INFORME DE SUPERVISIÓN - CONTRATO DE URGENCIA MANIFIESTA No. 003-2024

ACTA FINAL N° 001
OCTUBRE - 2024

CONTRATO DE URGENCIA MANIFIESTA No. 003-2024
DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024
"REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO CENTRO, DE CONFORMIDAD CON LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 0067"

CONTRATISTA
STROBUS CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.S
Nit No. 891.801.362-1
R/L PEDRO LUIS PINEDA RAMIREZ
C.C 1.002.527.322 de Bogotá D.C.

CONTRATANTE
MUNICIPIO DE OTANCHE - BOYACA
NIT 891.801.362-1

ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

CONTRATO DE URGENCIA MANIFIESTA No. 003-2024

CONTRATO	:	URGENCIA MANIFIESTA 003-2024
CONTRATANTE	:	**MUNICIPIO DE OTANCHE** NIT. 891801362-1
CONTRATISTA	:	**STROBUS CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.S** Nit No. 891.801.362-1 **R/L PEDRO LUIS PINEDA RAMIREZ** C.C 1.002.527.322 de Bogotá
OBJETO	:	**"REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO CENTRO, DE CONFORMIDAD CON LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 0067"**
VALOR INICIAL	:	SETENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 70.770.787).M/CTE.
VALOR A ADICIONAR	:	CERO ($ 0.00)
VALOR TOTAL CON ADICIÓN	:	N/A
VALOR ACTAS ANTERIORES	:	CERO ($ 0.00)
VALOR PRESENTE ACTA	:	SETENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 70.770.787).M/CTE.
VALOR POR EJECUTAR	:	($ 00)
SUPERVISOR	:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA.
FECHA DE INICIACIÓN	:	01 DE OCTUBRE DE 2024
DURACION INICIAL	:	QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	:	15 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	:	N/A
FECHA DE REINICIO No. 1	:	N/A
PRORROGA	:	QUINCE (15) DÍAS.
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	:	30 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA	:	29 DE OCTUBRE DE 2024

En atención a la emergencia y con el propósito de resolver oportunamente las actividades y responsabilidades adquiridas a la firma del contrato, se verifico el inicio de las actividades según las especificaciones, se evidencia que el contratista ha iniciado las intervenciones y que el avance es progresivo, sin embargo, las condiciones climáticas no han sido lo más convenientes, razón por la que el contratista solicito prorroga al contrato, ajustado las condiciones iniciales, así:

Siendo el día quince (15) de octubre de 2024, se amplía el plazo de ejecución originalmente pacto, por un periodo de quince (15) días, teniendo en consideración que las condiciones climáticas no permitieron dar alcance al objeto en los quince días iniciales.

ANEXO No. 4	**FECHA DE EXPEDICIÓN.**	21/10/2024
ASEGURADORA: **SEGUROS DEL ESTADO Nit: 860.009.518-6**	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PÓLIZA: 39-44-101165344 Anexo 2	$ 14.154.157,4	03/03/2025
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES PÓLIZA: 39-44-101165344 Anexo 2	$ 7.007.078,7	01/11/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA PÓLIZA: 39-44-101165344 Anexo 2	$ 14.154.157,4	5 AÑOS

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES PÓLIZA: 39-40-101043290 Anexo 2	$ 260.000.000	01/11/2024

Pólizas Contrato de URGENCIA MANIFIESTA No. 003-2024

LOCALIZACIÓN



Imagen No. 2. Localización proyecto urgencia manifiesta para el mejoramiento de alcantarillado ,Municipio de Otanche – Boyacá.

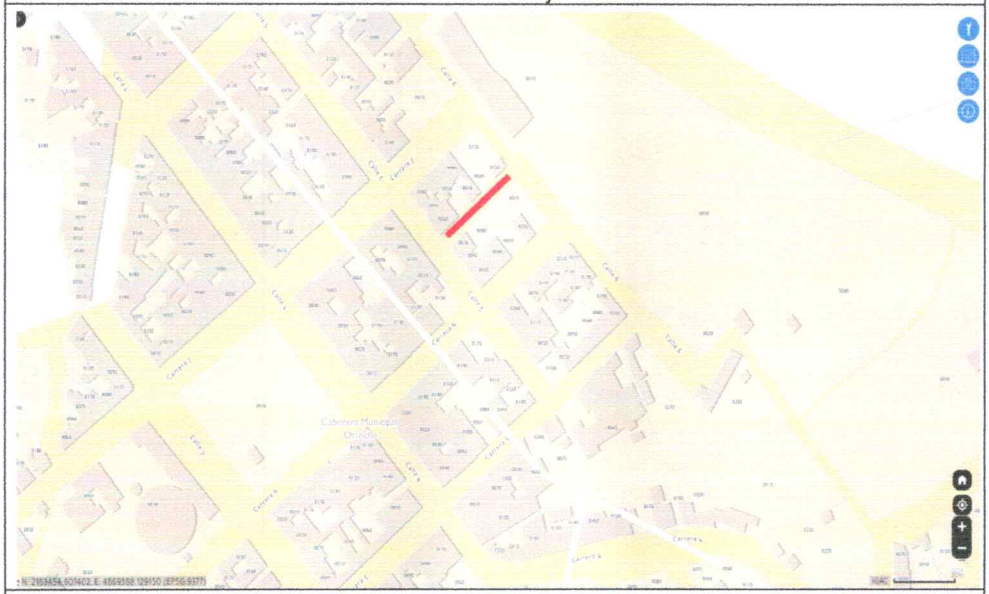


Imagen No. 3. Localización proyecto urgencia manifiesta para el mejoramiento de alcantarillado, Municipio de Otanche – Boyacá. (IGAC: 2024)

República de Colombia
Departamento de Boyacá Alcaldía Municipal de Otanche
Nit: 891.801.362-1

STROBUS CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA SAS

BALANCE ACTA FINAL

REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO CENTRO, DE CONFORMIDAD CON LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 067 DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACA

DETALLE		ESPECIFICACIONES		DETALLE PRESUPUESTAL					BALANCE FINAL ACTIVIDADES EJECUTADAS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GENERAL	PARTICULAR	UNIDAD	CANT	DIST	VR/UNITARIO	VR TOTAL	(+)	(-)	Cant. Actualizada	Vr. Total
1	**PRELIMINARES**							$ 10,250,816.28				$ 10,870,619.20
1.1	1.01.69 LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES HASTA H=50CM	GOBERNACIÓN		M2	120.00		$ 4,492.88	$ 539,145.60	82.5	0	202.5	$ 909,808.20
1.2	1.01.21. DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO <=10 CMS	GOBERNACIÓN		M2	100.00		$ 32,896.82	$ 3,289,682.00	62.5	0	162.5	$ 5,345,733.25
1.3	3.02.07. EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	GOBERNACIÓN		M3	193.20		$ 16,429.53	$ 3,174,185.20	0	-57.09	136.11	$ 2,236,223.33
1.4	1.01.73. RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"	GOBERNACIÓN		M	60.00		$ 6,150.65	$ 369,039.00	0	-53.2	6.8	$ 41,824.42
1.5	1.01.07. CORTE ARBOL (INC. RAICES) H>3.0 ICLUYE RETIRO		PARTICULAR	Hr	24.00		$ 97,376.25	$ 2,337,030.00	0	0	24	$ 2,337,030.00
1.6	1.01.09. CORTE RAIZ D=30CM - 80CM INCLUYE RETIRO	GOBERNACIÓN		UND	24.00		$ 22,572.27	$ 541,734.48	0	-24	0	$ -
2	**RED DE TUBERIA**							$ 28,436,310.81				$ 19,435,894.59
2.1	2.05.04. POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2, 2.0<H<2.5	GOBERNACIÓN		UND	4.00	12%	$ 3,275,747.91	$ 14,675,350.64	0	0	4	$ 14,675,350.64
2.2	2.05.59. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	GOBERNACIÓN		M	60.00	12%	$ 85,764.02	$ 5,763,342.14	0	-19.6	40.4	$ 3,880,650.38
2.3	2.01.06 RELLENO GRAVILLA COMPACTADO CON PLACA VIBRADORA	GOBERNACIÓN		M3	21.60	12%	$ 138,070.17	$ 3,340,193.55	0	-15.91	5.69	$ 879,893.58
2.4	2.01.0 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLACA VIDRADORA	GOBERNACIÓN		M3	159.60	12%	$ 28,055.23	$ 4,657,424.47	0	-159.6	0	$ -
3	**ACOMETIDAS**							$ 7,208,273.56				$ 8,914,225.39
3.1	1.02.17. EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	GOBERNACIÓN		M3	18.48	12%	$ 51,943.58	$ 1,075,107.44	35.06	0	53.54	$ 2,781,059.27
3.2	1.02.05. CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 CM	GOBERNACIÓN		UND	6.00	12%	$ 480,785.87	$ 3,230,881.05	0	0	6	$ 3,230,881.05
3.3	2.06.04. CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO. INC. TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN TUBERIA	GOBERNACIÓN		UND	6.00	12%	$ 431,887.66	$ 2,902,285.08	0	0	6	$ 2,902,285.08
4	**RECUPERACION ESTRUCTURA PAVIMENTO**							$ 10,721,228.87				$ 17,395,890.52
4.1	COMPATACION DE LA SUBRASANTE CBR=95%	GOBERNACIÓN		M2	330.00		$ 7,709.54	$ 2,544,148.20	0	-330	0	$ -
4.2	1.11.06. BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPATADO	GOBERNACIÓN		M3	99.00	12%	$ 73,747.12	$ 8,177,080.67	111.61223	0	210.61	$ 17,395,890.52
							COSTO DIRECTO	$ 56,616,629.51				$ 56,616,629.70
							ADMINISTRATIVOS (A) 20%	$ 11,323,325.90				$ 11,323,325.94
							IMPREVISTOS (I) 2%	$ 1,132,332.59				$ 1,132,332.59
							UTILIDAD (U) 3%	$ 1,698,498.89				$ 1,698,498.89
							PRESUPUESTO	$ 70,770,787.00				$ 70,770,787.00

STROBUS CONSTRUCCION E INGENIERIAS SAS
R.L. PEDRO LUIS PINEDA RAMIREZ

ING. ANDRY FABIAN JIMENEZ
SUPERVISOR

El día veintinueve (29) de octubre del 2024, se realiza la aprobación equivalente al **100%** del valor del contrato, por un valor de **SETENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 70.770.787) M/CTE.**, como se estableció en la forma de pago del contrato urgencia manifiesta-003-2024, **CLAUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.**

Se anexa registro fotográfico de las actividades realizadas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ANDRY FABIAN JIMÉNEZ MÉNDEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura

Proyecto: Ing. Adrián Garzón.
Revisó: Fabián Jiménez.
Archivado: Contrato de urgencia Manifiesta No. 003-2024
