
Memoría de Cantidades de obra			
ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA			
Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		

Item	Und	Descripción
1.01	m3	Excavación mecánica

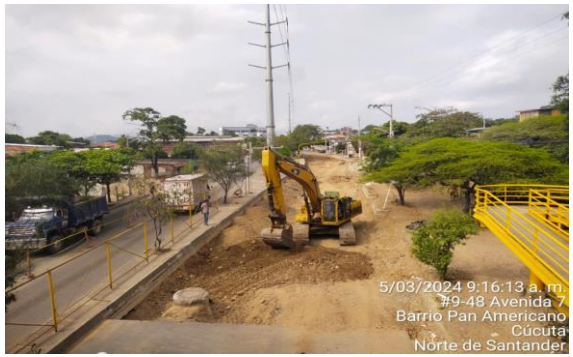

Coordenadas: 7°55'59.6"N 72°29'53.8"W

Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
		Long	Alt	Ancho		
7°55'59.6"N 72°29'53.8"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11 (vía)	130	1,15	8,55	1	1278,23
7°55'59.7"N 72°29'53.9"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11 (cuneta)	130	0,15	1,20	1	23,40
7°55'59.7"N 72°29'53.9"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11 (filtro)	60	0,8	0,50	1	24,00
7°55'59.7"N 72°29'53.9"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11 (filtro)	40	0,55	0,65	1	14,30
7°55'59.7"N 72°29'53.9"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11 (filtro)	30	0,45	0,80	1	10,80
7°54'37.8"N 72°29'34.8"W	Av. Guaimaral con cll. 11n	5,3	0,1	2,75	1	1,46
7°54'37.8"N 72°29'34.8"W	Av. Guaimaral con cll. 11n	1,5	0,1	2,30	1	0,35
7°54'35.8"N 72°29'33.9"W	Av. Guaimaral entre cll. 9bn y 11n	9,5	0,1	4,50	1	4,28
7°54'36.6"N 72°29'34.1"W	Av. Guaimaral entre cll. 9bn y 11n	3,5	0,1	2,50	1	0,875
7°54'46.0"N 72°29'35.8"W	Av. Guaimaral entre cll. 13n y 14n	2,3	0,1	3,00	1	0,69
7°54'47.0"N 72°29'36.4"W	Av. Guaimaral entre cll. 14n y 15n	2,5	0,1	2,50	1	0,625
7°54'59.5"N 72°29'58.1"W	Av. 5 entre cll. 17n y 18n Zona Industrial	1,6	0,1	2,55	1	0,408
7°54'59.5"N 72°29'58.1"W	Av. 5 entre cll. 17n y 18n Zona Industrial	3,3	0,1	2,60	1	0,858
7°55'00.5"N 72°29'57.8"W	Av. 5 entre cll. 18n y 19an Zona Industrial	2,3	0,1	2,00	1	0,46
					Total	1360,72

Registro fotografico









KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Memoría de Cantidades de obra			
ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA			
Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		

Item	Und	Descripción	Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
					Long	Alt	Ancho		
1.02	ml	Corte de pavimento asfaltico	7°55'59.6"N 72°29'53.8"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11	8,10			1	8,10
			7°55'59.6"N 72°29'53.8"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11	7,80			1	7,80
			7°55'59.6"N 72°29'53.8"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11	20,00			1	20,00
			7°54'37.8"N 72°29'34.8"W	Av. Guaimaral con cll. 11n	6,95			1	6,95
			7°54'37.8"N 72°29'34.8"W	Av. Guaimaral con cll. 11n	2,30			1	2,30
			7°54'37.8"N 72°29'34.8"W	Av. Guaimaral con cll. 11n	1,50			1	1,50
			7°54'37.8"N 72°29'34.8"W	Av. Guaimaral con cll. 11n	2,30			1	2,30
			7°54'37.8"N 72°29'34.8"W	Av. Guaimaral con cll. 11n	1,25			1	1,25
			7°54'37.8"N 72°29'34.8"W	Av. Guaimaral con cll. 11n	5,30			1	5,30
			7°54'37.8"N 72°29'34.8"W	Av. Guaimaral con cll. 11n	9,50			2	19,00
			7°54'37.8"N 72°29'34.8"W	Av. Guaimaral con cll. 11n	4,50			2	9,00
			7°54'35.8"N 72°29'33.9"W	Av. Guaimaral entre cll. 9bn y 11n	3,50			2	7,00
			7°54'35.8"N 72°29'33.9"W	Av. Guaimaral entre cll. 9bn y 11n	2,50			2	5,00
			7°54'36.6"N 72°29'34.1"W	Av. Guaimaral entre cll. 9bn y 11n	2,30			2	4,60
			7°54'36.6"N 72°29'34.1"W	Av. Guaimaral entre cll. 9bn y 11n	3,00			2	6,00
			7°54'47.0"N 72°29'36.4"W	Av. Guaimaral entre cll. 14n y 15n	2,50			4	10,00
			7°55'00.5"N 72°29'57.8"W	Av. 5 entre cll. 18n y 19an Zona Industrial	2,00			2	4,00
			7°55'00.5"N 72°29'57.8"W	Av. 5 entre cll. 18n y 19an Zona Industrial	2,30			2	4,60
			7°54'59.5"N 72°29'58.1"W	Av. 5 entre cll. 17n y 18n Zona Industrial	1,60			1	1,60
			7°54'59.5"N 72°29'58.1"W	Av. 5 entre cll. 17n y 18n Zona Industrial	2,55			1	2,55
			7°54'59.5"N 72°29'58.1"W	Av. 5 entre cll. 17n y 18n Zona Industrial	1,00			1	1,00
			7°54'59.5"N 72°29'58.1"W	Av. 5 entre cll. 17n y 18n Zona Industrial	3,30			1	3,30
			7°54'59.5"N 72°29'58.1"W	Av. 5 entre cll. 17n y 18n Zona Industrial	2,60			1	2,60
			7°54'59.5"N 72°29'58.1"W	Av. 5 entre cll. 17n y 18n Zona Industrial	5,55			1	5,55
								Total	141,30



Coordenadas: 7°55'59.6"N 72°29'53.8"W

Registro fotografico










KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Memoría de Cantidades de obra			
ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA			
Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 2
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		


Item	Und	Descripción
1.01	m3	Excavación mecánica

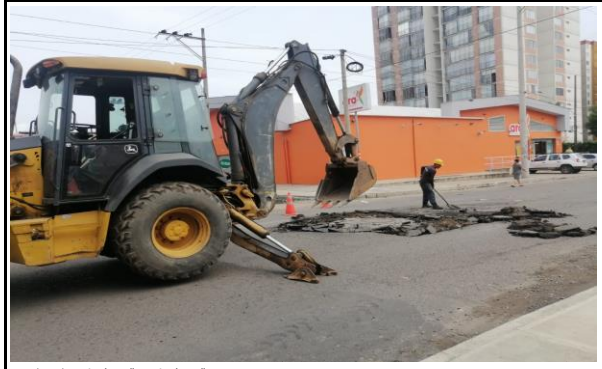

Coordenadas: 7°55'59.6"N 72°29'53.8"W

Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
		Long	Alt	Ancho		
7°54'53.3"N 72°29'53.4"W	Av 4 con Cll 17N Prados Norte	3,00	0,1	3,20	1	0,96
7°54'54.0"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	3,53	0,1	7,00	1	2,47
7°54'54.0"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	3,10	0,1	5,03	1	1,56
7°54'54.0"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	11,44	0,1	1,74	1	1,99
7°54'54.4"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	6,00	0,1	2,20	1	1,32
7°54'56.2"N 72°29'52.6"W	Av 4 entre Cll 18N y 18AN Prados Norte	2,20	0,1	1,40	1	0,31
7°54'56.2"N 72°29'52.6"W	Av 4 entre Cll 18N y 18AN Prados Norte	2,70	0,1	2,10	1	0,57
7°55'10.7"N 72°29'48.5"W	Av 4 entre Cll 23N y Libertadores Prados Norte	6,52	0,1	3,20	1	2,09
7°55'10.7"N 72°29'48.5"W	Av 4 entre Cll 23N y Libertadores Prados Norte	4,00	0,1	2,50	1	1
					Total	12,26

Registro fotografico

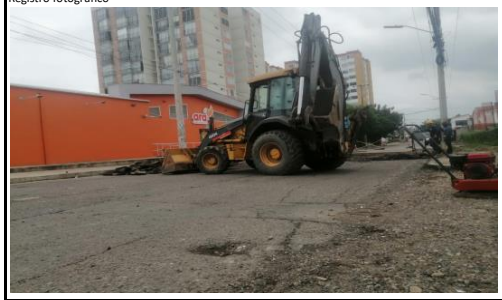





KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Memoría de Cantidades de obra			
ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA			
Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 2
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		

Item	Und	Descripción	Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
					Long	Alt	Ancho		
1.02	ml	Corte de pavimento asfaltico	7°54'53.3"N 72°29'53.4"W	Av 4 con Cll 17N Prados Norte	3,00			2	6,00
			7°54'53.3"N 72°29'53.4"W	Av 4 con Cll 17N Prados Norte	3,20			2	6,40
			7°54'54.0"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	3,53			1	3,53
			7°54'54.0"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	7,00			1	7,00
			7°54'54.0"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	1,50			1	1,50
			7°54'54.0"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	3,10			1	3,10
			7°54'54.0"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	3,29			1	3,29
			7°54'54.0"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	11,44			1	11,44
			7°54'54.0"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	1,74			1	1,74
			7°54'54.4"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	6,00			2	12,00
			7°54'54.4"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	2,20			2	4,40
			7°54'56.2"N 72°29'52.6"W	Av 4 entre Cll 18N y 18AN Prados Norte	2,10			1	2,10
			7°54'56.2"N 72°29'52.6"W	Av 4 entre Cll 18N y 18AN Prados Norte	4,90			1	4,90
			7°54'56.2"N 72°29'52.6"W	Av 4 entre Cll 18N y 18AN Prados Norte	1,40			1	1,40
			7°54'56.2"N 72°29'52.6"W	Av 4 entre Cll 18N y 18AN Prados Norte	2,20			1	2,20
			7°54'56.2"N 72°29'52.6"W	Av 4 entre Cll 18N y 18AN Prados Norte	0,70			1	0,70
			7°54'56.2"N 72°29'52.6"W	Av 4 entre Cll 18N y 18AN Prados Norte	2,70			1	2,70
			7°55'10.7"N 72°29'48.5"W	Av 4 entre Cll 23N y Libertadores Prados Norte	6,52			1	6,52
			7°55'10.7"N 72°29'48.5"W	Av 4 entre Cll 23N y Libertadores Prados Norte	3,20			1	3,20
			7°55'10.7"N 72°29'48.5"W	Av 4 entre Cll 23N y Libertadores Prados Norte	4,02			1	4,02
			7°55'10.7"N 72°29'48.5"W	Av 4 entre Cll 23N y Libertadores Prados Norte	4,00			1	4,00
			7°55'10.7"N 72°29'48.5"W	Av 4 entre Cll 23N y Libertadores Prados Norte	2,50			1	2,50
									0,00
									0,00
								Total	94,64



Coordenadas: 7°55'59.6"N 72°29'53.8"W

Registro fotografico

KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Memoría de Cantidades de obra

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		

Item	Und	Descripción	Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
					Long	Alt	Ancho		
1.03	m3	Demolición de pavimento asfaltico (incluye compresor con martillo demoledor)	7°55'59.6"N 72°29'53.8"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11	130,00		8,55	1	1111,50
			7°54'37.8"N 72°29'34.8"W	Av. Guaimaral con cll. 11n	5,30		2,75	1	14,58
			7°54'37.8"N 72°29'34.8"W	Av. Guaimaral con cll. 11n	1,50		2,30	1	3,45
			7°54'35.8"N 72°29'33.9"W	Av. Guaimaral entre cll. 9bn y 11n	9,50		4,50	1	42,75
			7°54'36.6"N 72°29'34.1"W	Av. Guaimaral entre cll. 9bn y 11n	3,50		2,50	1	8,75
			7°54'46.0"N 72°29'35.8"W	Av. Guaimaral entre cll. 13n y 14n	2,30		3,00	1	6,90
			7°54'47.0"N 72°29'36.4"W	Av. Guaimaral entre cll. 14n y 15n	2,50		2,50	1	6,25
			7°54'59.5"N 72°29'58.1"W	Av. 5 entre cll. 17n y 18n Zona Industrial	1,60		2,55	1	4,08
			7°54'59.5"N 72°29'58.1"W	Av. 5 entre cll. 17n y 18n Zona Industrial	3,30		2,60	1	8,58
			7°55'00.5"N 72°29'57.8"W	Av. 5 entre cll. 18n y 19an Zona Industrial	2,30		2,00	1	4,60
								Total	1211,44



Coordenadas: 7°55'59.6"N 72°29'53.8"W

Registro fotografico









KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Memoria de Cantidades de obra			
ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA			
Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 2
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		

Item	Und	Descripción	Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
					Long	Alt	Ancho		
1.03	m3	Demolición de pavimento asfaltico (incluye compresor con martillo demoledor)	7°54'53.3"N 72°29'53.4"W	Av 4 con Cll 17N Prados Norte	3,00		3,20	1	9,60
			7°54'54.0"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	3,53		7,00	1	24,71
			7°54'54.0"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	3,10		5,03	1	15,59
			7°54'54.0"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	11,44		1,74	1	19,91
			7°54'54.4"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	6,00		2,20	1	13,20
			7°54'56.2"N 72°29'52.6"W	Av 4 entre Cll 18N y 18AN Prados Norte	2,20		1,40	1	3,08
			7°54'56.2"N 72°29'52.6"W	Av 4 entre Cll 18N y 18AN Prados Norte	2,70		2,10	1	5,67
			7°55'10.7"N 72°29'48.5"W	Av 4 entre Cll 23N y Libertadores Prados Norte	6,52		3,20	1	20,86
			7°55'10.7"N 72°29'48.5"W	Av 4 entre Cll 23N y Libertadores Prados Norte	4,00		2,50	1	10,00
								Total	122,6226



Coordenadas: 7°55'59.6"N 72°29'53.8"W

Registro fotografico







KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Memoría de Cantidades de obra

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		


Item	Und	Descripción	Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
					Long	Alt	Ancho		
1.05	m3	Subbase granular CONSTRUCCION (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte)	7°55'59.6"N 72°29'53.8"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11	130	0,3	8,55	1	333,45
								Total	333,45



Coordenadas: 7°55'59.6"N 72°29'53.8"W

Registro fotografico



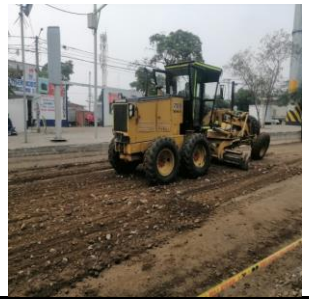


KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Memoría de Cantidades de obra

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		

Item	Und	Descripción	Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
					Long	Alt	Ancho		
1.06	m3	Base granular CONSTRUCCION (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte)	7°55'59.6"N 72°29'53.8"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11	130,00	0,25	8,55	1	277,88
			7°55'59.6"N 72°29'53.8"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11	130,00	0,20	1,20	1	31,20
								Total	309,08



Coordenadas: 7°55'59.6"N 72°29'53.8"W

Registro fotografico





KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Memoría de Cantidades de obra

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		

Item	Und	Descripción	Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
					Long	Alt	Ancho		
1.07	m2	Riego de Liga con emulsión asfáltica CRR-1 PARA CONSTRUCCION (Incluye suministro y aplicación)	7°55'59.6"N 72°29'53.8"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11	130,00	0,10		2	26,00
			7°55'59.6"N 72°29'53.8"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11	8,20	0,10		1	0,82
			7°55'59.6"N 72°29'53.8"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11	8,3	0,10		1	0,83
								Total	27,65



Coordenadas: 7°55'59.6"N 72°29'53.8"W

Registro fotografico







KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Memoría de Cantidades de obra

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 2
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		

Item	Und	Descripción	Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
					Long	Alt	Ancho		
1.07	m2	Riego de Liga con emulsión asfáltica CRR-1 PARA CONSTRUCCION (Incluye suministro y aplicación)	7°55'59.6"N 72°29'53.8"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11	130,00	0,10		2	26,00
			7°55'59.6"N 72°29'53.8"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11	8,20	0,10		1	0,82
			7°55'59.6"N 72°29'53.8"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11	8,3	0,10		1	0,83
								Total	27,65



Coordenadas: 7°55'59.6"N 72°29'53.8"W

Registro fotografico







KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Memoría de Cantidades de obra

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		

Item	Und	Descripción	Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
					Long	Alt	Ancho		
1.08	m2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 PARA CONSTRUCCION (Incluye suministro y aplicación)	7°55'59.6"N 72°29'53.8"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11 sobre base	130,00		8,55	1	1111,50
								Total	1111,50



Coordenadas: 7°55'59.6"N 72°29'53.8"W

Registro fotografico







KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Memoría de Cantidades de obra

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 2
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		

Item	Und	Descripción	Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
					Long	Alt	Ancho		
1.08	m2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 PARA CONSTRUCCION (Incluye suministro y aplicación)	7°55'59.6"N 72°29'53.8"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11	130,00		8,55	1	1111,50
								Total	1111,50



Coordenadas: 7°55'59.6" N 72°29'53.8" W

Registro fotografico



KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Memoría de Cantidades de obra

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 2
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		

Item	Und	Descripción	Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
					Long	Alt	Ancho		
1.09	m3	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA CONSTRUCCION (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación, incluye transporte del material)	7°55'59.6"N 72°29'53.8"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11	130,00	0,15	8,55	1	166,73
								Total	166,73



Coordenadas: 7°55'59.6"N 72°29'53.8"W

Registro fotografico





KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Memoría de Cantidades de obra

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		

Item	Und	Descripción	Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
					Long	Alt	Ancho		
1.12	m2	Demolición de pavimento rígido (mecánica)	7°55'59.7"N 72°29'53.9"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11 (cuneta)	130		1,20	1	156,00
								Total	156



Coordenadas: 7°55'59.6"N 72°29'53.8"W

Registro fotografico









KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Memoría de Cantidades de obra			
ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA			
Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		

Item	Und	Descripción	Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
					Long	Alt	Ancho		
1.21	m3	Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias menores a 15 km	7°55'59.6"N 72°29'53.8"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11 (vía)	130,00	1,15	8,55	1,30	1661,69
			7°55'59.7"N 72°29'53.9"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11 (cuneta)	130,00	0,15	1,20	1,30	30,42
			7°55'59.7"N 72°29'53.9"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11 (filtro)	60	0,8	0,50	1	24,00
			7°55'59.7"N 72°29'53.9"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11 (filtro)	40	0,55	0,65	1	14,30
			7°55'59.7"N 72°29'53.9"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11 (filtro)	30	0,45	0,80	1	10,80
								Total	1741,21



Coordenadas: 7°55'59.6"N 72°29'53.8"W

Registro fotografico









KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Memoría de Cantidades de obra			
ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA			
Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		

Item	Und	Descripción	Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
					Long	Alt	Ancho		
1.21	m3	Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias menores a 15 km	7°55'59.7"N 72°29'53.9"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11	60	0,6	0,5	1	18,00
			7°55'59.7"N 72°29'53.9"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11	40	0,3	0,6	1	7,33
			7°55'59.7"N 72°29'53.9"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11	30	0,2	0,6	1	3,60
								Total	28,93



Registro fotografico





KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Memoría de Cantidades de obra			
ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA			
Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		

Item	Und	Descripción	Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
					Long	Alt	Ancho		
1.23	m3	Generación y disposición de sobrantes	7°55'59.6"N 72°29'53.8"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11 (vía)	130,00	0,90	8,55	0,16	155,80
								Total	155,80



Coordenadas: 7°55'59.6"N 72°29'53.8"W

Registro fotografico







KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Memoría de Cantidades de obra

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 2
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		

Item	Und	Descripción	Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
					Long	Alt	Ancho		
1.23	m3	Generación y disposición de sobrantes	7°55'59.6"N 72°29'53.8"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11 (vía)	130	1,1	8,38	1,30	1557,10
			7°55'59.7"N 72°29'53.9"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11 (cuneta)	130	0,1	1,10	1,30	18,59
			7°55'59.7"N 72°29'53.9"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11 (filtro)	60	0,8	0,40	1	19,20
			7°55'59.7"N 72°29'53.9"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11 (filtro)	40	0,5	0,5	1	10,00
			7°55'59.7"N 72°29'53.9"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11 (filtro)	30	0,45	0,70	1	9,45
								Total	1614,34



Coordenadas: 7°55'59.6"N 72°29'53.8"W

Registro fotografico



KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Memoría de Cantidades de obra

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		

Item	Und	Descripción	Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
					Long	Alt	Ancho		
2.03	m2	Riego de Liga con emulsión asfáltica CRR-1 PARA BACHEO (Incluye suministro y aplicación)	7°54'37.8"N 72°29'34.8"W	Av. Guaimaral con cll. 11n	6,95		0,30	1	2,09
			7°54'37.8"N 72°29'34.8"W	Av. Guaimaral con cll. 11n	2,30		0,30	1	0,69
			7°54'37.8"N 72°29'34.8"W	Av. Guaimaral con cll. 11n	1,50		0,30	1	0,45
			7°54'37.8"N 72°29'34.8"W	Av. Guaimaral con cll. 11n	2,30		0,30	1	0,69
			7°54'37.8"N 72°29'34.8"W	Av. Guaimaral con cll. 11n	1,25		0,30	1	0,38
			7°54'37.8"N 72°29'34.8"W	Av. Guaimaral con cll. 11n	5,30		0,30	1	1,59
			7°54'37.8"N 72°29'34.8"W	Av. Guaimaral con cll. 11n	9,50		0,30	2	5,70
			7°54'37.8"N 72°29'34.8"W	Av. Guaimaral con cll. 11n	4,50		0,30	2	2,70
			7°54'35.8"N 72°29'33.9"W	Av. Guaimaral entre cll. 9bn y 11n	3,50		0,30	2	2,10
			7°54'35.8"N 72°29'33.9"W	Av. Guaimaral entre cll. 9bn y 11n	2,50		0,30	2	1,50
			7°54'36.6"N 72°29'34.1"W	Av. Guaimaral entre cll. 9bn y 11n	2,30		0,30	2	1,38
			7°54'36.6"N 72°29'34.1"W	Av. Guaimaral entre cll. 9bn y 11n	3,00		0,30	2	1,80
			7°54'47.0"N 72°29'36.4"W	Av. Guaimaral entre cll. 14n y 15n	2,50		0,30	4	3,00
			7°55'00.5"N 72°29'57.8"W	Av. 5 entre cll. 18n y 19an Zona Industrial	2,00		0,30	2	1,20
			7°55'00.5"N 72°29'57.8"W	Av. 5 entre cll. 18n y 19an Zona Industrial	2,30		0,30	2	1,38
			7°54'59.5"N 72°29'58.1"W	Av. 5 entre cll. 17n y 18n Zona Industrial	1,60		0,30	1	0,48
			7°54'59.5"N 72°29'58.1"W	Av. 5 entre cll. 17n y 18n Zona Industrial	2,55		0,30	1	0,77
			7°54'59.5"N 72°29'58.1"W	Av. 5 entre cll. 17n y 18n Zona Industrial	1,00		0,30	1	0,30
			7°54'59.5"N 72°29'58.1"W	Av. 5 entre cll. 17n y 18n Zona Industrial	3,30		0,30	1	0,99
			7°54'59.5"N 72°29'58.1"W	Av. 5 entre cll. 17n y 18n Zona Industrial	2,60		0,30	1	0,78
			7°54'59.5"N 72°29'58.1"W	Av. 5 entre cll. 17n y 18n Zona Industrial	5,55		0,30	1	1,67
								Total	31,62



Coordenadas: 7°55'59.6"N 72°29'53.8"W

Registro fotografico









KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Memoría de Cantidades de obra

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 2
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		

Item	Und	Descripción	Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
					Long	Alt	Ancho		
2.03	m2	Riego de Liga con emulsión asfáltica CRR-1 PARA BACHEO (Incluye suministro y aplicación)	7°54'53.3"N 72°29'53.4"W	Av 4 con Cll 17N Prados Norte	3,00		3,20	1	9,60
			7°54'53.3"N 72°29'53.4"W	Av 4 con Cll 17N Prados Norte	3,00		0,1	2	0,60
			7°54'53.3"N 72°29'53.4"W	Av 4 con Cll 17N Prados Norte	3,20		0,1	2	0,64
			7°54'54.0"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	3,53		7,00	1	24,71
			7°54'54.0"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	3,10		1,50	1	4,65
			7°54'54.0"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	11,38		1,70	1	19,35
			7°54'54.0"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	3,53		0,1	1	0,35
			7°54'54.0"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	7,00		0,1	1	0,70
			7°54'54.0"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	1,50		0,1	1	0,15
			7°54'54.0"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	3,10		0,1	1	0,31
			7°54'54.0"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	3,29		0,1	1	0,33
			7°54'54.0"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	7,80		0,1	1	0,78
			7°54'54.0"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	1,74		0,1	1	0,17
			7°54'54.0"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	10,10		0,1	1	1,01
			7°54'54.4"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	6,00		2,20	1	13,20
			7°54'54.4"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	6,00		0,10	2	1,20
			7°54'54.4"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	2,20		0,1	2	0,44
			7°54'56.2"N 72°29'52.6"W	Av 4 entre Cll 18N y 18AN Prados Norte	2,20		1,40	1	3,08
			7°54'56.2"N 72°29'52.6"W	Av 4 entre Cll 18N y 18AN Prados Norte	2,70		2,10	1	5,67
			7°54'56.2"N 72°29'52.6"W	Av 4 entre Cll 18N y 18AN Prados Norte	2,10		0,10	1	0,21
			7°54'56.2"N 72°29'52.6"W	Av 4 entre Cll 18N y 18AN Prados Norte	2,70		0,10	1	0,27
			7°54'56.2"N 72°29'52.6"W	Av 4 entre Cll 18N y 18AN Prados Norte	1,40		0,10	1	0,14
			7°54'56.2"N 72°29'52.6"W	Av 4 entre Cll 18N y 18AN Prados Norte	2,20		0,10	1	0,22
			7°54'56.2"N 72°29'52.6"W	Av 4 entre Cll 18N y 18AN Prados Norte	0,70		0,10	1	0,07
			7°54'56.2"N 72°29'52.6"W	Av 4 entre Cll 18N y 18AN Prados Norte	2,70		0,10	1	0,27
			7°55'10.7"N 72°29'48.5"W	Av 4 entre Cll 23N y Libertadores Prados Norte	6,50		3,20	1	20,80
			7°55'10.7"N 72°29'48.5"W	Av 4 entre Cll 23N y Libertadores Prados Norte	4,00		2,50	1	10,00
			7°55'10.7"N 72°29'48.5"W	Av 4 entre Cll 23N y Libertadores Prados Norte	6,52		0,10	1	0,65
			7°55'10.7"N 72°29'48.5"W	Av 4 entre Cll 23N y Libertadores Prados Norte	3,20		0,10	1	0,32
			7°55'10.7"N 72°29'48.5"W	Av 4 entre Cll 23N y Libertadores Prados Norte	4,02		0,10	1	0,40
			7°55'10.7"N 72°29'48.5"W	Av 4 entre Cll 23N y Libertadores Prados Norte	4,00		0,10	1	0,40
			7°55'10.7"N 72°29'48.5"W	Av 4 entre Cll 23N y Libertadores Prados Norte	2,50		0,10	1	0,25
			7°54'56.9"N 72°29'45.8"W	Av 2 con Cll 19N Prados Norte	8,10		1,20	1	9,72
			7°54'56.9"N 72°29'45.8"W	Av 2 con Cll 19N Prados Norte	1,80		1,70	1	3,06
			7°54'56.9"N 72°29'45.8"W	Av 2 con Cll 19N Prados Norte	8,60		2,00	1	17,20
			7°54'56.9"N 72°29'45.8"W	Av 2 con Cll 19N Prados Norte	7,60		1,60	1	12,16
			7°54'56.2"N 72°29'46.0"W	Av 2 entre Cll 18AN y 19N Prados Norte	1,00		1,10	1	1,10
			7°54'56.2"N 72°29'46.0"W	Av 2 entre Cll 18AN y 19N Prados Norte	5,20		1,50	1	7,80
			7°54'56.3"N 72°29'45.9"W	Av 2 entre Cll 18AN y 19N Prados Norte	2,10		1,80	1	3,78
			7°54'55.6"N 72°29'46.2"W	Av 2 con Cll 18AN Prados Norte	5,50		0,70	1	3,85
								Total	179,62





Registro fotografico









KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Memoría de Cantidades de obra

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		

Item	Und	Descripción	Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
					Long	Alt	Ancho		
2.04	m2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 PARA BACHEO (Incluye suministro y aplicación)	7°54'37.8"N 72°29'34.8"W	Av. Guaimaral con cll. 11n	5,30		2,75	1	14,58
			7°54'37.8"N 72°29'34.8"W	Av. Guaimaral con cll. 11n	1,50		2,30	1	3,45
			7°54'35.8"N 72°29'33.9"W	Av. Guaimaral entre cll. 9bn y 11n	9,50		4,50	1	42,75
			7°54'36.6"N 72°29'34.1"W	Av. Guaimaral entre cll. 9bn y 11n	3,50		2,50	1	8,75
			7°54'46.0"N 72°29'35.8"W	Av. Guaimaral entre cll. 13n y 14n	2,30		3,00	1	6,90
			7°54'47.0"N 72°29'36.4"W	Av. Guaimaral entre cll. 14n y 15n	2,50		2,50	1	6,25
			7°54'59.5"N 72°29'58.1"W	Av. 5 entre cll. 17n y 18n Zona Industrial	1,60		2,55	1	4,08
			7°54'59.5"N 72°29'58.1"W	Av. 5 entre cll. 17n y 18n Zona Industrial	3,30		2,60	1	8,58
			7°55'00.5"N 72°29'57.8"W	Av. 5 entre cll. 18n y 19an Zona Industrial	2,30		2,00	1	4,60
								Total	99,94



Coordenadas: 7°55'59.6"N 72°29'53.8"W

Registro fotografico







KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Memoría de Cantidades de obra			
ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA			
Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		

Item	Und	Descripción	Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
					Long	Alt	Ancho		
2.05	m3	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEO (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación CON VIBROCOMPACTADOR DE 3 TON, incluye transporte del material)	7°54'37.8"N 72°29'34.8"W	Av. Guaimaral con cll. 11n	5,30	0,10	2,75	1	1,46
			7°54'37.8"N 72°29'34.8"W	Av. Guaimaral con cll. 11n	1,50	0,10	2,30	1	0,35
			7°54'35.8"N 72°29'33.9"W	Av. Guaimaral entre cll. 9bn y 11n	9,50	0,10	4,50	1	4,28
			7°54'36.6"N 72°29'34.1"W	Av. Guaimaral entre cll. 9bn y 11n	3,50	0,10	2,50	1	0,88
			7°54'46.0"N 72°29'35.8"W	Av. Guaimaral entre cll. 13n y 14n	2,30	0,10	3,00	1	0,69
			7°54'47.0"N 72°29'36.4"W	Av. Guaimaral entre cll. 14n y 15n	2,50	0,10	2,50	1	0,63
			7°54'59.5"N 72°29'58.1"W	Av. 5 entre cll. 17n y 18n Zona Industrial	1,60	0,10	2,55	1	0,41
			7°54'59.5"N 72°29'58.1"W	Av. 5 entre cll. 17n y 18n Zona Industrial	3,30	0,10	2,60	1	0,86
			7°55'00.5"N 72°29'57.8"W	Av. 5 entre cll. 18n y 19an Zona Industrial	2,30	0,10	2,00	1	0,46
								Total	10,00



Coordenadas: 7°55'59.6"N 72°29'53.8"W

Registro fotografico









KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Memoría de Cantidades de obra

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 2
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		

Item	Und	Descripción
2.05	m3	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEO (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación CON VIBROCOMPACTADOR DE 3 TON, incluye transporte del material)



Coordenadas: 7°55'59.6"N 72°29'53.8"W

Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
		Long	Alt	Ancho		
7°54'53.3"N 72°29'53.4"W	Av 4 con Cll 17N Prados Norte	3,00	0,1	3,20	1	0,96
7°54'54.0"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	3,53	0,1	7,00	1	2,47
7°54'54.0"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	3,10	0,1	5,03	1	1,56
7°54'54.0"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	11,44	0,1	1,74	1	1,99
7°54'54.4"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	6,00	0,1	2,20	1	1,32
7°54'56.2"N 72°29'52.6"W	Av 4 entre Cll 18N y 18AN Prados Norte	2,20	0,1	1,40	1	0,31
7°54'56.2"N 72°29'52.6"W	Av 4 entre Cll 18N y 18AN Prados Norte	2,70	0,1	2,10	1	0,57
7°55'10.7"N 72°29'48.5"W	Av 4 entre Cll 23N y Libertadores Prados Norte	6,52	0,1	3,20	1	2,09
7°55'10.7"N 72°29'48.5"W	Av 4 entre Cll 23N y Libertadores Prados Norte	4,00	0,1	2,50	1	1,00
					Total	12,00

Registro fotografico







KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Memoría de Cantidades de obra			
ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA			
Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		

Item	Und	Descripción	Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
					Long	Alt	Ancho		
2.06	m3	PARCHEO TEMPORAL DE EMERGENCIA CON MDC-19 (Incluye Suministro, Extendido, Nivelación, compactación y transporte del material, personal e insumos. Emergencias Menores a 7 M2)	7°54'37.8"N 72°29'34.8"W	Av. Guaimaral con cll. 11n	4,00	0,035	2,75	1	0,39
			7°54'37.8"N 72°29'34.8"W	Av. Guaimaral con cll. 11n	1,55	0,035	2,30	1	0,12
			7°54'37.8"N 72°29'34.8"W	Av. Guaimaral con cll. 11n	7,95	0,035	4,60	1	1,28
			7°54'37.8"N 72°29'34.8"W	Av. Guaimaral con cll. 11n	3,50	0,035	2,50	1	0,31
			7°54'37.8"N 72°29'34.8"W	Av. Guaimaral con cll. 11n	2,30	0,035	3,00	1	0,24
			7°54'37.8"N 72°29'34.8"W	Av. Guaimaral con cll. 11n	2,50	0,035	2,50	1	0,22
			7°54'59.5"N 72°29'58.1"W	Av. 5 entre cll. 17n y 18n Zona Industrial	1,60	0,035	2,55	1	0,14
			7°54'59.5"N 72°29'58.1"W	Av. 5 entre cll. 17n y 18n Zona Industrial	3,30	0,035	2,60	1	0,30
			7°54'59.5"N 72°29'58.1"W	Av. 5 entre cll. 17n y 18n Zona Industrial	2,30	0,035	2,00	1	0,16
								Total	3,16



Coordenadas: 7°55'59.6"N 72°29'53.8"W

Registro fotografico









KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Memoría de Cantidades de obra			
ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA			
Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 2
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		

Item	Und	Descripción	Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
					Long	Alt	Ancho		
2.06	m3	PARCHEO TEMPORAL DE EMERGENCIA CON MDC-19 (Incluye Suministro, Extendido, Nivelación, compactación y transporte del material, personal e insumos. Emergencias Menores a 7 M2)	7°55'02.2"N 72°29'50.9"W	Av 4 entre Cll 20N y 20AN Prados Norte	2,00	0,04	2,00	1	0,16
			7°55'10.7"N 72°29'48.5"W	Av 4 entre Cll 23N y Libertadores Prados Norte	6,80	0,04	0,00	1	0,00
			7°55'10.7"N 72°29'48.5"W	Av 4 entre Cll 23N y Libertadores Prados Norte	2,50	0,04	1,50	1	0,15
			7°54'56.9"N 72°29'45.8"W	Av 2 con Cll 19N Prados Norte	8,10	0,04	1,20	1	0,39
			7°54'56.9"N 72°29'45.8"W	Av 2 con Cll 19N Prados Norte	1,80	0,04	1,70	1	0,12
			7°54'56.9"N 72°29'45.8"W	Av 2 con Cll 19N Prados Norte	1,18	0,04	2,00	1	0,09
			7°54'56.9"N 72°29'45.8"W	Av 2 con Cll 19N Prados Norte	7,40	0,04	1,60	1	0,47
			7°54'56.2"N 72°29'46.0"W	Av 2 entre Cll 18AN y 19N Prados Norte	1,00	0,04	1,10	1	0,04
			7°54'56.2"N 72°29'46.0"W	Av 2 entre Cll 18AN y 19N Prados Norte	5,20	0,04	1,50	1	0,31
			7°54'56.3"N 72°29'45.9"W	Av 2 entre Cll 18AN y 19N Prados Norte	2,10	0,04	1,80	1	0,1512
			7°54'55.6"N 72°29'46.2"W	Av 2 con Cll 18AN Prados Norte	5,50	0,04	0,70	1	0,154
			7°54'55.6"N 72°29'46.2"W	Av 2 con Cll 18AN Prados Norte	6,40	0,05	1,20	1	0,384
								Total	2,43



Coordenadas: 7°55'55.8" N 72°29'55.8" W

Registro fotografico





KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Memoría de Cantidades de obra

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		

Item	Und	Descripción	Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
					Long	Alt	Ancho		
2.10	m3	Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (incluye cargue manual)	7°54'37.8"N 72°29'34.8"W	Av. Guaimaral con cll. 11n	5,30	0,10	2,75	1,3	1,89
			7°54'37.8"N 72°29'34.8"W	Av. Guaimaral con cll. 11n	1,50	0,10	2,30	1,3	0,45
			7°54'35.8"N 72°29'33.9"W	Av. Guaimaral entre cll. 9bn y 11n	9,50	0,10	4,50	1,3	5,56
			7°54'36.6"N 72°29'34.1"W	Av. Guaimaral entre cll. 9bn y 11n	3,50	0,10	2,50	1,3	1,14
			7°54'46.0"N 72°29'35.8"W	Av. Guaimaral entre cll. 13n y 14n	2,30	0,10	3,00	1,3	0,90
			7°54'47.0"N 72°29'36.4"W	Av. Guaimaral entre cll. 14n y 15n	2,50	0,10	2,50	1,3	0,81
			7°54'59.5"N 72°29'58.1"W	Av. 5 entre cll. 17n y 18n Zona Industrial	1,60	0,10	2,55	1,3	0,53
			7°54'59.5"N 72°29'58.1"W	Av. 5 entre cll. 17n y 18n Zona Industrial	3,30	0,10	2,60	1,3	1,12
			7°55'00.5"N 72°29'57.8"W	Av. 5 entre cll. 18n y 19an Zona Industrial	2,30	0,10	2,00	1,3	0,60
								Total	13,00



Coordenadas: 7°55'59.6"N 72°29'53.8"W

Registro fotografico



KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Memoría de Cantidades de obra			
ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA			
Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 2
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		

Item	Und	Descripción	Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
					Long	Alt	Ancho		
2.10	m3	Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (incluye cargue manual)	7°54'53.3"N 72°29'53.4"W	Av 4 con Cll 17N Prados Norte	3,00	0,1	3,20	1,3	1,25
			7°54'54.0"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	3,50	0,1	7,00	1,3	3,19
			7°54'54.0"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	3,10	0,1	5,20	1,3	2,10
			7°54'54.0"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	11,44	0,1	1,70	1,3	2,53
			7°54'54.4"N 72°29'53.2"W	Av 4 entre Cll 17N y 17AN Prados Norte	6,00	0,1	2,20	1,3	1,72
			7°54'56.2"N 72°29'52.6"W	Av 4 entre Cll 18N y 18AN Prados Norte	2,20	0,1	1,40	1,3	0,40
			7°54'56.2"N 72°29'52.6"W	Av 4 entre Cll 18N y 18AN Prados Norte	2,70	0,1	2,10	1,3	0,74
			7°55'10.7"N 72°29'48.5"W	Av 4 entre Cll 23N y Libertadores Prados Norte	6,54	0,1	3,20	1,3	2,72
			7°55'10.7"N 72°29'48.5"W	Av 4 entre Cll 23N y Libertadores Prados Norte	4,00	0,1	2,50	1,3	1,30
								Total	15,93



Coordenadas: 7°55'59.6"N 72°29'53.8"W

Registro fotografico

KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Memoría de Cantidades de obra

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		

Item	Und	Descripción	Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
					Long	Alt	Ancho		
2.11	und	Limpieza de sumideros	7°55'59.6"N 72°29'53.8"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11 (vía)				1	1,00
			7°55'59.6"N 72°29'53.8"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11 (vía)				1	1,00
								Total	2



Coordenadas: 7°55'59.6"N 72°29'53.8"W

Registro fotografico





KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Memoría de Cantidades de obra			
ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA			
Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 3
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		

Item	Und	Descripción	Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
					Long	Alt	Ancho		
3.07	und	Realce de Pozos en concreto de 3000 psi (incluye demolición de concreto y refuerzo)	7°55'59.6"N 72°29'53.8"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11				2	2,00
								Total	2,00



Coordenadas: 7°55'59.6"N 72°29'53.8"W

Registro fotografico







KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Memoría de Cantidades de obra			
ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA			
Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		

Item	Und	Descripción	Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
					Long	Alt	Ancho		
3.13	m3	Pedraplen compacto	7°55'59.6"N 72°29'53.8"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11 (vía)	130	0,32	8,55	1	355,68
								Total	355,68



Coordenadas: 7°55'59.6"N 72°29'53.8"W

Registro fotografico










KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Memoría de Cantidades de obra

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		

Item	Und	Descripción	Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
					Long	Alt	Ancho		
3.15	m3	Concreto de Saneamiento de 14 Mpa.	7°55'59.6"N 72°29'53.8"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11 (vía)	130,00	0,05	1,20	1	7,80
								Total	7,80



Coordenadas: 7°55'59.6"N 72°29'53.8"W

Registro fotografico









KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Memoría de Cantidades de obra

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		

Item	Und	Descripción	Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
					Long	Alt	Ancho		
NP.01	ml	Construcción de filtro	7°55'59.6"N 72°29'53.8"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11 (vía)	130,00			1	130,00
								Total	130,00



Coordenadas: 7°55'59.6"N 72°29'53.8"W

Registro fotografico









KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Memoría de Cantidades de obra

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 2
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		

Item	Und	Descripción	Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
					Long	Alt	Ancho		
NP-02	m2	Geo malla para entre capaz asfálticas	7°55'59.6"N 72°29'53.8"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11	130,00		8,55	1	1111,50
								Total	1111,50



Coordenadas: 7°55'59.6"N 72°29'53.8"W

Registro fotografico









KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Memoría de Cantidades de obra			
ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA			
Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 2
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		

Item	Und	Descripción	Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
					Long	Alt	Ancho		
NP-03	und	Recalce de sumideros en concreto de 3000PSI (incluye demolicion de concreto y refuerzo)	7°55'59.6"N 72°29'53.8"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11	1,00				1,00
								Total	1,00



Coordenadas: 7°55'59.6"N 72°29'53.8"W

Registro fotografico





KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Memoría de Cantidades de obra

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		

Item	Und	Descripción	Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
					Long	Alt	Ancho		
NP.04	ml	Construccion de cuneta	7°55'59.6"N 72°29'53.8"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11 (vía)	130,00			1	130,00
								Total	130,00



Coordenadas: 7°55'59.6"N 72°29'53.8"W

Registro fotografico









KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Memoría de Cantidades de obra

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		

Item	Und	Descripción	Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
					Long	Alt	Ancho		
NP.05	ml	Suministro e instalación de tuberia novafort 12"	7°55'59.6"N 72°29'53.8"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11 (vía)	10			1	10,00
								Total	10



Coordenadas: 7°55'59.6"N 72°29'53.8"W

Registro fotografico



KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Memoría de Cantidades de obra

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		

Item	Und	Descripción	Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
					Long	Alt	Ancho		
NP.06	m3	Subrasante estabilizada	7°55'59.6"N 72°29'53.8"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11 (vía)	80	0,45	8,55	1	307,80
			7°55'59.6"N 72°29'53.8"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11 (vía)	20	0,15	8,55	1	25,65
			7°55'59.6"N 72°29'53.8"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11 (vía)	30	0,15	8,55	1	38,48
								Total	371,93



Coordenadas: 7°55'59.6"N 72°29'53.8"W

Registro fotografico











KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

Memoría de Cantidades de obra

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Contratista:	CONSORCIO FASE IV L1	**No. de Proceso**	
Interventor:	CONSORCIO SOCIEDAD PROESCO S.A.S	**No. de Contrato**	4230 DE 2023
Supervisor:	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA	**Contiene**	Memorias corte No. 1
Objeto:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 1		

Item	Und	Descripción	Coordenadas (WGS84)	Localización	Dimensiones			Cant	subtotal
					Long	Alt	Ancho		
NP.07	m2	Geotextil T3000	7°55'59.6"N 72°29'53.8"W	Av Panamericana entre cll 9 y 11 (vía)	130		8,55	1	1111,50
								Total	1111,50



Coordenadas: 7°55'59.6"N 72°29'53.8"W

Registro fotografico









KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ CONTRERAS
ING. RESIDENTE DE OBRA

JUAN DIEGO GUTIERREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL
