Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA

INFORME SEMANAL — No . 5

CONTRATO No: BGA-044-2024
CONTRATISTA : CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR

IDENTIFICACION

OBJETO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

FECHA INICIO: 27/09/2024
FECHA FIN: 27/12/2024

VALOR CONTRATO (Incluye iva) $ 1,940,000,000

ADICIÓN: N/A

PLAZO: ıeses, contados a partir de la suscripción de la respectiva acta de inicio.

FECHA PERIODO: 28 Octubre 2024 - 2 de Noviembre de 2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	SEMANA DEL 30 SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE				SEMANA DEL 7 OCTUBRE AL 12 DE OCTUBRE			SEMANA DEL 14 OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE			SEMANA DEL 21 OCTUBRE AL 26 DE OCTUBRE				SEMANA DEL 28 OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE			
			VALOR UNT.	CANT. EJECUT	TOTAL	ACUM EN VALOR	CANTI EJEC	TOTAL	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMUL	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES																			
1.1	Suministro e instalacion de Cerramiento provisional en polisombra. Incluye postes cada 1.5, puertas y accesorios	M	$ 15,313				7.50	$ 114,847.50	$ 114,847.50			$114,847.50			7.50	$ 114,847.50	0.00	$ 0.00	7.50	$ 114,847.50
1.2	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 19,220				200.61	$ 3,855,724.20	$ 3,855,724.20			$3,855,724.20			200.61	$ 3,855,724.20	0.00	$ 0.00	200.61	$ 3,855,724.20
1.4	Desmonte de puertas en madera	UND	$ 36,403				15.00	$ 546,045.00	$ 546,045.00			$546,045.00	8.00	$ 291,224.00	23.00	$ 837,269.00	0.00	$ 0.00	23.00	$ 837,269.00
1.7	Desmonte de luminarias. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 35,254	65.00	$ 2,291,510	$ 2,291,510			$ 2,291,510.00			$2,291,510.00	13.00	$ 458,302.00	78.00	$ 2,749,812.00	0.00	$ 0.00	78.00	$ 2,749,812.00
1.8	Desmonte y retiro de mueble bajo en madera H hasta 1.20 m de altura. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 37,548	32.52	$ 1,221,061	$ 1,221,061	8.57	$ 321,786.36	$ 1,542,847.32			$1,542,847.32			41.09	$ 1,542,847.32	0.00	$ 0.00	41.09	$ 1,542,847.32
1.9	Desmonte y retiro de bibliotecas en madera medidas aprox 2,5 m x1,63 m . (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 121,586	6.00	$ 729,516	$ 729,516	1.00	$ 121,586.00	$ 851,102.00	1.00	$ 121,586	$972,688.00			8.00	$ 972,688.00	0.00	$ 0.00	8.00	$ 972,688.00
1.10	Desmonte de revestimiento en madera sobre muro H hasta 1.20 m. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 28,517	21.30	$ 607,412	$ 607,412	45.23	$ 1,289,823.91	$ 1,897,236.01			$1,897,236.01			66.53	$ 1,897,236.01	0.00	$ 0.00	66.53	$ 1,897,236.01
1.12	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye Tubería trasiego y di	UN	$ 29,965							102.00	$ 3,056,430	$3,056,430.00			102.00	$ 3,056,430.00	0.00	$ 0.00	102.00	$ 3,056,430.00
1.13	Desmonte Cable UTP Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 1,655							1,564.50	$ 2,589,247.50	$2,589,247.50			1564.50	$ 2,589,247.50	0.00	$ 0.00	1564.50	$ 2,589,247.50
1.15	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final	M2	$ 31,067	408.50	$ 12,690,870	##########	144.83	$ 4,499,433.61	$ 17,190,303.11			$17,190,303.11	39.41	$ 1,224,236	592.74	$ 18,414,538.63	0.00	$ 0	592.74	$ 18,414,538.63
1.16	Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección >= 0,70 X 0,35 M. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 48,556				80.62	$ 3,914,584.72	$ 3,914,584.72			$3,914,584.72			80.62	$ 3,914,584.72	0.00	$ 0.00	80.62	$ 3,914,584.72
8.	ESTUCO Y PINTURA																			
8.1	Suministro y aplicación de Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 18,450										127.62	$ 2,354,555.79	127.62	$ 2,354,555.79	0.00	$ 0.00	127.62	$ 2,354,555.79
17	INSTALACIONES ELECTRICAS																			
17.4	Suministro, transporte e instalación de salida para iluminación 110 v, incluye caja octogonal, caja rectangular, interruptor sencillo, conectores 3M, 3 mts de cable Cu 3x12	UN	$ 159,473										110.00	$ 17,542,030.00	110.00	$ 17,542,030.00	0.00	$ 0.00	110.00	$ 17,542,030.00
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 17,540,368.56**			**$ 14,663,831.30**	**$ 32,204,199.86**		**$ 5,767,263.50**	**$ 37,971,463.36**		**$ 21,870,347.31**		**$ 59,841,810.67**		**$ 0.00**		**$ 59,841,810.67**
	ADMINISTRACIÓN	20%			**$ 3,508,073.71**			**$ 2,932,766.26**	**$ 6,440,839.97**		**$ 1,153,452.70**	**$ 7,594,292.67**		**$ 4,374,069.46**		**$ 11,968,362.00**		**$ 0.00**		**$ 11,968,362.00**
	IMPREVISTOS	1%			**$ 175,403.69**			**$ 146,638.31**	**$ 322,042.00**		**$ 57,672.64**	**$ 379,714.63**		**$ 218,703.47**		**$ 598,418.00**		**$ 0.00**		**$ 598,418.00**
	UTILIDAD	5%			**$ 877,018.43**			**$ 733,191.57**	**$ 1,610,209.99**		**$ 288,363.18**	**$ 1,898,573.17**		**$ 1,093,517.37**		**$ 2,992,091.00**		**$ 0.00**		**$ 2,992,091.00**
	TOTAL AIU	26%			**$ 4,560,495.83**			**$ 3,812,596.14**	**$ 8,373,091.96**		**$ 1,499,488.51**	**$ 9,872,580.47**		**$ 5,686,290.30**		**$ 15,558,871.00**		**$ 0.00**		**$ 15,558,871.00**
	IVA SOBRE UTILIDAD	19%			**$ 166,633.50**			**$ 139,306.40**	**$ 305,939.90**		**$ 54,789.00**	**$ 360,728.90**		**$ 207,768.30**		**$ 568,497.29**		**$ 0.00**		**$ 568,497.29**
	COSTO TOTAL DE OBRA				**$ 22,267,497.89**			**$ 18,615,733.84**	**$ 40,883,231.72**		**$ 7,321,541.01**	**$ 48,204,772.74**		**$ 27,764,405.91**		**$ 75,969,178.96**		**$ 0.00**		**$ 75,969,178.96**

Porcentaje obra Ejecutado	3.92%

AleXander Ramirez Marquez
Ing. Residente de Obra, Consorcio Ifraestructura A&v

Ingeniero Residente Interventoria

JENCY JULIANA MARTINEZ OVALLE

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	M
ITEM:	1.1. Suministro e instalacion de Cerramiento provisional en polisombra. Incluye postes cada 1.5, puertas y accesorios	**CANTIDAD:**	7.50

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LARGO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Suministro e instalacion de Cerramiento provisional en polisombra área de acoipo de escombros	2.50	3.00				M	7.50
Aproxima Resultado a :				2 Decimales		**TOTAL**	**7.50**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	M2
ITEM:	1.2. Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	200.61

AREA O LUGAR	LARGO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Área administrativa	87.22	2.30				M2	200.61
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			TOTAL	200.61



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	UND
ITEM:	1.4. Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	23.00

AREA O LUGAR	LARGO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Área zona Administrativa					15.00	UND	15.00
Área zona Administrativa (pta director)					1.00	UND	1.00
Área zona consejo seccional					5.00	UND	5.00
Área zona recepción					2.00	UND	2.00
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			TOTAL	23.00



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	UND
ITEM:	1.7. Desmonte de luminarias. (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	78.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Desmonte de luminarias. (Zona Administrativa)					65.00	UN	65.00
Desmonte de luminarias. (Zona Recepción)					4.00	UN	4.00
Desmonte de luminarias. (Zona Consejo Superior))					9.00	UN	9.00
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			**TOTAL**	**78.00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	M
ITEM:	1.8. Desmonte y retiro de mueble bajo en madera H hasta 1.20 m de altura. (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	41.09

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Desmonte y retiro de mueble bajo en madera H hasta 1.20 m de altura. (Admon)	32.52	1.00				M	32.52
Desmonte y retiro de mueble bajo en madera H hasta 1.20 m de altura. (Consejo seccional)	2.10	1.00				M	2.10
Desmonte y retiro de mueble bajo en madera H hasta 1.20 m de altura. (Consejo seccional)	6.47	1.00				M	6.47
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**41.09**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	UND
ITEM:	1.9. Desmonte y retiro de bibliotecas en madera medidas aprox 2,5 m x1,63 m . (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	8.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Desmonte y retiro de bibliotecas en madera medidas aprox 2,5 m x1,63 m . (Admon)					6.00	UND	6.00
Desmonte y retiro de bibliotecas en madera medidas aprox 2,5 m x1,63 m . (Admon)					1.00	UND	1.00
Desmonte y retiro de bibliotecas en madera medidas aprox 2,5 m x1,63 m . (Consejo seccional)					1.00	UND	1.00
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**8.00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	M
ITEM:	1.10. Desmonte de revestimiento en madera sobre muro H hasta 1.20 m. (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	66.53

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Desmonte de revestimiento en madera sobre muro H hasta 1.20 m. (Admon)	21.30	1.00				M	21.30
Desmonte de revestimiento en madera sobre muro H hasta 1.20 m. (Consejo seccional)	45.23	1.00				M	45.23
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**66.53**





OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	UND
ITEM:	1.12. Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye Tubería trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	102.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Oficinas administrativas rama (Puntos regulados)					45.00	UND	45.00
Oficinas administrativas rama (Puntos no regulados)					45.00	UND	45.00
Oficinas administrativas rama (Puntos normales)					12.00	UND	12.00
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**102.00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	M
ITEM:	1.13. Desmonte Cable UTP Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	1,564.50

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Oficinas administrativas rama judicial	1,564.50					M	1,564.50
Aproxima Resultado a :						TOTAL	1,564.50





OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	M2
ITEM:	1.15. Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	592.74

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Area Recepcion(Baños hombre)	2.02	1.93				M2	3.90
Area Recepcion(Baños hombre)	0.90	0.97				M2	0.87
Area Recepcion(Baños mujeres)	2.53	3.13				M2	7.92
Area Recepción	9.17	4.64				M2	42.55
Area Recepción	1.73	2.34				M2	4.05
Area Recepción	2.30	2.50				M2	5.75
Area Recepción	1.90	2.25				M2	4.28
Pasillo consejo seccional)	4.10	2.40				M2	9.84
Pasillo consejo seccional)	2.96	3.46				M2	10.24
Pasillo consejo seccional)	1.10	3.10				M2	3.41
Pasillo consejo seccional)	10.25	2.48				M2	25.42
Consejo seccional (oficina presidente consejo)	4.50	1.45				M2	6.53
Consejo seccional (oficina presidente consejo)	2.38	0.92				M2	2.19
Consejo seccional (oficina presidente consejo)	1.32	0.95				M2	1.25
Consejo seccional (oficina presidente consejo)	1.50	1.90				M2	2.85
Consejo seccional (oficina secretaria presidente)	3.74	2.64				M2	9.87
Consejo seccional (baño oficina ipresidente)	1.83	2.14				M2	3.92
Vicepresidencia consejo superior	4.90	1.47				M2	7.20
Vicepresidencia consejo superior	4.37	4.70				M2	20.54
Vicepresidencia consejo superior	4.10	0.74				M2	3.03
Vicepresidencia consejo superior, baño	1.29	0.86				M2	1.11
Vicepresidencia consejo superior, baño	2.02	1.10				M2	2.22
Sala de juntas , Consejo seccional	6.54	3.61				M2	23.61
Area Admon,(of.director)	6.32	5.10				M2	32.23
Area Admon,(baño de of.director)	2.22	1.72				M2	3.82
Area Admon,(secretaria de of.director)	3.33	6.25				M2	20.81
Area Admon,(oficina 1)	5.44	7.04				M2	38.30
Area Admon,(gestion humana)	9.44	7.04				M2	66.46
Area Admon,(gestion humana archivo)	2.89	1.40				M2	4.05
Area Admon,(gestion humana archivo)	5.12	3.68				M2	18.84
Area Admon,(oficina 3)	4.59	6.28				M2	28.83
Area Admon,(oficina 3, coordinación)	3.32	3.70				M2	12.28
Area Admon,(secretaria consejo inluye baño)	8.30	3.76				M2	31.21
Area Admon,(Oficina 4)	6.78	6.52				M2	44.21
Area Admon,(Oficina 4)	2.60	3.31				M2	8.61
Area Admon,(Oficina 2)	3.77	6.52				M2	24.58
Area Admon,(pasillos)	1.10	3.70				M2	4.07
Area Admon,(pasillos)	1.50	16.98				M2	25.47
Area Admon,(pasillos)	2.67	5.40				M2	14.42
Area Admon,(pasillos)	1.85	0.90				M2	1.67
Area Admon,(pasillos)	2.67	2.43				M2	6.49
Area Admon,(cabina recepciòn)	1.98	1.95				M2	3.86
Aproxima Resultado a :						TOTAL	592.74





OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	M
ITEM:	1.16. Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección >= 0,70 X 0,35 M. (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	80.62

AREA O LUGAR	LARGO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Desmonte aires acondicionados	67.87					M	67.87
Desmonte aires acondicionados(seccional)	12.75						12.75
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			TOTAL	80.62



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ESTUCO Y PINTURA	UNIDAD:	M2
ITEM:	8.1 Suministro y aplicación de Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	CANTIDAD:	127.62

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	ÀREA PARCIAL	ÁREA	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Oficinas Admón	3.06	2.30	0.49	6.55	6.55		M2	6.55
	2.70	2.30	0.76	5.45	5.45		M2	5.45
	2.23	2.30			5.13		M2	5.13
	0.96	3.40			3.26		M2	3.26
	0.37	2.30			0.85		M2	0.85
	3.87	2.30	1.00	7.90	7.90		M2	7.90
	2.80	1.55			4.34		M2	4.34
	0.90	0.80			0.72	15.00	M2	10.80
	0.95	1.80			1.71		M2	1.71
	0.95	0.60			0.57		M2	0.57
	0.95	2.73			2.59		M2	2.59
	2.30	0.63			1.45		M2	1.45
	0.95	2.50			2.38		M2	2.38
	0.95	1.80			1.71		M2	1.71
	0.50	0.50			0.25		M2	0.25
	2.30	2.35			5.41		M2	5.41
	1.25	1.60			2.00		M2	2.00
	2.10	0.10			0.21		M2	0.21
	0.95	3.40			3.23		M2	3.23
	3.08	2.30			7.08		M2	7.08
	0.80	2.30			1.84		M2	1.84
	1.10	2.30			2.53		M2	2.53
	0.72	2.30			1.66		M2	1.66
	0.67	1.60			1.07		M2	1.07
	0.10	1.10			0.11		M2	0.11
	0.20	0.60			0.12		M2	0.12
	0.30	0.20			0.06		M2	0.06
	0.80	2.17			1.74	5.00	M2	8.68
	0.58	2.17			1.26	5.00	M2	6.29
	0.17	2.30			0.39	5.00	M2	1.96
	0.13	2.05			0.27	5.00	M2	1.33
	1.00	0.14			0.14	5.00	M2	0.70
	2.50	0.95			2.38		M2	2.38
	0.92	1.00			0.92		M2	0.92
	0.69	2.50			1.73		M2	1.73
	0.92	1.10			1.01		M2	1.01
	0.95	1.10			1.05		M2	1.05
Área Seccional	0.13	2.28			0.30		M2	0.30
	3.00	1.03			3.09		M2	3.09
	1.34	2.30			3.08		M2	3.08
	0.56	1.00			0.56		M2	0.56
	1.10	2.30			2.53		M2	2.53
	1.30	1.00			1.30		M2	1.30
	1.00	1.00			1.00		M2	1.00
	0.98	0.90			0.88		M2	0.88
	0.98	2.13			2.09	2.00	M2	4.17
	0.55	2.13			1.17		M2	1.17
Área Recepción	1.00	0.10			0.10		M2	0.10
	2.05	0.10			0.21		M2	0.21
	0.83	2.05			1.70		M2	1.70
	0.60	2.05			1.23		M2	1.23
Aproxima Resultado a :							TOTAL	127.62



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**UNIDAD:**	UND
ITEM:	17.4 Suministro, transporte e instalación de salida para iluminación 110 v, incluye caja octogonal, caja rectangular, interruptor sencillo, c	**CANTIDAD:**	110.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Oficinas seccional					27.00	Und	27.00
Oficinas administrativas					75.00	Und	75.00
Área Recepción					8.00	Und	8.00
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**110.00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTROL DEL PERSONAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	CONTRATO No	BGA-044-2024

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL

MES / OCTUBRE	DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total Jornales
NOMBRE	CARGO	Total personal por dias																														
ANDRES VARGAS	Maestro de obra	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
JUAN DAVID VARGAS	Auxiliar de obra	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
DENIL DUVAN VEGA MESA	Auxiliar de obra	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	24
CARLOS PEÑUELA	Auxiliar de obra	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
JUAN VARGAS	Auxiliar de obra	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
LUIS CELIS	Auxiliar de obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	7
YEFERSON CLEMENTE	Auxiliar de obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	9
OMAR ARIAS	Auxiliar de obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
LEONARDO HERRERA	Tecnico Electricista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
ARLEY URREA ORTIZ	Tecnico Electricista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
ALEXANDER NOGUERA GUTIERREZ	Auxiliar Electrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
ALEXANDER RAMIREZ	Ingeniero residente	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	26
VIVIANA RAMIREZ	Siso	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	24
TOTAL		1	2	7	7	7	0	6	6	6	7	8	7	0	7	7	7	7	7	8	1	7	7	7	7	7	7	4	8	8	8	178

Observaciones:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA

INFORME SEMANAL — No . 6

CONTRATO No: BGA-044-2024
CONTRATISTA : CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
NIT 901863382-1

REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR

FECHA INICIO: 27/09/2024
FECHA FIN: 27/12/2024
VALOR CONTRATO (Incluye iva) $ 1,940,000,000
ADICIÓN: N/A

OBJETO:

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	SEMANA 1 DEL 30 SEPTIEMBRE	SEMANA 3 DEL 14 OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE			SEMANA 4 DEL 21 OCTUBRE AL 26 DE OCTUBRE				SEMANA 5 DEL 28 OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE				SEMANA 6 DEL 4 NOVIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE			
			VALOR UNT.	CANT EJECUT	TOTAL	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMUL	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 5,767,264	$ 37,971,463		$ 1,973,762		$ 39,945,225		$ 0		$ 39,945,225		$ 0		$ 39,945,225
1.1	Suministro e instalacion de Cerramiento provisional en polisombra. Incluye postes cada 1.5, puertas y accesorios	M	$ 15,313			$114,847.50			7.50	$ 114,847.50			7.50	$ 114,847.50			7.50	$ 114,847.50
1.2	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 19,220			$3,855,724.20			200.61	$ 3,855,724.20			200.61	$ 3,855,724.20			200.61	$ 3,855,724.20
1.4	Desmonte de puertas en madera	UND	$ 36,403			$546,045.00	8.00	$ 291,224.00	23.00	$ 837,269.00			23.00	$ 837,269.00			23.00	$ 837,269.00
1.7	Desmonte de luminarias. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 35,254			$2,291,510.00	13.00	$ 458,302.00	78.00	$ 2,749,812.00			78.00	$ 2,749,812.00			78.00	$ 2,749,812.00
1.8	Desmonte y retiro de mueble bajo en madera H hasta 1.20 m de altura. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 37,548			$1,542,847.32			41.09	$ 1,542,847.32			41.09	$ 1,542,847.32			41.09	$ 1,542,847.32
1.9	Desmonte y retiro de bibliotecas en madera medidas aprox 2,5 m x1,63 m . (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 121,586	1.00	$ 121,586	$972,688.00			8.00	$ 972,688.00			8.00	$ 972,688.00			8.00	$ 972,688.00
1.10	Desmonte de revestimiento en madera sobre muro H hasta 1.20 m. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 28,517			$1,897,236.01			66.53	$ 1,897,236.01			66.53	$ 1,897,236.01			66.53	$ 1,897,236.01
1.12	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye Tubería trasiego y disp	UN	$ 29,965	102.00	$ 3,056,430	$3,056,430.00			102.00	$ 3,056,430.00			102.00	$ 3,056,430.00			102.00	$ 3,056,430.00
1.13	Desmonte Cable UTP Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 1,655	1,564.50	$ 2,589,247.50	$2,589,247.50			1564.50	$ 2,589,247.50			1564.50	$ 2,589,247.50			1564.50	$ 2,589,247.50
1.15	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 31,067			$17,190,303.11	39.41	$ 1,224,236	592.74	$ 18,414,538.63			592.74	$ 18,414,538.63			592.74	$ 18,414,538.63
1.16	Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección >= 0,70 X 0,35 M. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 48,556			$3,914,584.72			80.62	$ 3,914,584.72			80.62	$ 3,914,584.72			80.62	$ 3,914,584.72
4	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO				$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 402,365.83		$ 402,365.83
4.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	$ 129,793												2.31	$ 299,821.83	2.31	$ 299,821.83
4.2	Division para mueble en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<80 cm, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos,	M	$ 120,640												0.85	$ 102,544.00	0.85	$ 102,544.00
8.	ESTUCO Y PINTURA				$ 0	$ 0		$ 2,354,556		$ 2,354,556		$ 0		$ 2,354,556		$ 0		$ 2,354,556
8.1	Suministro y aplicación de Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 18,450				127.62	$ 2,354,555.79	127.62	$ 2,354,555.79			127.62	$ 2,354,555.79			127.62	$ 2,354,555.79
17	INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 0	$ 0		$ 1,966,800		$ 17,542,030		$ 0		$ 17,542,030		$ 2,685,578		$ 20,227,608
17.4	Suministro, transporte e instalación de salida para iluminación 110 v, incluye caja octogonal, caja rectangular, interruptor sencillo, conectores 3M, 3 mts de cable Cu 3x12 THWNN LSZH, 3 mts de ducto conduit sch 40 Ø 1/2", clavija aerea tipo hembra 15 A, clavija aerea tipo macho 15 A, 1 mt de cable encauchetado 3x14 AWG	UN	$ 159,473				110.00	$ 1,966,800.00	110.00	$ 17,542,030.00			110.00	$ 17,542,030.00			110.00	$ 17,542,030.00
17.12	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 3/4" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M	$ 16,141												108.00	$1,743,228.00	108.00	$1,743,228.00
17.13	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 1" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M	$ 18,847												50.00	$942,350.00	50.00	$942,350.00
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 5,767,263.50**	**$ 37,971,463.36**		**$ 21,870,347.31**		**$ 59,841,810.67**		**$ 0.00**		**$ 59,841,810.67**		**$ 3,087,943.83**		**$ 62,929,754.50**
	ADMINISTRACIÓN	20%			**$ 1,153,452.70**	**$ 7,594,292.67**		**$ 4,374,069.46**		**$ 11,968,362.00**		**$ 0.00**		**$ 11,968,362.00**		**$ 617,589.00**		**$ 12,585,951.00**
	IMPREVISTOS	1%			**$ 57,672.64**	**$ 379,714.63**		**$ 218,703.47**		**$ 598,418.00**		**$ 0.00**		**$ 598,418.00**		**$ 30,879.00**		**$ 629,298.00**
	UTILIDAD	5%			**$ 288,363.18**	**$ 1,898,573.17**		**$ 1,093,517.37**		**$ 2,992,091.00**		**$ 0.00**		**$ 2,992,091.00**		**$ 154,397.00**		**$ 3,146,488.00**
	TOTAL AIU	26%			**$ 1,499,488.51**	**$ 9,872,580.47**		**$ 5,686,290.30**		**$ 15,558,871.00**		**$ 0.00**		**$ 15,558,871.00**		**$ 802,865.00**		**$ 16,361,736.00**
	IVA SOBRE UTILIDAD	19%			**$ 54,789.00**	**$ 360,728.90**		**$ 207,768.30**		**$ 568,497.29**		**$ 0.00**		**$ 568,497.29**		**$ 29,335.43**		**$ 597,832.72**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA

INFORME SEMANAL — No . 6

CONTRATO No: BGA-044-2024
CONTRATISTA : CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
NIT 901863382-1
REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR

FECHA INICIO: 27/09/2024
FECHA FIN: 27/12/2024
VALOR CONTRATO (Incluye iva) $ 1,940,000,000
ADICIÓN: N/A

OBJETO:

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	SEMANA 1 DEL 30 SEPTIEMBRE	SEMANA 3 DEL 14 OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE			SEMANA 4 DEL 21 OCTUBRE AL 26 DE OCTUBRE				SEMANA 5 DEL 28 OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE				SEMANA 6 DEL 4 NOVIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE			
			VALOR UNT.	CANT EJECUT	TOTAL	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMUL	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR
	COSTO TOTAL DE OBRA				**$ 7,321,541.01**	**$ 48,204,772.74**		**$ 27,764,405.91**		**$ 75,969,178.96**		**$ 0.00**		**$ 75,969,178.96**		**$ 3,920,144.26**		**$ 79,889,324.22**

Porcentaje obra Ejecutado	**4.12%**

AleXander Ramirez Marquez
Ing. Residente de Obra, Consorcio Ifraestructura A&v

Ingeniero Residente Interventoria
JENCY JULIANA MARTINEZ OVALLE

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	M
ITEM:	1.1. Suministro e instalacion de Cerramiento provisional en polisombra. Incluye postes cada 1.5, puertas y accesorios	**CANTIDAD:**	7.50

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LARGO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Suministro e instalacion de Cerramiento provisional en polisombra área de acoipo de escombros	2.50	3.00				M	7.50
Aproxima Resultado a :				2 Decimales		**TOTAL**	**7.50**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	M2
ITEM:	1.2. Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	200.61

AREA O LUGAR	LARGO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Área administrativa	87.22	2.30				M2	200.61
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			TOTAL	200.61



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	UND
ITEM:	1.4. Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	23.00

AREA O LUGAR	LARGO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Área zona Administrativa					15.00	UND	15.00
Área zona Administrativa (pta director)					1.00	UND	1.00
Área zona consejo seccional					5.00	UND	5.00
Área zona recepción					2.00	UND	2.00
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			TOTAL	23.00



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	UND
ITEM:	1.7. Desmonte de luminarias. (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	78.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Desmonte de luminarias. (Zona Administrativa)					65.00	UN	65.00
Desmonte de luminarias. (Zona Recepción)					4.00	UN	4.00
Desmonte de luminarias. (Zona Consejo Superior))					9.00	UN	9.00
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			**TOTAL**	**78.00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	M
ITEM:	1.8. Desmonte y retiro de mueble bajo en madera H hasta 1.20 m de altura. (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	41.09

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Desmonte y retiro de mueble bajo en madera H hasta 1.20 m de altura. (Admon)	32.52	1.00				M	32.52
Desmonte y retiro de mueble bajo en madera H hasta 1.20 m de altura. (Consejo seccional)	2.10	1.00				M	2.10
Desmonte y retiro de mueble bajo en madera H hasta 1.20 m de altura. (Consejo seccional)	6.47	1.00				M	6.47
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**41.09**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	UND
ITEM:	1.9. Desmonte y retiro de bibliotecas en madera medidas aprox 2,5 m x1,63 m . (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	8.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Desmonte y retiro de bibliotecas en madera medidas aprox 2,5 m x1,63 m . (Admon)					6.00	UND	6.00
Desmonte y retiro de bibliotecas en madera medidas aprox 2,5 m x1,63 m . (Admon)					1.00	UND	1.00
Desmonte y retiro de bibliotecas en madera medidas aprox 2,5 m x1,63 m . (Consejo seccional)					1.00	UND	1.00
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**8.00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	M
ITEM:	1.10. Desmonte de revestimiento en madera sobre muro H hasta 1.20 m. (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	66.53

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Desmonte de revestimiento en madera sobre muro H hasta 1.20 m. (Admon)	21.30	1.00				M	21.30
Desmonte de revestimiento en madera sobre muro H hasta 1.20 m. (Consejo seccional)	45.23	1.00				M	45.23
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**66.53**





OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	UND
ITEM:	1.12. Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye Tubería trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	102.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Oficinas administrativas rama (Puntos regulados)					45.00	UND	45.00
Oficinas administrativas rama (Puntos no regulados)					45.00	UND	45.00
Oficinas administrativas rama (Puntos normales)					12.00	UND	12.00
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**102.00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	M
ITEM:	1.13. Desmonte Cable UTP Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	1,564.50

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Oficinas administrativas rama judicial	1,564.50					M	1,564.50
Aproxima Resultado a :						TOTAL	1,564.50





OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	M2
ITEM:	1.15. Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	592.74

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Area Recepcion(Baños hombre)	2.02	1.93				M2	3.90
Area Recepcion(Baños hombre)	0.90	0.97				M2	0.87
Area Recepcion(Baños mujeres)	2.53	3.13				M2	7.92
Area Recepción	9.17	4.64				M2	42.55
Area Recepción	1.73	2.34				M2	4.05
Area Recepción	2.30	2.50				M2	5.75
Area Recepción	1.90	2.25				M2	4.28
Pasillo consejo seccional)	4.10	2.40				M2	9.84
Pasillo consejo seccional)	2.96	3.46				M2	10.24
Pasillo consejo seccional)	1.10	3.10				M2	3.41
Pasillo consejo seccional)	10.25	2.48				M2	25.42
Consejo seccional (oficina presidente consejo)	4.50	1.45				M2	6.53
Consejo seccional (oficina presidente consejo)	2.38	0.92				M2	2.19
Consejo seccional (oficina presidente consejo)	1.32	0.95				M2	1.25
Consejo seccional (oficina presidente consejo)	1.50	1.90				M2	2.85
Consejo seccional (oficina secretaria presidente)	3.74	2.64				M2	9.87
Consejo seccional (baño oficina ipresidente)	1.83	2.14				M2	3.92
Vicepresidencia consejo superior	4.90	1.47				M2	7.20
Vicepresidencia consejo superior	4.37	4.70				M2	20.54
Vicepresidencia consejo superior	4.10	0.74				M2	3.03
Vicepresidencia consejo superior, baño	1.29	0.86				M2	1.11
Vicepresidencia consejo superior, baño	2.02	1.10				M2	2.22
Sala de juntas , Consejo seccional	6.54	3.61				M2	23.61
Area Admon,(of.director)	6.32	5.10				M2	32.23
Area Admon,(baño de of.director)	2.22	1.72				M2	3.82
Area Admon,(secretaria de of.director)	3.33	6.25				M2	20.81
Area Admon,(oficina 1)	5.44	7.04				M2	38.30
Area Admon,(gestion humana)	9.44	7.04				M2	66.46
Area Admon,(gestion humana archivo)	2.89	1.40				M2	4.05
Area Admon,(gestion humana archivo)	5.12	3.68				M2	18.84
Area Admon,(oficina 3)	4.59	6.28				M2	28.83
Area Admon,(oficina 3, coordinación)	3.32	3.70				M2	12.28
Area Admon,(secretaria consejo inluye baño)	8.30	3.76				M2	31.21
Area Admon,(Oficina 4)	6.78	6.52				M2	44.21
Area Admon,(Oficina 4)	2.60	3.31				M2	8.61
Area Admon,(Oficina 2)	3.77	6.52				M2	24.58
Area Admon,(pasillos)	1.10	3.70				M2	4.07
Area Admon,(pasillos)	1.50	16.98				M2	25.47
Area Admon,(pasillos)	2.67	5.40				M2	14.42
Area Admon,(pasillos)	1.85	0.90				M2	1.67
Area Admon,(pasillos)	2.67	2.43				M2	6.49
Area Admon,(cabina recepciòn)	1.98	1.95				M2	3.86
Aproxima Resultado a :						TOTAL	592.74





OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	M
ITEM:	1.16. Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección >= 0,70 X 0,35 M. (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	80.62

AREA O LUGAR	LARGO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Desmonte aires acondicionados	67.87					M	67.87
Desmonte aires acondicionados(seccional)	12.75						12.75
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			TOTAL	80.62



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO	UNIDAD:	M2
ITEM:	4.1 Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministr	CANTIDAD:	2.31

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	ÀREA PARCIAL	ÁREA	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Oficinas Admon , (Ofi. Director)	1.10	2.10		2.31	2.31		M2	2.31
					-			-
					-			-
					-			-
					-			-
Aproxima Resultado a :							TOTAL	2.31

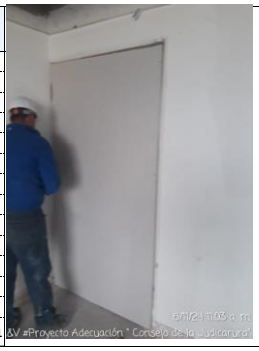

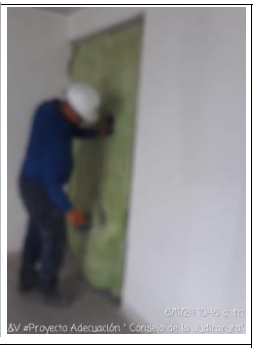

OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO	**UNIDAD:**	M
ITEM:	Division para mueble en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<80 cm, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Ir	**CANTIDAD:**	0.85

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	ÀREA PARCIAL	ÁREA	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFICINA DE SECRETARIA DIRECTOR	0.85			-	-		m	0.85
				-	-			
					-			-
					-			-
					-			-
					-			-
					-			-
					-			-
					-			-
Aproxima Resultado a :				2			TOTAL	0.85





OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ESTUCO Y PINTURA	UNIDAD:	M2
ITEM:	8.1 Suministro y aplicación de Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	CANTIDAD:	127.62

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	ÀREA PARCIAL	ÁREA	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Oficinas Admón	3.06	2.30	0.49	6.55	6.55		M2	6.55
	2.70	2.30	0.76	5.45	5.45		M2	5.45
	2.23	2.30			5.13		M2	5.13
	0.96	3.40			3.26		M2	3.26
	0.37	2.30			0.85		M2	0.85
	3.87	2.30	1.00	7.90	7.90		M2	7.90
	2.80	1.55			4.34		M2	4.34
	0.90	0.80			0.72	15.00	M2	10.80
	0.95	1.80			1.71		M2	1.71
	0.95	0.60			0.57		M2	0.57
	0.95	2.73			2.59		M2	2.59
	2.30	0.63			1.45		M2	1.45
	0.95	2.50			2.38		M2	2.38
	0.95	1.80			1.71		M2	1.71
	0.50	0.50			0.25		M2	0.25
	2.30	2.35			5.41		M2	5.41
	1.25	1.60			2.00		M2	2.00
	2.10	0.10			0.21		M2	0.21
	0.95	3.40			3.23		M2	3.23
	3.08	2.30			7.08		M2	7.08
	0.80	2.30			1.84		M2	1.84
	1.10	2.30			2.53		M2	2.53
	0.72	2.30			1.66		M2	1.66
	0.67	1.60			1.07		M2	1.07
	0.10	1.10			0.11		M2	0.11
	0.20	0.60			0.12		M2	0.12
	0.30	0.20			0.06		M2	0.06
	0.80	2.17			1.74	5.00	M2	8.68
	0.58	2.17			1.26	5.00	M2	6.29
	0.17	2.30			0.39	5.00	M2	1.96
	0.13	2.05			0.27	5.00	M2	1.33
	1.00	0.14			0.14	5.00	M2	0.70
	2.50	0.95			2.38		M2	2.38
	0.92	1.00			0.92		M2	0.92
	0.69	2.50			1.73		M2	1.73
	0.92	1.10			1.01		M2	1.01
	0.95	1.10			1.05		M2	1.05
Área Seccional	0.13	2.28			0.30		M2	0.30
	3.00	1.03			3.09		M2	3.09
	1.34	2.30			3.08		M2	3.08
	0.56	1.00			0.56		M2	0.56
	1.10	2.30			2.53		M2	2.53
	1.30	1.00			1.30		M2	1.30
	1.00	1.00			1.00		M2	1.00
	0.98	0.90			0.88		M2	0.88
	0.98	2.13			2.09	2.00	M2	4.17
	0.55	2.13			1.17		M2	1.17
Área Recepción	1.00	0.10			0.10		M2	0.10
	2.05	0.10			0.21		M2	0.21
	0.83	2.05			1.70		M2	1.70
	0.60	2.05			1.23		M2	1.23
Aproxima Resultado a :							TOTAL	127.62



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**UNIDAD:**	UND
ITEM:	17.4 Suministro, transporte e instalación de salida para iluminación 110 v, incluye caja octogonal, caja rectangular, interruptor sencillo, c	**CANTIDAD:**	110.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Oficinas seccional					27.00	UND	27.00
Oficinas administrativas					75.00	UND	75.00
Área Recepción					8.00	UND	8.00
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**110.00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**UNIDAD:**	M
ITEM:	17.12 Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 3/4" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, sc	**CANTIDAD:**	108.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LONGITUD	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFINAS DMON RAMA JUDIACIAL		72.90				ML	72.90
OFICINAS DE MAGISTRADOS		29.30				ML	29.30
RECEPCION		5.80				ML	5.80
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**108.00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**UNIDAD:**	M
ITEM:	17.13Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 1" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador,	**CANTIDAD:**	50.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LONG	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFINAS DMON RAMA JUDIACIAL		35.70				ML	35.70
OFICINAS DE MAGISTRADOS		8.50				ML	8.50
RECEPCION		5.80				ML	5.80
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**50.00**



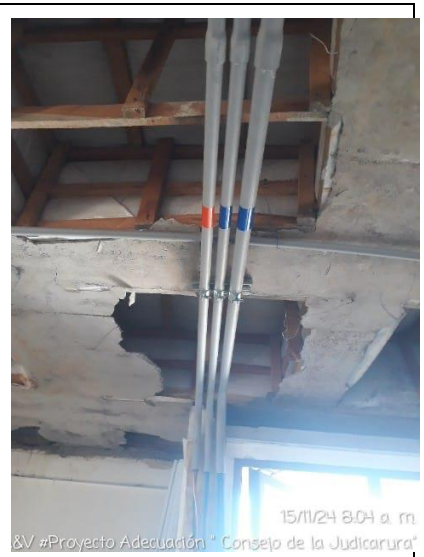

OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA

INFORME SEMANAL **No . 7**

CONTRATO No: BGA-044-2024
CONTRATISTA : CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V 27/09/2024
NIT 901863382-1 27/12/2024

REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR $ 1.940.000.000

N/A

OBJETO:

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	SEMANA 5 DEL 28 OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE				SEMANA 6 DEL 4 NOVIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE				SEMANA 7 DEL 11 NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE			
			CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**			**$ 0,00**		**$ 39.945.224,88**		**$ 0,00**		**$ 39.945.224,88**		**$ 33.566,00**		**$ 39.978.790,88**
1,1	Suministro e instalacion de Cerramiento provisional en polisombra. Incluye postes cada 1.5, puertas y accesorios	M			7,50	$ 114.847,50			7,50	$ 114.847,50			7,50	$ 114.847,50
1,2	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2			200,61	$ 3.855.724,20			200,61	$ 3.855.724,20			200,61	$ 3.855.724,20
1,3	Desmonte de sanitarios (Incluye trasiego y disposición final)	UND									1,00	$ 33.566,00	1,00	$ 33.566,00
1,4	Desmonte de puertas en madera	UND			23,00	$ 837.269,00			23,00	$ 837.269,00			23,00	$ 837.269,00
1.7	Desmonte de luminarias. (Incluye trasiego y disposición final)	UN			78,00	$ 2.749.812,00			78,00	$ 2.749.812,00			78,00	$ 2.749.812,00
1.8	Desmonte y retiro de mueble bajo en madera H hasta 1.20 m de altura. (Incluye trasiego y disposición final)	M			41,09	$ 1.542.847,32			41,09	$ 1.542.847,32			41,09	$ 1.542.847,32
1.9	Desmonte y retiro de bibliotecas en madera medidas aprox 2,5 m x1,63 m . (Incluye trasiego y disposición final)	UN			8,00	$ 972.688,00			8,00	$ 972.688,00			8,00	$ 972.688,00
1.10	Desmonte de revestimiento en madera sobre muro H hasta 1.20 m. (Incluye trasiego y disposición final)	M			66,53	$ 1.897.236,01			66,53	$ 1.897.236,01			66,53	$ 1.897.236,01
1.12	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye Tubería trasiego y disposición final)	UN			102,00	$ 3.056.430,00			102,00	$ 3.056.430,00			102,00	$ 3.056.430,00
1.13	Desmonte Cable UTP Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	M			1564,50	$ 2.589.247,50			1564,50	$ 2.589.247,50			1564,50	$ 2.589.247,50
1.15	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2			592,74	$ 18.414.538,63			592,74	$ 18.414.538,63			592,74	$ 18.414.538,63
1.16	Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección >= 0,70 X 0,35 M. (Incluye trasiego y disposición final)	M			80,62	$ 3.914.584,72			80,62	$ 3.914.584,72			80,62	$ 3.914.584,72
4	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**			**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 402.365,83**		**$ 402.365,83**		**$ 0,00**		**$ 402.365,83**
4.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2					2,31	$ 299.821,83	2,31	$ 299.821,83			2,31	$ 299.821,83
4.2	Division para mueble en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<80 cm, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M					0,85	$ 102.544,00	0,85	$ 102.544,00			0,85	$ 102.544,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA

INFORME SEMANAL **No . 7**

CONTRATO No: BGA-044-2024
CONTRATISTA : CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V 27/09/2024
NIT 901863382-1 27/12/2024

REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR $ 1.940.000.000

N/A

OBJETO:

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	SEMANA 5 DEL 28 OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE				SEMANA 6 DEL 4 NOVIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE				SEMANA 7 DEL 11 NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE			
			CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR
8.	**ESTUCO Y PINTURA**			$ 0,00		**$ 2.354.555,79**		$ 0,00		**$ 2.354.555,79**		$ 0,00		**$ 2.354.555,79**
8.1	Suministro y aplicación de Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2			127,62	$ 2.354.555,79			127,62	$ 2.354.555,79			127,62	$ 2.354.555,79
14.	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		**$ 45.126,00**		**$ 45.126,00**
14.1	Reinstalación Sanitarios existentes.	UN									1,00	$ 45.126,00	1,00	$ 45.126,00
16.	**INSTALACIONES SANITARIAS**			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		**$ 530.625,60**		**$ 530.625,60**
16.1	Mantenimiento de la red sanitaria , incluye revision y destape con sonda .	M									14,40	$ 530.625,60	14,40	$ 530.625,60
17	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			$ 0,00		**$ 17.542.030,00**		**$ 2.685.578,00**		**$ 20.227.608,00**		**$ 25.572.616,71**		**$ 45.800.224,71**
17,4	Suministro, transporte e instalación de salida para iluminación 110 v, incluye caja octogonal, caja rectangular, interruptor sencillo, conectores 3M, 3 mts de cable Cu 3x12 THWNN LSZH, 3 mts de ducto conduit sch 40 Ø 1/2", clavija aerea tipo hembra 15 A, clavija aerea tipo macho 15 A, 1 mt de cable encauchetado 3x14 AWG THWN LSZH	UN			110,00	$ 17.542.030,00			110,00	$ 17.542.030,00			110,00	$ 17.542.030,00
17,9	Suministro, transporte e instalación de Canaleta metalica 12x5 cm, en pintura electrostatica blanca, con separador, incluye: elementos de fijación y soporte	M									124,09	$12.175.586,71	124,09	$12.175.586,71
17.1O	Suministro, transporte e instalación de Red de cable 3x 12 AWG THWNN LSZH	M									830,00	$13.397.030,00	830,00	$13.397.030,00
17,12	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 3/4" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M					108,00	$1.743.228,00	108,00	$1.743.228,00			108,00	$1.743.228,00
17,13	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 1" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M					50,00	$942.350,00	50,00	$942.350,00			50,00	$942.350,00
	TOTAL COSTO DIRECTO			**$ 0,00**		**$ 59.841.810,67**		**$ 3.087.943,83**		**$ 62.929.754,50**		**$ 26.181.934,31**		**$ 89.111.688,81**
	ADMINISTRACIÓN	20%		**$ 0,00**		**$ 11.968.362,00**		**$ 617.589,00**		**$ 12.585.951,00**		**$ 5.236.387,00**		**$ 17.822.338,00**
	IMPREVISTOS	1%		**$ 0,00**		**$ 598.418,00**		**$ 30.879,00**		**$ 629.298,00**		**$ 261.819,00**		**$ 891.117,00**
	UTILIDAD	5%		**$ 0,00**		**$ 2.992.091,00**		**$ 154.397,00**		**$ 3.146.488,00**		**$ 1.309.097,00**		**$ 4.455.584,00**
	TOTAL AIU	26%		**$ 0,00**		**$ 15.558.871,00**		**$ 802.865,00**		**$ 16.361.736,00**		**$ 6.807.302,92**		**$ 23.169.039,09**
	IVA SOBRE UTILIDAD	19%		**$ 0,00**		**$ 568.497,29**		**$ 29.335,43**		**$ 597.832,72**		**$ 248.728,43**		**$ 846.560,96**
	COSTO TOTAL DE OBRA			**$ 0,00**		**$ 75.969.178,96**		**$ 3.920.144,26**		**$ 79.889.324,22**		**$ 33.237.965,74**		**$ 113.127.288,77**
	COSTO TOTAL DE OBRA + SUMINISTROS											**$ 33.237.965,74**		**$ 113.127.288,77**
	AVANCE SEMANAL (%)			**0%**				**0,20%**				**1,71%**		**5,83%**

Alexander Ramirez Marquez
Ing. Residente de Obra, Consorcio Ifraestructura A&v

Ingeniero Residente Interventoria
JENCY JULIANA MARTINEZ OVALLE

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	M
ITEM:	1.1. Suministro e instalacion de Cerramiento provisional en polisombra. Incluye postes cada 1.5, puertas y accesorios	**CANTIDAD:**	7.50

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LARGO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Suministro e instalacion de Cerramiento provisional en polisombra área de acoipo de escombros	2.50	3.00				M	7.50
Aproxima Resultado a :				2 Decimales		**TOTAL**	**7.50**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	M2
ITEM:	1.2. Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	200.61

AREA O LUGAR	LARGO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Área administrativa	87.22	2.30				M2	200.61
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			TOTAL	200.61



OBSERVACIONES:


Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	1.3 Desmonte de aparatos sanitarios. (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	1.00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES			V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)				
Oficina Seccional Judicatura					**1.00**	UN	**1.00**
Aproxima Resultado a : Decimales						**TOTAL**	**1.00**

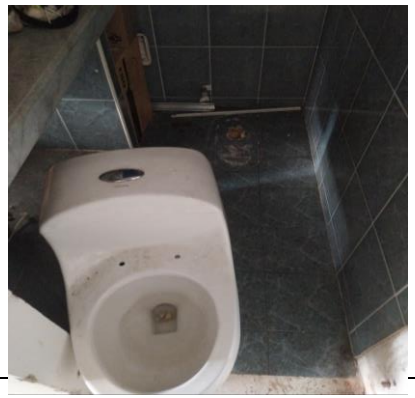

Observaciones:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	UND
ITEM:	1.4. Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	23.00

AREA O LUGAR	LARGO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Área zona Administrativa					15.00	UND	15.00
Área zona Administrativa (pta director)					1.00	UND	1.00
Área zona consejo seccional					5.00	UND	5.00
Área zona recepción					2.00	UND	2.00
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			TOTAL	23.00



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	UND
ITEM:	1.7. Desmonte de luminarias. (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	78.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Desmonte de luminarias. (Zona Administrativa)					65.00	UN	65.00
Desmonte de luminarias. (Zona Recepción)					4.00	UN	4.00
Desmonte de luminarias. (Zona Consejo Superior))					9.00	UN	9.00
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			**TOTAL**	**78.00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	M
ITEM:	1.8. Desmonte y retiro de mueble bajo en madera H hasta 1.20 m de altura. (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	41.09

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Desmonte y retiro de mueble bajo en madera H hasta 1.20 m de altura. (Admon)	32.52	1.00				M	32.52
Desmonte y retiro de mueble bajo en madera H hasta 1.20 m de altura. (Consejo seccional)	2.10	1.00				M	2.10
Desmonte y retiro de mueble bajo en madera H hasta 1.20 m de altura. (Consejo seccional)	6.47	1.00				M	6.47
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**41.09**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	UND
ITEM:	1.9. Desmonte y retiro de bibliotecas en madera medidas aprox 2,5 m x1,63 m . (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	8.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Desmonte y retiro de bibliotecas en madera medidas aprox 2,5 m x1,63 m . (Admon)					6.00	UND	6.00
Desmonte y retiro de bibliotecas en madera medidas aprox 2,5 m x1,63 m . (Admon)					1.00	UND	1.00
Desmonte y retiro de bibliotecas en madera medidas aprox 2,5 m x1,63 m . (Consejo seccional)					1.00	UND	1.00
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**8.00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	M
ITEM:	1.10. Desmonte de revestimiento en madera sobre muro H hasta 1.20 m. (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	66.53

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Desmonte de revestimiento en madera sobre muro H hasta 1.20 m. (Admon)	21.30	1.00				M	21.30
Desmonte de revestimiento en madera sobre muro H hasta 1.20 m. (Consejo seccional)	45.23	1.00				M	45.23
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**66.53**





OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	UND
ITEM:	1.12. Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye Tubería trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	102.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Oficinas administrativas rama (Puntos regulados)					45.00	UND	45.00
Oficinas administrativas rama (Puntos no regulados)					45.00	UND	45.00
Oficinas administrativas rama (Puntos normales)					12.00	UND	12.00
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**102.00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	M
ITEM:	1.13. Desmonte Cable UTP Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	1,564.50

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Oficinas administrativas rama judicial	1,564.50					M	1,564.50
Aproxima Resultado a :						TOTAL	1,564.50





OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	M2
ITEM:	1.15. Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	592.74

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Area Recepcion(Baños hombre)	2.02	1.93				M2	3.90
Area Recepcion(Baños hombre)	0.90	0.97				M2	0.87
Area Recepcion(Baños mujeres)	2.53	3.13				M2	7.92
Area Recepción	9.17	4.64				M2	42.55
Area Recepción	1.73	2.34				M2	4.05
Area Recepción	2.30	2.50				M2	5.75
Area Recepción	1.90	2.25				M2	4.28
Pasillo consejo seccional)	4.10	2.40				M2	9.84
Pasillo consejo seccional)	2.96	3.46				M2	10.24
Pasillo consejo seccional)	1.10	3.10				M2	3.41
Pasillo consejo seccional)	10.25	2.48				M2	25.42
Consejo seccional (oficina presidente consejo)	4.50	1.45				M2	6.53
Consejo seccional (oficina presidente consejo)	2.38	0.92				M2	2.19
Consejo seccional (oficina presidente consejo)	1.32	0.95				M2	1.25
Consejo seccional (oficina presidente consejo)	1.50	1.90				M2	2.85
Consejo seccional (oficina secretaria presidente)	3.74	2.64				M2	9.87
Consejo seccional (baño oficina ipresidente)	1.83	2.14				M2	3.92
Vicepresidencia consejo superior	4.90	1.47				M2	7.20
Vicepresidencia consejo superior	4.37	4.70				M2	20.54
Vicepresidencia consejo superior	4.10	0.74				M2	3.03
Vicepresidencia consejo superior, baño	1.29	0.86				M2	1.11
Vicepresidencia consejo superior, baño	2.02	1.10				M2	2.22
Sala de juntas , Consejo seccional	6.54	3.61				M2	23.61
Area Admon,(of.director)	6.32	5.10				M2	32.23
Area Admon,(baño de of.director)	2.22	1.72				M2	3.82
Area Admon,(secretaria de of.director)	3.33	6.25				M2	20.81
Area Admon,(oficina 1)	5.44	7.04				M2	38.30
Area Admon,(gestion humana)	9.44	7.04				M2	66.46
Area Admon,(gestion humana archivo)	2.89	1.40				M2	4.05
Area Admon,(gestion humana archivo)	5.12	3.68				M2	18.84
Area Admon,(oficina 3)	4.59	6.28				M2	28.83
Area Admon,(oficina 3, coordinación)	3.32	3.70				M2	12.28
Area Admon,(secretaria consejo inluye baño)	8.30	3.76				M2	31.21
Area Admon,(Oficina 4)	6.78	6.52				M2	44.21
Area Admon,(Oficina 4)	2.60	3.31				M2	8.61
Area Admon,(Oficina 2)	3.77	6.52				M2	24.58
Area Admon,(pasillos)	1.10	3.70				M2	4.07
Area Admon,(pasillos)	1.50	16.98				M2	25.47
Area Admon,(pasillos)	2.67	5.40				M2	14.42
Area Admon,(pasillos)	1.85	0.90				M2	1.67
Area Admon,(pasillos)	2.67	2.43				M2	6.49
Area Admon,(cabina recepciòn)	1.98	1.95				M2	3.86
Aproxima Resultado a :						TOTAL	592.74





OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	M
ITEM:	1.16. Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección >= 0,70 X 0,35 M. (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	80.62

AREA O LUGAR	LARGO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Desmonte aires acondicionados	67.87					M	67.87
Desmonte aires acondicionados(seccional)	12.75						12.75
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			TOTAL	80.62



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO	UNIDAD:	M2
ITEM:	4.1 Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministr	CANTIDAD:	2.31

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	ÀREA PARCIAL	ÁREA	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Oficinas Admon , (Ofi. Director)	1.10	2.10		2.31	2.31		M2	2.31
					-			-
					-			-
					-			-
					-			-
Aproxima Resultado a :							TOTAL	2.31

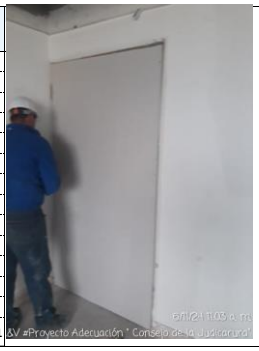

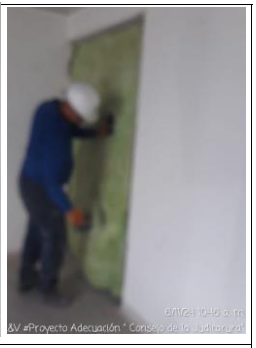

OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO	**UNIDAD:**	M
ITEM:	Division para mueble en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<80 cm, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Ir	**CANTIDAD:**	0.85

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	ÀREA PARCIAL	ÁREA	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFICINA DE SECRETARIA DIRECTOR	0.85			-	-		m	0.85
				-	-			
					-			-
					-			-
					-			-
					-			-
					-			-
					-			-
					-			-
Aproxima Resultado a :				2			TOTAL	0.85





OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ESTUCO Y PINTURA	UNIDAD:	M2
ITEM:	8.1 Suministro y aplicación de Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	CANTIDAD:	127.62

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	ÀREA PARCIAL	ÁREA	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Oficinas Admón	3.06	2.30	0.49	6.55	6.55		M2	6.55
	2.70	2.30	0.76	5.45	5.45		M2	5.45
	2.23	2.30			5.13		M2	5.13
	0.96	3.40			3.26		M2	3.26
	0.37	2.30			0.85		M2	0.85
	3.87	2.30	1.00	7.90	7.90		M2	7.90
	2.80	1.55			4.34		M2	4.34
	0.90	0.80			0.72	15.00	M2	10.80
	0.95	1.80			1.71		M2	1.71
	0.95	0.60			0.57		M2	0.57
	0.95	2.73			2.59		M2	2.59
	2.30	0.63			1.45		M2	1.45
	0.95	2.50			2.38		M2	2.38
	0.95	1.80			1.71		M2	1.71
	0.50	0.50			0.25		M2	0.25
	2.30	2.35			5.41		M2	5.41
	1.25	1.60			2.00		M2	2.00
	2.10	0.10			0.21		M2	0.21
	0.95	3.40			3.23		M2	3.23
	3.08	2.30			7.08		M2	7.08
	0.80	2.30			1.84		M2	1.84
	1.10	2.30			2.53		M2	2.53
	0.72	2.30			1.66		M2	1.66
	0.67	1.60			1.07		M2	1.07
	0.10	1.10			0.11		M2	0.11
	0.20	0.60			0.12		M2	0.12
	0.30	0.20			0.06		M2	0.06
	0.80	2.17			1.74	5.00	M2	8.68
	0.58	2.17			1.26	5.00	M2	6.29
	0.17	2.30			0.39	5.00	M2	1.96
	0.13	2.05			0.27	5.00	M2	1.33
	1.00	0.14			0.14	5.00	M2	0.70
	2.50	0.95			2.38		M2	2.38
	0.92	1.00			0.92		M2	0.92
	0.69	2.50			1.73		M2	1.73
	0.92	1.10			1.01		M2	1.01
	0.95	1.10			1.05		M2	1.05
Área Seccional	0.13	2.28			0.30		M2	0.30
	3.00	1.03			3.09		M2	3.09
	1.34	2.30			3.08		M2	3.08
	0.56	1.00			0.56		M2	0.56
	1.10	2.30			2.53		M2	2.53
	1.30	1.00			1.30		M2	1.30
	1.00	1.00			1.00		M2	1.00
	0.98	0.90			0.88		M2	0.88
	0.98	2.13			2.09	2.00	M2	4.17
	0.55	2.13			1.17		M2	1.17
Área Recepción	1.00	0.10			0.10		M2	0.10
	2.05	0.10			0.21		M2	0.21
	0.83	2.05			1.70		M2	1.70
	0.60	2.05			1.23		M2	1.23
Aproxima Resultado a :							TOTAL	127.62



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES	**UNIDAD:**	UND
ITEM:	14.1 Reinstalacion sanitarios existentes	**CANTIDAD:**	####

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS			
Oficina Seccional Judicatura					1.00	UNIDAD	**1.00**
							-
Aproxima Resultado a : 2						**TOTAL**	**1.00**




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES SANITARIAS	**UNIDAD:**	M
ITEM:	16.1 Mantenimiento de la red sanitaria, revision destape con sonda	**CANTIDAD:**	14.40

AREA O LUGAR	DIMENSIONES			N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)			
Palacio de Justicia	14.40				m	**14.40**
						-
			Aproxima Resultado a :		**TOTAL**	**14.40**

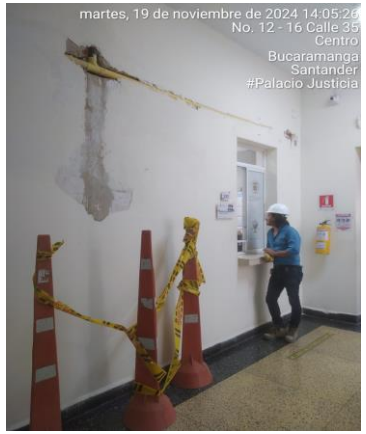

Observaciones:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**UNIDAD:**	UND
ITEM:	17.4 Suministro, transporte e instalación de salida para iluminación 110 v, incluye caja octogonal, caja rectangular, interruptor sencillo, c	**CANTIDAD:**	110.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Oficinas seccional					27.00	UND	27.00
Oficinas administrativas					75.00	UND	75.00
Área Recepción					8.00	UND	8.00
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**110.00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS		**UNIDAD:**	M
ITEM:	17,9	Suministro, transporte e instalación de Canaleta metalica 12x5 cm, en pintura electrostatica blanca, con separador, incluye: elementos de fijación y soporte	**CANTIDAD:**	124,09

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS				
OFICINA DIRECCIÓN	12,24							**12,24**
OFICINA SECRETARIA DIRECCIÓN	8,50							**8,50**
OFICINAS ADMINISTRATIVAS	25,76							**25,76**
OFICINA SECCIONAL JUDICATURA	14,36							**14,36**
RECEPCIÓN	9,21							**9,21**
RACK	9,49							**9,49**
OFICINA VICEPRESIDENTE	2,20							**2,20**
OFICINA SALA DE JUNTAS	13,24							**13,24**
OFICINA TERRAZA	15,70							**15,70**
OFICINA SECETARIA PRESIDENTE	6,81							**6,81**
OFICINA PRESIDENTE	6,58							**6,58**
								-
			Aproxima Resultado a :		2 Decimales		TOTAL	**124,09**



Observaciones:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**UNIDAD:**	M
ITEM:	17,10 Suministro, transporte e instalación de Red de cable 3x 12 AWG THWNN LSZH	**CANTIDAD:**	830,00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS				
5TO PISO RAMA JUDICIAL	1.520,00			690,00				**830,00**
Aproxima Resultado a :				2 Decimales			**TOTAL**	**830,00**





Observaciones:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**UNIDAD:**	M
ITEM:	17.12 Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 3/4" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, sc	**CANTIDAD:**	108.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LONGITUD	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFINAS DMON RAMA JUDIACIAL		72.90				ML	72.90
OFICINAS DE MAGISTRADOS		29.30				ML	29.30
RECEPCION		5.80				ML	5.80
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**108.00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**UNIDAD:**	M
ITEM:	17.13Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 1" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador,	**CANTIDAD:**	50.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LONG	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFINAS DMON RAMA JUDIACIAL		35.70				ML	35.70
OFICINAS DE MAGISTRADOS		8.50				ML	8.50
RECEPCION		5.80				ML	5.80
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**50.00**



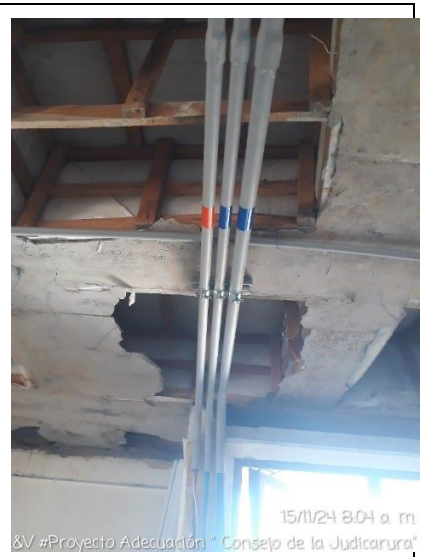

OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTROL DEL PERSONAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	CONTRATO No	BGA-044-2024

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL

MES / NOVIEMBRE	DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total Jornales
NOMBRE	CARGO	Total personal por dias																														
ANDRES VARGAS	Maestro de obra	0	0	0	1	1	0	1	0	0		1	1	1	1	1	1	1														10
LUIS CELIS	Auxiliar de obra	1	1	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1														15
ISAID NIÑO QUIHAY	Auxiliar de obra	1	1	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1														
YEFERSON CLEMENTE	Auxiliar de obra	1	1	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1														15
LEONARDO HERRERA	Tecnico Electricista	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1														16
ARLEY URREA ORTIZ	Tecnico Electricista	1	1	1	1	1	1	0	0	0		1	1	1	1	1	1	1														13
ALEXANDER NOGUERA GUTIERREZ	Auxiliar Electrico	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1														16
ALEXANDER RAMIREZ	Ingeniero residente	1	1	0	1	1	0	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1														14
VIVIANA RAMIREZ	Siso	1	1	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1														15
TOTAL		8	8	3	9	9	7	8	7	7	0	9	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**114**

Observaciones:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA

INFORME SEMANAL — No . 8

CONTRATO No: BGA-044-2024
CONTRATISTA : CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V — 27/09/2024
NIT 901863382-1 — 27/12/2024
REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR — $ 1.940.000.000
N/A

OBJETO:

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	SEMANA 5 DEL 28 OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE				SEMANA 6 DEL 4 NOVIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE				SEMANA 7 DEL 11 NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE				SEMANA 8 DEL 18 NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE			
			CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**			$ 0,00		**$ 39.945.224,88**		$ 0,00		**$ 39.945.224,88**		**$ 33.566,00**		**$ 39.978.790,88**		**$ 3.877.360,12**		**$ 43.856.151,00**
1,1	Suministro e instalacion de Cerramiento provisional en polisombra. Incluye postes cada 1.5, puertas y accesorios	M			7,50	$ 114.847,50			7,50	$ 114.847,50			7,50	$ 114.847,50			7,50	$ 114.847,50
1,2	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2			200,61	$ 3.855.724,20			200,61	$ 3.855.724,20			200,61	$ 3.855.724,20			200,61	$ 3.855.724,20
1,3	Desmonte de sanitarios (Incluye trasiego y disposición final)	UND									1,00	$ 33.566,00	1,00	$ 33.566,00			$ 1,00	$ 33.566,00
1,4	Desmonte de puertas en madera	UND			23,00	$ 837.269,00			23,00	$ 837.269,00			23,00	$ 837.269,00			23,00	$ 837.269,00
1,7	Desmonte de luminarias. (Incluye trasiego y disposición final)	UN			78,00	$ 2.749.812,00			78,00	$ 2.749.812,00			78,00	$ 2.749.812,00			78,00	$ 2.749.812,00
1.8	Desmonte y retiro de mueble bajo en madera H hasta 1.20 m de altura. (Incluye trasiego y disposición final)	M			41,09	$ 1.542.847,32			41,09	$ 1.542.847,32			41,09	$ 1.542.847,32			41,09	$ 1.542.847,32
1.9	Desmonte y retiro de bibliotecas en madera medidas aprox 2,5 m x1,63 m . (Incluye trasiego y disposición final)	UN			8,00	$ 972.688,00			8,00	$ 972.688,00			8,00	$ 972.688,00			8,00	$ 972.688,00
1.10	Desmonte de revestimiento en madera sobre muro H hasta 1.20 m. (Incluye trasiego y disposición final)	M			66,53	$ 1.897.236,01			66,53	$ 1.897.236,01			66,53	$ 1.897.236,01			66,53	$ 1.897.236,01
1.12	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye Tubería trasiego y disposición final)	UN			102,00	$ 3.056.430,00			102,00	$ 3.056.430,00			102,00	$ 3.056.430,00			102,00	$ 3.056.430,00
1.13	Desmonte Cable UTP Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	M			1564,50	$ 2.589.247,50			1564,50	$ 2.589.247,50			1564,50	$ 2.589.247,50			1564,50	$ 2.589.247,50
1.15	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2			592,74	$ 18.414.538,63			592,74	$ 18.414.538,63			592,74	$ 18.414.538,63			592,74	$ 18.414.538,63
1.16	Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección >= 0,70 X 0,35 M. (Incluye trasiego y disposición final)	M			80,62	$ 3.914.584,72			80,62	$ 3.914.584,72			80,62	$ 3.914.584,72	75,85	$ 3.682.972,60	156,47	$ 7.597.557,32
1.22	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye acabados, trasiego y disposición final)	M2													6,65	$ 194.387,52	6,65	$ 194.387,52
3.	**MAMPOSTERÍA**			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		**$ 435.384,17**		**$ 435.384,17**
3.1	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2													6,65	$ 435.384,17	6,65	$ 435.384,17
4	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**			$ 0,00		$ 0,00		**$ 402.365,83**		**$ 402.365,83**		$ 0,00		**$ 402.365,83**		$ 0,00		**$ 402.365,83**
4.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescasa) y acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2					2,31	$ 299.821,83	2,31	$ 299.821,83			2,31	$ 299.821,83			2,31	$ 299.821,83
4.2	Division para mueble en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho>80 cm, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M					0,85	$ 102.544,00	0,85	$ 102.544,00			0,85	$ 102.544,00			0,85	$ 102.544,00
8.	**ESTUCO Y PINTURA**			$ 0,00		**$ 2.354.555,79**		$ 0,00		**$ 2.354.555,79**		$ 0,00		**$ 2.354.555,79**		$ 0,00		**$ 2.354.555,79**
8.1	Suministro y aplicación de Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2			127,62	$ 2.354.555,79			127,62	$ 2.354.555,79			127,62	$ 2.354.555,79			127,62	$ 2.354.555,79

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA

INFORME SEMANAL

No . 8

CONTRATO No: BGA-044-2024
CONTRATISTA : CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V — 27/09/2024
NIT 901863382-1 — 27/12/2024
REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR — $ 1.940.000.000
N/A

OBJETO:

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	SEMANA 5 DEL 28 OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE				SEMANA 6 DEL 4 NOVIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE				SEMANA 7 DEL 11 NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE				SEMANA 8 DEL 18 NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE			
			CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR
14.	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		**$ 45.126,00**		**$ 45.126,00**		$ 0,00		**$ 45.126,00**
14.1	Reinstalación Sanitarios existentes.	UN									1,00	$ 45.126,00	1,00	$ 45.126,00			1,00	$ 45.126,00
16.	**INSTALACIONES SANITARIAS**			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		**$ 530.625,60**		**$ 530.625,60**		$ 0,00		**$ 530.625,60**
16.1	Mantenimiento de la red sanitaria , incluye revision y destape con sonda .	M									14,40	$ 530.625,60	14,40	$ 530.625,60			14,40	$ 530.625,60
17	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			$ 0,00		**$ 17.542.030,00**		**$ 2.685.578,00**		**$ 20.227.608,00**		**$ 25.572.616,71**		**$ 45.800.224,71**		$ 0,00		**$ 45.800.224,71**
17.4	Suministro, transporte e instalación de salida para iluminación 110 v, incluye caja octogonal, caja rectangular, interruptor sencillo, conectores 3M, 3 mts de cable Cu 3x12 THWNN LSZH, 3 mts de ducto conduit sch 40 Ø 1/2", clavija aerea tipo hembra 15 A, clavija aerea tipo macho 15 A, 1 mt de cable encauchetado 3x14 AWG THWN LSZH	UN			110,00	$ 17.542.030,00			110,00	$ 17.542.030,00			110,00	$ 17.542.030,00			110,00	$ 17.542.030,00
17.9	Suministro, transporte e instalación de Canaleta metalica 12x5 cm, en pintura electrostatica blanca, con separador, incluye: elementos de fijación y soporte	M									124,09	$12.175.586,71	124,09	$12.175.586,71			124,09	$ 12.175.586,71
17.10	Suministro, transporte e instalación de Red de cable 3x 12 AWG THWNN LSZH	M									830,00	$13.397.030,00	830,00	$13.397.030,00			830,00	$ 13.397.030,00
17.12	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 3/4" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M					108,00	$1.743.228,00	108,00	$1.743.228,00			108,00	$1.743.228,00			108,00	$ 1.743.228,00
17.13	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 1" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M					50,00	$942.350,00	50,00	$942.350,00			50,00	$942.350,00			50,00	$ 942.350,00
	TOTAL COSTO DIRECTO			**$ 0,00**		**$ 59.841.810,67**		**$ 3.087.943,83**		**$ 62.929.754,50**		**$ 26.181.934,31**		**$ 89.111.688,81**		**$ 4.312.744,29**		**$ 93.424.433,10**
	ADMINISTRACIÓN	20%		**$ 0,00**		**$ 11.968.362,00**		**$ 617.589,00**		**$ 12.585.951,00**		**$ 5.236.387,00**		**$ 17.822.338,00**		**$ 862.549,00**		**$ 18.684.887,00**
	IMPREVISTOS	1%		**$ 0,00**		**$ 598.418,00**		**$ 30.879,00**		**$ 629.298,00**		**$ 261.819,00**		**$ 891.117,00**		**$ 43.127,00**		**$ 934.244,00**
	UTILIDAD	5%		**$ 0,00**		**$ 2.992.091,00**		**$ 154.397,00**		**$ 3.146.488,00**		**$ 1.309.097,00**		**$ 4.455.584,00**		**$ 215.637,00**		**$ 4.671.222,00**
	TOTAL AIU	26%		**$ 0,00**		**$ 15.558.871,00**		**$ 802.865,00**		**$ 16.361.736,00**		**$ 6.807.302,92**		**$ 23.169.039,09**		**$ 1.121.313,51**		**$ 24.290.352,61**
	IVA SOBRE UTILIDAD	19%		**$ 0,00**		**$ 568.497,29**		**$ 29.335,43**		**$ 597.832,72**		**$ 248.728,43**		**$ 846.560,96**		**$ 40.971,03**		**$ 887.532,18**
	COSTO TOTAL DE OBRA			**$ 0,00**		**$ 75.969.178,96**		**$ 3.920.144,26**		**$ 79.889.324,22**		**$ 33.237.965,74**		**$ 113.127.288,77**		**$ 5.475.028,32**		**$ 118.602.318,28**
	COSTO TOTAL DE OBRA + SUMINISTROS											**$ 33.237.965,74**		**$ 113.127.288,77**		**$ 5.475.028,32**		**$ 118.602.318,28**
	AVANCE SEMANAL (%)			**0%**				**0,20%**				**1,71%**		**5,83%**		**0,28%**		**6,11%**

AleXander Ramirez Marquez
Ing. Residente de Obra, Consorcio Ifraestructura A&v

Ingeniero Residente Interventoría
JENCY JULIANA MARTINEZ OVALLE

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	M
ITEM:	1.1. Suministro e instalacion de Cerramiento provisional en polisombra. Incluye postes cada 1.5, puertas y accesorios	**CANTIDAD:**	7.50

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LARGO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Suministro e instalacion de Cerramiento provisional en polisombra área de acoipo de escombros	2.50	3.00				M	7.50
Aproxima Resultado a :				2 Decimales		**TOTAL**	**7.50**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	M2
ITEM:	1.2. Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	200.61

AREA O LUGAR	LARGO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Área administrativa	87.22	2.30				M2	200.61
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			TOTAL	200.61



OBSERVACIONES:


Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	1.3 Desmonte de aparatos sanitarios. (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	1.00

AREA O LUGAR		DIMENSIONES			V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
		LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)				
Oficina Seccional Judicatura						**1.00**	UN	**1.00**
				Aproxima Resultado a : Decimales			**TOTAL**	**1.00**

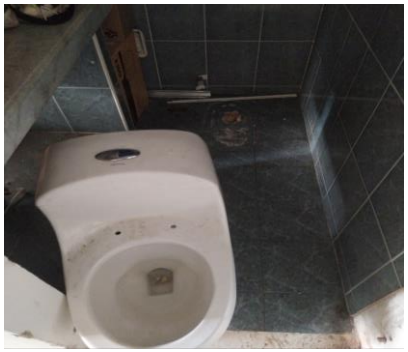

Observaciones:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	UND
ITEM:	1.4. Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	23.00

AREA O LUGAR	LARGO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Área zona Administrativa					15.00	UND	15.00
Área zona Administrativa (pta director)					1.00	UND	1.00
Área zona consejo seccional					5.00	UND	5.00
Área zona recepción					2.00	UND	2.00
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			TOTAL	23.00



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	UND
ITEM:	1.7. Desmonte de luminarias. (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	78.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Desmonte de luminarias. (Zona Administrativa)					65.00	UN	65.00
Desmonte de luminarias. (Zona Recepción)					4.00	UN	4.00
Desmonte de luminarias. (Zona Consejo Superior))					9.00	UN	9.00
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			**TOTAL**	**78.00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	M
ITEM:	1.8. Desmonte y retiro de mueble bajo en madera H hasta 1.20 m de altura. (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	41.09

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Desmonte y retiro de mueble bajo en madera H hasta 1.20 m de altura. (Admon)	32.52	1.00				M	32.52
Desmonte y retiro de mueble bajo en madera H hasta 1.20 m de altura. (Consejo seccional)	2.10	1.00				M	2.10
Desmonte y retiro de mueble bajo en madera H hasta 1.20 m de altura. (Consejo seccional)	6.47	1.00				M	6.47
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**41.09**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	UND
ITEM:	1.9. Desmonte y retiro de bibliotecas en madera medidas aprox 2,5 m x1,63 m . (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	8.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Desmonte y retiro de bibliotecas en madera medidas aprox 2,5 m x1,63 m . (Admon)					6.00	UND	6.00
Desmonte y retiro de bibliotecas en madera medidas aprox 2,5 m x1,63 m . (Admon)					1.00	UND	1.00
Desmonte y retiro de bibliotecas en madera medidas aprox 2,5 m x1,63 m . (Consejo seccional)					1.00	UND	1.00
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**8.00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	M
ITEM:	1.10. Desmonte de revestimiento en madera sobre muro H hasta 1.20 m. (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	66.53

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Desmonte de revestimiento en madera sobre muro H hasta 1.20 m. (Admon)	21.30	1.00				M	21.30
Desmonte de revestimiento en madera sobre muro H hasta 1.20 m. (Consejo seccional)	45.23	1.00				M	45.23
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**66.53**





OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	UND
ITEM:	1.12. Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye Tubería trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	102.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Oficinas administrativas rama (Puntos regulados)					45.00	UND	45.00
Oficinas administrativas rama (Puntos no regulados)					45.00	UND	45.00
Oficinas administrativas rama (Puntos normales)					12.00	UND	12.00
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**102.00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	M
ITEM:	1.13. Desmonte Cable UTP Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	1,564.50

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Oficinas administrativas rama judicial	1,564.50					M	1,564.50
Aproxima Resultado a :						TOTAL	1,564.50





OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	M2
ITEM:	1.15. Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	592.74

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Area Recepcion(Baños hombre)	2.02	1.93				M2	3.90
Area Recepcion(Baños hombre)	0.90	0.97				M2	0.87
Area Recepcion(Baños mujeres)	2.53	3.13				M2	7.92
Area Recepción	9.17	4.64				M2	42.55
Area Recepción	1.73	2.34				M2	4.05
Area Recepción	2.30	2.50				M2	5.75
Area Recepción	1.90	2.25				M2	4.28
Pasillo consejo seccional)	4.10	2.40				M2	9.84
Pasillo consejo seccional)	2.96	3.46				M2	10.24
Pasillo consejo seccional)	1.10	3.10				M2	3.41
Pasillo consejo seccional)	10.25	2.48				M2	25.42
Consejo seccional (oficina presidente consejo)	4.50	1.45				M2	6.53
Consejo seccional (oficina presidente consejo)	2.38	0.92				M2	2.19
Consejo seccional (oficina presidente consejo)	1.32	0.95				M2	1.25
Consejo seccional (oficina presidente consejo)	1.50	1.90				M2	2.85
Consejo seccional (oficina secretaria presidente)	3.74	2.64				M2	9.87
Consejo seccional (baño oficina ipresidente)	1.83	2.14				M2	3.92
Vicepresidencia consejo superior	4.90	1.47				M2	7.20
Vicepresidencia consejo superior	4.37	4.70				M2	20.54
Vicepresidencia consejo superior	4.10	0.74				M2	3.03
Vicepresidencia consejo superior, baño	1.29	0.86				M2	1.11
Vicepresidencia consejo superior, baño	2.02	1.10				M2	2.22
Sala de juntas , Consejo seccional	6.54	3.61				M2	23.61
Area Admon,(of.director)	6.32	5.10				M2	32.23
Area Admon,(baño de of.director)	2.22	1.72				M2	3.82
Area Admon,(secretaria de of.director)	3.33	6.25				M2	20.81
Area Admon,(oficina 1)	5.44	7.04				M2	38.30
Area Admon,(gestion humana)	9.44	7.04				M2	66.46
Area Admon,(gestion humana archivo)	2.89	1.40				M2	4.05
Area Admon,(gestion humana archivo)	5.12	3.68				M2	18.84
Area Admon,(oficina 3)	4.59	6.28				M2	28.83
Area Admon,(oficina 3, coordinación)	3.32	3.70				M2	12.28
Area Admon,(secretaria consejo inluye baño)	8.30	3.76				M2	31.21
Area Admon,(Oficina 4)	6.78	6.52				M2	44.21
Area Admon,(Oficina 4)	2.60	3.31				M2	8.61
Area Admon,(Oficina 2)	3.77	6.52				M2	24.58
Area Admon,(pasillos)	1.10	3.70				M2	4.07
Area Admon,(pasillos)	1.50	16.98				M2	25.47
Area Admon,(pasillos)	2.67	5.40				M2	14.42
Area Admon,(pasillos)	1.85	0.90				M2	1.67
Area Admon,(pasillos)	2.67	2.43				M2	6.49
Area Admon,(cabina recepciòn)	1.98	1.95				M2	3.86
Aproxima Resultado a :						TOTAL	592.74





OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	M
ITEM:	1.16. Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección >= 0,70 X 0,35 M. (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	156.47

AREA O LUGAR	LARGO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Desmonte aires acondicionados	67.87					M	67.87
Desmonte aires acondicionados(seccional)	12.75						12.75
DESMONTE DUCTOS PRINCIPALES	75.85						75.85
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			**TOTAL**	**156.47**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	M2
ITEM:	1.22 Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye acabados, trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	6.65

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS				
MURO OFICINA SECRETARIA DE PRESIDENTE		2.40	2.77		6.65		M2	**6.65**
Aproxima Resultado a :				2 Decimales			**TOTAL**	**6.65**



Observaciones:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA	**UNIDAD:**	M2
ITEM:	3.10 Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	**CANTIDAD:**	6.65

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS				
MURO OFICINA SECRETARIA DE PRESIDENTE		2.40	2.77		6.65		M2	**6.65**
Aproxima Resultado a :			2 Decimales				**TOTAL**	**6.65**



Observaciones:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO	UNIDAD:	M2
ITEM:	4.1 Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministr	CANTIDAD:	2.31

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	ÀREA PARCIAL	ÁREA	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Oficinas Admon , (Ofi. Director)	1.10	2.10		2.31	2.31		M2	2.31
					-			-
					-			-
					-			-
					-			-
Aproxima Resultado a :							TOTAL	2.31

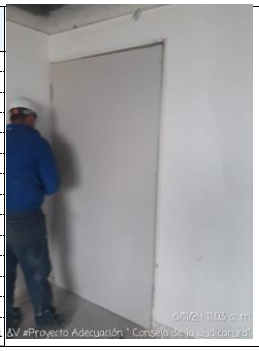

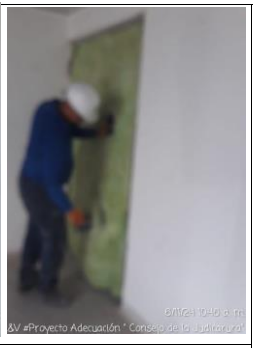

OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO	**UNIDAD:**	M
ITEM:	4.2. Division para mueble en Drywall doble cara, e= 12 cm,ncho < 80 cm, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	**CANTIDAD:**	0.85

AREA O LUGAR	ALTO (M)	ANCHO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Oficina de secretaria director	0.85				1.00	m	0.85
							-
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			TOTAL	0.85



OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:
Firma:	Firma:
ING. ALEXANDER RAMIREZ	ING. JENCY JULIANA MARTINEZ OVALLE
Cargo: RESIDENTE DE OBRA	Cargo: RESIDENTE INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ESTUCO Y PINTURA	UNIDAD:	M2
ITEM:	8.1 Suministro y aplicación de Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	CANTIDAD:	127.62

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	ÀREA PARCIAL	ÁREA	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Oficinas Admón	3.06	2.30	0.49	6.55	6.55		M2	6.55
	2.70	2.30	0.76	5.45	5.45		M2	5.45
	2.23	2.30			5.13		M2	5.13
	0.96	3.40			3.26		M2	3.26
	0.37	2.30			0.85		M2	0.85
	3.87	2.30	1.00	7.90	7.90		M2	7.90
	2.80	1.55			4.34		M2	4.34
	0.90	0.80			0.72	15.00	M2	10.80
	0.95	1.80			1.71		M2	1.71
	0.95	0.60			0.57		M2	0.57
	0.95	2.73			2.59		M2	2.59
	2.30	0.63			1.45		M2	1.45
	0.95	2.50			2.38		M2	2.38
	0.95	1.80			1.71		M2	1.71
	0.50	0.50			0.25		M2	0.25
	2.30	2.35			5.41		M2	5.41
	1.25	1.60			2.00		M2	2.00
	2.10	0.10			0.21		M2	0.21
	0.95	3.40			3.23		M2	3.23
	3.08	2.30			7.08		M2	7.08
	0.80	2.30			1.84		M2	1.84
	1.10	2.30			2.53		M2	2.53
	0.72	2.30			1.66		M2	1.66
	0.67	1.60			1.07		M2	1.07
	0.10	1.10			0.11		M2	0.11
	0.20	0.60			0.12		M2	0.12
	0.30	0.20			0.06		M2	0.06
	0.80	2.17			1.74	5.00	M2	8.68
	0.58	2.17			1.26	5.00	M2	6.29
	0.17	2.30			0.39	5.00	M2	1.96
	0.13	2.05			0.27	5.00	M2	1.33
	1.00	0.14			0.14	5.00	M2	0.70
	2.50	0.95			2.38		M2	2.38
	0.92	1.00			0.92		M2	0.92
	0.69	2.50			1.73		M2	1.73
	0.92	1.10			1.01		M2	1.01
	0.95	1.10			1.05		M2	1.05
Área Seccional	0.13	2.28			0.30		M2	0.30
	3.00	1.03			3.09		M2	3.09
	1.34	2.30			3.08		M2	3.08
	0.56	1.00			0.56		M2	0.56
	1.10	2.30			2.53		M2	2.53
	1.30	1.00			1.30		M2	1.30
	1.00	1.00			1.00		M2	1.00
	0.98	0.90			0.88		M2	0.88
	0.98	2.13			2.09	2.00	M2	4.17
	0.55	2.13			1.17		M2	1.17
Área Recepción	1.00	0.10			0.10		M2	0.10
	2.05	0.10			0.21		M2	0.21
	0.83	2.05			1.70		M2	1.70
	0.60	2.05			1.23		M2	1.23
Aproxima Resultado a :							TOTAL	127.62



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES	**UNIDAD:**	UND
ITEM:	14.1 Reinstalacion sanitarios existentes	**CANTIDAD:**	####

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS			
Oficina Seccional Judicatura					1.00	UNIDAD	**1.00**
							-
Aproxima Resultado a : 2						**TOTAL**	**1.00**




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES SANITARIAS	**UNIDAD:**	M
ITEM:	16.1 Mantenimiento de la red sanitaria, revision destape con sonda	**CANTIDAD:**	14.40

AREA O LUGAR	DIMENSIONES			N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)			
Palacio de Justicia	14.40				m	**14.40**
						-
Aproxima Resultado a :					**TOTAL**	**14.40**

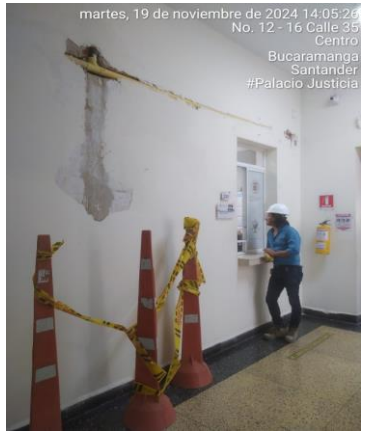

Observaciones:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**UNIDAD:**	UND
ITEM:	17.4 Suministro, transporte e instalación de salida para iluminación 110 v, incluye caja octogonal, caja rectangular, interruptor sencillo, c	**CANTIDAD:**	110.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Oficinas seccional					27.00	UND	27.00
Oficinas administrativas					75.00	UND	75.00
Área Recepción					8.00	UND	8.00
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**110.00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS		**UNIDAD:**	M
ITEM:	17.9	Suministro, transporte e instalación de Canaleta metalica 12x5 cm, en pintura electrostatica blanca, con separador, incluye: elementos de fijación y soporte	**CANTIDAD:**	124.09

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS				
OFICINA DIRECCIÓN	12.24							**12.24**
OFICINA SECRETARIA DIRECCIÓN	8.50							**8.50**
OFICINAS ADMINISTRATIVAS	25.76							**25.76**
OFICINA SECCIONAL JUDICATURA	14.36							**14.36**
RECEPCIÓN	9.21							**9.21**
RACK	9.49							**9.49**
OFICINA VICEPRESIDENTE	2.20							**2.20**
OFICINA SALA DE JUNTAS	13.24							**13.24**
OFICINA TERRAZA	15.70							**15.70**
OFICINA SECETARIA PRESIDENTE	6.81							**6.81**
OFICINA PRESIDENTE	6.58							**6.58**
								-
Aproxima Resultado a :				2 Decimales			**TOTAL**	**124.09**



Observaciones:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**UNIDAD:**	M
ITEM:	17,10 Suministro, transporte e instalación de Red de cable 3x 12 AWG THWNN LSZH	**CANTIDAD:**	830,00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS				
5TO PISO RAMA JUDICIAL	1.520,00			690,00				**830,00**
Aproxima Resultado a :				2 Decimales			**TOTAL**	**830,00**





Observaciones:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**UNIDAD:**	M
ITEM:	17.12 Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 3/4" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, sc	**CANTIDAD:**	108.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LONGITUD	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFINAS DMON RAMA JUDIACIAL		72.90				ML	72.90
OFICINAS DE MAGISTRADOS		29.30				ML	29.30
RECEPCION		5.80				ML	5.80
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**108.00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**UNIDAD:**	M
ITEM:	17.13Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 1" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador,	**CANTIDAD:**	50.00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LONG	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFINAS DMON RAMA JUDIACIAL		35.70				ML	35.70
OFICINAS DE MAGISTRADOS		8.50				ML	8.50
RECEPCION		5.80				ML	5.80
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**50.00**



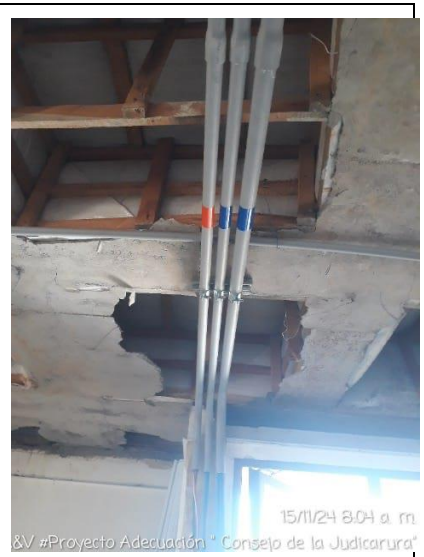

OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTROL DEL PERSONAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	CONTRATO No	BGA-044-2024

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL

MES / NOVIEMBRE	DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total Jornales
NOMBRE	CARGO	Total personal por dias																														
ANDRES VARGAS	Maestro de obra	0	0	0	1	1	0	1	0	0		1	1	1	1	1	1	1														10
LUIS CELIS	Auxiliar de obra	1	1	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1														15
ISAID NIÑO QUIHAY	Auxiliar de obra	1	1	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1														
YEFERSON CLEMENTE	Auxiliar de obra	1	1	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1														15
LEONARDO HERRERA	Tecnico Electricista	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1														16
ARLEY URREA ORTIZ	Tecnico Electricista	1	1	1	1	1	1	0	0	0		1	1	1	1	1	1	1														13
ALEXANDER NOGUERA GUTIERREZ	Auxiliar Electrico	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1														16
ALEXANDER RAMIREZ	Ingeniero residente	1	1	0	1	1	0	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1														14
VIVIANA RAMIREZ	Siso	1	1	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1														15
TOTAL		8	8	3	9	9	7	8	7	7	0	9	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**114**

Observaciones:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA

INFORME SEMANAL — **No . 9**

CONTRATO No: BGA-044-2024
CONTRATISTA : CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V — 27/09/2024
NIT 901863382-1 — 27/12/2024
REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR — $ 1.940.000.000
N/A

OBJETO:

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	SEMANA 1 DEL 30	SEMANA 5 DEL 28 OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE				SEMANA 6 DEL 4 NOVIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE				SEMANA 7 DEL 11 NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE				SEMANA 8 DEL 18 NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE				SEMANA 9 DEL 25 NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE			
			VALOR UNT.	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				$ 0,00		$ 39.945.224,88		$ 0,00		$ 39.945.224,88		$ 33.566,00		$ 39.978.790,88		$ 3.877.360,12		$ 43.856.151,00		$ 1.944.547,77		$ 45.800.698,77
1,1	Suministro e instalacion de Cerramiento provisional en polisombra. Incluye postes cada 1.5, puertas y accesorios	M	$ 15.313			7,50	$ 114.847,50			7,50	$ 114.847,50			7,50	$ 114.847,50			7,50	$ 114.847,50			7,50	$ 114.847,50
1,2	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 19.220			200,61	$ 3.855.724,20			200,61	$ 3.855.724,20			200,61	$ 3.855.724,20			200,61	$ 3.855.724,20			200,61	$ 3.855.724,20
1,3	Desmonte de sanitarios (Incluye trasiego y disposición final)	UND	$ 33.566									1,00	$ 33.566,00	1,00	$ 33.566,00			1,00	$ 33.566,00			1,00	$ 33.566,00
1,4	Desmonte de puertas en madera	UND	$ 36.403			23,00	$ 837.269,00			23,00	$ 837.269,00			23,00	$ 837.269,00			23,00	$ 837.269,00			23,00	$ 837.269,00
1,7	Desmonte de luminarias. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 35.254			78,00	$ 2.749.812,00			78,00	$ 2.749.812,00			78,00	$ 2.749.812,00			78,00	$ 2.749.812,00			78,00	$ 2.749.812,00
1,8	Desmonte y retiro de mueble bajo en madera H hasta 1.20 m de altura. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 37.548			41,09	$ 1.542.847,32			41,09	$ 1.542.847,32			41,09	$ 1.542.847,32			41,09	$ 1.542.847,32			41,09	$ 1.542.847,32
1,9	Desmonte y retiro de bibliotecas en madera medidas aprox 2,5 m x1,63 m. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 121.586			8,00	$ 972.688,00			8,00	$ 972.688,00			8,00	$ 972.688,00			8,00	$ 972.688,00			8,00	$ 972.688,00
1,10	Desmonte de revestimiento en madera sobre muro H hasta 1.20 m. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 28.517			66,53	$ 1.897.236,01			66,53	$ 1.897.236,01			66,53	$ 1.897.236,01			66,53	$ 1.897.236,01			66,53	$ 1.897.236,01
1,12	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye Tubería trasiego y disposición final)	UN	$ 29.965			102,00	$ 3.056.430,00			102,00	$ 3.056.430,00			102,00	$ 3.056.430,00			102,00	$ 3.056.430,00			102,00	$ 3.056.430,00
1,13	Desmonte Cable UTP Equivalente a mt de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 1.655			1564,50	$ 2.589.247,50			1564,50	$ 2.589.247,50			1564,50	$ 2.589.247,50			1564,50	$ 2.589.247,50			1564,50	$ 2.589.247,50
1,15	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 31.067			592,74	$ 18.414.538,63			592,74	$ 18.414.538,63			592,74	$ 18.414.538,63			592,74	$ 18.414.538,63			592,74	$ 18.414.538,63
1,16	Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección >= 0,70 X 0,35 M. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 48.556			80,62	$ 3.914.584,72			80,62	$ 3.914.584,72			80,62	$ 3.914.584,72	75,85	$ 3.682.972,60	156,47	$ 7.597.557,32			156,47	$ 7.597.557,32
1,20	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 24.767																	36,20	$ 896.525,77	36,20	$ 896.525,77
1,22	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye acabados, trasiego y disposición final)	M2	$ 29.240													6,65	$ 194.387,52	6,65	$ 194.387,52			6,65	$ 194.387,52
1,26	Escarificado de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)		$ 13.632																	27,25	$ 371.472,00	27,25	$ 371.472,00
1,28	Desmonte, reinstalacion y Mantenimiento de puerta de vidrio (incluye suministro de tornilleria, ajuste de base y herrajes)		$ 338.275																	2,00	$ 676.550,00	2,00	$ 676.550,00
2	**IMPERMEABILIZACIONES**				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 8.136.754,01		$ 8.136.754,01
2.1	Suministro e instalacion sistema de impermeabilizacion con Mortero cementoso bicomponente de elevada elasticidad (puenteo de fisuras >2 mm) tipo mapelastic smart + refuerzo en malla de fibra de vidrio + refuerzos en cambios de angulo(Suministro e instalación. Incluye equipos y accesorios)	M2	$ 98.341																	82,74	$ 8.136.754,01	82,74	$ 8.136.754,01
3.	**MAMPOSTERÍA**				$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 435.384,17		$ 435.384,17		$ 0,00		$ 435.384,17
3.1	Muro en bloque No 4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2	$ 65.491													6,65	$ 435.384,17	6,65	$ 435.384,17			6,65	$ 435.384,17
4	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**				$ 0,00		$ 0,00		$ 402.365,83		$ 402.365,83		$ 0,00		$ 402.365,83		$ 0,00		$ 402.365,83		$ 0,00		$ 402.365,83
4.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo fibracasa) y acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, fibracasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	$ 129.793					2,31	$ 299.821,83	2,31	$ 299.821,83			2,31	$ 299.821,83			2,31	$ 299.821,83			2,31	$ 299.821,83
4.2	Division para muebles en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho=80 cm, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M	$ 120.640					0,85	$ 102.544,00	0,85	$ 102.544,00			0,85	$ 102.544,00			0,85	$ 102.544,00			0,85	$ 102.544,00
7.	**CIELO RASOS**				$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 60.198.097,96		$ 60.198.097,96
7.4	Cielo raso en PVC 10 mm color de eleccion (Suministro e instalación. Incluye perfilería, estructura y todo lo referente para su correcta instalacion)	M2	$ 108.342																	555,63	$ 60.198.097,96	555,63	$ 60.198.097,96
8.	**ESTUCO Y PINTURA**				$ 0,00		$ 2.354.555,79		$ 0,00		$ 2.354.555,79		$ 0,00		$ 2.354.555,79		$ 0,00		$ 2.354.555,79		$ 0,00		$ 2.354.555,79
8.1	Suministro y aplicación de Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 18.450			127,62	$ 2.354.555,79			127,62	$ 2.354.555,79			127,62	$ 2.354.555,79			127,62	$ 2.354.555,79			127,62	$ 2.354.555,79
9.	**ENCHAPES Y ACABADOS**				$0,00		$0,00		$0,00		$0,00		$0,00		$0,00		$0,00		$0,00		$5.384.810,54		$5.384.810,54
9,7	Piso en ceramica (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	M2	$ 106.315																	36,20	$ 3.848.432,90	36,20	$ 3.848.432,90
9,9	Guardaescoba en Cerámica. (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	M	$ 49.433																	31,08	$ 1.536.377,64	31,08	$ 1.536.377,64
10.	**CUBIERTA**				$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 35.678.576,640		$ 35.678.576,6400
10.1	Suministro e instalacio de toldo fijo flotante, Incluye estructura metalica tuberia 3 x 1 1/2 cal 18, perfileria en aluminio arquitectonico y cubierta en lona americana 100% Acrilico tefado en masa Sunacryl Schmarbar >370, con soportes en tubo de 1"	M2	$ 497.748,00																	71,68	$ 35.678.576,64	71,68	$ 35.678.576,64
13.	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS**																				$ 6.774.911,00		$ 6.774.911,00
13.1	Suministro e instalación de puertas de oficina en vidrio templado de 10mm incluye chapatas pivotadas en acero inoxidable y tope de puerta al piso con Cerradura digital biométrica para puerta de vidrio (metodos de Apertura remota, Con huella dactilar, Con código de seguridad, Con tarjeta RFID, Codigo temporales) sandblasting de maximo 1,20 con rayas, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalación	UN	$ 2.471.279																	1,00	$ 2.471.279,00	1,00	$ 2.471.279,00
13.3	Suministro e instalación de puertas de oficina en vidrio templado de 10mm incluye chapetas pivotadas en acero inoxidable con portacerradura y recibidor en acero, cerradura tipo yale de palanca y tope de puerta al piso sandblasting de maximo 1,20 con rayas, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalación	M2	$ 537.954																	8,00	$ 4.303.632,00	8,00	$ 4.303.632,00
14.	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**				$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 45.126,00		$ 45.126,00		$ 0,00		$ 45.126,00		$ 0,00		$ 45.126,00
14.1	Reinstalación Sanitarios existentes.	UN	$ 45.126									1,00	$ 45.126,00	1,00	$ 45.126,00			1,00	$ 45.126,00			1,00	$ 45.126,00
16.	**INSTALACIONES SANITARIAS**				$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 530.625,60		$ 530.625,60		$ 0,00		$ 530.625,60		$ 0,00		$ 530.625,60
16.1	Mantenimiento de la red sanitaria , incluye revision y destape con sonda .	M	$ 36.849									14,40	$ 530.625,60	14,40	$ 530.625,60			14,40	$ 530.625,60			14,40	$ 530.625,60

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA

INFORME SEMANAL — **No . 9**

CONTRATO No: BGA-044-2024
CONTRATISTA : CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V — 27/09/2024
NIT 901863382-1 — 27/12/2024
REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR — $ 1.940.000.000
N/A

OBJETO:

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	SEMANA 1 DEL 30	SEMANA 5 DEL 28 OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE				SEMANA 6 DEL 4 NOVIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE				SEMANA 7 DEL 11 NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE				SEMANA 8 DEL 18 NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE				SEMANA 9 DEL 25 NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE			
			VALOR UNT.	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR
17	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				$ 0,00		$ 17.542.030,00		$ 2.685.578,00		$ 20.227.608,00		$ 25.572.616,71		$ 45.800.224,71		$ 0,00		$ 45.800.224,71		$ 38.901.740,00		$ 84.701.964,71
17,4	Suministro, transporte e instalación de salida para iluminación 110 v, incluye caja octogonal, caja rectangular, interruptor sencillo, conectores 3M, 3 mts de cable Cu 3x12 THWNN LSZH, 3 mts de ducto conduit sch 40 Ø 1/2", clavija aerea tipo hembra 15 A, clavija aerea tipo macho 15 A, 1 mt de cable encauchetado 3x14 AWG THWN LSZH	UN	$ 159.473			110,00	$ 17.542.030,00			110,00	$ 17.542.030,00			110,00	$ 17.542.030,00			110,00	$ 17.542.030,00			110,00	$17.542.030,00
17,6	Suministro, transporte e instalación de Salida Tomacorriente 110 v, incluye: 3 mts de cable Cu 3x12 AWH THWNN LSZH, toma blanco 20 A y tapa	UN	$ 159.473																	115,00	$ 18.339.395,00	115,00	$18.339.395,00
17,7	Suministro, transporte e instalación de Salida Toma regulada 110 v, incluye: 3 mts de cable Cu 3x12 AWH THWNN LSZH, toma naranja 20 A y tapa	UN	$ 178.803																	115,00	$ 20.562.345,00	115,00	$20.562.345,00
17,9	Suministro, transporte e instalación de Canaleta metálica 12x5 cm, en pintura electrostatica blanca, con separador, incluye: elementos de fijación y soporte	M	$ 98.119									124,09	$12.175.586,71	124,09	$12.175.586,71			124,09	$ 12.175.586,71			124,09	$12.175.586,71
17.10	Suministro, transporte e instalación de Red de cable 3x 12 AWG THWNN LSZH	M	$ 16.141									830,00	$13.397.030,00	830,00	$13.397.030,00			830,00	$ 13.397.030,00			830,00	$13.397.030,00
17,12	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 3/4" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M	$ 16.141					108,00	$1.743.228,00	108,00	$1.743.228,00			108,00	$1.743.228,00			108,00	$ 1.743.228,00			108,00	$1.743.228,00
17,13	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 1" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M	$ 18.847					50,00	$942.350,00	50,00	$942.350,00			50,00	$942.350,00			50,00	$ 942.350,00			50,00	$942.350,00
20	**NO PREVISTOS**				$0,00		$0,00		$0,00		$0,00		$0,00		$0,00		$0,00		$0,00		$96.267.080,40		$96.267.080,40
NP.1	Suministro, transporte e instalacion de bandeja tipo malla de 20 x 6 cm. Incluye elementos de fijacion y soporte.	M	$ 145.749,00																	39,45	$ 5.749.679,70	39,45	$5.749.679,70
NP.2	Suministro, transporte e instalacion de bandeja tipo malla de 20 x 6 cm. Incluye elementos de fijacion y soporte.	M	$ 124.352,00																	17,03	$ 2.117.714,56	17,03	$2.117.714,56
NP.3	Suministro, transporte e instalación de transferencia manual para UPS entre 10 a 15KVA (incluye gabinete de 36x80 Base transferencia, protecciones de del trifásicas 3x40, barrajes y accesorios para su correcto funcionamiento)	UN	$ 1.509.419,00																	1,00	$ 1.509.419,00	1,00	$1.509.419,00
NP.4	Traslado de acometida de alimentación de UPS de 15 kva a tablero de distribución principal	UN	$ 448.016,00																	1,00	$ 448.016,00	1,00	$448.016,00
NP.5	Suministro, transporte e instalación de rack abierto de 2.10mts con dos organizadores verticales, 4 bandejas portacable de rack, dos multitoma, 6 hernaje patch panel y barraje platina para sistema puesta tierra.	UN	$ 7.448.112,00																	1,00	$ 7.448.112,00	1,00	$7.448.112,00
NP.6	Suministro de de automaticos de 1 x 20 Amp, enchufatiles para circuito de iluminacionternas normales y regulatas	UN	$ 30.046,00																	45,00	$ 1.352.070,00	45,00	$1.352.070,00
NP.9	Suministro, transporte e instalación de Cable UTP, LSZH, categoría 6A	M	$ 13.110,00																	4230,00	$ 42.765.300,00	4230,00	$42.765.300,00
NP.10	Suministro, transporte e instalación de Salida voz y datos Categoría 6A, incluye: caja rectangular, herrajes, jack, faux plate, 3 mts de cable UTP categoria 6A, ponchado del cable y marcación	UND	$ 159.385,00																	115,00	$ 18.329.275,00	115,00	$18.329.275,00
NP.22	Suministro e instalación de tuberia de cobre con aislamiento térmico tipo rubotex y cable control para sistemas de aires acondicionados de hasta 36.000 BTU.	M	$ 119.351,00																	107,70	$ 12.531.002,70	107,70	$12.531.002,70
NP.26	Suministro e instalación de anclaje de refuerzo para fijación de divisiones en vidrio templado de 10mm los refuerzos se harán con tubular metálico calibre 16 de 3 x 1 1/2 con varilla roscada de 1/8 doble tuerca y arandela y epóxido para fijación.	M	$ 39.308,00																	102,18	$ 4.016.491,44	102,18	$4.016.491,44
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 0,00		$ 59.841.810,67		$ 3.087.943,83		$ 62.929.754,50		$ 26.181.934,31		$ 89.111.688,81		$ 4.312.744,29		$ 93.424.433,10		$ 253.286.518,32		$ 346.710.951,42
	ADMINISTRACIÓN	20%			$ 0,00		$ 11.968.362,00		$ 617.589,00		$ 12.585.951,00		$ 5.236.387,00		$ 17.822.338,00		$ 862.549,00		$ 18.684.887,00		$ 50.657.304,00		$ 69.342.190,00
	IMPREVISTOS	1%			$ 0,00		$ 598.418,00		$ 30.879,00		$ 629.298,00		$ 261.819,00		$ 891.117,00		$ 43.127,00		$ 934.244,00		$ 2.532.865,00		$ 3.467.109,00
	UTILIDAD	5%			$ 0,00		$ 2.992.091,00		$ 154.397,00		$ 3.146.488,00		$ 1.309.097,00		$ 4.455.584,00		$ 215.637,00		$ 4.671.222,00		$ 12.664.326,00		$ 17.335.548,00
	TOTAL AIU	26%			$ 0,00		$ 15.558.871,00		$ 802.865,00		$ 16.361.736,00		$ 6.807.302,92		$ 23.169.039,09		$ 1.121.313,51		$ 24.290.352,61		$ 65.854.495,00		$ 90.144.847,00
	IVA SOBRE UTILIDAD	19%			$ 0,00		$ 568.497,29		$ 29.335,43		$ 597.832,72		$ 246.728,43		$ 846.560,96		$ 40.971,03		$ 887.532,18		$ 2.406.221,94		$ 3.293.754,12
	COSTO TOTAL DE OBRA				$ 0,00		$ 75.969.178,96		$ 3.920.144,26		$ 79.889.324,22		$ 33.237.965,74		$ 113.127.288,77		$ 5.475.028,32		$ 118.602.318,28		$ 321.547.235,26		$ 440.149.552,54
	COSTO TOTAL DE OBRA + SUMINISTROS												$ 33.237.965,74		$ 113.127.288,77		$ 5.475.028,32		$ 118.602.318,28		$ 411.725.252,00		$ 530.327.569,28
	AVANCE SEMANAL (%)				0%				0,20%				1,71%		5,83%		0,28%		6,11%		21,22%		27,34%

Ingeniero Residente Interventoria — JENCY JULIANA MARTINEZ OVALLE

Alexander Ramirez Marquez
Ing. Residente de Obra, Consorcio Ifraestructura A&v

19	**OTRAS COMPRAS O SERVICIOS REQUERIDOS**	UNIDAD	SEMANA 1 DEL 30	SEMANA 5 DEL 28 OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE				SEMANA 6 DEL 4 NOVIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE				SEMANA 7 DEL 11 NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE				SEMANA 8 DEL 18 NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE				SEMANA 9 DEL 25 NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE			
			VR. UNITARIO CONTRACTUAL																				
19.1	Juego de 2 Sillones de Exterior 1.80x.0,9 m con estructura en tubo de aluminio pared 2mm, soldados, totalmente pulidos y pintados con pintura poliéster electrostática para exteriores de color a escoger. Asientos y espaldares en espuma anti hongos de diferentes densidades forrada con tela 100% acrílica importada americana de color a escoger, Cojin de asiento de 15cm de altura.	UN	$ 13.634.350,00																				
19.2	Sillon de exterior sin brazos de 0.9x 0,9 con estructura en tubo de aluminio pared 2mm, soldados, totalmente pulidos y pintados con pintura poliester electrostática para exteriores de color a escoger. Asientos y espaldares en espuma anti hongos de diferentes densidades forrada con tela 100% acrílica importada americana de color a escoger, Cojin de asiento de 15cm de altura. Mesas de centro con superficies en WPC (Wood Plastic Composite) de color a escoger.	UN	$ 3.679.455,00																				
19.3	Mesa de centro para exterior 0,9x0,6 con estructura en tubo de aluminio pared 2mm esblada, totalmente pulida y pintada con pintura poliéster electrostática para exteriores de color a escoger con superficies en WPC (Wood Plastic Composite) de color a escoger.	UN	$ 2.012.900,00																				
19.4	Mesa para exterior de 180 x 90 cm, con superficie en tablones de WPC (Wood Plastic Composite) de color a escoger. Estructura en aluminio acabada con pintura poliester electrostática de color a escoger. Altura 75cm. Nivelatores en las patas.	UN	$ 9.899.650,00																				
19.5	Sillas para exterior con estructura de aluminio, hierraje de unión exclusivo y tornillería en acero inoxidable sin soldaduras. Terminado de la estructura en pintura electrostática color a escoger. Tapones en ABS inyectados de alta resistencia con Bling importado americano tipo malla con recubrimiento sintético de alta resistencia en color a escoger con protección U.V.	UN	$ 1.159.900,00																				
19.6	Cartelera Tipo Vitrina Magnética de 100×100 cm, incluye marco en aluminio, respaldo metálico, personalizada con logo y/o titulo, puertas corredizas en vidrio y chapa con 2 llaves. Incluye 6ft material tipo rotoplas.	UN	$ 1.614.055,00																				
19.7	Juego Banderia de 1.50 x 1.10 m incluye banderia para interior , base en madera con platina de 3 niveles 0.15 m x 0.35 m, asta desarmable de 2 m en madera y moharra Scm removible, elaborada en tela poliéster 100% sublimado o en satin pintado de lujo, brillante, confeccionada en doble faz, con un bolsillo al lado izquierdo con el espacio para fijar el asta (sistema tubular), cordón de amarre de color, refuerzos de costura, bastillera.	UN	$ 882.877,00																				
19.8	Juego Banderia de 2,.06 m x1.45 m incluye banderia para interior , base en madera con platina de 3 niveles 0.15 m x 0.60 m, asta desarmable de 3 m en madera y moharra Scm removible, elaborada en tela poliéster 100% sublimado o en satin pintado de lujo, brillante, confeccionada en doble faz, con un bolsillo al lado izquierdo con el espacio para fijar el asta (sistema tubular), cordón de amarre de color, refuerzos de costura, bastillera.	UN	$ 758.511,00																				
19.9	Banderas para exterior, material impermeable (Tempestad), doble faz con agarraderas, costuras reforzadas. Medidas de 3 x 2 metros.	UN	$ 539.729,00																				
19.10	Suministro e instalación de puesto de trabajo en U tipo Magistrado conformado por tres módulos en madera y vidrio.	UN	$ 9.315.750,00																				

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA

INFORME SEMANAL **No . 9**

CONTRATO No: BGA-044-2024
CONTRATISTA : CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V 27/09/2024
NIT 901863382-1 27/12/2024
REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR $ 1.940.000.000
N/A

OBJETO:

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	SEMANA 1 DEL 30	SEMANA 5 DEL 28 OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE				SEMANA 6 DEL 4 NOVIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE				SEMANA 7 DEL 11 NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE				SEMANA 8 DEL 18 NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE				SEMANA 9 DEL 25 NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE			
			VALOR UNT.	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR	CANT EJECUT	TOTAL	CANT.ACUMU	ACUM EN VALOR
19.11	Suministro e instalación de puesto de trabajo en U tipo Magistrado conformado por tres módulos en madera	UN	$ 4.832.505,00																				
19.12	Sofa de dos puestos (juego despacho magistrado) tapizado en pirama con detalles de madera	UN	$ 4.059.300,00																				
19.13	Poltrona (juego despacho magistrado) tapizado en pirama con detalles de madera	UN	$ 2.416.250,00																				
19.14	Mesa de centro en madera de medidas 0.9x0.6x0.4	UN	$ 918.175,00																				
19.15	Silla interlocutora tipo magistrado	UN	$ 434.925,00																				
19.16	Mesa en madera rectangular con laterales ovalados para juntas tipo magistrado de 3.20 x 1.2	UN	$ 4.059.300,00																				
19.17	Mesa en madera rectangular con laterales ovalados para juntas tipo magistrado de 1,80 m x 1.2m	UN	$ 2.107.252,00																				
19.18	Silla tipo ejecutivo	UN	$ 468.753,00																				
19.19	Silla tipo presidencial	UN	$ 628.225,00																				
19.20	Mueble de recepción en madera y superficies en WPC (Wood Plastic Composite) de 2 m de largo a doble altura	UN	$ 4.155.950,00																				
19.21	Parasol telescópico de 3x3m con estructura 100% inoxidable	UN	$ 7.828.650,00																				
19.22	Letras para aviso de entrada principal en Bronce de altura 12 cm	UN	$ 109.315,00																				
19.23	Letras para aviso de entrada principal en Aluminio de altura 12 cm	UN	$ 77.320,00																				
19.24	Placa en bronce de 0,50 X0,50 m grabada con el Logo de la Rama judicial	UN	$ 1.623.720,00																				
19.25	Placa en Aluminio de 0,50 X0,50 m grabada con el Logo de la Rama judicial	UN	$ 1.063.150,00																				
19.26	Horno microondas industrial para trabajo pesado en acero inoxidable, P:1000w v 110 capacidad >22 lts	UN	$ 2.416.250,00																				
NP 14	Suministro e instalación de aire Acondicionado de 12.000BTU. Incluye tubería sobre aislada en rutuales, bomba condensadora y base para condensadora	UN	$ 4.662.798,00																	1,00	$ 4.662.798,00	1,00	$4.662.798,00
NP 15	Suministro e instalación de aire Acondicionado de 24.000BTU. Incluye tubería sobre aislada en rutuales, bomba condensadora y base para condensadora	UN	$ 6.704.518,00																	2,00	$ 13.409.036,00	2,00	$13.409.036,00
NP 16	Suministro e instalación de aire Acondicionado de 36.000BTU. Incluye tubería sobre aislada en rutuales, bomba condensadora y base para condensadora	UN	$ 14.427.003,00																	4,00	$ 57.708.012,00	4,00	$57.708.012,00
																						COSTO DIRECTO	**$75.779.846,00**
																						IVA (19%)	$14.398.170,74
																						COSTO TOTAL	**$90.178.016,74**


Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	1.3 Desmonte de aparatos sanitarios. (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	1,00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES			V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)				
Oficina Seccional Judicatura					**1,00**	UN	**1,00**
Aproxima Resultado a : Decimales						**TOTAL**	**1,00**

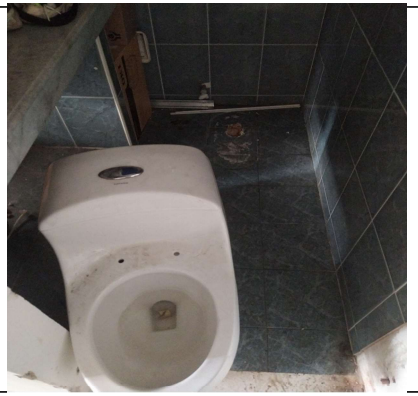

Observaciones:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	M
ITEM:	1.16. Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección >= 0,70 X 0,35 M. (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	156,47

AREA O LUGAR	LARGO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
DESMONTE DUCTOS PRINCIPALES	75,85						75,85
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			TOTAL	156,47



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	M2
ITEM:	1.2. Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	36,20

AREA O LUGAR	ALTO (M)	ANCHO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Oficina magistrado Palacio de Justicia	4,48	4,58				M2	20,52
	4,48	3,50				M2	15,68
							-
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			TOTAL	36,20







OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	M2
ITEM:	1,22 Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye acabados, trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	6,65

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS				
MURO OFICINA SECRETARIA DE PRESIDENTE		2,40	2,77		6,65		M2	**6,65**
Aproxima Resultado a :				2 Decimales			**TOTAL**	**6,65**





Observaciones:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	M2
ITEM:	1.26. Escarificado de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	**CANTIDAD:**	27,25

AREA O LUGAR	LARGO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Muros Terraza	11,10	0,90				M2	9,99
	12,40	0,70				M2	8,68
	11,44	0,75				M2	8,58
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			**TOTAL**	**27,25**





OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD:**	UND
ITEM:	1.28. Desmonte, reinstalacion y Mantenimiento de puerta de vidrio (incluye suministro de tornilleria, ajuste de base y herrajes)	**CANTIDAD:**	2,00

AREA O LUGAR	LARGO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Entrada Oficinas administrativas					1,00	und	1,00
Entrada Oficina area seccional					1,00	und	1,00
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			TOTAL	2,00





OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	IMPERMEABILIZACIONES	**UNIDAD:**	M2
ITEM:	2.1. Suministro e instalacion sistema de impermeabilizacion con Mortero cementoso bicomponente de elevada elasticidad (puenteo de fisuras >2 mm) tipo mapelastic smart + refuerzo en malla de fibra de vidrio + refuerzos en cambios de angulo(Suministro e instalación. Incluye equipos y accesorios)	**CANTIDAD:**	82,74

AREA O LUGAR	LARGO (M)	ANCHO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Terraza 5to piso	7,00	1,73				M2	12,11
	12,30	5,10				M2	62,73
	6,27	1,26				M2	7,90
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			**TOTAL**	**82,74**

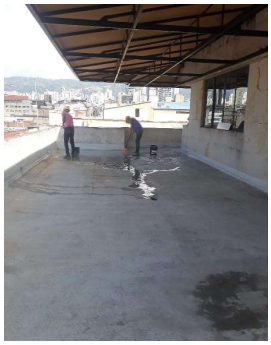

OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA	**UNIDAD:**	M2
ITEM:	3,10 Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	**CANTIDAD:**	6,65

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS				
MURO OFICINA SECRETARIA DE PRESIDENTE		2,40	2,77		6,65		M2	**6,65**
Aproxima Resultado a :				2 Decimales			**TOTAL**	**6,65**



Observaciones:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO	**UNIDAD:**	M2
ITEM:	4.1 Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e in	**CANTIDAD:**	2,31

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	ÀREA PARCIAL	ÁREA	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Oficinas Admon , (Ofi. Director)	1,10	2,10		2,31	2,31		M2	2,31
					-			-
					-			-
					-			-
					-			-
Aproxima Resultado a :							TOTAL	2,31





OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO	**UNIDAD:**	M
ITEM:	4.2 Division para mueble en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<80 cm, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incl	**CANTIDAD:**	0,85

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	ÀREA PARCIAL	ÁREA	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFICINA DE SECRETARIA DIRECTOR	0,85			-	-		m	0,85
				-	-			
					-			-
					-			-
					-			-
					-			-
					-			-
					-			-
Aproxima Resultado a :				2			TOTAL	0,85





OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CIELO RASO	UNIDAD:	M2
ITEM:	7.4. Cielo raso en PVC 10 mm color de eleccion (Suministro e instalación. Incluye perfilería, estructura y todo lo referente para su correcta instalacion)	CANTIDAD:	555,63

AREA O LUGAR	LARGO (M)	ANCHO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Oficina Director	6,40	5,20	0,55			M2	32,73
Baño Oficina Director	2,22	1,72				M2	3,82
Oficina Seccional Judicatura	7,90	3,79				M2	29,94
Oficina Vicepresidente	1,45	4,12				M2	5,97
	4,73	4,38				M2	20,72
	1,26	0,88				M2	1,11
	1,10	2,00				M2	2,20
	4,12	0,62				M2	2,55
Oficina Presidente	5,95	4,66				M2	27,73
	2,14	0,94				M2	2,01
	2,32	1,84				M2	4,27
	1,38	0,85				M2	1,17
	1,75	0,78				M2	1,37
Oficina Secretaria Presidente	5,45	2,07				M2	11,28
	3,77	0,50				M2	1,89
Oficina Secretaria Director	6,40	3,50				M2	22,40
Recepcion	9,50	4,77				M2	45,32
Recepcion	3,67	2,33				M2	8,55
pasillo Magistrado	2,53	0,79				M2	2,00
pasillo Magistrado	1,81	0,77				M2	1,39
pasillo Magistrado	5,45	3,50				M2	19,08
pasillo Magistrado	3,17	1,14				M2	3,61
pasillo Magistrado	9,65	2,51				M2	24,22
Sala de Juntas	6,60	3,62				M2	23,89
Baño hombres	1,93	2,02				M2	3,90
Baño hombres	0,90	0,97				M2	0,87
Baño Mujeres	2,53	3,13				M2	7,92
Salon Admon	6,50	1,50				M2	9,75
Salon Admon	7,95	2,67				M2	21,23
Salon Admon	9,40	5,25				M2	49,35
Salon Admon	18,40	8,65	0,71			M2	158,45
Salon Admon (Guitron)	1,63	0,76			4,00	M2	4,96
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			TOTAL	555,63





OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ENCHAPES Y ACABADOS	**UNIDAD:**	M
ITEM:	9.9. Guardaescoba en Cerámica. (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	**CANTIDAD:**	31,08

AREA O LUGAR	LARGO (M)	ANCHO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Oficina magistrado Palacio de Justicia	34,08		3,00			m	31,08
							-
							-
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			TOTAL	31,08



OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:
Firma:	Firma:
ING. ALEXANDER RAMIREZ	ING. JENCY JULIANA MARTINEZ OVALLE
Cargo: RESIDENTE DE OBRA	Cargo: RESIDENTE INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	ENCHAPES Y ACABADOS	**UNIDAD:**	M2
ITEM:	9.7. Piso en ceramica (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	**CANTIDAD:**	36,20

AREA O LUGAR	ALTO (M)	ANCHO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Oficina magistrado Palacio de Justicia	4,48	4,58				M2	20,52
	4,48	3,50				M2	15,68
							-
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			TOTAL	36,20





OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**


MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CUBIERTA	**UNIDAD:**	M2
ITEM:	10.1. Suministro e instalacio de toldo fijo flotante, Incluye estructura metalica tuberia 3 x 1 1/2 cal 18, perfileria en aluminio arquitectonico y cubierta en lona americana 100% Acrílico teñido en masa Sunacryl Schmerber >370, con soportes en tubo de 1"	**CANTIDAD:**	71,68

AREA O LUGAR	LARGO (M)	ANCHO (M)	DESCUENTOS	Area	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Terraza 5to piso				71,68		M2	71,68
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			TOTAL	71,68







OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	13.1. Suministro e instalación de puertas de oficina en vidrio templado de 10mm incluye chapetas pivotadas en acero inoxidable y tope de puerta al piso con Cerradura digital biométrica para puerta de vidrio (metodos de Apertura remota, Con huella dactilas, Con código de seguridad, Con tarjeta RFID, Codigo temporales) sandblasting de maximo 1.20 con rayas, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion	**CANTIDAD:**	1,00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LARGO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFICINA DIRECTOR					1,00	UN	1,00
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			**TOTAL**	**1,00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	13.3 Suministro e instalacion de puertas de oficina en vidrio templado de 10mm incluye chapetas pivotadas en acero inoxidable con portacerradura y recibidor en acero, cerradura tipo yale de palanca y tope de puerta al piso sandblasting de maximo 1,20 con rayas, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion	**CANTIDAD:**	8,00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LARGO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
SECRETARIA DIRECTOR					2,00	UN	2,00
OFICINA SECCIONAL JUDICTURA					1,00	UN	1,00
OFICINA PRESIDENTE					1,00	UN	1,00
OFICINA VICEPRESIDENTE					1,00	UN	1,00
OFICINA SECRETARIA PRESIDENTE					2,00	UN	2,00
OFICINA SALA JUNTAS					1,00		1,00
Aproxima Resultado a :			2 Decimales			**TOTAL**	**8,00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES	**UNIDAD:**	UND
ITEM:	14.1 Reinstalacion sanitarios existentes	**CANTIDAD:**	1,00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS			
Oficina Seccional Judicatura					1,00	UNIDAD	**1,00**
							-
Aproxima Resultado a :				2		**TOTAL**	**1,00**



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES SANITARIAS	**UNIDAD:**	M
ITEM:	16.1 Mantenimiento de la red sanitaria, revision destape con sonda	**CANTIDAD:**	14,40

AREA O LUGAR	DIMENSIONES			N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)			
Palacio de Justicia	14,40				m	**14,40**
						-
Aproxima Resultado a :					**TOTAL**	**14,40**



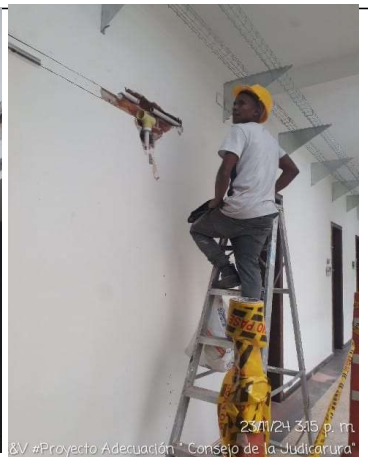

Observaciones:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**UNIDAD:**	UND
ITEM:	17.4 Suministro, transporte e instalación de salida para iluminación 110 v, incluye caja octogonal, caja rectangular, interruptor sencillo, c	**CANTIDAD:**	110,00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Oficinas seccional					27,00	UND	27,00
Oficinas administrativas					75,00	UND	75,00
Área Recepción					8,00	UND	8,00
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**110,00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**UNIDAD:**	UND
ITEM:	17.6 Suministro, transporte e instalación de Salida Tomacorriente 110 v, incluye: 3 mts de cable Cu 3x12 AWH THWNN LSZH, toma blan	**CANTIDAD:**	115,00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
5TO PISO					115,00	UN	115,00
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**115,00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**UNIDAD:**	UND
ITEM:	17.7 Suministro, transporte e instalación de Salida Toma regulada 110 v, incluye: 3 mts de cable Cu 3x12 AWH THWNN LSZH, toma nara	**CANTIDAD:**	115,00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
5TO PISO					115,00	UN	115,00
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**115,00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS		**UNIDAD:**	M
ITEM:	17,9	Suministro, transporte e instalación de Canaleta metalica 12x5 cm, en pintura electrostatica blanca, con separador, incluye: elementos de fijación y soporte	**CANTIDAD:**	124,09

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS				
OFICINA DIRECCIÓN	12,24							**12,24**
OFICINA SECRETARIA DIRECCIÓN	8,50							**8,50**
OFICINAS ADMINISTRATIVAS	25,76							**25,76**
OFICINA SECCIONAL JUDICATURA	14,36							**14,36**
RECEPCIÓN	9,21							**9,21**
RACK	9,49							**9,49**
OFICINA VICEPRESIDENTE	2,20							**2,20**
OFICINA SALA DE JUNTAS	13,24							**13,24**
OFICINA TERRAZA	15,70							**15,70**
OFICINA SECETARIA PRESIDENTE	6,81							**6,81**
OFICINA PRESIDENTE	6,58							**6,58**
								-
			Aproxima Resultado a :		2 Decimales		TOTAL	**124,09**



Observaciones:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5°PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	CONTRATO No	BGA-044-2024

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**UNIDAD:**	M
ITEM:	17,10 Suministro, transporte e instalación de Red de cable 3x 12 AWG THWNN LSZH	**CANTIDAD:**	830,00

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS				
5TO PISO RAMA JUDICIAL	1.520,00			690,00				**830,00**
Aproxima Resultado a :				2 Decimales			**TOTAL**	**830,00**





Observaciones:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**UNIDAD:**	M
ITEM:	17.12 Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 3/4" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, s	**CANTIDAD:**	108,00

AREA O LUGAR	ANCHO (M)	LONGITUD	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
OFINAS DMON RAMA JUDIACIAL		72,90				ML	72,90
OFICINAS DE MAGISTRADOS		29,30				ML	29,30
RECEPCION		5,80				ML	5,80
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**108,00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	**UNIDAD:**	M
ITEM:	17.13 Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 1" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador,	**CANTIDAD:**	50,00

AREA O LUGAR	LONGITUD (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Oficinas administrativa	35,70					M	35,70
Oficinas seccional	8,50					M	8,50
Área Recepción	5,80					M	5,80
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**50,00**



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	M
ITEM:	NP.1 Suministro, transporte e instalacion de bandeja tipo malla de 30 x 6 cm. Incluye elementos de fijacion y soporte.	**CANTIDAD:**	39,45

AREA O LUGAR	LONGITUD (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
5TO PISO	39,45					M	39,45
							-
							-
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**39,45**





OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	M
ITEM:	NP.2 Suministro, transporte e instalacion de bandeja tipo malla de 20 x 6 cm. Incluye elementos de fijacion y soporte.	**CANTIDAD:**	17,03

AREA O LUGAR	LONGITUD (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
5TO PISO	17,03					M	17,03
							-
							-
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**17,03**

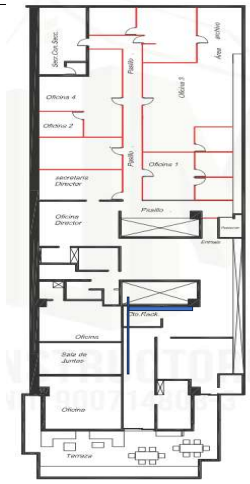



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	NP.3 Suministro, transporte e instalación de transferencia manual para UPS entre 10 a 15KVA (incluye gabinete de 30x50 llave transferer	**CANTIDAD:**	1,00

AREA O LUGAR	LONGITUD (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
5TO PISO					1,00	UN	1,00
							-
							-
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**1,00**

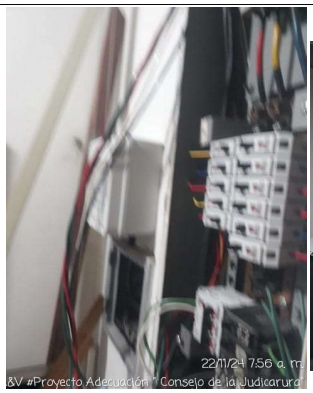



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	NP.4 Traslado de acometida de alimentación de UPS de 15 kva a tablero de distribución principal	**CANTIDAD:**	1,00

AREA O LUGAR	LONGITUD (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
5TO PISO					1,00	UN	1,00
							-
							-
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**1,00**

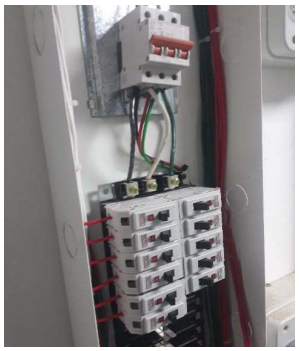



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	NP.5 Suministro, transporte e instalación de rack abierto de 2.10mts con dos organizadores verticales, 4 bandejas portacable de rack, dos	**CANTIDAD:**	1,00

AREA O LUGAR	LONGITUD (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
5TO PISO					1,00	UN	1,00
							-
							-
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**1,00**



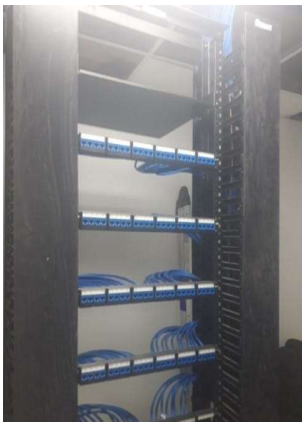

OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	NP.8 Suministro de de automaticos de 1 x 20 Amp, enchufables para circuitis de ilumnaciontomas normales y reguladas	**CANTIDAD:**	45,00

AREA O LUGAR	LONGITUD (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
5TO PISO					45,00	UN	45,00
							-
							-
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**45,00**

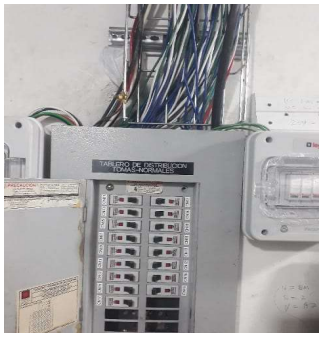

OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	M
ITEM:	NP.9 Suministro, transporte e instalación de Cable UTP, LSZH, categoria 6A	**CANTIDAD:**	4.230,00

AREA O LUGAR	LONGITUD (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
5TO PISO	4.575,00		345,00			M	4.230,00
							-
							-
Aproxima Resultado a :						TOTAL	4.230,00

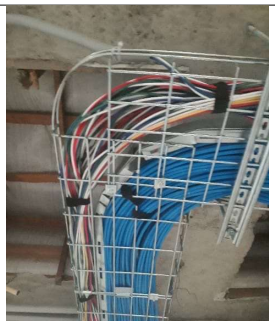

OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	NP.10 Suministro, transporte e instalación de Salida voz y datos Categoria 6A, incluye: caja rectangular, herrajes, jack, face plate, 3 mts d	**CANTIDAD:**	115,00

AREA O LUGAR	LONGITUD (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
5TO PISO					115,00	UN	115,00
							-
							-
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**115,00**





OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	NP.14 Suministro e Instalación de aire Acondicionado de 12.000BTU. Incluye tuberia cobre aislada en rubatex, bomba condensadora y base para condensadora	**CANTIDAD:**	1,00

AREA O LUGAR	LONGITUD (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Cuarto de RACK					1,00	UN	1,00
							-
							-
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**1,00**

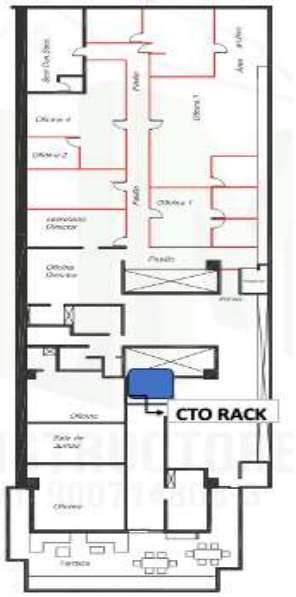



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	NP.15 Suministro e Instalación de aire Acondicionado de 24.000BTU . Incluye tuberia cobre aislada en rubatex, bomba condensadora y base para condensadora	**CANTIDAD:**	2,00

AREA O LUGAR	LONGITUD (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Oficina Secretaria Presidente Consejo					1,00	UN	1,00
Oficina Seccional Judicatura					1,00	UN	1,00
							-
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**2,00**

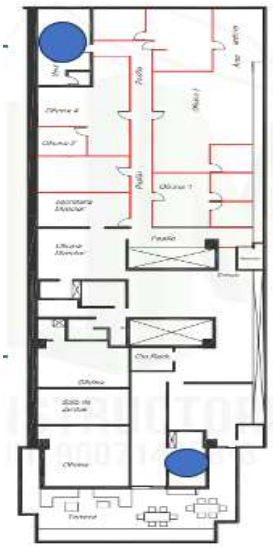



OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	NP.16 Suministro e Instalación de aire Acondicionado de 36.000BTU Incluye tuberia cobre aislada en rubatex, bomba condensadora y base para condensadora	**CANTIDAD:**	4,00

AREA O LUGAR	LONGITUD (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Oficina Presidente Consejo					1,00	UN	1,00
Oficina Vicepresidente Consejo					1,00	UN	1,00
Oficina Terraza					1,00	UN	1,00
Oficina Dirección					1,00	UN	1,00
Aproxima Resultado a :						**TOTAL**	**4,00**





OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	M
ITEM:	NP.22 Suministro e instalación de tubería de cobre con aislamiento térmico tipo rubatex y cable control para sistemas de aires acondicionados de hasta 36.000 BTU.	**CANTIDAD:**	107,70

AREA O LUGAR	LONGITUD (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
LINEA EQUIPO OFI. DIRECTOR	12,38					M	12,38
LINEA EQUIPO OFI. PRSIDENTE	14,00					M	14,00
SECRETARIA PRESIDENTE	16,60					M	16,60
SECCIONAL JUDICATURA	16,30					M	16,30
CTO RACK	24,60					M	24,60
CTO ADYACENTE A TERRAZA	14,55					M	14,55
VICEPRESIDENTE	9,27					M	9,27
Aproxima Resultado a :						TOTAL	107,70

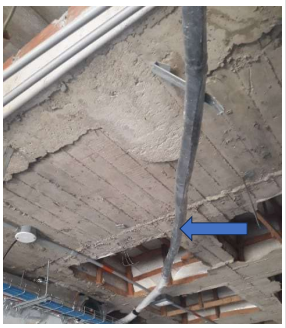

OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"	**CONTRATO No**	**BGA-044-2024**

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	NO PREVISTOS	**UNIDAD:**	UN
ITEM:	NP.26 Suministro e instalación de anclaje de refuerzo para fijación de divisiones en vidrio templado de 10mm los refuerzos se harán con tubular metálico calibre 16 de 3 x 1 1/2 con varilla roscada de 1/8 doble tuerca y arandela y epóxido para fijación.	**CANTIDAD:**	102,18

AREA O LUGAR	LONGITUD (M)	ALTO (M)	DESCUENTOS	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
Salon Oficinas Admon	102,18						102,18
							-
Aproxima Resultado a :						TOTAL	102,18







PERFIL 3 1/2"

OBSERVACIONES:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTROL DEL PERSONAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	CONTRATO No	BGA-044-2024

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL

MES / NOVIEMBRE	DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total Jornales
NOMBRE	CARGO	Total personal por dias																														
ANDRES VARGAS	Maestro de obra	0	0	0	1	1	0	1	0	0		1	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	20
LUIS CELIS	Auxiliar de obra	1	1	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		25
ISAID NIÑO QUIHAY	Auxiliar de obra	1	1	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		25
YEFERSON CLEMENTE	Auxiliar de obra	1	1	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		25
LEONARDO HERRERA	Tecnico Electricista	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		11
ARLEY URREA ORTIZ	Tecnico Electricista	1	1	1	1	1	1	0	0	0		1	1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		13
ALEXANDER NOGUERA GUTIERREZ	Auxiliar Electrico	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		16
EDUIW FLORES	Instalador toldos	1		1	1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		8
ALEJANDRO CALDERON	Instalador toldos	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		13
RONALD	TÉCNICO AIRES	0	0	0	0	0	0	1	1	1		0	0	0	0	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		16
JUAN DAVID	TÉCNICO AIRES	0	0	0	0	0	0	1	1	1		1		1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	0	0	1	1		16
MiLTON	TÉCNICO AIRES (ductero)	0	0	0	0	0	0	1	1	1		1	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	1	1	1	7
JAIME PRADA	Instalador Vidrio	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	1	1	1	1		0	1	1	1	1		8
ALVEIRO SANCHES	Instalador Vidrio	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			1	1	1	1		0	1	1	1	1		8
ALEXANDER RAMIREZ	Ingeniero residente	1	1	0	1	1	0	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		24
VIVIANA RAMIREZ	Siso	1	1	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		25
TOTAL		9	8	4	10	10	8	12	11	11	0	11	9	9	9	11	11	10	0	9	10	11	11	11	0	9	10	10	12	12	2	260

Observaciones:
