JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ
NIT: 94407112-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 42 NORTE 7 71 CON TERRAZAS DE CHIPICHAPE CA 2 D, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Tel. 3127838212
Email. gerencia@jaimeduqueingenieria.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764079018441 válida desde 2024-09-06 hasta 2025-03-06 rango desde FELE47 hasta FELE200.

Cliente: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS
NIT : 890399011
Dirección: AV 2 NORTE 10 70 CAM TORRE ALCALDIA DE CALI, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono: 6026531063
Email: facturaselectronicas@cali.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 09/01/2025
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FELE62
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 17:43:57-05:00
FECHA FIRMADO: 09/12/2024 17:43:59

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	12	2024	09	01	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	HONORARIOS ACTA FINAL CONTRATO 4182.010.26.1.491-2023INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO ACUEDUCTO FLAMENCO - CORREGIMIENTO EL HORMIGUERO	WSD	1,00	$20.547.905,00	IVA	19%	$3,904,102.00	0,00	$20.547.905,00

Notas:
CONTRATO 4182.010.26.1.491-2023

SON: (veinticuatro millones cuatrocientos cincuenta y dos mil siete pesos)
CUFE: 88a07563817e8ac62b6536cecd111eccebabe4ea685839485ef07761c71dbea5ffa7e5af59a1ae884f0685a7a87f5171

Subtotal:	$20.547.905,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$3.904.102,00
Total:	$24.452.007,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$20.547.905,00	19,00%	$3.904.102,00

Firma Digital: czMUljgplmq3ao3oBsjX0Rb/4IyITyEPzxob8MRExhM4z/2PbX55UPMfFP/VBmkY
vTidpt6Z88bYX1DB4YXM/mHLOiNsVCmExWQ+oURf+fKRGi7Jg5
m3MfbcImVhwbLi toiVnzcc3DPXr50QjP1nnB8mdd6EkIAc16HLWlMoLKF13obZp34iaapcEOaee51A kb4H1/Ey2d3cNd1dAzFcyOdq0DQaiANSbbW
+OGyqX7+3h3/XAv8xXul2nVXnKrRA 4otjwSnUafPO8FAyAB0T5WkIcjKBRiCcU7psTihAg06h951/Ti1nqJz6evr0p4QJ luqyQzq9Ece4I3foUh60
jQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

1. TIPO DE INFORME			
INFORME PARCIAL ☐		INFORME FINAL [X]	
Tipo de Contrato: OBRA ☐		INTERVENTORÍA [X]	
Informe Número: 2		Periodo comprendido entre el 21 noviembre de 2023 al 29 de diciembre 2023 y del 22 de febrero al 15 de marzo del 2024	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN			
Contrato o Aceptación de Oferta No. 4182.010.26.1.491 de 2023			
Nombre Completo del Contratista: JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ			
Documento de identificación del contratista: C.C: 94.492.719 DE CALI			
Nombre del Supervisor: FRANCISCO JAVIER BONILLA HURTADO - TEL: 602 8854666			
Organismo: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS			
Obra Física Ejecutada del Periodo: N/A		Obra Física Ejecutada Acumulada: N/A	
Objeto del contrato: "REALIZAR INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO ACUEDUCTO FLAMENCO - CORREGIMIENTO EL HORMIGUERO"			
3. INFORME JURÍDICO			
Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
26/sep/2023		15/mar/2024	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Modificación del contrato: Suspensión 29/12/2023

Modificación del contrato: Reinicio 22/02/2024

Modificación del contrato: Prórroga del contrato 22/02/2024

Adición presupuestal: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

Acta de recibo final de obra: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del Contrato: CIENTO CINCUENRTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($ 155.000.000)

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo a favor del Distrito
$ 75.585.801	$ 24.452.007	$ 51.126.236	$ 7.558

PERSONA JURÍDICA: N/A

PERSONA NATURAL

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 03 de abril de 2024

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

Para el periodo comprendido entre el 21 noviembre de 2023 al 29 de diciembre 2023 y del 22 de febrero del 2024 al 15 de marzo del 2024

JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

No. Planilla: 9459853678
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 312060336
Operador: Aportes en Línea
Fecha de Pago: 2023/12/04
Periodo de pago: nov/2024

No. Planilla: 9462871456
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 450547966
Operador: Aportes en Línea
Fecha de Pago: 2024/02/12
Periodo de pago: dic/2024

No. Planilla: 9465715283
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 581538986
Operador: Aportes en Línea
Fecha de Pago: 2024/04/17
Periodo de pago: feb/2024

No. Planilla: 9465715373
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 581545773
Operador: Aportes en Línea
Fecha de Pago: 2024/04/17
Periodo de pago: mar/2024

ALEJANDRO MARULANDA A

No. Planilla: 1063493325
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador: PAGOSIMPLE
Fecha de Pago: 2024-05-06,
Periodo de pago: dic/2024

No. Planilla: 1066263012
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador: PAGOSIMPLE
Fecha de Pago: 2024-09-04
Periodo de pago: feb/2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

No. Planilla: 82568670
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador: Compensar - miplanila.com
Fecha de Pago: 2024-12-12
Periodo de pago: mar/2024

VICTOR SALINAS S

No. Planilla: 1060683852
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador: PAGOSIMPLE
Fecha de Pago: 2024-12-12
Periodo de pago: dic/2024

No. Planilla: 82567058
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador: Compensar - miplanila.com
Fecha de Pago: 2024-12-12
Periodo de pago: feb/2024

No. Planilla: 82568223
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador: Compensar - miplanila.com
Fecha de Pago: 2024-12-12
Periodo de pago: mar/2024

Observaciones al informe contable y financiero:

5. INFORME TÉCNICO

1. De acuerdo al informe de actividades presentado por la interventoría, se pudo constatar las actividades realizadas durante el periodo relacionado.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Realizó la revisión de las actividades ejecutadas por el contratista de obra que tiene por nombre CONTRUCTORA LAS ELES (L) SAS con el contrato de obra **No. 4182.010.26.1.473-2023 cuyo objeto es "OBRAS DE MEJORAMIENTO ACUEDUCTO FLAMENCO - CORREGIMIENTO EL HORMIGUERO**

ADMINISTRATIVAS

La interventoría realizo trabajo de seguimiento administrativo que consistió en las siguientes actividades:

- Realizó control y seguimiento de las afiliaciones de seguridad y prestaciones sociales de los empleados del contratista de obra y demás personas autorizadas para intervenir en el desarrollo de las actividades de ejecución del proyecto.
- Realizó acompañamiento e inspección permanente de las actividades ejecutadas por el contratista de obra.
- Proyectó respuestas y/o conceptos referentes a solicitudes realizadas por parte del contratista de obra y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP.
- Informó a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP sobre el estado actual del frente de intervención.
- Elaboró informes semanales y mensuales de interventoría.
- Elaboró comunicados referentes con la ejecución del contrato de obra.
- Realizó reuniones de socialización, aclaración de observaciones, dudas e inquietudes manifestadas por parte de la comunidad del sector ubicado dentro del área de intervención del proyecto.
- Seguimiento de las actividades desarrolladas por el área social, ambiental y SST del contrato de obra.
- Requirió al contratista de obra por los elementos de protección personal para todas las actividades a ejecutar
- Requirió al contratista de obra por los informes de actividades diario a través de registro fotográfico
- Requirió al contratista de obra por las planillas de seguridad social del personal
- Requirió al contratista de obra por los informes de avance de obra

SOCIALES

Durante el periodo de tiempo transcurrido se realizaron actividades sociales tales como:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- Se realizó socialización inicial del proyecto en compañía de la interventoría y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y la comunidad de Cascajal y Flamenco.
- Se informó sobre el objetivo de la reunión el cual era efectuar reunión de socialización de la obra de mejoramiento de la PTAP compacta y reforzamiento estructural e las veredas Cascajal y Flamenco del Corregimiento de El Hormiguero.
- Hubo intervención por parte de la UAESP explicando en detalle lo que se iba a realizar técnicamente.
- Intervino la interventoría y el contratista de obra dando a conocer sus contratos y el alcance de los mismos.

AMBIENTALES

Durante el periodo reportado, la interventoría realizó las siguientes actividades ambientales:

- Verificó la veracidad de los certificados de disposición de escombros y tierra en la cantidad establecida en los mismos.
- Realizó recomendaciones sobre el acopio de residuos de obra.



CERTIFICADO DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

Certificado No 4066 2024

Certifica que la entidad CONSTRUCTORA LAS ELES S.A.S con NIT 900359989-1

Material escombros no reciclables	A4075Y1ZA1180	11.36	DISPOSICION FINAL

GERENTE

***Imagen 1**. Certificado de disposición de residuos*

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

FINANCIERA

Durante el periodo relacionado, la interventoría realizó seguimiento y supervisión al avance de las actividades de obra. , en el cual se realiza un corte para cobro de acta parcial No. 2, es decir que hasta la fecha hay relacionada una actividad de carácter financiero de la siguiente manera:

CONTRATO DE OBRA	CONTRATO No.: 4182.010.26.1.473-2023
VALOR DEL CONTRATO:	$ 617.913.328
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1	$ 417.956.575
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2	$ 199.903.014
SALDO A FAVOR DEL DISTRITO	$53.739
% EJECUTADO ACUMULADO:	99,99%
AVANCE EJECUTADO:	$ 617.859.589
VALOR PAGADO:	$ 617.859.589

TÉCNICAS

La interventoría realizó labores de supervisión técnica a las actividades ejecutadas por el contratista de obra durante los periodos relacionados de la siguiente manera:

- Entre el 21 noviembre de 2023 al 29 de diciembre 2023
- Entre el 22 de febrero al 15 de marzo del 2024

Actividades que hacen parte del acta parcial (final) de obra No. 2:

CAMPAMENTO EN TABLA

La interventoría verificó que el contratista realizara la construcción del campamento. Durante el periodo de ejecución de la presente acta, esta actividad se ejecutó en una cantidad de **18 m2**

1.1.2.1.2.2 ACARREO DE MATERIAL A MANO

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

La interventoría verificó que el contratista realizara el acarreo de materiales producto de las labores ejecutadas. Durante el periodo de ejecución de la presente acta, esta actividad se ejecutó en una cantidad de **777 m3.**

1.1.2.1.2.3 RELLENO Y EXPLANACIÓN CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN CON COMPACTADOR

La interventoría verificó que el contratista realizara el relleno y explanación con material de la excavación con compactador. Durante el periodo de ejecución de la presente acta, esta actividad se ejecutó en una cantidad de **503 m3.**

1.1.2.1.2.4 RETIRO DEL SITIO DE LA OBRA DEL MAT DE LA EXCAVACION A MANO EN VOLQUETA INCLUYE ACARREO Y BOTADERO 10 KM.

La interventoría verificó que el contratista realizara el retiro del sitio de la obra del material de la excavación a mano en volqueta incluye acarreo y botadero 10 km. Durante el periodo de ejecución de la presente acta, esta actividad se ejecutó en una cantidad de **172 m3.**

1.1.2.1.2.5 RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO (ROCA MUERTA) SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro y relleno de roca muerta. Durante el periodo de ejecución de la presente acta, esta actividad se ejecutó en una cantidad de **710 m3**

1.1.2.1.3.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBASE GRANULAR TIPO INVIAS 95%PM

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de sub-base granular tipo invias 95%PM. Durante el periodo de ejecución de la presente acta, esta actividad se ejecutó en una cantidad de **20 m3**.

1.1.2.1.3.2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE GRANULAR TIPO INVIAS 95%PM

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de base granular tipo invias 95% PM. Durante el periodo de ejecución de la presente acta, esta actividad se ejecutó en una cantidad de **15 m3**

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

1.1.2.2.4.1 VALLA DE PUBLICIDAD DE LA OBRA DE 3.0X4.0 M. CON IMAGEN CORPORATIVA EN IMPRESIÓN DIGITAL DE 720 DPI (INCLUYE MONTAJE Y RETIRO)

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de la valla publicitaria con imagen corporativa. Durante el periodo de ejecución de la presente acta, esta actividad se ejecutó en una cantidad de **1 unidad**.

1.1.2.2.4.2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CINTA BARRERA PREVENTIVA 300 ML

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro y colocación de cinta de barrera preventiva 300 ML. Durante el periodo de ejecución de la presente acta, esta actividad se ejecutó en una cantidad de **17 unidades.**

1.1.2.2.4.3 SUMISTRO Y COLOCACIÓN SEÑALIZADOR TUBULAR (COLOMBINA) H=1,27 M REFLECTIVA DE ALTA CON REUTILIZACIÓN
La interventoría verificó el suministro e instalación de colombinas. Durante el periodo de ejecución de la presente acta, esta actividad se ejecutó en una cantidad de **40 unidades**

INP-01 EXCAVACIÓN CONGLOMERADO

La interventoría verificó que el contratista realizara la excavación de material conglomerado. Durante el periodo de ejecución de la presente acta, esta actividad se ejecutó en una cantidad de **603 m2.**

INP-03 REPARACIÓN DAÑOS TUBERIAS

La interventoría verificó que el contratista realizara la reparación de daños en la tubería. Durante el periodo de ejecución de la presente acta, esta actividad se ejecutó en una cantidad de **36 ML**

INP-04 DEMOLICIÓN CAJA EXISTENTE

La interventoría verificó que el contratista realizara la demolición de las cajas existentes. Durante el periodo de ejecución de la presente acta, esta actividad se ejecutó en una cantidad de **5 und**

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

INP-05 EXCAVACIÓN ENTIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0-2 M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS)

La interventoría verificó que el contratista realizara la excavación en tierra en seco a mano entre 0-2 m de profundidad. Durante el periodo de ejecución de la presente acta, esta actividad se ejecutó en una cantidad de **586,93 m3**

INP-09 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CODO 2" HD 90° EXTREMO LISO

La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de codos 2" HD 90° extremo liso. Durante el periodo de ejecución de la presente acta, esta actividad se ejecutó en una cantidad de **3 Unidades**

INP-10 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TEE 2" X2" HD EXTREMO LISO


La interventoría verificó que el contratista realizara el suministro e instalación de TEE 2"X2" HD extremo liso. Durante el periodo de ejecución de la presente acta, esta actividad se ejecutó en una cantidad de **2 Unidades**


INP-13 RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN CONCRETO DE CEMENTO 21 MPa (2500 PSI) e= 0.10m (INCLUYE SUB-BASE GRANULAR DE 0.10 m DE ESPESOR ACARREO INTERNO). FUNDICIÓN DE ANDENES


La interventoría verificó que el contratista realizara la reconstrucción de andenes en concreto, cumpliendo con los estándares y especificaciones requeridas. Durante el periodo de ejecución de la presente acta, esta actividad se ejecutó en una cantidad de **66 m2**


REGISTRO FOTOGRÁFICO:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

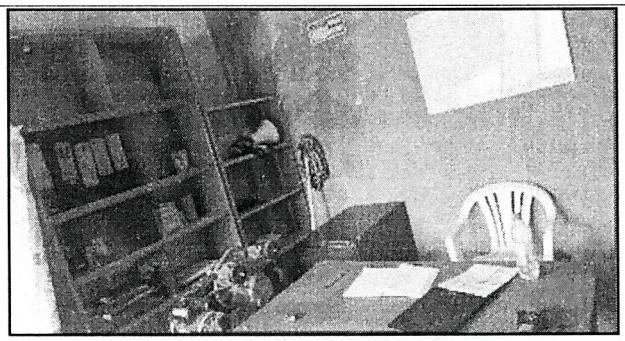


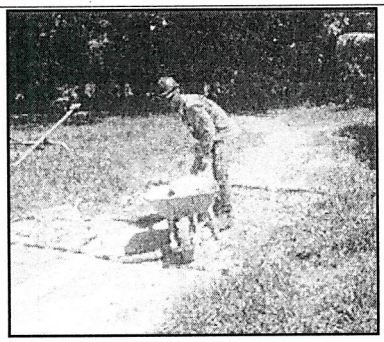

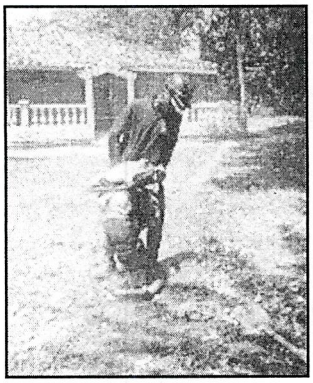


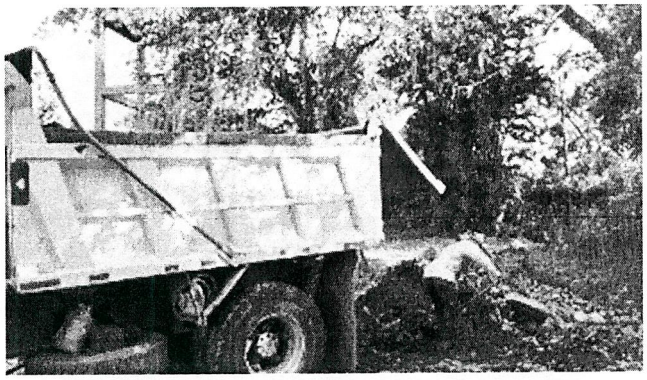




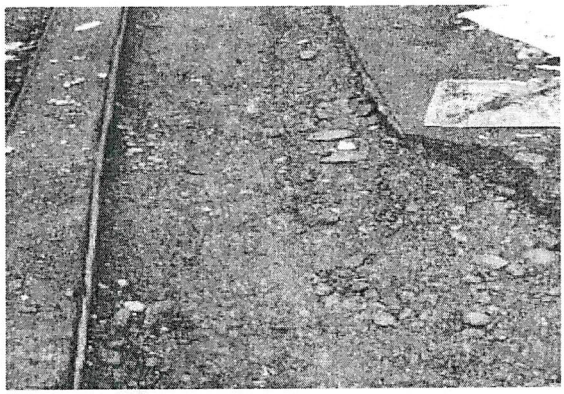


Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

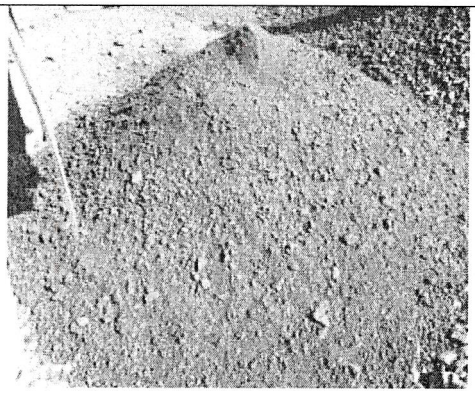



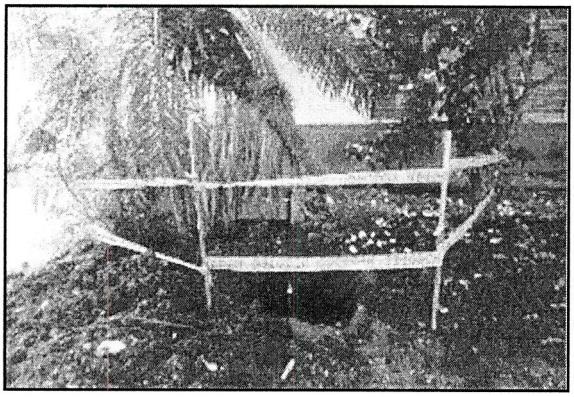

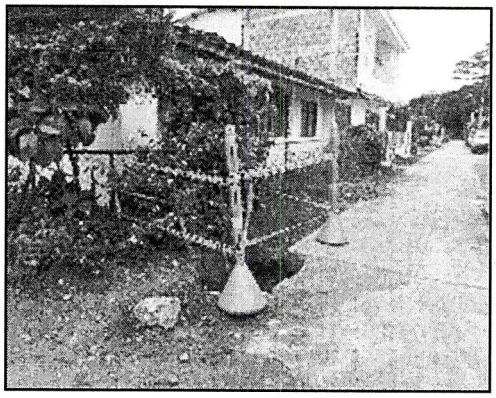





RECIBO A SATISFACCIÓN: N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES

FRANCISCO JAVIER BONILLA HURTADO
Profesional Especializado
Supervisor - UAESP

DIEGO FERNANDO BERMUDEZ SALAZAR
Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 13 De diciembre de 2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

DECLARACION JURAMENTADA


DE PAGO DE APORTES ALSISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

(ARTÍCULO 50, LEY 789 DE 2002)
(PERSONA NATURAL)

Yo JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ identificado(a) con C.C. 94.407.112 de Cali , de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, QUE HE EFECTUADO CORRECTA Y ADECUADAMENTE, EL PAGO DE MIS APORTES Y EL DE MIS EMPLEADOS, AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL (Salud, Pensiones y ARL) y DE APORTES PARAFISCALES (Cajas de Compensación Familiar), según me corresponde, durante los últimos seis (06) meses calendario.

Se firma en Santiago de Cali, 03 días de abril 2024

Cordialmente,



JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ
C.C. 94.407.112
INGENIERO CIVIL

Sandra Patricia Peña B.

SANDRA PATRICIA PEÑA BURBANO
C.C. 38.460.488 de Cali
Contador Público- TP 161319-T

República de Colombia

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL

DE CONTADOR PUBLICO



161319-T

SANDRA PATRICIA

PEÑA BURBANO

C.C. 38460488

RESOLUCION INSCRIPCION 272 FECHA 01/09/2011

UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 17267

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA


NÚMERO **38.460.488**
PEÑA BURBANO

APELLIDOS
SANDRA PATRICIA

NOMBRES

Sandra Patricia Peña B.

FIRMA

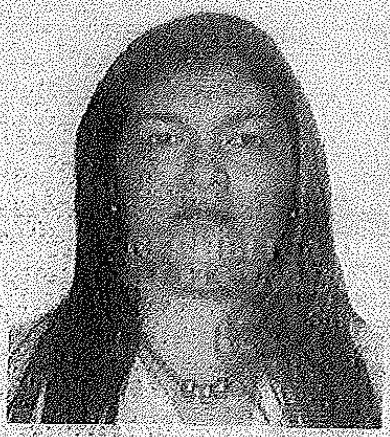



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-DIC-1980**
ALMAGUER
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

27-AGO-1999 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-3100150-00880800-F-0038460488-20170202 0053435741G 1 9998663531

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C786C4556F2BF2EE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA PATRICIA PEÑA BURBANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 38460488 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 161319-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *
