INFORME TECNICO DE INTERVENTORIA No. 2

"INTERVENTORÍA, TÉCNICA ADMINISTRATIVA JURÍDICA FINANCIERA SOCIAL AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES DIAGNOSTICO CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA".

PERIODO:

INFORME DE ACTIVIDADES NO 2 DEL 18 DE FEBERERO 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024 Y DEL 15 DE MAYO 2024 AL 31 DE MAYO 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 4301 DE 2023

"INTERVENTORÍA, TÉCNICA ADMINISTRATIVA JURÍDICA FINANCIERA SOCIAL AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES DIAGNOSTICO CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA".

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA – NORTE DE SANTANDER.
ABRIL DE 2024

Contenido

INTRODUCCIÓN 3
GENERALIDADES 4
1.1 LOCALIZACIÓN 4
1.2 ASPECTOS TÉCNICOS 5
1.4 DOCUMENTOS TÉCNICOS 5
Tramos a intervenir 5
1.3 ALCANCE 6
2 ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA OBRA 8
2 ASPECTOS CONTRACTUALES DE LA INTERVENTORIA 14
4 ANTECEDENTES 18
5 CONDICIONES CLIMÁTICAS 19
5.1.1AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 20
6. ACTIVIDADES CONTRACTUALES EJECUTADAS 20
6.1 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION 20
4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 21
6.3 OBRAS COMPLEMENTARIAS 21
6.4 ITEM NO PREVISTOS 21
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN EN OBRA. 21
FLUJO DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA 21
CONTROL DE PERSONAL Y DE EQUIPO DEL CONTRATISTA 22
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 22
1. REGISTRO FOTOGRAFICO 23
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SECTOR MINUTO DE DIOS 23

INTRODUCCIÓN

Este informe mensual corresponde a las labores de la interventoría cuyo contrato es 3888 "**INTERVENTORÍA, TÉCNICA ADMINISTRATIVA JURÍDICA FINANCIERA SOCIAL AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES DIAGNOSTICO CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA"**. desarrolladas en el Contrato de obra No. 4301 de 2031, cuyo objeto es: **DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" Lote 3.**

En este informe se describe el trabajo realizado al contrato de obra pública No. 4301 de 2023. Esta obra se está ejecutando por el contratista seleccionado por la administración municipal el cual corresponde a UNION TEMPORAL MALLA VIAL 2023 y tiene un plazo inicial hasta el 29 de DICIEMBRE DE 2023.

Teniendo prorroga el 16 de enero se firma una prorroga el cual la nueva fecha de terminación es el 02 de febrero de 2024, una prorroga No 2 del 2 de febrero del 2024 teniendo como fecha de terminación el 02 de mayo de 2024.


El 17 de mayo se aprueba solicitud de adicional con ajuste de tiempo quedando como fecha d de terminación el 16 de junio de 2024.

El proyecto **DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" Lote 3.** Territorio Sostenible y Hábitat Saludable para Todos. Componente 4. Infraestructura vial, transporte y movilidad sostenible e inteligente. Programa 1. Infraestructura vial. Subprograma 2. Rehabilitación y Mantenimiento de la malla vial principal de la ciudad de Cúcuta con el fin de mejorar la transitabilidad de las arterias principales de la ciudad.

El objetivo principal de los mantenimientos y/o rehabilitación es irradiar desde las zonas céntricas (sitios de mayor afluencia) hacia las zonas periféricas del casco urbano.

GENERALIDADES

1.1 LOCALIZACIÓN

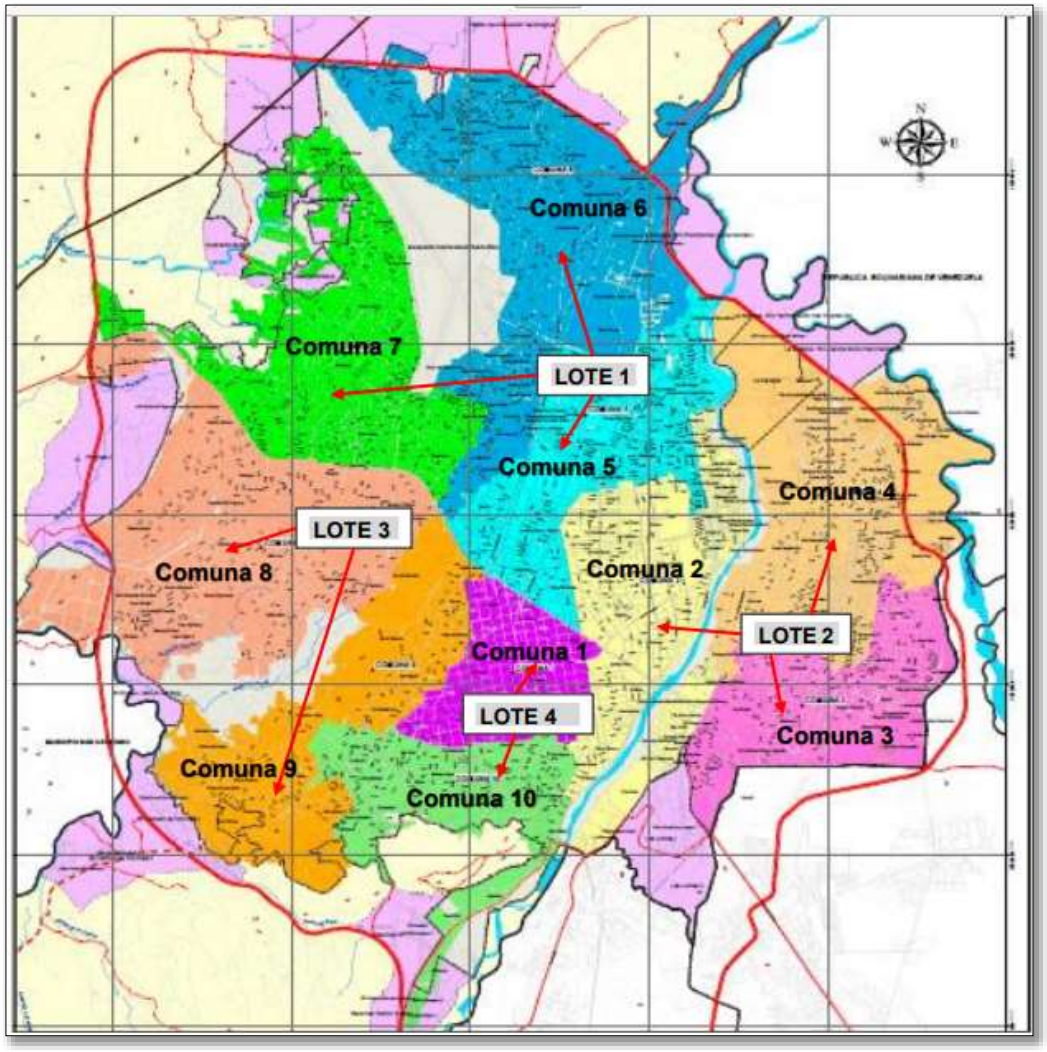

El lote 3 esta comprendido por la comuna 8 y 9 del municipio de san jose de cucuta.

1.2 ASPECTOS TÉCNICOS

Para la ejecución del proyecto **DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" Lote 3**, se ejecuta de acuerdo a consideraciones del anexo técnico 1, específicamente donde menciona:

1.3 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:

Las notas técnicas están contenidas dentro de las especificaciones específicas y/o generales del proyecto, sin embargo, el contratista entregará, ajustará y/o complementará las requeridas, acorde a la revisión que realice al estudio técnico entregado por la administración, entre otros documentos soportes; el supervisor será el encargado de dar el visto bueno, procurando no afectar el alcance físico del proyecto.

1.4 DOCUMENTOS TÉCNICOS

Tramos a intervenir

1. **<u>Calles para rehabilitación</u>:**

    - Avenida 5a entre calles 1ne y 3ne Barrio Minuto de Dios
    - Avenida 15a entre calles 6 y 8 Barrio La Victoria

2. **<u>Calles Para mantenimiento</u> (bacheo de emergencia)**

    - avenida 4 entre calles 1ne y 3ne barrio minuto de dios

- **1.5 CONDICIONES CONTRACTUALES**

El Municipio de San José de Cúcuta, para el presente proceso allega este documento técnico existente para la respectiva evaluación.

- Capítulo 1 actividades de construcción y o rehabilitación
- Capítulo 2 actividades de mantenimiento (bacheo, tapa hueco de emergencia y sobre carpeta)
- Capítulo 3 obras complementarias
- Capítulo 4 demarcación
- Capítulo 5 componentes
- Capítulo 6 diagnósticos

1.3 ALCANCE

De acuerdo con el objeto contractual, el alcance para esta acta parcial está representado como se observa en el cuadro anexo:

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA Secretaría de Infraestructura Municipal DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV, LOTE 3																			
Contratista: UNION TEMPORAL MALLA VIAL 2023					**No. de Proceso**	SIM-LP-006-2023													
Supervisor: ING. JOSÉ SEBÁSTIAN RUIZ LARA					**No. de Contrato**	4301													
Valor total del contrato:					**Contiene**	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES													
CONDICION INICIAL						**CONDICION MODIFICADA**		**CONDICION ACTUAL**		Acta Parcial 01		Acta Parcial 02		Acuamulado		Por ejecutar	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD (1)**	**UNIDAD**	**VR. UNITARIO PROPUESTO (4)**	**VR. PARCIAL PROPUESTO (5) = (1) X (4)**	**CANT.**	**VR TOTAL**	**CANT.**	**VR TOTAL**	**CANT.**	**VR TOTAL**	**CANT.**	**VR TOTAL**	**CANT.**	**VR TOTAL**	**CANT.**	**VR TOTAL**
1	**ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION**																
1.01	Excavación mecánica	385.30	m3	$ 17,483.47	$ 6,736,432.00	592.88	$ 10,365,600.00	588.47	$ 10,288,498.00	385.3029	$ 6,736,432.00	203.17	$ 3,552,066.00	588.47	$ 10,288,498.00	0.00	$ 0.00
1.02	Corte de pavimento asfaltico	620.00	ml	$ 5,006.37	$ 3,103,949.00	57.45	$ 287,605.00	77.89	$ 389,965.00		$ -	77.89383196	$ 389,965.00	77.89	$ 389,965.00	0.00	$ 0.00
1.03	Demolición de pavimento asfaltico (incluye compresor con martillo demoledor)	1,620.00	m2	$ 15,489.82	$ 25,093,508.00	1998.61	$ 30,958,109.00	1,969.18	$ 30,502,244.00	1620	$ 25,093,508.00	349.18	$ 5,408,736.00	1969.18	$ 30,502,244.00	0.00	$ 0.00
1.04	Conformación de subrasante	1,620.00	m2	$ 8,388.46	$ 13,589,305.00	2871.79	$ 24,089,896.00	2,842.36	$ 23,843,023.00	1619	$ 13,580,917.00	1223.36	$ 10,262,106.00	2842.36	$ 23,843,023.00	0.00	$ 0.00
1.05	Subbase granular CONSTRUCCION (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte)	-	m3	$ 146,254.97	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.06	Base granular CONSTRUCCION (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte)	-	m3	$ 153,608.25	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.07	Riego de Liga con emulsión asfáltica CRR-1 PARA CONSTRUCCION (Incluye suministro y aplicación)	3,078.00	m2	$ 3,706.00	$ 11,407,068.00	3078.00	$ 11,407,068.00	3,078.00	$ 11,407,068.00	3078	$ 11,407,068.00			3078.00	$ 11,407,068.00	0.00	$ 0.00
1.08	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 PARA CONSTRUCCION (Incluye suministro y aplicación)		m2	$ 4,831.16	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.09	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA CONSTRUCCION (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación, incluye transporte del material)	186.30	m3	$ 1,094,386.36	$ 203,884,179.00	201.83	$ 220,879,999.00	186.30	$ 203,884,179.00	186.3	$ 203,884,179.00	0	$ 0.00	186.30	$ 203,884,179.00	0.00	$ 0.00
1.10	Base estabilizada con cemento al 6% (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador 8 ton, incluye transporte)	343.27	m3	$ 276,501.11	$ 94,914,536.00	461.90	$ 127,715,863.00	457.49	$ 126,496,493.00	335.1	$ 92,655,522.00	122.39	$ 33,840,971.00	457.49	$ 126,496,493.00	0.00	$ 0.00
1.11	Fresado de pavimento asfaltico hasta 10 cm (incluye equipos y todas los elementos para el desarrollo de la actividad , no incluye transporte)	-	m2	$ 13,891.12	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.12	Demolición de pavimento rígido (mecánica)	84.07	m2	$ 22,328.83	$ 1,877,185.00		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.13	Corte de pavimento rígido y/o losas de concreto	-	ml	$ 7,092.83	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.14	Concreto Premezclado MR 41 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días CONSTRUCCION (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla)	-	m3	$ 800,998.46	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.15	Concreto Premezclado MR 43 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días CONSTRUCCION (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla)	-	m3	$ 827,974.71	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.16	Concreto Premezclado MR 45 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días CONSTRUCCION (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla)	-	m3	$ 852,204.37	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.17	Acero para dovelas, canastilla y barras de amarre (incluye corte y figurado e instalacion)	3,436.66	kg	$ 12,984.74	$ 44,624,113.00	3718.10	$ 48,278,562.00	3,718.10	$ 48,278,562.00	3379.4242	$ 43,880,945.00	338.6758	$ 4,397,617.00	3718.10	$ 48,278,562.00	0.00	$ 0.00
1.18	Corte de juntas de dilatacion menor a 8 cm	-	ml	$ 6,775.55	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.19	Suministro y aplicación de aditivo para curado de concreto	-	m2	$ 5,951.58	$ -	424.22	$ 2,524,779.00	424.22	$ 2,524,779.00		$ -	424.22	$ 2,524,779.00	424.22	$ 2,524,779.00	0.00	$ 0.00
1.2	Cordón de espuma de polietileno y sellado de juntas de dilatacion	-	ml	$ 14,138.31	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.21	Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias menores a 15 km	841.84	m3	$ 41,040.68	$ 34,549,727.00	901.63	$ 37,003,426.00	949.64	$ 38,973,748.00		$ -	949.637	$ 38,973,748.00	949.64	$ 38,973,748.00	0.00	$ 0.00
1.23	Generación y disposición de sobrantes	841.84	m3	$ 18,727.01	$ 15,765,165.00	901.63	$ 16,884,797.00	949.64	$ 17,783,862.00		$ -	949.637	$ 17,783,862.00	949.64	$ 17,783,862.00	0.00	$ 0.00
													$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
				Sub total	**$ 455,545,167.00**		**$ 530,395,704.00**		**$ 514,372,421.00**								
2	**ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO**												$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.01	Excavación manual para BACHEO Y PARCHEO	-	m3	$ 78,945.52	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.02	Base granular BACHEO Y PARCHEO (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte al sitio)	-	m3	$ 149,025.24	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.03	Riego de Liga con emulsión asfáltica CRR-1 PARA BACHEO (Incluye suministro y aplicación)	-	m2	$ 3,825.34	$ -	1457.45	$ 5,575,242.00		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.04	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 PARA BACHEO (Incluye suministro y aplicación)	-	m2	$ 5,018.68	$ -		$ -	1,935.43	$ 9,713,304.00		$ -	1935.43	$ 9,713,304.00	1935.43	$ 9,713,304.00	0.00	$ 0.00
2.05	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEO (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación CON VIBROCOMPACTADOR DE 3 TON, incluye transporte del material)	-	m3	$ 1,333,363.37	$ -	108.89	$ 145,189,937.00	112.25	$ 149,670,038.00		$ -	112.25	$ 149,670,038.00	112.25	$ 149,670,038.00	0.00	$ 0.00
2.06	PARCHEO TEMPORAL DE EMERGENCIA CON MDC-19 (Incluye Suministro, Extendido, Nivelación, compactación y transporte del material, personal e insumos. Emergencias Menores a 7 M2)	6.00	m3	$ 1,500,980.18	$ 9,005,881.00	4.25	$ 6,379,166.00	13.03	$ 19,557,772.00	2.75	$ 4,127,695.00	10.28	$ 15,430,077.00	13.03	$ 19,557,772.00	0.00	$ 0.00
2.07	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19 (solo suministro de mezcla asfáltica no incluye transporte ni instalacion)	-	m3	$ 811,261.24	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.08	Instalación de Mezcla Asfáltica (cuadrilla de 1 oficial x 8 ayudantes)	-	m3	$ 202,204.90	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.09	Transporte de Mezcla Asfáltica para BACHEO Y PARCHEO	-	m3	$ 55,405.35	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.1	Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (incluye cargue manual)	-	m3	$ 60,178.73	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.11	Limpieza de sumideros	-	und	$ 105,260.69	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.12	Remoción de derrumbes con retrocargador	-	m3	$ 29,468.07	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.13	Fresado de pavimento asfaltico hasta 10 cm (Incluye equipos y todas los elementos para el desarrollo de la actividad) (No incluye transporte)	-	m2	$ 13,891.12	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.14	Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias menores a 15 km	-	m3	$ 41,040.68	$ -	123.05	$ 5,049,850.00	113.48	$ 4,657,173.00		$ -	113.477	$ 4,657,173.00	113.48	$ 4,657,173.00	0.00	$ 0.00
2.15	Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias mayores de 15 km	-	m3.km	$ 1,841.16	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.16	Suministro e instalacion de Adoquin vehicular de 8x10x20 para pavimento articulado (incluye suministro e instalacion de cama de arena fina h= 5cm, y de sello)	-	m2	$ 196,647.32	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.17	Suministro e instalacion de Adoquin hexagonal vehicular de 8x20x20 para pavimento articulado (incluye suministro e instalacion de cama de arena fina h= 5cm, y de sello)	-	m2	$ 179,204.58	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

CONSORCIO
PROESCO S.A.S.

2.18	Concreto Premezclado MR 41 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días para mantenimiento (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla)	-	m3	$ 917,831.77	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.19	Acero para dovelas, canastilla y barras de amarre (incluye corte y figurado e instalacion)	-	kg	$ 12,984.74	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.2	Corte de juntas de dilatacion menor a 8 cm	-	ml	$ 6,775.55	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.21	Suministro y aplicación de aditivo para curado de concreto	-	m2	$ 5,951.58	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.22	Cordón de espuma de polietileno y sellado de juntas de dilatacion	-	ml	$ 13,891.12	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.23	Generación y disposición de sobrantes	-	m3	$ 18,727.01	$ -	123.05	$ 2,304,265.00	113.48	$ 2,125,085.00		$ -	113.477	$ 2,125,085.00	113.48	$ 2,125,085.00	0.00	$ 0.00	
				Sub total	**$ 9,005,881.00**		**$ 164,498,460.00**		**$ 185,723,372.00**									
3	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**														$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.01	Anden de concreto de 3000 psi h=10 cm (incluye malla electrosoldada de 5mm)	-	m2	$ 112,593.14	$ -	83.88	$ 9,444,313.00	83.88	$ 9,444,313.00		$ -	83.88	$ 9,444,313.00	83.88	$ 9,444,313.00	0.00	$ 0.00		
3.02	Base granular para ANDENES (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte)	-	m3	$ 151,734.08	$ -	8.39	$ 1,273,049.00	8.39	$ 1,273,049.00		$ -	8.39	$ 1,273,049.00	8.39	$ 1,273,049.00	0.00	$ 0.00		
3.03	Bordillo hecho en sitio de h=40cm a=15 cm, (concreto de 3000 psi, incluye acero)	100.00	ml	$ 78,687.91	$ 7,868,791.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.04	Bordillo prefabricado concreto de 3000 PSI h=45cm, a=15 cm	-	ml	$ 74,434.48	$ -	138.60	$ 10,316,619.00	138.60	$ 10,316,619.00		$ -	138.60	$ 10,316,619.00	138.60	$ 10,316,619.00	0.00	$ 0.00		
3.05	Suministro e instalación de loseta alerta/guía e=6cm 6x20x20	-	m2	$ 197,892.76	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.06	Suministro e instalación de loseta guía/alerta 6x20x20	-	ml	$ 48,169.51	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.07	Realce de Pozos en concreto de 3000 psi (incluye demolición de concreto y refuerzo)	8.00	und	$ 354,867.95	$ 2,838,944.00	10.00	$ 3,548,680.00	11.00	$ 3,903,547.00	8	$ 2,838,944.00	0	$ 0.00	8.00	$ 2,838,944.00	3.00	$ 1,064,603.00		
3.08	Geotextil NT3000		m2	$ 22,211.39	$ -	378.61	$ 8,409,454.00	349.18	$ 7,755,773.00		$ -	349.18	$ 7,755,773.00	349.18	$ 7,755,773.00	0.00	$ 0.00		
3.09	Excavacion manual en material comun en zona	-	m3	$ 55,401.56	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.10	Excavación a maquina material comun de la zona saturado y contaminado	-	m3	$ 19,858.79	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.11	Relleno compactado en material comun de la zona		m3	$ 44,399.10	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.12	Relleno compactado material de prestamo grava de rio		m3	$ 130,949.83	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.13	Pedraplen compacto		m3	$ 132,837.40	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.14	Suministro e Instalación de Sub-base compactada en capas de 10 CM		m3	$ 100,640.74	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.15	Concreto de Saneamiento de 14 Mpa.		m3	$ 654,258.57	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.16	Concreto acelerado de 28 Mpa para losas de piso		m3	$ 919,110.35	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.17	Concreto acelerado de 28 Mpa para losas-muros laterales		m3	$ 997,013.12	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.18	Entibado vertical zanja excavación		m2	$ 52,170.06	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.19	Concreto acelerado de 21 Mpa para losas-muros laterales	-	m3	$ 957,867.58	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.2	Suministro e Instalación de Concreto Ciclópeo (CON CONCRETO 28 Mpa acelerado A7) para cimentación de pisos y muros de contención canal - otros		m3	$ 768,025.17	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3.21	Suministro e Instalación de Concreto Ciclópeo (CON CONCRETO 21 Mpa acelerado A7) para cimentación de pisos y muros de contención canal - otros	-	m3	$ 744,538.04	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
				$ 34,286.91	**$ 10,707,735.00**		**$ 32,992,115.00**		**$ 32,693,301.00**						$ 0.00	0.00	$ 0.00		
4	**DEMARCACION**														$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4.01	Demarcación horizontal lineal ancho 12 cm, pintura acrílica (incluye suministro, aplicación manual)	-	ml	$ 3,348.96	$ -	810.00	$ 2,712,658.00	810.00	$ 2,712,658.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	810.00	$ 2,712,658.00		
4.02	Demarcación horizontal marcas viales (cebras, flechas, símbolos, letras) pintura acrílica (incluye suministro, aplicación manual)	-	m2	$ 46,682.56	$ -	55.00	$ 2,567,541.00	55.00	$ 2,567,541.00			55.00	$ 2,567,541.00	55.00	$ 2,567,541.00	0.00	$ 0.00		
				Sub total	**$ -**		**$ 5,280,199.00**		**$ 5,280,199.00**										
5	**COMPONENTES**														$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.01	Componente SST	1.00	glb	$ 10,092,771.15	$ 10,092,771.00	1.00	$ 10,092,771.00	1.00	$ 10,092,771.00						$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 10,092,771.00
5.02	Componente Ambiental	1.00	glb	$ 8,869,638.86	$ 8,869,639.00	1.00	$ 8,869,639.00	1.00	$ 8,869,639.00						$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 8,869,639.00
5.03	Componente Social	1.00	glb	$ 2,095,458.75	$ 2,095,459.00	1.00	$ 2,095,459.00	1.00	$ 2,095,459.00						$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 2,095,459.00
5.04	Componente Sig	1.00	glb	$ 1,894,200.00	$ 1,894,200.00	1.00	$ 1,894,200.00	1.00	$ 1,894,200.00						$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1,894,200.00
5.05	Plan de manejo de transito	1.00	glb	$ 10,418,100.00	$ 10,418,100.00	1.00	$ 10,418,100.00	1.00	$ 10,418,100.00						$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 10,418,100.00
				Sub total	**$ 33,370,169.00**		**$ 33,370,169.00**		**$ 33,370,169.00**										
6	**DIAGNOSTICO**														$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.1	ENTREGABLE DE DIAGNOSTICO INCLUYE IVA 19%	2.00	glb	$ 5,254,885.96	$ 10,509,772.00	3.00	$ 15,764,658.00	3.00	$ 15,764,658.00						$ 0.00	0.00	$ 0.00	3.00	$ 15,764,658.00
				Sub total	**$ 10,509,772.00**		**$ 15,764,658.00**		**$ 15,764,658.00**										
	ITEM NO PREVISTOS														$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP01	GEOMALLA PARA REFUERZO	1458	m2	$ 27,914.00	$ 40,698,612.00	1918.67	$ 53,557,754.00	1,743.03	$ 48,654,939.00	1458.00	$ 40,698,612.00	285.03	$ 7,956,327.00	1743.03	$ 48,654,939.00	0.00	$ 0.00		
NP02	CUNETA EN CONCRETO DE 3000 (incluye malla de refuerzo)	540	ml	$ 103,926.00	$ 56,120,040.00	540.00	$ 56,120,040.00	540.00	$ 56,120,040.00	540.00	$ 56,120,040.00	0	$ 0.00	540.00	$ 56,120,040.00	0.00	$ 0.00		
NP03	REPARACION TUBERIA AGUA PRESION	22	und	$ 120,320.00	$ 2,647,040.00	13.00	$ 1,564,160.00	13.00	$ 1,564,160.00	13.00	$ 1,564,160.00	0	$ 0.00	13.00	$ 1,564,160.00	0.00	$ 0.00		
NP04	Concreto 21 Mpa, acelerado Placa huella	36.73778618	M3	$ 1,259,875.38	$ 46,285,032.00	63.63	$ 80,165,870.00	63.63	$ 80,165,870.00	25.93	$ 32,663,265.00	37.704	$ 47,502,605.00	63.63	$ 80,165,870.00	0.00	$ 0.00		
NP05	Concreto de 21 MPA para riostras de 30x20	19.09	ML	$ 81,839.00	$ 1,562,307.00	297.10	$ 24,314,367.00	297.10	$ 24,314,367.00	19.09	$ 1,562,307.00	278.01	$ 22,752,060.00	297.10	$ 24,314,367.00	0.00	$ 0.00		
NP06	concreto clase G (40% Piedra rajon, 60% concreto de 21mpa) (no incluye transporte de agregados)	37.7737323	M3	$ 955,867.00	$ 36,106,664.00	56.98	$ 54,465,302.00	56.98	$ 54,465,302.00	19.05	$ 18,207,557.00	37.93178826	$ 36,257,745.00	56.98	$ 54,465,302.00	0.00	$ 0.00		
				Sub total	**$ 183,419,695.00**	**subtotal**	**$ 270,187,493.00**	**subtotal**	**$ 265,284,678.00**		**$ 555,021,151.00**		**$ 444,555,559.00**		**$ 999,576,710.00**		**$ 52,912,088.00**		
				SUB TOTAL	**$ 702,558,419.00**		**$ 1,052,488,798.00**		**$ 1,052,488,798.00**										

2 ASPECTOS CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA OBRA

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONTRATO No	4301 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS COL2023. R/L NÉSTOR ANDRÉS MESA SANTANDER
NIT	NIT 901772993-9
NUMERO DEL PROCESO	SIM-LP-006-2023
FECHA DE CONTRATO	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO	EL OBJETO DEL CONTRATO ES: "DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 3
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETECIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($702.558.419)
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	SETECIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($702.558.419)
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 203
FORMA DE PAGO	El pago se hará a la unidad y precio unitario establecido para cada actividad dentro del presupuesto del contrato, acorde a cada especificación técnica. Las actividades establecidas como unidad de pago la Unidad / Global, deberán ser sustentadas para el pago correspondiente por el contratista y aceptadas por la interventoría contratada. El valor total del presente contrato es de: SETECIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($702.558.419) a monto agotable incluido IVA y AIU, de la siguiente forma: El valor del contrato se pagará al contratista de la siguiente manera: La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad

	hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. La secretaria de Infraestructura cancelara el valor del presente proceso a través de la secretaria de Hacienda y secretaria del Tesoro Municipal. La forma de pago del presente adicional No. 1 del contrato hará a la unidad y precio unitario establecido para cada actividad dentro del presupuesto del contrato, acorde a cada especificación técnica, previa presentación de informe de supervisión y de la correspondiente facturación, como fue establecida en el contrato inicial.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	29 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN	29 DE DICIEMBRE DE 2023
MODIFICACIÓN No. 1	27 DE DICIEMBRE DE 2023
MODIFICACION No. 2 **ADICION No. 1**	16 DE ENERO DE 2024
SUSPENSION N°01	18 DE ENERO DE 2024
REINICIO N°01	16 DE ENERO DE 2024
PRORROGA No 1	18 DE ENERO DE 2024
PRÓRROGA N°02	02 DE FEBRERO DE 2024
SESIÓN DEL CONTRATO	04 DE ABRIL DE 2024
SUSPENSION N°02	30 DE ABRIL DE 2024
REINICIO N°02	15DE MAYO DE 2024
PRÓRROGA N°03	17 DE MAYO DE 2024
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN	02 DE MAYO DE 2024
SUPERVISOR	ING. JOSÉ SEBÁSTIAN RUIZ LARA
INTERVENTORÍA	CONTRATO 3888 DE 2023 SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS RL/ NOEMI RIVERA RIVEROS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00 004334 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	00 006746 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.3.2.02.02.005.24 – SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN TRANSPORTE.
RÉGIMEN	COMÚN

2.1 POLIZA SEGÚN CONTRATO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No	156899 ANEXO 0 1		
APROBACIÓN DE PÓLIZAS INICIALES	29 DE NOVIEMBRE DEL 2023		
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEG**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/11/2023	22/07/2024	$210.767.525,70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/11/2023	21/01/2027	$70.255.841,90
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Esta garantía debe estar vigente por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo a satisfacción de las obras por tramo vial (Acta de Recibo Final de cada tramo) Desde 31/12/2023 hasta 31/12/2028		$210.767.525,70
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	13639		
AMPARO BASICO - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	23/11/2023	22/01/2024	$232.000.000,00
PATRONAL	23/11/2023	22/01/2024	$116.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	23/11/2023	22/01/2024	$116.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	23/11/2023	22/01/2024	$116.000.000,00

2..2.1 POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No	156899 ANEXO 2		
APROBACIÓN DE PÓLIZAS INICIALES	14 DE DICIEMBRE DEL 2023		
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEG**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/11/2023	28/07/2024	$210.767.525,70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/11/2023	27/01/2027	$70.255.841,90
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Esta garantía debe estar vigente por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo a satisfacción de las obras por tramo vial (Acta de Recibo Final de cada tramo) Desde 31/12/2023 hasta 31/12/2028		$210.767.525,70
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	B-100011122		
AMPARO BASICO - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	29/11/2023	28/01/2024	$232.000.000,00
PATRONAL	29/11/2023	28/01/2024	$116.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	29/11/2023	28/01/2024	$116.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29/11/2023	28/01/2024	$116.000.000,00

2.2.2 1 POLIZAS SEGÚN PRORROGA No 1

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No	156899		
APROBACIÓN DE PÓLIZAS INICIALES	15 DE ABRIL DE 2024		
COBERTURA	DESDE	HASTA	SUMA ASEG
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/11/2023	12/08/2024	$210,767,525.70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/11/2023	11/02/2027	$70,255,841.90
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31/12/2023	31/12/2023	$210,767,525.70
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	13639		
AMPARO BASICO - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	29/11/2023	12/02/2024	$260,000,000.00
PATRONAL	29/11/2023	12/02/2024	$130,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	29/11/2023	12/02/2024	$130,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29/11/2023	12/02/2024	$130,000,000.00

2.2.3 POLIZAS SEGÚN ACTA DE PRORROGA No 2

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No	156899		
APROBACIÓN DE PÓLIZAS INICIALES	15 DE ABRIL DE 2024		
COBERTURA	DESDE	HASTA	SUMA ASEG
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/11/2023	10/11/2024	$210,767,525.70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/11/2023	12/05/2027	$70,255,841.90
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31/12/2023	31/12/2028	$210,767,525.70
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	13639		
AMPARO BASICO - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	29/11/2023	13/05/2024	$260,000,000.00
PATRONAL	29/11/2023	13/05/2024	$130,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	29/11/2023	13/05/2024	$130,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29/11/2023	13/05/2024	$130,000,000.00

POLIZAS PRORROGA 3 Y ADICIONAL 1

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No	160798		
APROBACIÓN DE PÓLIZAS INICIALES	17 DE JUNIO DE 2024		
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEG**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/04/2024	16/12/2024	$149.240.294,09
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/04/2024	16/06/2027	$49.746.764,69
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	LA GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO SE OTORGA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS Y SU VIGENCIA SE AJUSTA CON LA PRESENTACIÓN DEL ACTA RESPECTIVA		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	13639		
AMPARO BASICO - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	04/04/2024	16/06/2024	$260,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	04/04/2024	16/06/2024	$260,000,000.00

PROESCO SAS Teléfonos: 5922070
Correo electrónico: proesco_maquinaria@hotmail.com

2.3 ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATISTA DE OBRA

Desde el momento de la suscripción de los contratos tanto de obra, se ha generado las siguientes actas suscritas entre las partes.

CONTRATO DE OBRA No 4301	CONSORCIO VIAS COL2023
COMUNAS 8,9	VALOR: 702.558.419
REPRESENTANTE LEGAL	NESTOR ANDRES MESA SANTANDER
ACTA DE INICIO	29 DE NOVIEMBRE DEL 2023
ACTA DE SUSPENSION	27 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO No 1	16 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINACION INCIAL FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No2 : FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No3 :	29 DE DICIEMBRE DE 2023 PRORROGA No 1 : 16 DE ENERO DE 2024 02 DE FEBRERO DE 2024 17 DE JUNIO DE 2024
SESIÓN DEL CONTRATO A LA UT MALLA VIAL 2023	04 DE ABRIL DE 2024
ADICIONAL	17 DE MAYO DE 2024
MODIFICACION	17 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACION	16 D EJUNIO DE 2024

PROESCO SAS Teléfonos: 5922070
Correo electrónico: proesco_maquinaria@hotmail.com

2 ASPECTOS CONTRACTUALES DE LA INTERVENTORIA

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATO No	3888 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS R/L NOHEMI RIVERA RIVEROS
NIT	830508442-5
NUMERO DEL PROCESO	SIM-CMA -007 -2023
FECHA DE CONTRATO	18 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO	"INTERVENTORÍA, TÉCNICA ADMINISTRATIVA JURÍDICA FINANCIERA SOCIAL AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES DIAGNOSTICO CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA".
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($189,766,325.00)
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($189,766,325.00)
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 203
FORMA DE PAGO	El MUNICIPIO, a través de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: La Entidad pagará al Interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con la ejecución del contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de su monto. El cinco por ciento (5 %) restante se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato. El pago al Interventor se efectuará dentro de los (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfacción de las actividades y de la certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre

	cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. La Alcaldía de San José de Cúcuta, descontará de las facturas o cuentas de cobro los porcentajes establecidos en las ordenanzas y/o acuerdos, estampillas, etc., los cuales están a cargo del contratista.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	29 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN	29 DE DICIEMBRE DE 2023
MODIFICACIÓN No. 1	N/A
SUSPENSION	26 DE DICIEMBRE DE 2023
PRÓRROGA	2 DE FEBRERO DE 2024
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN	2 DE MAYO DE 2024
SUPERVISOR	ING. JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	0000433 DEL 06 SEPTIEMBRE DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	00005573
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.3.2.02.02.005.24 – SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN TRANSPORTE.

3.1

3. POLIZAS DE CUMPLIMIENTO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No	49-44101032104 SEGUROS DEL ESTADO		
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	19 DE OCTUBRE DEL 2023		
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEG**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/10/2023	29/06/2024	$ 56.929.897,5
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/10/2023	29/12/2026	$18.976.632,50
CALIDAD DE SERVICIO	29/12/2023	29/12/2028	$ 56.929.897,5

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No	49-40101010179 SEGUROS DEL ESTADO		
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	30 DE NOVIEMBRE DEL 2023		
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEG**
PREDIOS LEGALES Y OPERACIONES	18/10/2023	29/12/2023	$ 232.000.000

3.1.1.POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No	49-44101032104 SEGUROS DEL ESTADO		
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	30 DE NOVIEMBRE DEL 2023		
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEG**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/11/2023	10/08/2024	$ 56.929.897,5
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/11/2023	09/02/2027	$18.976.632,50
CALIDAD DE SERVICIO	09/02/2024	09/02/2029	$ 56.929.897,5

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No	49-40101010179 SEGUROS DEL ESTADO		
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	30 DE NOVIEMBRE DEL 2023		
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEG**
PREDIOS LEGALES Y OPERACIONES	29/11/2023	09/02/2024	$ 232.000.000

3.1.2 POLIZAS SEGÚN REINICIO No 1

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No	49-44101032104 SEGUROS DEL ESTADO		
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	08 de Abril de 2024		
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEG**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/11/2023	09/02/2024	$ 56.929.897,5
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/11/2023	09/03/2027	$18.976.632,50
CALIDAD DE SERVICIO	09/02/2024	09/02/2029	$ 56.929.897,5

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No	49-40101010179 SEGUROS DEL ESTADO		
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	08 de Abril de 2024		
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEG**

PREDIOS LEGALES Y OPERACIONES	29/11/2023	09/03/2024	$ 232.000.000

3.1.3 POLIZAS SEGÚN ADICIONAL

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No	49-44101032104 SEGUROS DEL ESTADO		
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	08 de Abril de 2024		
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEG**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/11/2023	31/12/2024	$ 110.572.360,5
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/11/2023	03/063/2027	$36.587.453,50
CALIDAD DE SERVICIO	AMPARA 5 AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE ENTRGA Y RECIBO A SATISFACCION DE LAS OBRAS		

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No	49-40101010179 SEGUROS DEL ESTADO		
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	08 de Abril de 2024		
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEG**
PREDIOS LEGALES Y OPERACIONES	29/11/2023	30/06/2024	$ 260.000.000

3.1.4 POLIZAS SEGÚN REINCIO 2

Póliza No. 49-44-101032104	**Aprobación** : 04 de julio de 2024	**Expedición : 29-05-2024**
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
Cumplimento del contrato	110.572.360,5	29-11-2023 a 31-01-2025
Pago de salarios prestaciones sociales legales o indemnizaciones laborales	36.857.453	29-11-2023 a 30-07-2027
Calidad del servicio	110.572.360,5	09-02-2024 a 09-02-2029

Póliza No. 49-40-101010179	**Aprobación :** : 04 de julio de 2024	**Expedición : 29-05-2024**
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	
Amparo básico- predios, labores y operaciones	260.000.000	

3.1.5 POLIZAS SEGÚN PRORROGA 3 Y ADICION 1

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No	160798		
APROBACIÓN DE PÓLIZAS INICIALES	17 DE JUNIO DE 2024		
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEG**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/04/2024	16/12/2024	$149.240.294,09
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/04/2024	16/06/2027	$49.746.764,69
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	LA GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO SE OTORGA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS Y SU VIGENCIA SE AJUSTA CON LA PRESENTACIÓN DEL ACTA RESPECTIVA		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	13639		
AMPARO BASICO - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	04/04/2024	16/06/2024	$260,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	04/04/2024	16/06/2024	$260,000,000.00

4 ANTECEDENTES

Es de vital importancia dentro de la inversión municipal, las obras de infraestructura vial urbana, las cuales se traducen en mayor movilidad de personas, bienes y servicios; y en consecuencia, en impulso económico y social. De aquí que la infraestructura vial se componga de un conjunto de elementos, cada uno de los cuales cumple una función específica, asegurando en sí mismo un tránsito confortable y seguro de los usuarios (peatones y vehículos), siendo los pavimentos el elemento básico de la infraestructura vial, y por lo tanto el de mayor importancia.
De acuerdo a lo anterior, La gestión de infraestructura vial contempla todos estos elementos, asegurando que se encuentren en buena condición, y presten un servicio adecuado a los usuarios.
Es por ello y, de conformidad con las responsabilidades que le corresponde asumir a la Secretaría de Infraestructura en cumplimiento de las competencias asignadas, específicamente las relacionadas con la obligatoriedad de velar por las necesidades de la comunidad, se hace necesario adelantar los procesos contractuales tendientes a contratar proyectos de obra pública priorizados, tales como la construcción, adecuación y/o mantenimiento de vías urbanas.

Actualmente el municipio de San José de Cúcuta, presenta dificultad en la movilidad en las vías, debido al mal estado de las mismas, lo que ocasiona que sean intransitables o con restricción de tránsito.

Según el diagnóstico del plan de desarrollo, la red vial urbana del Municipio está conformada por 1272 km de vías arteriales, zonales y barriales, de los kilómetros pavimentados el 48% están en buen estado y el restante requiere ser rehabilitadas o necesitan mantenimiento. Tal situación actual de la malla vial urbana está generando, entre otras cosas: Incremento en los tiempos de movilidad de los vehículos y por ende de los habitantes, congestión vial, daños frecuentes en los vehículos particulares y de transporte público, emisión de material articulado por el paso de los vehículos lo cual ocasiona

contaminación del aire, incremento de los niveles de ruido deteriorando la calidad de vida e incrementando el ruido ambiental

Por lo anteriormente descrito, existen actualmente un importante kilometraje deteriorado en la red vial urbana de Cúcuta, lo cual se obtiene por:

a) Muchas de las vías pavimentadas han alcanzado su vida útil, sin haber recibido mantenimientos y/o rehabilitaciones pertinentes.

b) La no reparación por parte de los entes de servicios públicos (Acueducto, Alcantarillado, Gases, Energía, entre otros) al realizar intervenciones sobre estas vías.

c) No existencia de un drenaje adecuado para el manejo de aguas lluvias.

d) Ejecución de vías sin los debidos estudios y diseños, mala calidad de materiales o un mal sistema constructivo ocasionan las fallas en una vía.

e) Utilización de vías que no corresponden al nivel del diseño según su carga o volumen de tráfico.

Así las cosas, con el presente proyecto se pretende".

Que, la necesidad que justifica el presente proceso se encuentra soportado en la formulación del proyecto radicado por la Secretaria de Infraestructura Municipal quien radico ante el Banco de Programas y Proyectos bajo el código BPIN 2020540010057 en el cual se estableció como objetivo general mejorar el tránsito vehicular en la zona urbana del Municipio de San José de Cúcuta, y se incluyen las siguientes actividades: 1.1.1 construcción, mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la red vial en el área urbana vereda el pórtico .

5 CONDICIONES CLIMÁTICAS


Existen diferentes factores que pueden generar los tiempos no productivos en las obras, por lo general son tres los aspectos importantes que se repiten y que si no se contemplan en la planeación del proyecto pueden ocasionar muchas dificultades. El primer aspecto a considerar es la mala planeación administrativa, es muy común que muchos de los tiempos muertos se generen por una mala administración, ya sea por la espera de materiales y herramientas, el traslado de hombres hacia otras áreas de trabajo, la espera de instrucciones, la conglomeración en zonas específicas, las modificaciones en la obra, entre otras. El segundo aspecto que afecta la obra es el tiempo mal usado del personal. Este tiempo desperdiciado se puede generar por diferentes motivos entre los que están la desmotivación, el descontento, baja moral en el trabajo, la falta de supervisión del personal y hasta el estado de ánimo. Y por último existen las causas de fuerza mayor, que son todas aquellas actividades que extraña vez se presentan en las construcciones pero que si llegan a ocurrir es muy probable que generen un tiempo muerto muy importante, como los cortes de energía eléctrica, los accidentes, días feriados y las eventualidades climáticas, respecto a este ultimo la interventoría llevo registro pormenorizado del mismo para ver su incidencia dentro de los rendimientos de la obra.

En este periodo se tuvo condiciones climáticas fueron favorables para las actividades a realizar, lo cual no afecto las actividades a realizar.

5.1.1AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

En el período se cuenta con un porcentaje ejecutado de 98.95 %.

En esta Acta parcial se cobra el 42.24 %

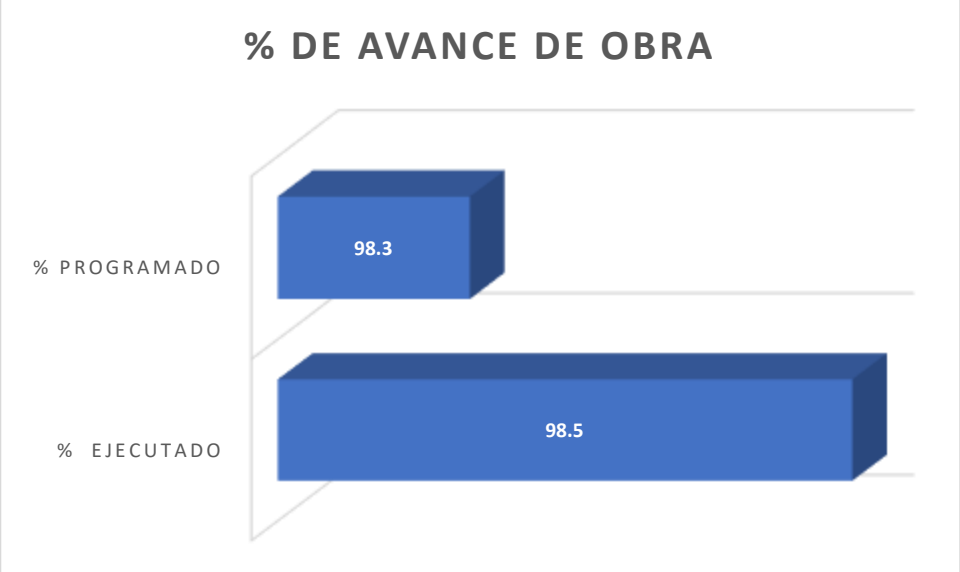

En la gráfica se muestra el % de obra ejecutado acumulado vs el % programado acumulado.

6. ACTIVIDADES CONTRACTUALES EJECUTADAS

A continuación, se realizará una breve descripción de las actividades realizadas en el transcurso del periodo trabajado, describiendo de manera generalizada las acciones representativas en las diversas actividades que se desarrollaron en este proyecto bajo ese periodo.

En el desarrollo de las obras de DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 3. 29 de noviembre de 2023 al 27 de diciembre de 2023 y del 16 de enero de 2024 al17 de febrero de 2024, se desarrollaron las siguientes actividades:

6.1 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION

1. excavación mecánica
2. corte de pavimento asfaltico
3. demolición de pavimento asfaltico (incluye compresor con martillo demoledor)
4. conformación de subrasante

5. riego de liga con emulsión asfáltica crr-1 para construcción (incluye suministro y aplicación)
6. mezcla asfáltica en caliente tipo mdc-19 para construcción (incluye suministro, extendido, nivelación y compactación, incluye transporte del material)
7. base estabilizada con cemento al 6% (incluye suministro, extendido, nivelación y compactación con vibrocompactador 8 ton, incluye transporte)
8. acero para dovelas, canastilla y barras de amarre (incluye corte y figurado e instalación)

4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

1. PARCHEO TEMPORAL DE EMERGENCIA CON MDC-19 (Incluye Suministro, Extendido, Nivelación, compactación y transporte del material, personal e insumos. Emergencias Menores a 7 M2)

6.3 OBRAS COMPLEMENTARIAS

1. Realce de Pozos en concreto de 3000 psi (incluye demolición de concreto y refuerzo)

6.4 ITEM NO PREVISTOS

1. Geo malla para refuerzo
2. cuneta en concreto de 3000 (incluye malla de refuerzo)
3. reparación tubería agua presión
4. concreto 21 mpa, acelerado placa huella
5. concreto de 21 mpa para riostras de 30x20
6. concreto clase g (40% piedra rajón, 60% concreto de 21mpa) (no incluye transporte de agregados)

- *CONTROL EN OBRA:* Se realiza el control y seguimiento mediante balance de cantidades de obra para verificar el alcance del proyecto.

- *INFORMES SEMANALES:* se realizan informes semanales y se radican en la página de la Alcaldía.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN EN OBRA.

La obra tiene para su ejecución un plazo hasta el 16 de junio de 2024, se hace entrega de la programación de obra y flujo de inversión, lo cual se encuentra aprobado por parte de la supervisión.

FLUJO DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

Este ítem consiste en mostrar una herramienta de control para el supervisor que permite exponer de una forma más clara las variables relacionadas en la medición del proyecto en su porcentaje de avance.

CONTROL DE PERSONAL Y DE EQUIPO DEL CONTRATISTA

Diariamente se realizará una inspección del personal a trabajar, así como las ausencias e incapacidades de los trabajadores activos vinculados. Se les hace referencia sobre el uso de los elementos de protección en obra y la importancia de ello, para cualquier tipo de trabajo.

EQUIPO MINIMO REQUERIDO

N	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	RETROEXCAVADORA	2
2	MOTONIVELADORA	1
3	VIBROCOMPACTADOR CILINDRO	2

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En síntesis, para este informe se tienen las siguientes conclusiones derivadas de los temas tratados.

- Se recomienda seguir con las instrucciones asignadas por esta interventoría, para la construcción de cada actividad.
- Se cumple con lo establecido en lo contractual

Atentamente,

SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS
NOHEMI RIVERA RIVEROS
INTERVENTORIA

PROESCO SAS Teléfonos: 5922070
Correo electrónico: proesco_maquinaria@hotmail.com

1. REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SECTOR MINUTO DE DIOS

	• Excavación mecánica
 	• Demolición de pavimento asfaltico (incluye compresor con martillo demoledor)

PROESCO SAS Teléfonos: 5922070
Correo electrónico: proesco_maquinaria@hotmail.com

	• Conformación de subrasante
	• Riego de Liga con emulsión asfáltica CRR-1 PARA CONSTRUCCION (Incluye suministro y aplicación)
 	• MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA CONSTRUCCION (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación, incluye transporte del material)

PROESCO SAS Teléfonos: 5922070
Correo electrónico: proesco_maquinaria@hotmail.com

	• Base estabilizada con cemento al 6% (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador 8 ton, incluye transporte)
	• Realce de Pozos en concreto de 3000 psi (incluye demolición de concreto y refuerzo)

PROESCO SAS Teléfonos: 5922070
Correo electrónico: proesco_maquinaria@hotmail.com

	• NP01 GEOMALLA PARA REFUERZO
	• NP02 CUNETA EN CONCRETO DE 3000 (incluye malla de refuerzo)

PROESCO SAS Teléfonos: 5922070
Correo electrónico: proesco_maquinaria@hotmail.com

	• NP03 REPARACION TUBERIA AGUA PRESION

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SECTOR DE LA VICTORIA

	• Excavación mecánica

PROESCO SAS Teléfonos: 5922070
Correo electrónico: proesco_maquinaria@hotmail.com

	• Conformación de subrasante
	• Retiro de material
	• Base estabilizada con cemento al 6% (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador 8 ton, incluye transporte)

PROESCO SAS Teléfonos: 5922070
Correo electrónico: proesco_maquinaria@hotmail.com

	• Acero para dovelas, canastilla y barras de amarre (incluye corte y figurado e instalación)
 	• NP04 Concreto 21 Mpa, acelerado Placa huella

PROESCO SAS Teléfonos: 5922070
Correo electrónico: proesco_maquinaria@hotmail.com

	• NP05 Concreto de 21 MPA para riostras de 30x20
	• NP06 concreto clase G (40% Piedra rajón, 60% concreto de 21mpa) (no incluye transporte de agregados)

PROESCO SAS Teléfonos: 5922070
Correo electrónico: proesco_maquinaria@hotmail.com

CUNDINAMARCA

	• Excavación
	• Corte de pavimento
	• Demolición de pavimento

	• Base estabilizada
	• Imprimación
	• Retiro de sobrantes

PROESCO SAS Teléfonos: 5922070
Correo electrónico: proesco_maquinaria@hotmail.com

	• Mezcla MCD 19
	• Parcheo temporal

PROESCO SAS Teléfonos: 5922070
Correo electrónico: proesco_maquinaria@hotmail.com

PAZ Y SALVO DE LA ESCOMBRERA



ESCOMBRERA MUNICIPAL
ALCALDÍA SAN JOSÉ DE CÚCUTA
FUNDACIÓN SALVEMOS EL MEDIO AMBIENTE FUNAMBIENTE
FSMA-016-24

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

Fecha del Contrato	23 DE NOVIEMBRE 2023
Contratante	ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA
Contratista	UNION TEMPORAL MALLA VIAL 2023
Nit. Contratiststa	901.100.536-3
Contrato de Obra No.	4301 DE 2023
Objeto del Contrato	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 3.
Valor del contrato	$ 702.558.419 SETECIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE
Valor por Generación de Escombros $	11.481.696
Valor por disposición de Escombros $	2.445.176
Escombros producidos	1.063,12 MTS ACTA DE RECIBO FINAL
Fecha de Expedición	14 DE JUNIO 2024

Hace constar que se encuentra a Paz y Salvo con la escombrera Municipal por concepto de generación de Escombros correspondiente al:

CONTRATO DE OBRA N° 4301 DE 2023

FUNAMBIENTE
Director Técnico
