

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
1		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-290 DE 2018**	**259.13 días**	**vie 22/02/19**
2		REVISION Y APROPIACION DE DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS	14 días	vie 22/02/19
3		**MODELIA CL 23 G ENTRE KR 75 - KR 81 (9003285-9003213)**	**140 días**	**mar 26/02/19**
4		APIQUES	1 día	mar 26/02/19
5		IMPLEMENTACION DEL PMT	2 días	vie 1/03/19
6		**PRELIMINARES**	**1 día**	**sáb 9/03/19**
7		REPLANTEO GENERAL	1 día	sáb 9/03/19
8		**DESCAPOTE/EXCAVACION**	**35 días**	**jue 21/03/19**
9		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	25 días	jue 21/03/19
10		EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	10 días	lun 22/04/19
11		**DEMOLICIONES**	**15 días**	**lun 11/03/19**
12		DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores max. 0.15m	10 días	lun 11/03/19

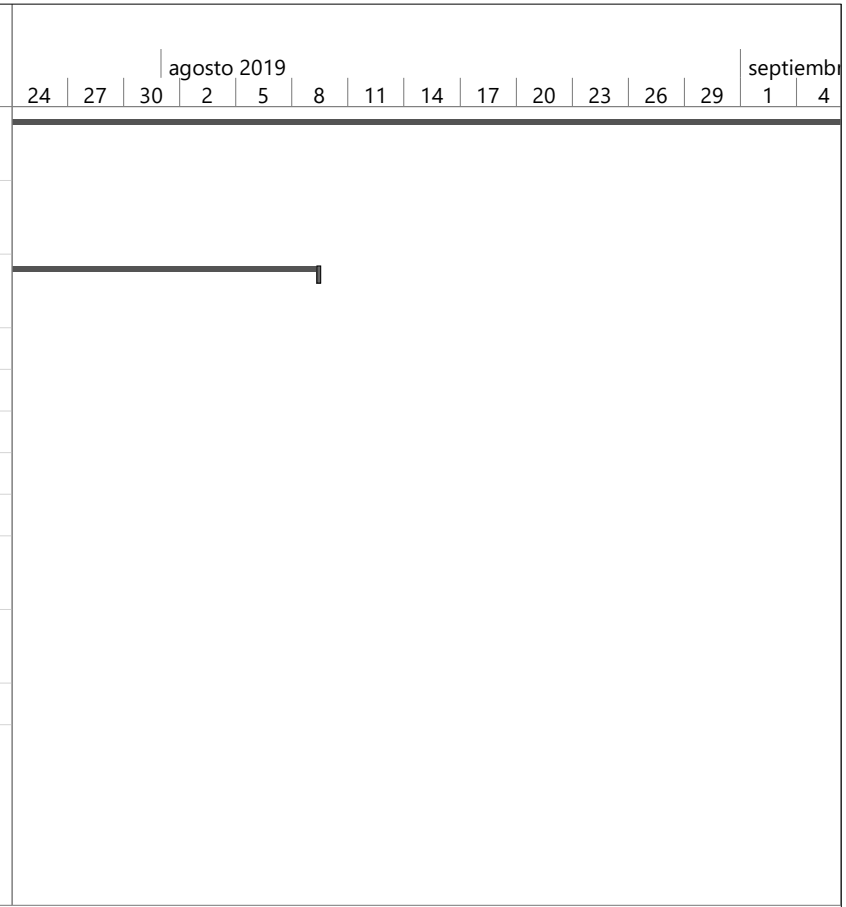

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
13			DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	8 días	sáb 16/03/19
14			DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue)	3 días	sáb 23/03/19
15			**CAPAS GRANULARES**	**76 días**	**lun 29/04/19**
16			SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	10 días	jue 27/06/19
17			NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	10 días	lun 29/04/19
18			BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	8 días	mié 17/07/19
19			**RELLENOS PARA REDES / RELLENOS PARA ANDENES / SUB-DRENES**	**12 días**	**lun 27/05/19**
20			RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	12 días	lun 27/05/19
21			RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (Suministro, Extendido y Compactación)	5 días	lun 27/05/19
22			**PAVIMENTOS ASFALTICO**	**11 días**	**sáb 27/07/19**

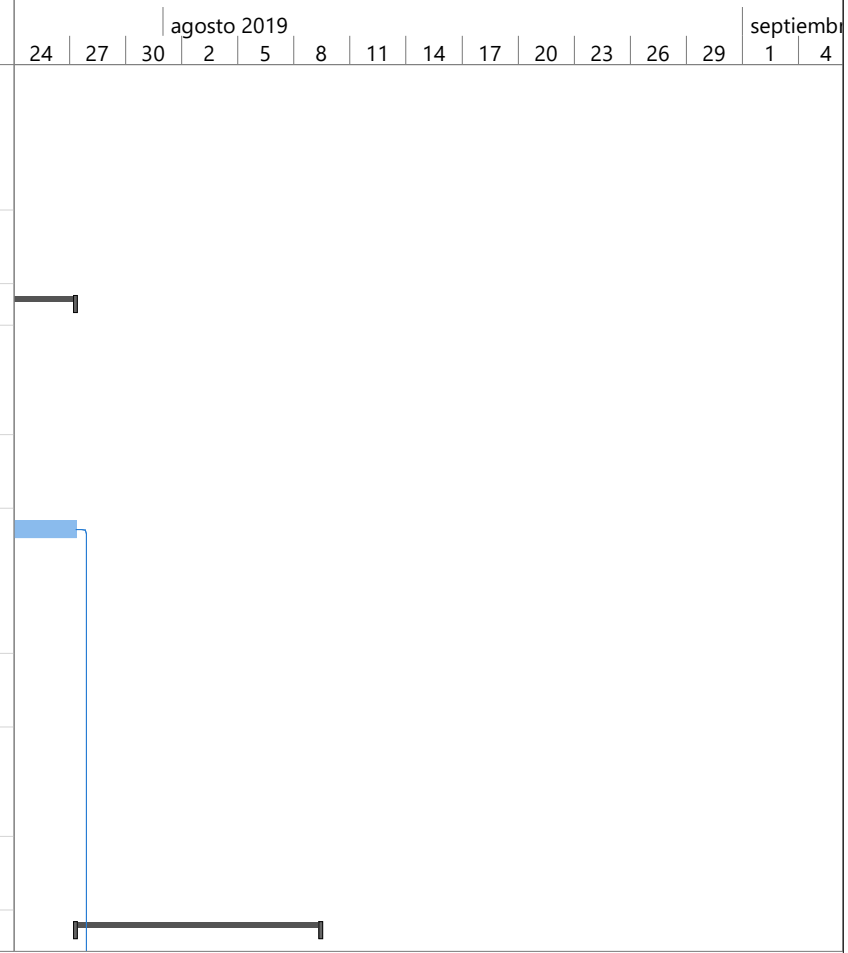

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
23		IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	5 días	sáb 27/07/19
24		RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	5 días	sáb 27/07/19
25		MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	6 días	jue 1/08/19
26		**ESPACIO PUBLICO/SARDINELES/BORDILLO/**	**10 días**	**mar 4/06/19**
27		SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	10 días	mar 4/06/19
28		SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	4 días	mar 4/06/19
29		**BORDILLO PREFABRICADO / ANDENES**	**14 días**	**mié 12/06/19**
30		ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) HECHO EN OBRA e=0.10m (Incluye Mezcla, Formaleteo, Fundida y Curado)	14 días	mié 12/06/19
31		**COMPONENTE AMBIENTAL**	**35 días**	**jue 21/03/19**
32		ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (Incluye Suministro e Instalación)	35 días	jue 21/03/19
33		**GEOTEXTIL**	**4 días**	**vie 12/07/19**

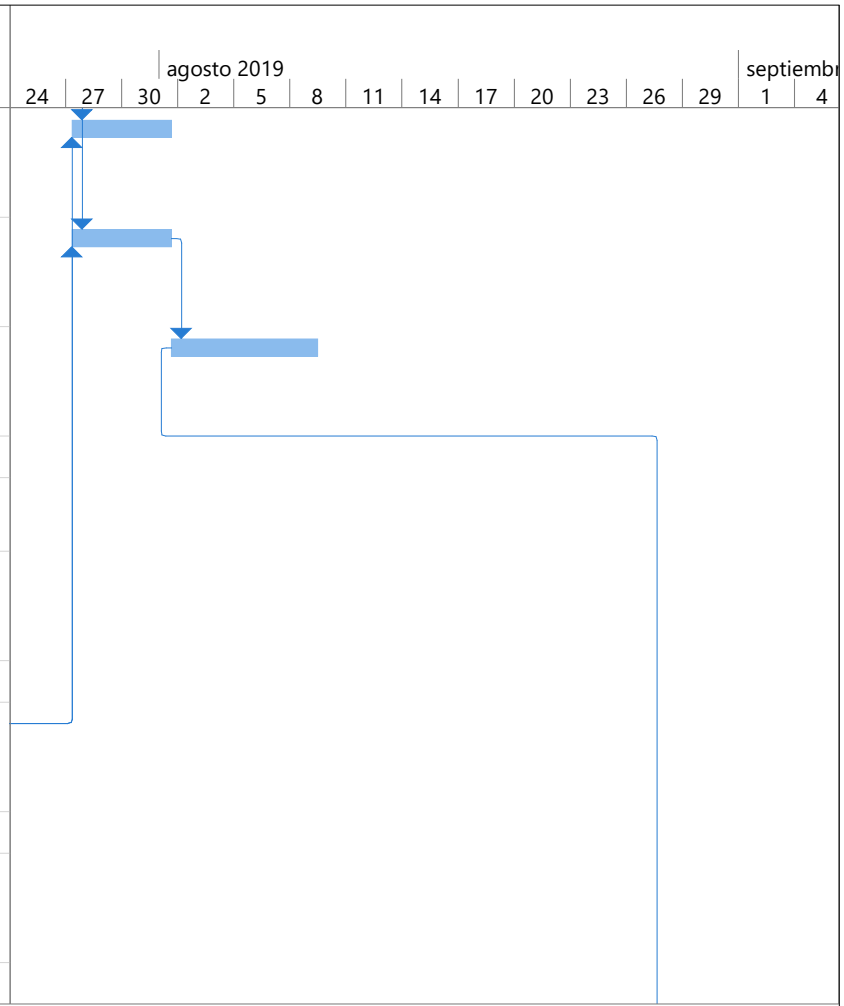

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
34		GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	4 días	vie 12/07/19
35		**REDES**	**9 días**	**sáb 11/05/19**
36		TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)	3 días	sáb 11/05/19
37		TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (Incluye Suministro e Instalación)	6 días	mar 14/05/19
38		**SUMIDEROS**	**4 días**	**vie 31/05/19**
39		SUMIDERO LATERAL SL-150A, H=1.7m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa)	4 días	vie 31/05/19
40		**CILINDRO POZO INSPECCIÓN**	**5 días**	**vie 12/07/19**
41		CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	5 días	vie 12/07/19
42		**PLACAS**	**11 días**	**mié 10/07/19**
43		PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incl. Sumin, Inst.)	3 días	mié 10/07/19

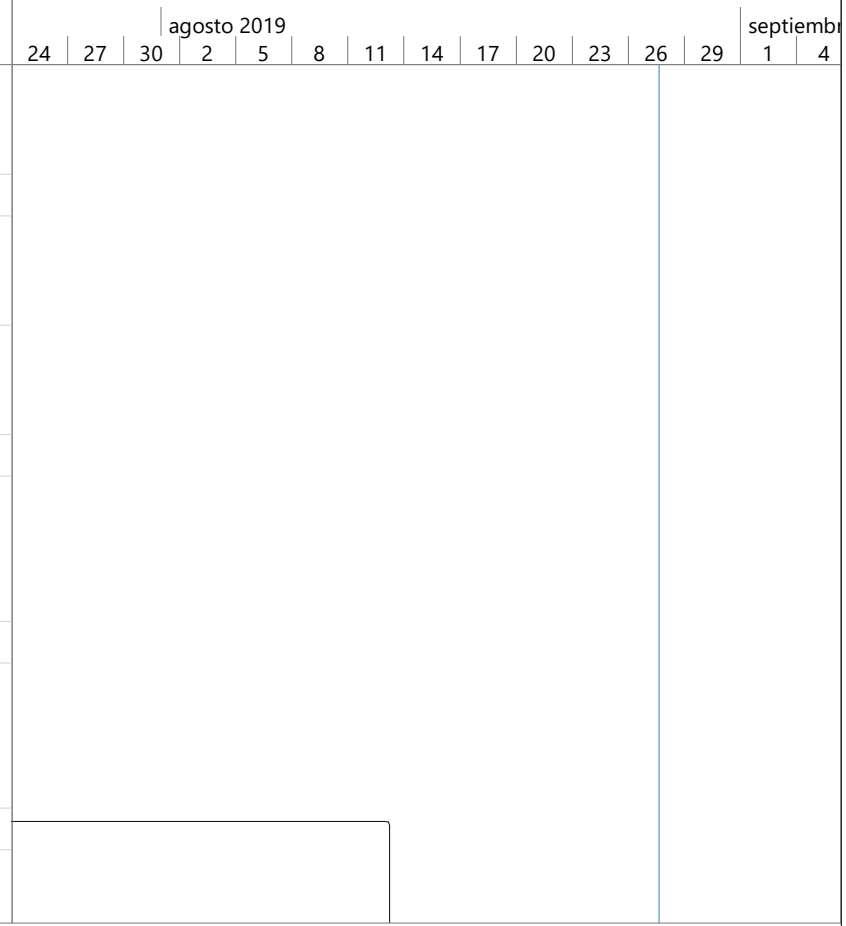

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
44		PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	3 días	jue 18/07/19
45		**LIMPIEZAS**	**1 día**	**jue 7/03/19**
46		LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	1 día	jue 7/03/19
47		LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	1 día	jue 7/03/19
48		**TRANSPORTES Y DISPOSICION DE ESCOMBROS**	**7 días**	**jue 28/03/19**
49		TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	7 días	jue 28/03/19
50		**NO PREVISTOS**	**129 días**	**mar 26/02/19**
51		PRUEBA DE CAMPO PARA LA MODELACIÓN DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, (Incluye ensayos de laboratorio)	1 día	mar 26/02/19
52		LAVADO E INSPECCION CON CCTV	1 día	jue 28/02/19
53		RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5% DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, INCLUYE 1,5% DE CEMENTO PORTLAND.	8 días	mié 17/07/19

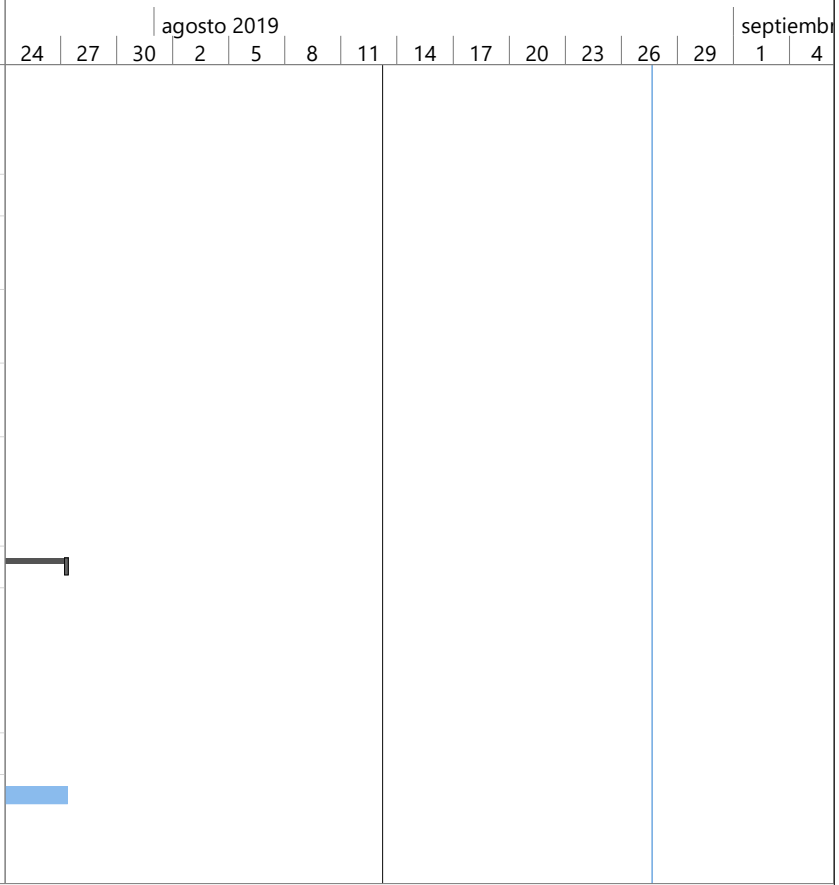

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
54		PROCESO DE INSTALACION DE RECICLADO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)	8 días	mié 17/07/19
55		ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN(suministro, extendido a mano, nivelación y compactación con retroexcavadora sobre oruga y benitin de 1 tonelada incluyen operario y combustible)	10 días	sáb 15/06/19
56		CÁRCAMO EN MAMPOSTERÍA CON TAPA EN CONCRETO PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT 10" (área=0,46 m2; h=0,575 m)	6 días	mar 14/05/19
57		CÁRCAMO EN MAMPOSTERÍA CON TAPA EN CONCRETO PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT 16" (área=0,65 m2; h=0,65 m)	12 días	jue 16/05/19
58		TUBERÍA EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D=10" (SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA)	3 días	mar 21/05/19

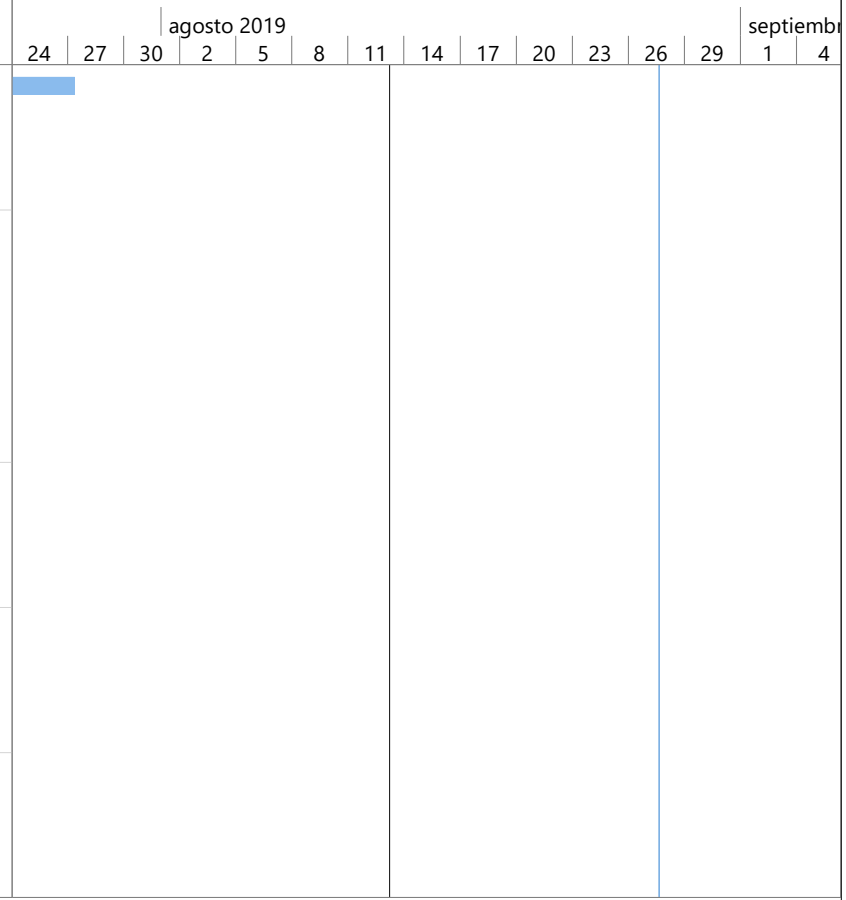

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
59		TUBERÍA EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D=12" (SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA)	3 días	mié 5/06/19
60		PERFORACIONES EN SECO DE 3" INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAL HIDRATADA	5 días	lun 10/06/19
61		GEODRÉN CON TUBERÍA CIRCULAR 4" H=0,5 m	4 días	mié 10/07/19
62		CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 hasta h=1,90 m (incluye suministro, construcción, marco, tapa, base y cañuela)	9 días	mar 21/05/19
63		**MODELIA CL 23 G ENTRE KR 81 - KR 82 (50003247-9003024)**	**113 días**	**lun 12/08/19**
64		APIQUES	1 día	lun 12/08/19
65		IMPLEMENTACION DEL PMT	2 días	vie 16/08/19
66		**PRELIMINARES**	**1 día**	**sáb 24/08/19**
67		REPLANTEO GENERAL	1 día	sáb 24/08/19
68		**DESCAPOTE/EXCAVACION**	**30 días**	**vie 6/09/19**
69		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	20 días	vie 6/09/19
70		EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	10 días	vie 27/09/19
71		**DEMOLICIONES**	**15 días**	**lun 26/08/19**

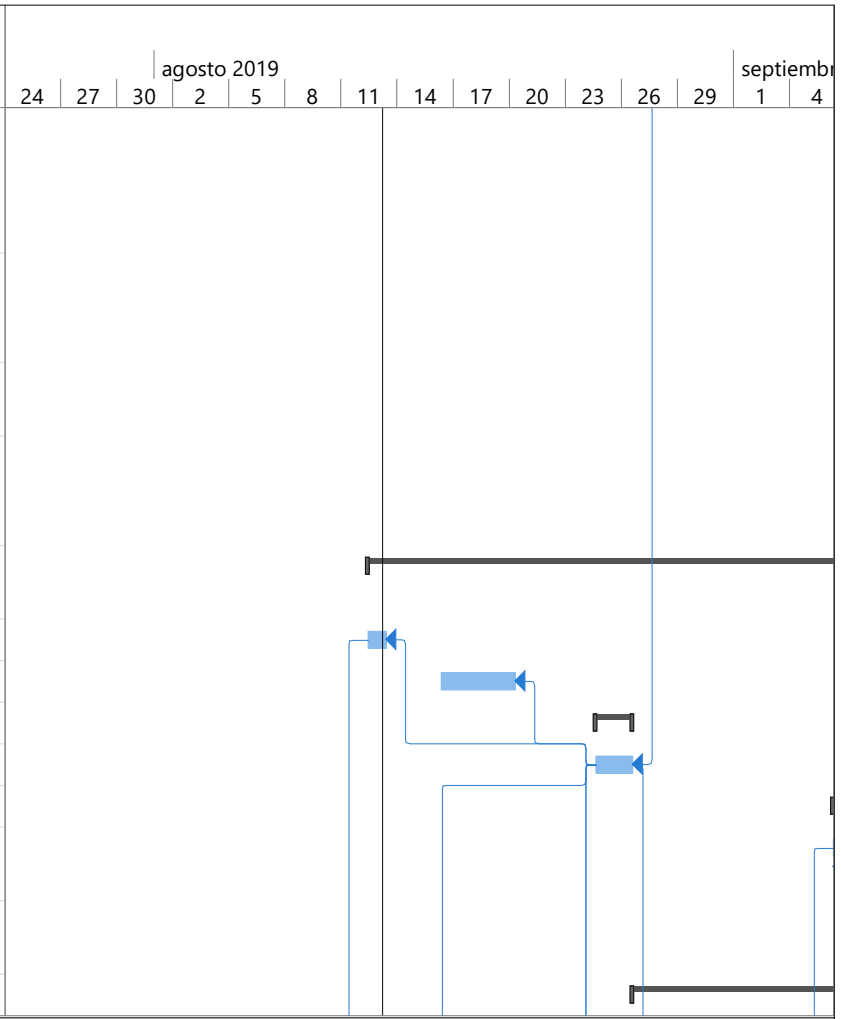

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
72			DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores max. 0.15m	10 días	lun 26/08/19
73			DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	8 días	lun 2/09/19
74			DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue)	3 días	lun 9/09/19
75			**CAPAS GRANULARES**	**59 días**	**vie 27/09/19**
76			SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	9 días	mié 13/11/19
77			BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	7 días	mié 27/11/19
78			NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	8 días	vie 27/09/19
79			**RELLENOS PARA REDES / RELLENOS PARA ANDENES / SUB-DRENES**	**15 días**	**sáb 12/10/19**

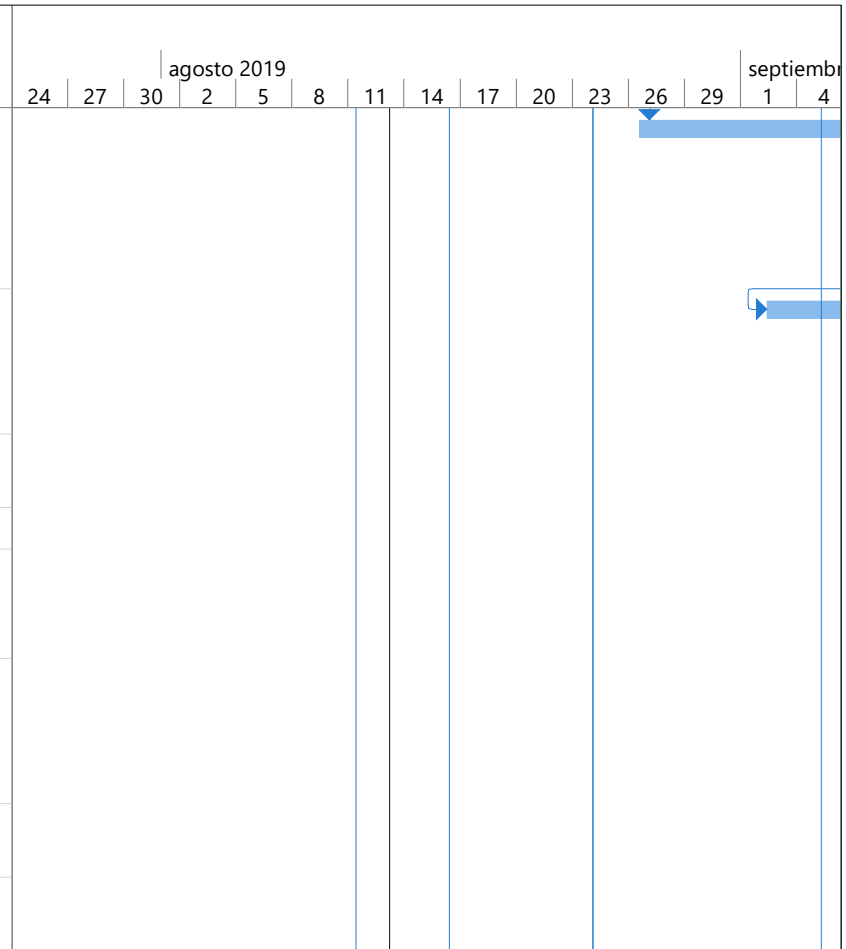

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
80		RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	12 días	jue 17/10/19
81		RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (Suministro, Extendido y Compactación)	6 días	sáb 12/10/19
82		**PAVIMENTOS ASFALTICO**	**11 días**	**vie 6/12/19**
83		IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	5 días	vie 6/12/19
84		RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	5 días	vie 6/12/19
85		MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	6 días	jue 12/12/19
86		**ESPACIO PUBLICO/SARDINELES/BORDILLO/**	**10 días**	**lun 18/11/19**
87		SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	10 días	lun 18/11/19
88		SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	4 días	mié 20/11/19
89		**BORDILLO PREFABRICADO / ANDENES**	**14 días**	**jue 21/11/19**



Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
90		ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) HECHO EN OBRA e=0.10m (Incluye Mezcla, Formaleteo, Fundida y Curado)	14 días	jue 21/11/19
91		**COMPONENTE AMBIENTAL**	**30 días**	**vie 6/09/19**
92		ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (Incluye Suministro e Instalación)	30 días	vie 6/09/19
93		**GEOTEXTIL**	**4 días**	**sáb 23/11/19**
94		GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	4 días	sáb 23/11/19
95		**REDES**	**9 días**	**lun 7/10/19**
96		TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)	3 días	lun 7/10/19
97		TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (Incluye Suministro e Instalación)	6 días	jue 10/10/19
98		**SUMIDEROS**	**4 días**	**lun 28/10/19**
99		SUMIDERO LATERAL SL-150A, H=1.7m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa)	4 días	lun 28/10/19
100		**CILINDRO POZO INSPECCIÓN**	**6 días**	**vie 11/10/19**

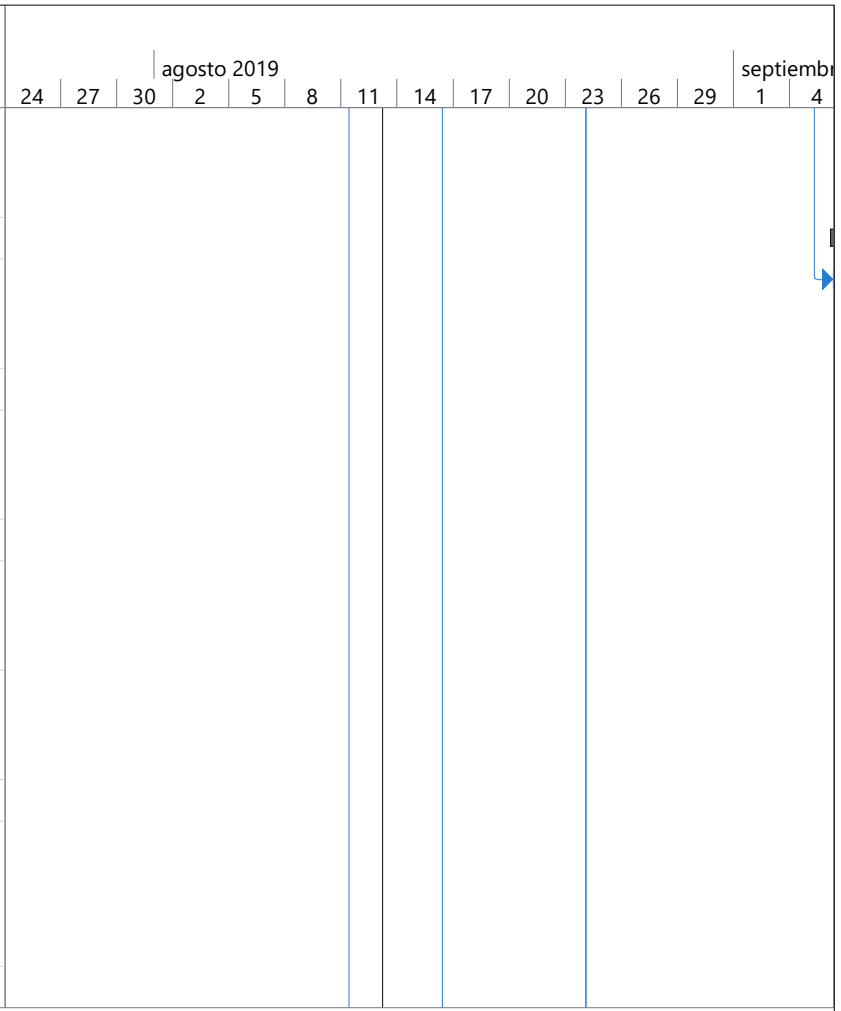

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
101		CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	6 días	vie 11/10/19
102		**PLACAS**	**14 días**	**lun 7/10/19**
103		PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	4 días	lun 7/10/19
104		PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	4 días	vie 18/10/19
105		**LIMPIEZAS**	**1 día**	**vie 30/08/19**
106		LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	1 día	vie 30/08/19
107		LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	1 día	vie 30/08/19
108		**TRANSPORTES Y DISPOSICION DE ESCOMBROS**	**7 días**	**mié 11/09/19**
109		TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	7 días	mié 11/09/19
110		**NO PREVISTOS**	**101 días**	**lun 12/08/19**

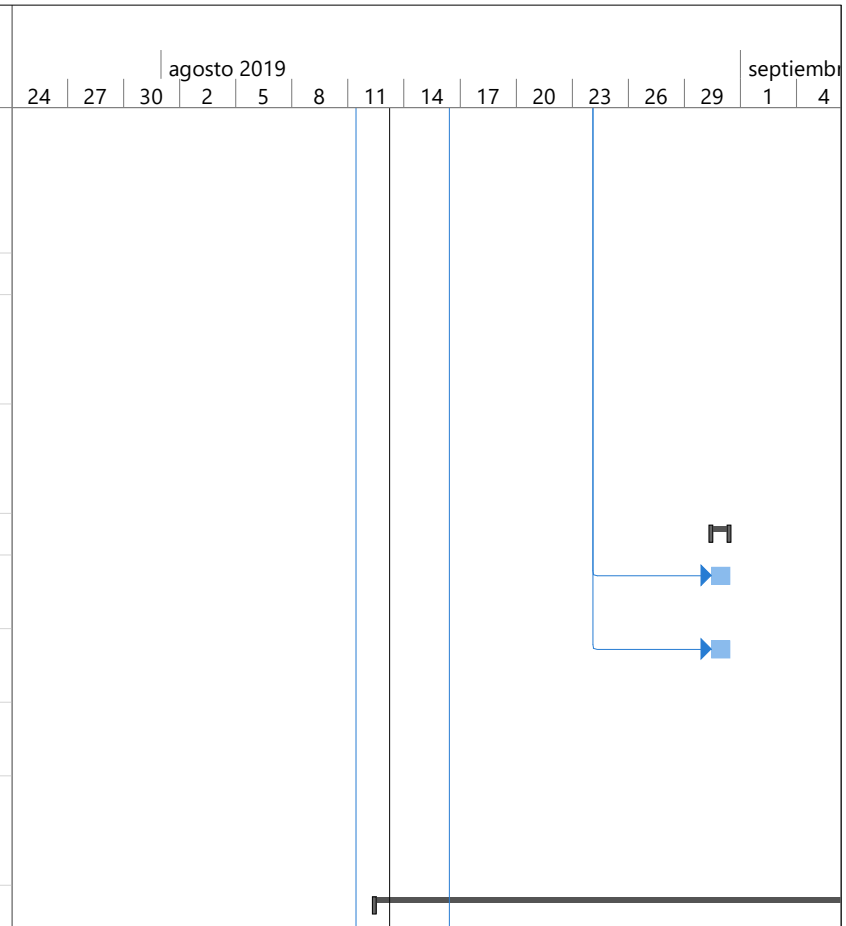

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
111			PRUEBA DE CAMPO PARA LA MODELACIÓN DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, (Incluye ensayos de laboratorio)	1 día	lun 12/08/19
112			LAVADO E INSPECCION CON CCTV	1 día	mié 14/08/19
113			RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5% DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, INCLUYE 1,5% DE CEMENTO PORTLAND.	7 días	mié 27/11/19
114			PROCESO DE INSTALACION DE RECICLADO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)	7 días	mié 27/11/19
115			ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN(suministro, extendido a mano, nivelación y compactación con retroexcavadora sobre oruga y benitin de 1 tonelada incluyen operario y combustible)	8 días	sáb 2/11/19
116			CÁRCAMO EN MAMPOSTERÍA CON TAPA EN CONCRETO PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT 10" (área=0,46 m2; h=0,575 m)	4 días	jue 10/10/19

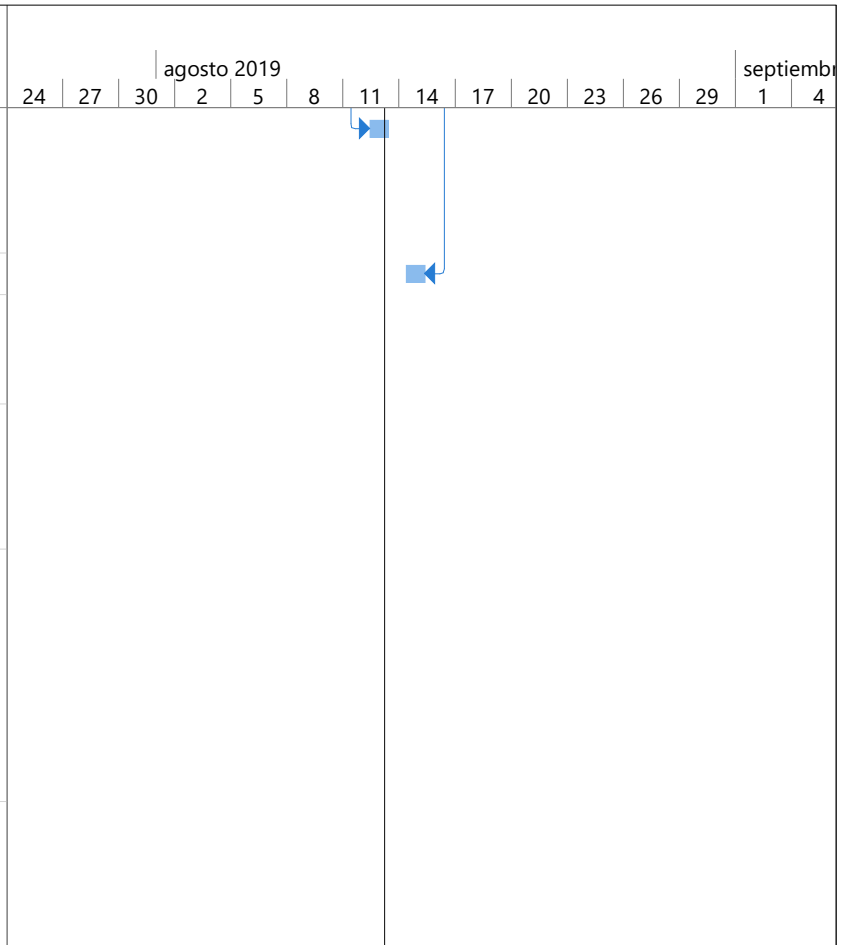

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
117			CÁRCAMO EN MAMPOSTERÍA CON TAPA EN CONCRETO PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT 16" (área=0,65 m2; h=0,65 m)	8 días	sáb 12/10/19
118			TUBERÍA EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D=10" (SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA)	3 días	jue 10/10/19
119			TUBERÍA EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D=12" (SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA)	3 días	mar 15/10/19
120			PERFORACIONES EN SECO DE 3" INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAL HIDRATADA	5 días	mié 30/10/19
121			GEODRÉN CON TUBERÍA CIRCULAR 4" H=0,5 m	4 días	sáb 23/11/19
122			CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 hasta h=1,90 m (incluye suministro, construcción, marco, tapa, base y cañuela)	9 días	jue 17/10/19
123			**SELVA DORADA. CALLE 23 ENTRE CALLE 24B Y 24C (9000148)**	**132 días**	**lun 1/04/19**
124			APIQUES	1 día	lun 1/04/19
125			IMPLEMENTACION DEL PMT	4 días	mar 2/04/19

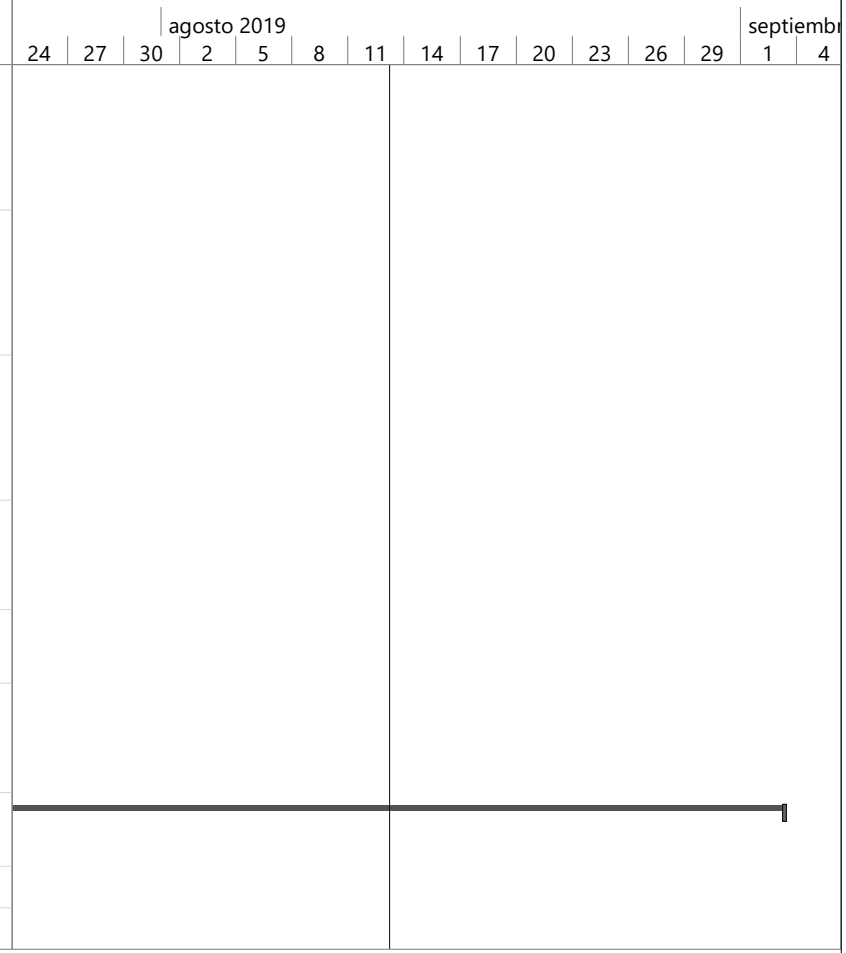

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
126		**PRELIMINARES**	**1 día**	**sáb 6/04/19**
127		REPLANTEO GENERAL	1 día	sáb 6/04/19
128		**DESCAPOTE/EXCAVACION**	**35 días**	**lun 22/04/19**
129		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	15 días	lun 22/04/19
130		EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	20 días	jue 9/05/19
131		**DEMOLICIONES**	**18 días**	**lun 8/04/19**
132		DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores max. 0.15m	10 días	lun 8/04/19
133		DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	6 días	mié 17/04/19
134		DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue)	6 días	mar 23/04/19
135		**CAPAS GRANULARES**	**40 días**	**vie 31/05/19**
136		SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	7 días	lun 17/06/19

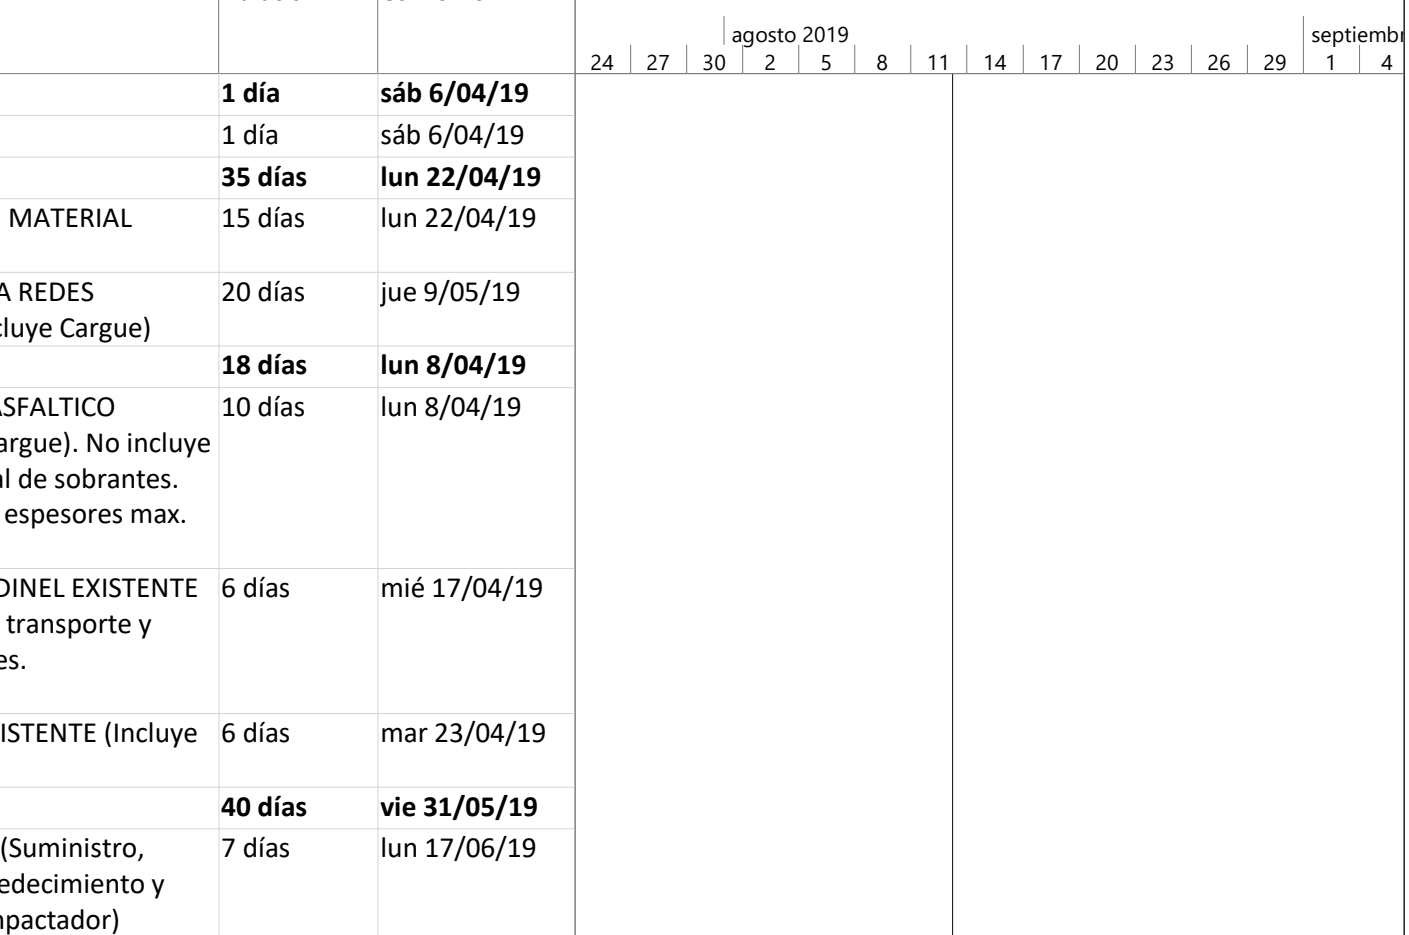

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
137		NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	6 días	vie 31/05/19
138		BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	8 días	mar 9/07/19
139		**RELLENOS PARA REDES / RELLENOS PARA ANDENES / SUB-DRENES**	**14 días**	**lun 8/07/19**
140		RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	12 días	mié 10/07/19
141		RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (Suministro, Extendido y Compactación)	5 días	lun 8/07/19
142		**PAVIMENTOS ASFALTICO**	**5 días**	**mié 21/08/19**
143		IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	5 días	mié 21/08/19
144		RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	5 días	mié 21/08/19
145		**ESPACIO PUBLICO/SARDINELES/BORDILLO/**	**16 días**	**mié 24/07/19**
146		SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	8 días	mié 24/07/19

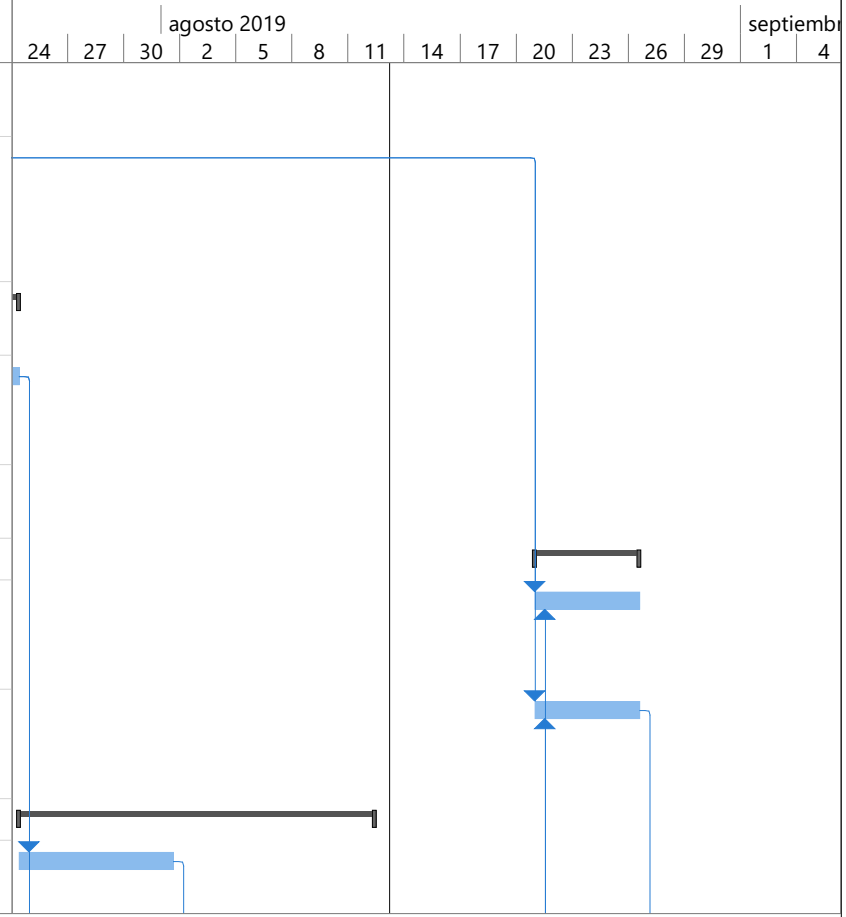

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
147		SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	8 días	jue 1/08/19
148		**BORDILLO PREFABRICADO / ANDENES**	**7 días**	**lun 12/08/19**
149		ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) HECHO EN OBRA e=0.10m (Incluye Mezcla, Formaleteo, Fundida y Curado)	7 días	lun 12/08/19
150		**COMPONENTE AMBIENTAL**	**35 días**	**lun 22/04/19**
151		ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (Incluye Suministro e Instalación)	35 días	lun 22/04/19
152		**GEOTEXTIL**	**5 días**	**mié 3/07/19**
153		GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	5 días	mié 3/07/19
154		**REDES**	**17 días**	**vie 7/06/19**
155		TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	5 días	vie 7/06/19
156		TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)	6 días	mar 11/06/19

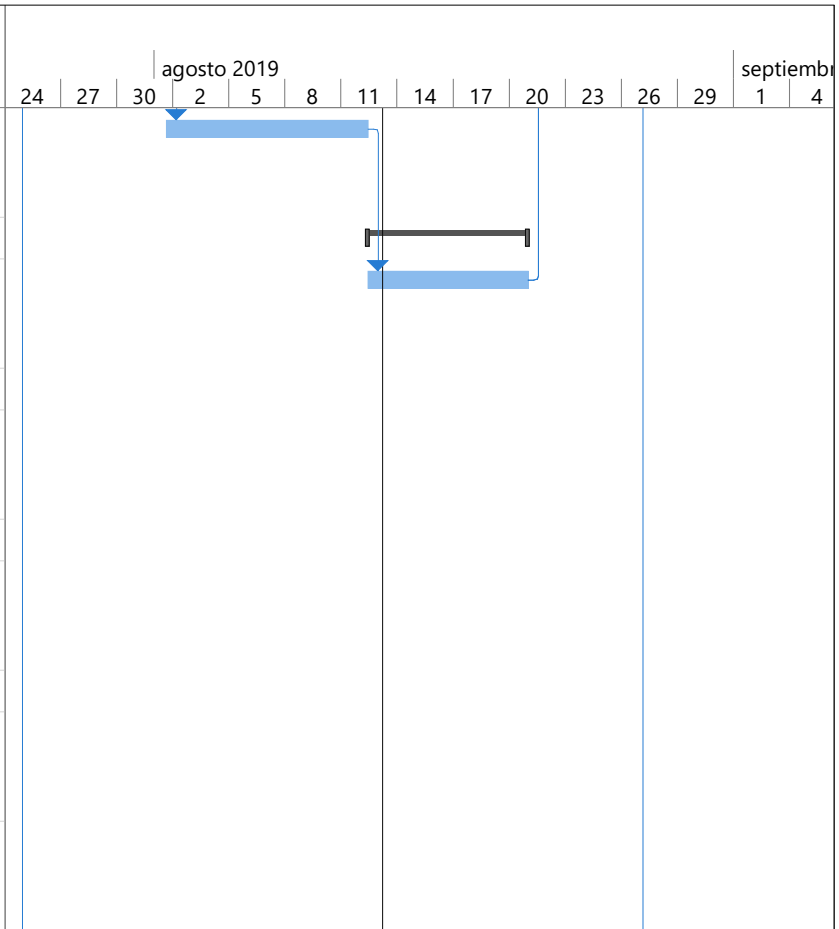


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
157		TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)	10 días	sáb 15/06/19
158		**ACCESORIOS**	**6 días**	**jue 27/06/19**
159		CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)	6 días	jue 27/06/19
160		**SUMIDEROS**	**6 días**	**vie 5/07/19**
161		SUMIDERO LATERAL SL-150A, H=1.7m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa)	6 días	vie 5/07/19
162		**CILINDRO POZO INSPECCIÓN**	**7 días**	**mié 3/07/19**
163		CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	7 días	mié 3/07/19
164		**PLACAS**	**19 días**	**mar 25/06/19**
165		PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	6 días	mar 25/06/19



Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
166		PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	6 días	jue 11/07/19
167		**LIMPIEZAS**	**1 día**	**lun 8/04/19**
168		LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	1 día	lun 8/04/19
169		LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	1 día	lun 8/04/19
170		**TRANSPORTES Y DISPOSICION DE ESCOMBROS**	**132 días**	**lun 1/04/19**
171		TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	7 días	mar 30/04/19
172		**NO PREVISTOS**	**132 días**	**lun 1/04/19**
173		PRUEBA DE CAMPO PARA LA MODELACIÓN DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, (Incluye ensayos de laboratorio)	1 día	lun 1/04/19
174		LAVADO E INSPECCION CON CCTV	1 día	jue 4/04/19
175		RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5% DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, INCLUYE 1,5% DE CEMENTO PORTLAND.	7 días	mar 9/07/19

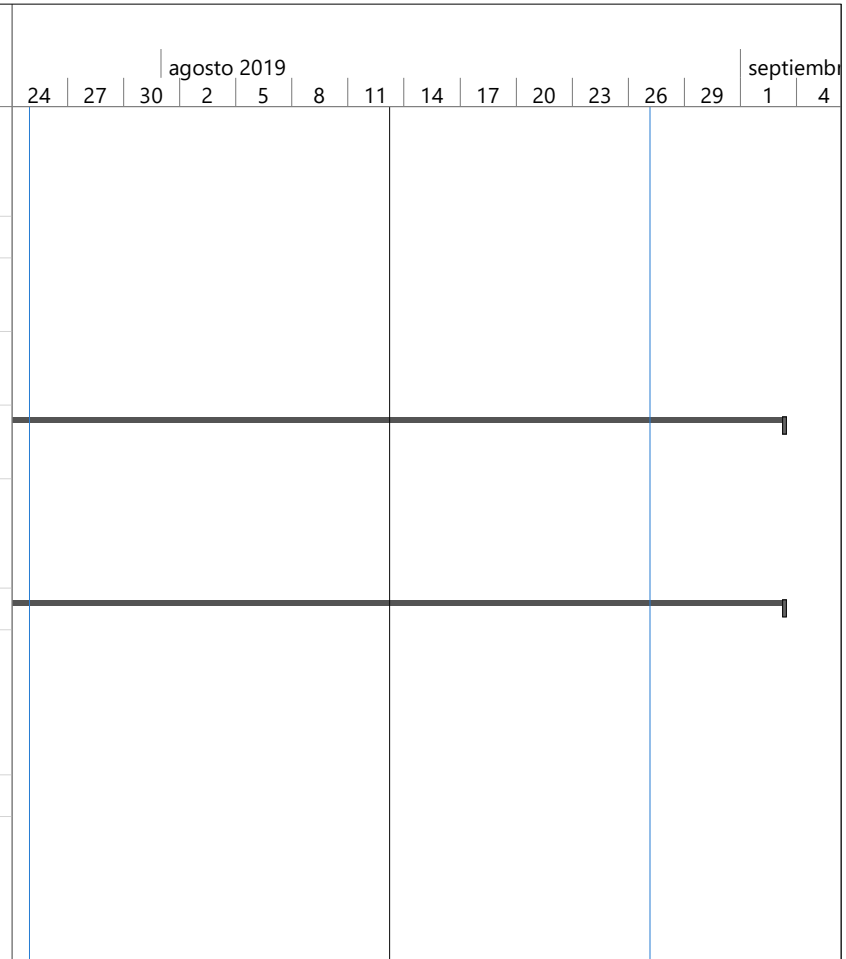

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
176			PROCESO DE INSTALACION DE RECICLADO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)	7 días	mar 9/07/19
177			ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN(suministro, extendido a mano, nivelación y compactación con retroexcavadora sobre oruga y benitin de 1 tonelada incluyen operario y combustible)	8 días	vie 7/06/19
178			CÁRCAMO EN MAMPOSTERÍA CON TAPA EN CONCRETO PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT 6" (área=0,255 m2; h=0,425 m)	5 días	lun 10/06/19
179			CÁRCAMO EN MAMPOSTERÍA CON TAPA EN CONCRETO PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT 8" (área=0,34 m2; h=0,425 m)	20 días	jue 13/06/19
180			CÁRCAMO EN MAMPOSTERÍA CON TAPA EN CONCRETO PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT 12" (área=0,5175 m2; h=0,575 m)	14 días	mar 18/06/19

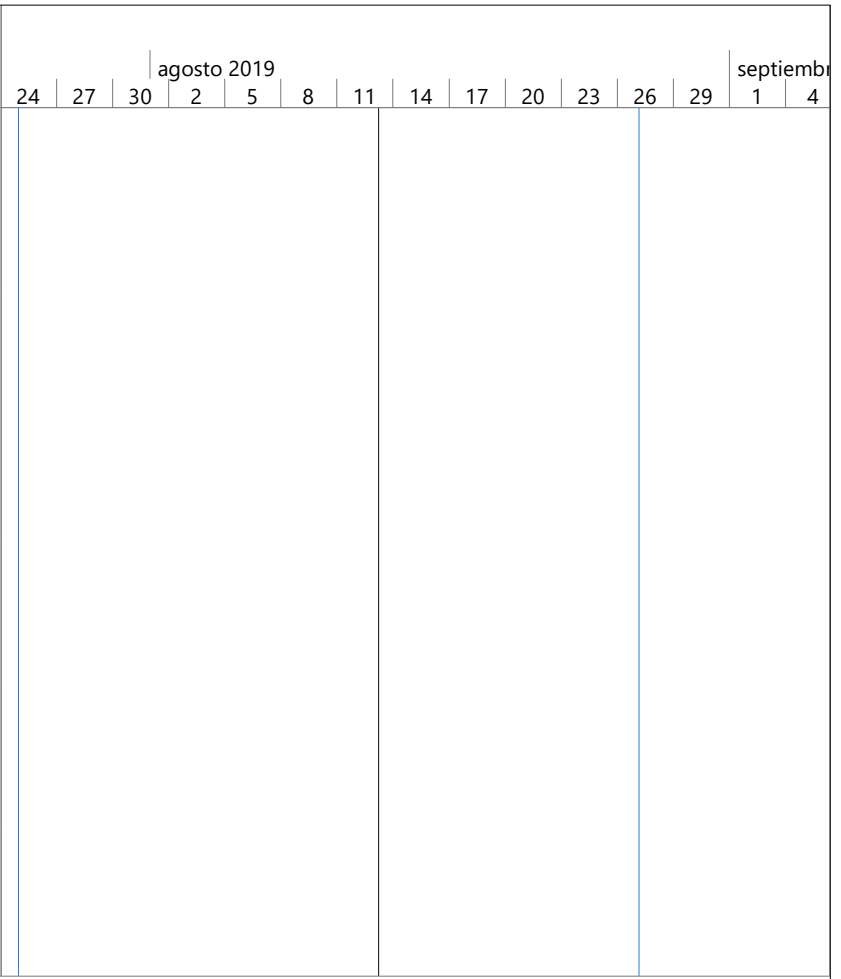

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
181			PERFORACIONES EN SECO DE 3" INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAL HIDRATADA	5 días	mié 24/07/19
182			GEODRÉN CON TUBERÍA CIRCULAR 4" H=0,5 m	4 días	mar 25/06/19
183			REHABILITACION PAVIMENTO FLEXIBLE e=0,12	7 días	lun 26/08/19
184			**MODELIA CARRERA 81 ENTRE 24B Y 24C**	**74 días**	**mar 20/08/19**
185	✓		APIQUES	1 día	mar 20/08/19
186	✓		LAVADO E INSPECCION CON CCTV	1 día	mié 21/08/19
187	✓		IMPLEMENTACION DEL PMT	4 días	mié 21/08/19
188	✓		**PRELIMINARES**	**1 día**	**jue 29/08/19**
189	✓		REPLANTEO GENERAL	1 día	jue 29/08/19
190	✓		**DESCAPOTE/EXCAVACION**	**14 días**	**mié 4/09/19**
191	✓		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	6 días	mié 4/09/19
192	✓		EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	8 días	mar 10/09/19
193	✓		**DEMOLICIONES**	**12 días**	**vie 30/08/19**

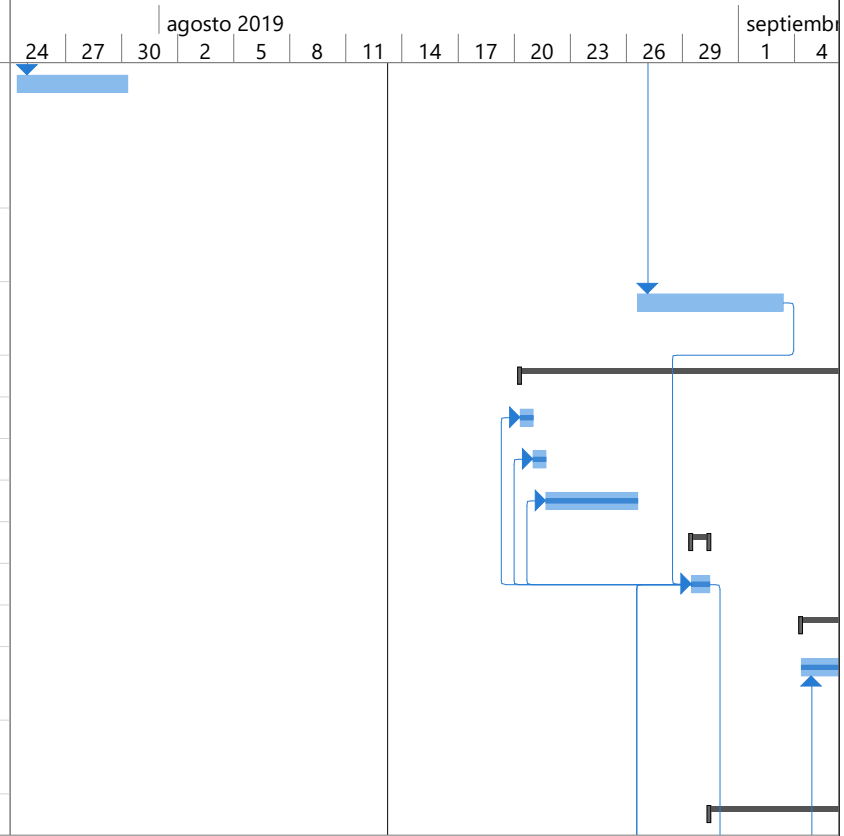

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
194	✓		DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores max. 0.15m	4 días	vie 30/08/19
195	✓		DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	4 días	mié 4/09/19
196	✓		DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue)	4 días	lun 9/09/19
197	✓		**CAPAS GRANULARES**	**40 días**	**jue 19/09/19**
198	✓		SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	4 días	mar 22/10/19
199	✓		ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJON (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	6 días	mié 16/10/19
200	✓		NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	4 días	jue 19/09/19
201	✓		BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	5 días	mar 29/10/19

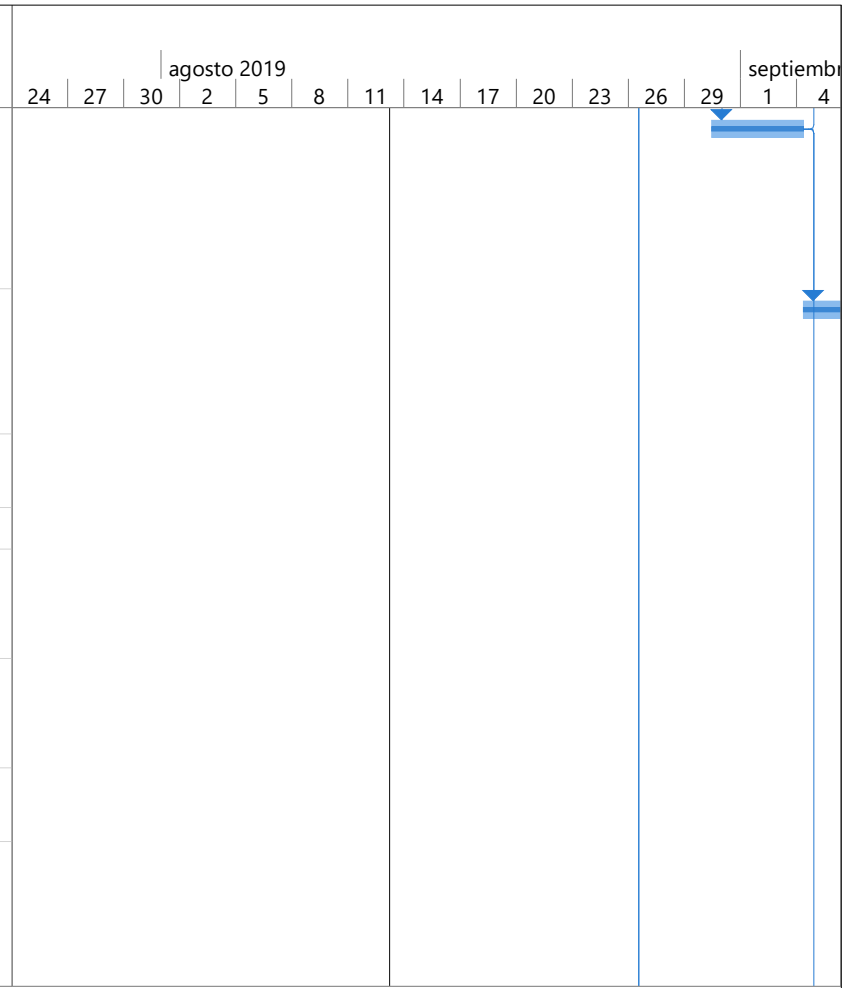

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
202	✓		**RELLENOS PARA REDES / RELLENOS PARA ANDENES / SUB-DRENES**	**6 días**	**mar 8/10/19**
203	✓		RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	3 días	vie 11/10/19
204	✓		RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (Suministro, Extendido y Compactación)	3 días	mar 8/10/19
205	✓		**PAVIMENTOS ASFALTICO**	**3 días**	**mar 5/11/19**
206	✓		IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	3 días	mar 5/11/19
207	✓		RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	3 días	mar 5/11/19
208	✓		**ESPACIO PUBLICO/SARDINELES/BORDILLO/**	**4 días**	**sáb 26/10/19**
209	✓		SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	2 días	sáb 26/10/19
210	✓		SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	2 días	mar 29/10/19
211	✓		**BORDILLO PREFABRICADO / ANDENES**	**3 días**	**jue 31/10/19**
212	✓		ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) HECHO EN OBRA e=0.10m (Incluye Mezcla, Formaleteo, Fundida y Curado)	3 días	jue 31/10/19



Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
213	✓		**COMPONENTE AMBIENTAL**	**8 días**	**mar 10/09/19**
214	✓		ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (Incluye Suministro e Instalación)	8 días	mar 10/09/19
215	✓		**GEOTEXTIL**	**2 días**	**sáb 26/10/19**
216	✓		GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	2 días	sáb 26/10/19
217	✓		**REDES**	**13 días**	**mar 24/09/19**
218	✓		TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	2 días	mar 24/09/19
219	✓		TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)	3 días	jue 26/09/19
220	✓		TUBERIA CONCRETO D=12" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)	4 días	sáb 28/09/19
221	✓		TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (Incluye Suministro e Instalación)	4 días	jue 3/10/19
222	✓		**ACCESORIOS**	**3 días**	**mar 8/10/19**

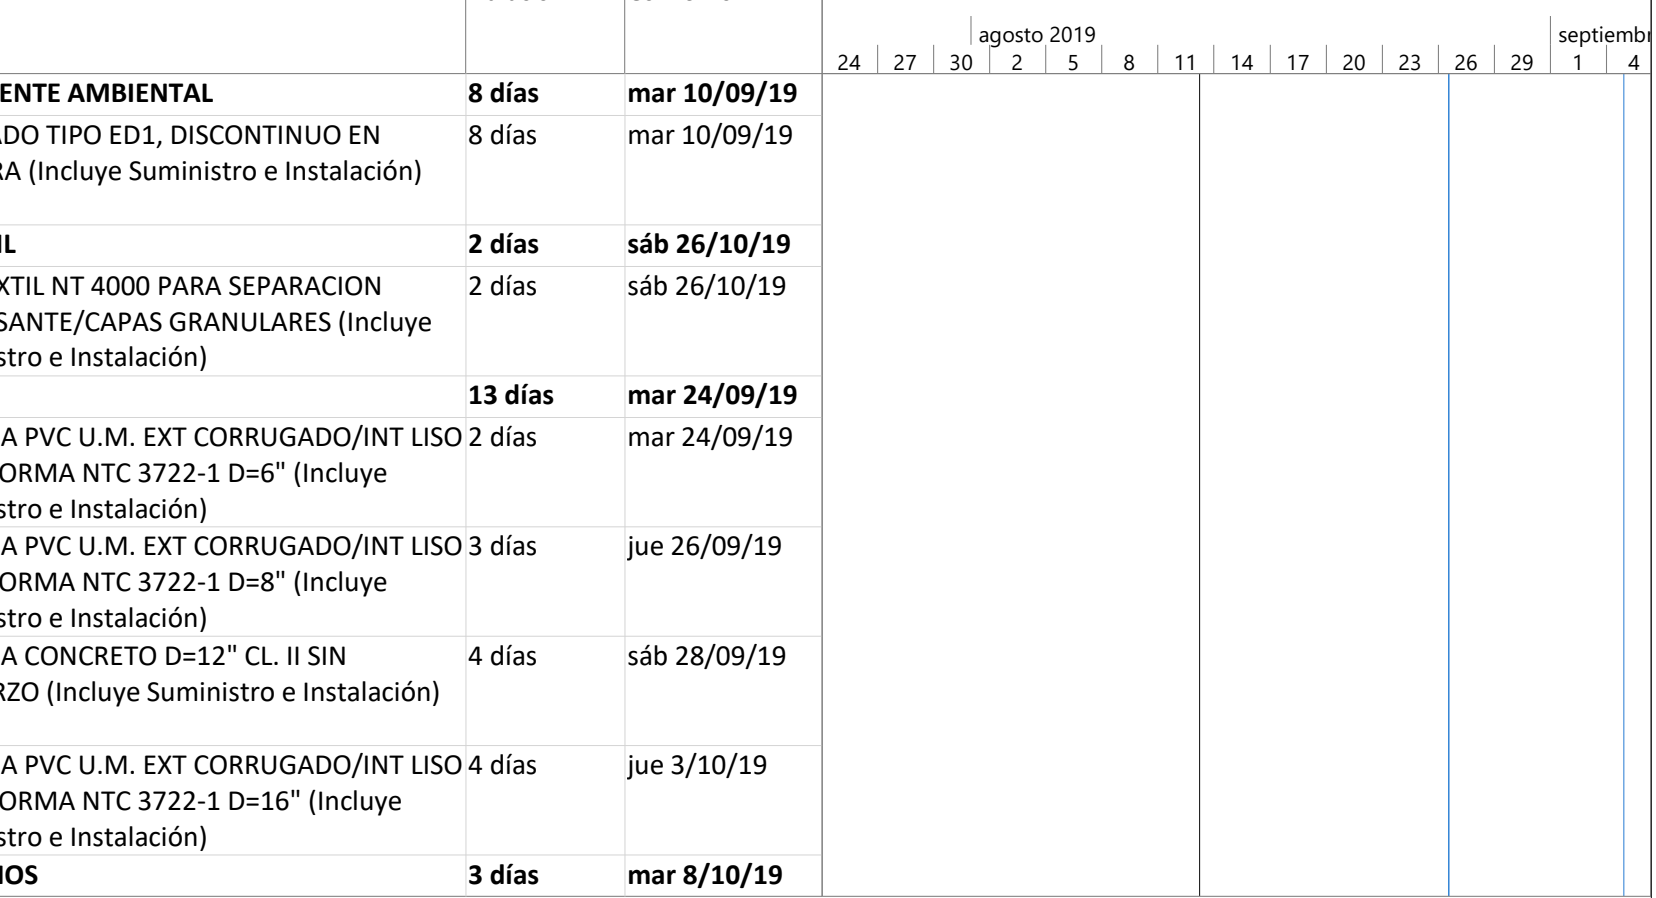

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
223	✓		CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)	3 días	mar 8/10/19
224	✓		**SUMIDEROS**	**2 días**	**vie 11/10/19**
225	✓		SUMIDERO LATERAL SL-150A, H=1.7m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa)	2 días	vie 11/10/19
226	✓		**CILINDRO POZO INSPECCIÓN**	**3 días**	**sáb 26/10/19**
227	✓		CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	3 días	sáb 26/10/19
228	✓		**PLACAS**	**7 días**	**jue 24/10/19**
229	✓		PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	2 días	jue 24/10/19
230	✓		PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	2 días	mié 30/10/19
231	✓		**LIMPIEZAS**	**1 día**	**mar 27/08/19**
232	✓		LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	1 día	mar 27/08/19

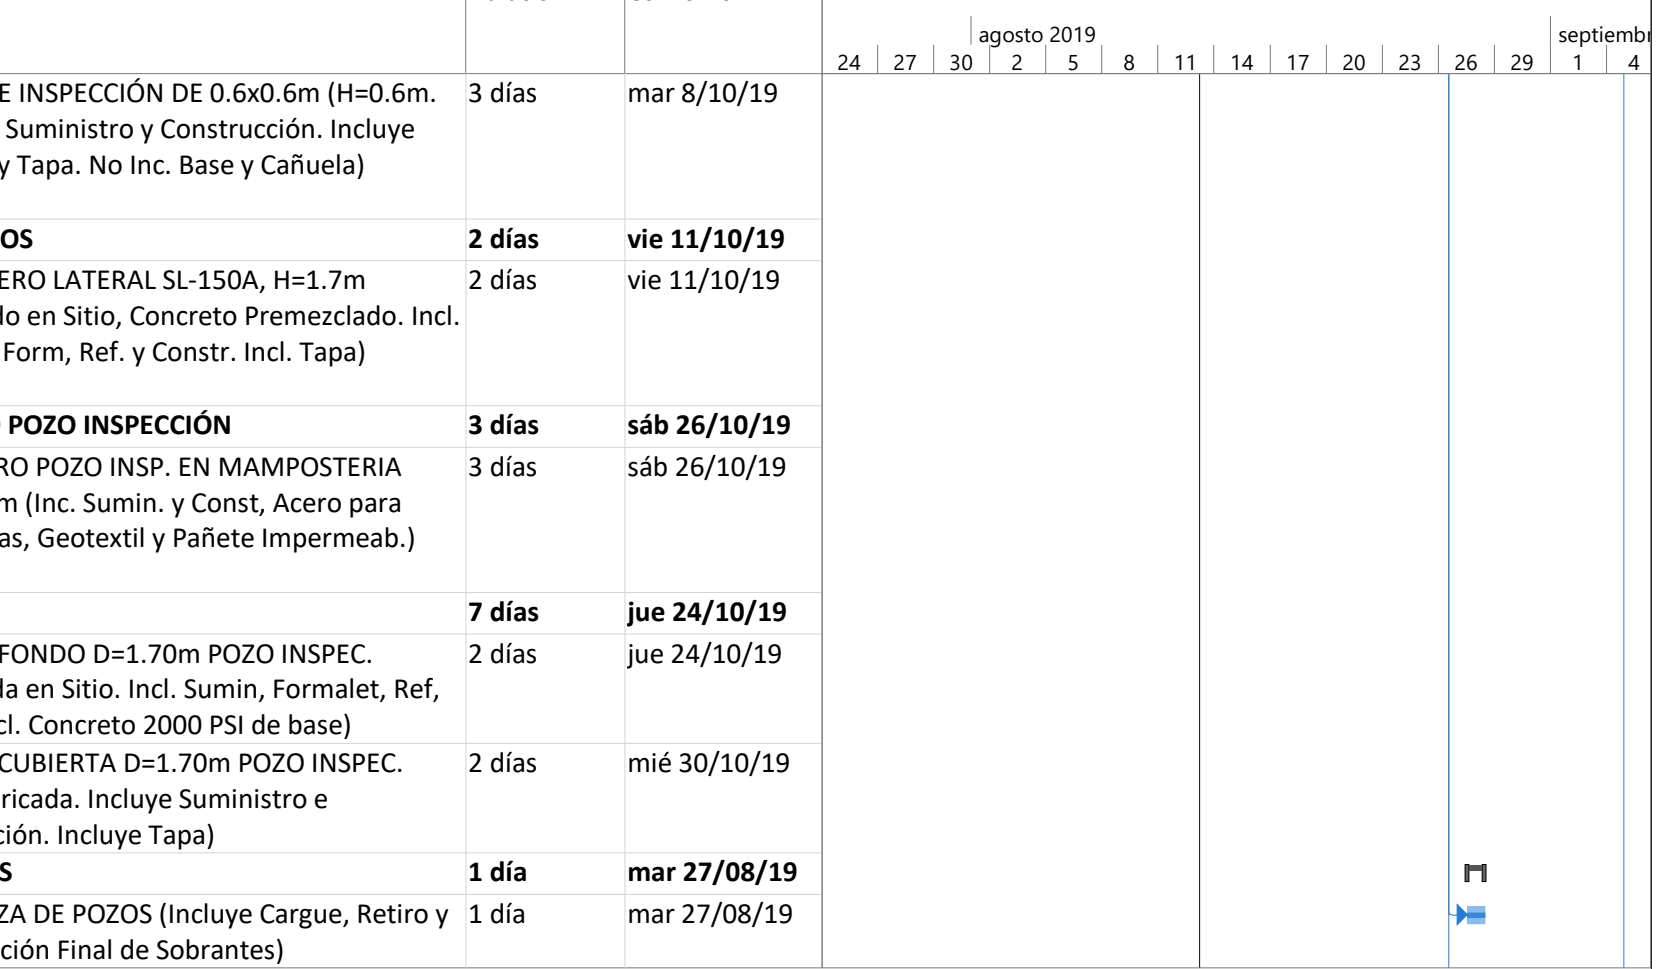

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
233	✓		LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	1 día	mar 27/08/19
234	✓		**TRANSPORTES Y DISPOSICION DE ESCOMBROS**	**3 días**	**mié 4/09/19**
235	✓		TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	3 días	mié 4/09/19
236			**NO PREVISTO**	**11 días**	**mar 29/10/19**
237			RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5% DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, INCLUYE 1,5% DE CEMENTO PORTLAND.	2 días	mar 29/10/19
238			PROCESO DE INSTALACION DE RECICLADO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)	2 días	mar 29/10/19
239	✓		REHABILITACION PAVIMENTO FLEXIBLE e=0,12	3 días	jue 7/11/19
240			**CASANDRA CARRERA 134A ENTRE CALLE 14F Y 16**	**159 días**	**mar 18/06/19**
241			APIQUES	1 día	mar 18/06/19
242			LAVADO E INSPECCION CON CCTV	1 día	mié 19/06/19
243			IMPLEMENTACION DEL PMT	3 días	mié 19/06/19
244			**LIMPIEZAS**	**2 días**	**jue 20/06/19**

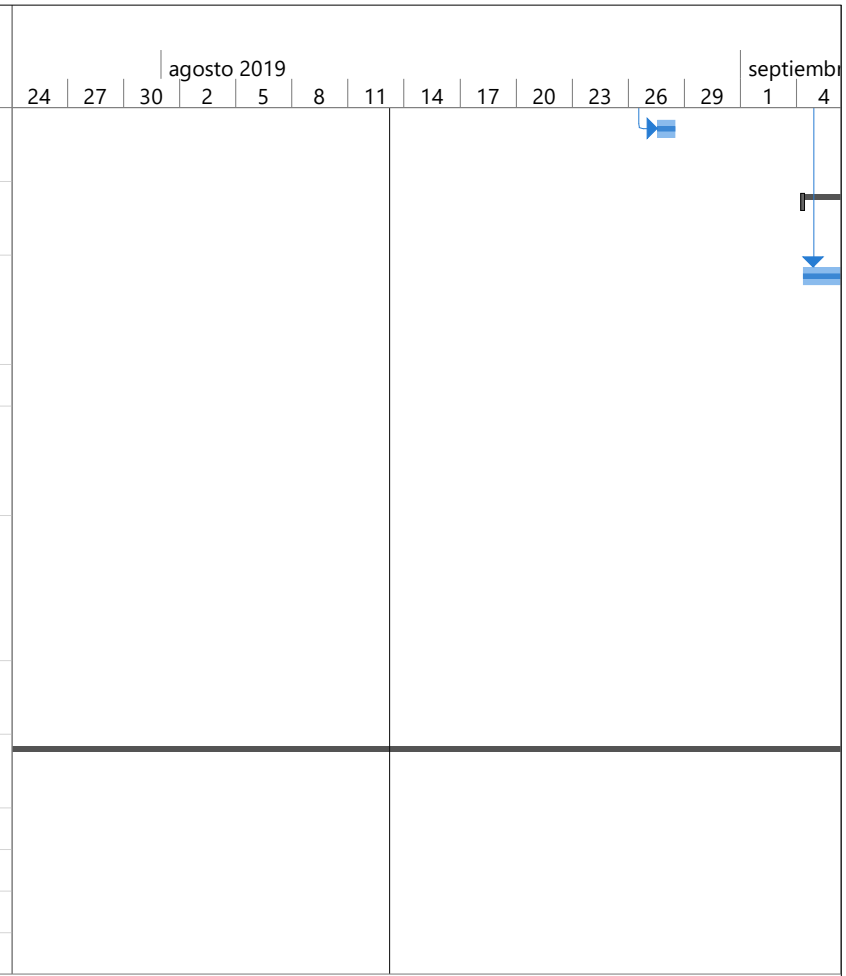

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
245		LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	1 día	jue 20/06/19
246		LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	1 día	vie 21/06/19
247		**PRELIMINARES**	**1 día**	**sáb 22/06/19**
248		REPLANTEO GENERAL	1 día	sáb 22/06/19
249		**PAVIMENTOS ASFALTICO**	**2 días**	**sáb 22/06/19**
250		FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO Profundidad de Fresado 0 - 18 cm. (Incluye Cargue)	2 días	sáb 22/06/19
251		**CIV 9000252**	**20 días**	mié 26/06/19
252		**DESCAPOTE/EXCAVACION**	**4 días**	**mié 26/06/19**
253		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	3 días	mié 26/06/19
254		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	3 días	jue 27/06/19
255		**CAPAS GRANULARES**	**17 días**	**sáb 29/06/19**
256		SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	3 días	sáb 13/07/19
257		ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJON (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	2 días	vie 12/07/19



Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
258		NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	2 días	sáb 29/06/19
259		BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	2 días	mié 17/07/19
260		**RELLENOS PARA REDES / RELLENOS PARA ANDENES / SUB-DRENES**	**3 días**	**mar 9/07/19**
261		RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	3 días	mar 9/07/19
262		RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (Suministro, Extendido y Compactación)	2 días	mar 9/07/19
263		**COMPONENTE AMBIENTAL**	**4 días**	**mié 26/06/19**
264		ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (Incluye Suministro e Instalación)	4 días	mié 26/06/19
265		**GEOTEXTIL**	**1 día**	**mar 16/07/19**
266		GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	1 día	mar 16/07/19
267		**REDES**	**6 días**	**mar 2/07/19**



Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
268		TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	6 días	mar 2/07/19
269		TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA 2TC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)	6 días	mar 2/07/19
270		**CILINDRO POZO INSPECCIÓN**	**1 día**	**jue 4/07/19**
271		CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	1 día	jue 4/07/19
272		**PLACAS**	**3 días**	**mié 3/07/19**
273		PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	1 día	mié 3/07/19
274		PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	1 día	vie 5/07/19
275		**TRANSPORTES Y DISPOSICION DE ESCOMBROS**	**2 días**	**mar 2/07/19**



Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
276		TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	2 días	mar 2/07/19
277		**NO PREVISTOS**	**2 días**	**mié 17/07/19**
278		RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5% DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, INCLUYE 1,5% DE CEMENTO PORTLAND.	2 días	mié 17/07/19
279		PROCESO DE INSTALACION DE RECICLADO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)	2 días	mié 17/07/19
280		**CIV 9000263**	**20 días**	**vie 19/07/19**
281		**DESCAPOTE/EXCAVACION**	**4 días**	**vie 19/07/19**
282		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	3 días	vie 19/07/19
283		EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	3 días	lun 22/07/19
284		**CAPAS GRANULARES**	**17 días**	**mié 24/07/19**

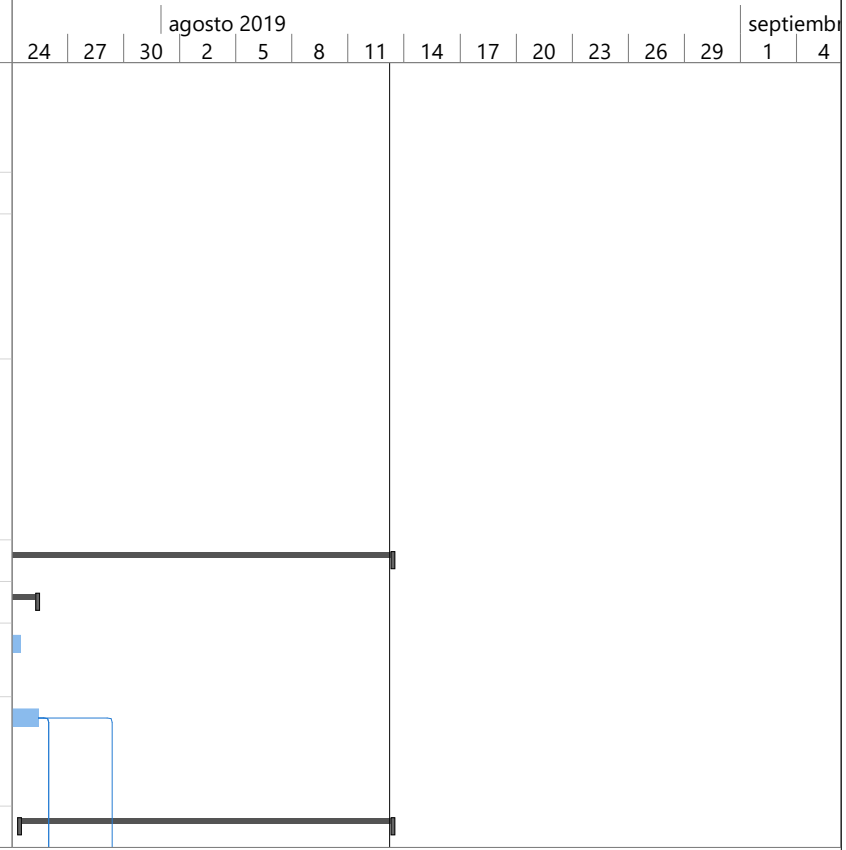

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
285		SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	3 días	lun 5/08/19
286		ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJON (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	2 días	sáb 3/08/19
287		NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	2 días	mié 24/07/19
288		BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	2 días	sáb 10/08/19
289		**RELLENOS PARA REDES / RELLENOS PARA ANDENES / SUB-DRENES**	**3 días**	**jue 1/08/19**
290		RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	3 días	jue 1/08/19
291		RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (Suministro, Extendido y Compactación)	2 días	jue 1/08/19
292		**COMPONENTE AMBIENTAL**	**4 días**	**vie 19/07/19**

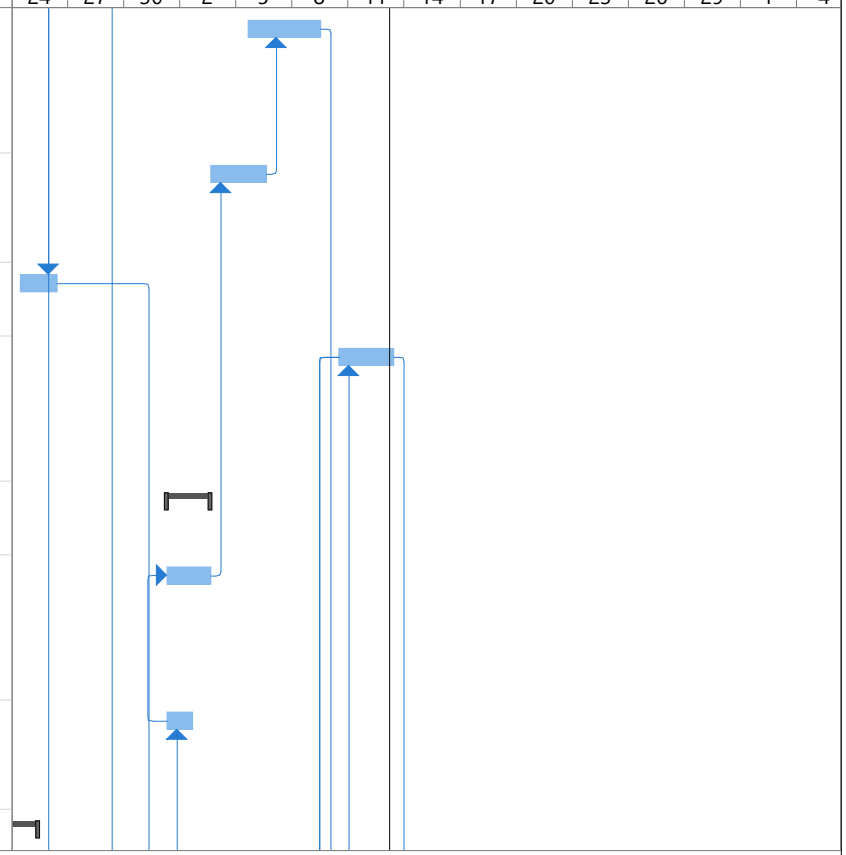

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
293		ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (Incluye Suministro e Instalación)	4 días	vie 19/07/19
294		**GEOTEXTIL**	**1 día**	**vie 9/08/19**
295		GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	1 día	vie 9/08/19
296		**REDES**	**6 días**	**jue 25/07/19**
297		TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	6 días	jue 25/07/19
298		TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMANTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)	6 días	jue 25/07/19
299		**CILINDRO POZO INSPECCIÓN**	**1 día**	**jue 1/08/19**
300		CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	1 día	jue 1/08/19
301		**PLACAS**	**3 días**	**mié 31/07/19**

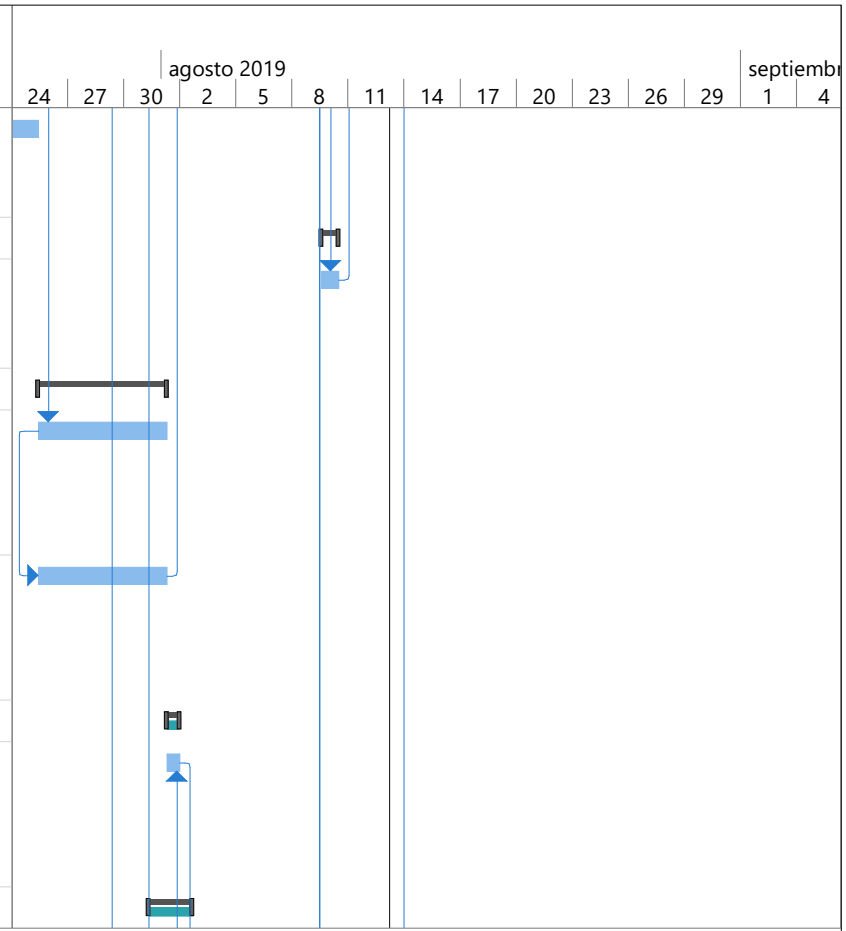

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
302		PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	1 día	mié 31/07/19
303		PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	1 día	vie 2/08/19
304		**TRANSPORTES Y DISPOSICION DE ESCOMBROS**	**2 días**	**lun 29/07/19**
305		TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	2 días	lun 29/07/19
306		**NO PREVISTOS**	**2 días**	**sáb 10/08/19**
307		RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5% DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, INCLUYE 1,5% DE CEMENTO PORTLAND.	2 días	sáb 10/08/19
308		PROCESO DE INSTALACION DE RECICLADO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)	2 días	sáb 10/08/19
309		**CIV 9000284**	**20 días**	**mar 13/08/19**
310		**DESCAPOTE/EXCAVACION**	**4 días**	**mar 13/08/19**

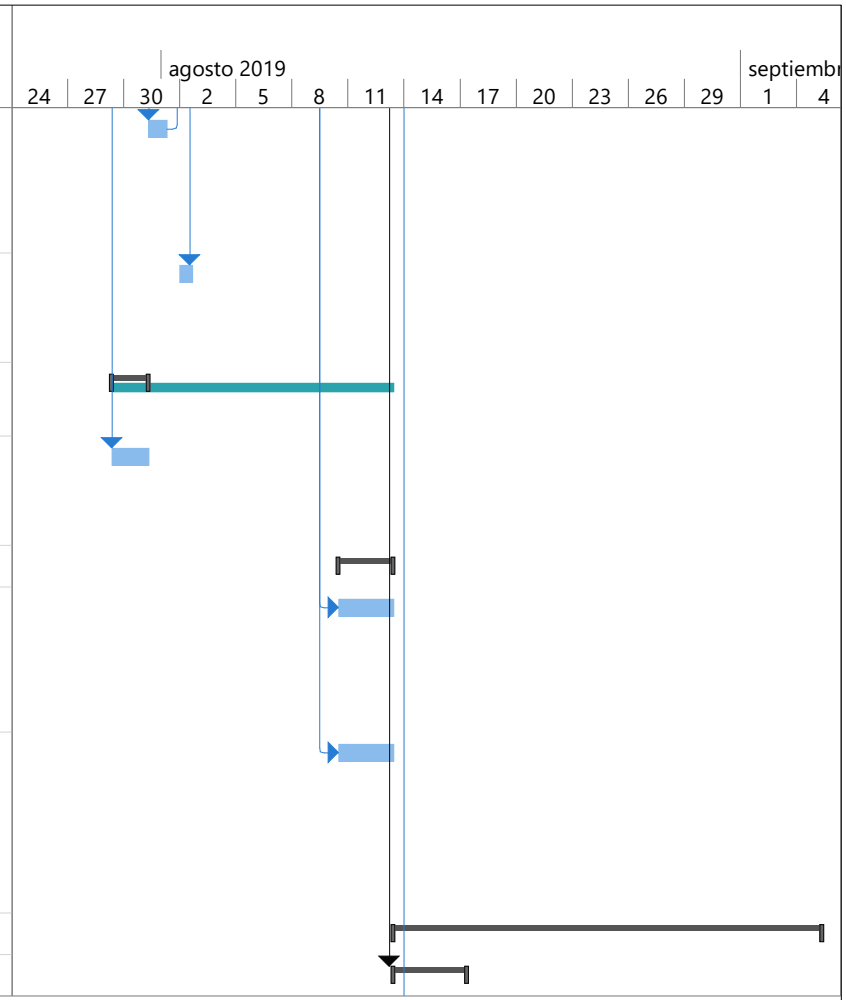

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
311		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	3 días	mar 13/08/19
312		EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	3 días	mié 14/08/19
313		**CAPAS GRANULARES**	**17 días**	**vie 16/08/19**
314		SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	3 días	jue 29/08/19
315		ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJON (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	2 días	mié 28/08/19
316		NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	2 días	vie 16/08/19
317		BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	2 días	mar 3/09/19
318		**RELLENOS PARA REDES / RELLENOS PARA ANDENES / SUB-DRENES**	**3 días**	**sáb 24/08/19**

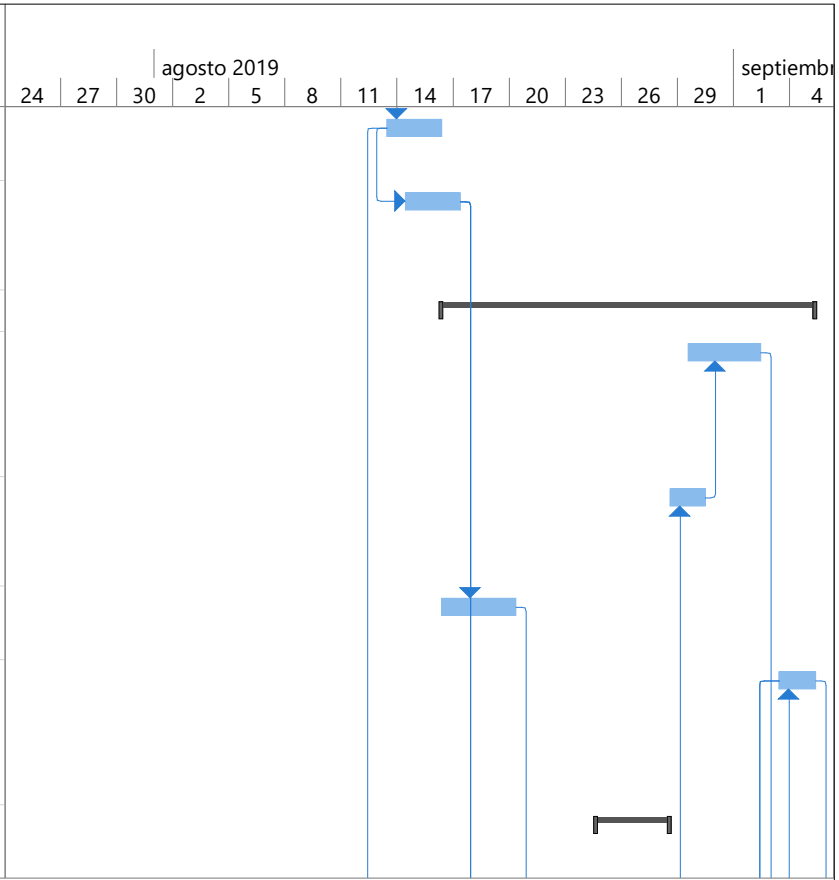

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
319		RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	3 días	sáb 24/08/19
320		RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (Suministro, Extendido y Compactación)	2 días	sáb 24/08/19
321		**COMPONENTE AMBIENTAL**	**4 días**	**mar 13/08/19**
322		ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (Incluye Suministro e Instalación)	4 días	mar 13/08/19
323		**GEOTEXTIL**	**1 día**	**lun 2/09/19**
324		GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	1 día	lun 2/09/19
325		**REDES**	**6 días**	**sáb 17/08/19**
326		TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	6 días	sáb 17/08/19

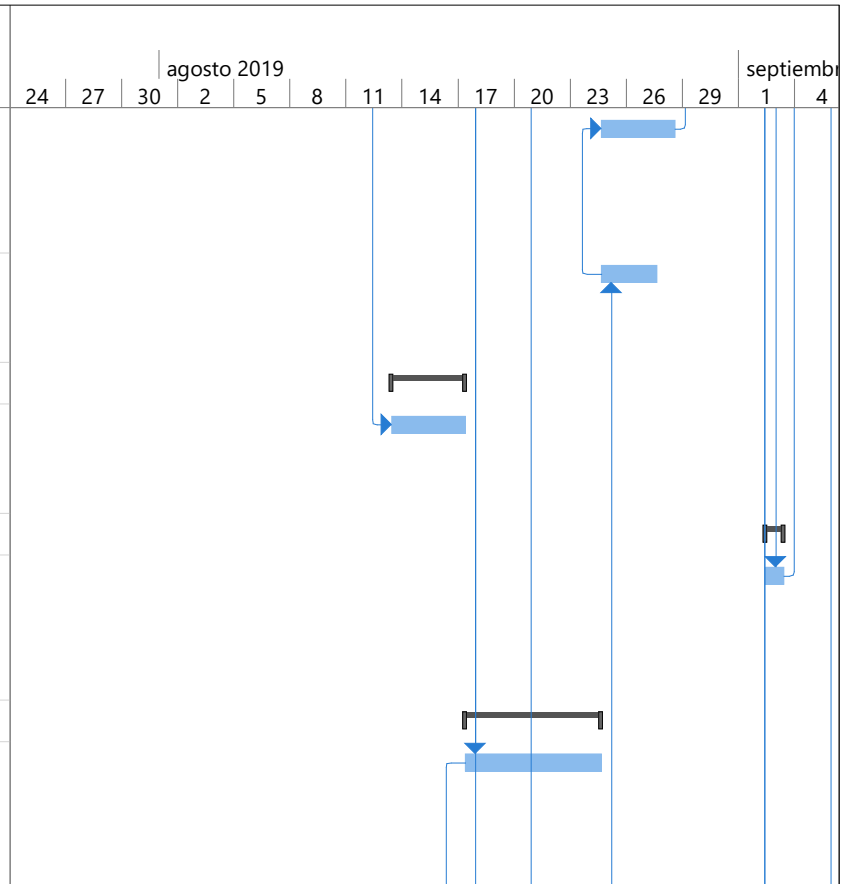

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
327		TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)	6 días	sáb 17/08/19
328		**CILINDRO POZO INSPECCIÓN**	**1 día**	**mié 21/08/19**
329		CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	1 día	mié 21/08/19
330		**PLACAS**	**3 días**	**mar 20/08/19**
331		PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	1 día	mar 20/08/19
332		PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	1 día	jue 22/08/19
333		**TRANSPORTES Y DISPOSICION DE ESCOMBROS**	**2 días**	**sáb 17/08/19**
334		TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	2 días	sáb 17/08/19
335		**NO PREVISTOS**	**2 días**	**mar 3/09/19**

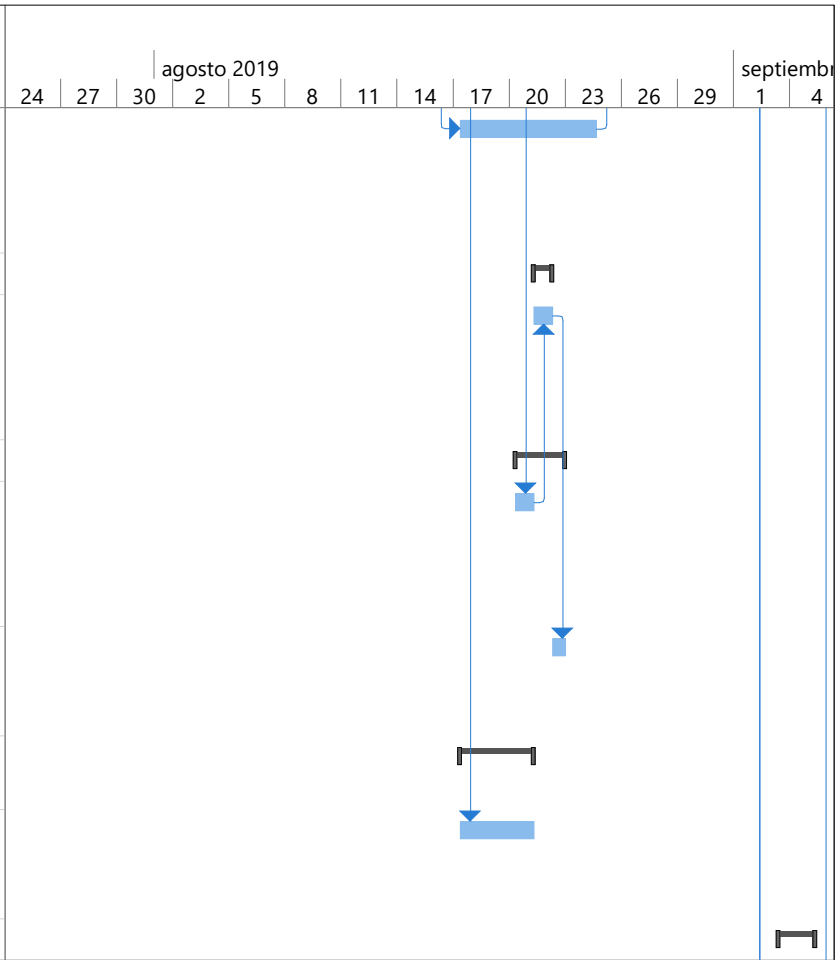

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
336		RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5% DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, INCLUYE 1,5% DE CEMENTO PORTLAND.	2 días	mar 3/09/19
337		PROCESO DE INSTALACION DE RECICLADO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)	2 días	mar 3/09/19
338		**CIV 9000302**	**23 días**	**jue 5/09/19**
339		**DESCAPOTE/EXCAVACION**	**5 días**	**jue 5/09/19**
340		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	4 días	jue 5/09/19
341		EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	4 días	vie 6/09/19
342		**CAPAS GRANULARES**	**19 días**	**mar 10/09/19**
343		SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	4 días	lun 23/09/19
344		ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJON (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	3 días	vie 20/09/19

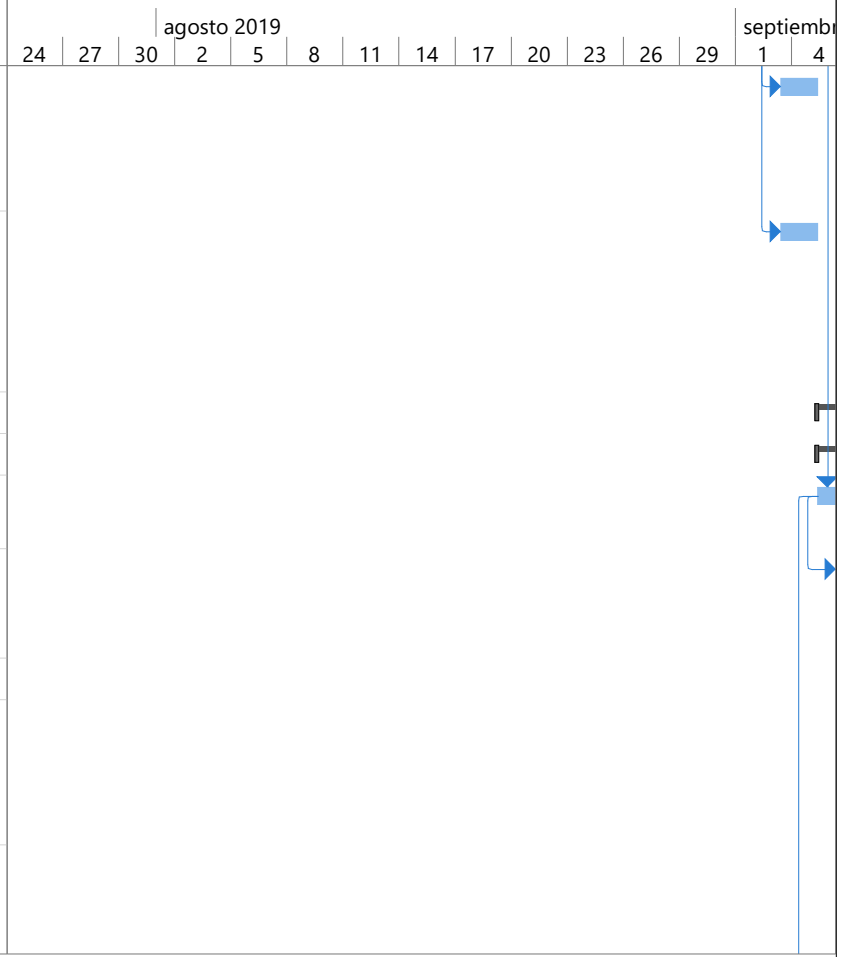

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
345		NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	2 días	mar 10/09/19
346		BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	2 días	sáb 28/09/19
347		**RELLENOS PARA REDES / RELLENOS PARA ANDENES / SUB-DRENES**	**5 días**	**mar 17/09/19**
348		RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	3 días	mar 17/09/19
349		RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (Suministro, Extendido y Compactación)	2 días	vie 20/09/19
350		**COMPONENTE AMBIENTAL**	**4 días**	**jue 5/09/19**
351		ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (Incluye Suministro e Instalación)	4 días	jue 5/09/19
352		**GEOTEXTIL**	**1 día**	**vie 27/09/19**
353		GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	1 día	vie 27/09/19

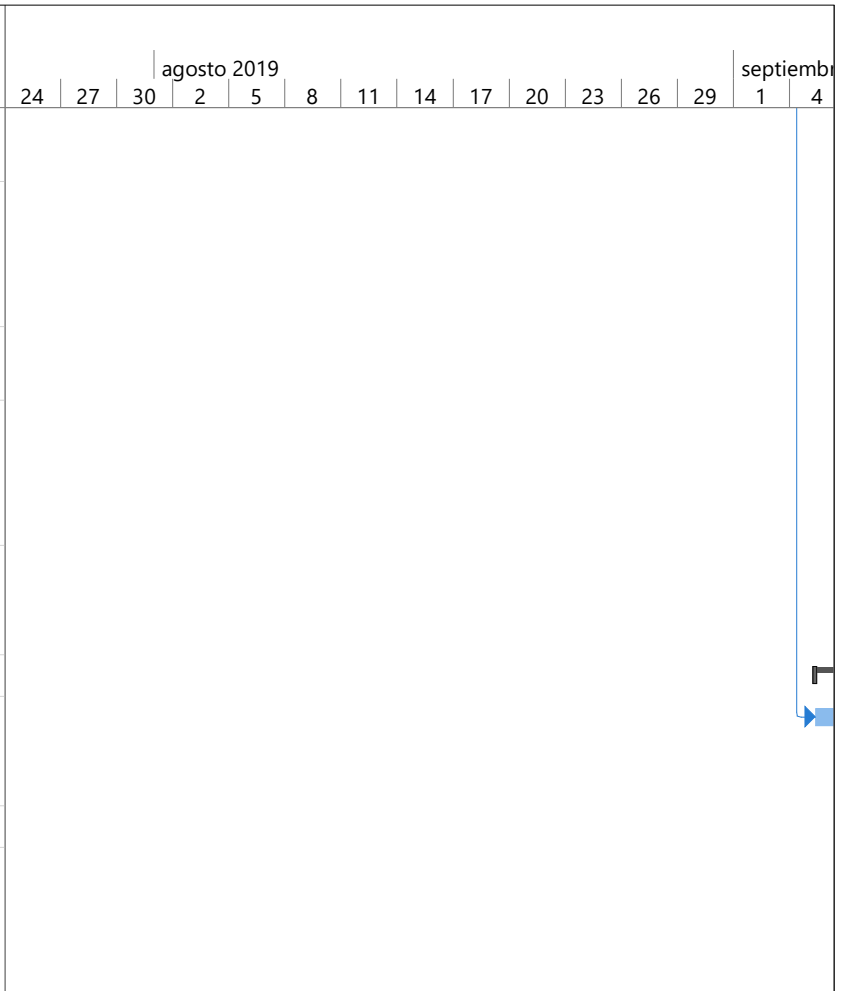

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19


Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
354		**REDES**	**12 días**	**mié 11/09/19**
355		TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	6 días	mié 11/09/19
356		TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORM2 NTC 3722-1 D=16" (Incluye Suministro e Instalación)	6 días	mar 17/09/19
357		**CILINDRO POZO INSPECCIÓN**	**1 día**	**mié 11/09/19**
358		CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	1 día	mié 11/09/19
359		**PLACAS**	**3 días**	**mié 11/09/19**
360		PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	1 día	mié 11/09/19
361		PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	1 día	jue 12/09/19
362		**TRANSPORTES Y DISPOSICION DE ESCOMBROS**	**2 días**	**mié 11/09/19**



Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
363			TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	2 días	mié 11/09/19
364			**NO PREVISTOS**	**2 días**	**sáb 28/09/19**
365			RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5% DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, INCLUYE 1,5% DE CEMENTO PORTLAND.	2 días	sáb 28/09/19
366			PROCESO DE INSTALACION DE RECICLADO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)	2 días	sáb 28/09/19
367			**CIV 9000319**	**23 días**	**lun 30/09/19**
368			**DESCAPOTE/EXCAVACION**	**5 días**	**lun 30/09/19**
369			EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	4 días	lun 30/09/19
370			EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	4 días	mar 1/10/19
371			**CAPAS GRANULARES**	**19 días**	**vie 4/10/19**




Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
372			SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	4 días	sáb 19/10/19
373			ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJON (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	3 días	jue 17/10/19
374			NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	2 días	vie 4/10/19
375			BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	2 días	jue 24/10/19
376			**RELLENOS PARA REDES / RELLENOS PARA ANDENES / SUB-DRENES**	**3 días**	**sáb 12/10/19**
377			RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	3 días	sáb 12/10/19
378			RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (Suministro, Extendido y Compactación)	2 días	sáb 12/10/19
379			**COMPONENTE AMBIENTAL**	**4 días**	**lun 30/09/19**



Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
380		ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (Incluye Suministro e Instalación)	4 días	lun 30/09/19
381		**GEOTEXTIL**	**1 día**	**mié 23/10/19**
382		GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	1 día	mié 23/10/19
383		**REDES**	**6 días**	**sáb 5/10/19**
384		TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	6 días	sáb 5/10/19
385		TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (Incluye Suministro e Instalación)	6 días	sáb 5/10/19
386		**CILINDRO POZO INSPECCIÓN**	**1 día**	**mar 8/10/19**
387		CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	1 día	mar 8/10/19
388		**PLACAS**	**3 días**	**lun 7/10/19**




Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
389			PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	1 día	lun 7/10/19
390			PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	1 día	mié 9/10/19
391			**TRANSPORTES Y DISPOSICION DE ESCOMBROS**	**2 días**	**sáb 5/10/19**
392			TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	2 días	sáb 5/10/19
393			**NO PREVISTOS**	**2 días**	**jue 24/10/19**
394			RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5% DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, INCLUYE 1,5% DE CEMENTO PORTLAND.	2 días	jue 24/10/19
395			PROCESO DE INSTALACION DE RECICLADO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)	2 días	jue 24/10/19
396			**CIV 9000334**	**25 días**	**jue 24/10/19**
397			**DESCAPOTE/EXCAVACION**	**5 días**	**jue 24/10/19**

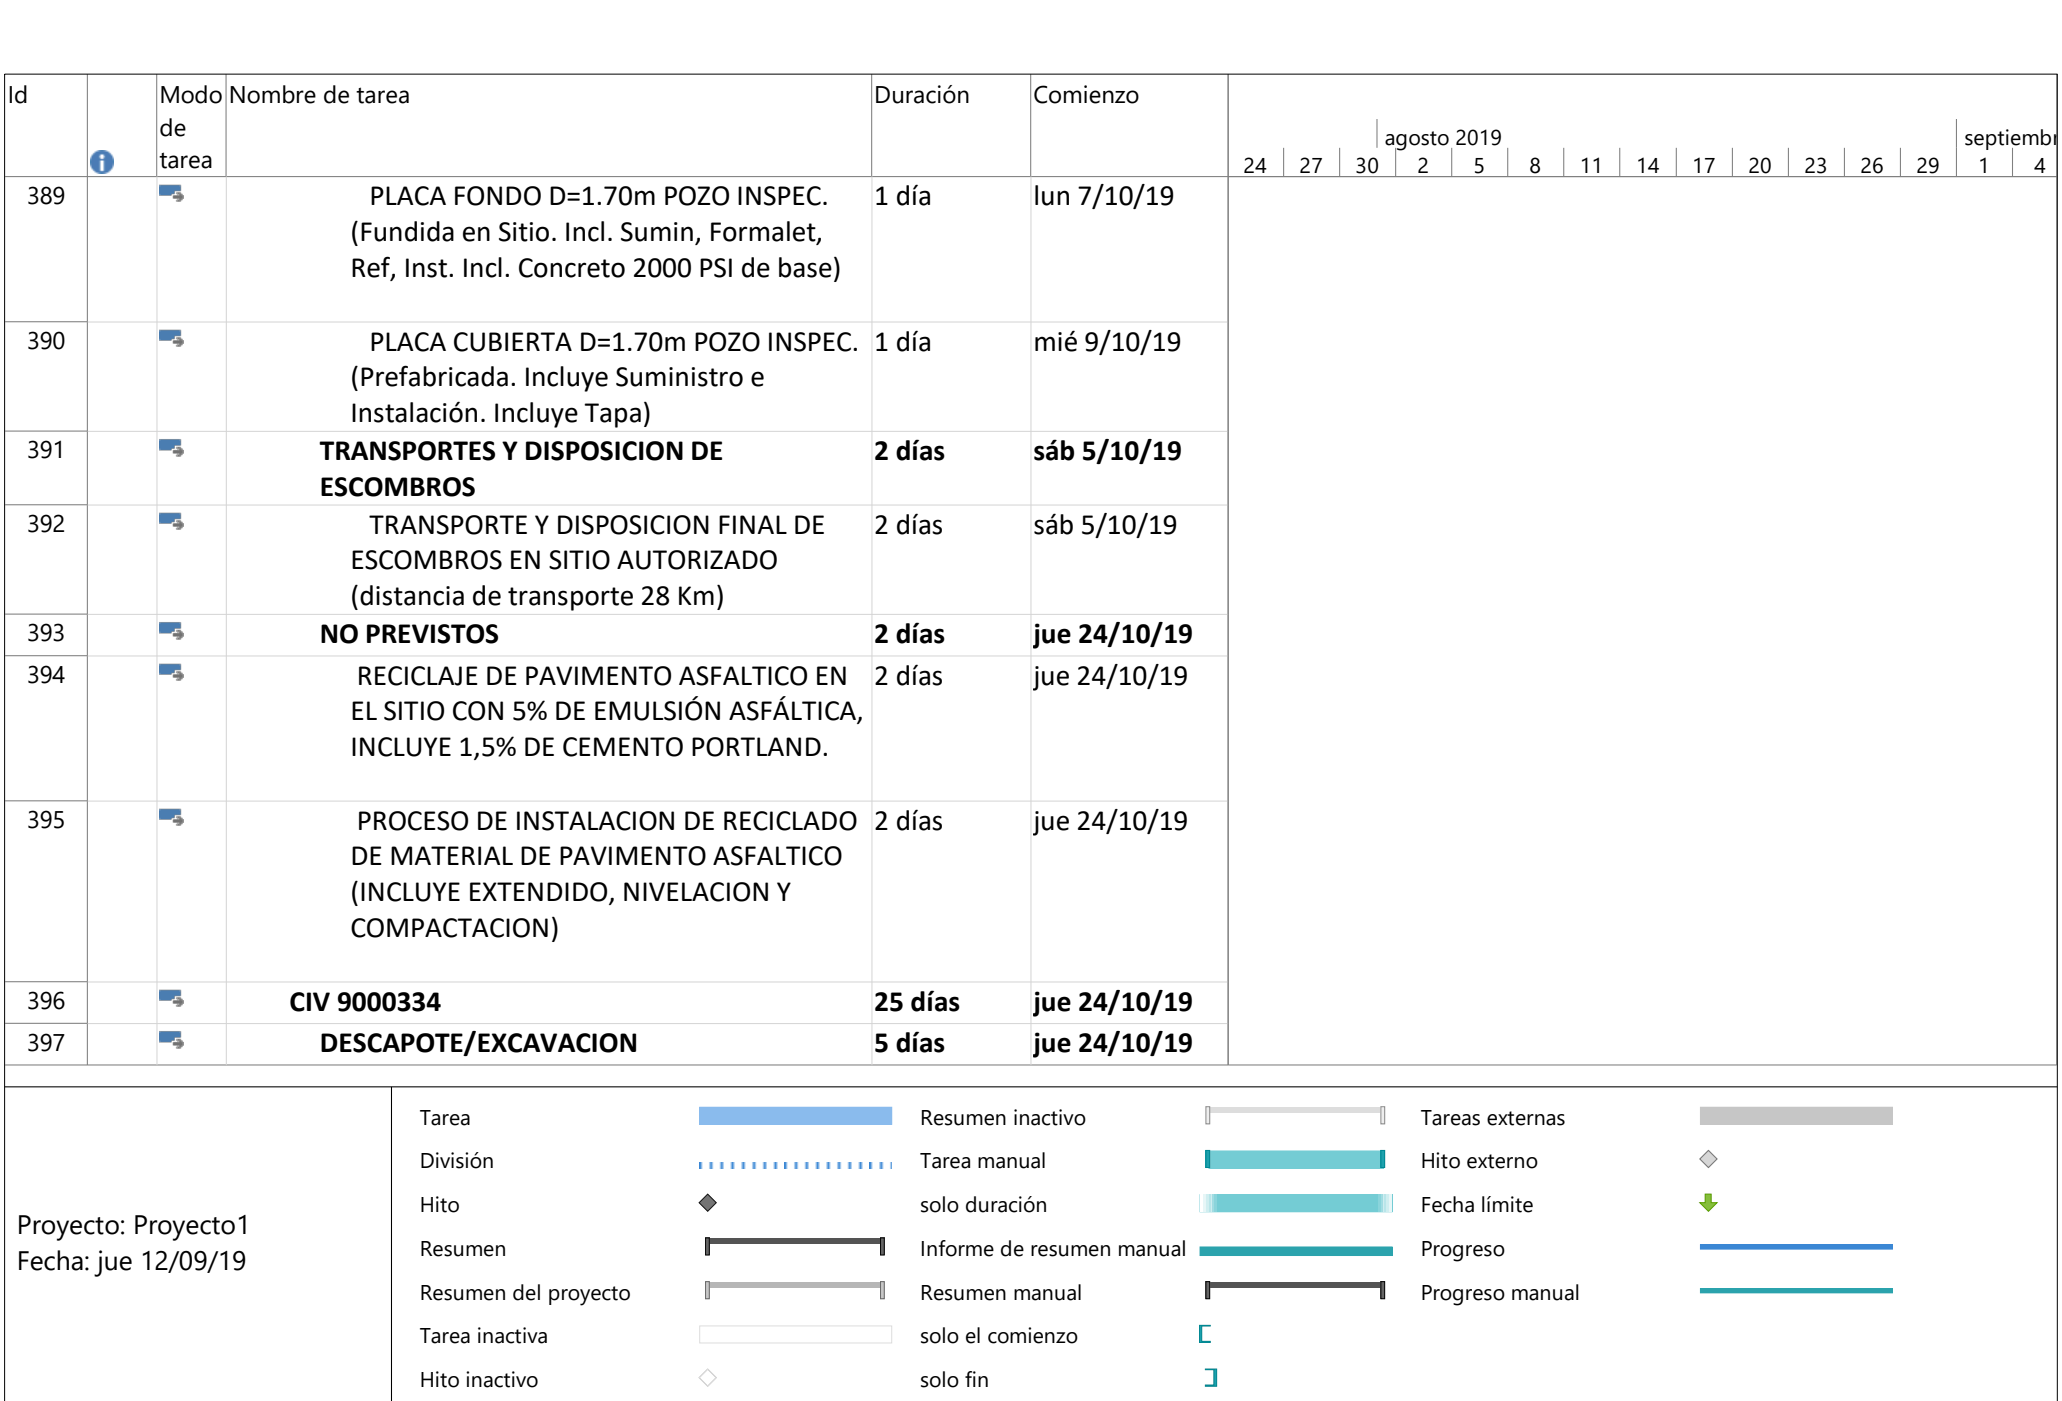


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
398		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	4 días	jue 24/10/19
399		EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	4 días	vie 25/10/19
400		**CAPAS GRANULARES**	**21 días**	**mar 29/10/19**
401		SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	4 días	vie 15/11/19
402		ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJON (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	3 días	mié 13/11/19
403		NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	2 días	mar 29/10/19
404		BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	2 días	jue 21/11/19
405		**RELLENOS PARA REDES / RELLENOS PARA ANDENES / SUB-DRENES**	**5 días**	**jue 7/11/19**



Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19




Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
406			RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	3 días	vie 8/11/19
407			RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (Suministro, Extendido y Compactación)	2 días	jue 7/11/19
408			**COMPONENTE AMBIENTAL**	**4 días**	**jue 24/10/19**
409			ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (Incluye Suministro e Instalación)	4 días	jue 24/10/19
410			**GEOTEXTIL**	**1 día**	**mié 20/11/19**
411			GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye Suministro e Instalación)	1 día	mié 20/11/19
412			**REDES**	**6 días**	**mié 30/10/19**
413			TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	6 días	mié 30/10/19



Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
414			TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)	6 días	mié 30/10/19
415			**CILINDRO POZO INSPECCIÓN**	**1 día**	**vie 1/11/19**
416			CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	1 día	vie 1/11/19
417			**PLACAS**	**3 días**	**jue 31/10/19**
418			PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	1 día	jue 31/10/19
419			PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	1 día	sáb 2/11/19
420			**TRANSPORTES Y DISPOSICION DE ESCOMBROS**	**2 días**	**mié 30/10/19**
421			TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	2 días	mié 30/10/19
422			**NO PREVISTOS**	**2 días**	**jue 21/11/19**




Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
423			RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5% DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, INCLUYE 1,5% DE CEMENTO PORTLAND.	2 días	jue 21/11/19
424			PROCESO DE INSTALACION DE RECICLADO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION)	2 días	jue 21/11/19
425			**DEMOLICIONES**	**5 días**	**sáb 30/11/19**
426			DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	2 días	sáb 30/11/19
427			DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue)	2 días	sáb 30/11/19
428			**DESCAPOTE/EXCAVACION**	**3 días**	**sáb 30/11/19**
429			EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	3 días	sáb 30/11/19
430			**CAPAS GRANULARES**	**2 días**	**mié 4/12/19**
431			NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	2 días	mié 4/12/19
432			**RELLENOS PARA REDES / RELLENOS PARA ANDENES / SUB-DRENES**	**2 días**	**vie 6/12/19**



Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
433		SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	2 días	vie 6/12/19
434		**ESPACIO PUBLICO/SARDINELES/BORDILLO/**	**4 días**	**lun 9/12/19**
435		SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	4 días	lun 9/12/19
436		SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)	2 días	lun 9/12/19
437		**BORDILLO PREFABRICADO / ANDENES**	**5 días**	**vie 13/12/19**
438		ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) HECHO EN OBRA e=0.10m (Incluye Mezcla, Formaleteo, Fundida y Curado)	5 días	vie 13/12/19
439		**PAVIMENTOS ASFALTICO**	**2 días**	**sáb 23/11/19**
440		IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	2 días	sáb 23/11/19
441		RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	2 días	sáb 23/11/19
442		**TRANSPORTES Y DISPOSICION DE ESCOMBROS**	2 días	**mié 4/12/19**




Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
443			TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	2 días	mié 4/12/19
444			**NO PREVISTOS**	**5 días**	**mar 26/11/19**
445			REHABILITACION PAVIMENTO FLEXIBLE e=0,12	5 días	mar 26/11/19

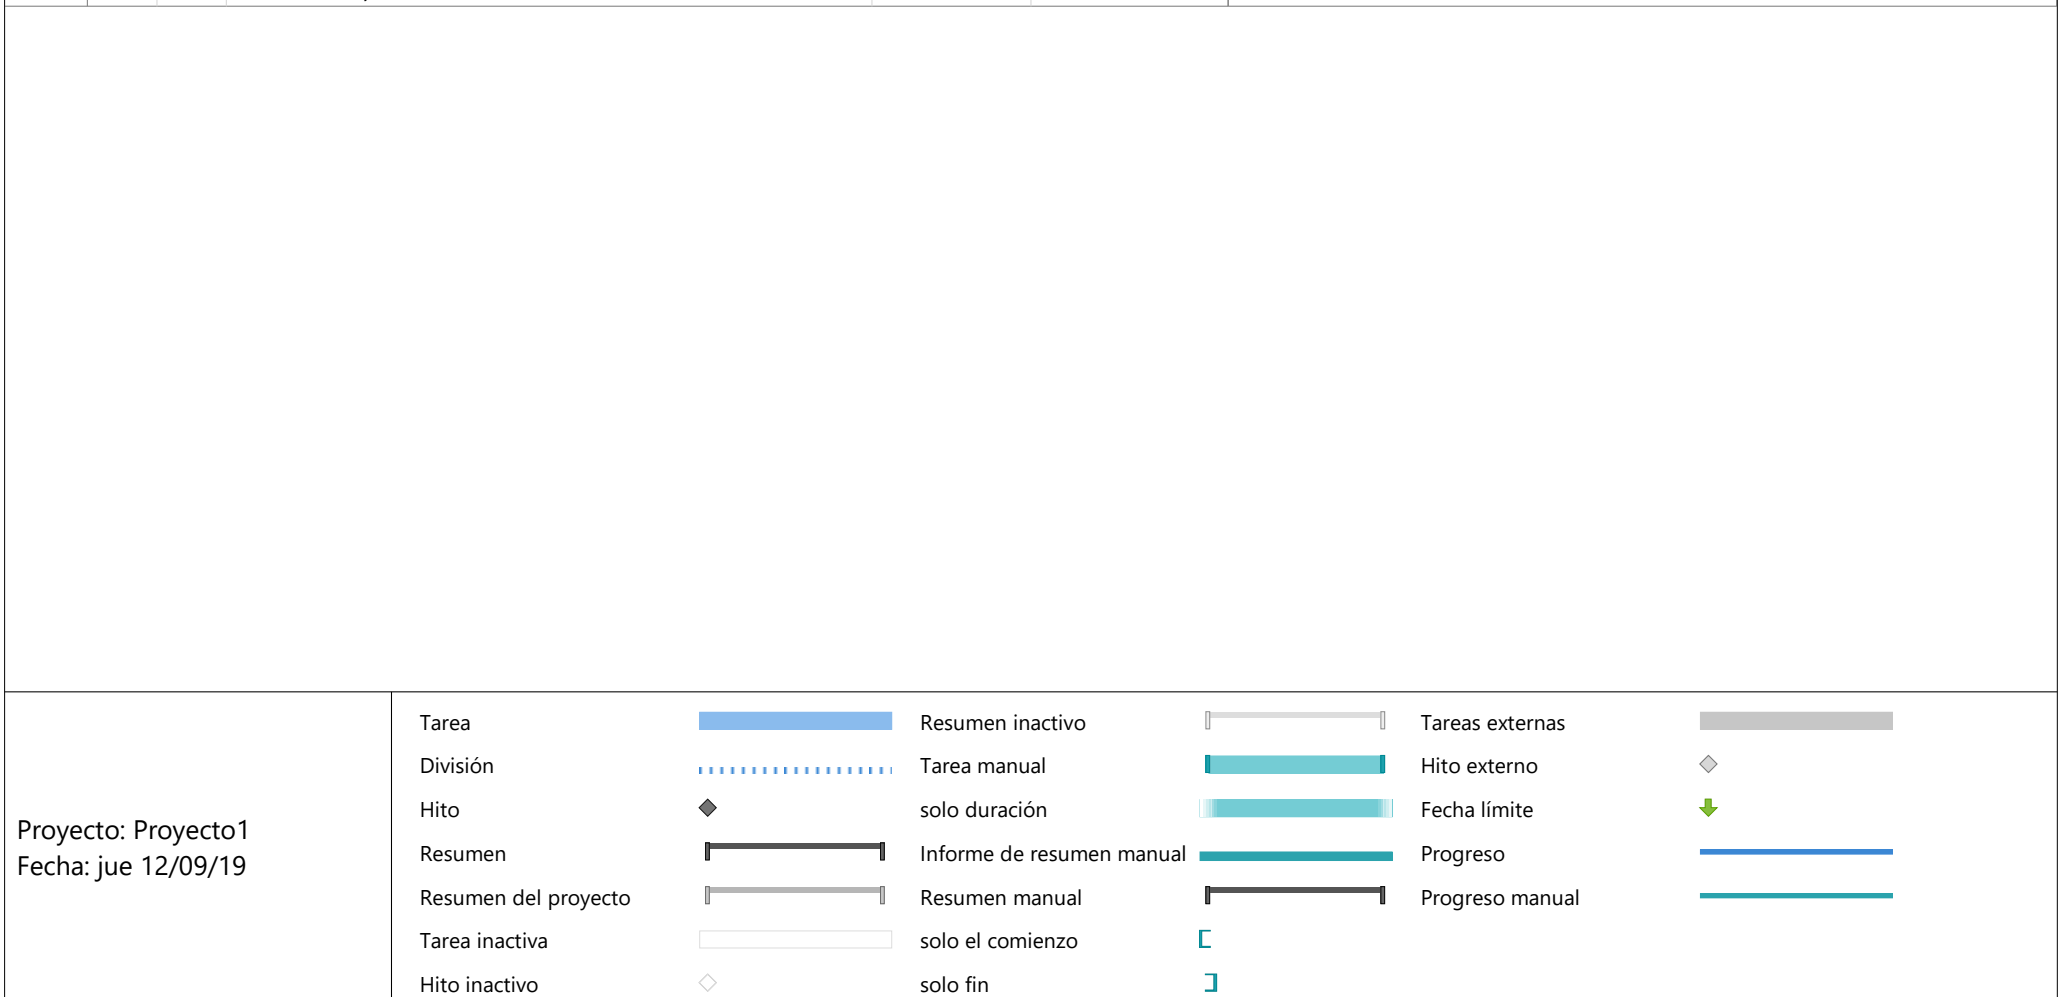


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

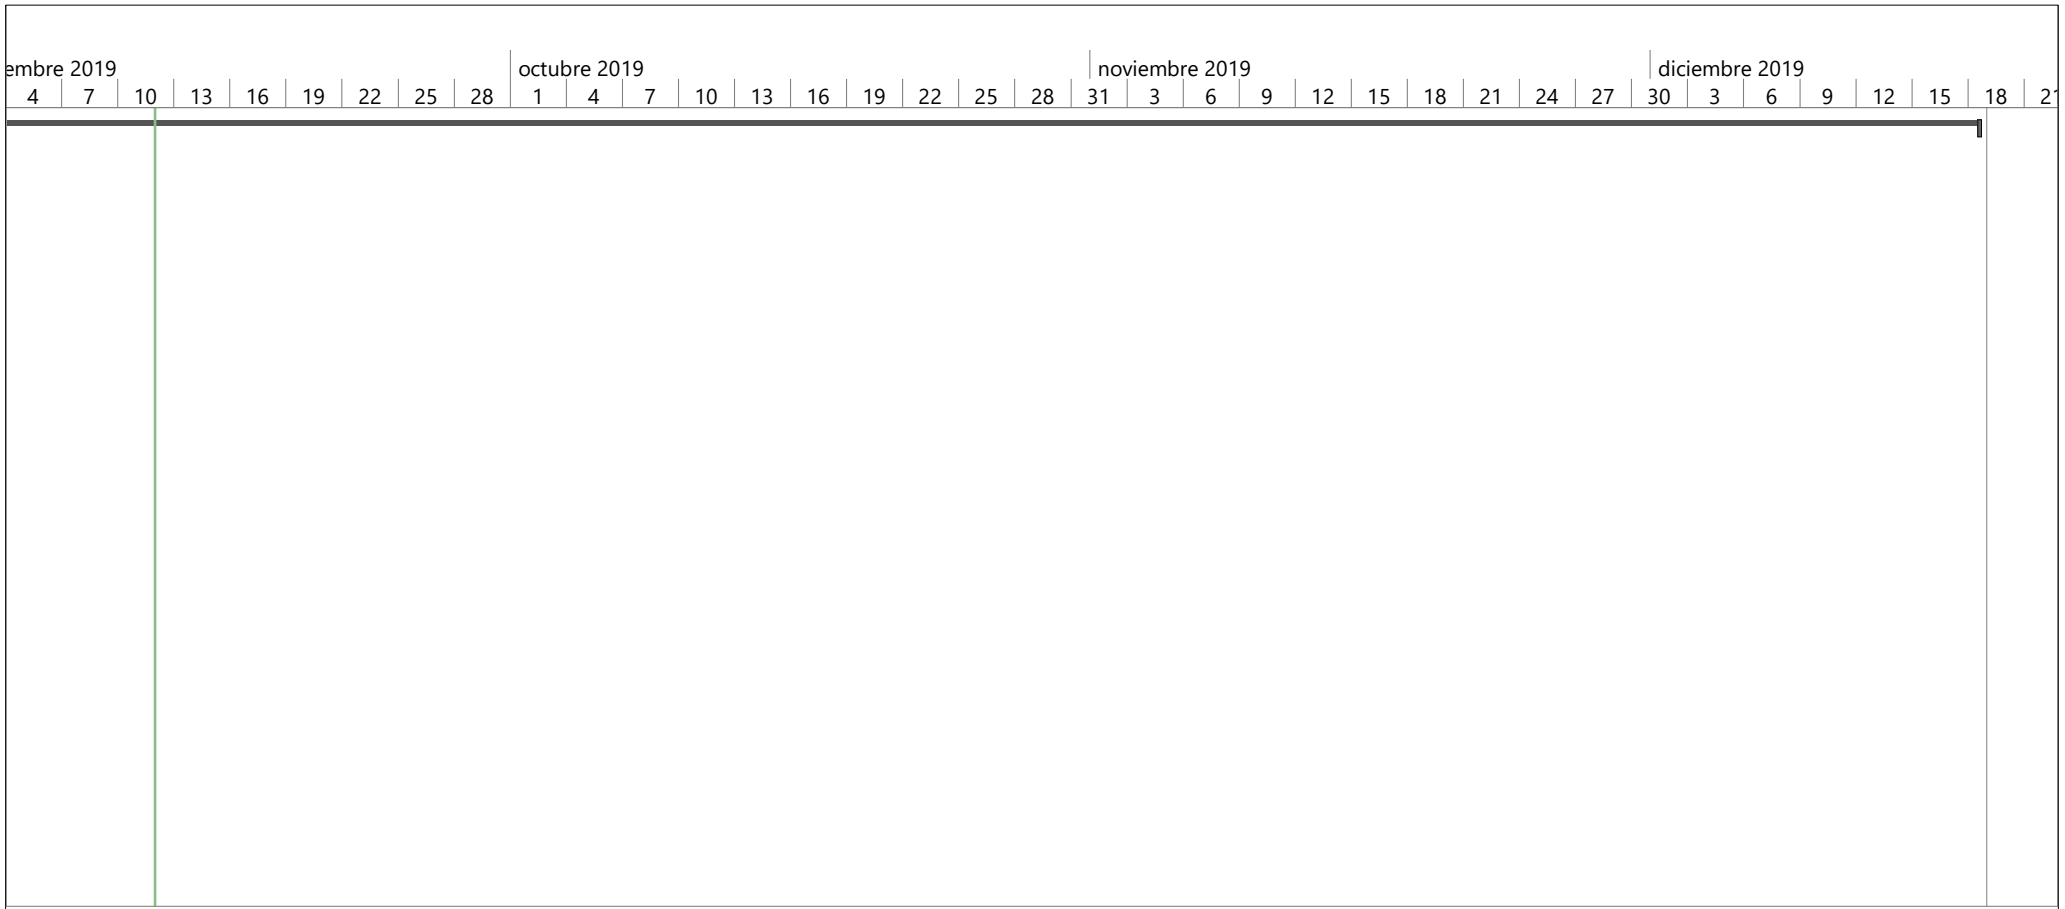


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

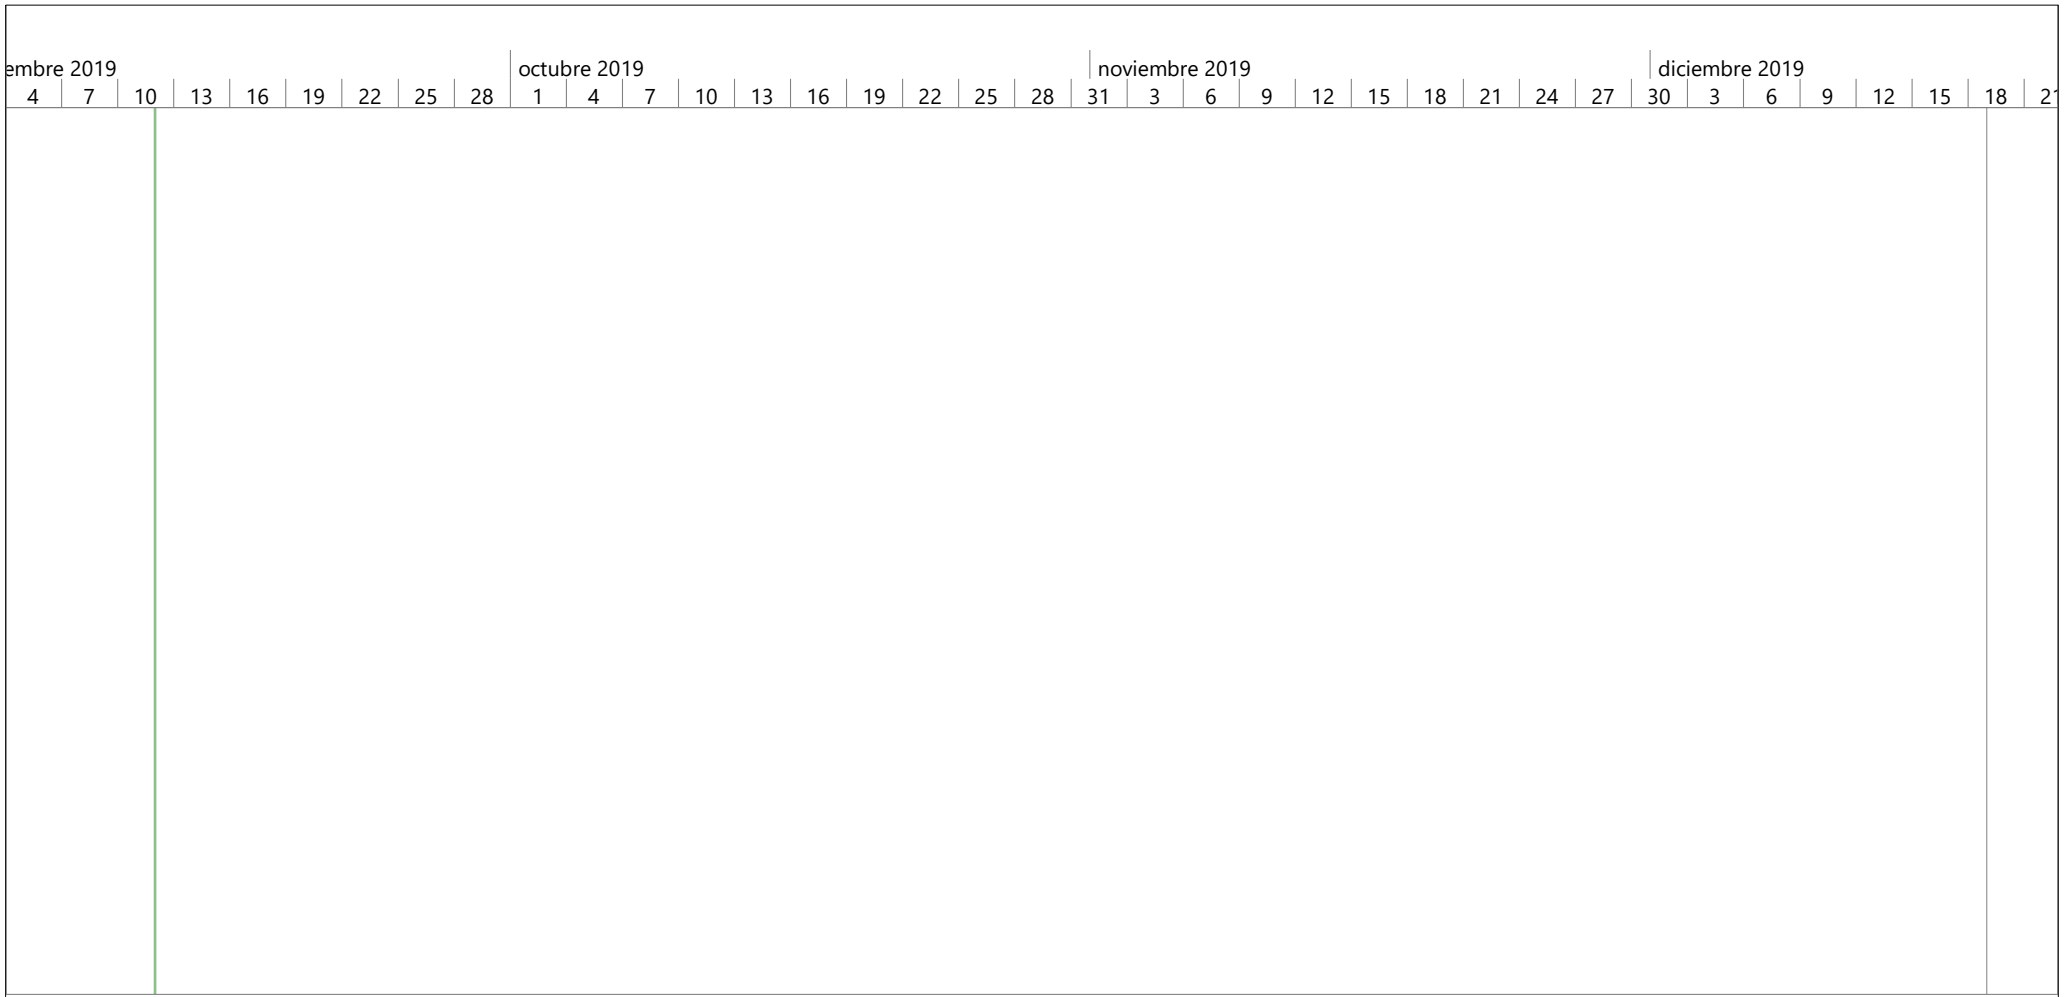


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

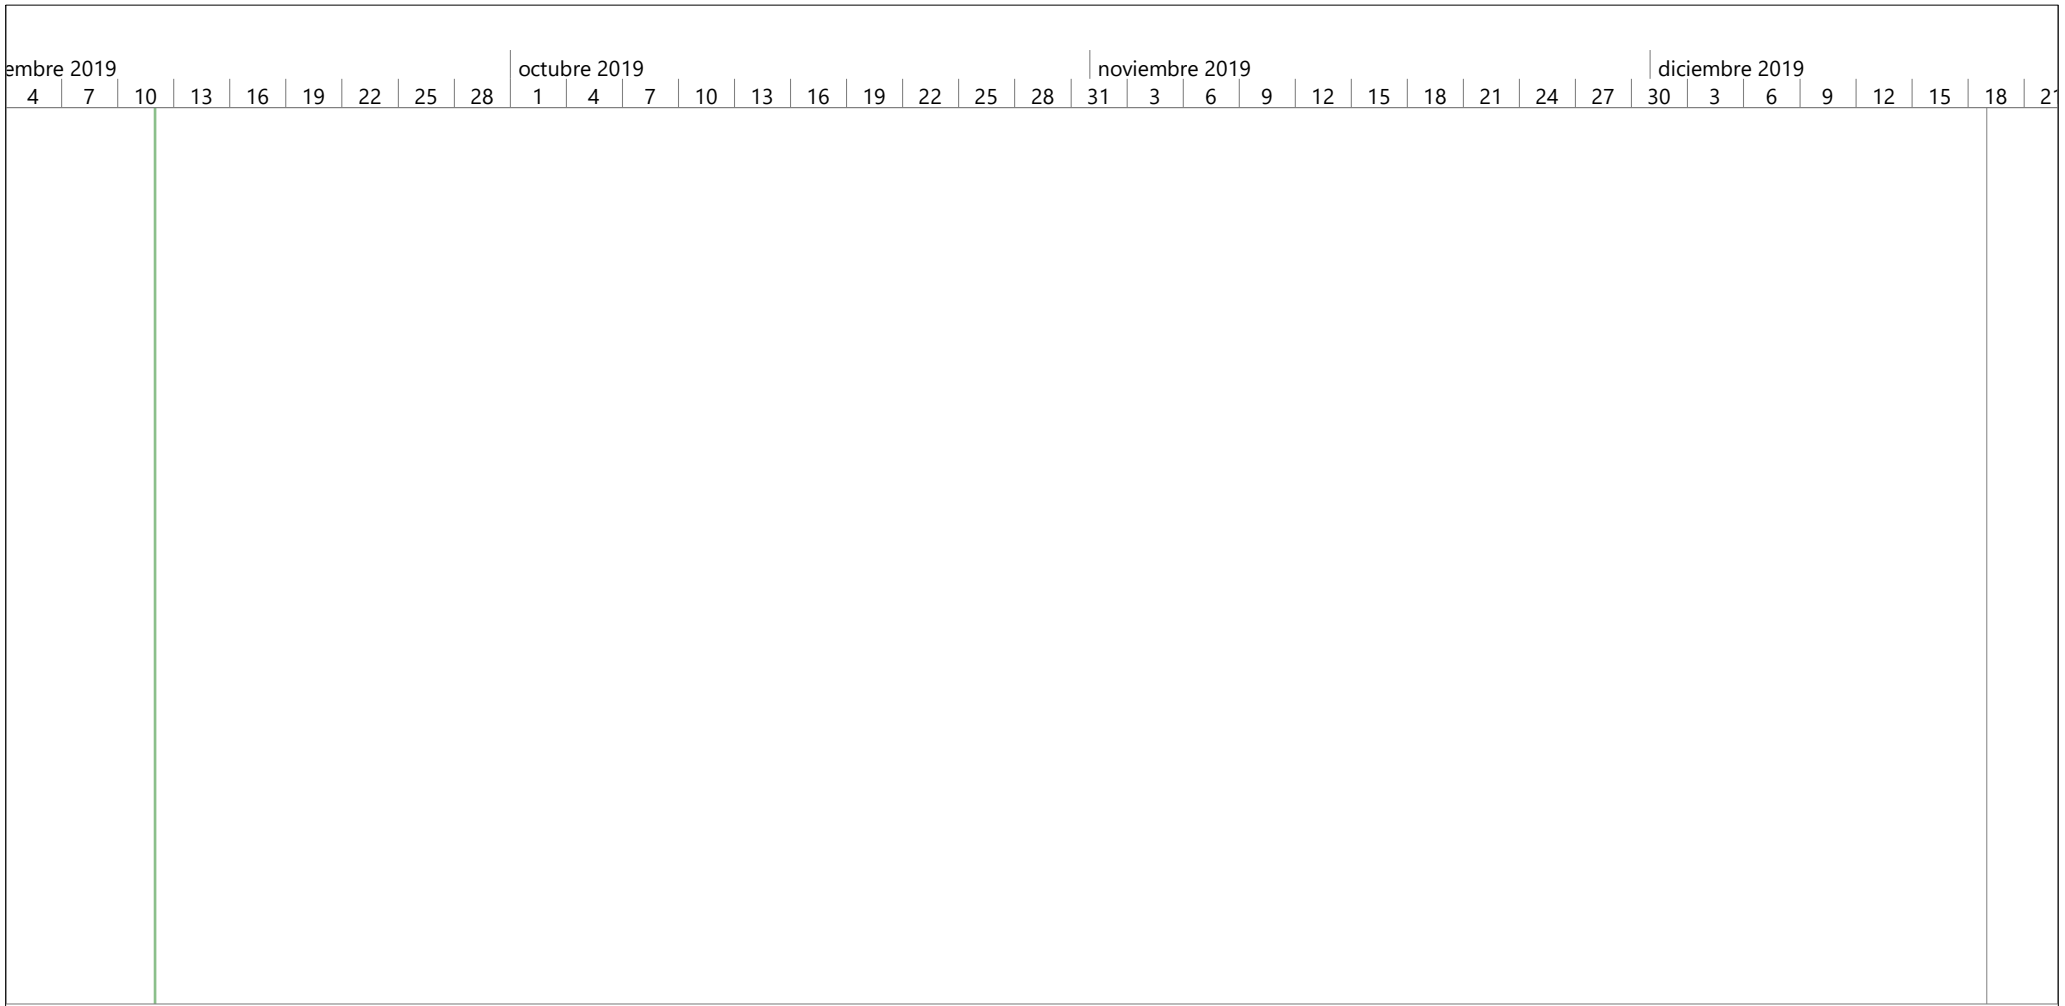


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

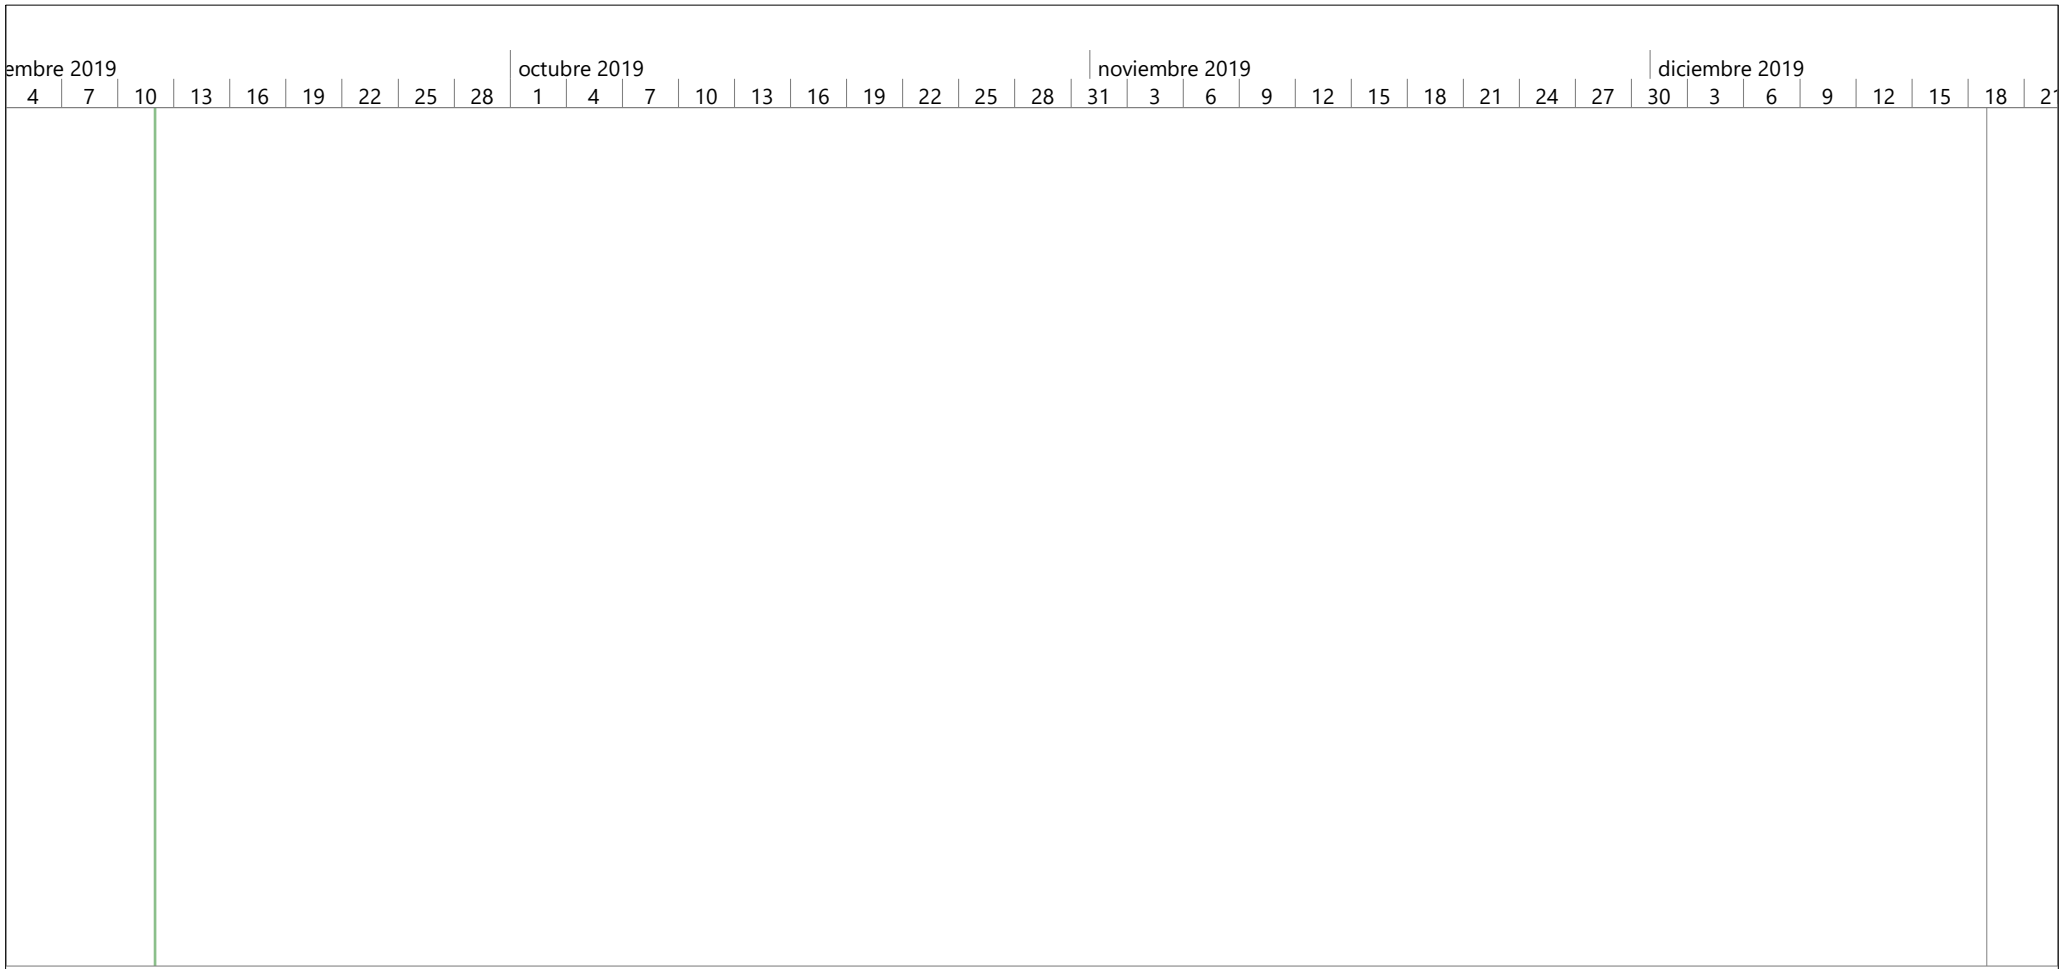


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

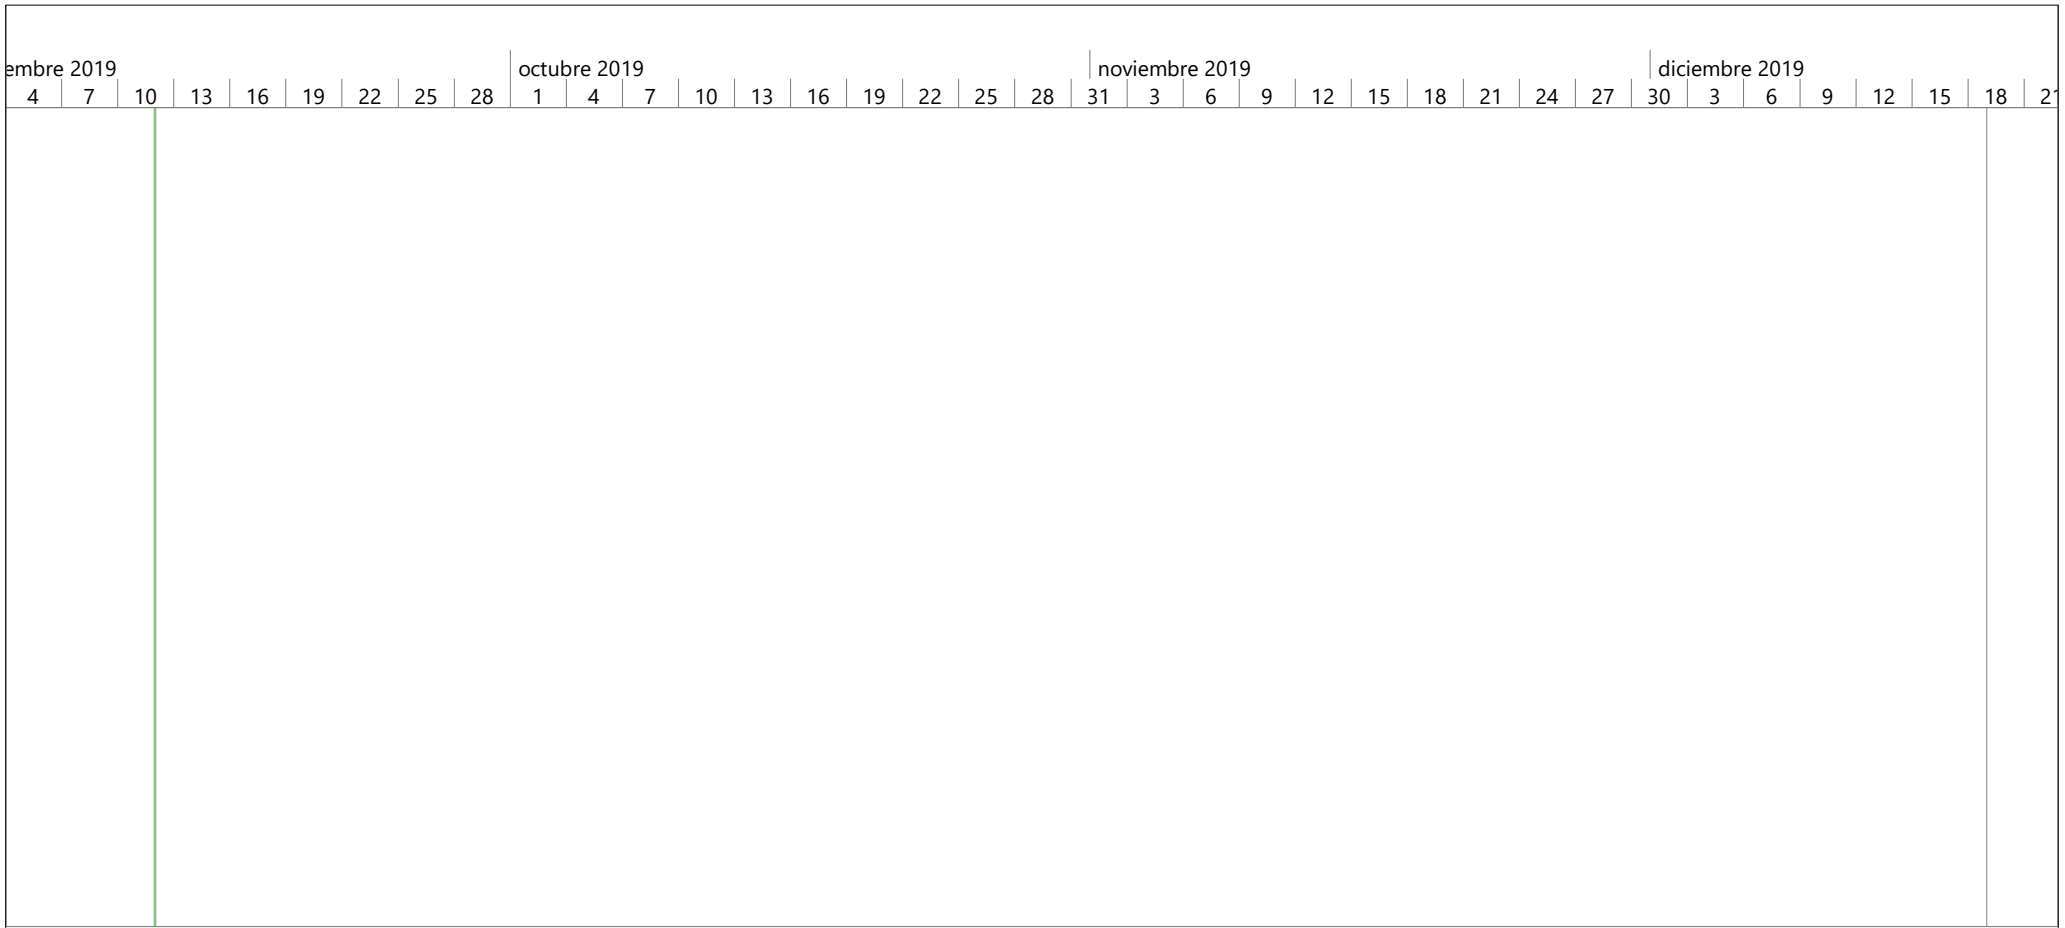


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

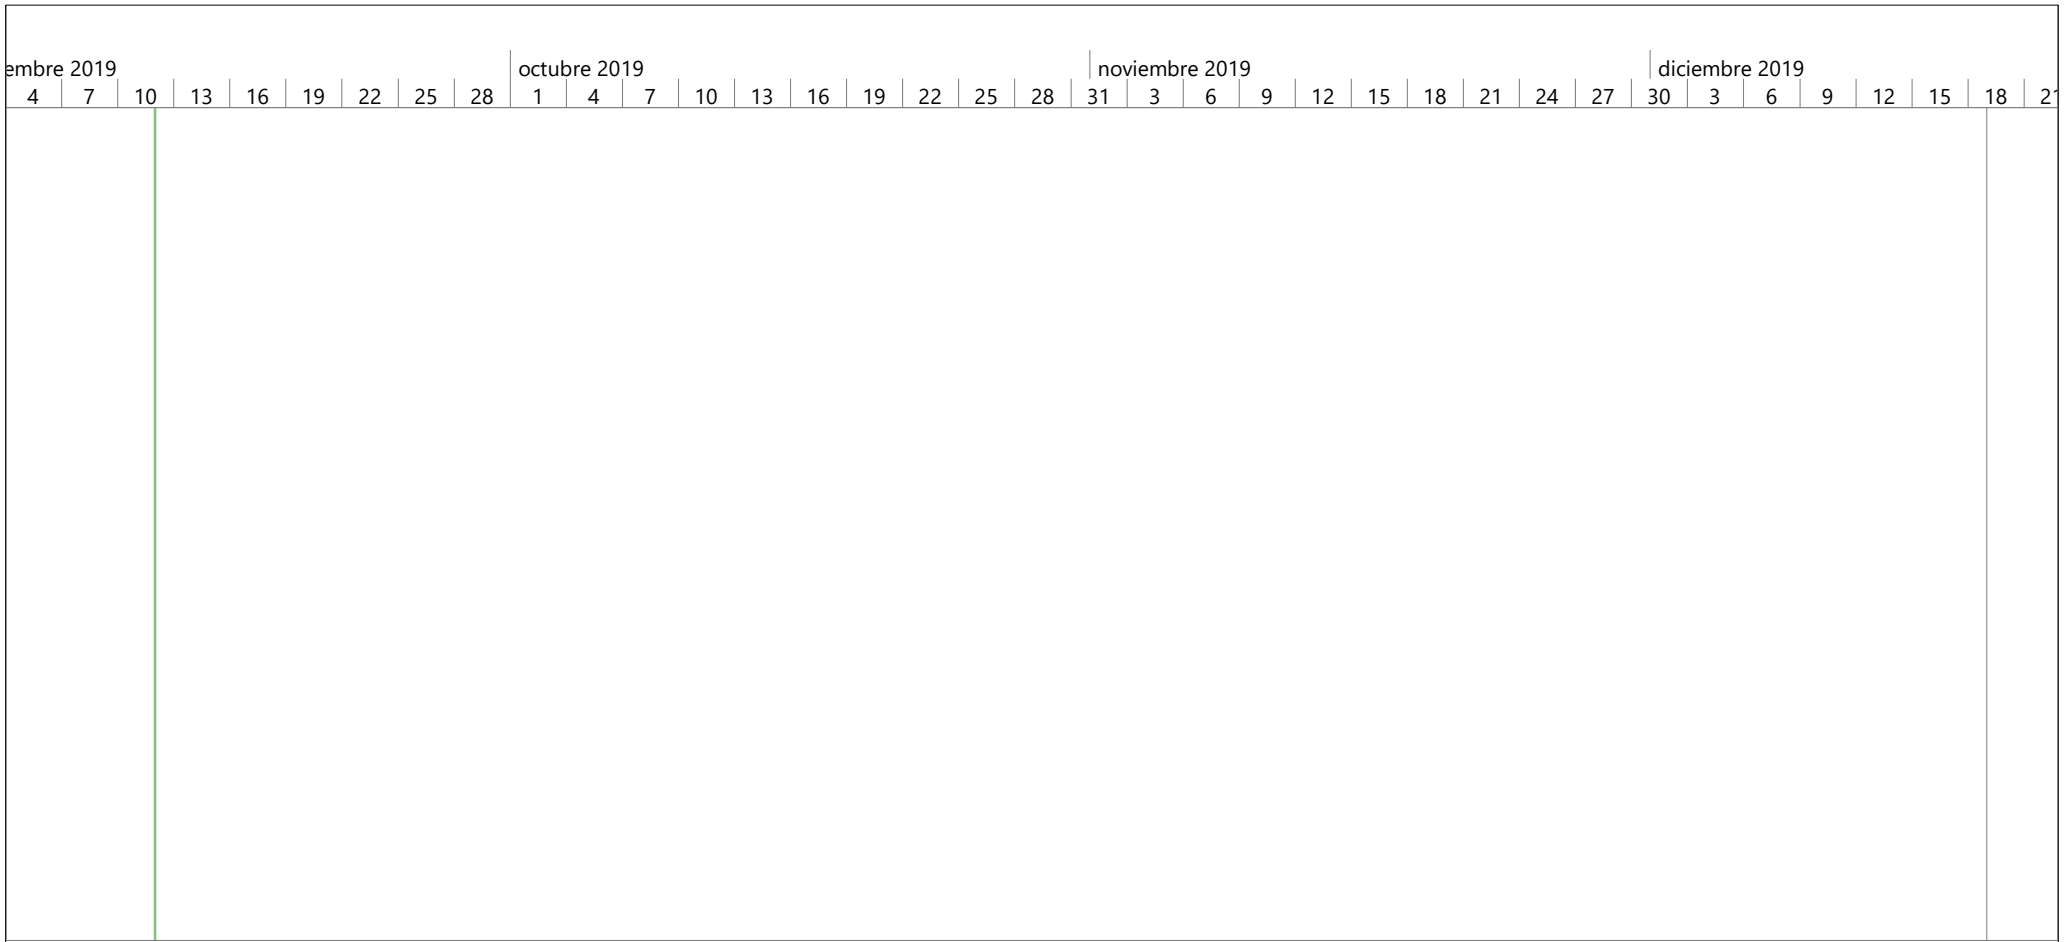


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

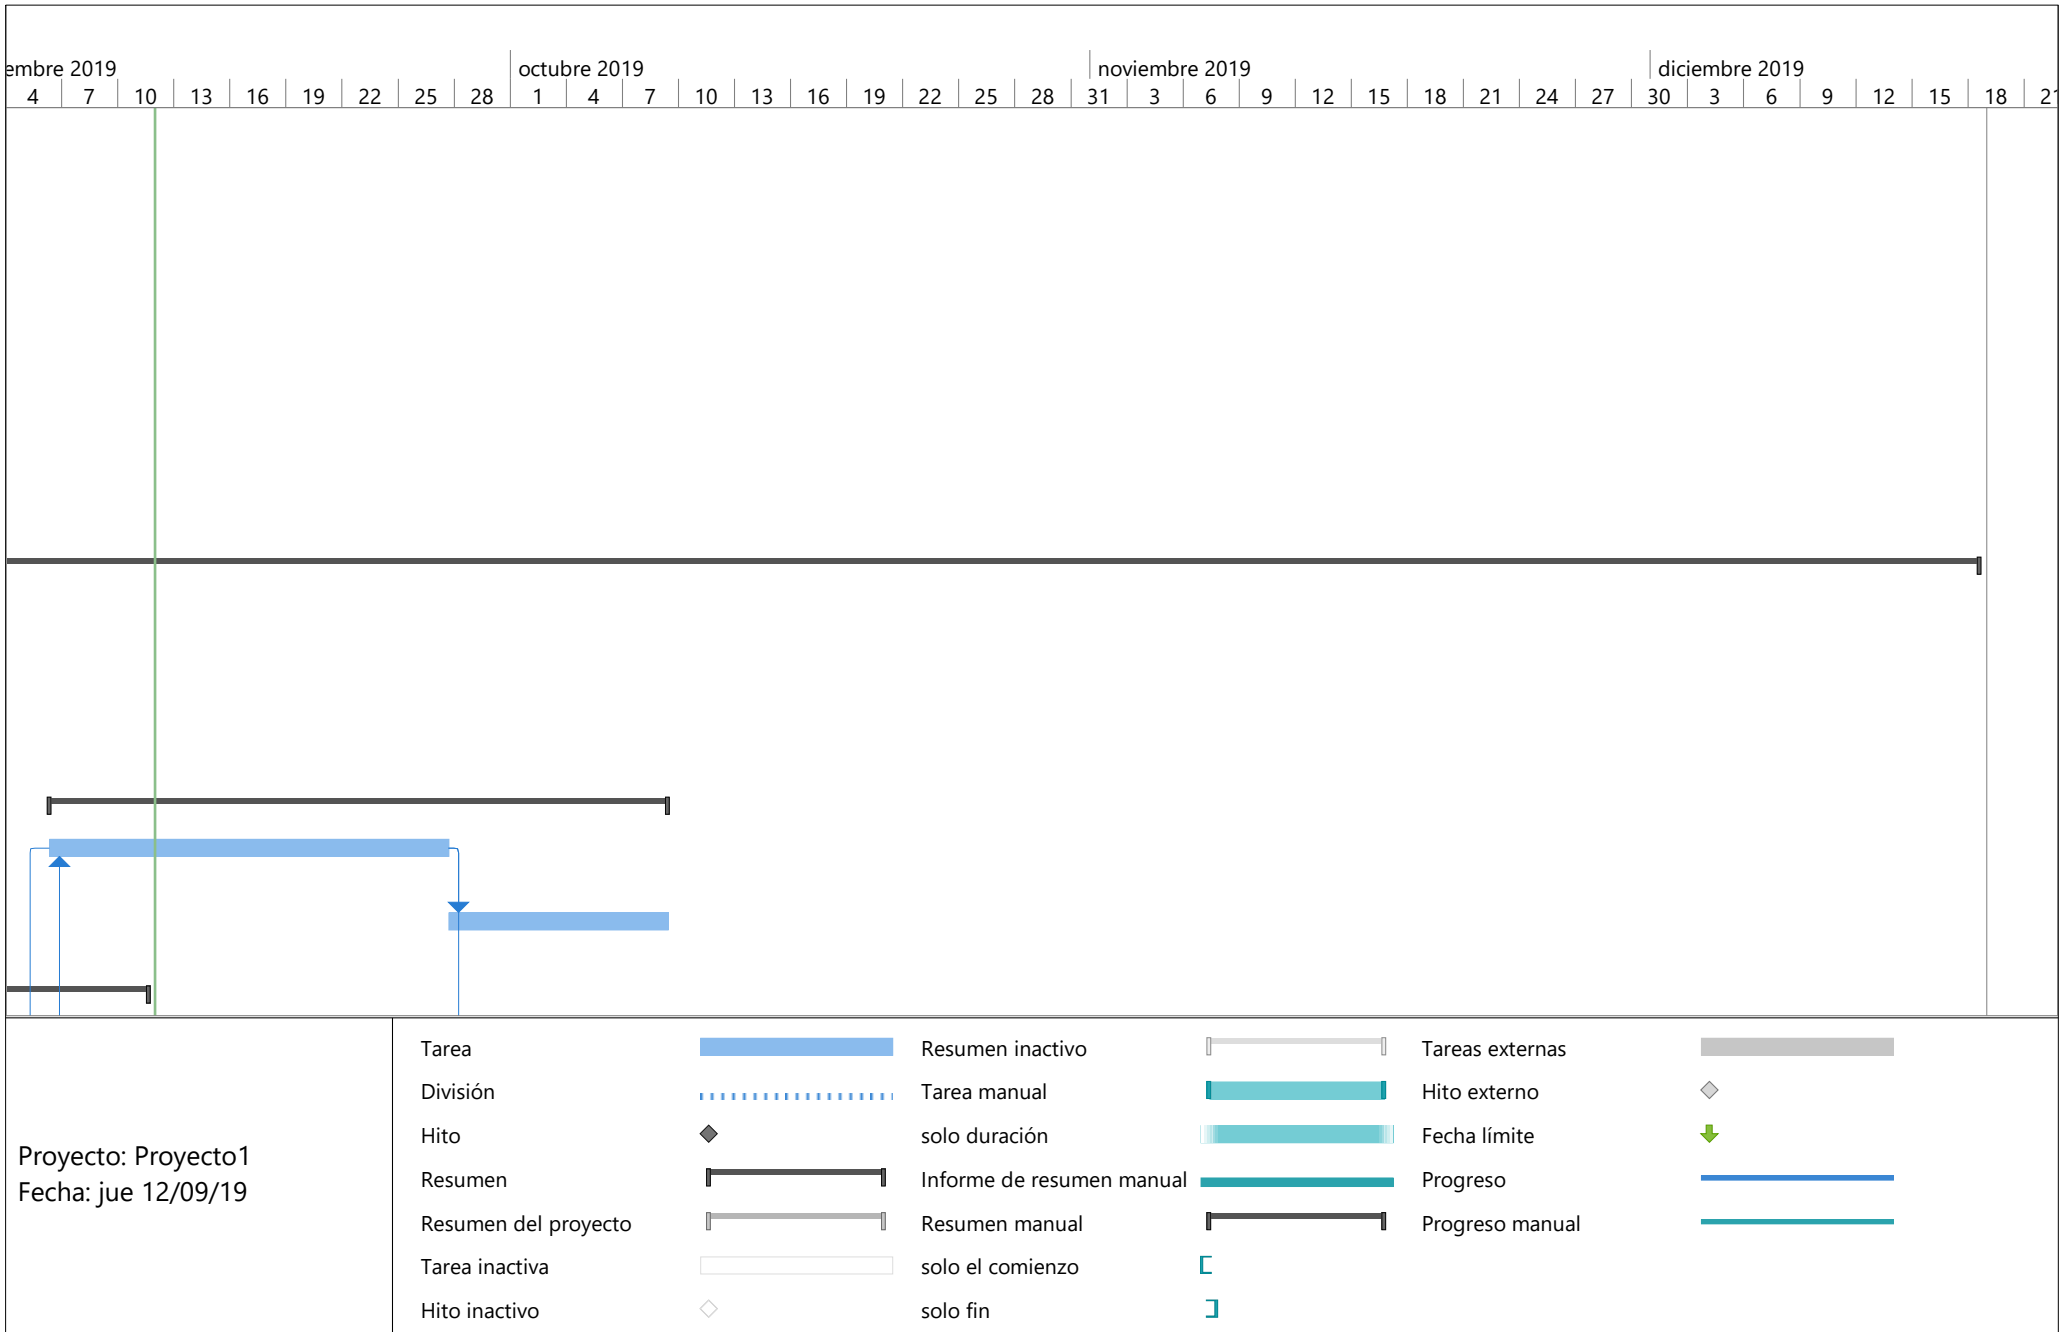


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

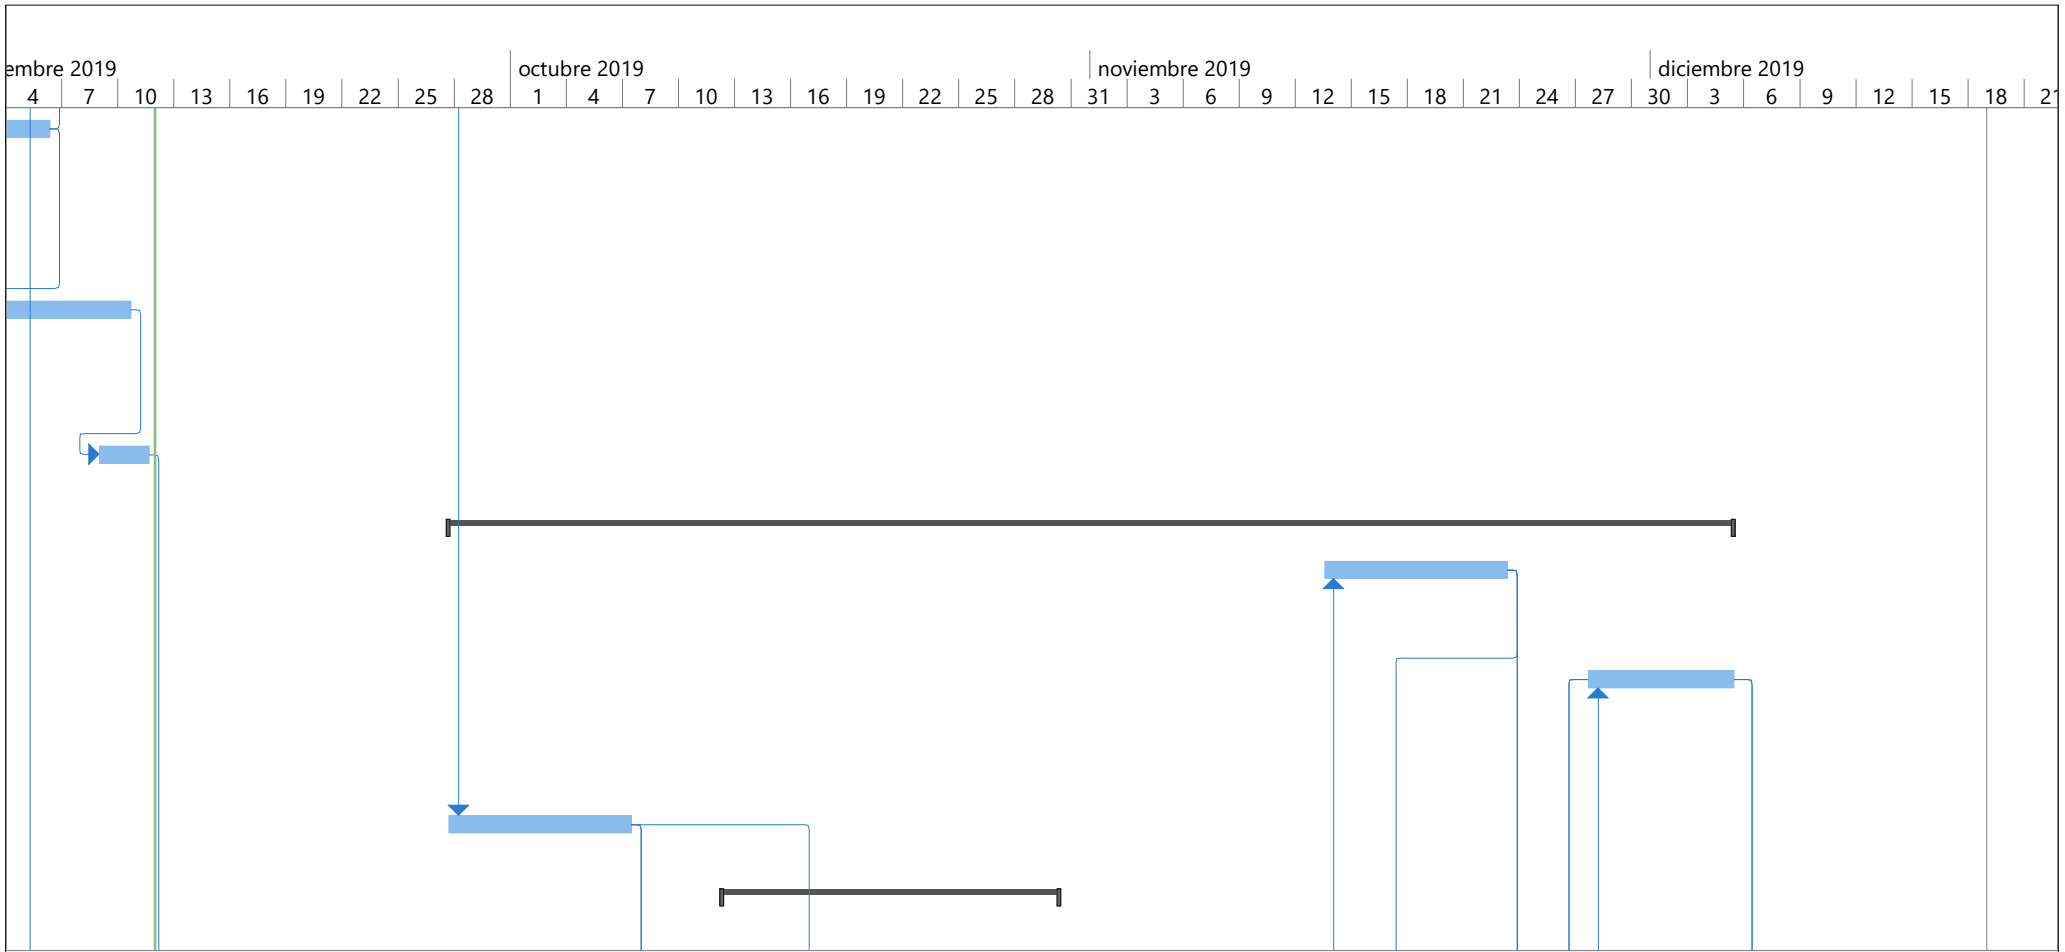


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

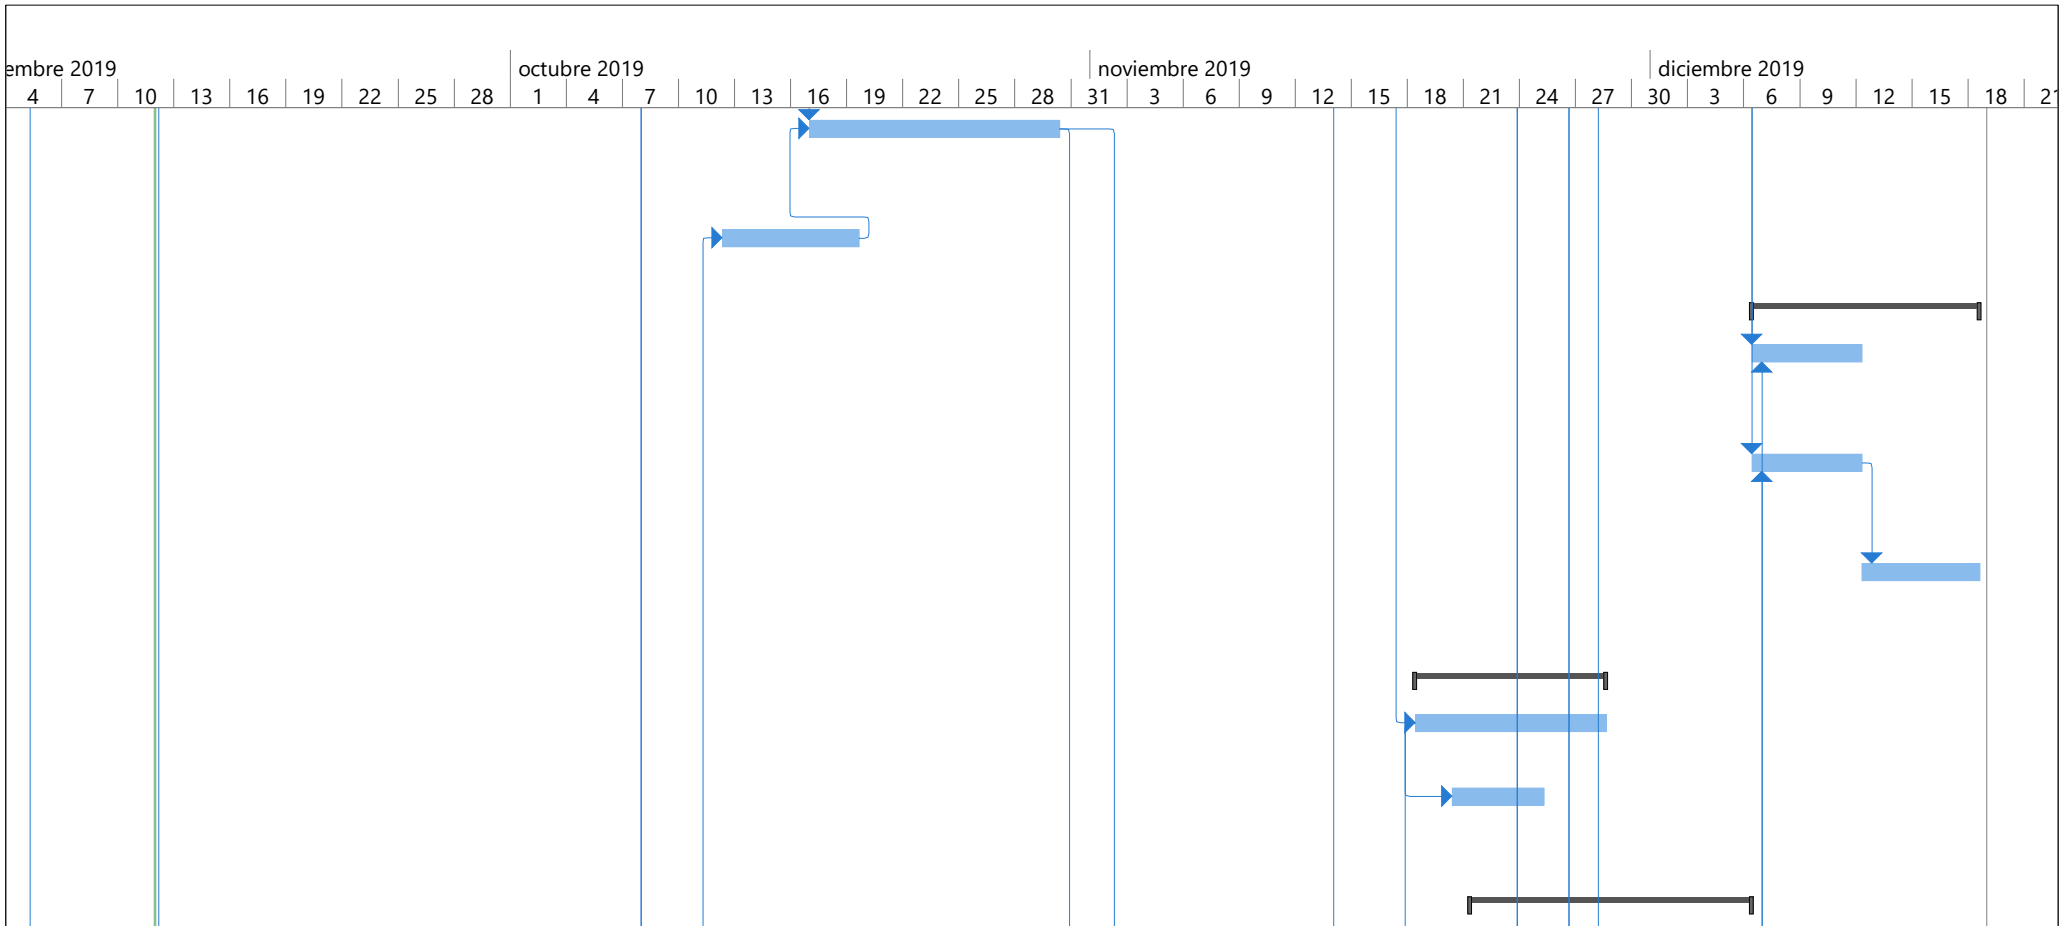


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

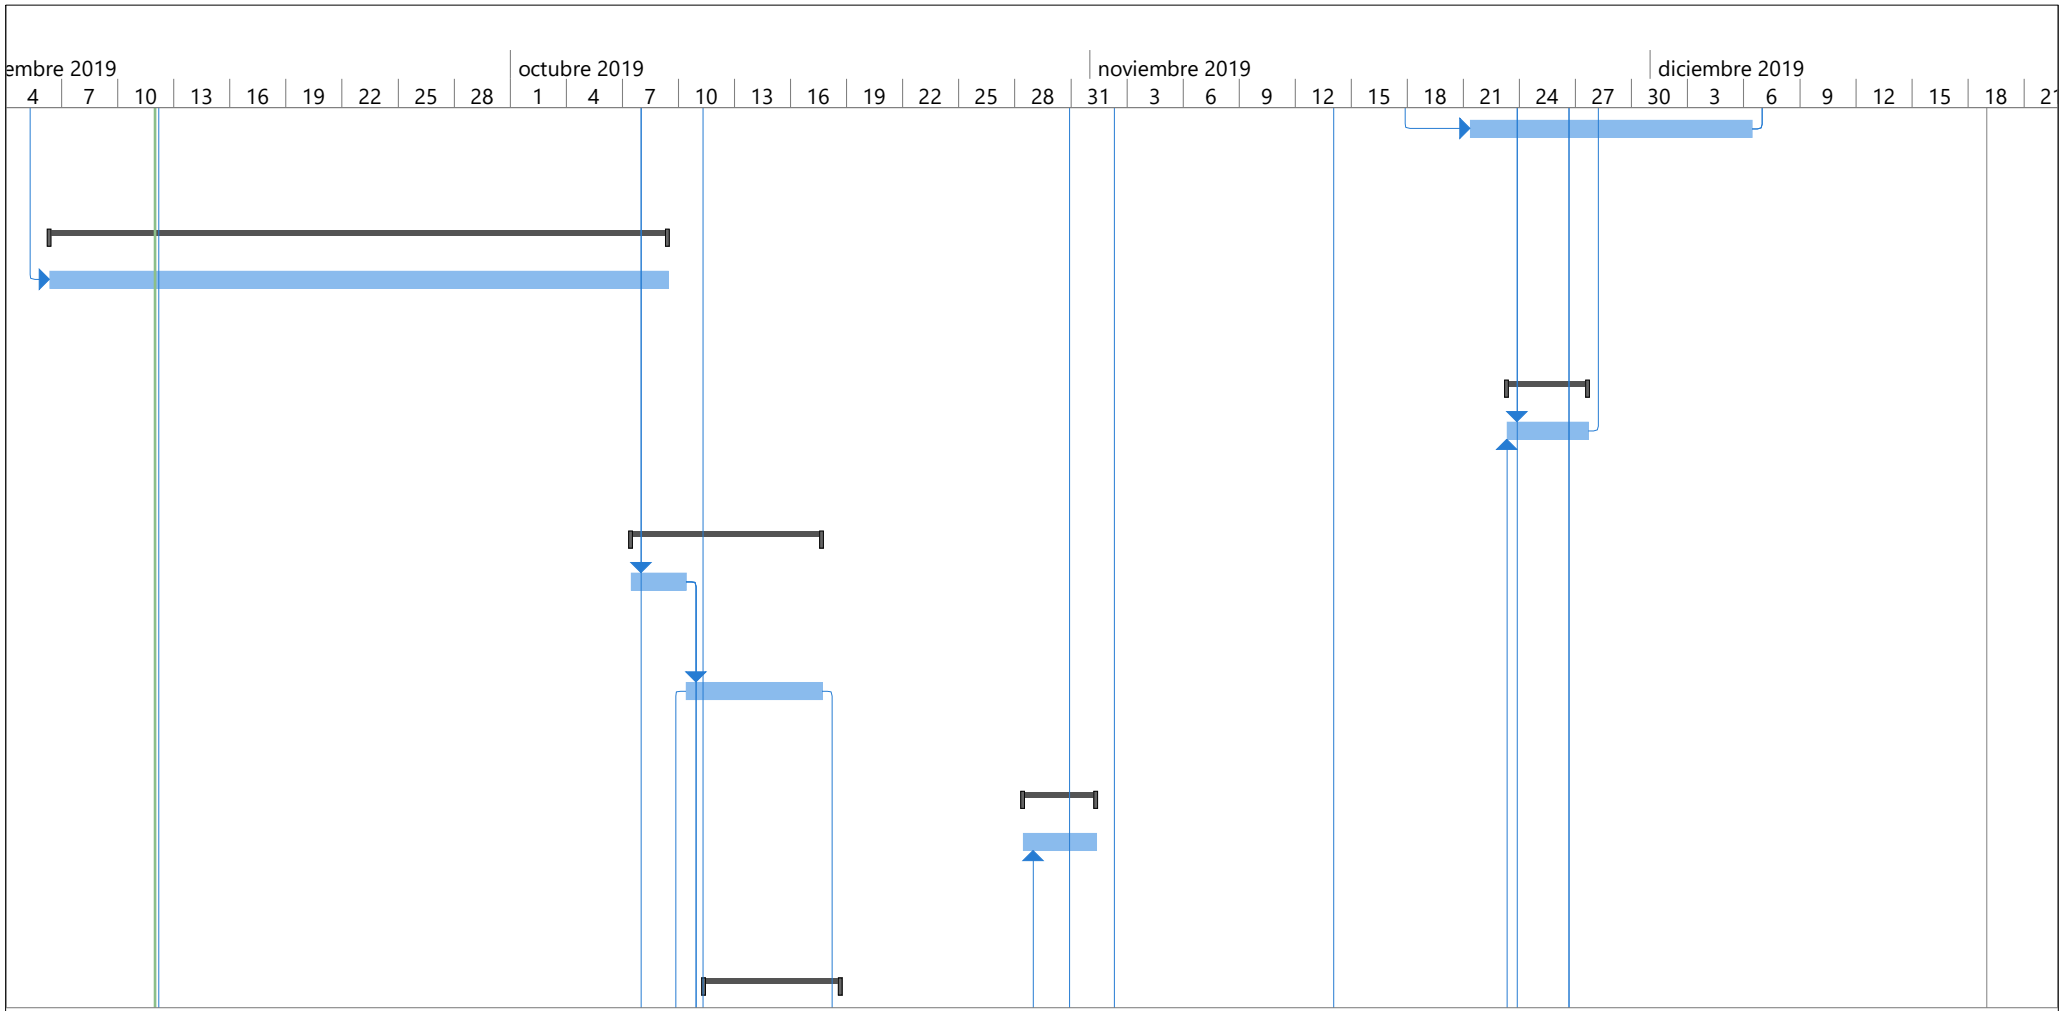


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

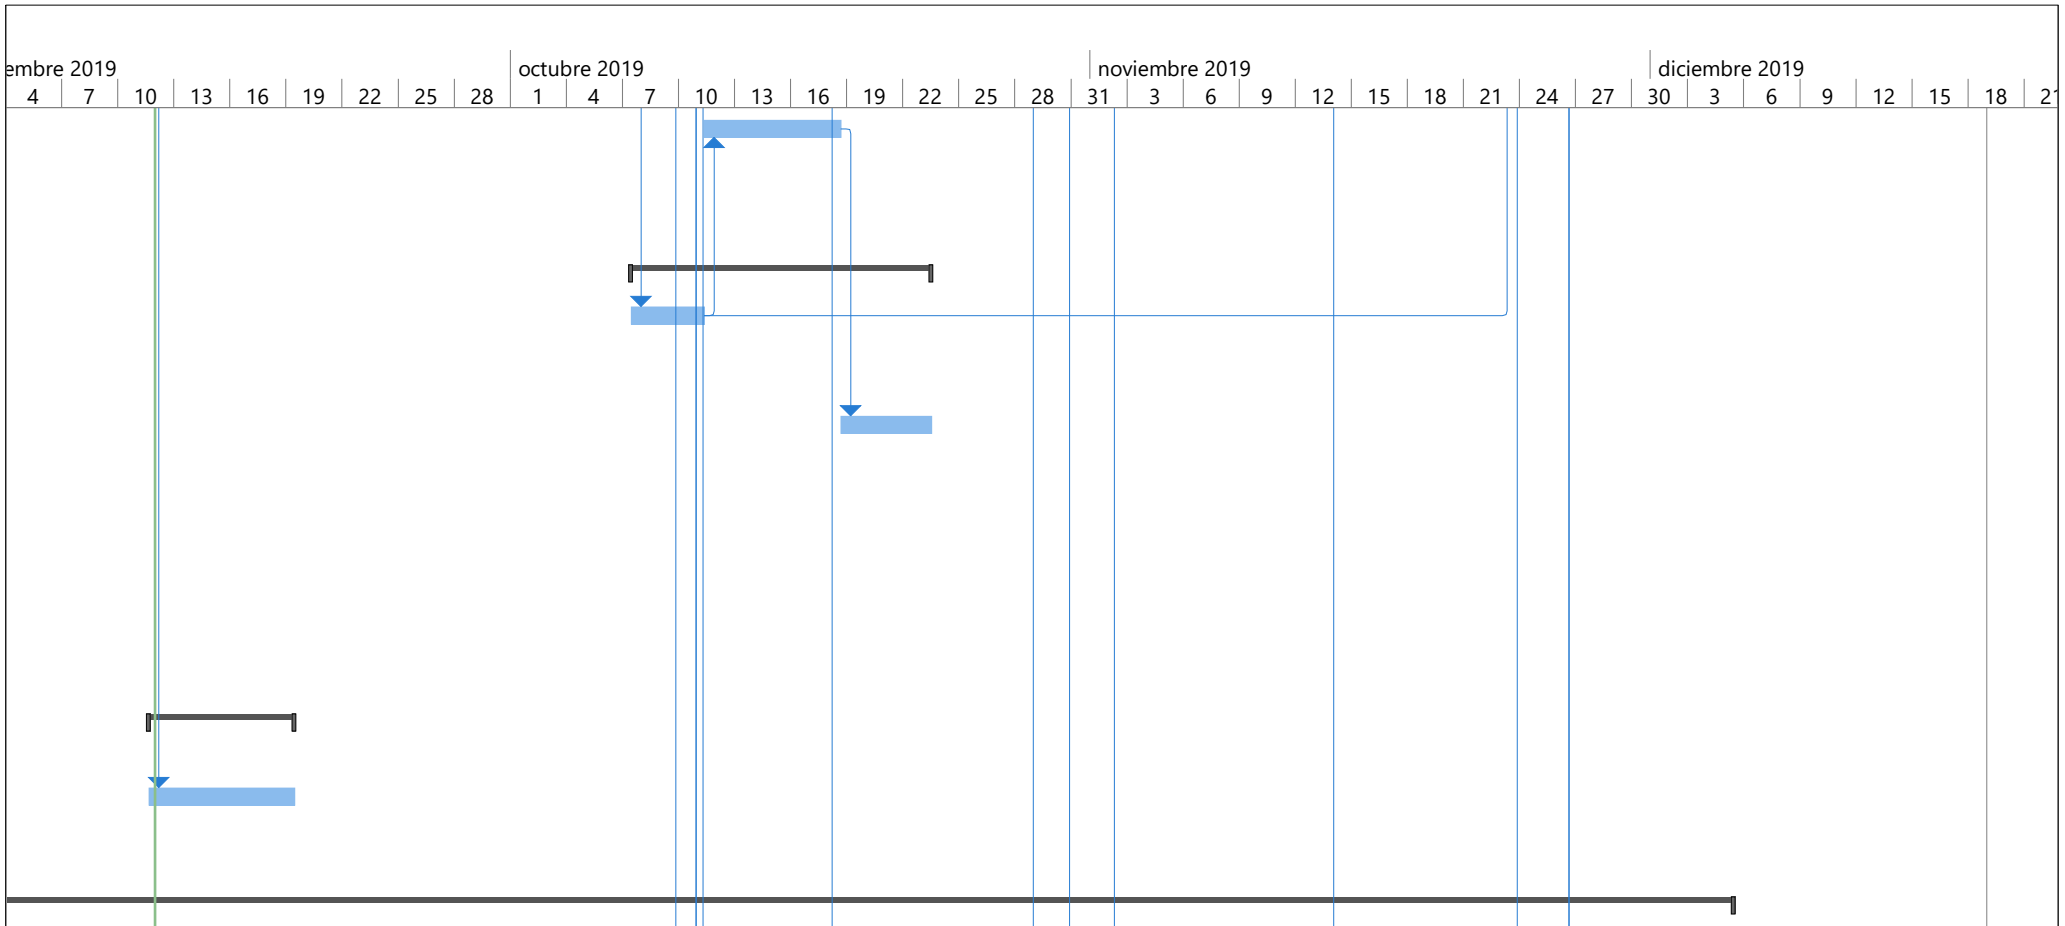


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

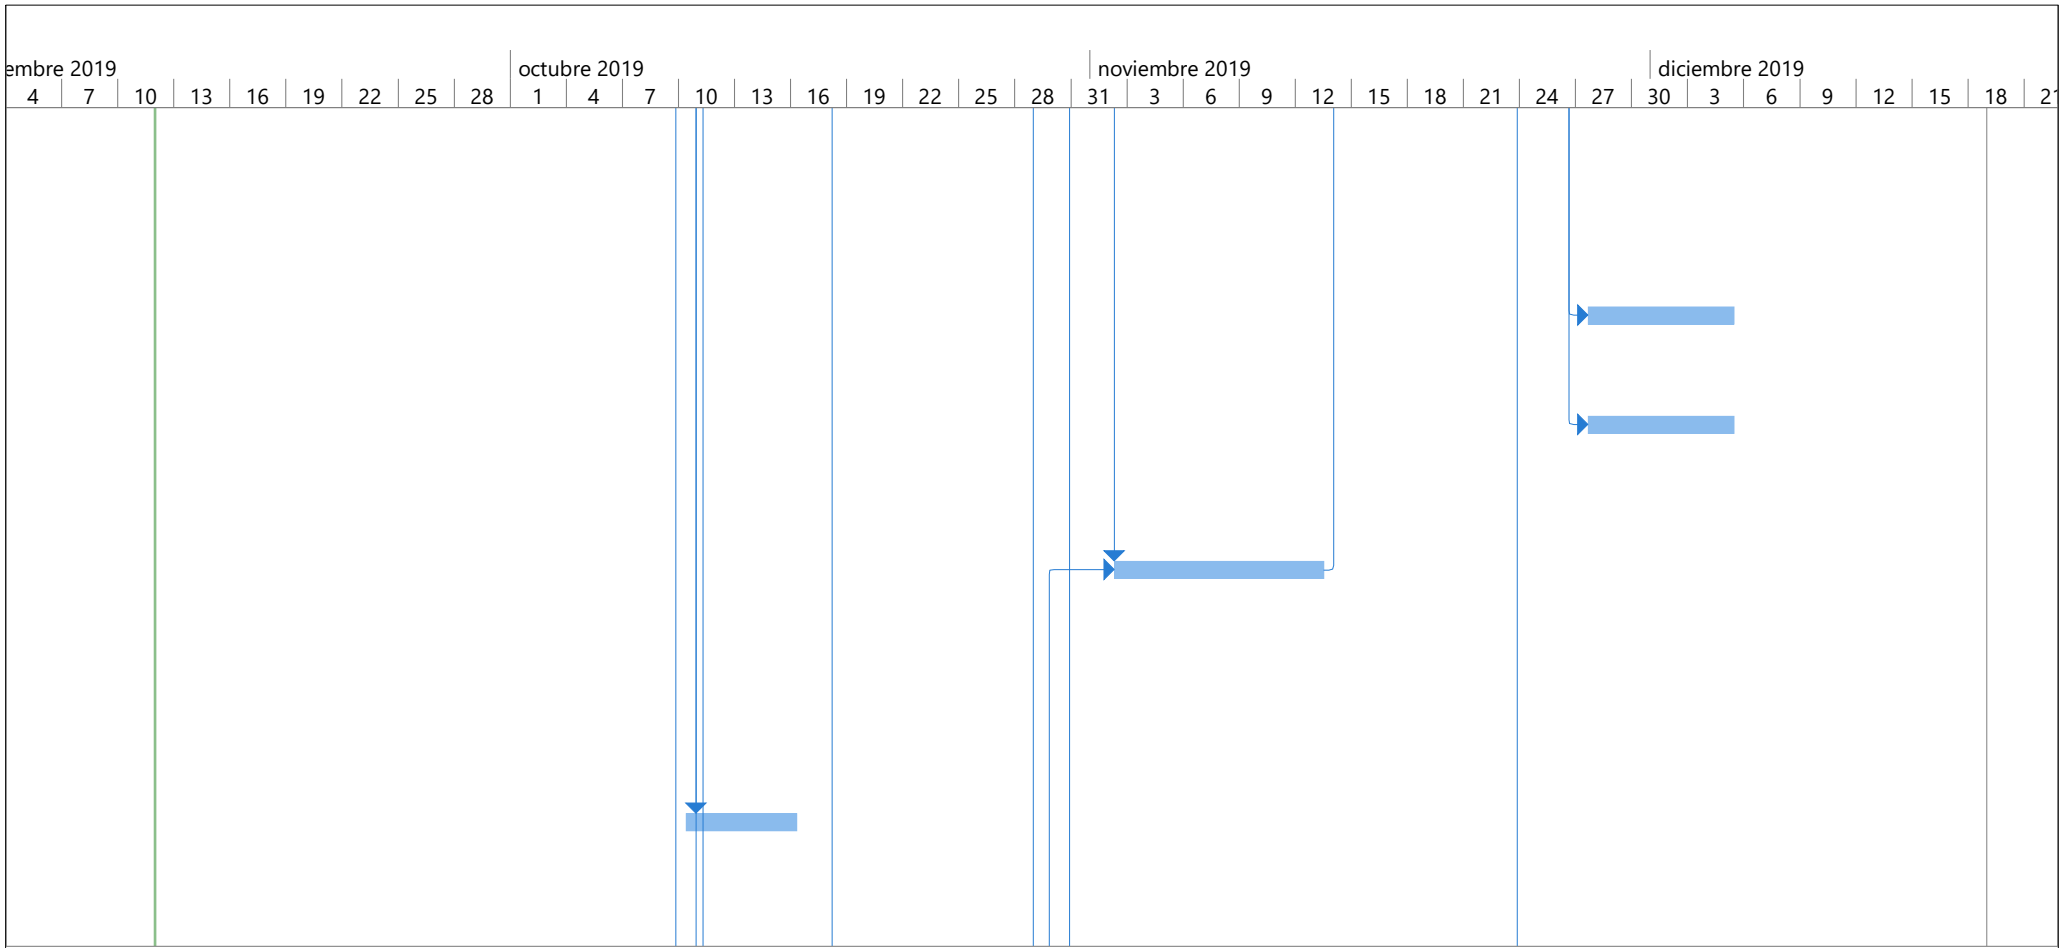


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

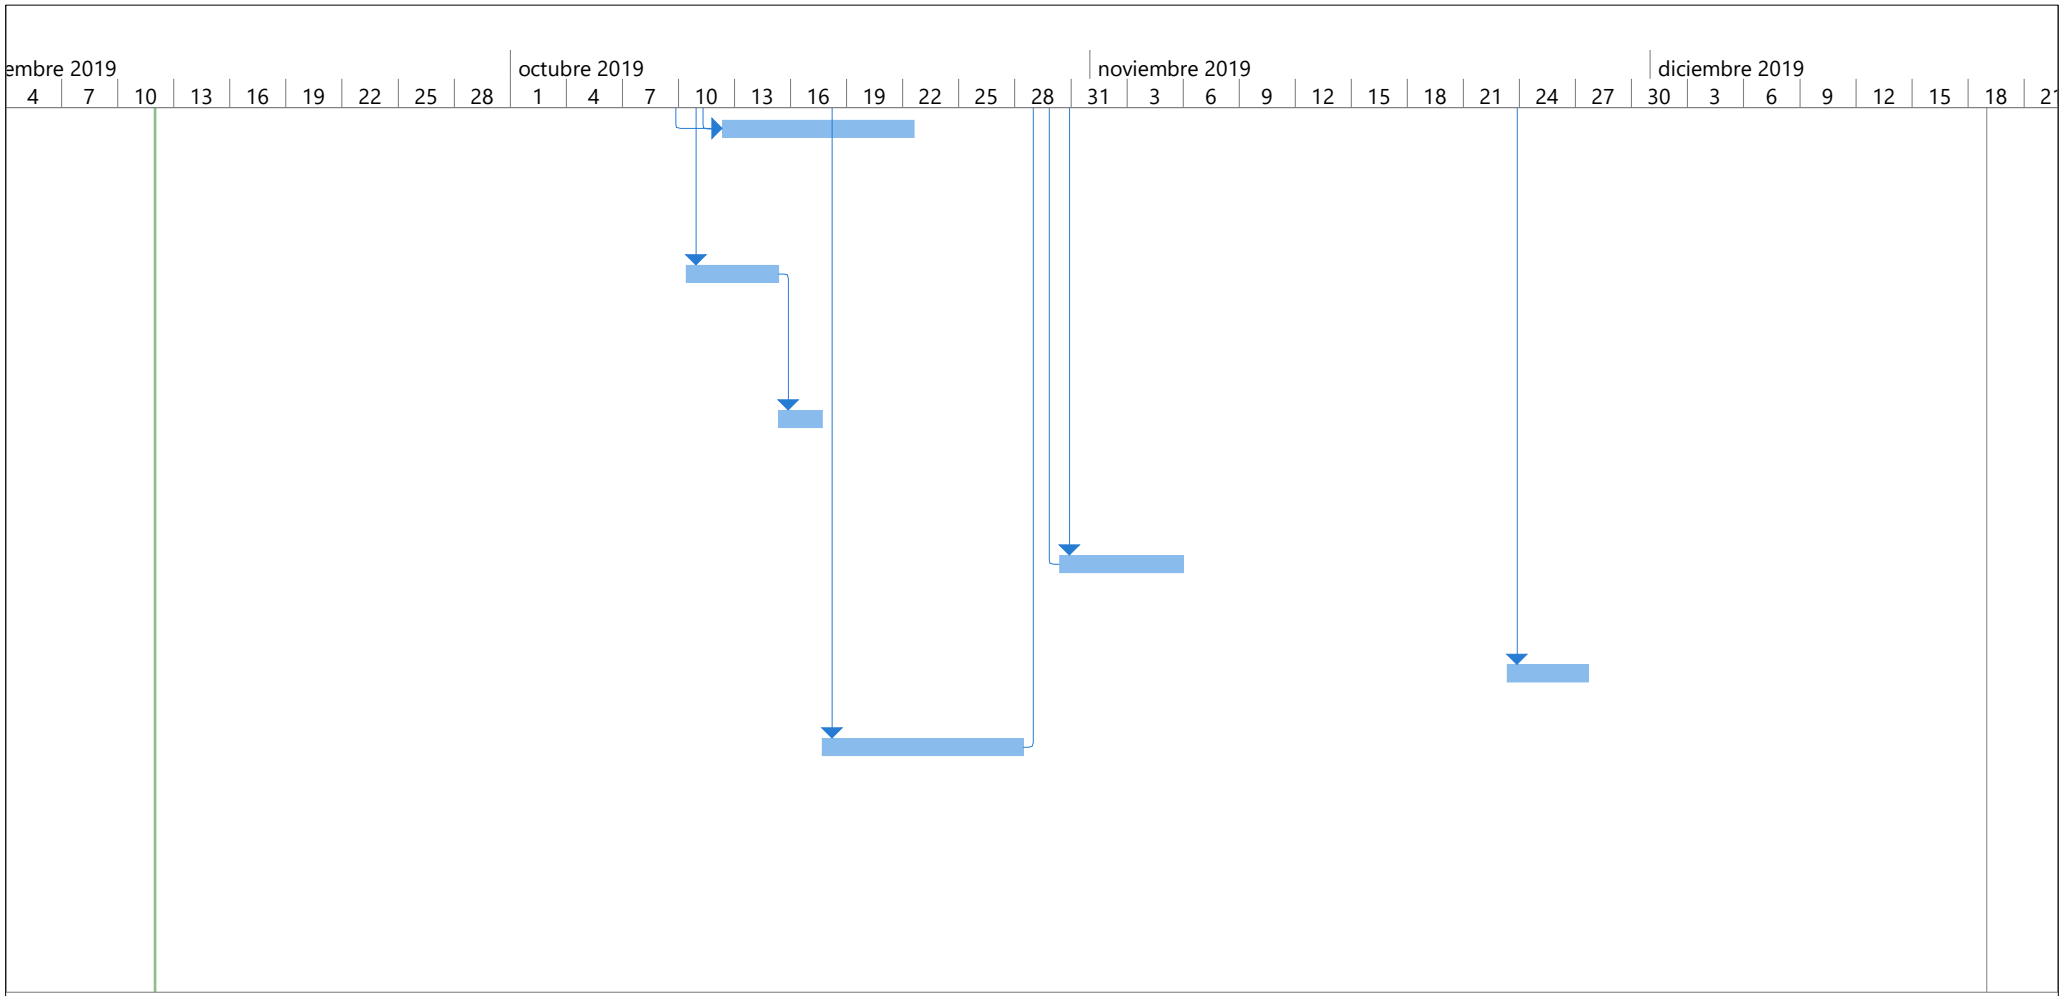


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

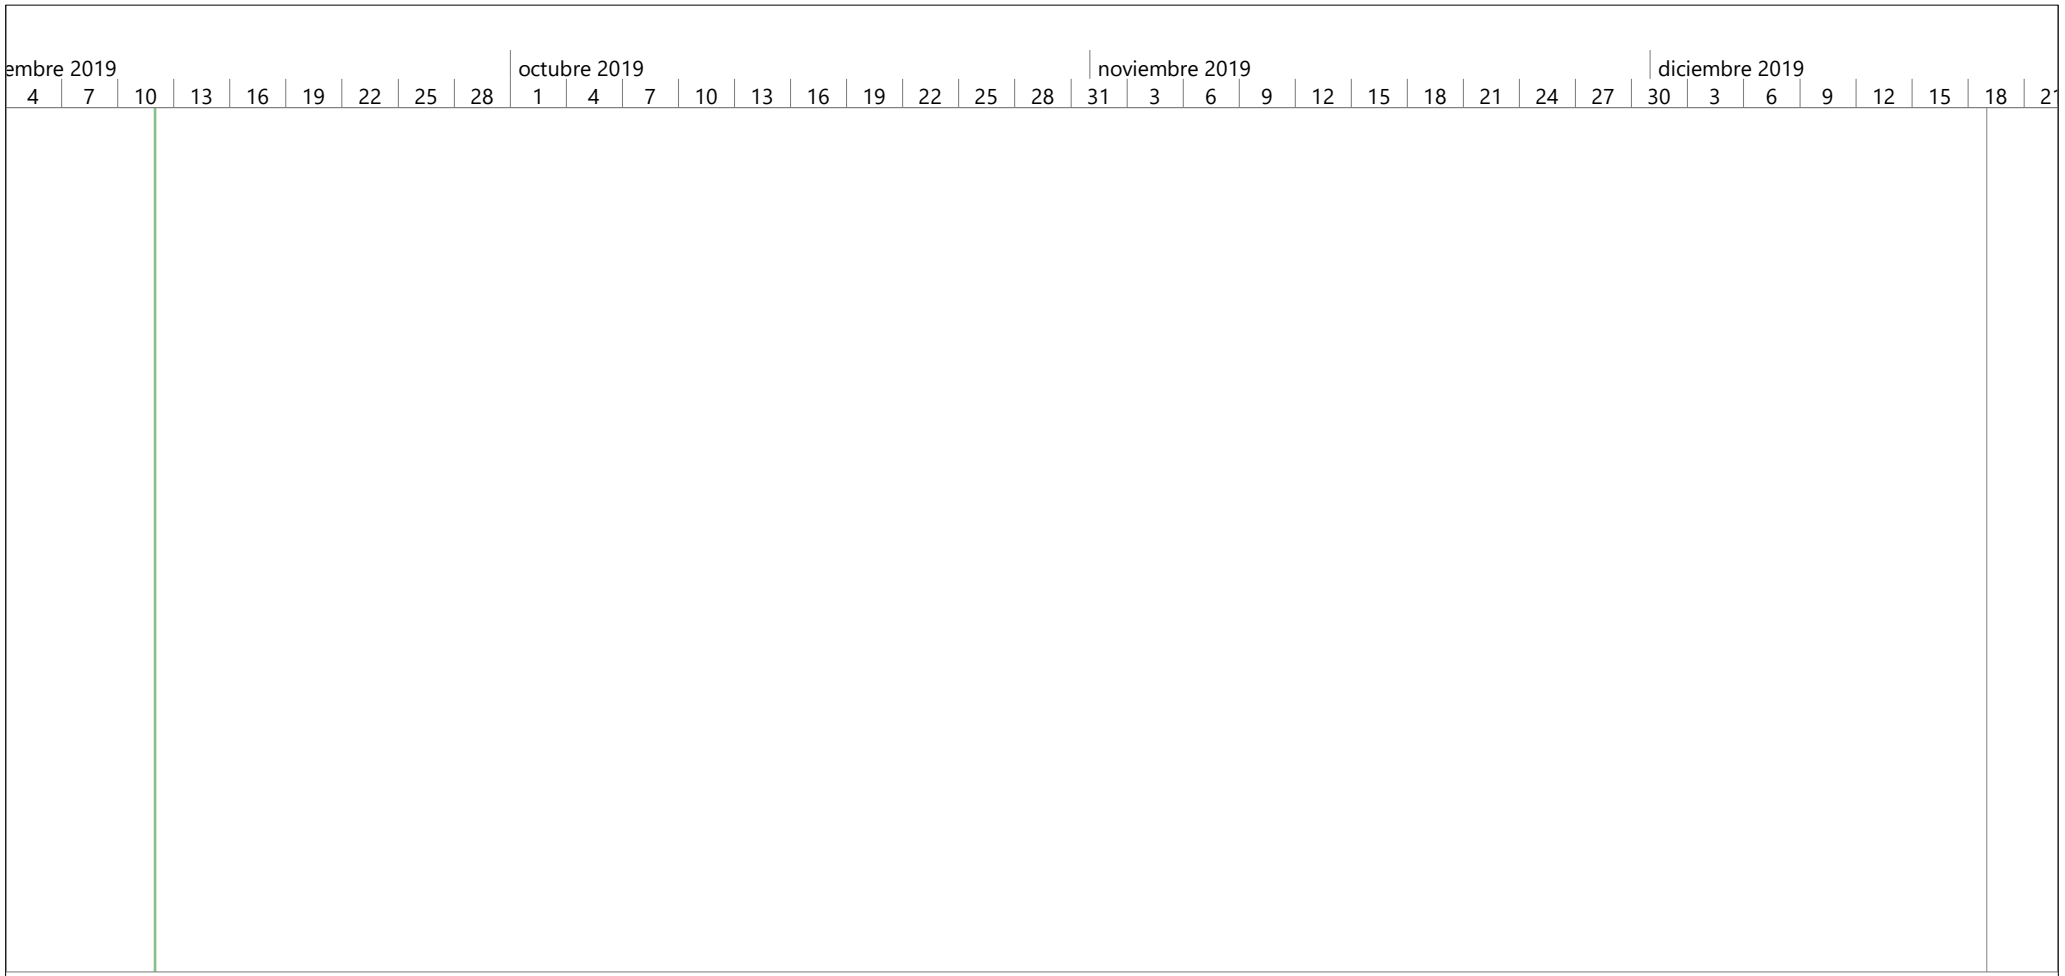


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

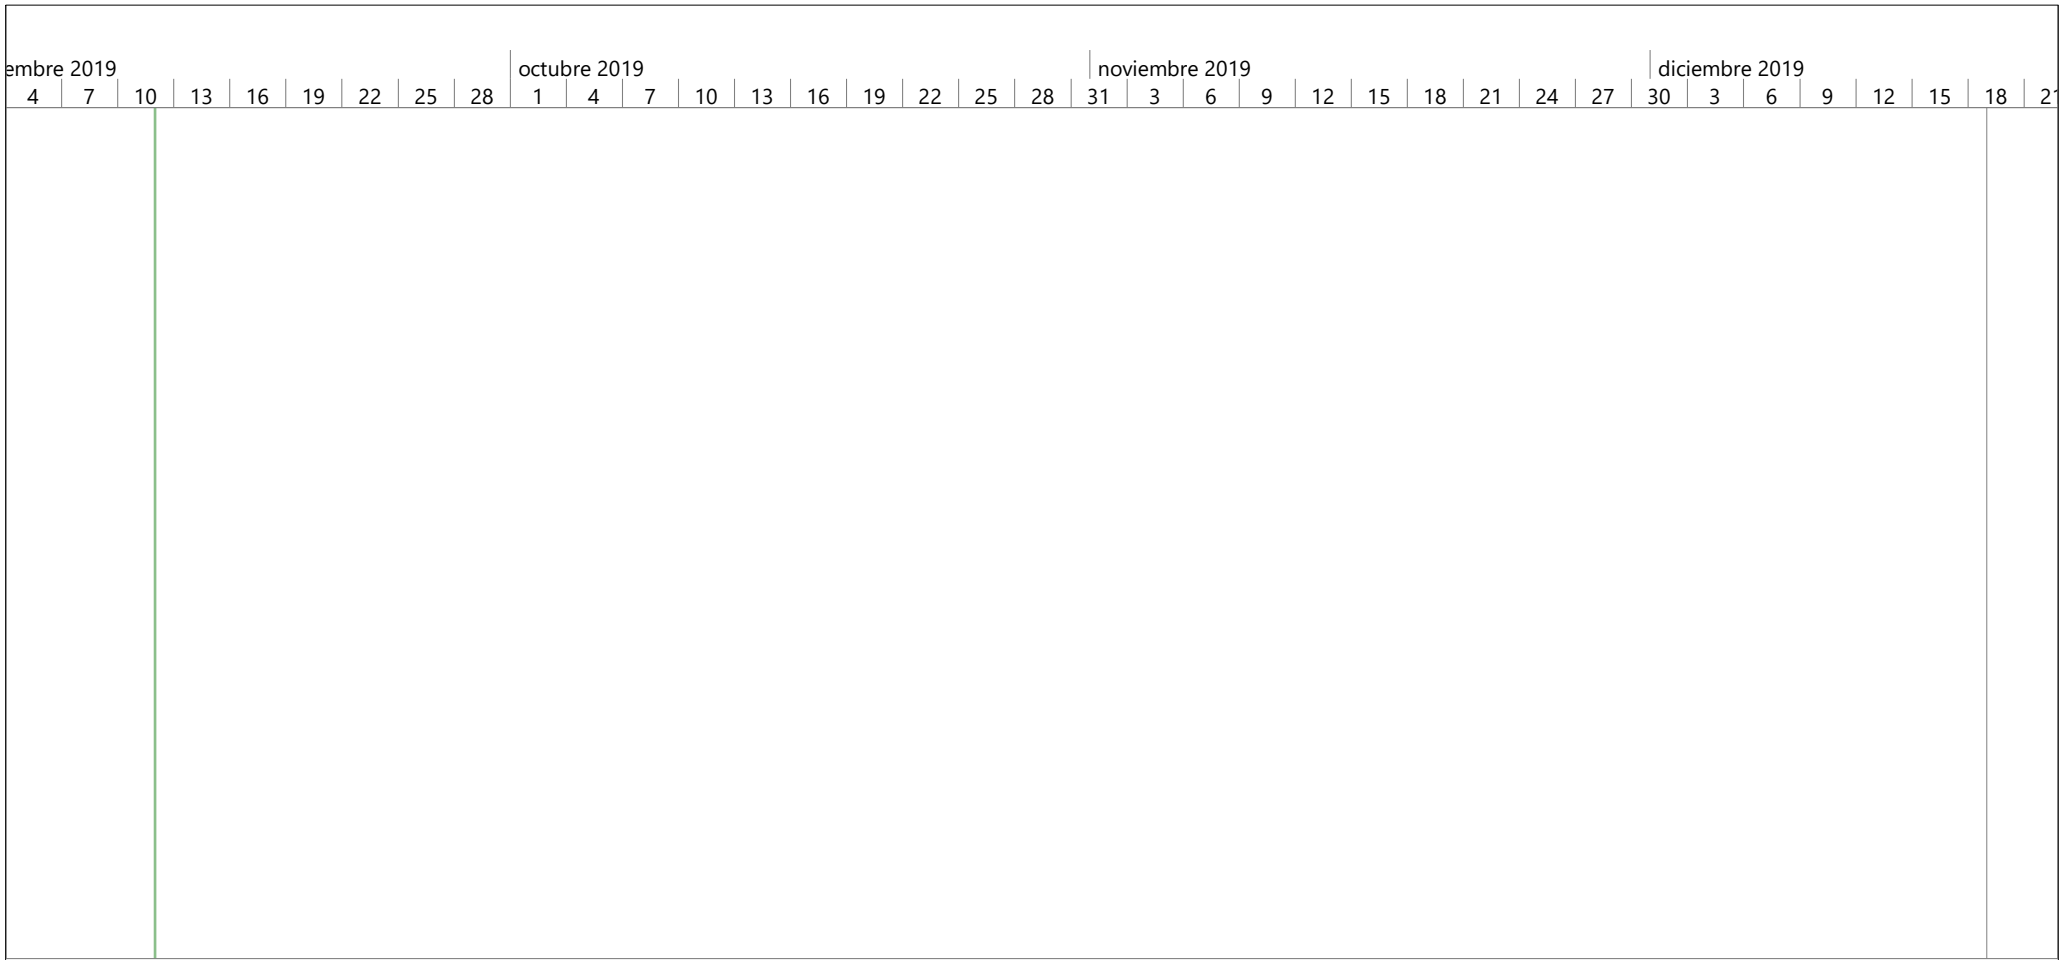


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

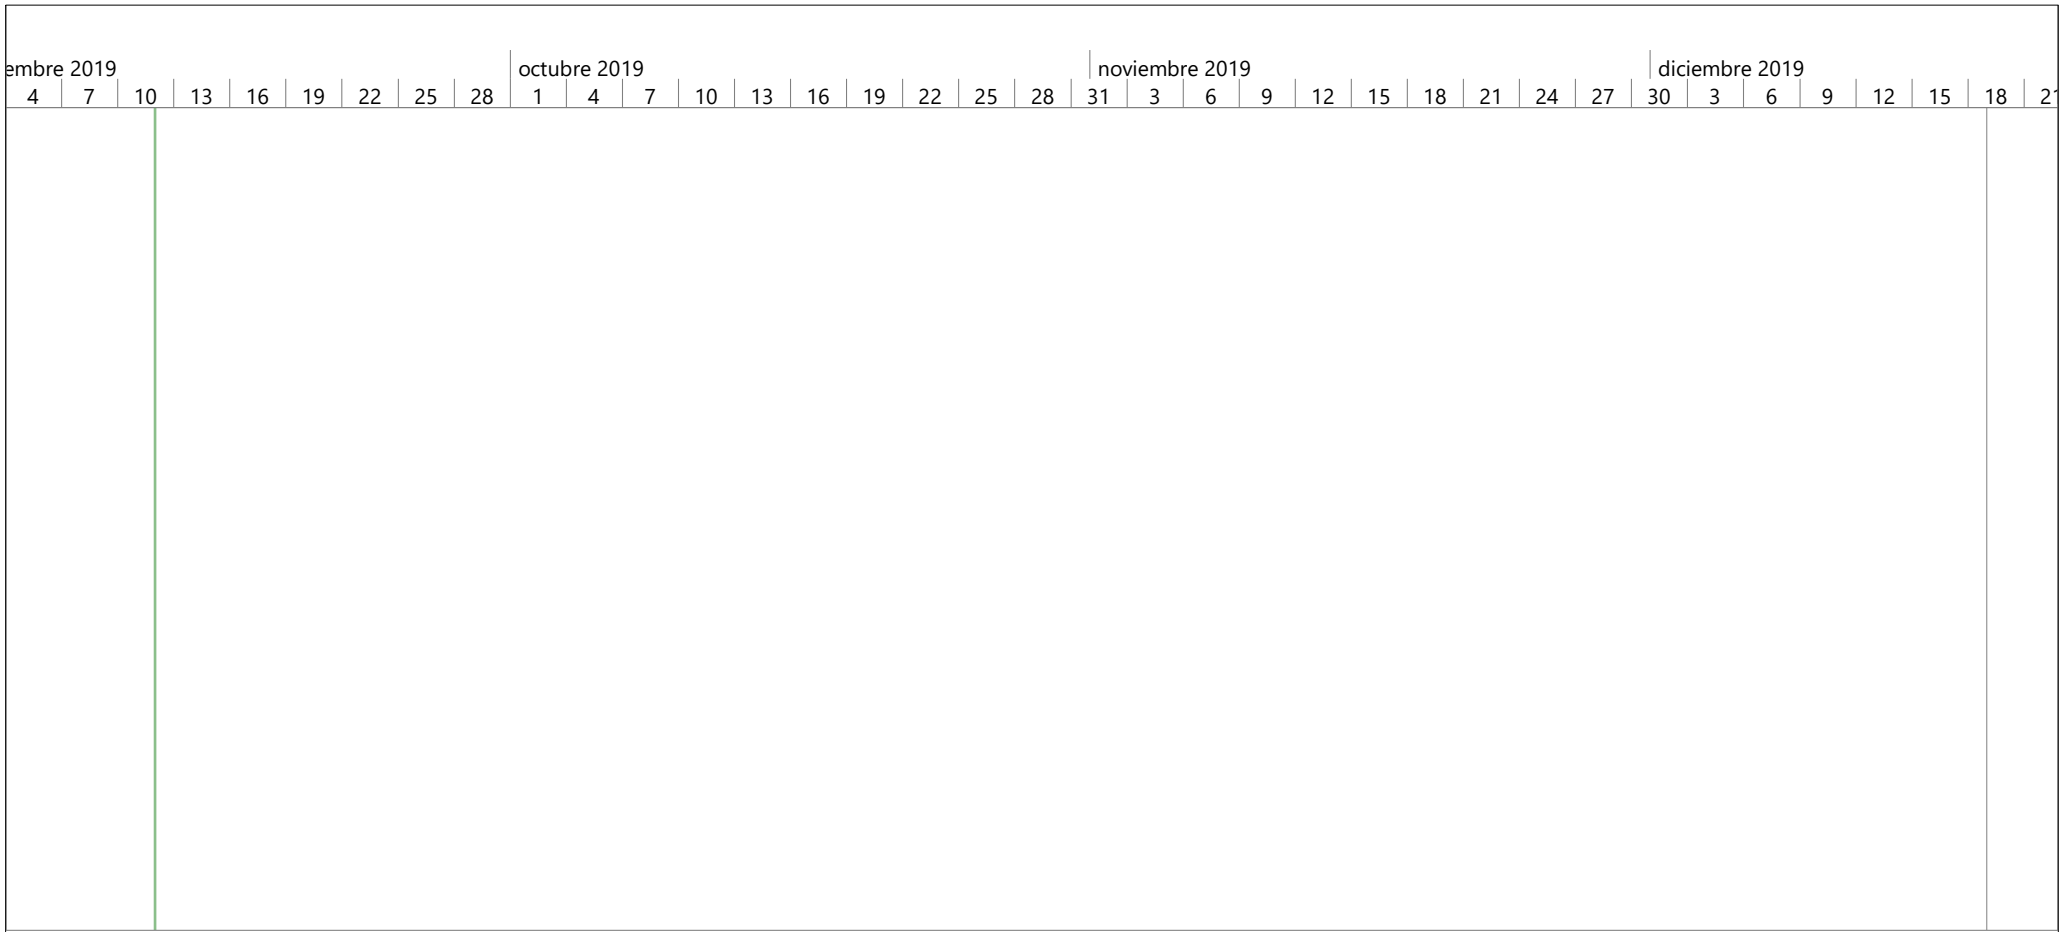


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

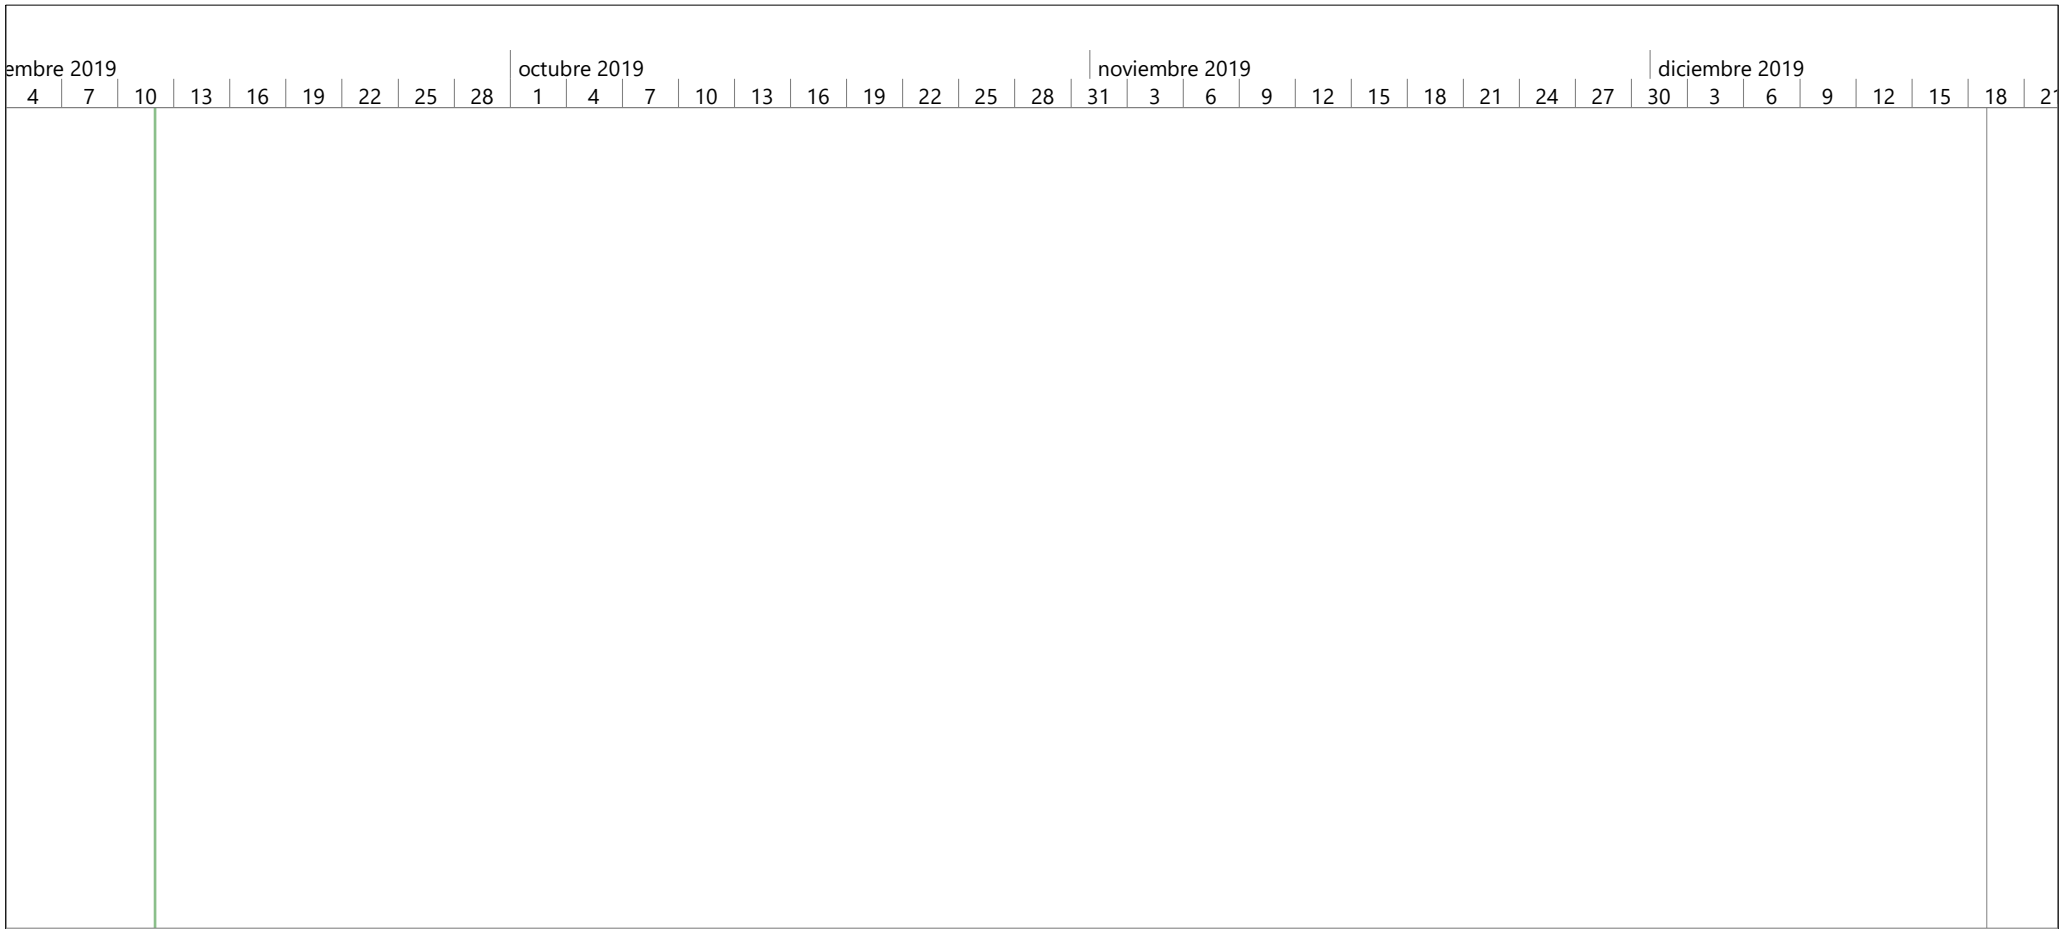


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

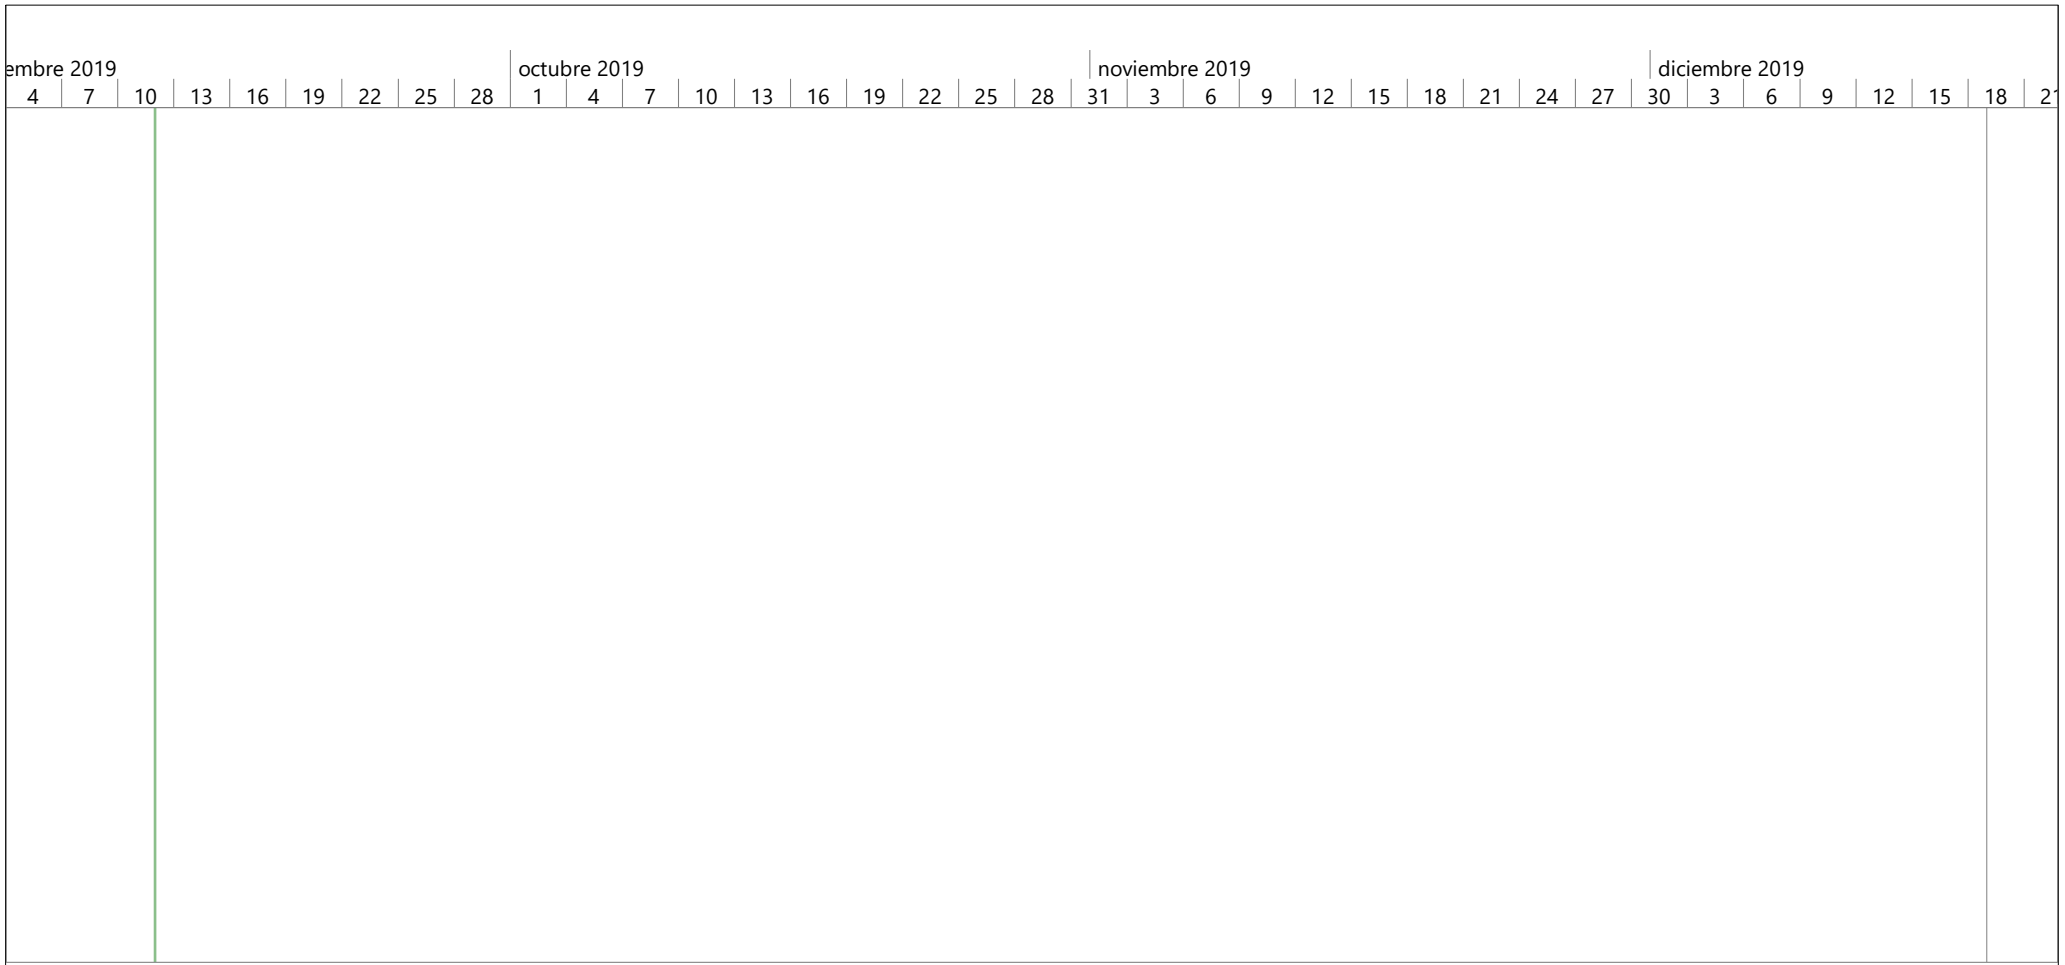


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

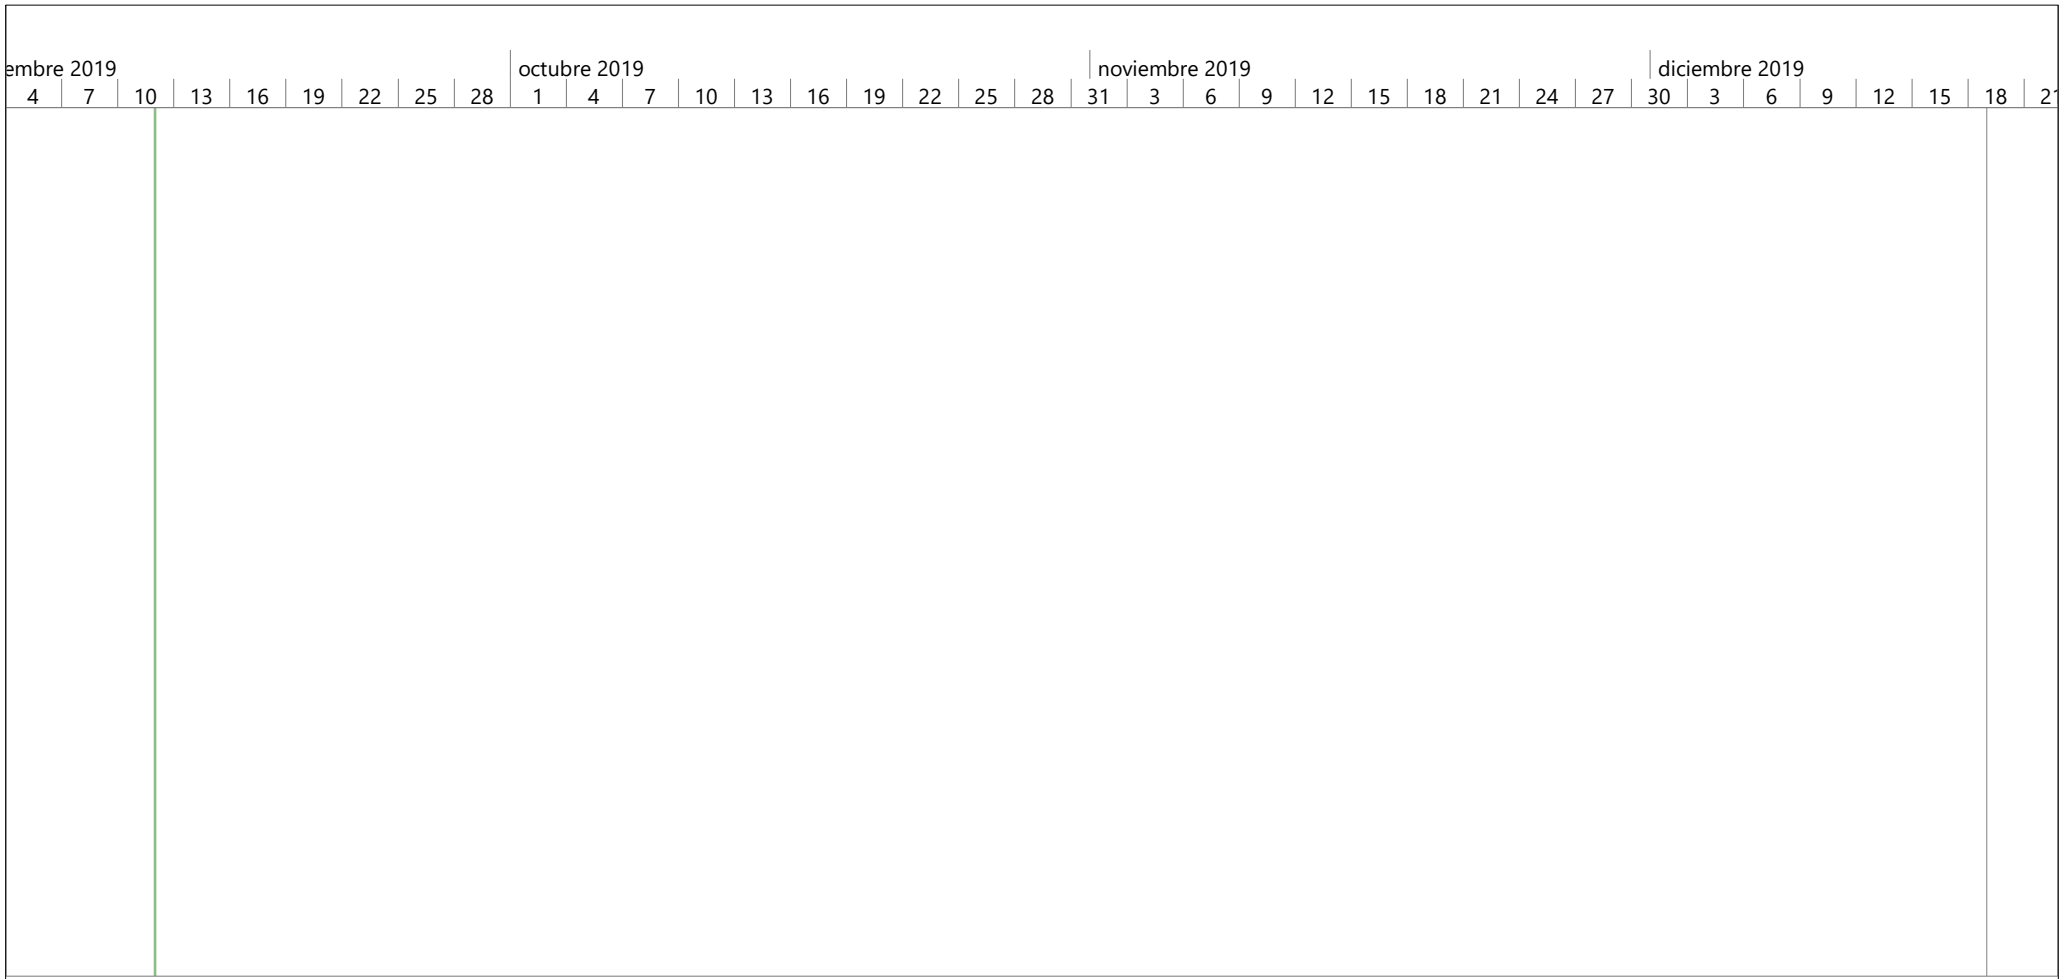


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

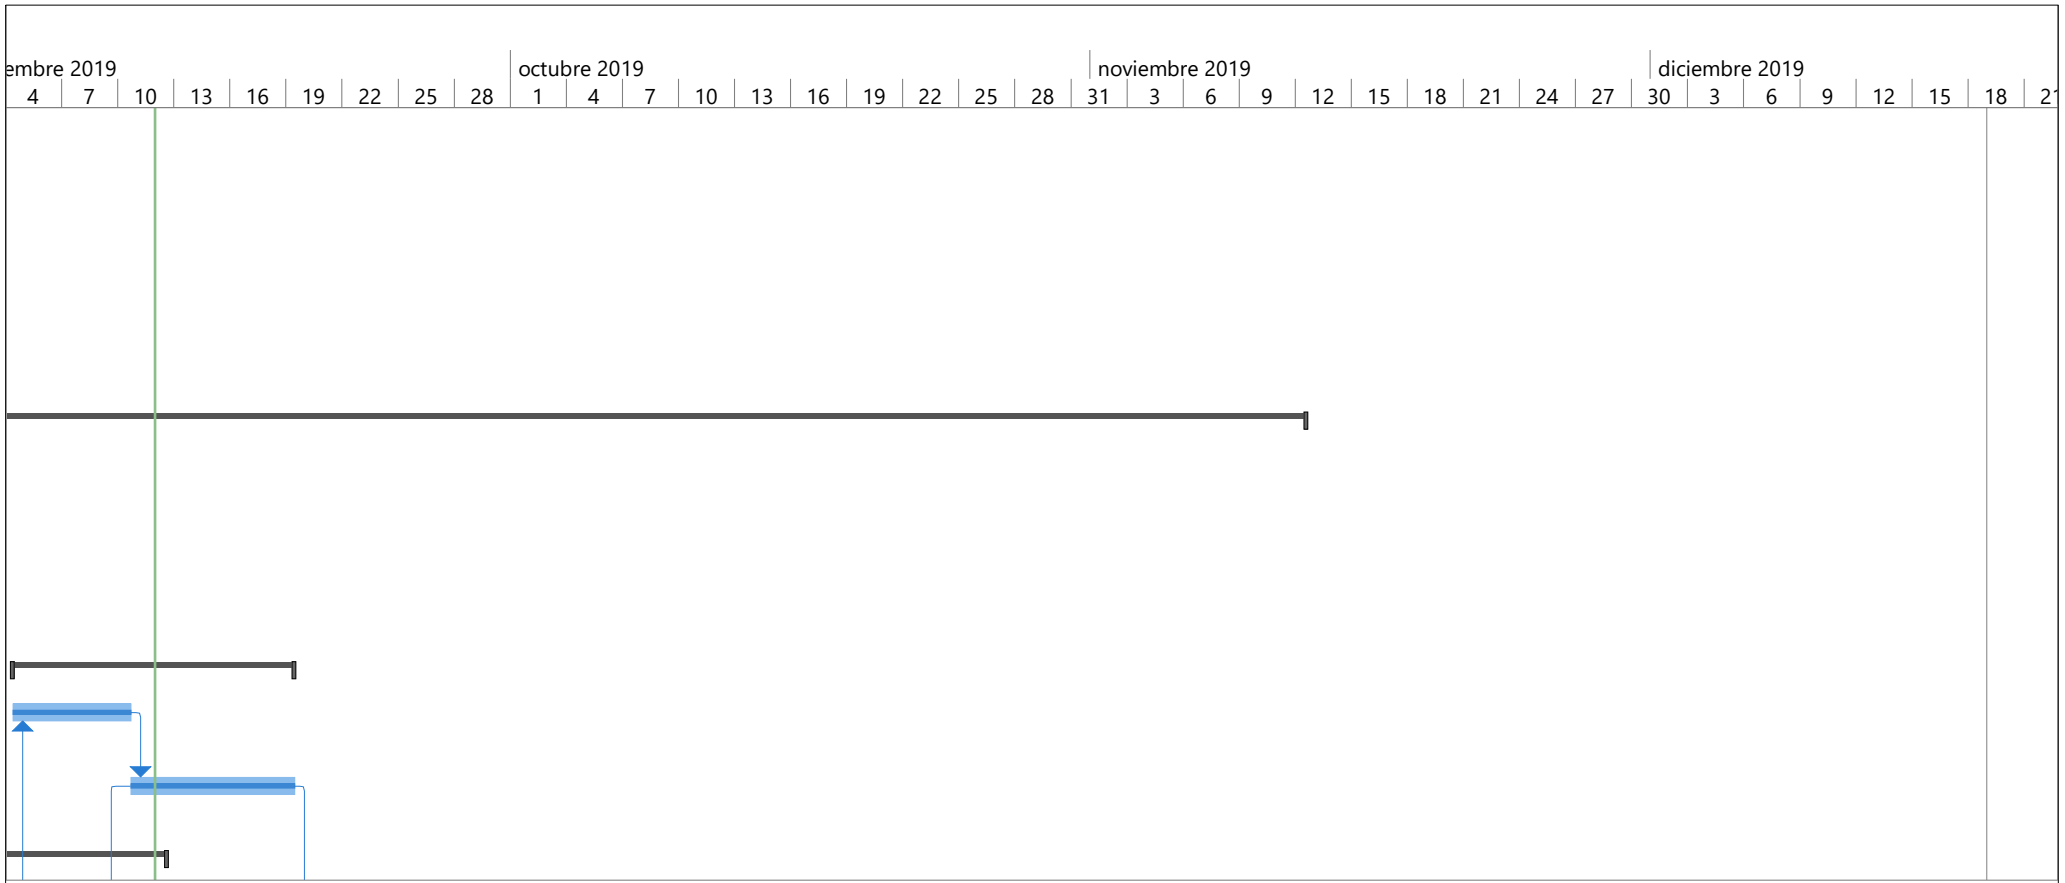


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

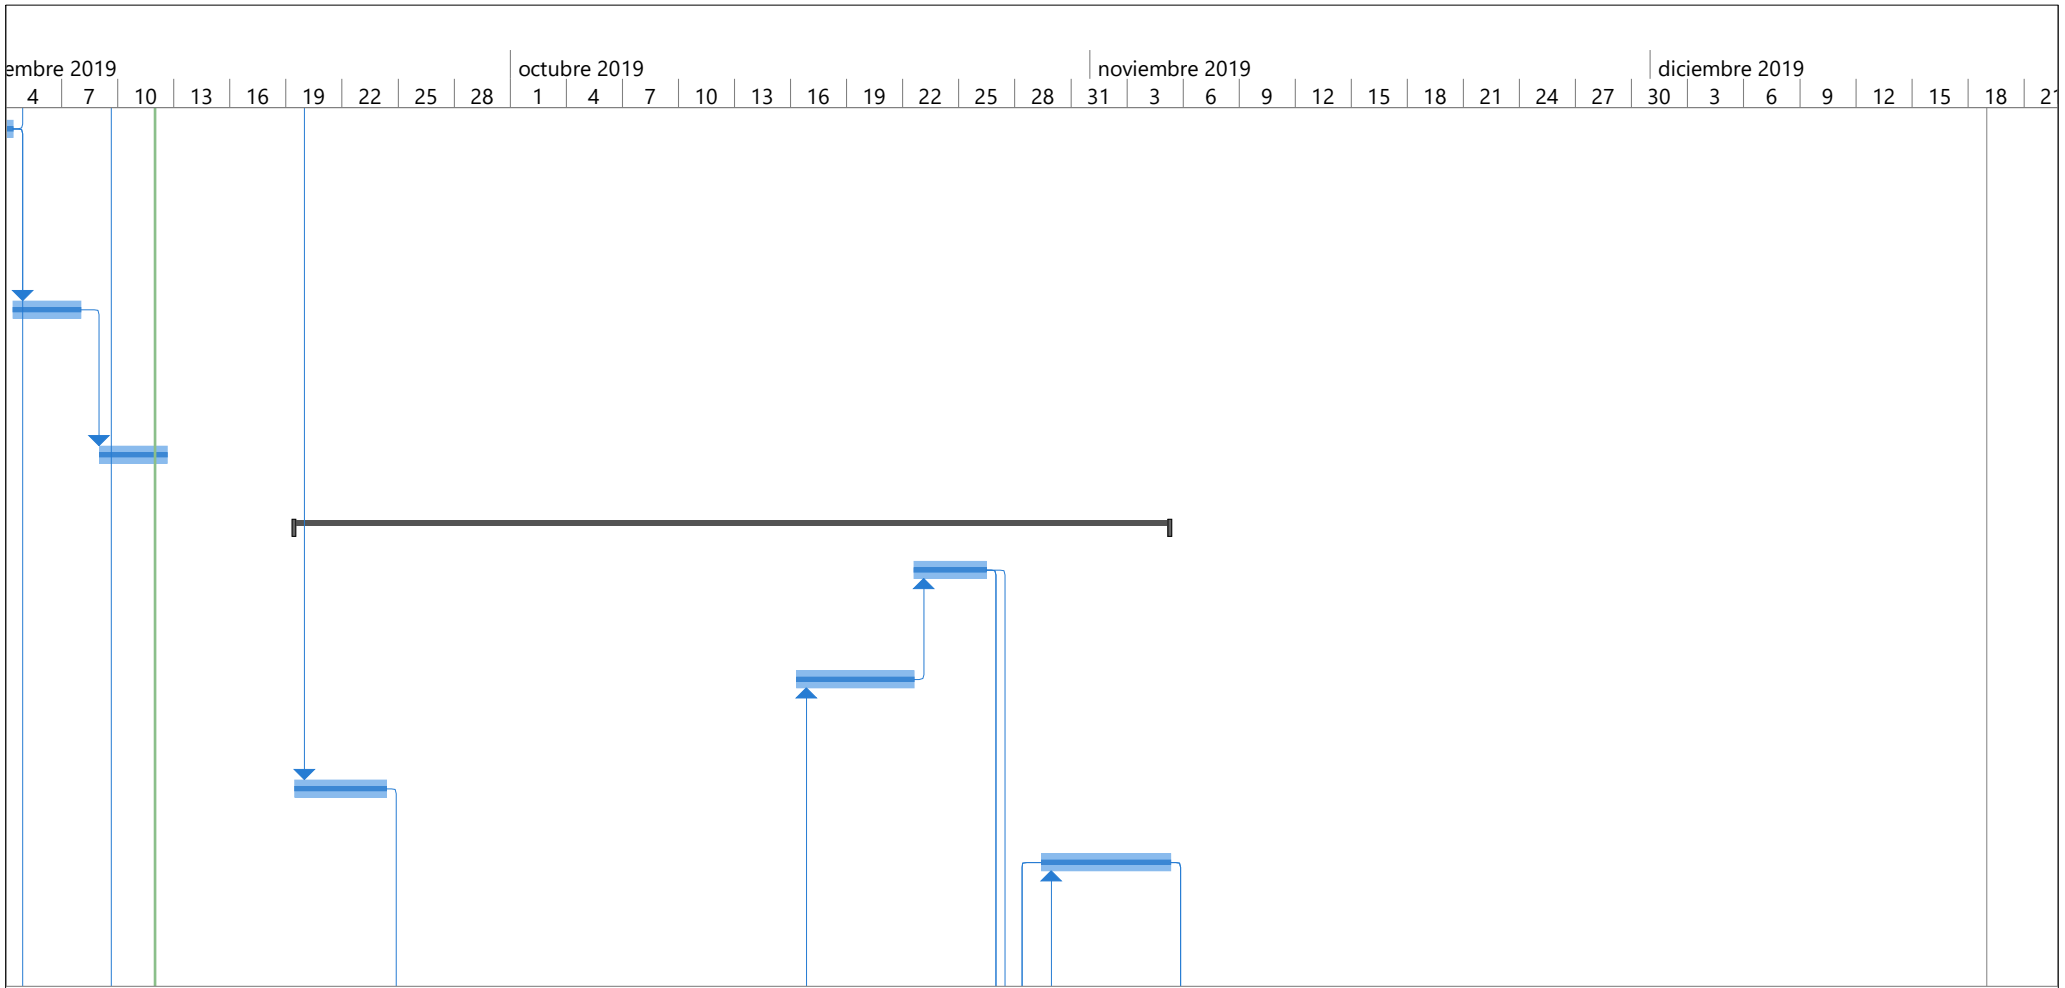


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

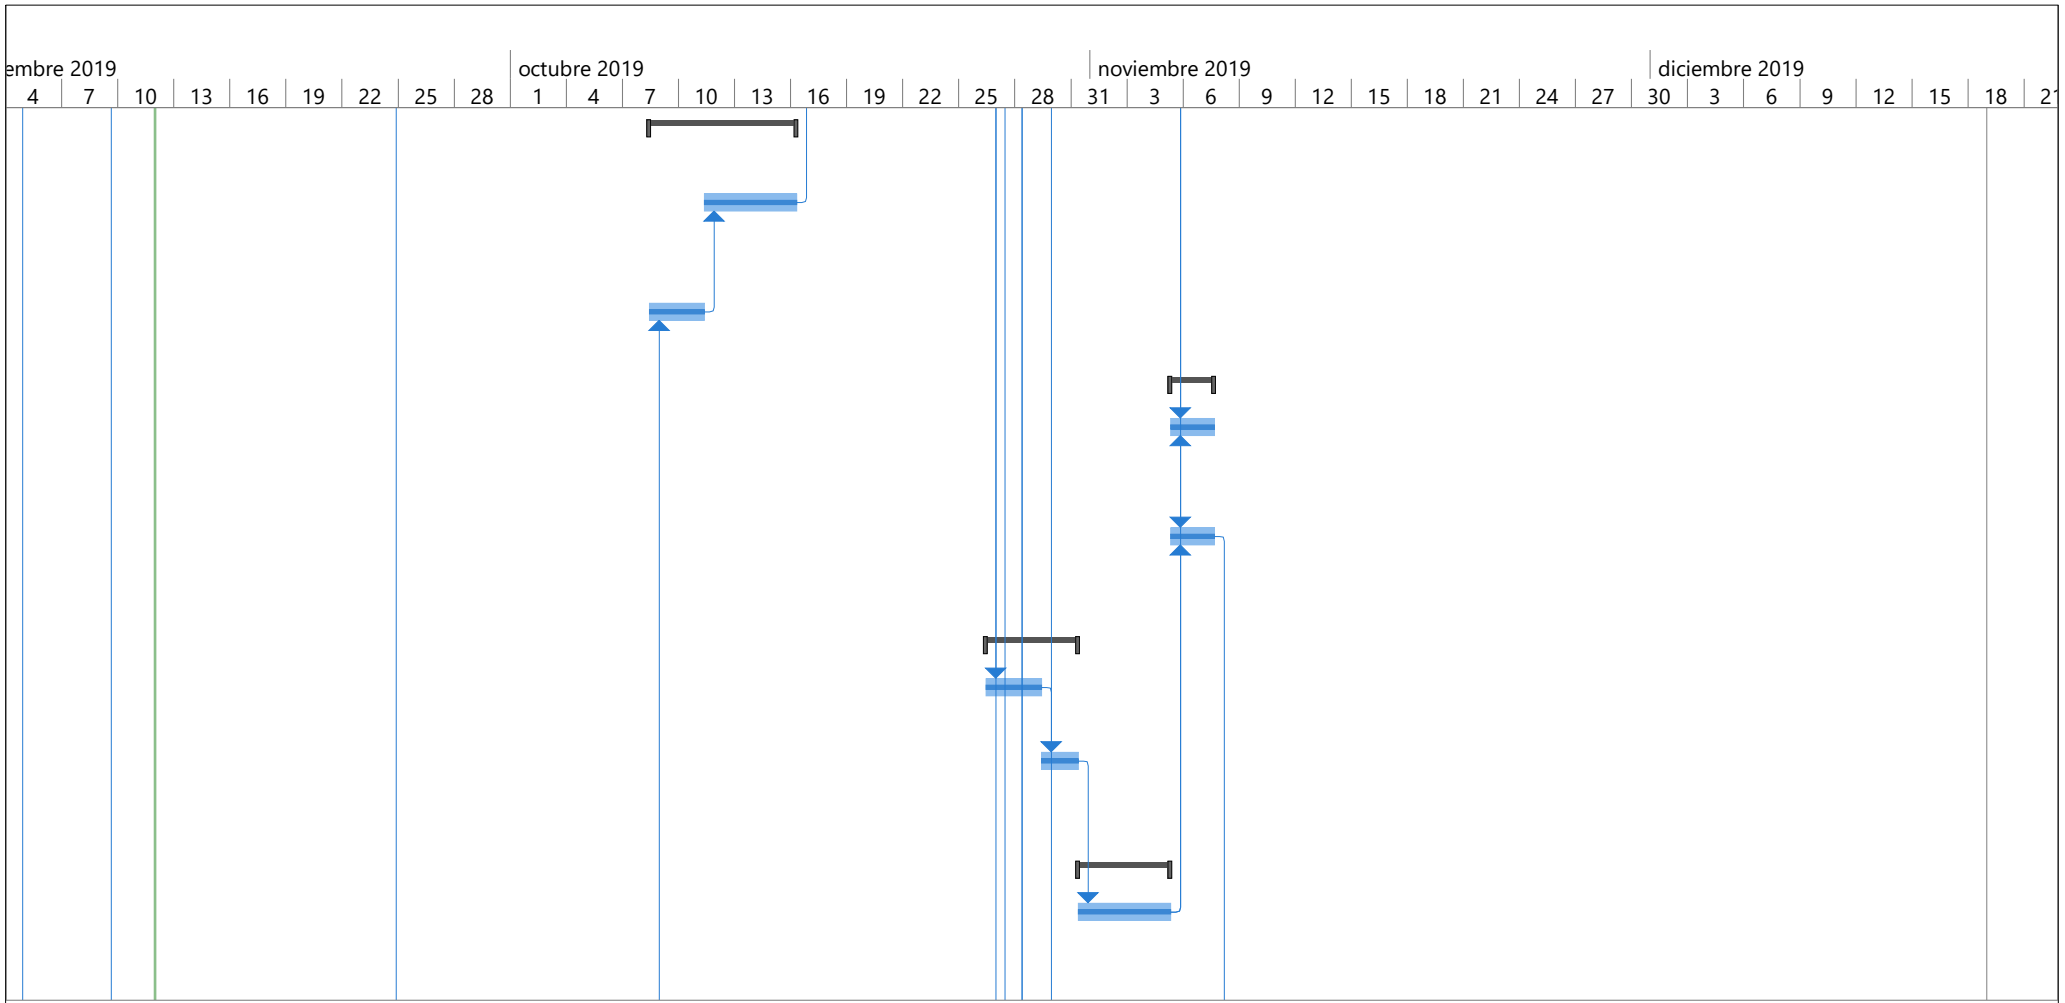


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

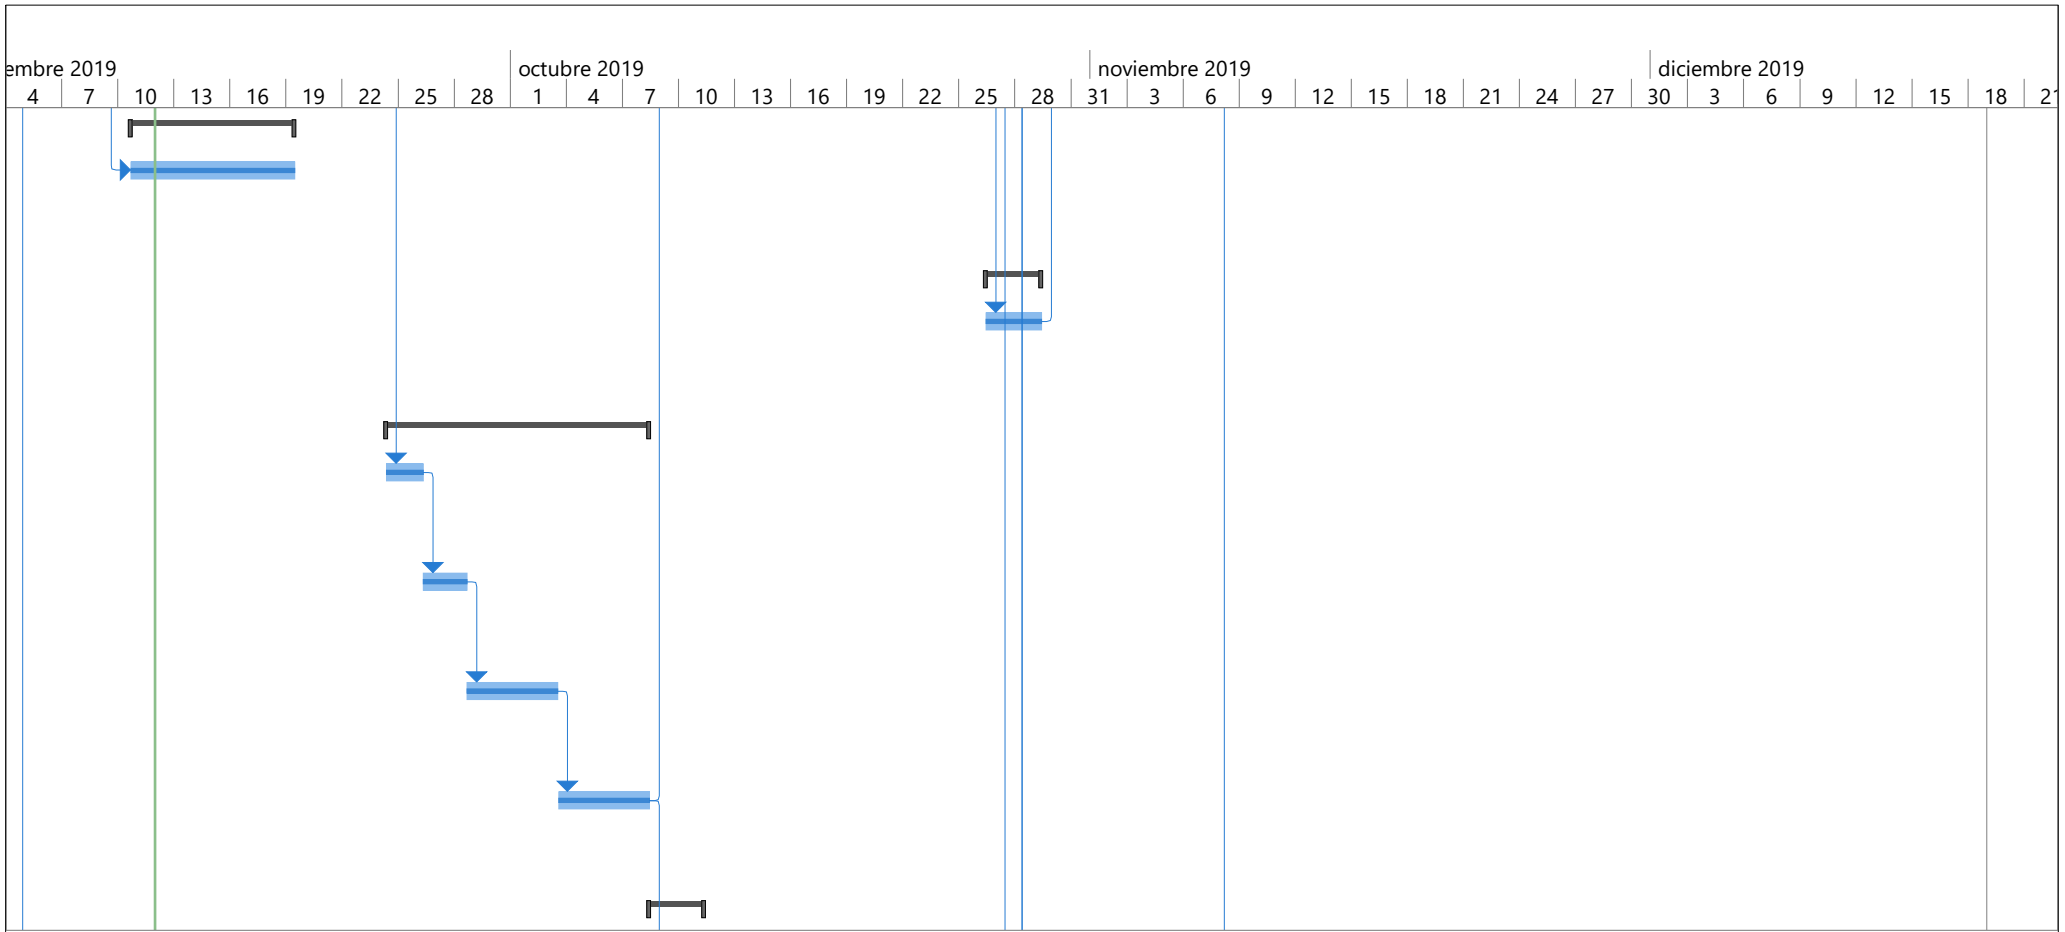


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

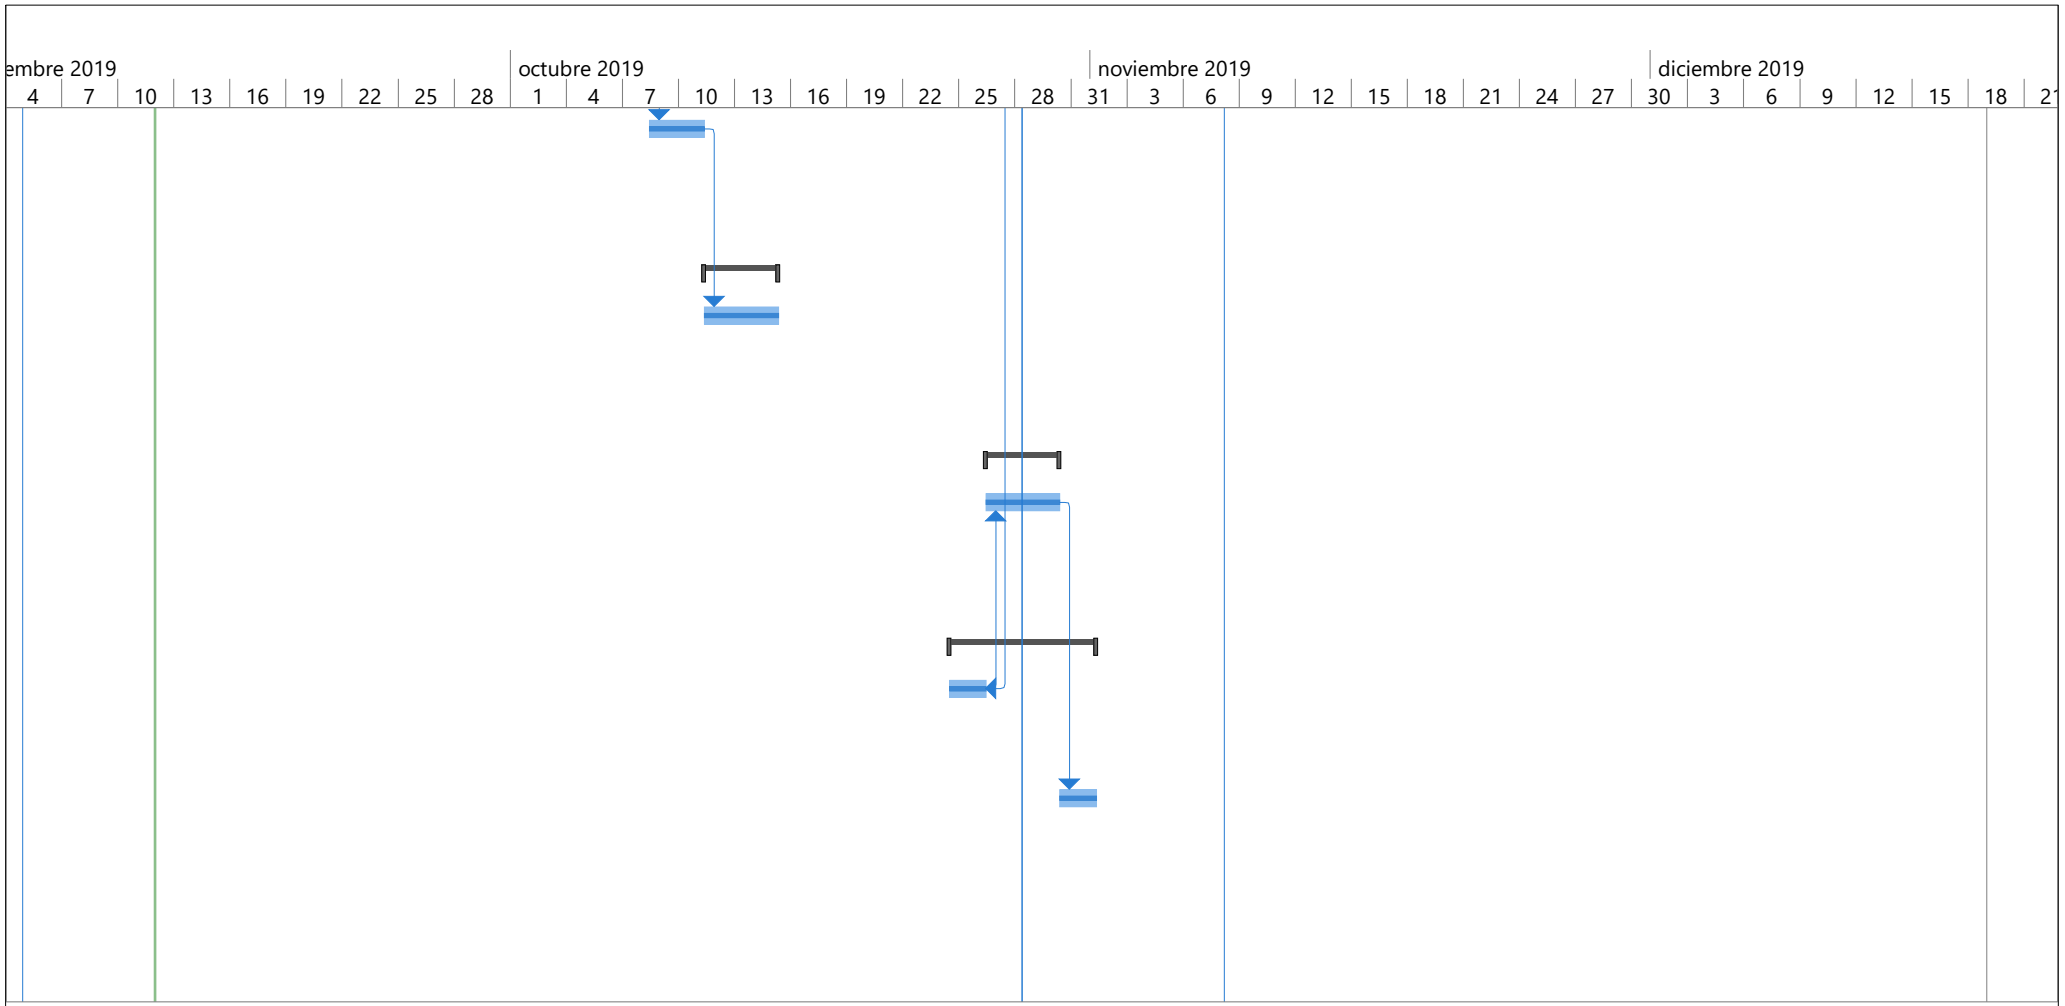


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

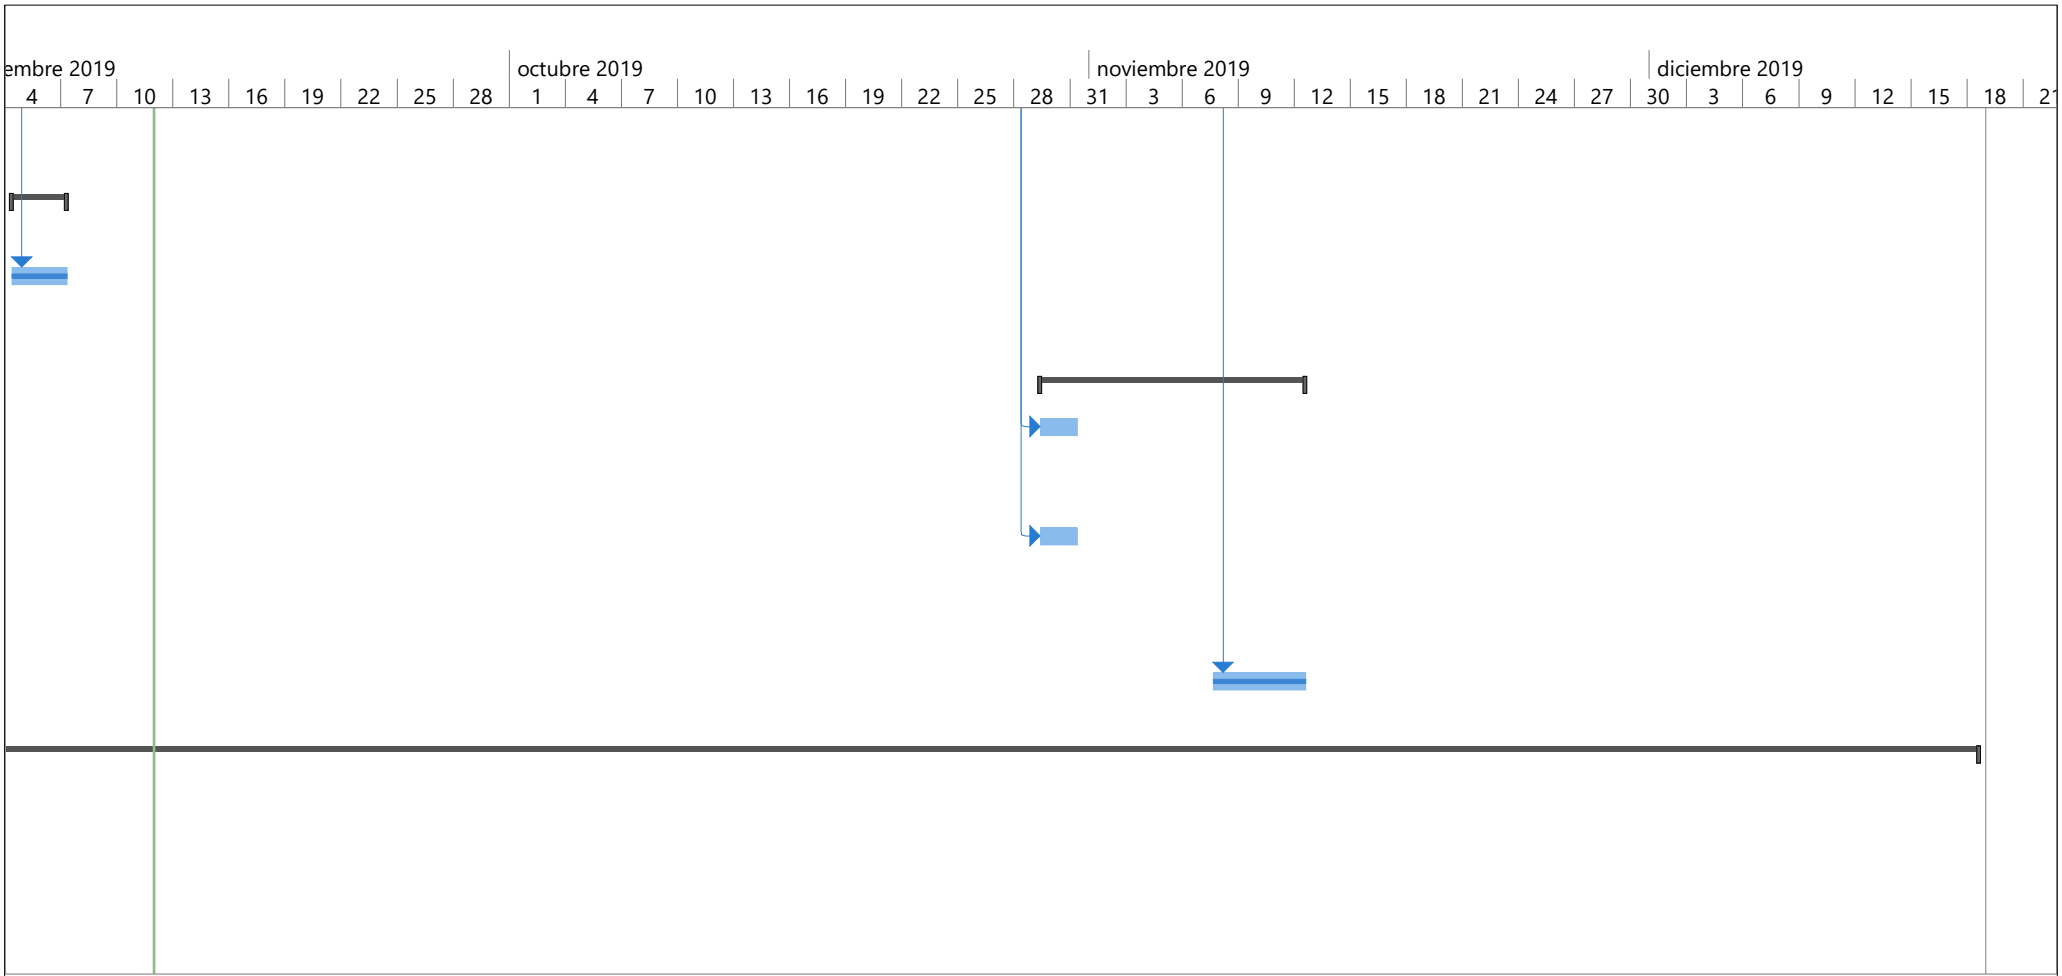


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

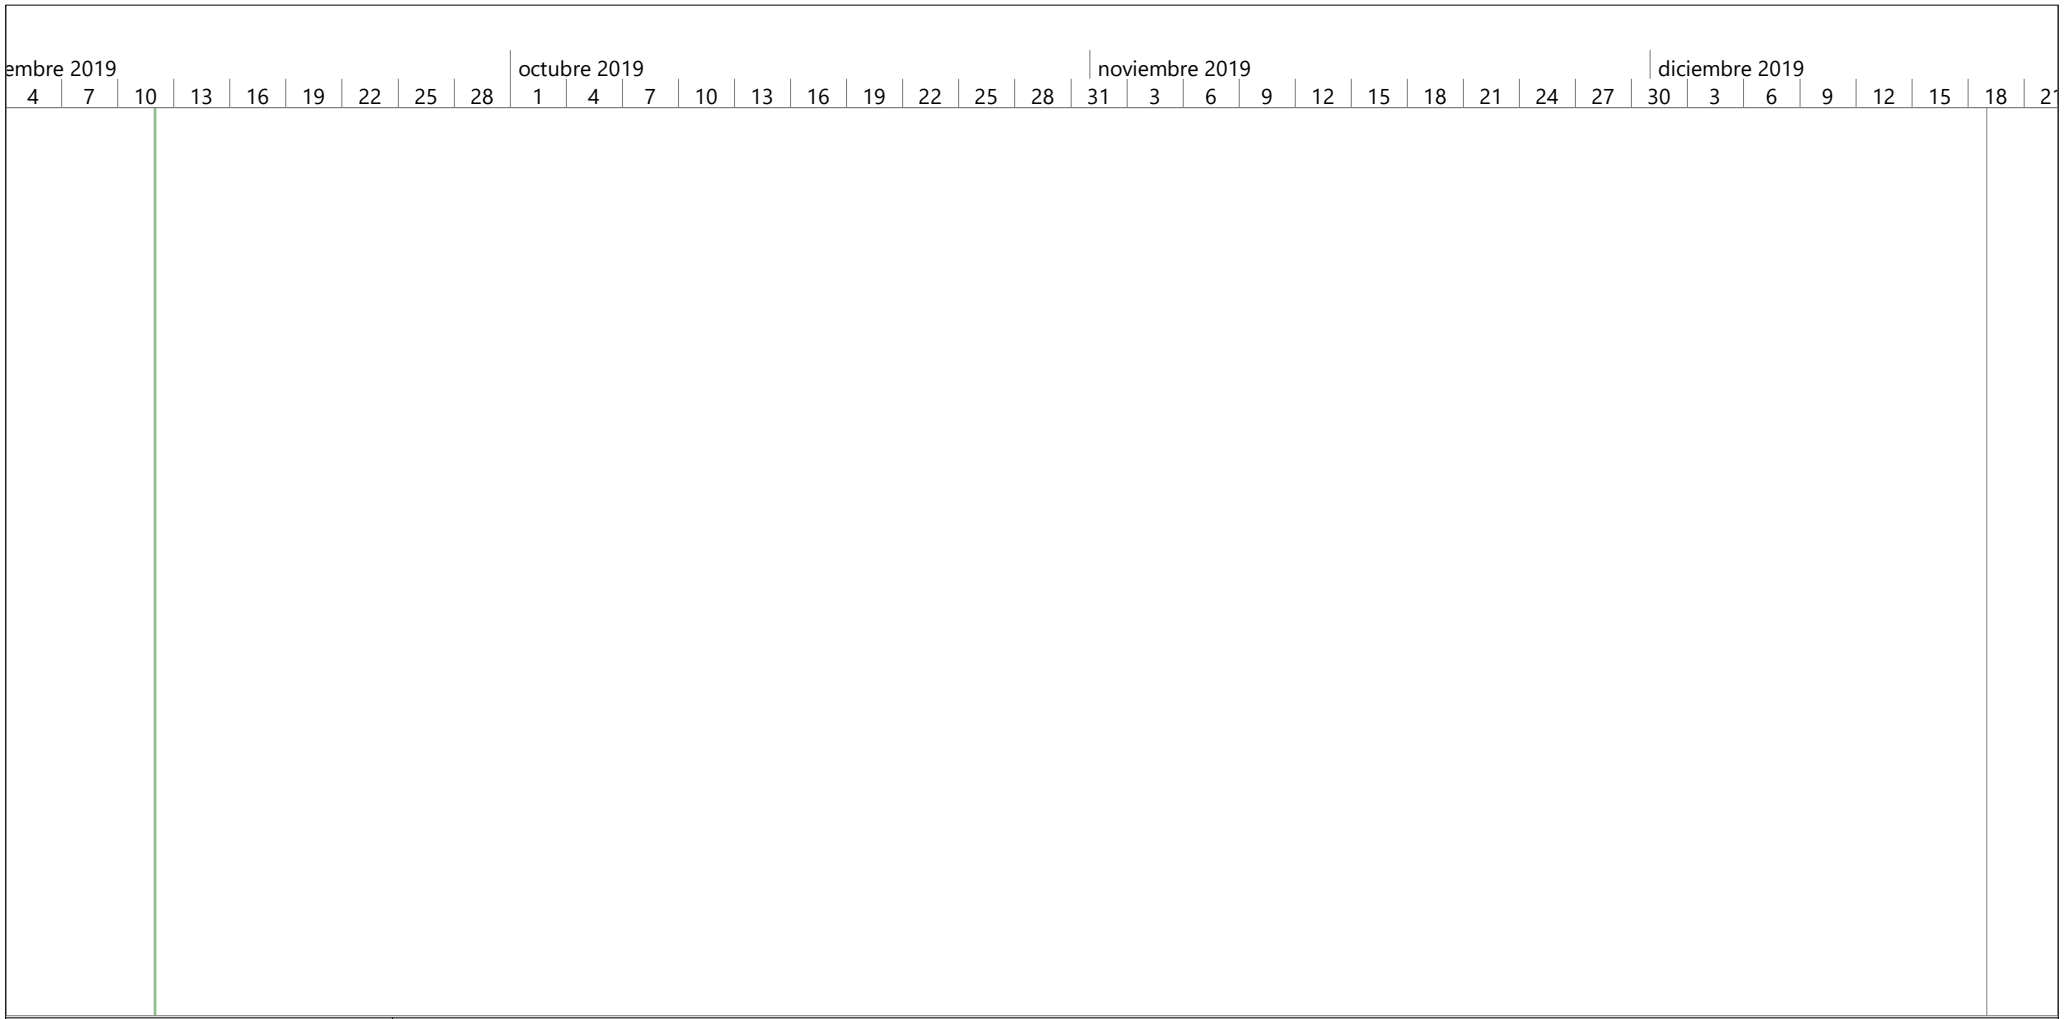


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

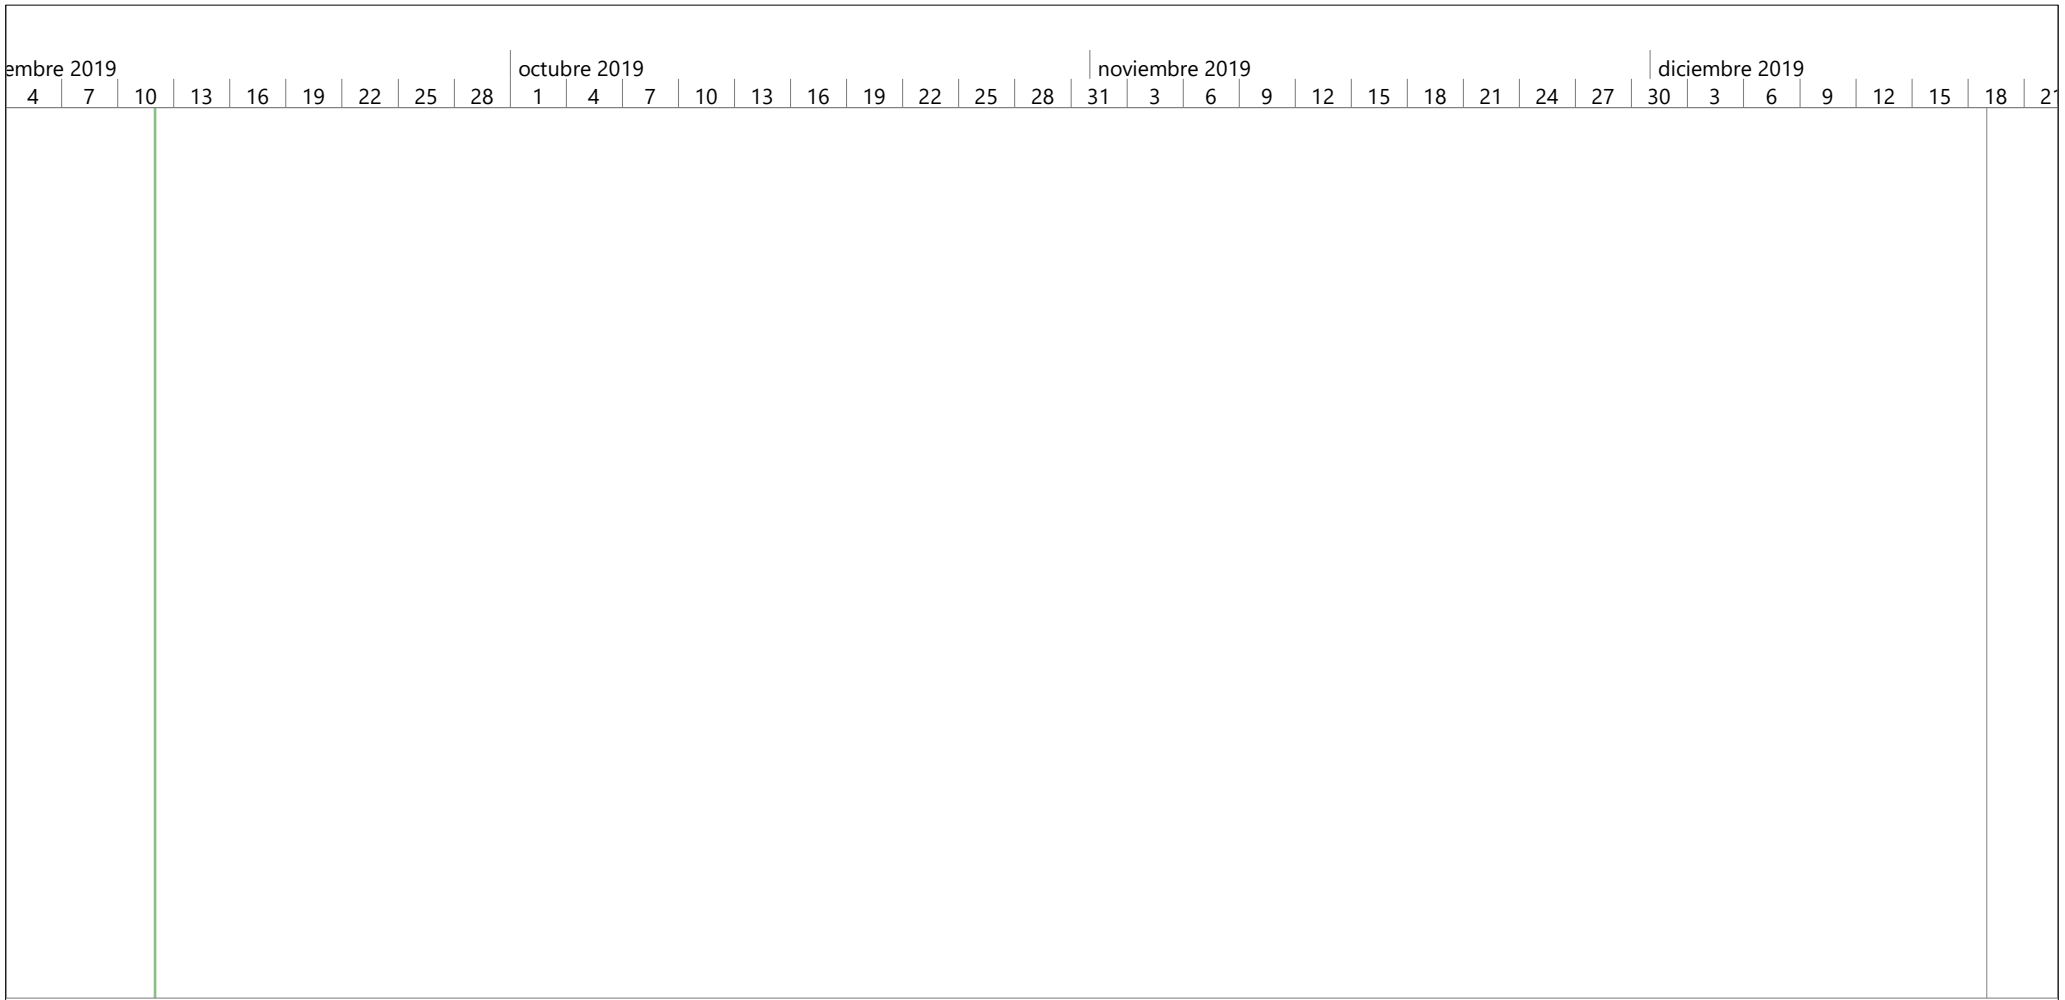


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

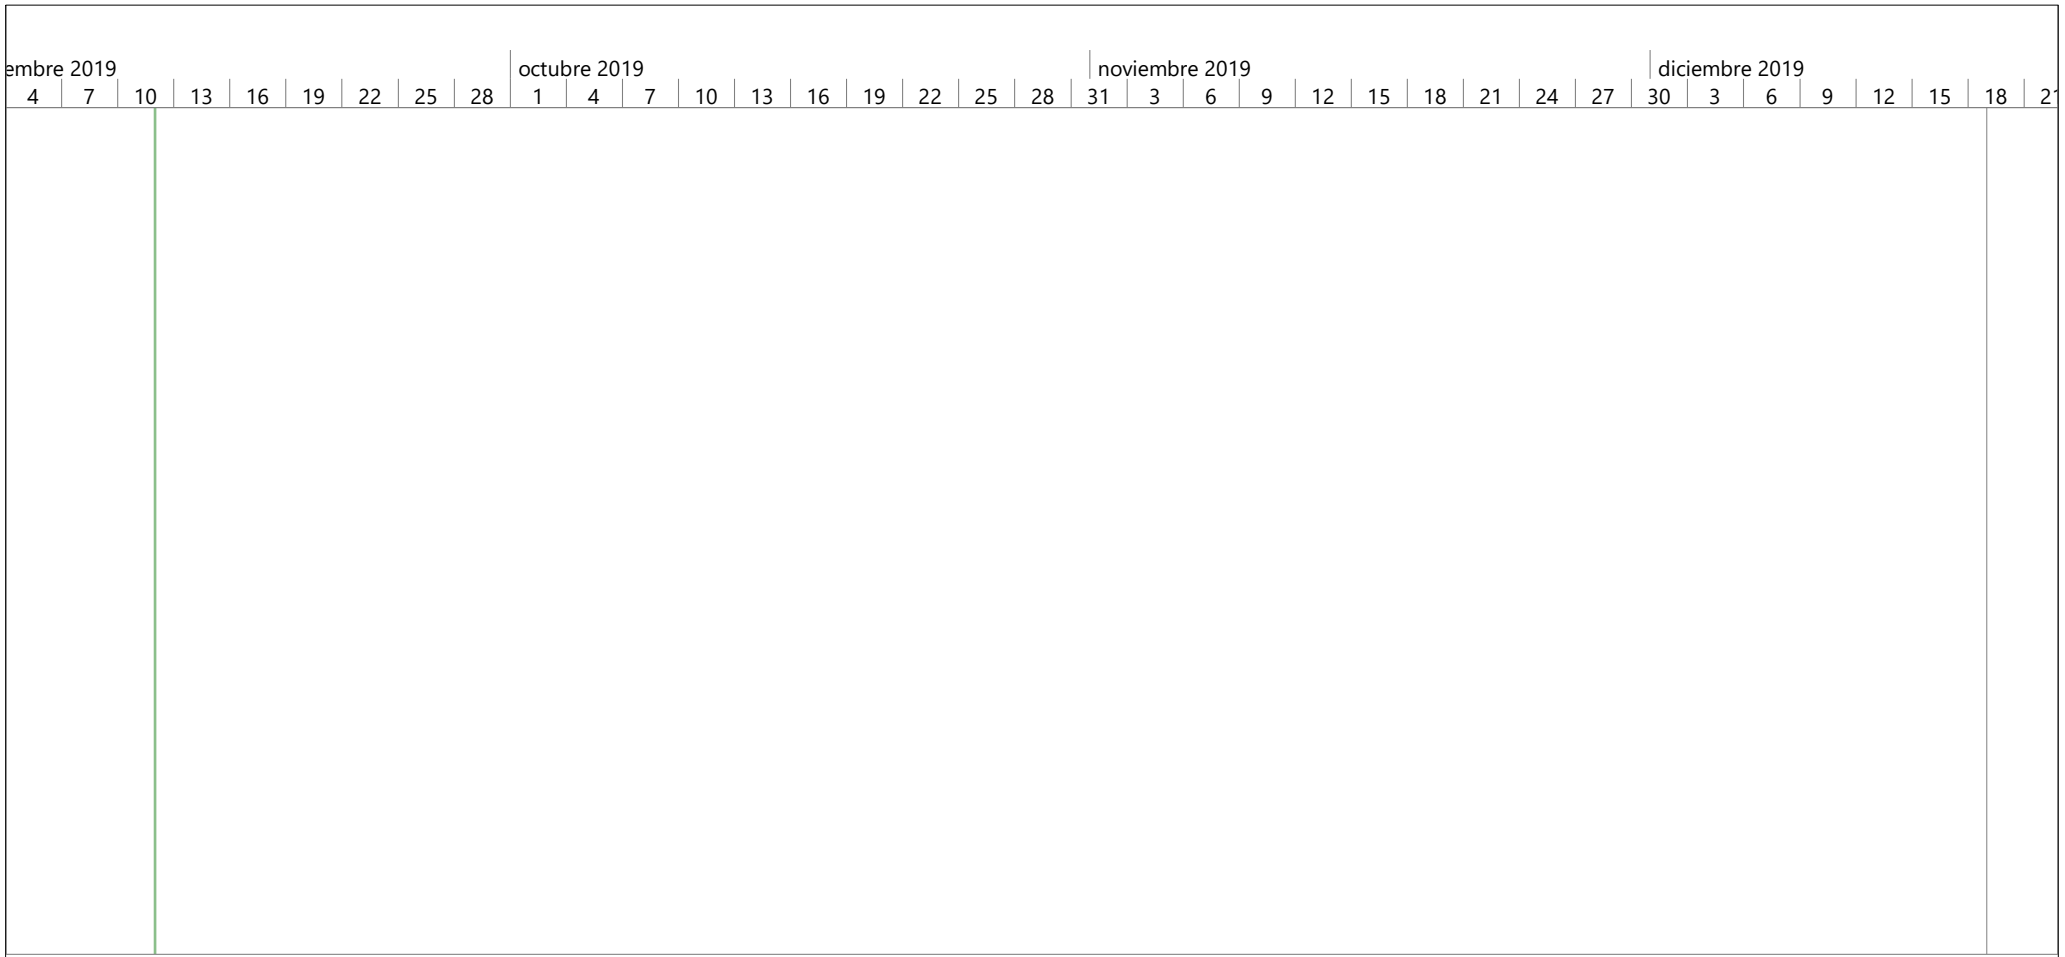


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

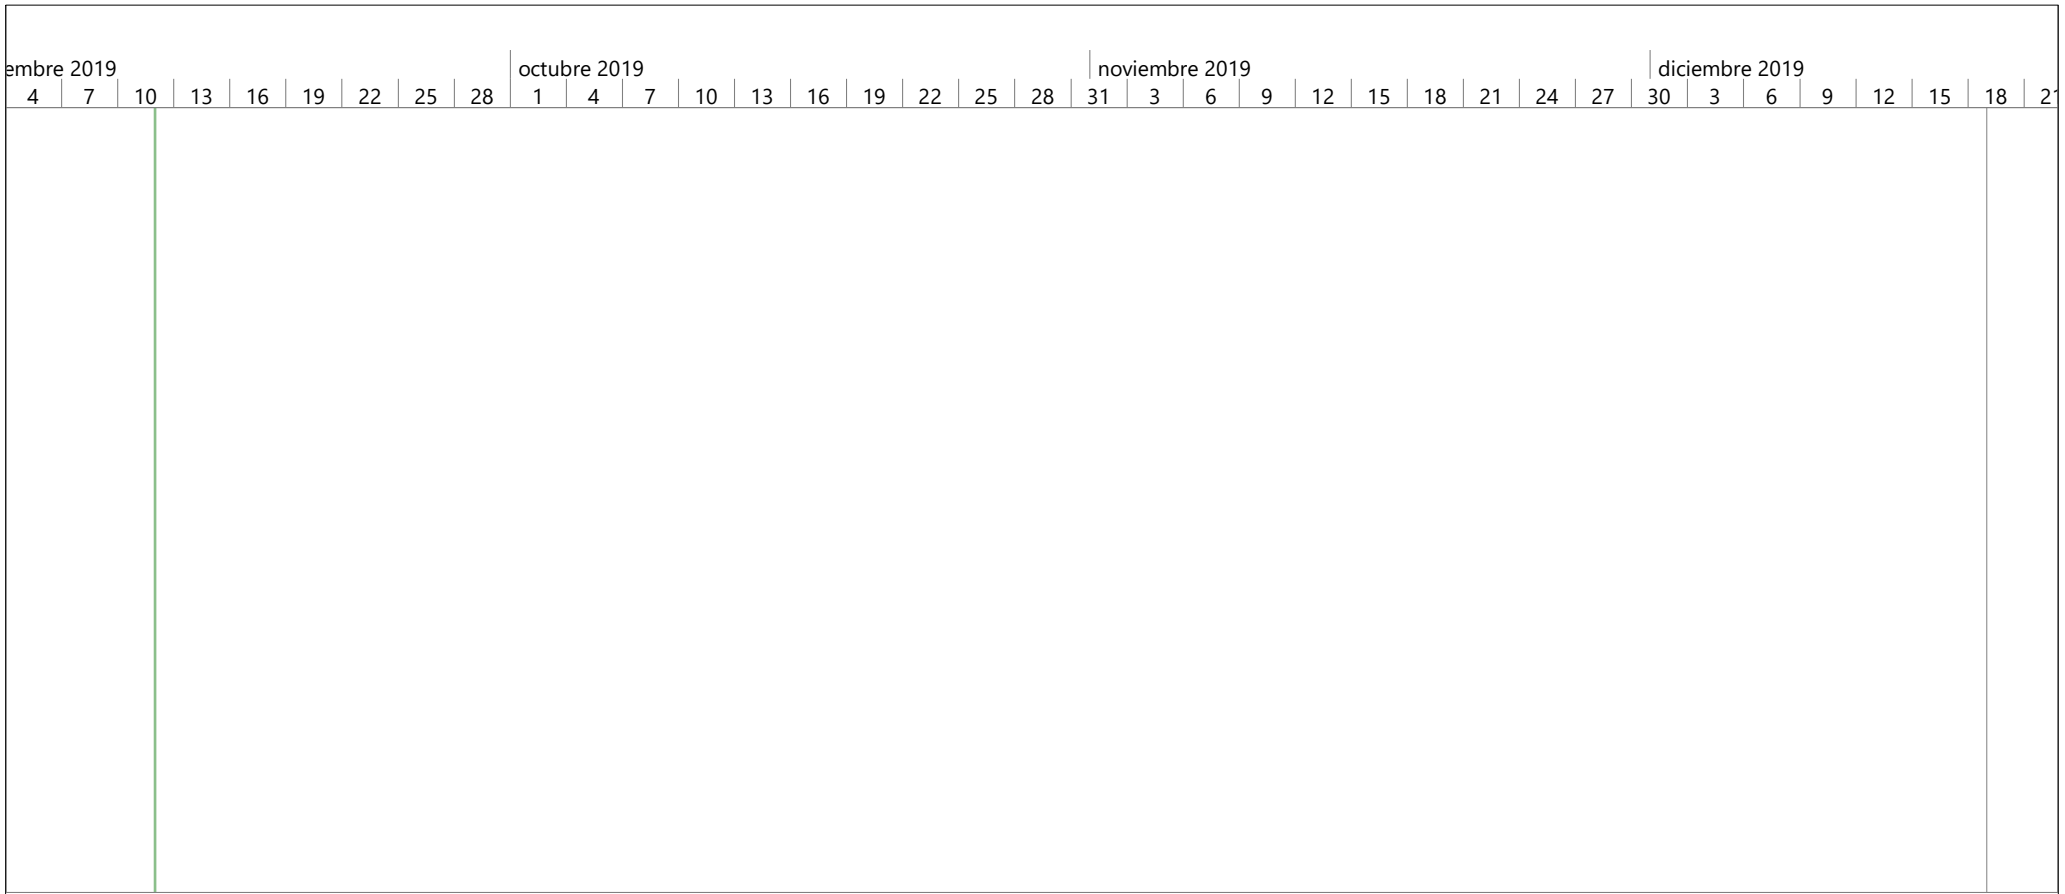


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

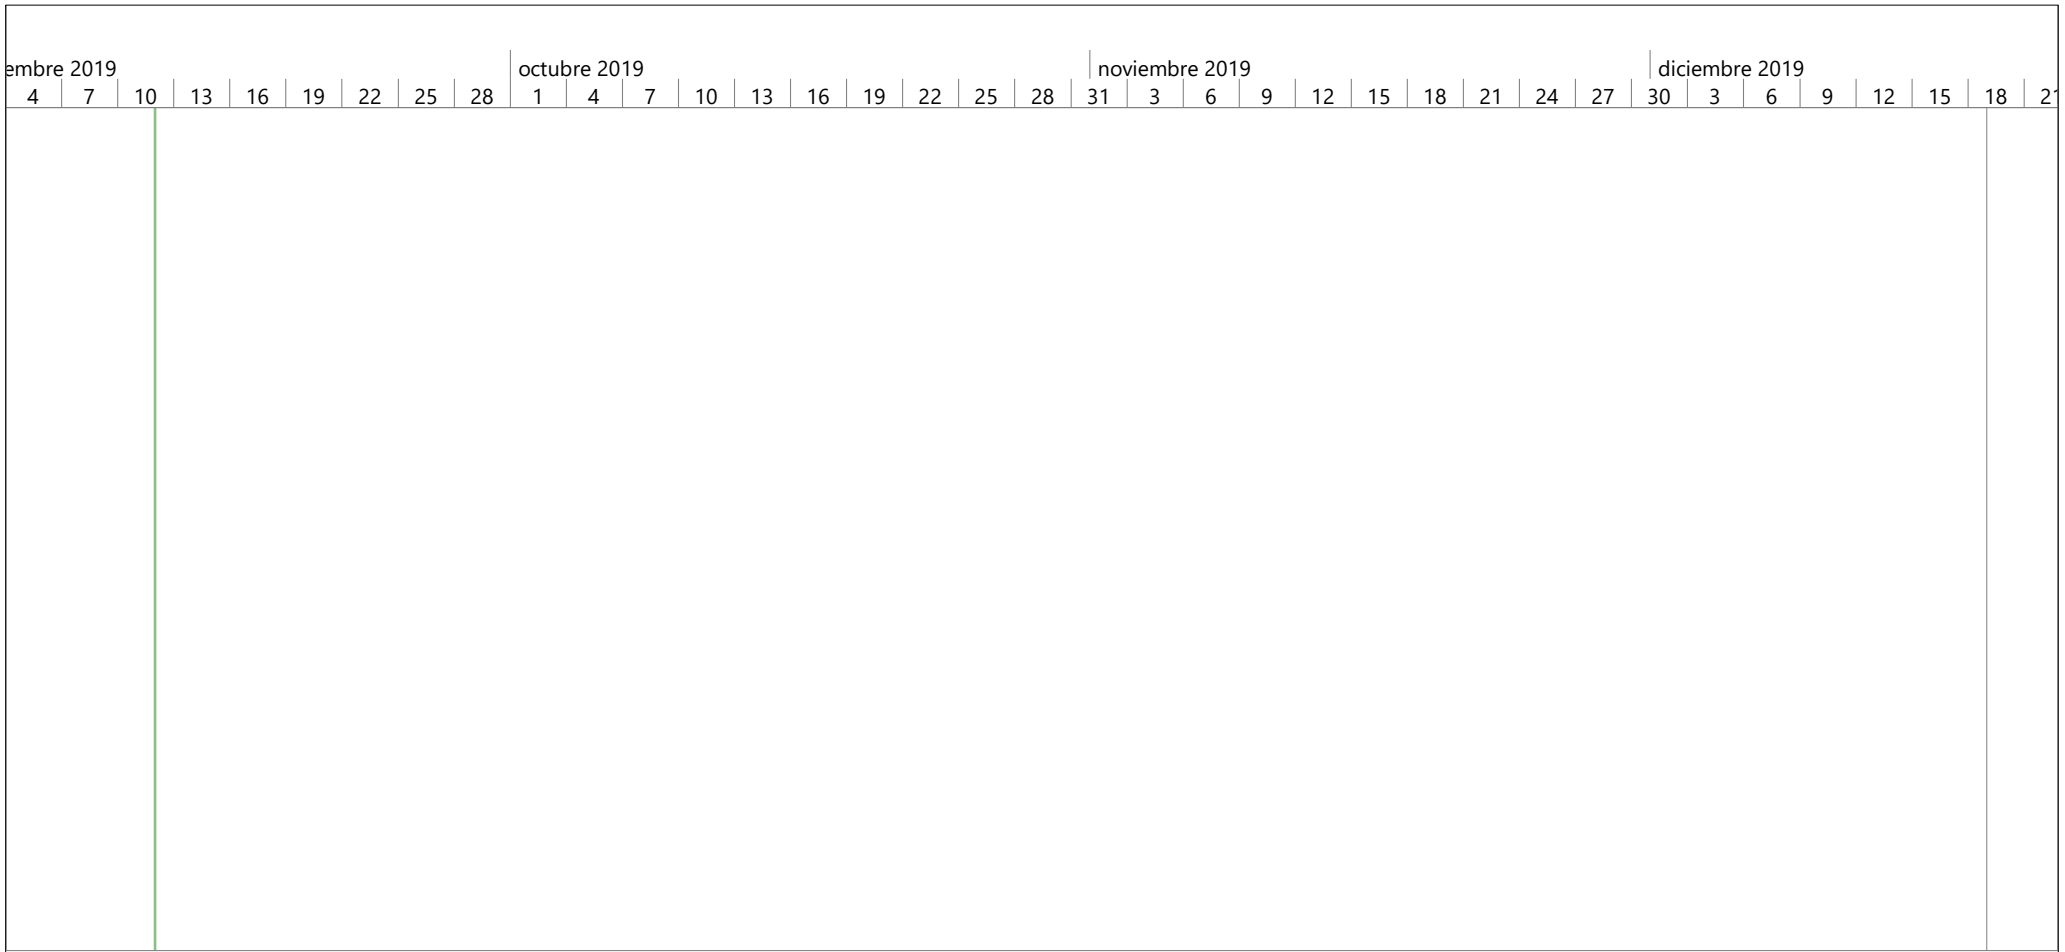


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

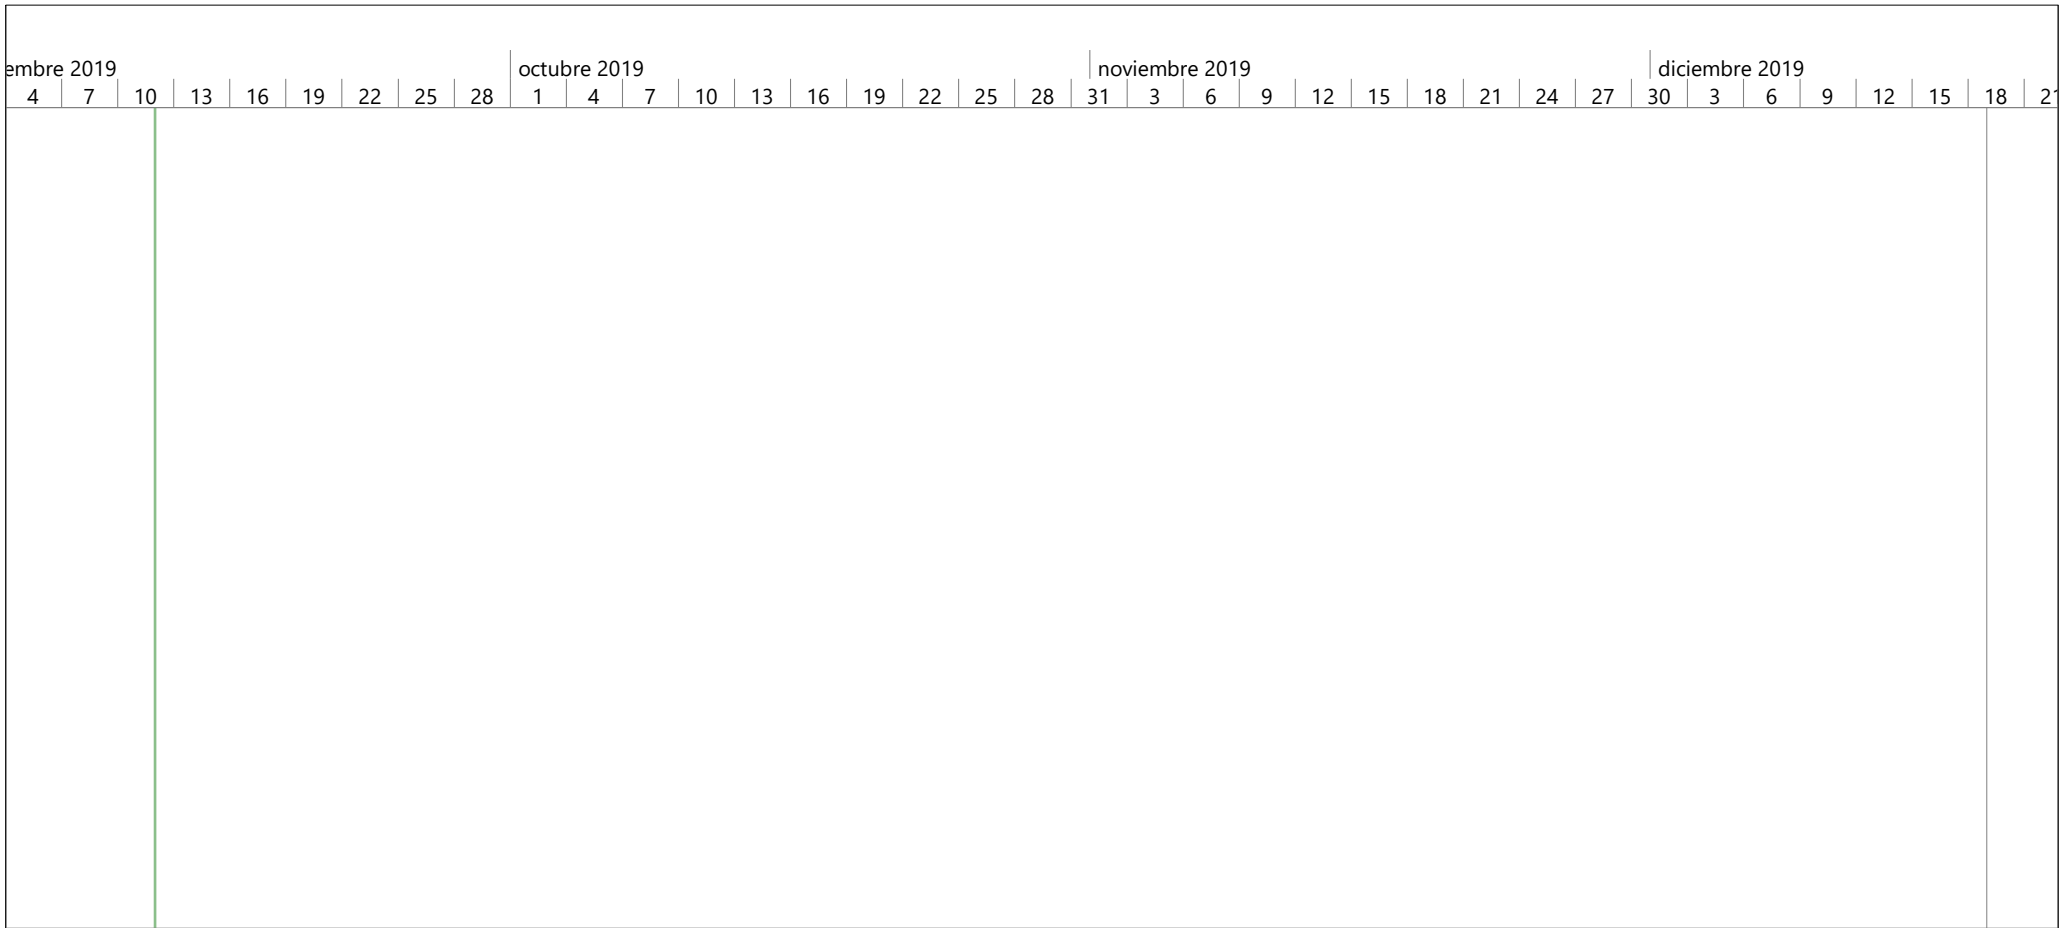


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

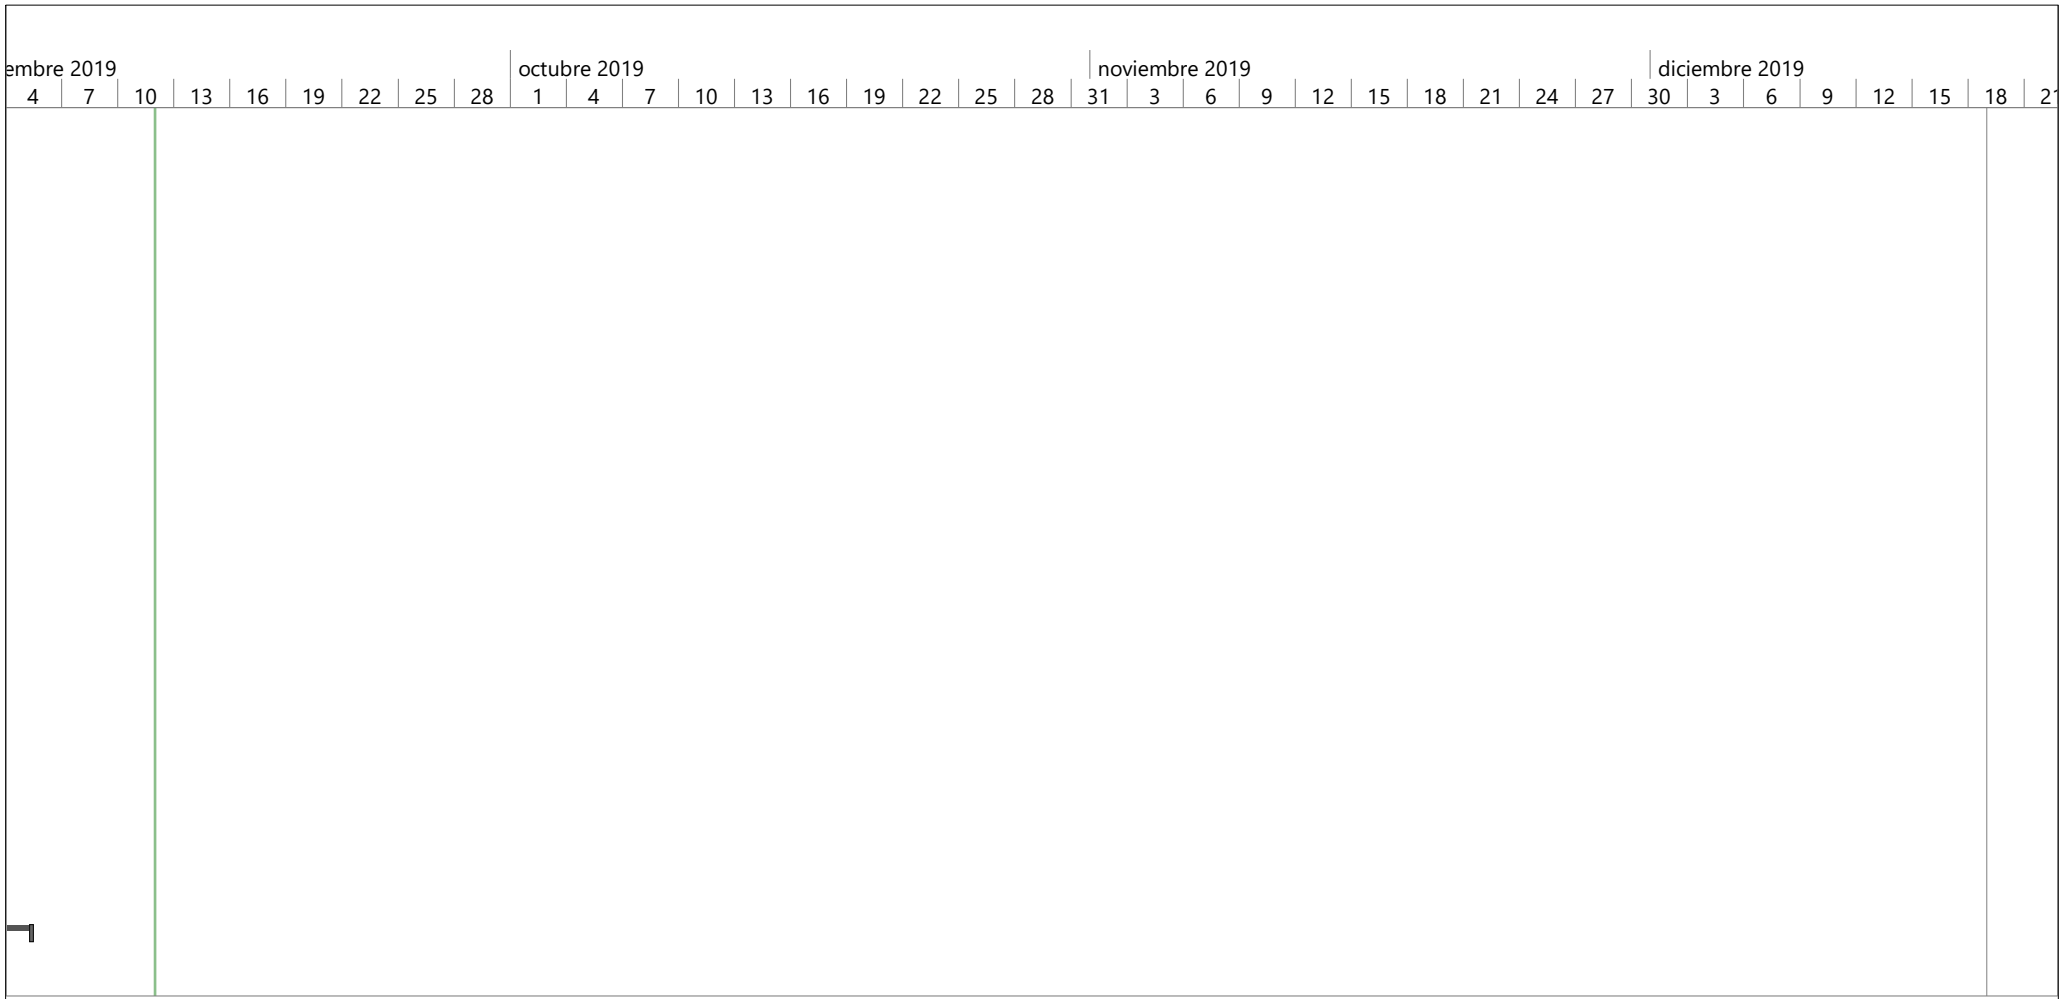


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

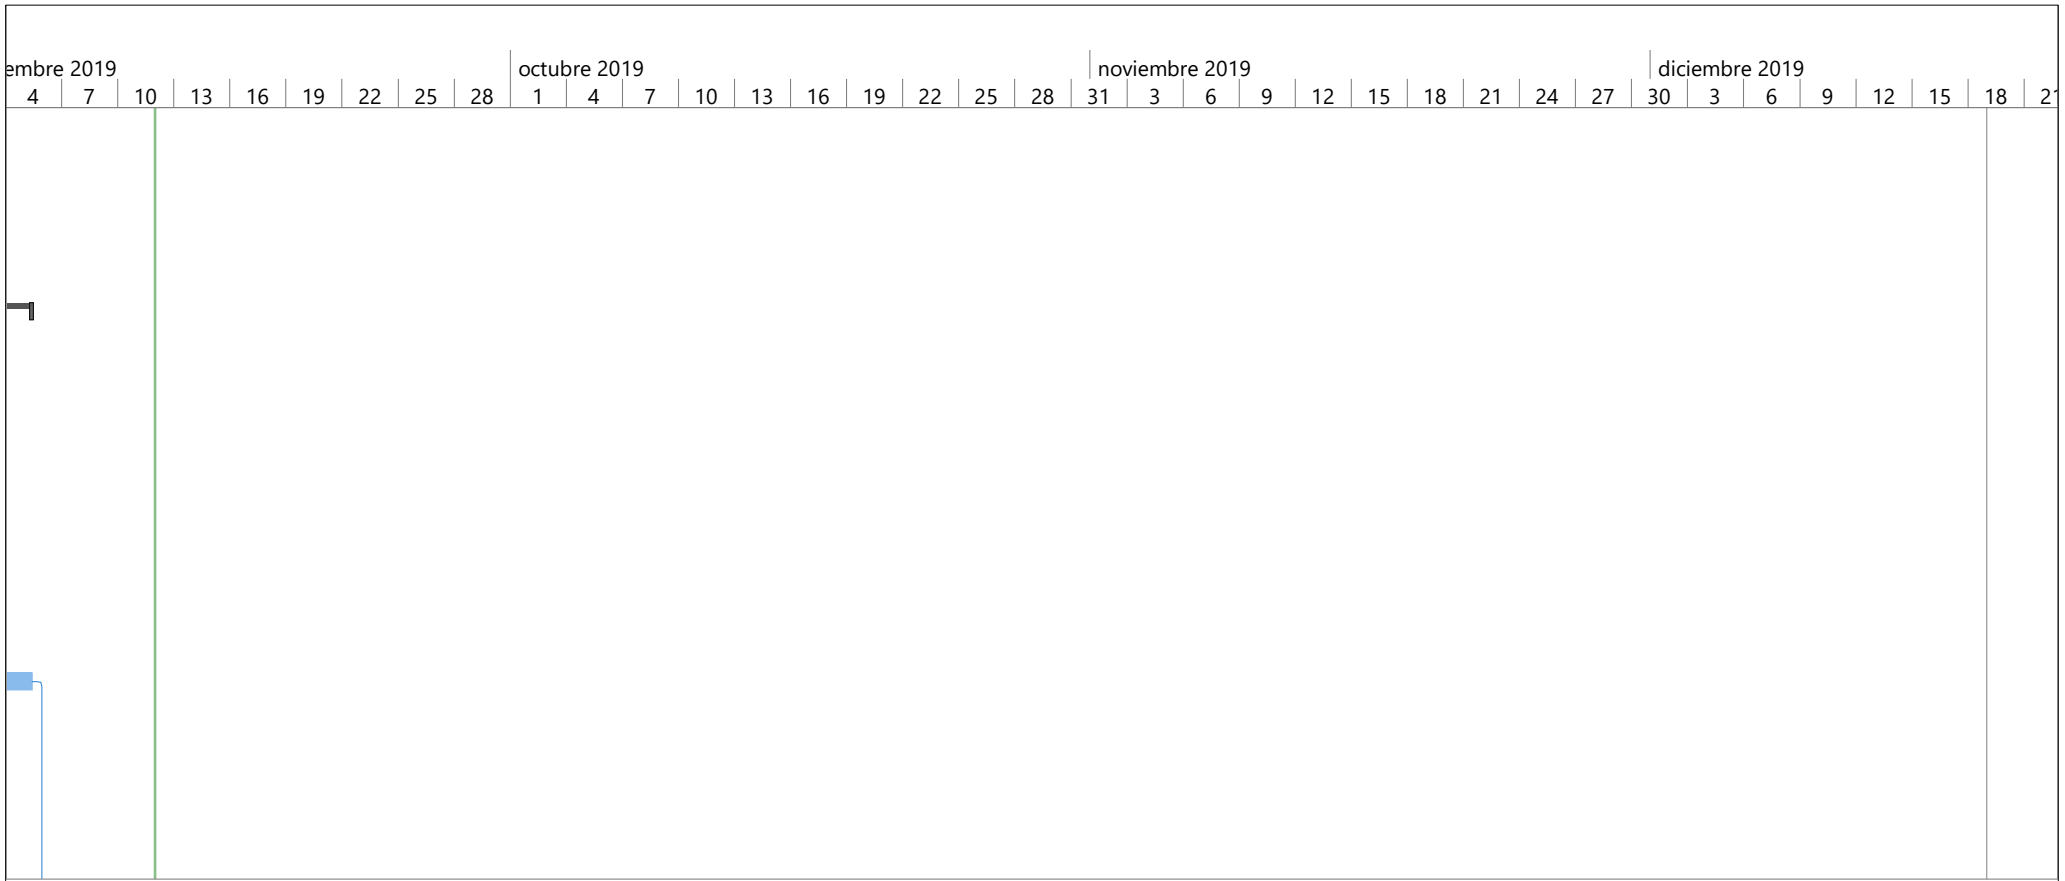

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

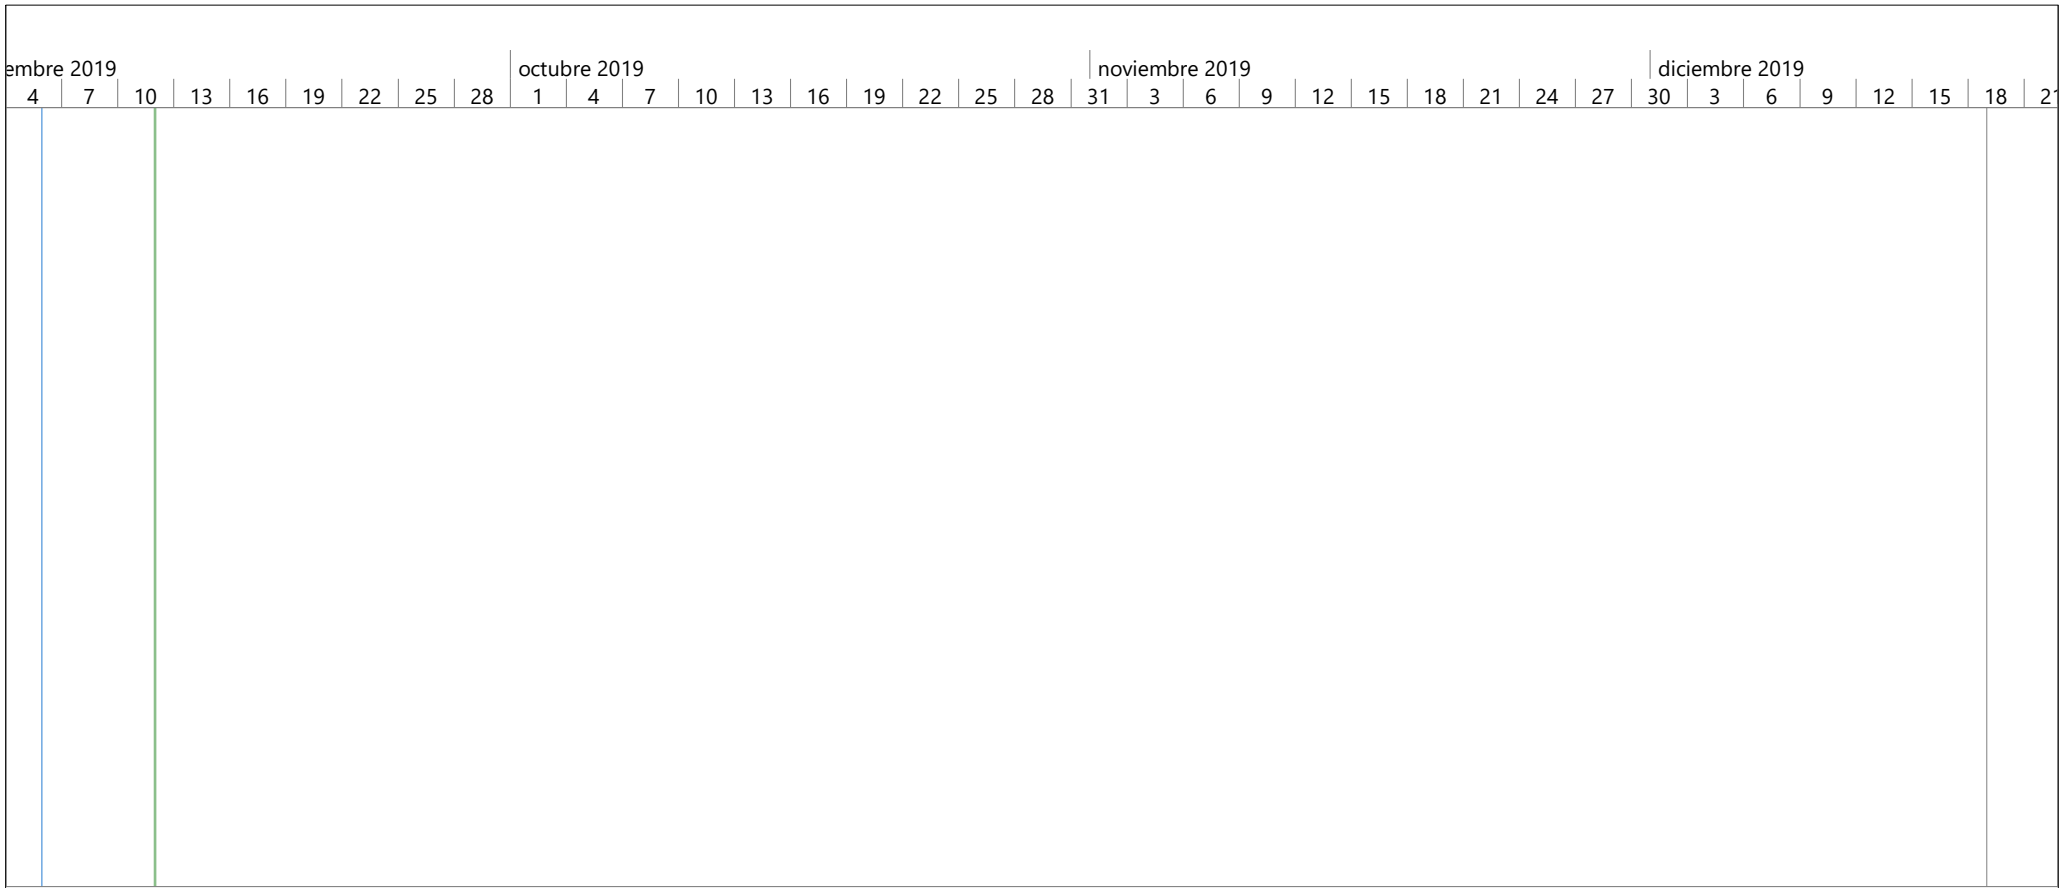

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	




Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

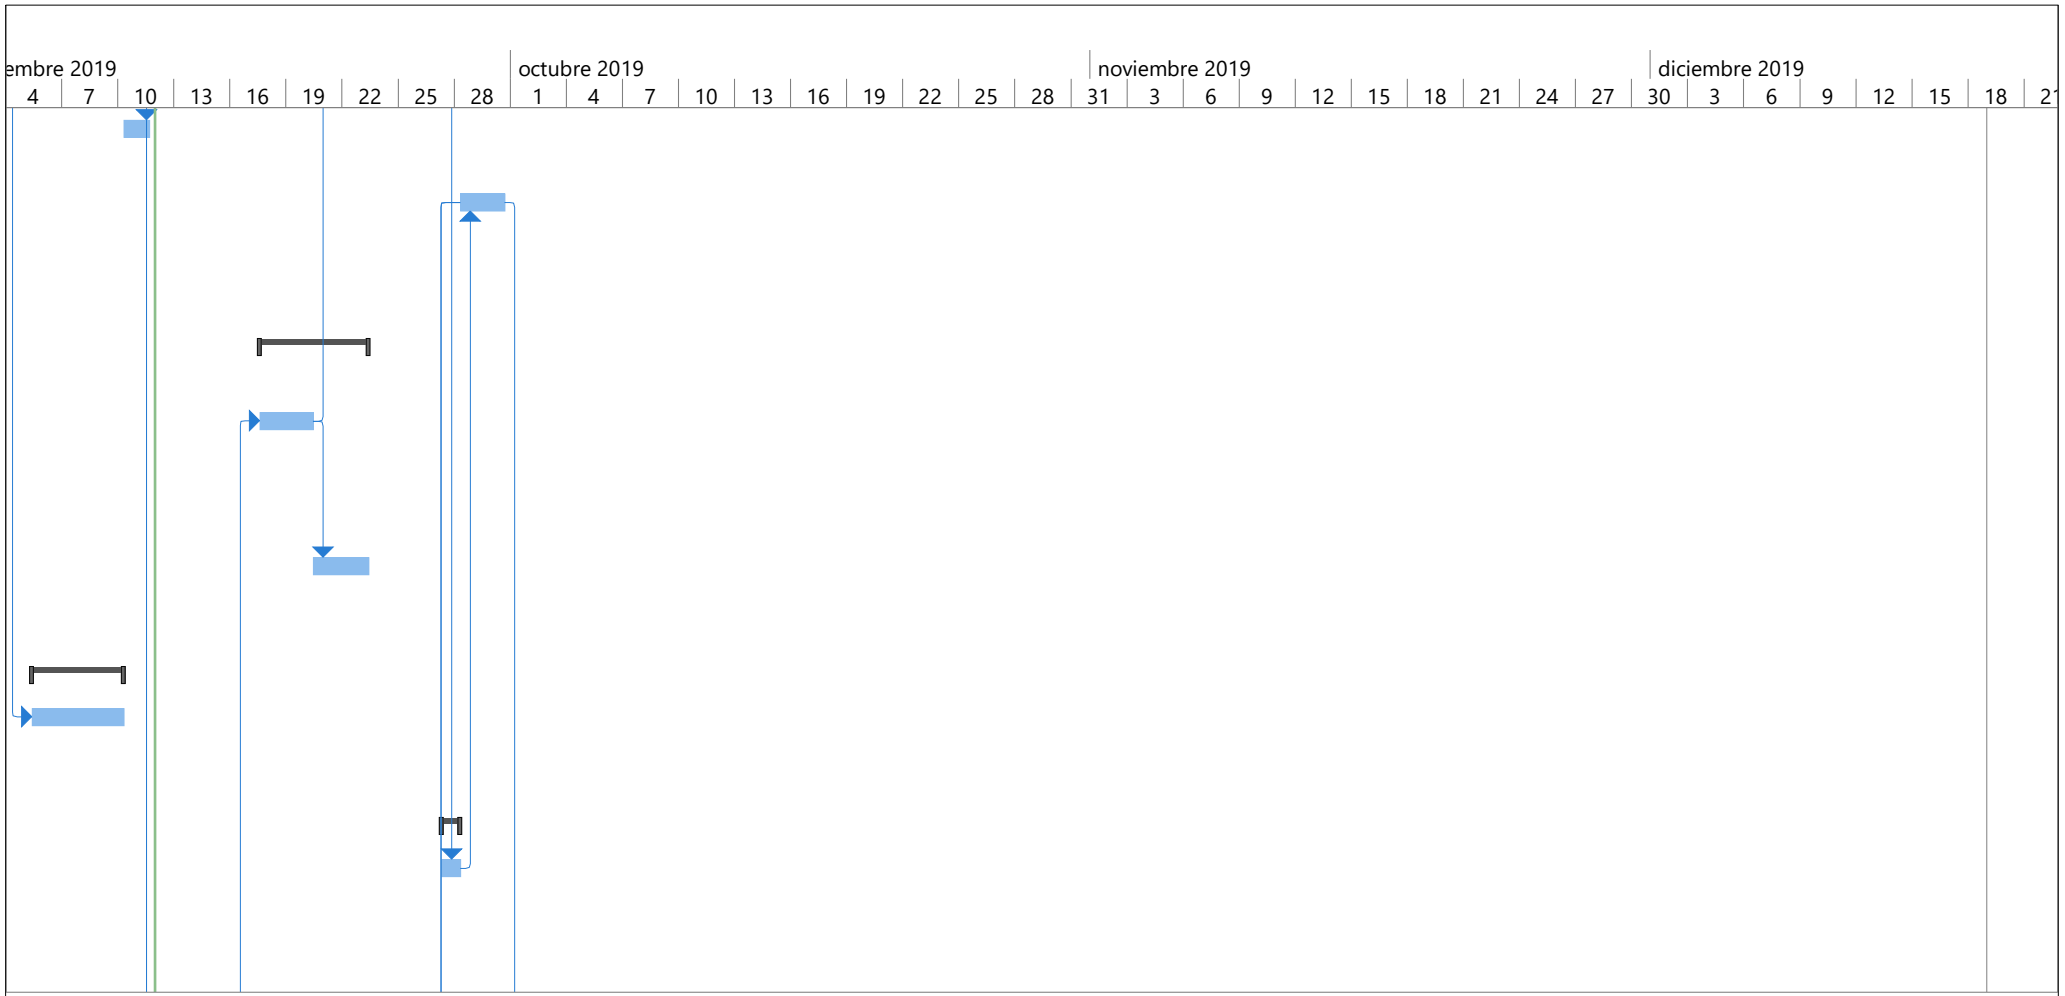


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

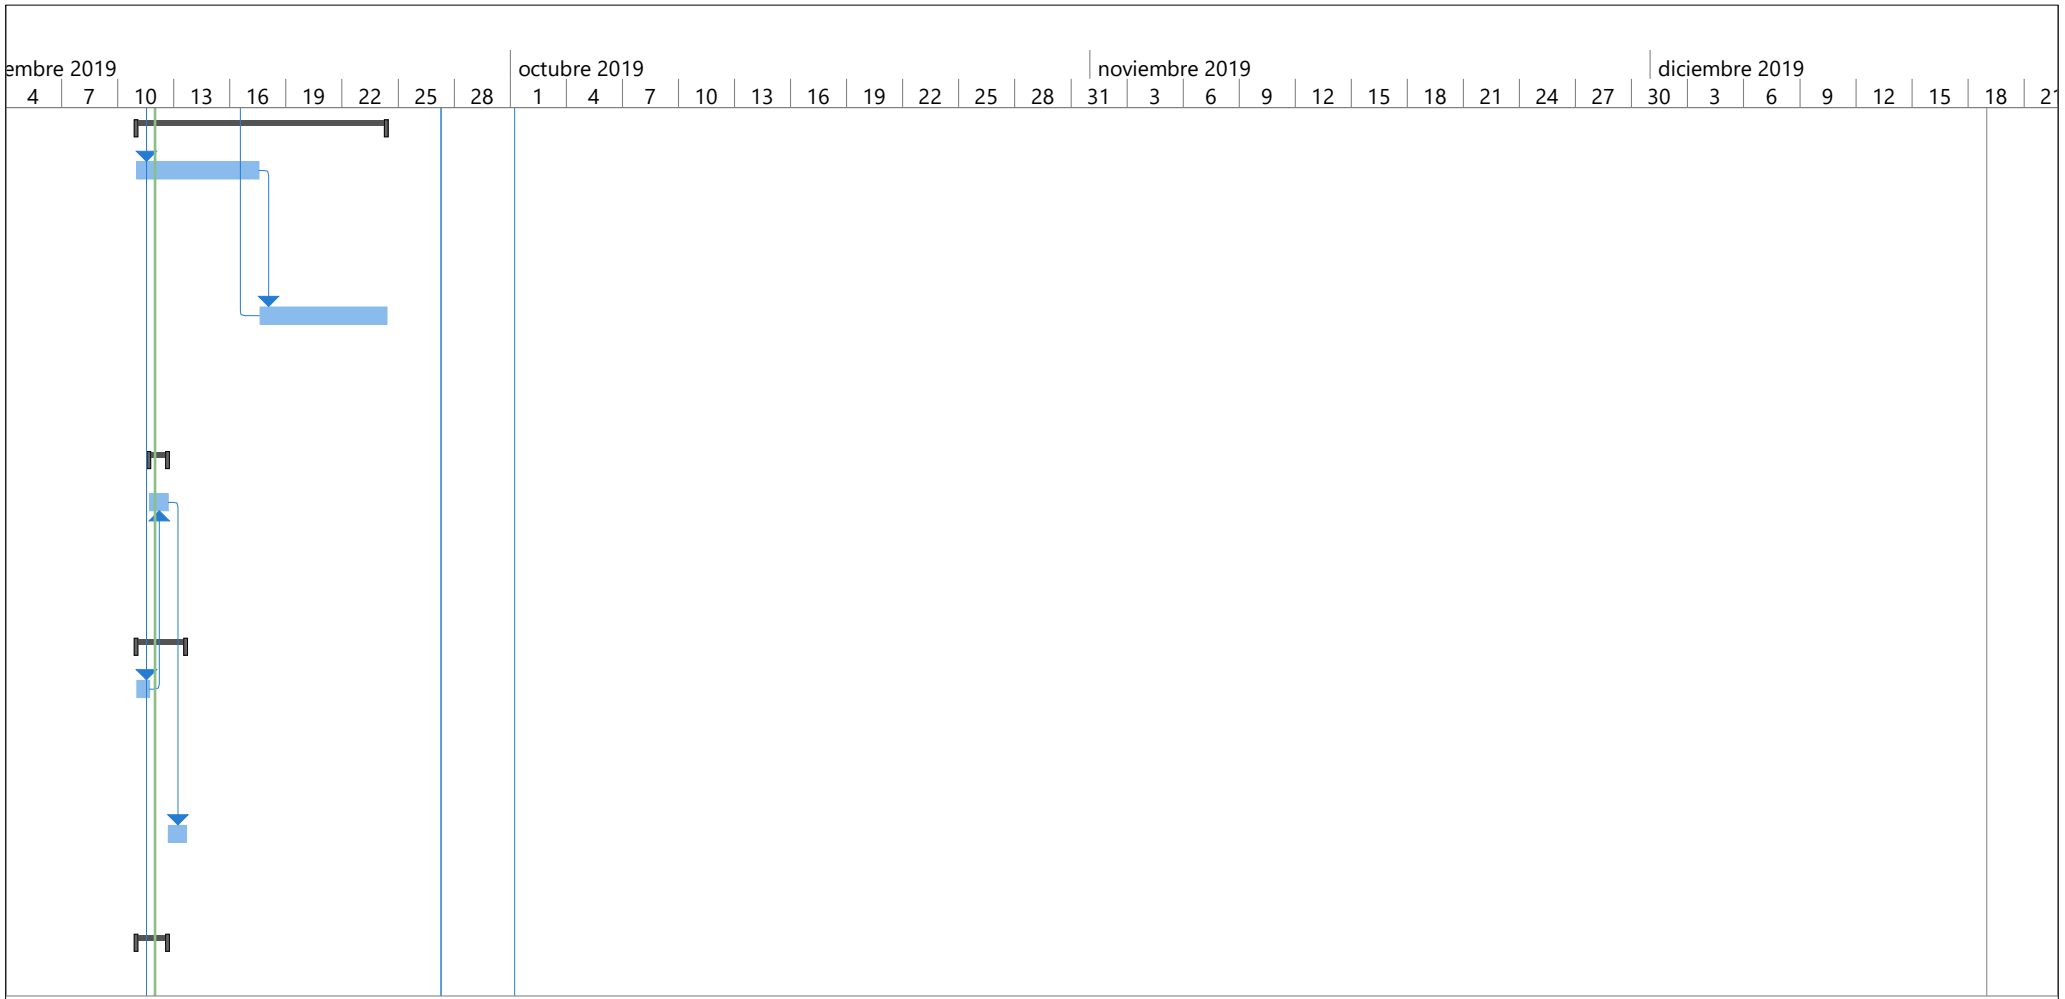


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

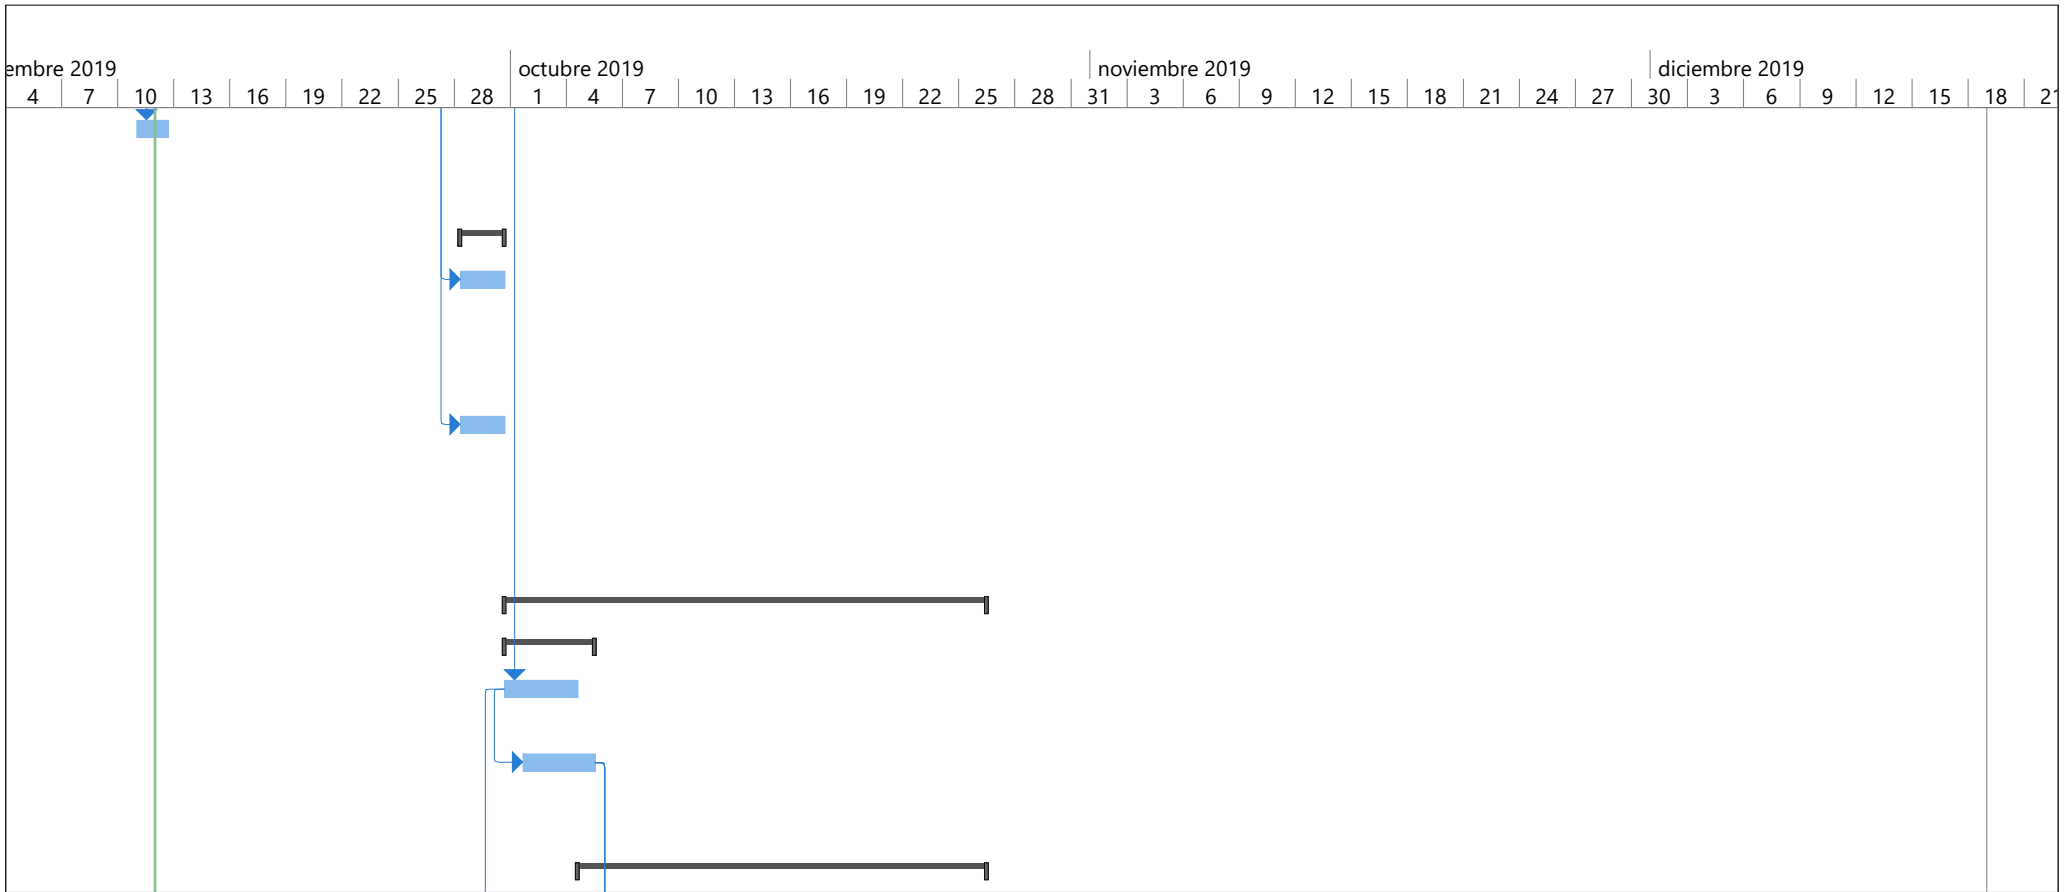


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

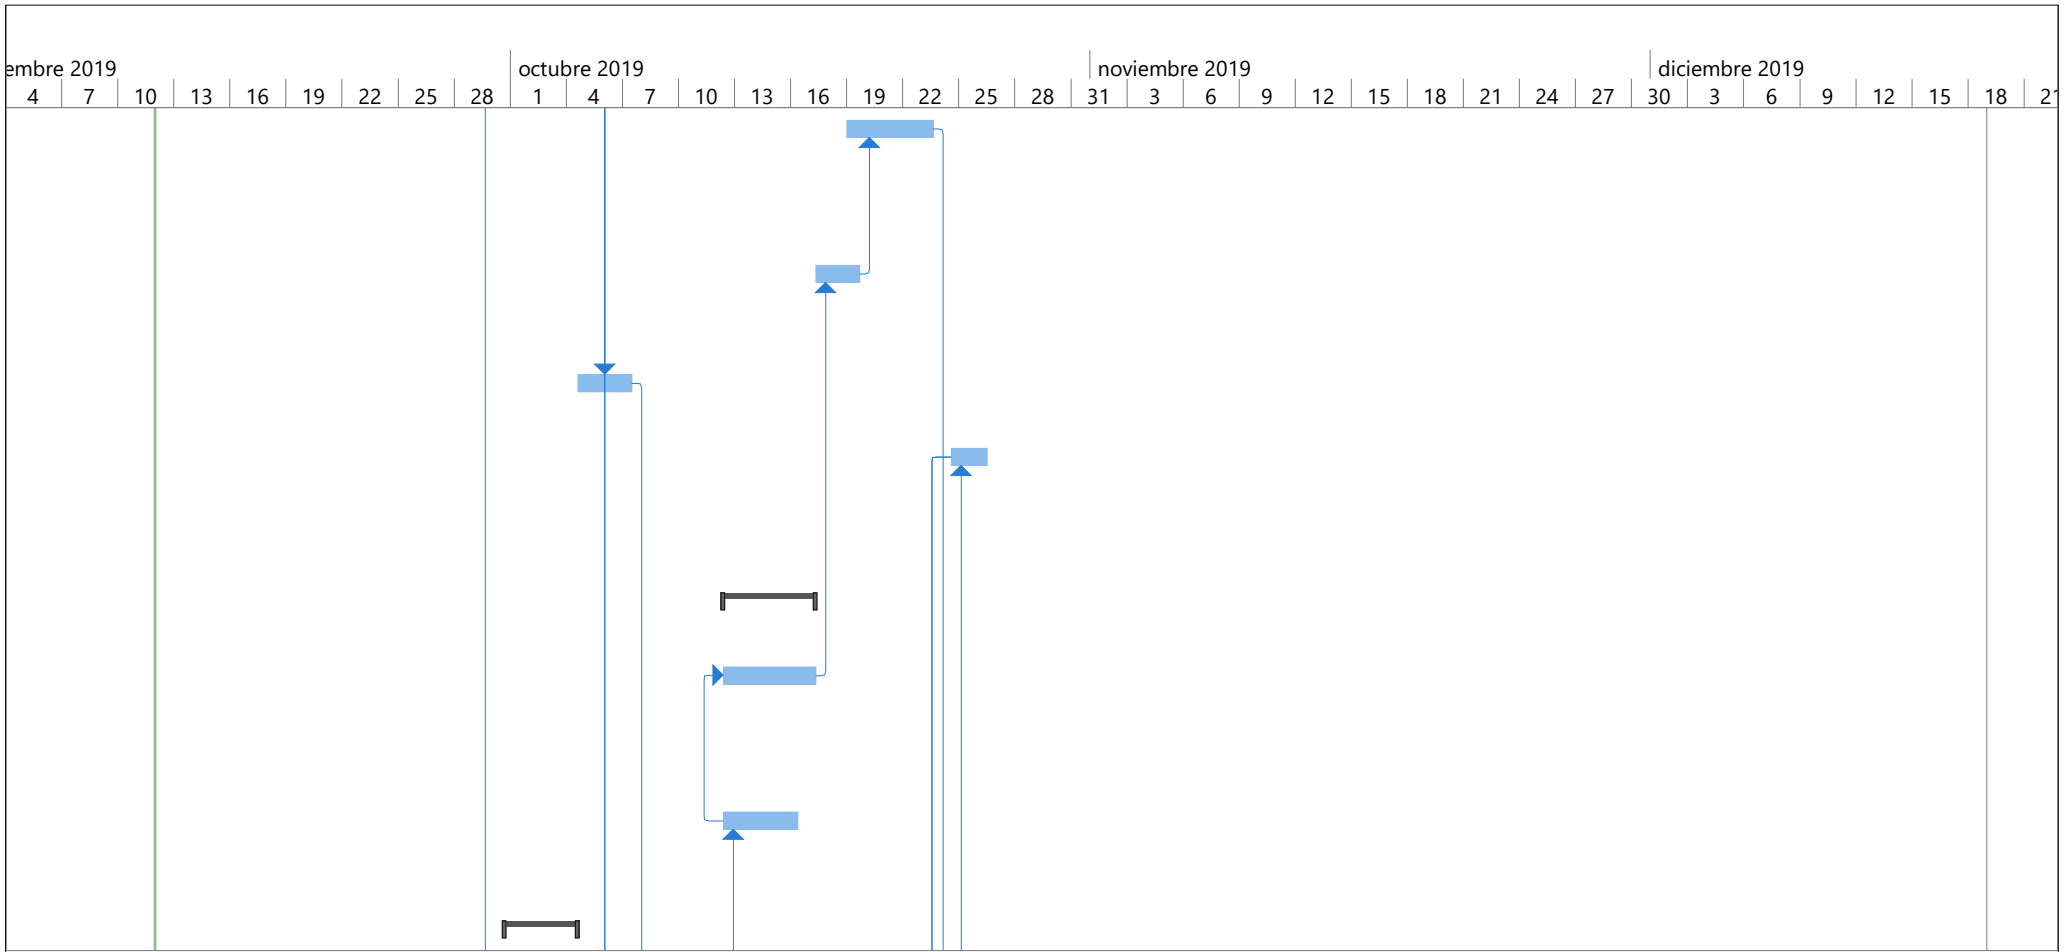


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

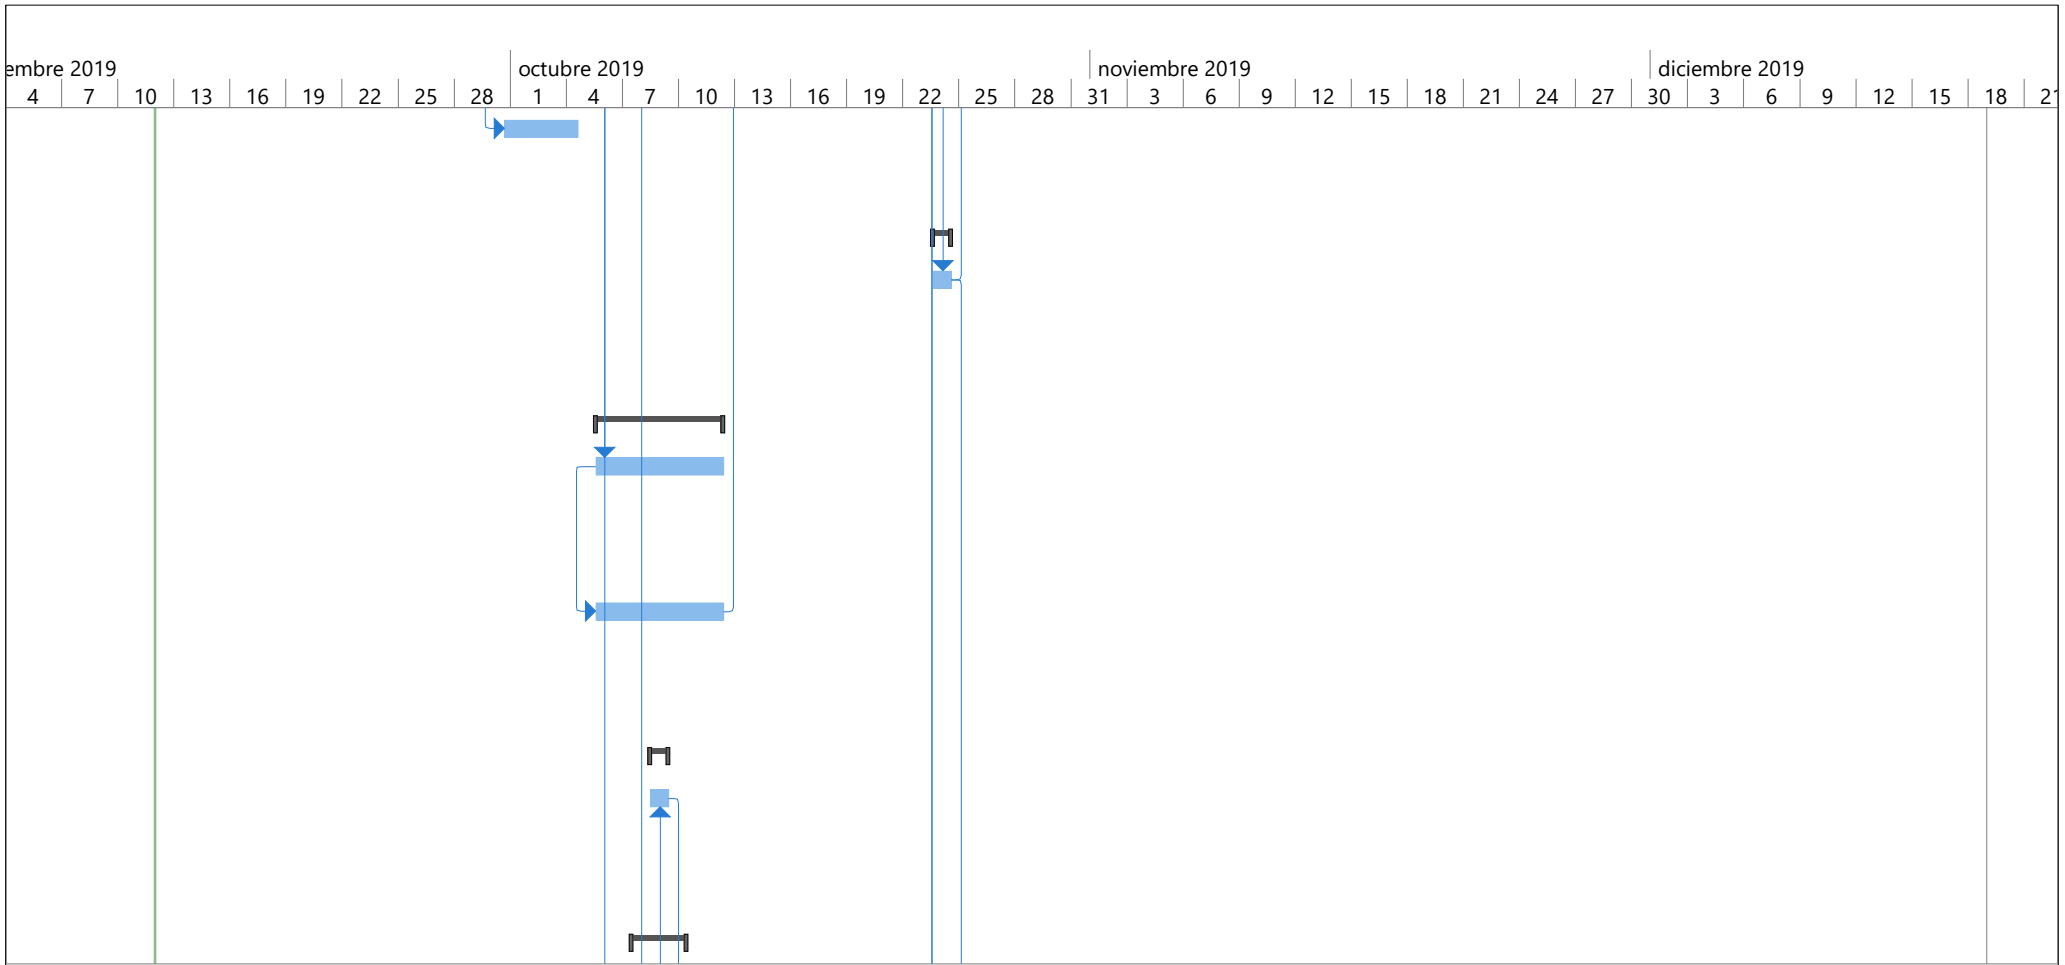


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

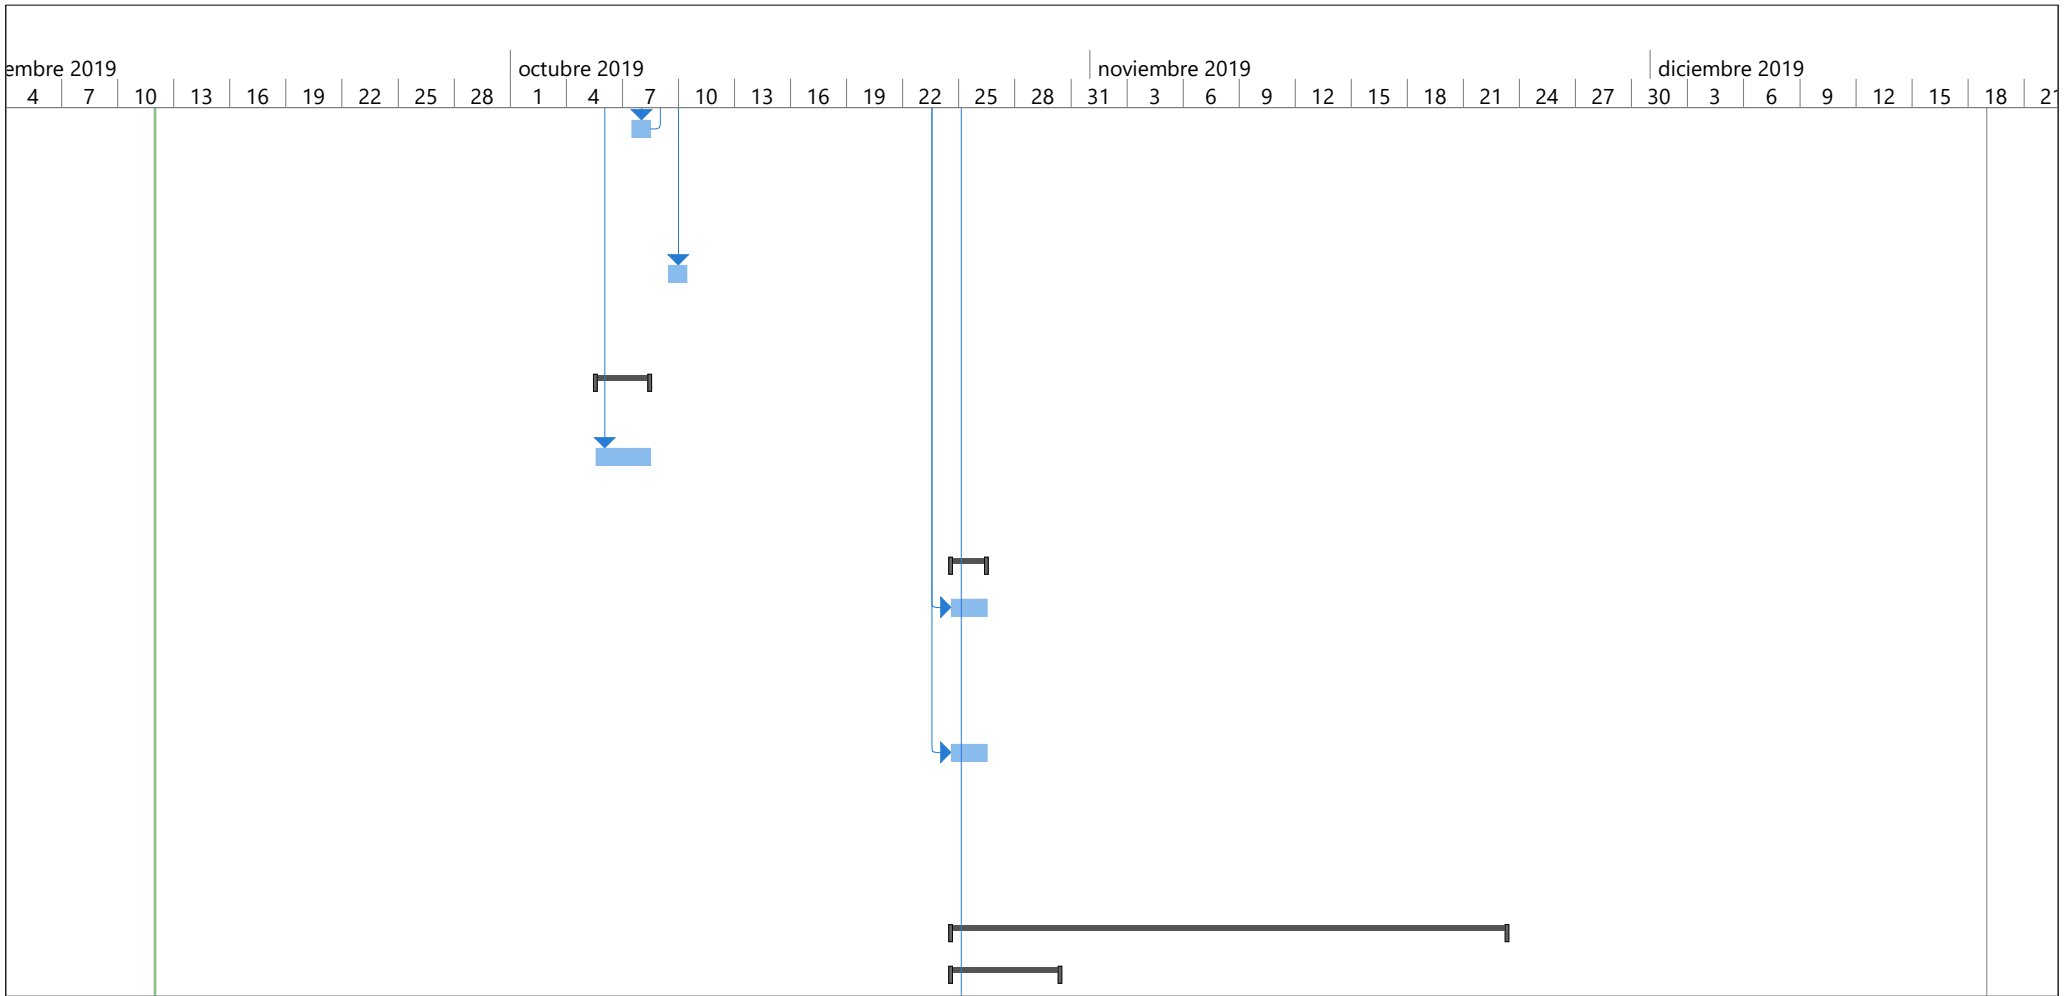


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

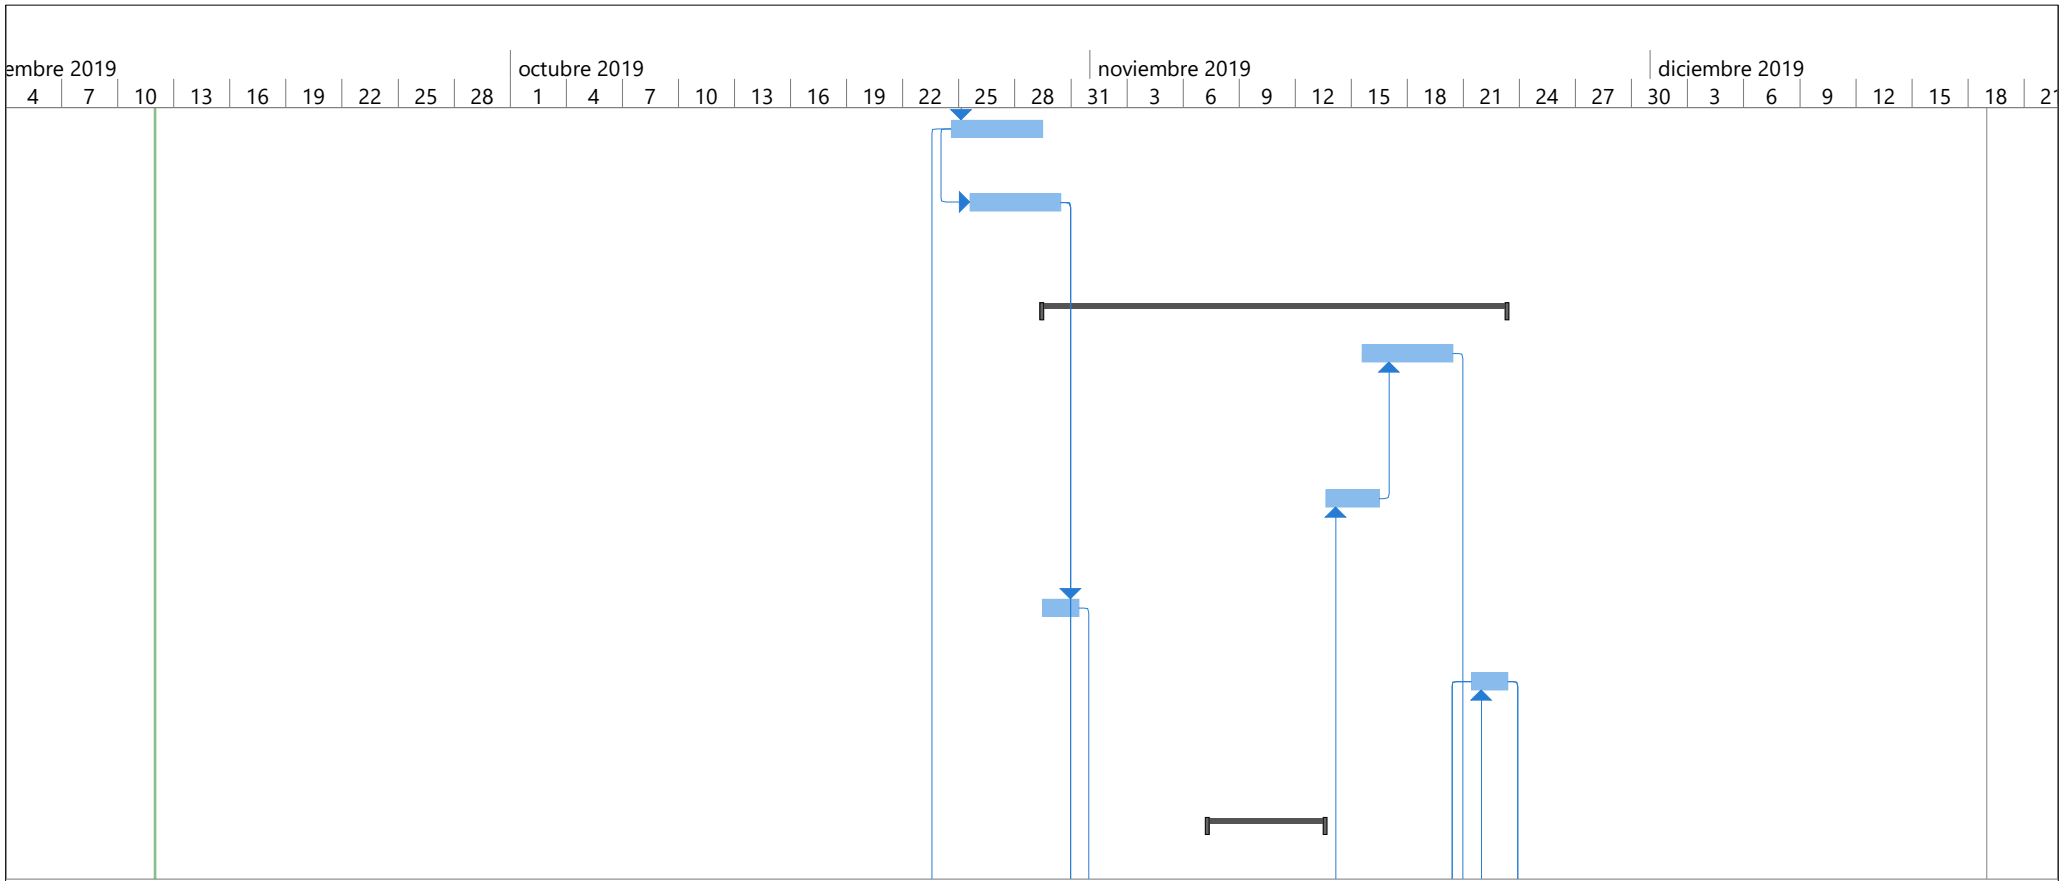


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

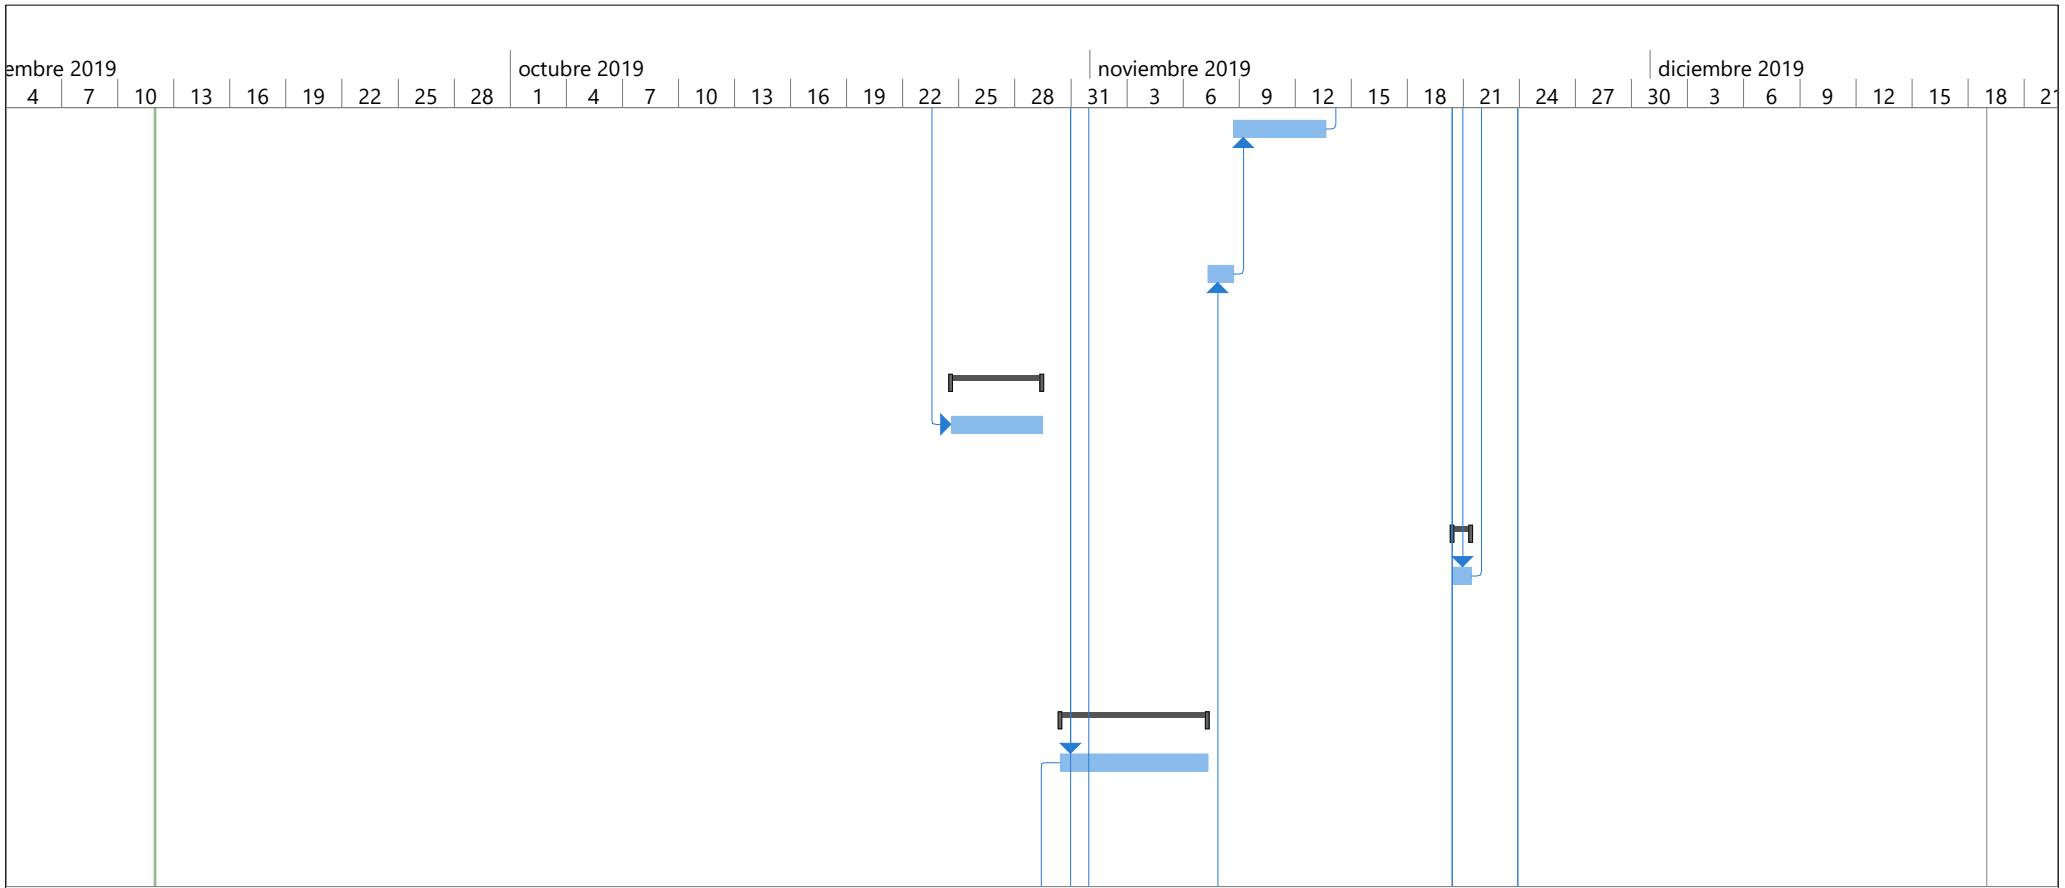

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

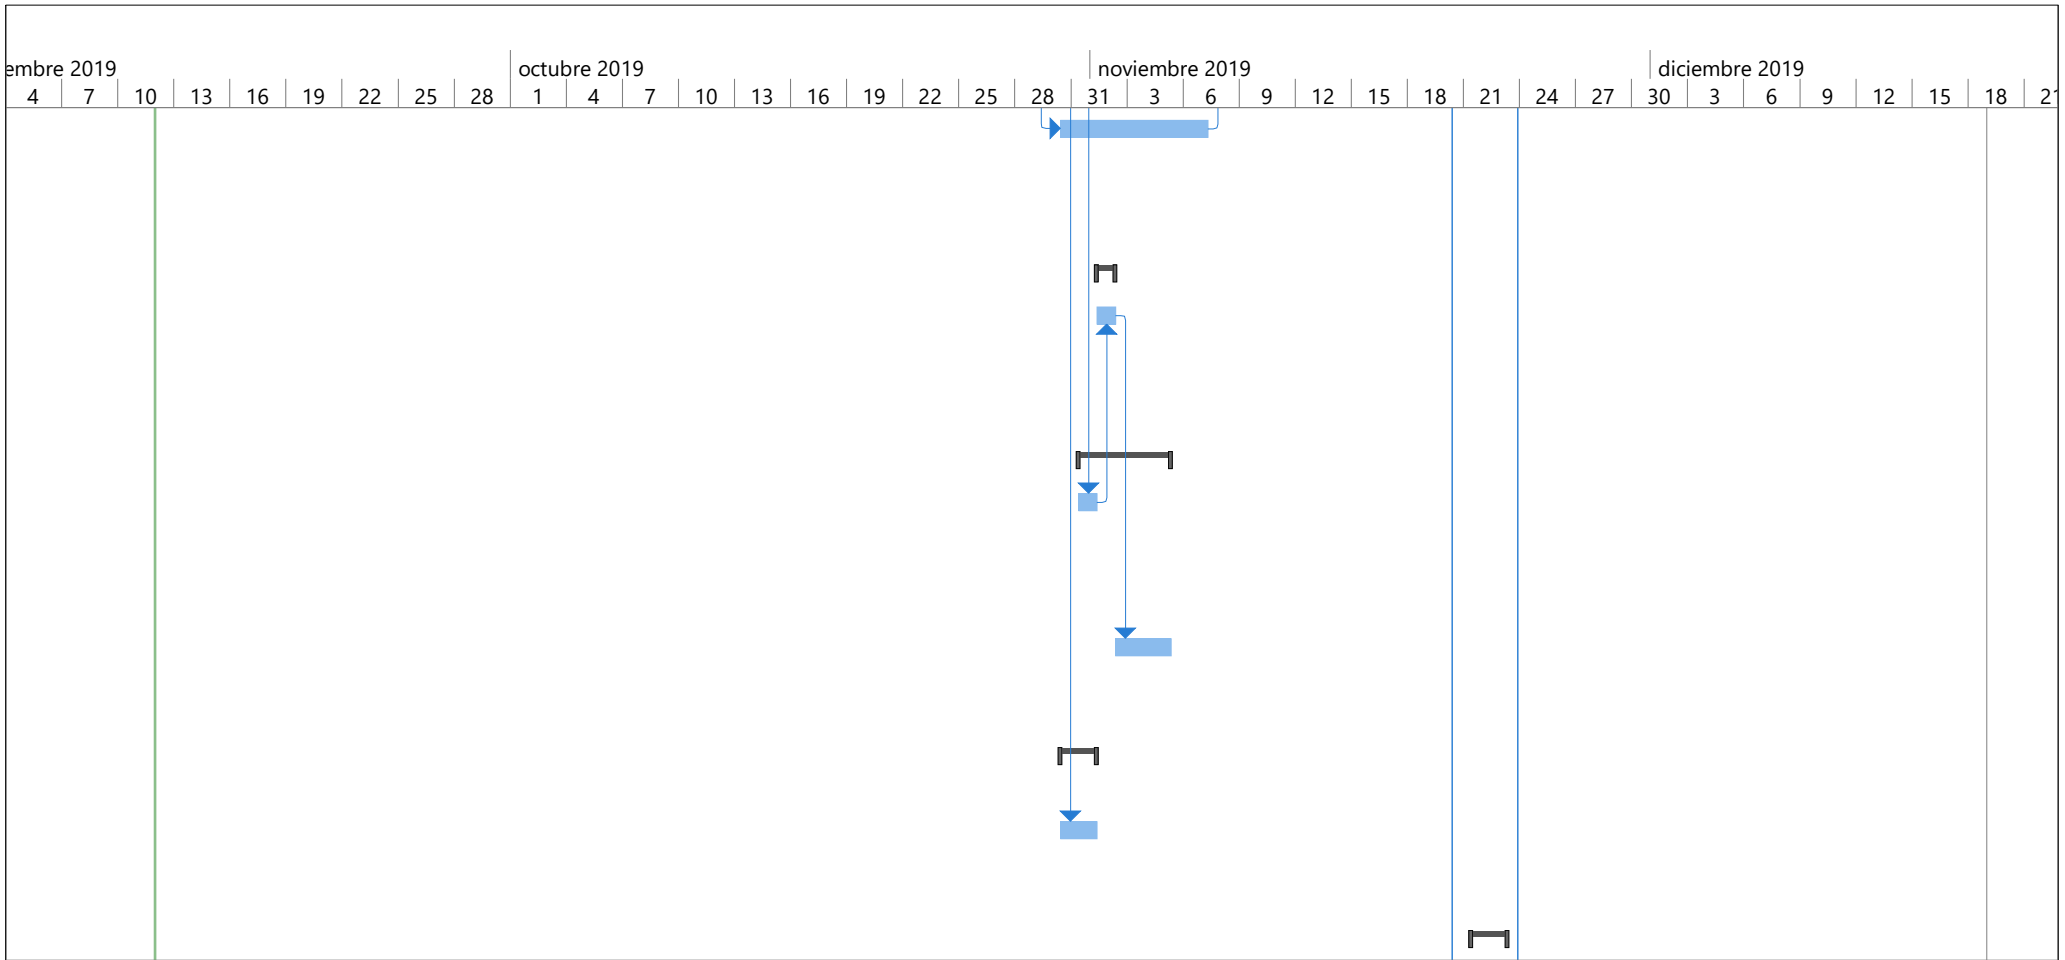


Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	




Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

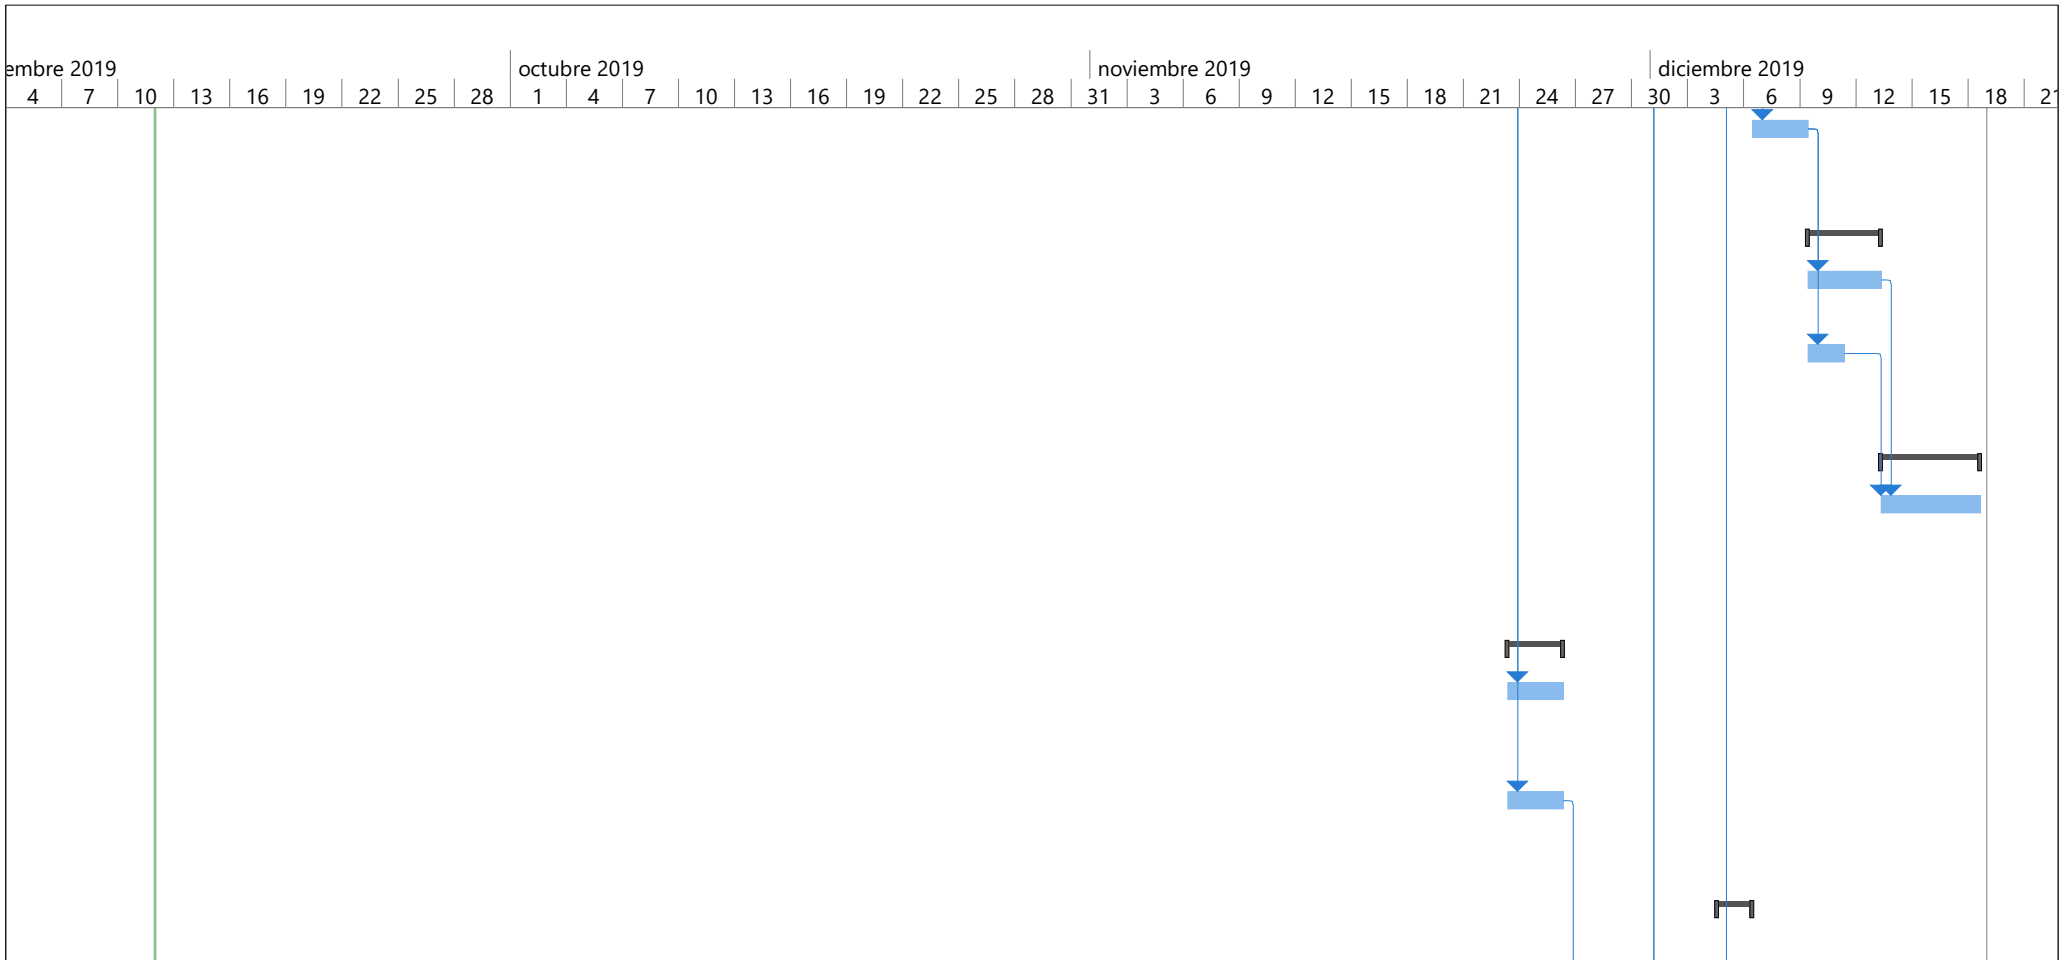

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

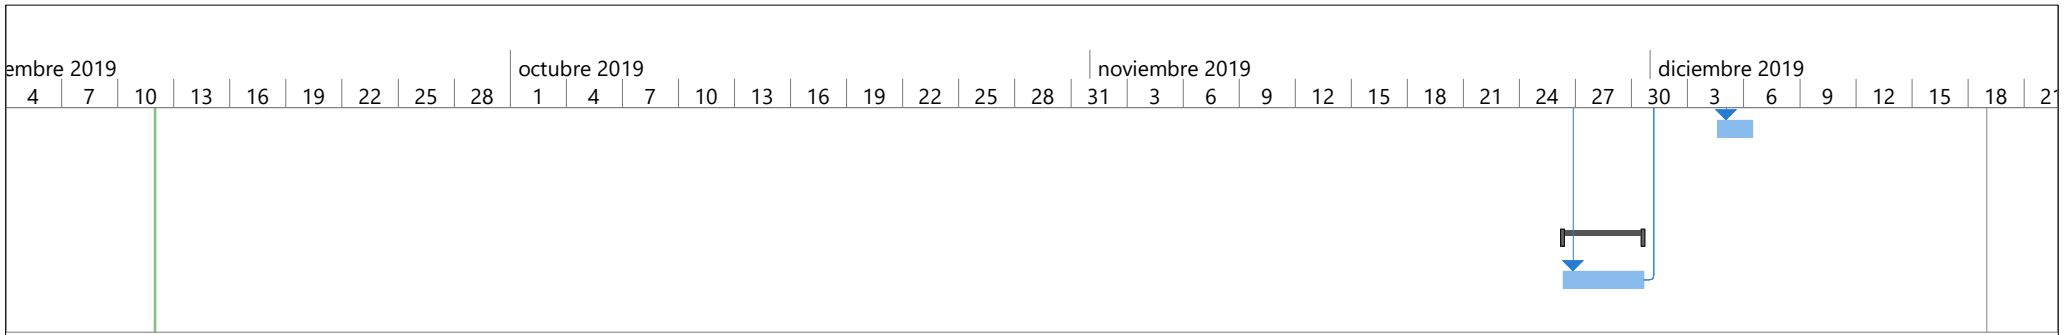

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 12/09/19

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	
