UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL

CONSORCIO VENTURA


# MEMORIAS CORTE #1 DE OBRA EJECUTADA

| Código: 055-2024 UAEJPMP | Versión: 1 | Página 1 de 20 |
|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO | ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA. | | | | Nro. VALE | | 001 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VENTURA | NIT. | 901.550.907-2 | | | | |
| INTERVENTORIA | PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | NIT. | 901.835.570-9 | FECHA | DIA | MES | AÑO |
| CONTRATO Nro: | CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP | | | | 19 | 12 | 2024 |

## DESCRIPCION

| 1.01 Demolición y desmonte de cielo raso en lamina de yeso-cartón | | | M2 |
|---|---|---|---|
| **ESPACIO** | **LARGO** | **ANCHO** | **PRCIAL** |
| A. Baño Hombres | 3,40 | 3,27 | 11,12 |
| B. Baño Mujeres | 5,25 | 3,43 | 18,01 |
| C. Pasillo Acceso | 7,97 | 1,48 | 11,80 |
| D. Oficina 1 | 3,85 | 3,17 | 12,20 |
| **TOTAL AREA DEMOLIDA** | | | **53,13** |

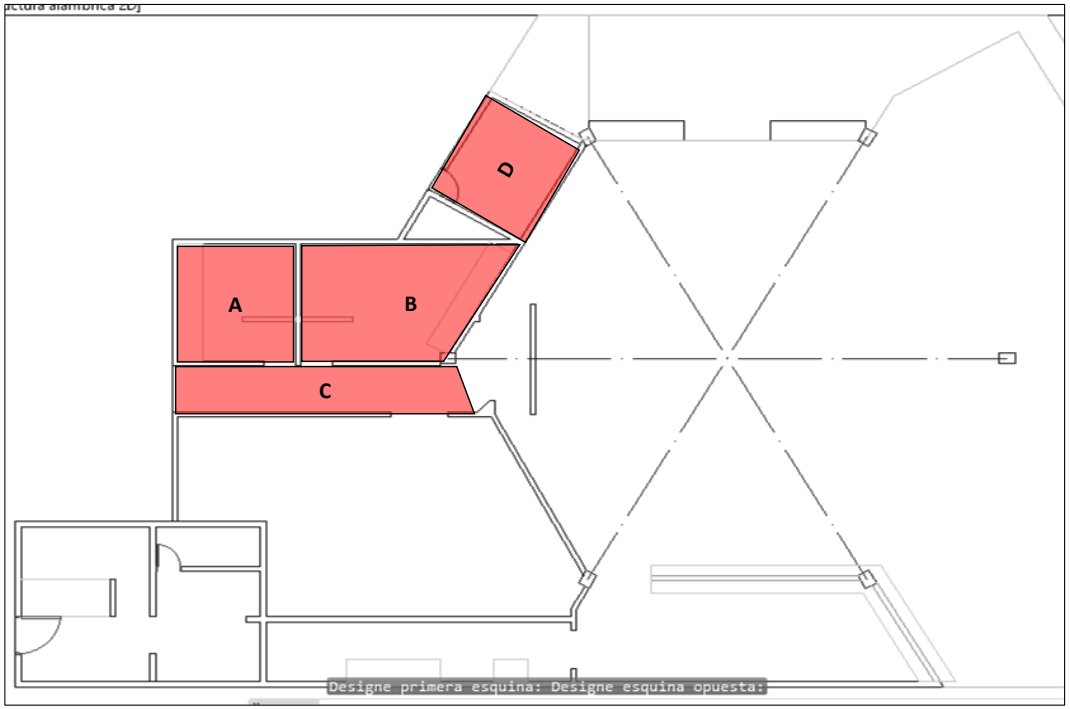


| TOTAL AREA DEMOLIDA | 53,13 |
|---|---|


| ELABORO: | CONTRATISTA: | Vo.Bo. INTERVENTORIA | Vo.Bo. SUPERVISOR |
|---|---|---|---|
| Arq. JORGE E MORALES RUIZ | RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA | RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO | ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA. | | | Nro. VALE | | 001 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VENTURA | NIT. | 901.550.907-2 | | | |
| INTERVENTORIA | PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | NIT. | 901.835.570-9 | FECHA | DIA | MES / AÑO |
| CONTRATO Nro: | CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP | | | | 19 | 12 / 2024 |

**DESCRIPCION**

| 1.02 Demolición y desmonte de cielo raso en esterilla de guadua | | | M2 |
|---|---|---|---|
| **ESPACIO** | **LARGO** | **ANCHO** | **PRCIAL** |
| F. Zona Barra | 8,75 | 3,00 | 26,25 |
| G. Muro frontal | 7,55 | 1,45 | 10,95 |
| **TOTAL AREA DEMOLIDA** | | | **37,20** |

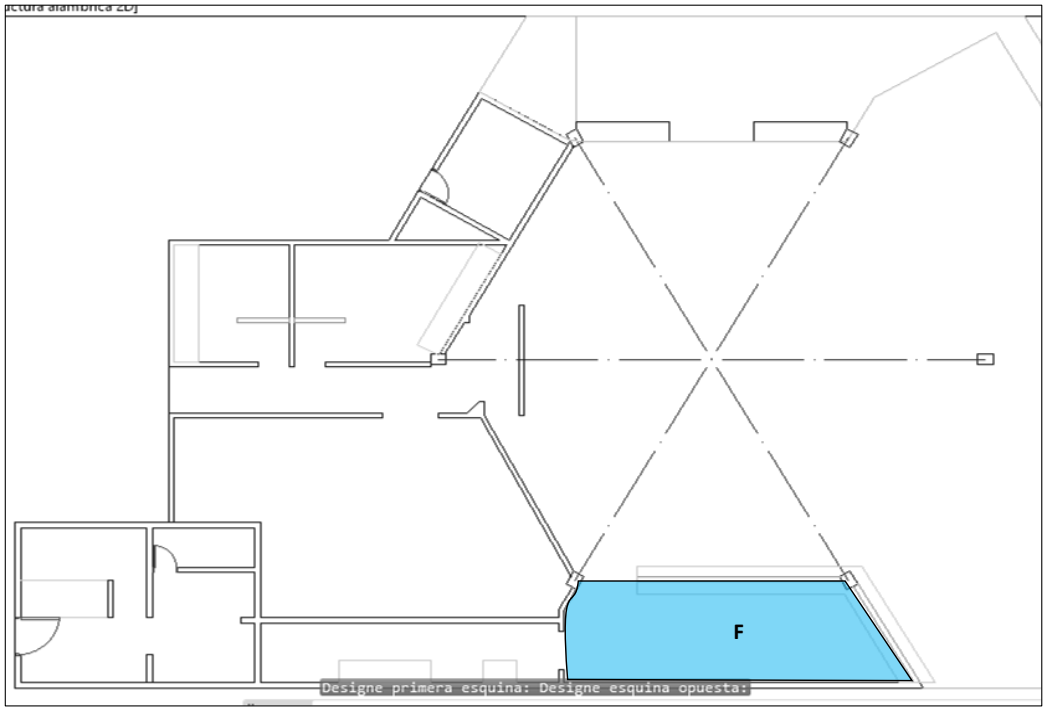


| TOTAL AREA DEMOLIDA | 37,20 |
|---|---|


| ELABORO: | CONTRATISTA: | Vo.Bo. INTERVENTORIA | Vo.Bo. SUPERVISOR |
|---|---|---|---|
| Arq. JORGE E MORALES RUIZ | RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA | RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO | ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA. | | | Nro. VALE | | 001 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VENTURA | NIT. | 901.550.907-2 | | | |
| INTERVENTORIA | PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | NIT. | 901.835.570-9 | FECHA | DIA | MES / AÑO |
| CONTRATO Nro: | CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP | | | | 19 | 12 / 2024 |

**DESCRIPCION**

| 1.03 Desmonte y demolición de cubierta en teja de fibrocemento | | | M2 |
|---|---|---|---|
| **ESPACIO** | **PERIMETO** | **APOTEMA** | **PARCIAL** |
| H. Area del Hexagono | 32,40 | 9,35 | 302,94 |
| D. Oficina 1 | 4,81 | 4,10 | 19,72 |
| **TOTAL AREA DEMOLIDA** | | | **322,66** |

| | |
|---|---|
| $\frac{B+b}{2}$ | x H |

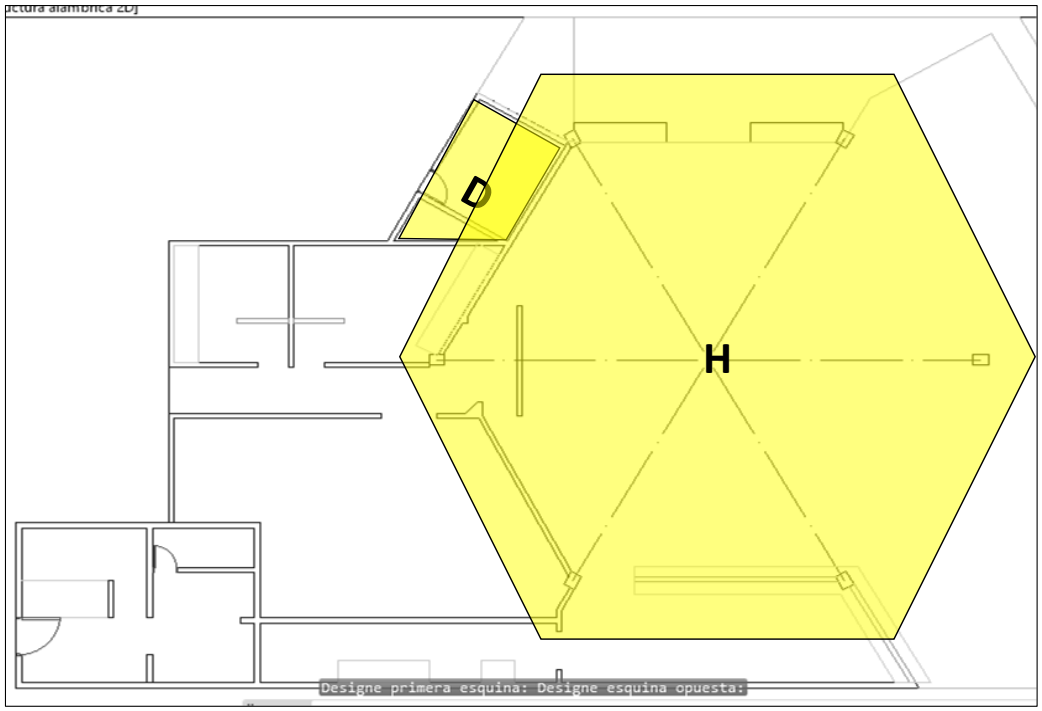


| TOTAL AREA DEMOLIDA | 322,66 |
|---|---|

| ELABORO: | CONTRATISTA: | Vo.Bo. INTERVENTORIA | Vo.Bo. SUPERVISOR |
|---|---|---|---|
| Arq. JORGE E MORALES RUIZ | RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA | RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO | ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA. | | | | Nro. VALE | | 001 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VENTURA | NIT. | 901.550.907-2 | | | | |
| INTERVENTORIA | PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | NIT. | 901.835.570-9 | FECHA | DIA | MES | AÑO |
| CONTRATO Nro: | CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP | | | | 19 | 12 | 2024 |

## DESCRIPCION

| 1.04 Demolición muro en mampostería, Incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada. | | | | M2 |
|---|---|---|---|---|
| ZONA | LARGO | ALTURA | CANT | PARCIAL |
| A. ZONA KIOSCO - CONTRAFUERTES DE COLUMNAS MUROS DOBLES LADRILLO | 0,88 | 3,18 | 2,00 | 5,57 |
| | 0,80 | 3,18 | 2,00 | 5,09 |
| | 0,78 | 3,18 | 2,00 | 4,93 |
| B. MURO MESON BARRA BAR | 3,35 | 0,93 | 1,00 | 3,12 |
| | 6,19 | 0,93 | 1,00 | 5,76 |
| B. MOCHETAS MESON BARRA | 1,61 | 0,56 | 1,00 | 0,90 |
| | 0,49 | 0,65 | 5,00 | 1,59 |
| B. MURO DIV. COCINA - BAR | 1,90 | 2,60 | 1,00 | 4,94 |
| DCTO PUERTA | -0,88 | 2,16 | 1,00 | -1,90 |
| B. MURO BOBLE - FALSA ESCUADRA - BAR | 10,87 | 3,15 | 1,00 | 34,24 |
| DCTO VENTANA | -2,45 | 1,32 | 1,00 | -3,23 |
| C. JARDINERAS ZONA ACCESO KIOSKO SON 2 UNIDADES 1 | 2,21 | 1,61 | 1,00 | 3,56 |
| | 2,21 | 1,61 | 1,00 | 3,56 |
| 2 | 0,85 | 0,99 | 2,00 | 1,68 |
| | 0,27 | 0,99 | 2,00 | 0,53 |
| | 0,85 | 0,99 | 2,00 | 1,68 |
| | 0,27 | 0,99 | 2,00 | 0,53 |
| 3 | 1,20 | 0,70 | 1,00 | 0,84 |
| | 0,28 | 0,70 | 2,00 | 0,39 |
| | 1,20 | 0,70 | 1,00 | 0,84 |
| | 0,28 | 0,70 | 2,00 | 0,39 |
| 4 | 0,13 | 0,55 | 1,00 | 0,07 |
| | 1,92 | 0,55 | 1,00 | 1,06 |
| | 1,41 | 0,55 | 1,00 | 0,78 |
| | 0,13 | 0,55 | 1,00 | 0,07 |
| | 1,92 | 0,55 | 1,00 | 1,06 |
| | 1,41 | 0,55 | 1,00 | 0,78 |
| D. MURO ACCESO A PASILLO BAÑOS | 3,41 | 3,82 | 1,00 | 13,04 |
| | 0,98 | 3,82 | 2,00 | 7,49 |
| DCTO PUERTAS | -0,98 | 2,17 | 2,00 | -4,24 |
| E. MOCHETAS MESON COCINA | 0,65 | 0,50 | 4,00 | 1,30 |
| | 0,72 | 0,58 | 2,00 | 0,84 |
| F. MURO DIVISION BODEGA | 1,57 | 2,60 | 1,00 | 4,08 |
| DCTO PUERTA | -0,88 | 2,16 | 1,00 | -1,90 |
| E. MOCHETAS LAVADERO | 0,59 | 0,82 | 1,00 | 0,48 |
| | 0,56 | 0,81 | 1,00 | 0,45 |
| E. MOCHETAS MESON LAVADERO | 0,63 | 0,70 | 1,00 | 0,44 |
| | 0,71 | 0,70 | 1,00 | 0,50 |
| E. DIVISION MUEBLE MADERA | 0,60 | 0,53 | 2,00 | 0,64 |
| | 0,41 | 0,90 | 1,00 | 0,37 |
| TOTAL AREA DEMOLIDA | | | | 102,30 |








| TOTAL AREA DEMOLIDA | 102,30 |
|---|---|

| ELABORO: | CONTRATISTA: | Vo.Bo. INTERVENTORIA | Vo.Bo. SUPERVISOR |
|---|---|---|---|
| Arq. JORGE E MORALES RUIZ | RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA | RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO | ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA. | | | Nro. VALE | | 001 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VENTURA | NIT. | 901.550.907-2 | | | |
| INTERVENTORIA | PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | NIT. | 901.835.570-9 | FECHA | DIA | MES / AÑO |
| CONTRATO Nro: | CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP | | | | 19 | 12 / 2024 |

**DESCRIPCION**

| 1.5 Demolición de poyo de hasta 0,15m de altura, en mamposteria y/o concreto,incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada. | | | | M2 |
|---|---|---|---|---|
| **ESPACIO** | **LARGO** | **ANCHO** | **CANT** | **PARCIAL** |
| A. ZONA DE ROPAS | 2,35 | 0,60 | 1,00 | 1,41 |
| | 1,40 | 0,69 | 1,00 | 0,97 |
| | 0,85 | 0,66 | 1,00 | 0,56 |
| | 2,68 | 0,40 | 1,00 | 1,07 |
| **TOTAL AREA DEMOLIDA** | | | | **4,00** |

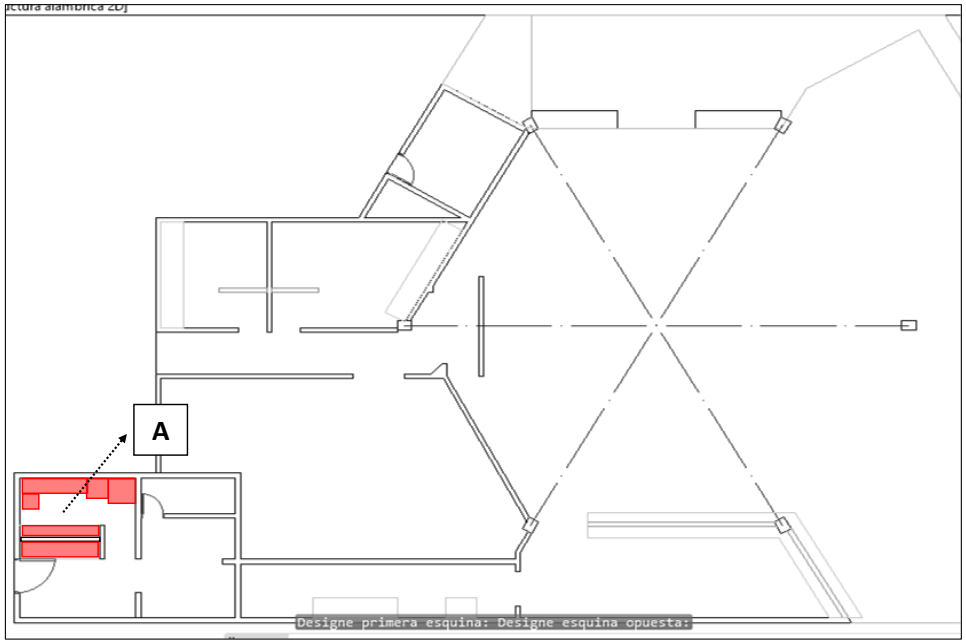



| TOTAL AREA DEMOLIDA | 4,00 |
|---|---|

| ELABORO: | CONTRATISTA: | Vo.Bo. INTERVENTORIA | Vo.Bo. SUPERVISOR |
|---|---|---|---|
| Arq. JORGE E MORALES RUIZ | RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA | RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO | ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA. | | | Nro. VALE | | 001 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VENTURA | NIT. | 901.550.907-2 | | | |
| INTERVENTORIA | PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | NIT. | 901.835.570-9 | FECHA | DIA | MES / AÑO |
| CONTRATO Nro: | CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP | | | | 19 | 12 / 2024 |

**DESCRIPCION**

| 1.7 Demolición de mesones en concreto + soportes verticales y horizontales + acabado , incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada. | | | | M2 |
|---|---|---|---|---|
| **ESPACIO** | **LARGO** | **ANCHO** | **CANT** | **PARCIAL** |
| A. ZONA DE ROPAS | 2,02 | 0,50 | 1,00 | 1,01 |
| | 0,90 | 0,69 | 1,00 | 0,62 |
| | 2,68 | 0,40 | 1,00 | 1,07 |
| B. ZONA DE BODEGA | 2,68 | 0,59 | 1,00 | 1,58 |
| C. ZONA DE COCINA | 5,93 | 0,50 | 1,00 | 2,97 |
| | 2,05 | 0,72 | 1,00 | 1,48 |
| | 2,01 | 0,42 | 1,00 | 0,84 |
| D. ZONA DE BAR | 9,07 | 0,93 | 1,00 | 8,44 |
| **TOTAL AREA DEMOLIDA** | | | | **18,00** |

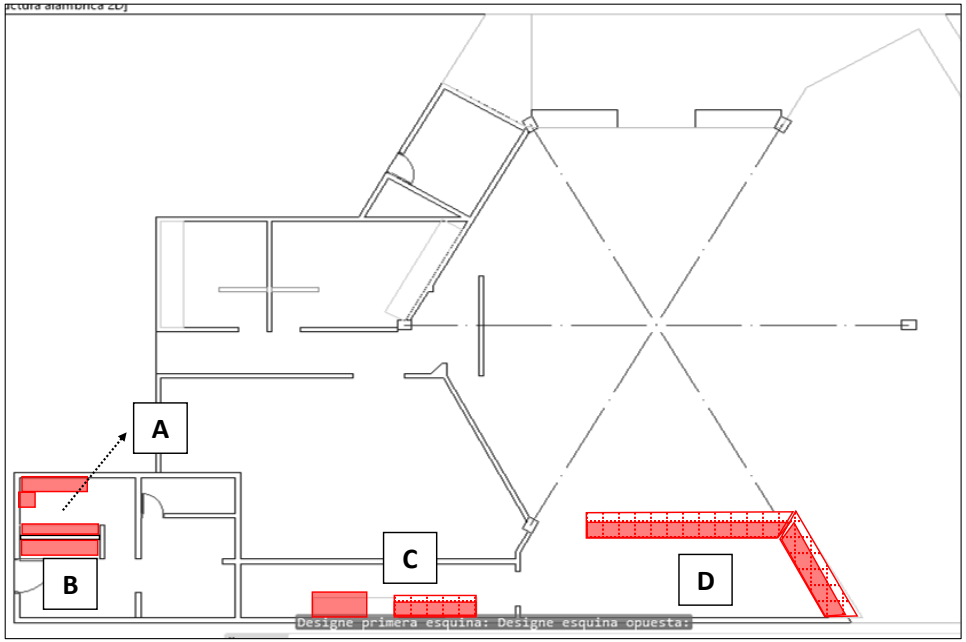



| TOTAL AREA DEMOLIDA | 18,00 |
|---|---|

| ELABORO: | CONTRATISTA: | Vo.Bo. INTERVENTORIA | Vo.Bo. SUPERVISOR |
|---|---|---|---|
| Arq. JORGE E MORALES RUIZ | RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA | RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO | ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA. | | | | Nro. VALE | | 001 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VENTURA | NIT. | 901.550.907-2 | | | | |
| INTERVENTORIA | PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | NIT. | 901.835.570-9 | FECHA | DIA | MES | AÑO |
| CONTRATO Nro: | CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP | | | | 19 | 12 | 2024 |

**DESCRIPCION**

| 1.8 Desmonte de luminarias existentes, incluye retiro y dispocición final certificada. | | | | UND |
|---|---|---|---|---|
| ESPACIO | LARGO | ANCHO | CANT | PARCIAL |
| ZONA DE KIOSKO | | | 2,00 | 2,00 |
| TOTAL DESMONTES | | | | 2,00 |

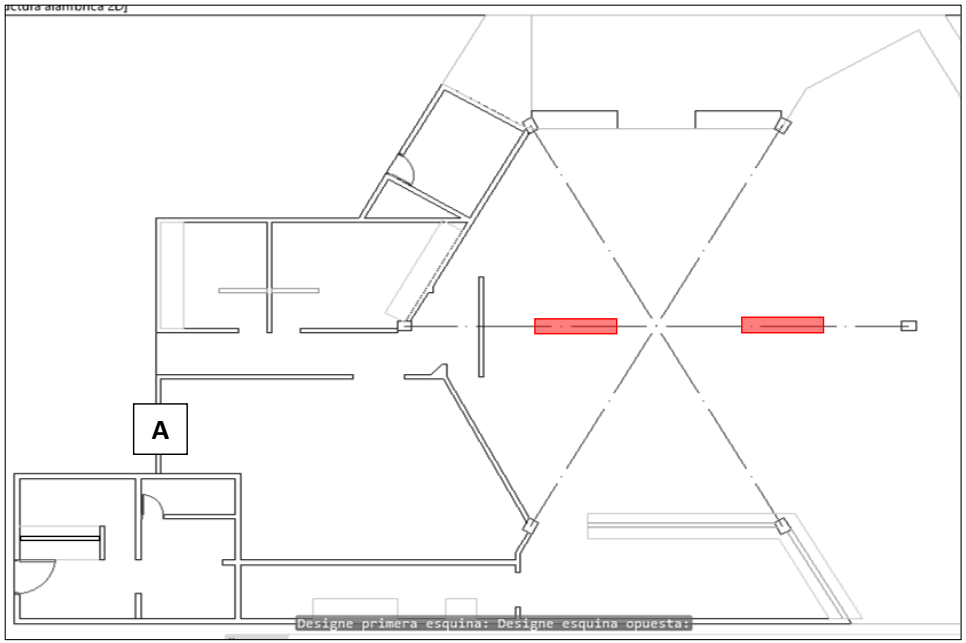



| TOTAL DESMONTES | 2,00 |
|---|---|

| ELABORO: | CONTRATISTA: | Vo.Bo. INTERVENTORIA | Vo.Bo. SUPERVISOR |
|---|---|---|---|
| Arq. JORGE E MORALES RUIZ | RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA | RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO | ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA. | | | | Nro. VALE | | 001 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VENTURA | NIT. | 901.550.907-2 | | | | |
| INTERVENTORIA | PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | NIT. | 901.835.570-9 | FECHA | DIA | MES | AÑO |
| CONTRATO Nro: | CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP | | | | 19 | 12 | 2024 |

**DESCRIPCION**

| 1.09 Desmonte de guardaescoba existente, incluye empaque, cargue, transporte y disposición final certificada. | | | Ml |
|---|---|---|---|
| **ZONA** | **LARGO** | **ALTURA** | **PARCIAL** |
| A. BODEGA | 34,30 | | 34,30 |
| B. PASILLO | 19,93 | | 19,93 |
| C. KIOSKO | 13,00 | | 13,00 |
| D. CUARTO 1 | 13,33 | | 13,33 |
| **TOTAL AREA DEMOLIDA** | | | **80,56** |

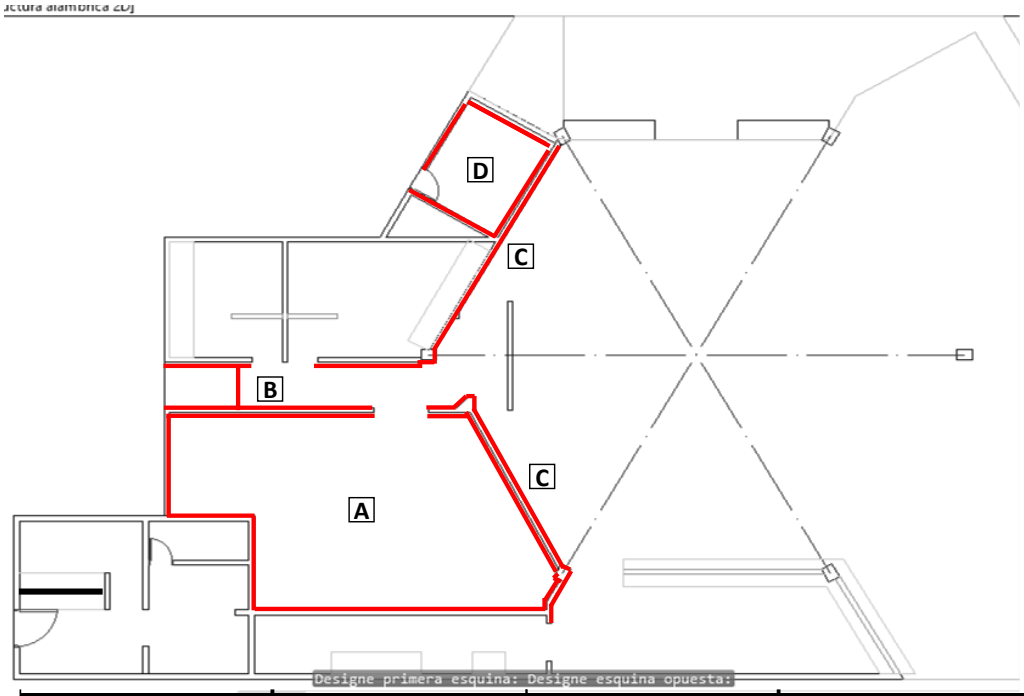



| TOTAL AREA DEMOLIDA | 80,56 |
|---|---|

| ELABORO: | CONTRATISTA: | Vo.Bo. INTERVENTORIA | Vo.Bo. SUPERVISOR |
|---|---|---|---|
| Arq. JORGE E MORALES RUIZ | RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA | RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO | ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA. | | | Nro. VALE | | 001 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VENTURA | NIT. | 901.550.907-2 | | | |
| INTERVENTORIA | PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | NIT. | 901.835.570-9 | FECHA | DIA | MES / AÑO |
| CONTRATO Nro: | CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP | | | | 19 | 12 / 2024 |

## DESCRIPCION

| 1.10.Desmonte mobiliario fijo en madera, incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada. | | | M2 |
|---|---|---|---|
| **ESPACIO** | **LARGO** | **ALTURA** | **PARCIAL** |
| ZONA DOBEGA | 1,50 | 2,68 | 4,02 |
| | 1,20 | 2,00 | 2,40 |
| ZONA DE BAR | 2,90 | 2,20 | 6,38 |
| ZONA DE KIOSKO | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **TOTAL DESMONTES** | | | **13,80** |

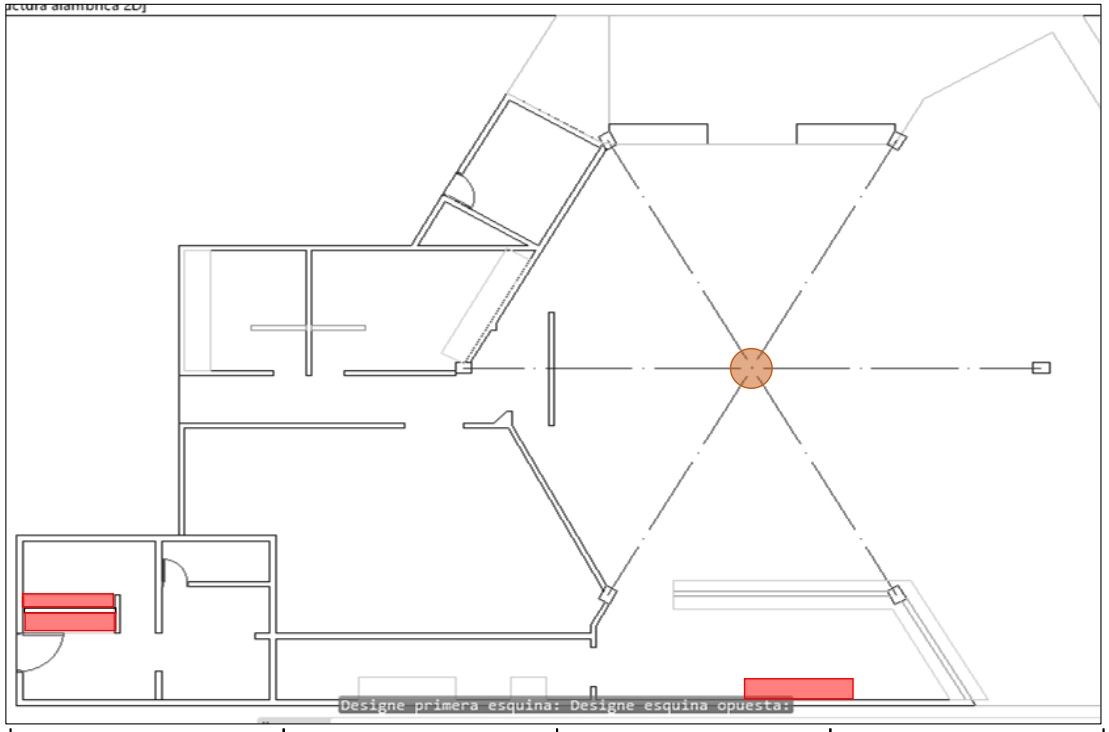



| TOTAL DESMONTES | 13,80 |
|---|---|

| ELABORO: | CONTRATISTA: | Vo.Bo. INTERVENTORIA | Vo.Bo. SUPERVISOR |
|---|---|---|---|
| Arq. JORGE E MORALES RUIZ | RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA | RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO | ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA. | | | | Nro. VALE | | 001 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VENTURA | NIT. | 901.550.907-2 | | | | |
| INTERVENTORIA | PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | NIT. | 901.835.570-9 | FECHA | DIA | MES | AÑO |
| CONTRATO Nro: | CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP | | | | 19 | 12 | 2024 |

**DESCRIPCION**

| 1.11 Desmonte de dispositivos electricos supendidos incluye soportes, aparatado, cancelación de punto electrico | | | UND |
|---|---|---|---|
| **ESPACIO** | **LARGO** | **CANT** | **PARCIAL** |
| ZONA DE KIOSKO - VENTILADORES | | 3,00 | 3,00 |
| **TOTAL DESMONTES** | | | **3,00** |

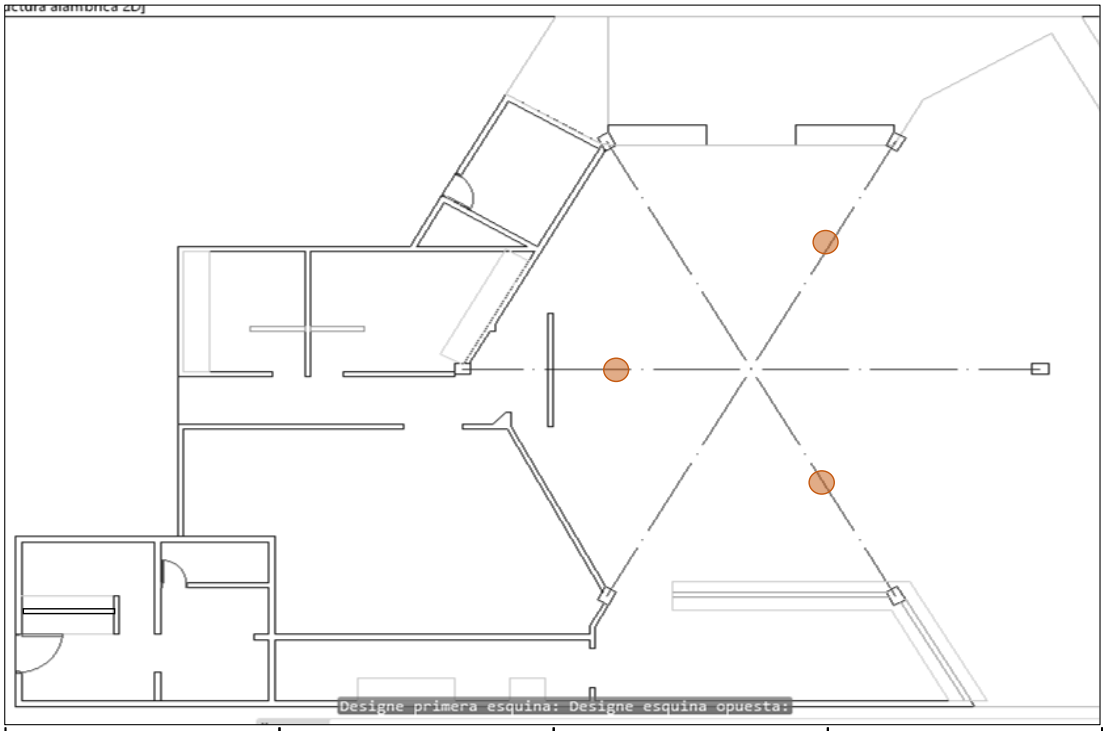



| TOTAL DESMONTES | 3,00 |
|---|---|

| ELABORO: | CONTRATISTA: | Vo.Bo. INTERVENTORIA | Vo.Bo. SUPERVISOR |
|---|---|---|---|
| Arq. JORGE E MORALES RUIZ | RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA | RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO | ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA. | | | Nro. VALE | | 001 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VENTURA | NIT. | 901.550.907-2 | | | |
| INTERVENTORIA | PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | NIT. | 901.835.570-9 | FECHA | DIA | MES / AÑO |
| CONTRATO Nro: | CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP | | | | 19 | 12 / 2024 |

## DESCRIPCION

| 1.12 Desmonte de unidades sanitarias (inodoros, urinales, lavamanos) incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada. | | | | UND |
|---|---|---|---|---|
| ESPACIO | SANITARIOS | LAVAMANOS | ORINALES | PARCIAL |
| BAÑOS HOMBRES | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 |
| BAÑOS MUJERES | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 5,00 |
| ZONA ROPAS (MUEBLE LAVADERO) | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL DESMONTES | | | | 12,00 |

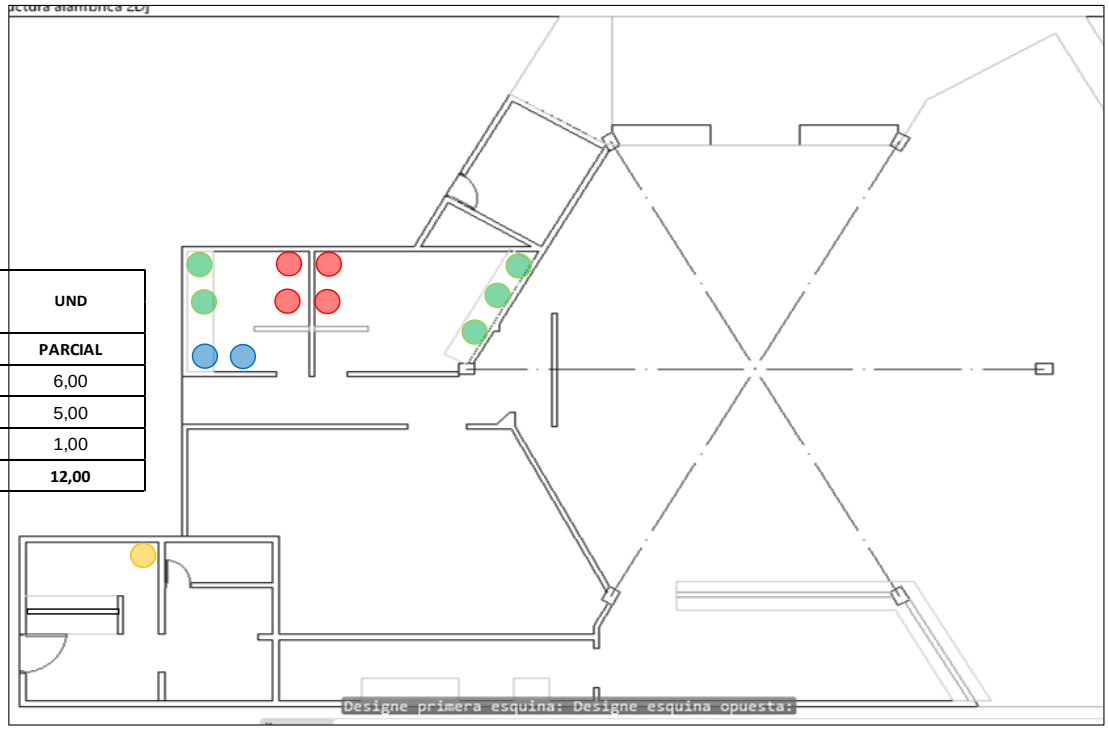



| TOTAL DESMONTES | 12,00 |
|---|---|

| ELABORO: | CONTRATISTA: | Vo.Bo. INTERVENTORIA | Vo.Bo. SUPERVISOR |
|---|---|---|---|
| Arq. JORGE E MORALES RUIZ | RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA | RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO | ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA. | | | | Nro. VALE | | 001 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VENTURA | NIT. | 901.550.907-2 | | | | |
| INTERVENTORIA | PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | NIT. | 901.835.570-9 | FECHA | DIA | MES | AÑO |
| CONTRATO Nro: | CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP | | | | 19 | 12 | 2024 |

**DESCRIPCION**

| 1.13 Desmonte de espejos incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada. | | | GLB |
|---|---|---|---|
| **ESPACIO** | **LARGO** | **CANT** | **PARCIAL** |
| ZONA BAÑO BODEGA | | 1,00 | 1,00 |
| **TOTAL DESMONTES** | | | **1,00** |

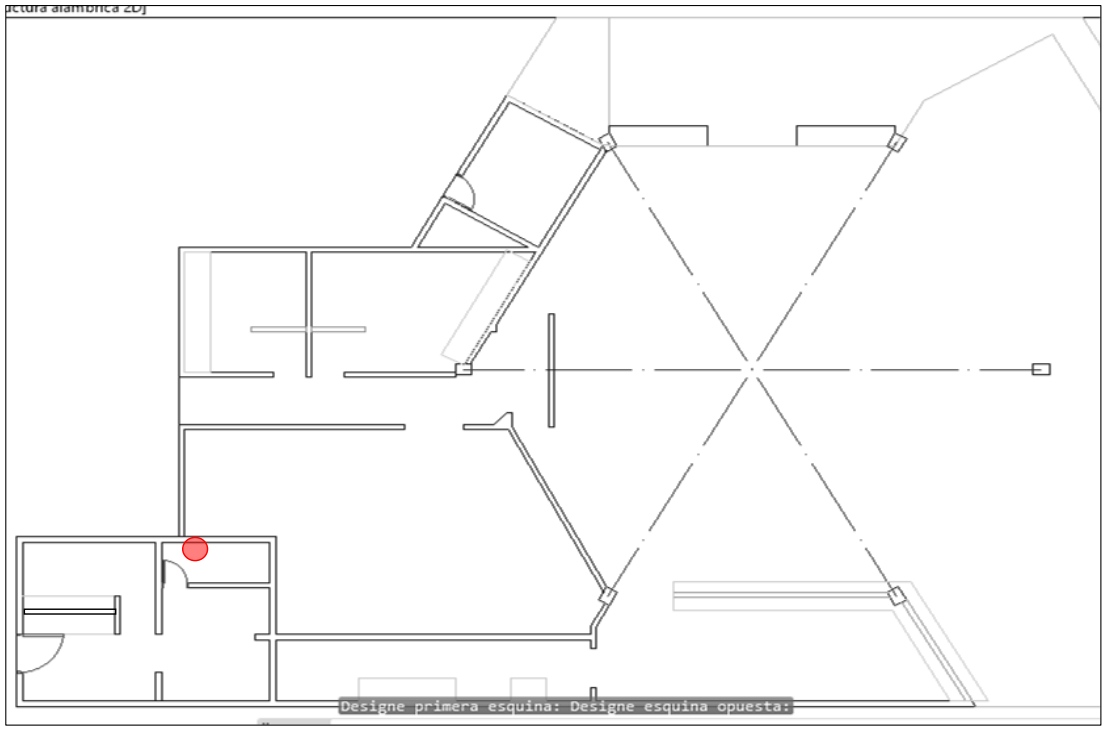




| TOTAL DESMONTES | 1,00 |
|---|---|

| ELABORO: | CONTRATISTA: | Vo.Bo. INTERVENTORIA | Vo.Bo. SUPERVISOR |
|---|---|---|---|
| Arq. JORGE E MORALES RUIZ | RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA | RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO | ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA. | | | Nro. VALE | | 001 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VENTURA | NIT. | 901.550.907-2 | | | |
| INTERVENTORIA | PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | NIT. | 901.835.570-9 | FECHA | DIA | MES / AÑO |
| CONTRATO Nro: | CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP | | | | 19 | 12 / 2024 |

## DESCRIPCION

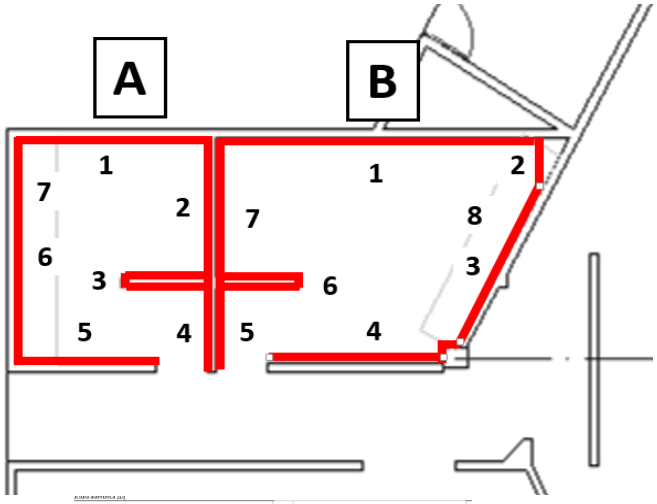

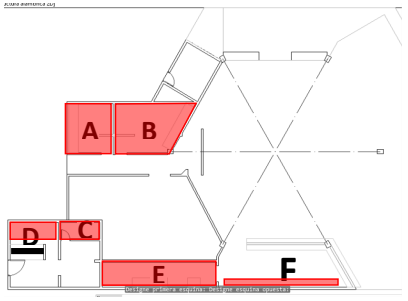





| 1.15 Demolición de enchapes tipo ceramico en muros, incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada. | | LARGO | ALTURA | CANT | M2 PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONA | | | | | |
| A. BAÑOS HOMBRES | 1 | 3,25 | 2,00 | 1,00 | 6,50 |
| | 2 | 1,96 | 2,00 | 2,00 | 7,84 |
| | 3 | 1,40 | 2,00 | 1,00 | 2,80 |
| | | 0,12 | 2,00 | 1,00 | 0,24 |
| | | 1,40 | 2,00 | 1,00 | 2,80 |
| | 4 | 1,43 | 2,00 | 1,00 | 2,86 |
| 1 | 5 | 2,27 | 2,00 | 1,00 | 4,54 |
| | 6 | 3,38 | 2,00 | 1,00 | 6,76 |
| MOCHETAS | 7 | 0,59 | 0,89 | 2,00 | 1,05 |
| LAVAMANOS | | 0,075 | 0,89 | 1,00 | 0,07 |
| B. BAÑOS MUJERES | 1 | 5,93 | 2,00 | 1,00 | 11,86 |
| | 2 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| | 3 | 2,20 | 0,82 | 1,00 | 1,80 |
| | | 0,47 | 0,95 | 1,00 | 0,45 |
| | | 0,15 | 0,95 | 1,00 | 0,14 |
| | 4 | 3,44 | 2,00 | 1,00 | 6,88 |
| | 5 | 1,18 | 2,00 | 1,00 | 2,36 |
| | 6 | 1,43 | 2,00 | 1,00 | 2,86 |
| | | 0,12 | 2,00 | 1,00 | 0,24 |
| | | 1,43 | 2,00 | 1,00 | 2,86 |
| | 7 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 |
| MOCHETAS | 8 | 0,67 | 0,70 | 1,00 | 0,47 |
| LAVAMANOS | | 0,15 | 0,70 | 1,00 | 0,11 |
| PASAN - SUBTOTAL AREA DEMOLIDA | | | | | 71,48 |


| ELABORO: | CONTRATISTA: | Vo.Bo. INTERVENTORIA | Vo.Bo. SUPERVISOR |
|---|---|---|---|
| Arq. JORGE E MORALES RUIZ | RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA | RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO | ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA. | | | Nro. VALE | | 001 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VENTURA | NIT. | 901.550.907-2 | | | |
| INTERVENTORIA | PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | NIT. | 901.835.570-9 | FECHA | DIA | MES / AÑO |
| CONTRATO Nro: | CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP | | | | 19 | 12 / 2024 |

## DESCRIPCION

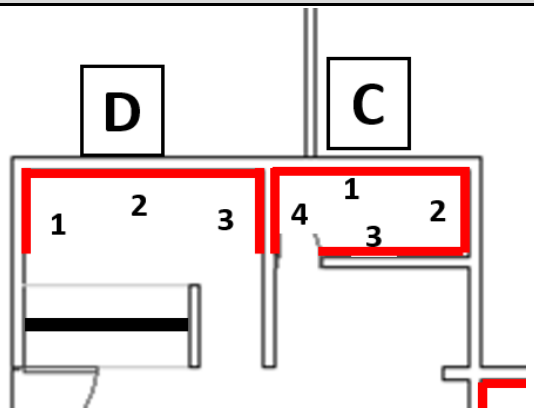




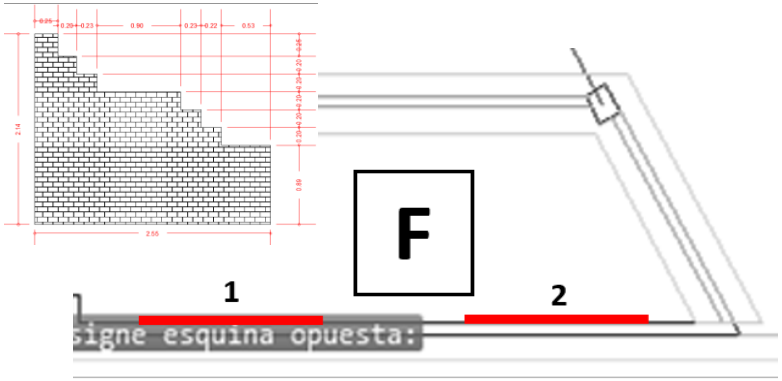

| 1.15 Demolición de enchapes tipo ceramico en muros, incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada. | | | | | M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONA | | LARGO | ALTURA | CANT | PARCIAL |
| VIENEN- SUBTOTAL AREA DEMOLIDA | | | | | 71,48 |
| C. BAÑO DEPOSITO | 1 | 1,75 | 1,75 | 1,00 | 3,06 |
| | | 0,87 | 2,00 | 1,00 | 1,74 |
| | 2 | 0,91 | 2,00 | 1,00 | 1,82 |
| | 3 | 0,99 | 2,00 | 1,00 | 1,98 |
| | | 0,87 | 1,75 | 1,00 | 1,52 |
| | 4 | 1,24 | 1,75 | 1,00 | 2,17 |
| D. ZONA ROPAS | 1 | 0,09 | 0,50 | 1,00 | 0,05 |
| | | 0,10 | 0,50 | 1,00 | 0,05 |
| | | 0,10 | 0,50 | 1,00 | 0,05 |
| | | 0,14 | 0,50 | 1,00 | 0,07 |
| | | 1,20 | 0,12 | 1,00 | 0,14 |
| | 2 | 3,50 | 0,50 | 1,00 | 1,75 |
| | 3 | 0,60 | 0,50 | 1,00 | 0,30 |
| | | 0,27 | 1,39 | 1,00 | 0,38 |
| | | 1,02 | 0,50 | 1,00 | 0,51 |
| F. ZONA BARRA BAR | | 0,25 | 0,25 | 2,00 | 0,13 |
| | | 0,45 | 0,20 | 2,00 | 0,18 |
| | | 0,675 | 0,20 | 2,00 | 0,27 |
| | | 1,575 | 0,20 | 2,00 | 0,63 |
| | | 1,80 | 0,20 | 2,00 | 0,72 |
| | | 2,02 | 0,20 | 2,00 | 0,81 |
| | | 2,55 | 0,89 | 2,00 | 4,54 |
| PASAN - SUBTOTAL AREA DEMOLIDA | | | | | 94,34 |


| ELABORO: | CONTRATISTA: | Vo.Bo. INTERVENTORIA | Vo.Bo. SUPERVISOR |
|---|---|---|---|
| Arq. JORGE E MORALES RUIZ | RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA | RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO | ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA. | | | Nro. VALE | | 001 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VENTURA | NIT. | 901.550.907-2 | | | |
| INTERVENTORIA | PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | NIT. | 901.835.570-9 | FECHA | DIA | MES / AÑO |
| CONTRATO Nro: | CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP | | | | 19 | 12 / 2024 |
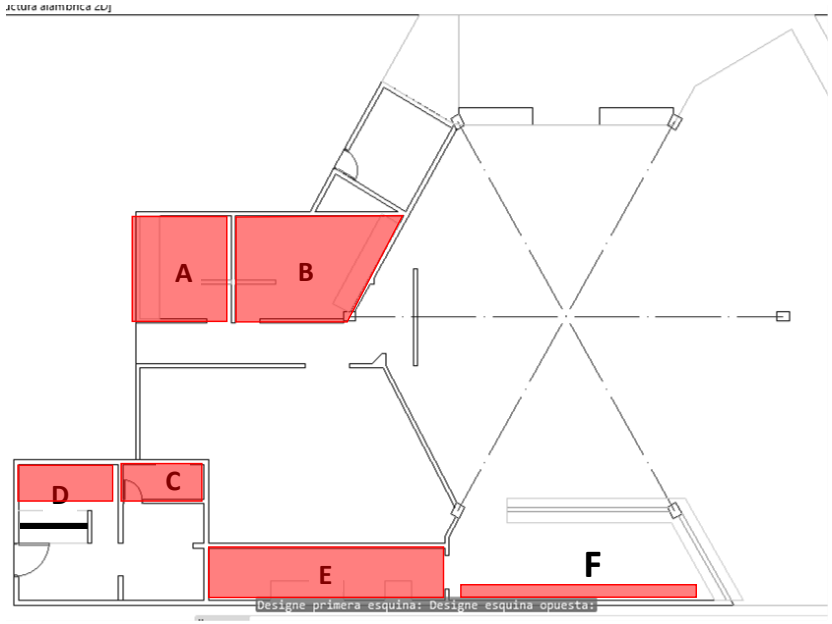
## DESCRIPCION




| 1.15 Demolición de enchapes tipo ceramico en muros, incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada. | | | | | M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONA | | LARGO | ALTURA | CANT | PARCIAL |
| PASAN - SUBTOTAL AREA DEMOLIDA | | | | | 94,34 |
| C. ZONA DE COCINA | 1 | 8,53 | 2,20 | 1,00 | 18,77 |
| | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | 8,83 | 2,20 | 1,00 | 19,43 |
| | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL AREA DEMOLIDA | | | | | 132,53 |

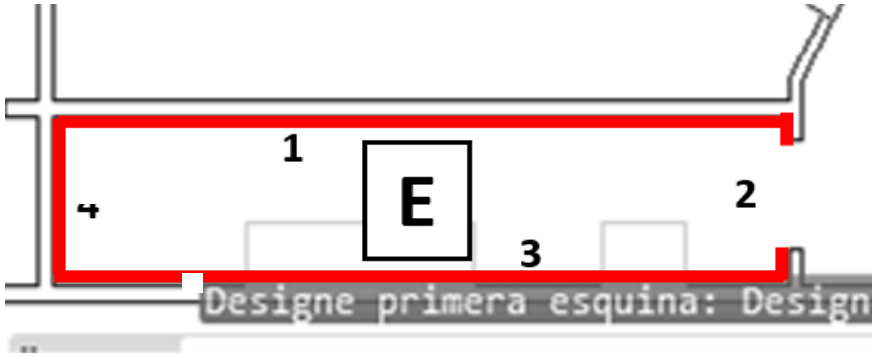



| ELABORO: | CONTRATISTA: | Vo.Bo. INTERVENTORIA | Vo.Bo. SUPERVISOR |
|---|---|---|---|
| Arq. JORGE E MORALES RUIZ | RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA | RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO | ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA. | | | Nro. VALE | | 001 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VENTURA | NIT. | 901.550.907-2 | | | |
| INTERVENTORIA | PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | NIT. | 901.835.570-9 | FECHA | DIA | MES / AÑO |
| CONTRATO Nro: | CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP | | | | 19 | 12 / 2024 |

## DESCRIPCION

| 1.16 Demolición de enchapes tipo ceramico en pisos, incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada. | | | | | M2 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONA | | LARGO | ANCHO O AREA | DCTO | PARCIAL |
| A. ROPAS - BODEGA | A1 | 5,35 | 2,70 | | 14,45 |
| | A2 | 0,70 | 1,55 | | 1,09 |
| | A3 | 2,49 | 0,95 | | 2,37 |
| | A4 | 0,65 | 0,75 | | 0,49 |
| | | 1,23 | 3,03 | | 3,73 |
| | | 0,75 | 0,58 | | 0,44 |
| | D1 | 0,26 | 1,37 | | 0,36 |
| | D2 | 1,08 | 1,82 | | 1,97 |
| B. ZONA COCINA | D3 | 9,82 | 1,88 | -3,44 | 15,03 |
| C. ZONA BARRA BAR | | 8,75 | 3,00 | | 26,25 |
| D. ZONA BODEGA | | | 70,65 | | 70,65 |
| E. ZONA PASILLO | | 8,47 | 1,49 | | 12,62 |
| | | 1,18 | 2,46 | | 2,90 |
| F. BAÑOS HOMBRES | | 3,40 | 3,27 | -0,17 | 10,95 |
| G. BAÑOS MUJRES | | 5,25 | 3,43 | -0,17 | 17,84 |
| H. ZONA KIOSKO | | | 341,33 | | 341,33 |
| J. CUARTO 1 | | 3,85 | 3,17 | | 12,20 |
| TOTAL AREA DEMOLIDA | | | | | 534,64 |

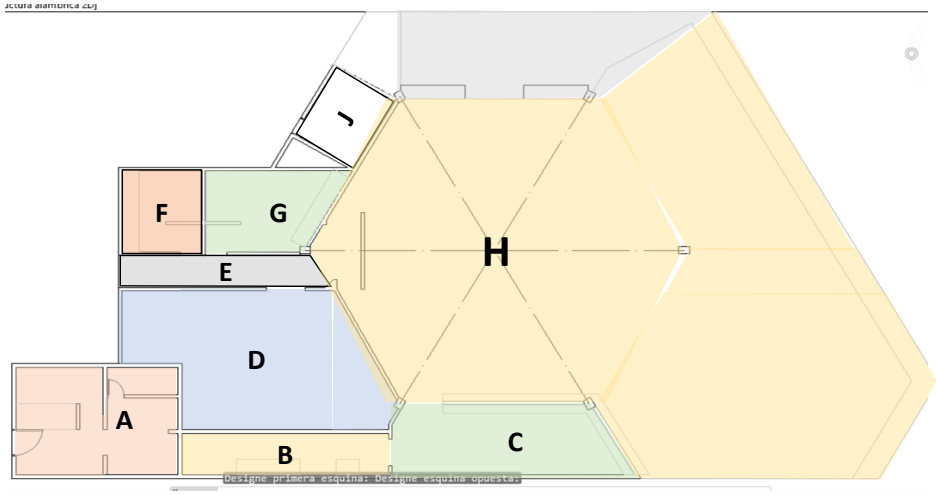


| TOTAL AREA DEMOLIDA | 534,64 |
|---|---|


D3

| ELABORO: | CONTRATISTA: | Vo.Bo. INTERVENTORIA | Vo.Bo. SUPERVISOR |
|---|---|---|---|
| Arq. JORGE E MORALES RUIZ | RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA | RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO | ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA. | | | Nro. VALE | | 001 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VENTURA | NIT. | 901.550.907-2 | | | |
| INTERVENTORIA | PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | NIT. | 901.835.570-9 | FECHA | DIA | MES / AÑO |
| CONTRATO Nro: | CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP | | | | 19 | 12 / 2024 |

**DESCRIPCION**

| **1.20 Limpieza, retiro de escombros, parchado de grietas con sellador tipo resina liquida de poliuretano o similar, alisado de superficies irregulares, limpieza de bajantes, nivelado de la placa para dar la pendiente hacia bajantes con mortero autonivelante reforzado con fibra de vidrio, aplicación de manto asfaltico con foil de aluminio, fijaciopn mediante brea liquida y aplicación de calor** | | | | **M2** |
|---|---|---|---|---|
| **TRAMO** | **LARGO** | **ANCHO** | **ALTURA** | **PARCIAL** |
| A. POLICIA JUDICIAL | 7,40 | 7,90 | | 58,46 |
| **TOTAL M2 DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZADA** | | | | **58,46** |

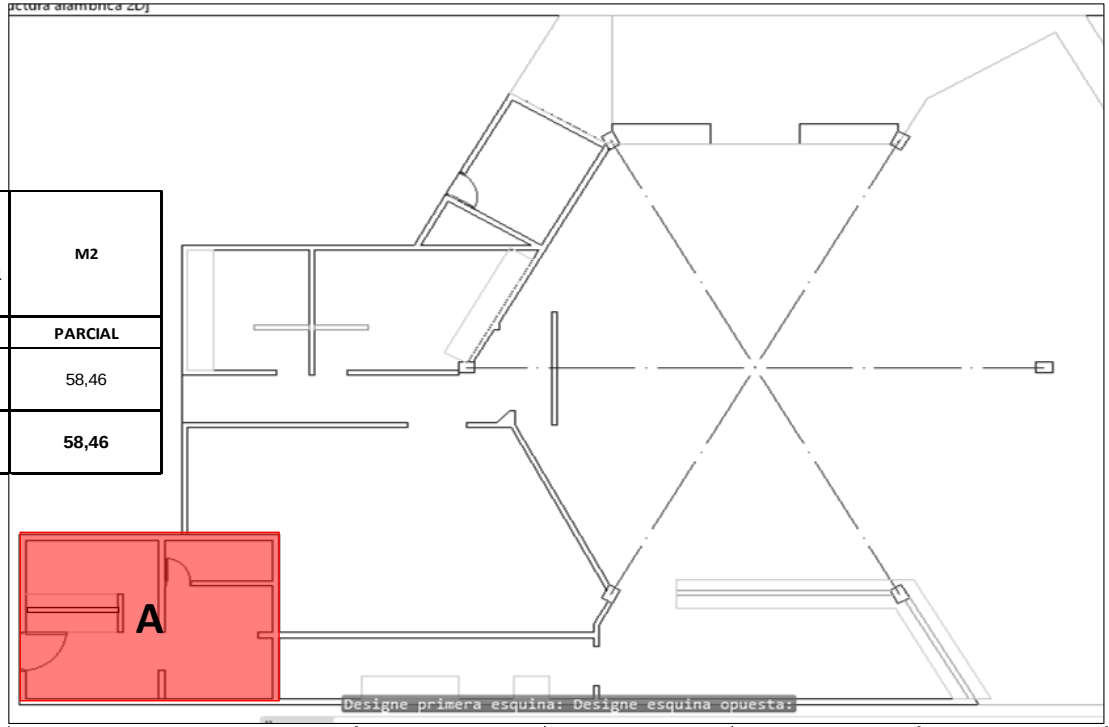



| **TOTAL M2 DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZADA** | **58,46** |
|---|---|

| ELABORO: | CONTRATISTA: | Vo.Bo. INTERVENTORIA | Vo.Bo. SUPERVISOR |
|---|---|---|---|
| **Arq. JORGE E MORALES RUIZ** | **RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA** | **RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO | ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA. | | | Nro. VALE | | 001 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VENTURA | NIT. | 901.550.907-2 | | | |
| INTERVENTORIA | PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | NIT. | 901.835.570-9 | FECHA | DIA | MES / AÑO |
| CONTRATO Nro: | CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP | | | | 19 | 12 / 2024 |

**DESCRIPCION**

| 1.29 Muro en Mampostería de e:15 cm en Bloque #5, afirmado y pañetado pór ambas caras con mortero 1:3 incluye grapas de fijación a muros existentes, corte de acabado e instalado sobre placa estructural. | LARGO | ALTURA | DCTO | PARCIAL M2 |
|---|---|---|---|---|
| TRAMO - M1 | 6,97 | 2,90 | 0,00 | 20,21 |
| TRAMO - M2 | 1,59 | 2,60 | 0,00 | 4,13 |
| TRAMO - M3 | 1,43 | 2,00 | 0,00 | 2,86 |
| TRAMO - M4 | 3,03 | 2,40 | -1,82 | 5,45 |
| TRAMO - M5 | 2,53 | 2,40 | -1,82 | 4,25 |
| TRAMO - M6 | 3,20 | 2,40 | -1,82 | 5,86 |
| TRAMO - M7 | 3,10 | 2,40 | -1,82 | 5,62 |
| TRAMO - M8 | 3,00 | 2,40 | -1,82 | 5,38 |
| TRAMO - M9 | 3,00 | 2,40 | -1,82 | 5,38 |
| TRAMO - M10 | 3,07 | 2,40 | -1,82 | 5,55 |
| TRAMO - M11 | 2,58 | 2,40 | -1,82 | 4,37 |
| TOTAL M2 DE MAMPOSTERIA | | | | 69,07 |

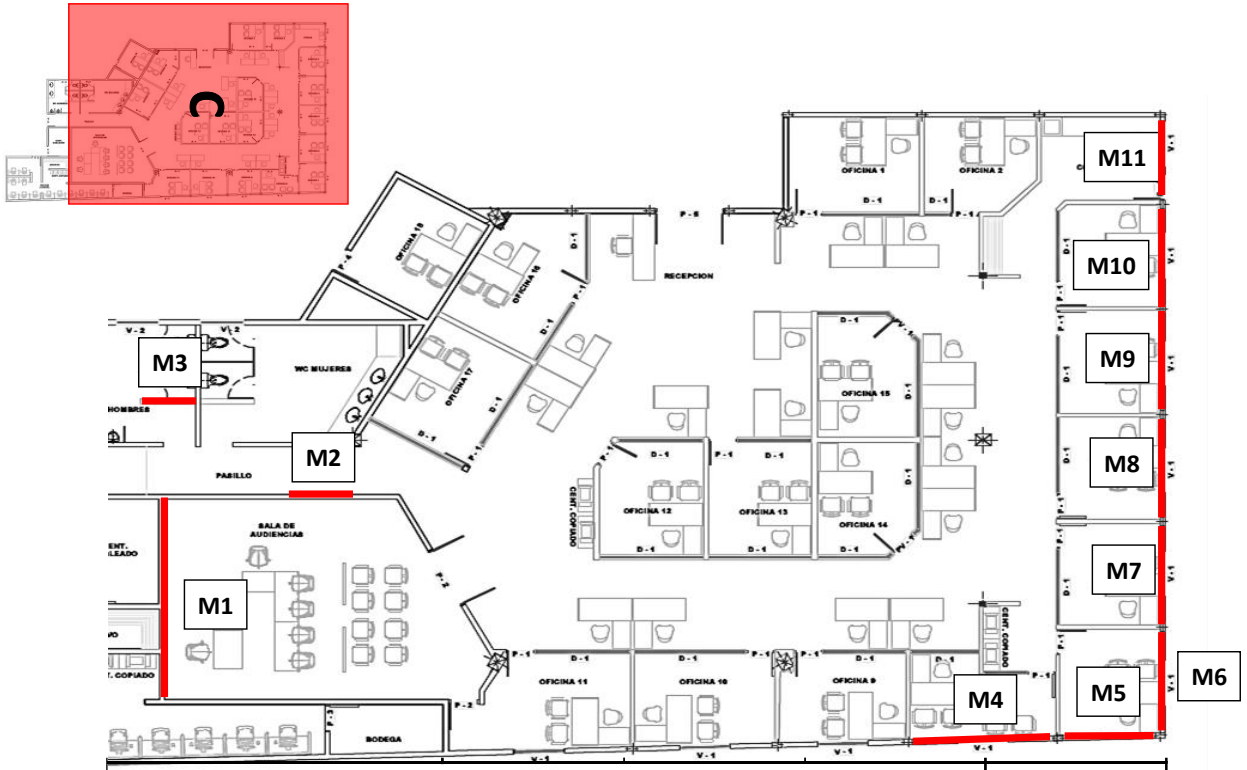


| TOTAL M2 DE MAMPOSTERIA | 69,07 |
|---|---|


| ELABORO: | CONTRATISTA: | Vo.Bo. INTERVENTORIA | Vo.Bo. SUPERVISOR |
|---|---|---|---|
| Arq. JORGE E MORALES RUIZ | RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA | RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO | ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA. | | | Nro. VALE | | 001 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VENTURA | NIT. | 901.550.907-2 | | | |
| INTERVENTORIA | PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | NIT. | 901.835.570-9 | FECHA | DIA | MES | AÑO |
| CONTRATO Nro: | CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP | | | | 19 | 12 | 2024 |

## DESCRIPCION

**1.30 Columneta de confinamiento en concreto 3000psi 0,25 x 0,12, con refuerzo principal 4#4, anclado a elementos estructurales, superior e inferior + flejes #2 cada 0,15cm. Incluye formaleta y todo lo necesarrio para su ejecución.** — MI

| TRAMO | LARGO | ANCHO | ALTURA | PARCIAL |
|---|---|---|---|---|
| COLUMNETA - **C1** | | | 3,40 | 3,40 |
| COLUMNETA - **C2** | | | 2,40 | 2,40 |
| COLUMNETA - **C3** | | | 2,40 | 2,40 |
| COLUMNETA - **C4** | | | 2,40 | 2,40 |
| COLUMNETA - **C5** | | | 2,40 | 2,40 |
| COLUMNETA - **C6** | | | 2,40 | 2,40 |
| COLUMNETA - **C7** | | | 2,40 | 2,40 |
| COLUMNETA - **C8** | | | 2,40 | 2,40 |
| COLUMNETA - **C9** | | | 2,40 | 2,40 |
| COLUMNETA - **C10** | | | 2,40 | 2,40 |
| COLUMNETA - **C11** | | | 5,00 | 5,00 |
| **TOTAL MI DE COLUMNETAS** | | | | **30,00** |






| | |
|---|---|
| **TOTAL MI DE COLUMNETAS** | **30,00** |

| ELABORO: | CONTRATISTA: | Vo.Bo. INTERVENTORIA | Vo.Bo. SUPERVISOR |
|---|---|---|---|
| **Arq. JORGE E MORALES RUIZ** | **RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA** | **RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO | ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA EN CUCUTA. | | | Nro. VALE | | 001 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VENTURA | NIT. | 901.550.907-2 | | | |
| INTERVENTORIA | PALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | NIT. | 901.835.570-9 | FECHA | DIA | MES / AÑO |
| CONTRATO Nro: | CONTRATO DE OBRA No. 055-2024 UAEJPMP | | | | 19 | 12 / 2024 |

## DESCRIPCION

| 1.31 Vigueta de confinamiento en concreto 3000psi 0,25 x 0,12m + refuerzo principal 4#4, anclado a elementos estructurales horizontales + flejes #2@15cm, Incluye formaleta y todo lo necesarrio para su ejecución. | | | | M2 |
|---|---|---|---|---|
| **TRAMO** | **TRAMO** | | **CANT** | **PARCIAL** |
| TRAMO 1 | 7,40 | | 1,00 | 7,40 |
| TRAMO 2 | 19,30 | | 1,00 | 19,30 |
| **TOTAL ML VIGUETA CONFINAMIENTO** | | | | **26,70** |






| TOTAL ML VIGUETA CONFINAMIENTO | 26,70 |
|---|---|

| ELABORO: | CONTRATISTA: | Vo.Bo. INTERVENTORIA | Vo.Bo. SUPERVISOR |
|---|---|---|---|
| Arq. JORGE E MORALES RUIZ | RPTE LEGAL CONSORCIO VENTURA | RPTE LEGALPALO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS | |
