	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN 2 | **2**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. 751 de fecha 06 de octubre de 2023

CONSECUTIVO N° 3247

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-708-2023	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	31 DE MAYO DE 2023	**FECHA INCIO**	01 DE AGOSTO DE 2023
	ICCU-815-2023	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	07 DE JUNIO DE 2023	**FECHA INCIO**	01 DE AGOSTO DE 2023
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO PASCA CNJ	**NIT**	901.715.912-1
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		COPEBA S.A.S.	**NIT**	830.011.122-9
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATÉ – FUSAGASUGÁ – PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500".				
PLAZO EJECUCIÓN OBRA	SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DÍAS O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, LO PRIMERO QUE OCURRA				
PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA	SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DÍAS O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, LO PRIMERO QUE OCURRA				
MODIFICACIONES AL CONVENIO (DetallaR Otrosies, modificatorios, etc)	MODIFICATORIO DE OBRA: ITEMS NO PREVISTOS SUSCRITO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 MODIFICATORIO DE INTERVENTORIA: AMPLIACION DE VEHICULO PARA EL TRANSPORTE DE LOS PROFESIONALES EN TERRNO				
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	N/A				
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN	SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DÍAS O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, LO PRIMERO QUE OCURRA				
FORMA DE PAGO - OBRA	1- Un anticipo equivalente al (30%). 2- El 65% mediante actas parciales mensuales. 3- Un pago final del 5% con el acta de liquidación.			**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$17.862.489.434,00
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	1- Un anticipo equivalente al (30%). 2- El 65% mediante actas parciales mensuales. 3- Un pago final del 5% con el acta de liquidación.			**VALOR DEL CONTRATO (incluir**	$1.032.793.845,00
		PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		

3. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**100263154**	1 de agosto de 2023	16 de agosto de 2024	$ 3.572.497.887,00
Pago de salarios	**100263154**	1 de agosto de 2023	16 de agosto de 2024	$ 893.124.472,00
Estabilidad de la obra	**100263154**	15 de febrero de 2024	15 de febrero de 2029	$ 5.358.746.831,00
Todo Riesgo	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Contrato de interventoría

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**15-44-**	1 de agosto de 2023	16 de agosto de 2024	$ 154.918.623,15
Pago de salarios	**15-44-**	1 de agosto de 2023	15 de febrero de 2027	$ 103.279.082,10
Calidad del servicio	**15-44-**	15 de febrero de 2024	15 de febrero de 2029	$ 206.558.164,20
Todo Riesgo	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)	**Responsable diligenciamiento**	**JAISON FONSECA MARIN**
	Fecha diligenciamiento	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023

4. DESCRICIÓN DEL AVANCE

Se realiza recorrido en compañía del personal de Obra e Interventoria y se evidencia personal en la obra, maquinaria y se realizan las actividades programadas.

RELACIÓN PROGRAMADO/EJECUTADO:
A la fecha se tiene un avance:
Programado: 8,25%
Ejecutado a la Fecha: 11,47%
Ejecucíon Adelantada: 3,22%

5. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO PASCA CNJ	COPEBA S.A.S.
Anticipo	$5.358.746.830,00	$309.837.246,00
Pago No. 1	$37.411.377,56	$24.349.350,56
Pago No. 2	$1.402.267.875,46	$33.113.421,09
Pago No. 3	$0,00	$0,00
Pago No. 4	$0,00	$0,00
Pago No. 5 (Insertar las filas necesarias)	$0,00	$0,00
Valor Pagado Total	$6.798.426.083,00	$367.300.017,65
Saldo Pendiente por Cancelar	$11.064.063.351,00	$665.493.827
Porcentaje de ejecución	38%	36%

6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se	**Responsable diligenciamiento**	**JAISON FONSECA MARIN**

Se verifico pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.	**Fecha diligenciamiento**			

7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL				
Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**SI**	**Chalecos**	**SI**
	Cascos	**SI**	**Otros**	**N/A**
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**X**	**NO**	**N/A**

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

En la visita y como se evidencia en el registro fotografico se puede observar que se esta cumpliendo con lo establecido en el contrato, que se tienen varios frentes de trabajo y que todos cuentas con sus EPP, se evidencia tambien el PMT.

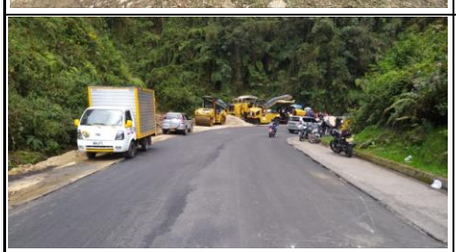








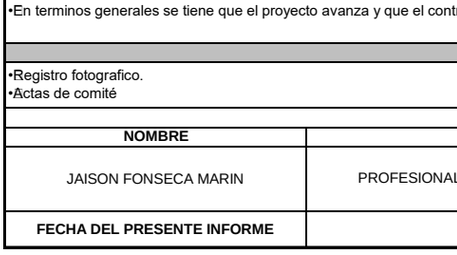










9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

•En terminos generales se tiene que el proyecto avanza y que el contratista esta cumpliendo con lo establecido inicialmente.

10- ANEXOS

•Registro fotografico.
•Actas de comité

FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS

NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - ELABORÓ**
JAISON FONSECA MARIN	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SUPERVISOR - ICCU	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	01 DE NOVIEMBRE DE 2023	
