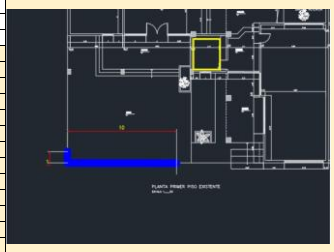
Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de protector sobre fachada en poli sombra, incluye accesorios y elementos para su fijación.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 1,1	22,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Polisombra	Fachada Transferencia	22		11	2,0	22

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN: Lavada de fachada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye retiro de material extraño y piezas rotas)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 1,2	395,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
fachada	lateral izquierda			14,30	6,40	91,52
fachada	volado lateral izquierda			18,00	2,00	36,00
fachada	columnas	2,0		2,00	4,50	18,00
fachada	frente			4,40	5,25	23,10
fachada	frente volado con canal			21,45	1,70	36,47
fachada	frente derecho 1			6,00	9,60	57,60
fachada	lateral dereca 1			4,69	4,40	20,62
fachada	frente 2			4,70	11,20	52,64
fachada	terraza piso 2			8,80	4,00	35,20
fachada				3,80	1,00	3,80
fachada				3,00	1,00	3,00
fachada				1,80	1,00	1,80
fachada				5,00	1,00	5,00
fachada	tapa derecha			5,70	1,80	10,26


Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN: Rasqueteada de pintura y retiro de material en mal estado

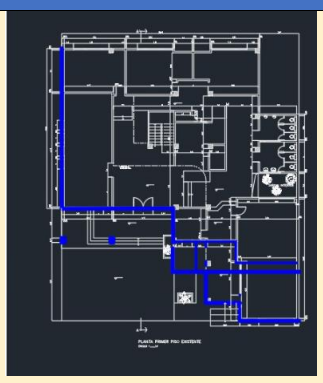ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 1,3	245,00	M2		

DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
fachada	lateral izquierda			14,30	6,40	91,52
fachada	volado laterl izquierda			15,00	2,00	30,00
fachada	columnas	2,0		2,00	4,40	17,60
fachada	frente			4,40	5,14	22,60
fachada	frente volado con canal			12,00	1,70	20,40
fachada	frente derecho 1			4,00	8,60	34,40
fachada	lateral dereca 1			3,60	4,40	15,84
fachada	frente 2			4,70	9,20	43,24
vetanas	vetanas	8		1,6	1,0	-12,8
vetanas	vetanas	4		1,6	1,0	-6,4
ventana	ventana	4		1,6	1,0	-6,4
ventana	ventana			2	2,5	-5,00

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco		

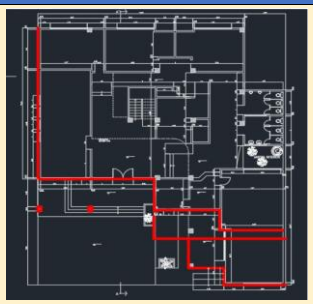ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 1,4	218,47	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
fachada	lateral izquierda			16,30	6,40	104,32
fachada	volado laterl izquierda			20,00	2,00	40,00
fachada	columnas	2,0		2,00	3,40	13,60
fachada	frente			5,25	3,40	17,85
fachada	frente derecho 1			10,60	3,00	31,80
fachada	lateral dereca 1			4,69	2,40	11,26
fachada	frente 2			2,70	11,20	30,24
vetanas	vetanas	8		1,6	1,0	-12,8
vetanas	vetanas	4		1,6	1,0	-6,4
ventana	ventana	4		1,6	1,0	-6,4
ventana	ventana			2	2,5	-5,00

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura
DESCRIPCIÓN	Suministro y aplicación de sellador para superficie altamente alcalina		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 1,5	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura
DESCRIPCIÓN	Suministro y aplicación de pintura acrílica resistente a climas tropicales como la humedad y el calor extremo (para exterior) a 3 manos		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 1,6	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN: Desmonte de puertas en madera incluye hoja y marco metálico

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 2,1	0,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Desmonte	Primer piso	3				

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de puertas de una nave en madera , cuyas medidas son entre 70 a 90 cm de ancho x 180 -220 cm de alto - incluido marco, largueros, travesaños, hojas o panel y cerrajería

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 2,2	0,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de puerta de una nave de madera, diseño y color igual a las existentes, debidamente lijada, masillada y pintada, cuyas medidas son entre 70 a 100 cm de ancho x 180 -210 cm de alto, incluye marco, tapa luz, bisagras, herrajes y cerradura.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 2,3	0	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Puerta	Transferencia	3				

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de marco metálico para puerta en madera de medidas entre 70 a 100 cm de ancho x 180 -210 cm de alto

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 2,4	0,00	UND		

DISCRIMINACIÓN						
elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura
DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de chapa bola para puerta en madera		

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 2,5	0,00	UND		


DISCRIMINACIÓN						
elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Chapa	Transferencia					

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN		INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura
DESCRIPCIÓN	Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado		

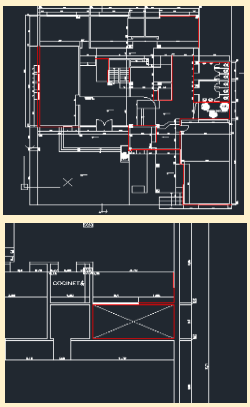ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 3,1	147,48	M2		

DISCRIMINACIÓN						
elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
paredes interiores	zonas comunes			11,40	1,20	13,68
paredes interiores	Sala 1			4,75	2,65	12,59
paredes interiores	Sala 1			6,45	2,65	17,09
paredes interiores	Juzgado 3			7,35	2,65	19,48
paredes interiores	zonas comunes			3,20	1,20	3,84
paredes interiores	zonas comunes			4,60	1,20	5,52
paredes interiores	zonas comunes			1,30	1,20	1,56
paredes interiores	zonas comunes			2,05	1,20	2,46
paredes interiores	zonas comunes			2,50	1,20	3,00
paredes interiores	zonas comunes			7,40	1,20	8,88
paredes interiores	zonas comunes			2,00	1,20	2,40
paredes interiores	zonas comunes			1,80	1,20	2,16
paredes interiores	zonas comunes			3,20	1,20	3,84
paredes interiores	Patio			7,10	3,80	26,98
paredes interiores	Patio			7,10	3,80	26,98
paredes interiores	Patio			7,10	2,40	17,04
paredes interiores	Patio			7,10	2,40	17,04
ventanas	ventanas	3	1,2		1,60	-5,71
ventanas	ventanas	1	1,10		1,50	-1,65
ventanas	ventanas	1	1,00		1,60	-1,60
puertas	puertas		0,85		2,00	-1,70
puertas	puertas	8	0,75		2,00	-12,00
puertas	puertas	8	0,90		2,00	-14,40

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura


DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
F. 3,2	147,48	M2

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
paredes interiores	zonas comunes			11,40	1,20	13,68
paredes interiores	Sala 1			4,75	2,65	12,59
paredes interiores	Sala 1			6,45	2,65	17,09
paredes interiores	Juzgado 3			7,35	2,65	19,48
paredes interiores	zonas comunes			3,20	1,20	3,84
paredes interiores	zonas comunes			4,60	1,20	5,52
paredes interiores	zonas comunes			1,30	1,20	1,56
paredes interiores	zonas comunes			2,05	1,20	2,46
paredes interiores	zonas comunes			2,50	1,20	3,00
paredes interiores	zonas comunes			7,40	1,20	8,88
paredes interiores	zonas comunes			2,00	1,20	2,40
paredes interiores	zonas comunes			1,80	1,20	2,16
paredes interiores	zonas comunes			3,20	1,20	3,84
paredes interiores	Patio			7,10	3,80	26,98
paredes interiores	Patio			7,10	3,80	26,98
paredes interiores	Patio			7,10	2,40	17,04
paredes interiores	Patio			7,10	2,40	17,04
ventanas	ventanas	3	1,2		1,60	-5,71
ventanas	ventanas	1	1,10		1,50	-1,65
ventanas	ventanas	1	1,00		1,60	-1,60
puertas	puertas		0,85		2,00	-1,70
puertas	puertas	8	0,75		2,00	-12,00
puertas	puertas	8	0,90		2,00	-14,40

PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO



Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura


DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de estuco plástico

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD
F. 3,3	147,48	M2


DISCRIMINACIÓN


elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
paredes interiores	zonas comunes			11,40	1,20	13,68
paredes interiores	Sala 1			4,75	2,65	12,59
paredes interiores	Sala 1			6,45	2,65	17,09
paredes interiores	Juzgado 3			7,35	2,65	19,48
paredes interiores	zonas comunes			3,20	1,20	3,84
paredes interiores	zonas comunes			4,60	1,20	5,52
paredes interiores	zonas comunes			1,30	1,20	1,56
paredes interiores	zonas comunes			2,05	1,20	2,46
paredes interiores	zonas comunes			2,50	1,20	3,00
paredes interiores	zonas comunes			7,40	1,20	8,88
paredes interiores	zonas comunes			2,00	1,20	2,40
paredes interiores	zonas comunes			1,80	1,20	2,16
paredes interiores	zonas comunes			3,20	1,20	3,84
paredes interiores	Patio			7,10	3,80	26,98
paredes interiores	Patio			7,10	3,80	26,98
paredes interiores	Patio			7,10	2,40	17,04
paredes interiores	Patio			7,10	2,40	17,04
ventanas	ventanas	3	1,2		1,60	-5,71
ventanas	ventanas	1	1,10		1,50	-1,65
ventanas	ventanas	1	1,00		1,60	-1,60
puertas	puertas		0,85		2,00	-1,70
puertas	puertas	8	0,75		2,00	-12,00
puertas	puertas	8	0,90		2,00	-14,40


PLANO DE CANTIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO

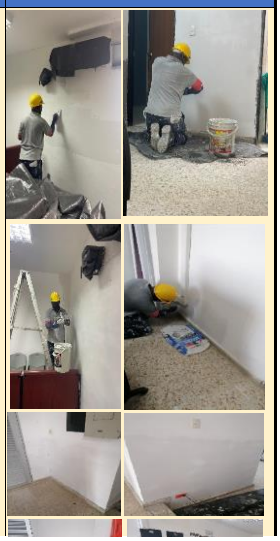







Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN					INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura
DESCRIPCIÓN	Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos)					
ITEM	**CANTIDAD TOTAL**	**UNIDAD**			**PLANO DE CANTIDADES**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
F. 3,4	**0,00**	**M2**				

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN					INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura
DESCRIPCIÓN	Suministro y aplicación de pintura en esmalte					
ITEM	**CANTIDAD TOTAL**	**UNIDAD**			**PLANO DE CANTIDADES**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
F. 3,5	**0,00**	**M2**				

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
						0

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN					INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura
DESCRIPCIÓN	Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 1					
ITEM	**CANTIDAD TOTAL**	**UNIDAD**			**PLANO DE CANTIDADES**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
F. 3,6	**0,00**	**M2**				

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 3,7	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Zonas comunes						

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 3,8	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Zonas comunes						

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de estuco plástico

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 3,9	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
zonas comunes						

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 3,10	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
zonas comunes						

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro y aplicación de pintura en esmalte

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 3,11	0,00	M2		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
zonas comunes						




Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Lavada de cubierta con agua a chorro de aspersión con hipoclorito.(incluye retiro de material extraño y debe realizarse con belt manlift)

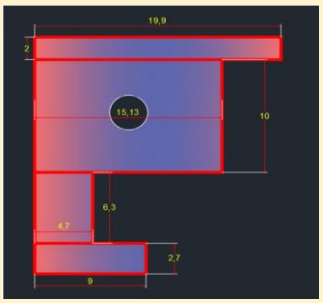ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 4,1	245,00	M2		      

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
Lavada	Cubierta		6,30	4,70		29,61
Lavada	Cubierta		2,70	9,00		24,30
Lavada	Cubierta		10,00	15,13		151,29
Lavada	Cubierta Baja archivo posterior		2,00	19,90		39,80

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Aseo general.

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 4,5	199,97	M2	 	       

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total
aseo general	transferecnia lado derecho		2	19,45		38,90
aseo general	Juzgado 1 piso		4,82	11,39		54,90
aseo general	Pasillo frente juzgados		11,26	5,14		57,88
aseo general	fachada lado izquierdo		12,64	2,00		25,28
aseo general	fachada lado derecho		2,07	11,12		23,02

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN retiro de rejilla sifón (incluye demolición y retiro)

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 4,6	0,00	UND		

DISCRIMINACIÓN

elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca

MEMORIA DE CÁLCULO DE EJECUCIÓN	INMUEBLE	Edificio de Transferencia de Buenaventura

DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de sifón de 3"

ITEM	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	PLANO DE CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
F. 4,7	0,00	UND		

DISCRIMINACIÓN						
elemento	Ubicación	Cantidad	Ancho	Largo	Alto	total

Vo Bo Director Obra
