
Culturas

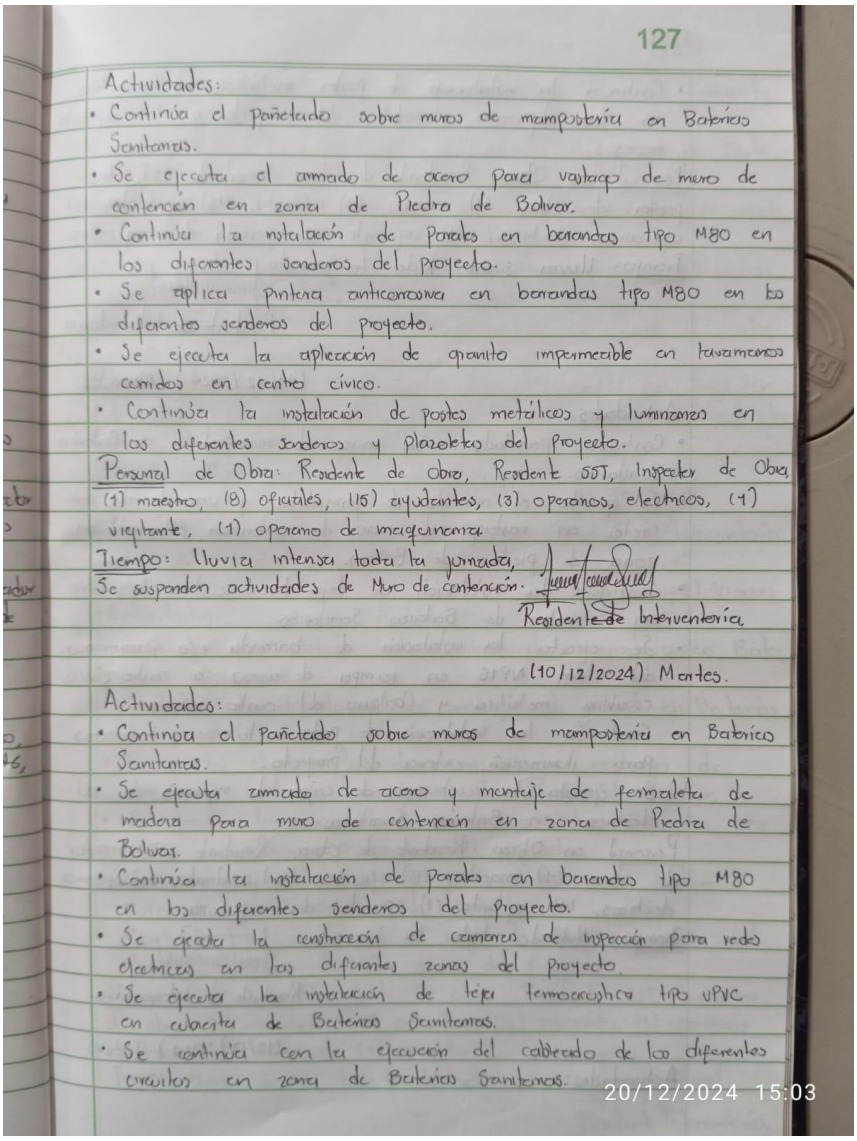

127

Actividades:

- Continúa el pañetado sobre muros de mampostería en Baterías Sanitarias.
- Se ejecuta el armado de acero para vaciado de muro de contención en zona de Piedra de Bolivar.
- Continúa la instalación de pasamanos en barandas tipo M80 en los diferentes senderos del proyecto.
- Se aplica pintura anticorrosiva en barandas tipo M80 en los diferentes senderos del proyecto.
- Se ejecuta la aplicación de granito impermeable en tratamientos curvos en centro cívico.
- Continúa la instalación de postes metálicos y luminarias en los diferentes senderos y plazoletas del proyecto.

Personal de Obra: Residente de obra, Residente SST, Inspector de Obra, (1) maestro, (8) oficiales, (15) ayudantes, (3) operarios, electricos, (1) vigilante, (1) operario de mantenimiento.

Tiempo: lluvia intensa toda la jornada, Se suspenden actividades de Muro de contención.

Residente de interventoría


(10/12/2024) Martes.

Actividades:

- Continúa el pañetado sobre muros de mampostería en Baterías Sanitarias.
- Se ejecuta armado de acero y monteje de formaleta de madera para muro de contención en zona de Piedra de Bolivar.
- Continúa la instalación de pasamanos en barandas tipo M80 en los diferentes senderos del proyecto.
- Se ejecuta la construcción de cámaras de inspección para redes electricas en las diferentes zonas del proyecto.
- Se ejecuta la instalación de tapa termoacustica tipo uPVC en cubierta de Baterías Sanitarias.
- Se continúa con la ejecución del cableado de los diferentes circuitos en zona de Baterías Sanitarias.

20/12/2024 15:03

Culturas

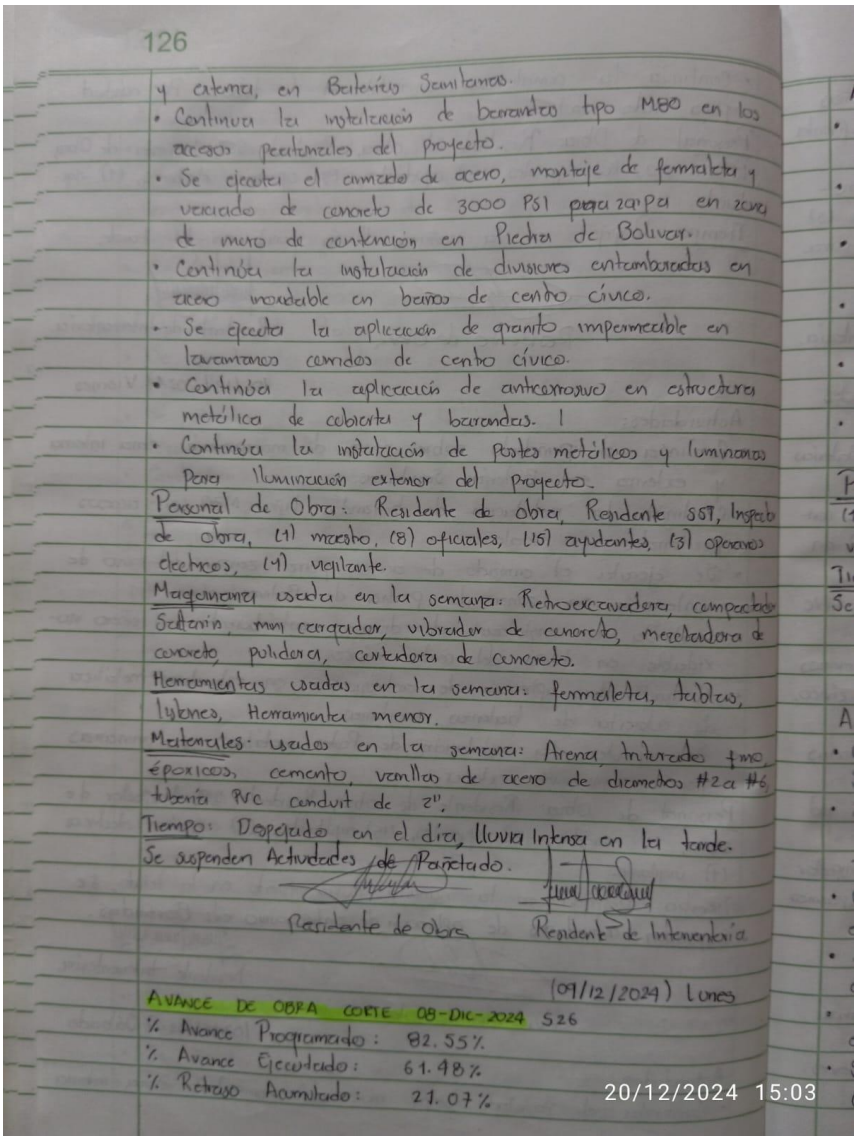

126

y cabeceras, en Baterías Sanitarias.
- Continúa la instalación de barandas tipo M30 en los accesos peatonales del proyecto.
- Se ejecuta el armado de acero, montaje de formaleta y vaciado de concreto de 3000 PSI para zapata en zona de muro de contención en Piedras de Bolívar.
- Continúa la instalación de divisiones entamboradas en acero inoxidable en baños de centro cívico.
- Se ejecuta la aplicación de granito impermeable en tratamientos comunes de centro cívico.
- Continúa la aplicación de anticorrosivo en estructura metálica de cobertura y barandas.
- Continúa la instalación de Postes metálicos y luminarias para iluminación exterior del proyecto.

Personal de Obra: Residente de obra, Residente SST, Ingeniero de obra, (1) maestro, (8) oficiales, (15) ayudantes, (3) operarios electricos, (4) vigilante.

Maquinaria usada en la semana: Retroexcavadora, compactador Stafenin, mini cargador, vibrador de concreto, mezcladora de concreto, polidora, cortadora de concreto.

Herramientas usadas en la semana: formaletas, tablas, tylenes, Herramienta menor.

Materiales: usados en la semana: Arena, triturado fino, epoxicos, cemento, varillas de acero de diametros #2 a #6, tubería PVC conduit de 2".

Tiempo: Despejado en el día, lluvia intensa en la tarde. Se suspenden Actividades de Pañetado.

Residente de Obra Residente de Interventoría


(09/12/2024) Lunes

AVANCE DE OBRA CORTE 08-DIC-2024 S26

% Avance Programado: 82.55%
% Avance Ejecutado: 61.48%
% Retraso Acumulado: 21.07%

20/12/2024 15:03

Culturas

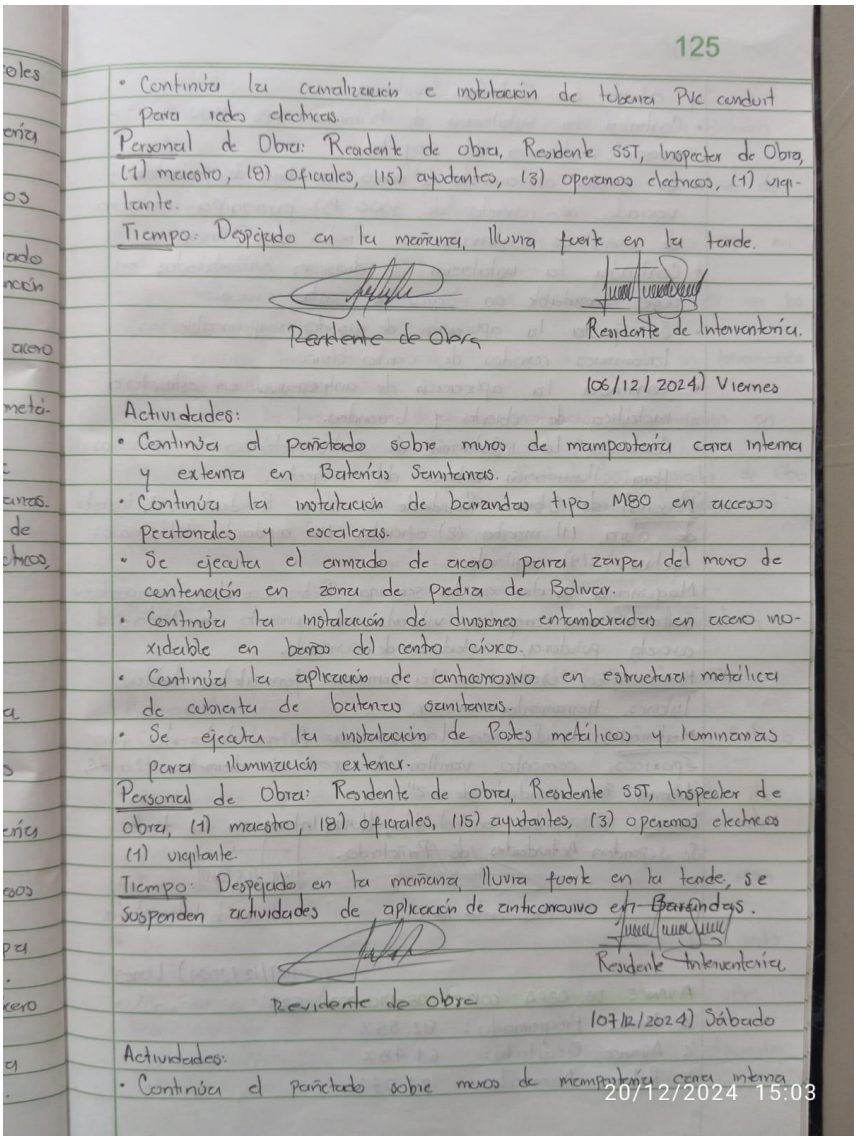

125

- Continúa la canalización e instalación de tuberías PVC conduit para redes electricas.

Personal de Obra: Residente de obra, Residente SST, Inspector de Obra, (1) maestro, (8) oficiales, (15) ayudantes, (3) operarios electricos, (1) vigilante.

Tiempo: Despejado en la mañana, lluvia fuerte en la tarde.

Residente de obra — Residente de Interventoría.

06/12/2024) Viernes

Actividades:

- Continúa el pañetado sobre muros de mampostería cara interna y externa en Baterías Sanitarias.
- Continúa la instalación de barandas tipo M80 en accesos peatonales y escaleras.
- Se ejecuta el armado de acero para zarpa del muro de contención en zona de piedra de Bolivar.
- Continúa la instalación de divisiones entamboradas en acero modulable en baños del centro cívico.
- Continúa la aplicación de anticorrosivo en estructuras metálicas de cubierta de baterías sanitarias.
- Se ejecuta la instalación de Postes metálicos y luminarias para iluminación exterior.

Personal de Obra: Residente de obra, Residente SST, Inspector de obra, (1) maestro, (8) oficiales, (15) ayudantes, (3) operarios electricos (1) vigilante.

Tiempo: Despejado en la mañana, lluvia fuerte en la tarde, se suspenden actividades de aplicación de anticorrosivo en ~~Barandas~~.

Residente de obra — Residente Interventoría.

07/12/2024) Sábado

Actividades:

- Continúa el pañetado sobre muros de mampostería cara interna

20/12/2024 15:03

Culturas



Culturas



Culturas



Culturas



Culturas



Culturas



Culturas



Culturas



Culturas



Culturas

