ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTIÓN CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

CONTRATO No.				FECHA DE ELABORACION:	23 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA:	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	NIT [X] CC [ ] NUMERO:	CONSORCIO SAN DIEGO 901.853.381-1			
OBJETO :	"LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI"			FECHA DE INICIO:	21 DE AGOSTO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970,00	PRORROGA 1:	Quince (15) dias	FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78.525.153,00	PRORROGA 2:	Siete (07) dias	FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3.460.305.123,00	PRORROGA 3:	N/A	FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			PERIODO PRESENTE ACTA	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	HASTA EL: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.4		EJECUCION							
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO)	M2	8.271,20	$ 1.716,00	$ 14.193.380,00	20.979,69	$ 36.001.148,00	9.956,33	$ 17.085.063,00	11.023,36	$ 18.916.085,00	20.979,69	$ 36.001.148,00	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS)	ML	3.179,00	$ 6.356,00	$ 20.205.724,00	4.539,20	$ 28.851.155,00	2.655,50	$ 16.878.358,00	1.883,70	$ 11.972.797,00	4.539,20	$ 28.851.155,00	-	$ -
Subtotal					**$ 34.399.104,00**		**$ 64.852.303,00**		**$ 33.963.421,00**		**$ 30.888.882,00**		**$ 64.852.303,00**		**$ 0,00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	8.606,20	$ 22.513,00	$ 193.751.381,00	41,11	$ 925.509,00	-	$ -	41,11	$ 925.509,00	41,11	$ 925.509,00	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	1.466,60	$ 9.327,00	$ 13.678.978,00	619,83	$ 5.781.154,00	161,91	$ 1.510.135,00	457,92	$ 4.271.019,00	619,83	$ 5.781.154,00	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO NO INCLUYE RETIRO.	M3	324,56	$ 103.237,00	$ 33.506.085,00	1.393,51	$ 143.862.163,00	799,77	$ 82.566.227,00	593,74	$ 61.295.936,00	1.393,51	$ 143.862.163,00	-	$ -
Subtotal					**$ 240.936.444,00**		**$ 150.568.826,00**		**$ 84.076.362,00**		**$ 66.492.464,00**		**$ 150.568.826,00**		**$ 0,00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN SECO EN MATERIAL COMUN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	53,00	$ 10.545,00	$ 558.885,00	0,00	$ 0,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	196,10	$ 60.034,00	$ 11.772.667,00	13,30	$ 798.452,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	13,30	$ 798.452,00
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	219,82	$ 43.679,00	$ 9.601.463,00	770,05	$ 33.635.014,00	-	$ -	383,80	$ 16.764.000,00	383,80	$ 16.764.000,00	386,25	$ 16.871.014,00
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM	191,10	$ 3.355,00	$ 641.141,00	19.633,80	$ 65.871.393,00	10.796,93	$ 36.223.695,00	8.836,87	$ 29.647.698,00	19.633,80	$ 65.871.393,00	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB	2,00	$ 2.588.680,00	$ 5.177.360,00	2,00	$ 5.177.360,00	2,00	$ 5.177.360,00	-	$ -	2,00	$ 5.177.360,00	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	265,00	$ 8.282,00	$ 2.194.730,00	906,93	$ 7.511.194,00	-	$ -	906,93	$ 7.511.194,00	906,93	$ 7.511.194,00	-	$ -
Subtotal					**$ 29.946.246,00**		**$ 112.993.413,00**		**$ 41.401.055,00**		**$ 53.922.892,00**		**$ 95.323.947,00**		**$ 17.669.466,00**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	880,12	$ 212.313,00	$ 186.860.918,00	207,35	$ 44.023.101,00	51,63	$ 10.961.721,00	155,72	$ 33.061.380,00	207,35	$ 44.023.101,00	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	9.206,30	$ 28.591,00	$ 263.217.323,00	9.888,15	$ 282.712.097,00	9.888,15	$ 282.712.097,00	-	$ -	9.888,15	$ 282.712.097,00	-	$ -
Subtotal					**$ 450.078.241,00**		**$ 326.735.198,00**		**$ 293.673.818,00**		**$ 33.061.380,00**		**$ 326.735.198,00**		**$ 0,00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO	M2	8.271,20	$ 4.818,00	$ 39.850.642,00	0,00	$ 0,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MAQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	12.677,23	$ 4.652,00	$ 58.974.451,00	0,00	$ 0,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	2.145,00	$ 7.184,00	$ 15.409.680,00	7.155,60	$ 51.405.830,00	2.017,70	$ 14.495.157,00	5.137,90	$ 36.910.673,00	7.155,60	$ 51.405.830,00	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML	300,00	$ 14.328,00	$ 4.298.400,00	0,00	$ 0,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2	12.093,20	$ 4.966,00	$ 60.054.831,00	29.892,73	$ 148.447.297,00	19.776,30	$ 98.209.106,00	10.116,43	$ 50.238.191,00	29.892,73	$ 148.447.297,00	-	$ -
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	191,10	$ 1.332.529,00	$ 254.646.292,00	1.360,42	$ 1.812.794.538,00	842,27	$ 1.122.344.902,00	497,73	$ 663.239.659,00	1.340,00	$ 1.785.584.561,00	20,42	$ 27.209.977,00
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	772,52	$ 1.371.977,00	$ 1.059.883.102,00	0,00	$ 0,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	413,56	$ 1.425.083,00	$ 589.357.325,00	0,00	$ 0,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 2.082.474.723,00**		**$ 2.012.647.665,00**		**$ 1.235.049.165,00**		**$ 750.388.523,00**		**$ 1.985.437.688,00**		**$ 27.209.977,00**

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTIÓN CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

				FECHA DE ELABORACION:	23 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	NIT [X] CC [ ]	NUMERO:	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI"			FECHA DE INICIO:	21 DE AGOSTO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.381.779.970,00	PRORROGA 1:	Quince (15) dias	FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78.525.153,00	PRORROGA 2:	Siete (07) dias	FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3.460.305.123,00	PRORROGA 3:	N/A	FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			PERIODO PRESENTE ACTA	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	HASTA EL: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

		CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.4		EJECUCION							
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
VI	**CONCRETOS**														
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) FC=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO	ML	15,00	$ 42.650,00	$ 639.750,00	293,04	$ 12.498.156,00	-	$ -	293,04	$ 12.498.156,00	293,04	$ 12.498.156,00	-	$ -
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) FC=3000 PSI INCLUYE ANTISOL	ML	2,00	$ 92.763,00	$ 185.526,00	15,40	$ 1.428.550,00	-	$ -	15,40	$ 1.428.550,00	15,40	$ 1.428.550,00	-	$ -
Subtotal					**$ 825.276,00**		**$ 13.926.706,00**		**$ 0,00**		**$ 13.926.706,00**		**$ 13.926.706,00**		**$ 0,00**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**														
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015. LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	16.184,00	$ 3.927,00	$ 63.554.568,00	8.698,10	$ 34.157.439,00	-	$ -	6.527,60	$ 25.633.885,00	6.527,60	$ 25.633.885,00	2.170,50	$ 8.523.554,00
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015. LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	1.274,40	$ 64.328,00	$ 81.979.603,00	2.045,31	$ 131.570.702,00	-	$ -	1.344,28	$ 86.474.844,00	1.344,28	$ 86.474.844,00	701,03	$ 45.095.858,00
Subtotal					**$ 145.534.171,00**		**$ 165.728.141,00**		**$ 0,00**		**$ 112.108.729,00**		**$ 112.108.729,00**		**$ 53.619.412,00**
XI	**DRENAJES**														
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	98,44	$ 422.631,00	$ 41.603.796,00	17,00	$ 7.184.727,00	-	$ -	17,00	$ 7.184.727,00	17,00	$ 7.184.727,00	-	$ -
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F'c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS)	UND	176,88	$ 1.159.538,00	$ 205.099.081,00	6,00	$ 6.957.228,00	3,00	$ 3.478.614,00	3,00	$ 3.478.614,00	6,00	$ 6.957.228,00	-	$ -
Subtotal					**$ 246.702.877,00**		**$ 14.141.955,00**		**$ 3.478.614,00**		**$ 10.663.341,00**		**$ 14.141.955,00**		**$ 0,00**
XII	**NO PREVISTOS**														
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	0,00	$ 51.535,00	$ 0,00	1.395,56	$ 71.920.185,00	-	$ -	1.194,80	$ 61.574.018,00	1.194,80	$ 61.574.018,00	200,76	$ 10.346.167,00
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS	ML	0,00	$ 16.002,00	$ 0,00	652,64	$ 10.443.545,00	-	$ -	652,64	$ 10.443.545,00	652,64	$ 10.443.545,00	-	$ -
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS. CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3	0,00	$ 1.391.619,00	$ 0,00	215,67	$ 300.123.512,00	-	$ -	156,37	$ 217.600.505,00	156,37	$ 217.600.505,00	59,300	$ 82.523.007,00
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI	KG	0,00	$ 8.237,00	$ 0,00	3.934,52	$ 32.408.641,00	-	$ -	3.934,52	$ 32.408.641,00	3.934,52	$ 32.408.641,00	-	$ -
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F'c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS)	UND	0,00	$ 820.404,00	$ 0,00	35,00	$ 28.714.140,00	-	$ -	22,00	$ 18.048.888,00	22,00	$ 18.048.888,00	13,00	$ 10.665.252,00
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	0,00	$ 156.087,00	$ 0,00	11,00	$ 1.716.957,00	-	$ -	11,00	$ 1.716.957,00	11,00	$ 1.716.957,00	-	$ -
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	0,00	$ 37.174,00	$ 0,00	187,32	$ 6.963.434,00	-	$ -	187,32	$ 6.963.434,00	187,32	$ 6.963.434,00	-	$ -
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 452.290.414,00**		**$ 0,00**		**$ 348.755.988,00**		**$ 348.755.988,00**		**$ 103.534.426,00**

GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024			FECHA DE ELABORACION:	23 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	NIT [X] CC [ ] NUMERO: 901.853.381-1				
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			FECHA DE INICIO:	21 DE AGOSTO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	PRORROGA 1:	Quince (15) dias	FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	PRORROGA 2:	Siete (07) dias	FECHA DE FINALIZACION PRORROGA 1:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	PRORROGA 3:	N/A	FECHA DE FINALIZACION PRORROGA 2:	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION PRORROGA 3:	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ				

			PERIODO PRESENTE ACTA			
			DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	HASTA EL:	HASTA EL: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024	
SUBTOTAL OBRAS	$ 3,230,697,076.00	$ 3,313,884,621.00	$ 1,691,642,435.00	$ 1,420,208,905.00	$ 3,111,851,341.00	$ 202,033,280.00
Plan de Adaptación de la Guia Ambiental - PAGA (2.02%)	$ 65,254,121.00	$ 66,246,829.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 66,246,829.00
Plan de Manejo de Transito - PMT (2.65%)	$ 85,618,773.00	$ 80,173,673.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 80,173,673.00
VALOR TOTAL	$ 3,381,779,970	$ 3,460,305,123	$ 1,691,642,435	$ 1,420,208,905	$ 3,111,851,341	$ 348,453,782

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR OBRAS PRESENTE ACTA (ACTA No. 1)	$ 1,420,208,905.00
VALOR PAGA PRESENTE ACTA (2.02%)	$ 0.00
VALOR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (2.65%)	$ 0.00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 1,420,208,905

ESTADO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00
VALOR CONTRATO CON ADICION	$ 3,460,305,123
EJECUTADO A LA FECHA	$ 3,111,851,341
VALOR PAGADO	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 1,420,208,905
PENDIENTE POR PAGAR	$ 1,691,642,435
PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 348,453,782
% EJECUTADO	89.93%
VALOR NETO A PAGAR PRESENTA ACTA	$ 1,420,208,905

IVAN CAMILO LOPEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

LINDA DANIELA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ
SUB-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VIAL

APOYO A LA SUPERVISION
Cristian Zapata

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA PRESENTADAS EN ESTA ACTA SON RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y DEL CONTRATISTA.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

LOTE 03 - COMUNA 02 SEGUNDO SECTOR Y COMUNA 08

FRENTE 26 - Avenida 9 norte entre avenida 9a N y calle 18 norte

CONDICIONES CONTRACTUALES						**CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.4**		**EJECUCION**							
								ACTAS ANTERIORES		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				**CANTIDADES ACTUALIZADAS**									
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2	2,548.00	$ 1,716.00	$ 4,372,368.00	5,250.29	$ 9,009,498.00	5,250.29	$ 9,009,498.00	-	$ -	5,250.29	$ 9,009,498.00	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	546.00	$ 6,356.00	$ 3,470,376.00	1,002.40	$ 6,371,254.00	930.00	$ 5,911,080.00	72.40	$ 460,174.00	1,002.40	$ 6,371,254.00	-	$ -
Subtotal					**$ 7,842,744.00**		**$ 15,380,752.00**		**$ 14,920,578.00**		**$ 460,174.00**		**$ 15,380,752.00**		**$ 0.00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	2,548.00	$ 22,513.00	$ 57,363,124.00	41.11	$ 925,509.00	-	$ -	41.11	$ 925,509.00	41.11	$ 925,509.00	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	364.00	$ 9,327.00	$ 3,395,028.00	150.05	$ 1,399,516.00	26.25	$ 244,834.00	123.80	$ 1,154,682.00	150.05	$ 1,399,516.00	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3	191.10	$ 103,237.00	$ 19,728,591.00	434.89	$ 44,896,764.00	434.89	$ 44,896,764.00	-	$ -	434.89	$ 44,896,764.00	-	$ -
Subtotal					**$ 80,486,743.00**		**$ 47,221,789.00**		**$ 45,141,598.00**		**$ 2,080,191.00**		**$ 47,221,789.00**		**$ 0.00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10,545.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	191.10	$ 60,034.00	$ 11,472,497.00	13.30	$ 798,452.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	13.30	$ 798,452.00
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43,679.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM	191.10	$ 3,355.00	$ 641,141.00	5,871.02	$ 19,697,266.00	5,871.02	$ 19,697,266.00	-	$ -	5,871.02	$ 19,697,266.00	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2,588,680.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8,282.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 12,113,638.00**		**$ 20,495,718.00**		**$ 19,697,266.00**		**$ -**		**$ 19,697,266.00**		**$ 798,452.00**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	254.80	$ 212,313.00	$ 54,097,352.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2		$ 28,591.00	$ 0.00	5,182.11	$ 148,161,707.00	5,182.11	$ 148,161,707.00	-	$ -	5,182.11	$ 148,161,707.00	-	$ -
Subtotal					**$ 54,097,352.00**		**$ 148,161,707.00**		**$ 148,161,707.00**		**$ 0.00**		**$ 148,161,707.00**		**$ 0.00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	2,548.00	$ 4,818.00	$ 12,276,264.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	3,822.00	$ 4,652.00	$ 17,779,944.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7,184.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2	6,370.00	$ 4,966.00	$ 31,633,420.00	10,364.22	$ 51,468,717.00	10,364.22	$ 51,468,717.00	-	$ -	10,364.22	$ 51,468,717.00	-	$ -
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	191.10	$ 1,332,529.00	$ 254,646,292.00	452.43	$ 602,871,467.00	452.43	$ 602,871,467.00	-	$ -	452.43	$ 602,871,467.00	-	$ -
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3		$ 1,371,977.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	127.40	$ 1,425,083.00	$ 181,555,574.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 497,891,494.00**		**$ 654,340,184.00**		**$ 654,340,184.00**		**$ 0.00**		**$ 654,340,184.00**		**$ 0.00**
VI	**CONCRETOS**														

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: **23 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ				

								PERIODO PRESENTE ACTA							
								DESDE EL:	12 DE OCTUBRE DE 2024		**HASTA EL:**		**HASTA EL:**	22 DE NOVIEMBRE DE 2024	
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	15.40	$ 1,428,550.00	-	$ -	15.40	$ 1,428,550.00	15.40	$ 1,428,550.00	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 1,428,550.00**		**$ 0.00**		**$ 1,428,550.00**		**$ 1,428,550.00**		**$ 0.00**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**														
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	2,730.00	$ 3,927.00	$ 10,720,710.00	1,579.70	$ 6,203,482.00	-	$ -	995.20	$ 3,908,150.00	995.20	$ 3,908,150.00	584.50	$ 2,295,332.00
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	212.80	$ 64,328.00	$ 13,688,998.00	340.64	$ 21,912,690.00	-	$ -	230.98	$ 14,858,481.00	230.98	$ 14,858,481.00	109.66	$ 7,054,209.00
Subtotal					**$ 24,409,708.00**		**$ 28,116,172.00**		**$ 0.00**		**$ 18,766,631.00**		**$ 18,766,631.00**		**$ 9,349,541.00**
XI	**DRENAJES**														
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	18.20	$ 422,631.00	$ 7,691,884.00	5.00	$ 2,113,155.00	-	$ -	5.00	$ 2,113,155.00	5.00	$ 2,113,155.00	-	$ -
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	36.40	$ 1,159,538.00	$ 42,207,183.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 49,899,067.00**		**$ 2,113,155.00**		**$ 0.00**		**$ 2,113,155.00**		**$ 2,113,155.00**		**$ 0.00**
XII	**NO PREVISTOS**														
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	0.00	$ 51,535.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML	0.00	$ 16,002.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3	0.00	$ 1,391,619.00	$ 0.00	3.44	$ 4,787,169.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3.44	$ 4,787,169.00
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG	0.00	$ 8,237.00	$ 0.00	411.43	$ 3,388,949.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	411.43	$ 3,388,949.00
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	0.00	$ 820,404.00	$ 0.00	13.00	$ 10,665,252.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	13.00	$ 10,665,252.00
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	0.00	$ 156,087.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	0.00	$ 37,174.00	$ 0.00	9.85	$ 366,164.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	9.85	$ 366,164.00
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 19,207,534.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 19,207,534.00**
SUBTOTAL OBRAS					**$ 726,740,746.00**		**$ 936,465,561.00**		**$ 882,261,333.00**		**$ 24,848,701.00**		**$ 907,110,034.00**		**$ 29,355,527.00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00 **PRORROGA 1:** Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00 **PRORROGA 2:** Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00 **PRORROGA 3:** N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024 **HASTA EL:**	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

FRENTE 27 - Calle 18 norte entre la avenida 9 norte y CLL 21 norte

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1		EJECUCION							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS									
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2	514.50	$ 1,716.00	$ 882,882.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	0.00	$ 6,356.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 882,882.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	514.50	$ 22,513.00	$ 11,582,939.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	73.50	$ 9,327.00	$ 685,535.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3	0.00	$ 103,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 12,268,474.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10,545.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60,034.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43,679.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2,588,680.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8,282.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	51.45	$ 212,313.00	$ 10,923,504.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2		$ 28,591.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 10,923,504.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	514.50	$ 4,818.00	$ 2,478,861.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2		$ 4,652.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7,184.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2	514.50	$ 4,966.00	$ 2,555,007.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,332,529.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3		$ 1,371,977.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	25.73	$ 1,425,083.00	$ 36,660,260.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 41,694,128.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

				FECHA DE ELABORACION:	**23 DE NOVIEMBRE DE 2024**
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1				
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

VI	**CONCRETOS**																
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**																
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	735.00	$ 3,927.00	$ 2,886,345.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	22.40	$ 64,328.00	$ 1,440,947.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 4,327,292.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
XI	**DRENAJES**																
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	4.90	$ 422,631.00	$ 2,070,892.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	9.80	$ 1,159,538.00	$ 11,363,472.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 13,434,364.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
XII	**NO PREVISTOS**																
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 83,530,644.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00 **PRORROGA 1:** Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00 **PRORROGA 2:** Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00 **PRORROGA 3:** N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024 **HASTA EL:**	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

FRENTE 28 - Avenida 9 norte entre calle 18 norte y calle 21 norte

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.4		EJECUCION							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS									
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2	252.00	$ 1,716.00	$ 432,432.00	326.82	$ 560,823.00	326.82	$ 560,823.00	-	$ -	326.82	$ 560,823.00	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	0.00	$ 6,356.00	$ 0.00	130.00	$ 826,280.00	130.00	$ 826,280.00	-	$ -	130.00	$ 826,280.00	-	$ -
Subtotal					**$ 432,432.00**		**$ 1,387,103.00**		**$ 1,387,103.00**		**$ 0.00**		**$ 1,387,103.00**		**$ 0.00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	252.00	$ 22,513.00	$ 5,673,276.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	36.00	$ 9,327.00	$ 335,772.00	111.16	$ 1,036,789.00	111.16	$ 1,036,789.00	-	$ -	111.16	$ 1,036,789.00	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3	0.00	$ 103,237.00	$ 0.00	26.22	$ 2,706,791.00	26.22	$ 2,706,791.00	-	$ -	26.22	$ 2,706,791.00	-	$ -
Subtotal					**$ 6,009,048.00**		**$ 3,743,580.00**		**$ 3,743,580.00**		**$ 0.00**		**$ 3,743,580.00**		**$ 0.00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10,545.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60,034.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43,679.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	353.96	$ 1,187,536.00	353.96	$ 1,187,536.00	-	$ -	353.96	$ 1,187,536.00	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2,588,680.00	$ 0.00	1.00	$ 2,588,680.00	1.00	$ 2,588,680.00	-	$ -	1.00	$ 2,588,680.00	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8,282.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 3,776,216.00**		**$ 3,776,216.00**		**$ -**		**$ 3,776,216.00**		**$ -**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	25.20	$ 212,313.00	$ 5,350,288.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2		$ 28,591.00	$ 0.00	326.82	$ 9,344,111.00	326.82	$ 9,344,111.00	-	$ -	326.82	$ 9,344,111.00	-	$ -
Subtotal					**$ 5,350,288.00**		**$ 9,344,111.00**		**$ 9,344,111.00**		**$ 0.00**		**$ 9,344,111.00**		**$ 0.00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	252.00	$ 4,818.00	$ 1,214,136.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2		$ 4,652.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7,184.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2	252.00	$ 4,966.00	$ 1,251,432.00	653.64	$ 3,245,976.00	653.64	$ 3,245,976.00	-	$ -	653.64	$ 3,245,976.00	-	$ -
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	0.00	$ 1,332,529.00	$ 0.00	26.25	$ 34,975,345.00	26.25	$ 34,975,345.00	-	$ -	26.25	$ 34,975,345.00	-	$ -
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3		$ 1,371,977.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	12.60	$ 1,425,083.00	$ 17,956,046.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 20,421,614.00**		**$ 38,221,321.00**		**$ 38,221,321.00**		**$ 0.00**		**$ 38,221,321.00**		**$ 0.00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

VI	**CONCRETOS**																
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**																
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	360.00	$ 3,927.00	$ 1,413,720.00	308.00	$ 1,209,516.00	-	$ -	308.00	$ 1,209,516.00	308.00	$ 1,209,516.00	-	$ -		
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	22.40	$ 64,328.00	$ 1,440,947.00	141.58	$ 9,107,558.00	-	$ -	49.00	$ 3,152,072.00	49.00	$ 3,152,072.00	92.58	$ 5,955,486.00		
Subtotal					**$ 2,854,667.00**		**$ 10,317,074.00**		**$ 0.00**		**$ 4,361,588.00**		**$ 4,361,588.00**		**$ 5,955,486.00**		
XI	**DRENAJES**																
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	2.40	$ 422,631.00	$ 1,014,314.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	4.80	$ 1,159,538.00	$ 5,565,782.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 6,580,096.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
XII	**NO PREVISTOS**																
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		

SUBTOTAL OBRAS	**$ 41,648,145.00**	**$ 66,789,405.00**	**$ 56,472,331.00**	**$ 4,361,588.00**	**$ 60,833,919.00**	**$ 5,955,486.00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC** **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00 **PRORROGA 1:** Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00 **PRORROGA 2:** Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00 **PRORROGA 3:** N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024 **HASTA EL:**	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

FRENTE 29 - Calle 21 norte entre 18 norte y avenida 9 N

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.4		EJECUCION							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS									
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2	294.00	$ 1,716.00	$ 504,504.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	0.00	$ 6,356.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 504,504.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	294.00	$ 22,513.00	$ 6,618,822.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	42.00	$ 9,327.00	$ 391,734.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3	0.00	$ 103,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 7,010,556.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	0.00	$ 10,545.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	0.00	$ 60,034.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	0.00	$ 43,679.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM	0.00	$ 3,355.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB	0.00	$ 2,588,680.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	0.00	$ 8,282.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	29.40	$ 212,313.00	$ 6,242,002.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	0.00	$ 28,591.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 6,242,002.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	294.00	$ 4,818.00	$ 1,416,492.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	0.00	$ 4,652.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	0.00	$ 7,184.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML	0.00	$ 14,328.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2	294.00	$ 4,966.00	$ 1,460,004.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	0.00	$ 1,332,529.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	0.00	$ 1,371,977.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	14.70	$ 1,425,083.00	$ 20,948,720.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 23,825,216.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: **23 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

VI	**CONCRETOS**																
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML	0.00	$ 42,650.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML	0.00	$ 92,763.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**																
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	420.00	$ 3,927.00	$ 1,649,340.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	22.40	$ 64,328.00	$ 1,440,947.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 3,090,287.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
XI	**DRENAJES**																
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	2.80	$ 422,631.00	$ 1,183,367.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	5.60	$ 1,159,538.00	$ 6,493,413.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 7,676,780.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
XII	**NO PREVISTOS**																
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	0.00	$ 51,535.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML	0.00	$ 16,002.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3	0.00	$ 1,391,619.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG	0.00	$ 8,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	0.00	$ 820,404.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	0.00	$ 156,087.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	0.00	$ 37,174.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 48,349,345.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

				FECHA DE ELABORACION:	**23 DE NOVIEMBRE DE 2024**
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ]	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

FRENTE 30 - Calle 17 N entre 9 N y 9a N

CONDICIONES CONTRACTUALES						**CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.4**		**EJECUCION**							
								ACTAS ANTERIORES		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				**CANTIDADES ACTUALIZADAS**									
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2	205.80	$ 1,716.00	$ 353,153.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	0.00	$ 6,356.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 353,153.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	205.80	$ 22,513.00	$ 4,633,175.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	29.40	$ 9,327.00	$ 274,214.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3	0.00	$ 103,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 4,907,389.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	0.00	$ 10,545.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	0.00	$ 60,034.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	0.00	$ 43,679.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM	0.00	$ 3,355.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB	0.00	$ 2,588,680.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	0.00	$ 8,282.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	20.58	$ 212,313.00	$ 4,369,402.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	0.00	$ 28,591.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 4,369,402.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	205.80	$ 4,818.00	$ 991,544.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	0.00	$ 4,652.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	0.00	$ 7,184.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML	0.00	$ 14,328.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2	205.80	$ 4,966.00	$ 1,022,003.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	0.00	$ 1,332,529.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	0.00	$ 1,371,977.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	10.29	$ 1,425,083.00	$ 14,664,104.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 16,677,651.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: **23 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ]	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

VI	**CONCRETOS**																
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML	0.00	$ 42,650.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML	0.00	$ 92,763.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**																
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	294.00	$ 3,927.00	$ 1,154,538.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	22.40	$ 64,328.00	$ 1,440,947.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 2,595,485.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
XI	**DRENAJES**																
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1.96	$ 422,631.00	$ 828,357.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	3.92	$ 1,159,538.00	$ 4,545,389.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 5,373,746.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
XII	**NO PREVISTOS**																
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	0.00	$ 51,535.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML	0.00	$ 16,002.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3	0.00	$ 1,391,619.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG	0.00	$ 8,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	0.00	$ 820,404.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	0.00	$ 156,087.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	0.00	$ 37,174.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 34,276,826.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00 **PRORROGA 1:** Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00 **PRORROGA 2:** Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00 **PRORROGA 3:** N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024 **HASTA EL:**	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

FRENTE 31 - Calle 16 N entre 9 N y 9a N

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.4		EJECUCION							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS									
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2	199.50	$ 1,716.00	$ 342,342.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	0.00	$ 6,356.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 342,342.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	199.50	$ 22,513.00	$ 4,491,344.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	28.50	$ 9,327.00	$ 265,820.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3	0.00	$ 103,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 4,757,164.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10,545.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60,034.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43,679.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2,588,680.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8,282.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	19.95	$ 212,313.00	$ 4,235,644.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2		$ 28,591.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 4,235,644.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	199.50	$ 4,818.00	$ 961,191.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2		$ 4,652.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7,184.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2	199.50	$ 4,966.00	$ 990,717.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,332,529.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3		$ 1,371,977.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	9.98	$ 1,425,083.00	$ 14,215,203.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 16,167,111.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

			FECHA DE ELABORACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC** **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00 **PRORROGA 1:** Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00 **PRORROGA 2:** Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00 **PRORROGA 3:** N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

VI	**CONCRETOS**																
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**																
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	285.00	$ 3,927.00	$ 1,119,195.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	22.40	$ 64,328.00	$ 1,440,947.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 2,560,142.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
XI	**DRENAJES**																
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1.90	$ 422,631.00	$ 802,999.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	3.80	$ 1,159,538.00	$ 4,406,244.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 5,209,243.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
XII	**NO PREVISTOS**																
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 33,271,646.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: **23 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00 **PRORROGA 1:** Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00 **PRORROGA 2:** Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00 **PRORROGA 3:** N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024 **HASTA EL:**	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

FRENTE 32 - Calle 15a N entre 9 N y 9a N

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.4		EJECUCION							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS									
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2	195.30	$ 1,716.00	$ 335,135.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML		$ 6,356.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 335,135.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	195.30	$ 22,513.00	$ 4,396,789.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	27.90	$ 9,327.00	$ 260,223.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 4,657,012.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10,545.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60,034.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43,679.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2,588,680.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8,282.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	19.53	$ 212,313.00	$ 4,146,473.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2		$ 28,591.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 4,146,473.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	195.30	$ 4,818.00	$ 940,955.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2		$ 4,652.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7,184.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2	195.30	$ 4,966.00	$ 969,860.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,332,529.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3		$ 1,371,977.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	9.77	$ 1,425,083.00	$ 13,915,935.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 15,826,750.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

			FECHA DE ELABORACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC** **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00 **PRORROGA 1:** Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00 **PRORROGA 2:** Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00 **PRORROGA 3:** N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

VI	**CONCRETOS**																
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**																
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	279.00	$ 3,927.00	$ 1,095,633.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	22.40	$ 64,328.00	$ 1,440,947.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 2,536,580.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
XI	**DRENAJES**																
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1.86	$ 422,631.00	$ 786,094.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	3.72	$ 1,159,538.00	$ 4,313,481.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 5,099,575.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
XII	**NO PREVISTOS**																
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 32,601,525.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: **23 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00 **PRORROGA 1:** Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00 **PRORROGA 2:** Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00 **PRORROGA 3:** N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024 **HASTA EL:**	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

FRENTE 33 - Calle 15 N entre 9 N y 9a N

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.4		EJECUCION							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS									
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2	195.30	$ 1,716.00	$ 335,135.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML		$ 6,356.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 335,135.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	195.30	$ 22,513.00	$ 4,396,789.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	27.90	$ 9,327.00	$ 260,223.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 4,657,012.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10,545.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60,034.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43,679.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2,588,680.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8,282.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	19.53	$ 212,313.00	$ 4,146,473.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2		$ 28,591.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 4,146,473.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	195.30	$ 4,818.00	$ 940,955.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2		$ 4,652.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7,184.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2	195.30	$ 4,966.00	$ 969,860.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,332,529.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3		$ 1,371,977.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	9.77	$ 1,425,083.00	$ 13,915,935.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 15,826,750.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

			FECHA DE ELABORACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC** **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00 **PRORROGA 1:** Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00 **PRORROGA 2:** Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00 **PRORROGA 3:** N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

VI	**CONCRETOS**																
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**																
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	279.00	$ 3,927.00	$ 1,095,633.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	22.40	$ 64,328.00	$ 1,440,947.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 2,536,580.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
XI	**DRENAJES**																
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1.86	$ 422,631.00	$ 786,094.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	3.72	$ 1,159,538.00	$ 4,313,481.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 5,099,575.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
XII	**NO PREVISTOS**																
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 32,601,525.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00 **PRORROGA 1:** Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00 **PRORROGA 2:** Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00 **PRORROGA 3:** N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024 **HASTA EL:**	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

FRENTE 34 - Calle 14 N entre 9 N y 9a N

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.4		EJECUCION							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS									
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2	195.30	$ 1,716.00	$ 335,135.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML		$ 6,356.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 335,135.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	195.30	$ 22,513.00	$ 4,396,789.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	27.90	$ 9,327.00	$ 260,223.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 4,657,012.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10,545.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60,034.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43,679.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2,588,680.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8,282.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	19.53	$ 212,313.00	$ 4,146,473.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2		$ 28,591.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 4,146,473.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	195.30	$ 4,818.00	$ 940,955.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2		$ 4,652.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7,184.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2	195.30	$ 4,966.00	$ 969,860.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,332,529.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3		$ 1,371,977.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	9.77	$ 1,425,083.00	$ 13,915,935.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 15,826,750.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

			FECHA DE ELABORACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC** **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00 **PRORROGA 1:** Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00 **PRORROGA 2:** Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00 **PRORROGA 3:** N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

VI	**CONCRETOS**																
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**																
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	279.00	$ 3,927.00	$ 1,095,633.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	22.40	$ 64,328.00	$ 1,440,947.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 2,536,580.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
XI	**DRENAJES**																
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1.86	$ 422,631.00	$ 786,094.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	3.72	$ 1,159,538.00	$ 4,313,481.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 5,099,575.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
XII	**NO PREVISTOS**																
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 32,601,525.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC** **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00 **PRORROGA 1:** Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00 **PRORROGA 2:** Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00 **PRORROGA 3:** N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024 **HASTA EL:**	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

FRENTE 35 - Calle 13 N entre 9 N y 9a N

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.4		EJECUCION							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS									
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2	195.30	$ 1,716.00	$ 335,135.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML		$ 6,356.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 335,135.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	195.30	$ 22,513.00	$ 4,396,789.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	27.90	$ 9,327.00	$ 260,223.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 4,657,012.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10,545.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60,034.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43,679.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2,588,680.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8,282.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	19.53	$ 212,313.00	$ 4,146,473.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2		$ 28,591.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 4,146,473.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	195.30	$ 4,818.00	$ 940,955.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2		$ 4,652.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7,184.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2	195.30	$ 4,966.00	$ 969,860.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,332,529.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3		$ 1,371,977.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	9.77	$ 1,425,083.00	$ 13,915,935.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 15,826,750.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

			FECHA DE ELABORACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC** **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00 **PRORROGA 1:** Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00 **PRORROGA 2:** Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00 **PRORROGA 3:** N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

VI	**CONCRETOS**																
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**																
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	279.00	$ 3,927.00	$ 1,095,633.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	22.40	$ 64,328.00	$ 1,440,947.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 2,536,580.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
XI	**DRENAJES**																
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1.86	$ 422,631.00	$ 786,094.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	3.72	$ 1,159,538.00	$ 4,313,481.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 5,099,575.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
XII	**NO PREVISTOS**																
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 32,601,525.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC** **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00 **PRORROGA 1:** Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00 **PRORROGA 2:** Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00 **PRORROGA 3:** N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024 **HASTA EL:**	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

FRENTE 36 - Calle 12 N entre 9 N y 9a N

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.4		EJECUCION							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS									
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2	195.30	$ 1,716.00	$ 335,135.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML		$ 6,356.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 335,135.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	195.30	$ 22,513.00	$ 4,396,789.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	27.90	$ 9,327.00	$ 260,223.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 4,657,012.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10,545.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60,034.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43,679.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2,588,680.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8,282.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	19.53	$ 212,313.00	$ 4,146,473.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2		$ 28,591.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 4,146,473.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	195.30	$ 4,818.00	$ 940,955.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2		$ 4,652.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7,184.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2	195.30	$ 4,966.00	$ 969,860.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,332,529.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3		$ 1,371,977.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	9.77	$ 1,425,083.00	$ 13,915,935.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 15,826,750.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

			FECHA DE ELABORACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC** **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00 **PRORROGA 1:** Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00 **PRORROGA 2:** Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00 **PRORROGA 3:** N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

VI	**CONCRETOS**																
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**																
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	279.00	$ 3,927.00	$ 1,095,633.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	22.40	$ 64,328.00	$ 1,440,947.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 2,536,580.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
XI	**DRENAJES**																
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1.86	$ 422,631.00	$ 786,094.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	3.72	$ 1,159,538.00	$ 4,313,481.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 5,099,575.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
XII	**NO PREVISTOS**																
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 32,601,525.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: **23 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00 **PRORROGA 1:** Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00 **PRORROGA 2:** Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00 **PRORROGA 3:** N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024 **HASTA EL:**	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

FRENTE 37 - Calle 10 N entre 9 N y 9a N

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.4		EJECUCION							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS									
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2	176.40	$ 1,716.00	$ 302,702.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML		$ 6,356.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 302,702.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	176.40	$ 22,513.00	$ 3,971,293.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	25.20	$ 9,327.00	$ 235,040.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 4,206,333.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10,545.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60,034.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43,679.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2,588,680.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8,282.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	17.64	$ 212,313.00	$ 3,745,201.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2		$ 28,591.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 3,745,201.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	176.40	$ 4,818.00	$ 849,895.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2		$ 4,652.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7,184.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2	176.40	$ 4,966.00	$ 876,002.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,332,529.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3		$ 1,371,977.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	8.82	$ 1,425,083.00	$ 12,569,232.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 14,295,129.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

				FECHA DE ELABORACION:	**23 DE NOVIEMBRE DE 2024**
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1				
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

VI	**CONCRETOS**																
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**																
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	252.00	$ 3,927.00	$ 989,604.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	22.40	$ 64,328.00	$ 1,440,947.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 2,430,551.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
XI	**DRENAJES**																
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1.68	$ 422,631.00	$ 710,020.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	3.36	$ 1,159,538.00	$ 3,896,048.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 4,606,068.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
XII	**NO PREVISTOS**																
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 29,585,984.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: **23 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00 **PRORROGA 1:** Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00 **PRORROGA 2:** Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00 **PRORROGA 3:** N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

FRENTE 38 - Calle 9 N entre 9 N y 9a N

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.4		EJECUCION							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS									
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2	52.50	$ 1,716.00	$ 90,090.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML		$ 6,356.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 90,090.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	52.50	$ 22,513.00	$ 1,181,933.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	7.50	$ 9,327.00	$ 69,953.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 1,251,886.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10,545.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60,034.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43,679.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2,588,680.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8,282.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	5.25	$ 212,313.00	$ 1,114,643.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2		$ 28,591.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 1,114,643.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	52.50	$ 4,818.00	$ 252,945.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2		$ 4,652.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7,184.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2	52.50	$ 4,966.00	$ 260,715.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,332,529.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3		$ 1,371,977.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	2.63	$ 1,425,083.00	$ 3,740,843.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 4,254,503.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

				FECHA DE ELABORACION:	**23 DE NOVIEMBRE DE 2024**
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1				
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

VI	**CONCRETOS**																
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**																
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	75.00	$ 3,927.00	$ 294,525.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	22.40	$ 64,328.00	$ 1,440,947.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 1,735,472.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
XI	**DRENAJES**																
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	0.50	$ 422,631.00	$ 211,316.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	1.00	$ 1,159,538.00	$ 1,159,538.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 1,370,854.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
XII	**NO PREVISTOS**																
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 9,817,448.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: **23 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00 **PRORROGA 1:** Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00 **PRORROGA 2:** Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00 **PRORROGA 3:** N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024 **HASTA EL:**	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

FRENTE 39 - Avenida 8 norte entre calle 21 norte y avenida 4 norte

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.4		EJECUCION							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS									
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2	3,052.00	$ 1,716.00	$ 5,237,232.00	10,116.43	$ 17,359,794.00	-	$ -	10,116.43	$ 17,359,794.00	10,116.43	$ 17,359,794.00	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML		$ 6,356.00	$ 0.00	1,140.00	$ 7,245,840.00	-	$ -	1,140.00	$ 7,245,840.00	1,140.00	$ 7,245,840.00	-	$ -
Subtotal					**$ 5,237,232.00**		**$ 24,605,634.00**		**$ 0.00**		**$ 24,605,634.00**		**$ 24,605,634.00**		**$ 0.00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	3,052.00	$ 22,513.00	$ 68,709,676.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	436.00	$ 9,327.00	$ 4,066,572.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103,237.00	$ 0.00	593.74	$ 61,295,936.00	-	$ -	593.74	$ 61,295,936.00	593.74	$ 61,295,936.00	-	$ -
Subtotal					**$ 72,776,248.00**		**$ 61,295,936.00**		**$ 0.00**		**$ 61,295,936.00**		**$ 61,295,936.00**		**$ 0.00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10,545.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60,034.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43,679.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	8,015.49	$ 26,891,969.00	-	$ -	8,015.49	$ 26,891,969.00	8,015.49	$ 26,891,969.00	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2,588,680.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8,282.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 26,891,969.00**		**$ 0.00**		**$ 26,891,969.00**		**$ 26,891,969.00**		**$ -**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	305.20	$ 212,313.00	$ 64,797,928.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2		$ 28,591.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 64,797,928.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	3,052.00	$ 4,818.00	$ 14,704,536.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2		$ 4,652.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7,184.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2	3,052.00	$ 4,966.00	$ 15,156,232.00	10,116.43	$ 50,238,191.00	-	$ -	10,116.43	$ 50,238,191.00	10,116.43	$ 50,238,191.00	-	$ -
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,332,529.00	$ 0.00	518.15	$ 690,449,636.00	-	$ -	497.73	$ 663,239,659.00	497.73	$ 663,239,659.00	20.42	$ 27,209,977.00
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3		$ 1,371,977.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	152.60	$ 1,425,083.00	$ 217,467,666.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 247,328,434.00**		**$ 740,687,827.00**		**$ 0.00**		**$ 713,477,850.00**		**$ 713,477,850.00**		**$ 27,209,977.00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

VI	**CONCRETOS**															
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**															
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	3,270.00	$ 3,927.00	$ 12,841,290.00	2,286.00	$ 8,977,122.00	-	$ -	815.00	$ 3,200,505.00	815.00	$ 3,200,505.00	1,471.00	$ 5,776,617.00
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	268.80	$ 64,328.00	$ 17,291,366.00	670.77	$ 43,149,293.00	-	$ -	236.84	$ 15,235,444.00	236.84	$ 15,235,444.00	433.93	$ 27,913,849.00
Subtotal					**$ 30,132,656.00**		**$ 52,126,415.00**		**$ 0.00**		**$ 18,435,949.00**		**$ 18,435,949.00**		**$ 33,690,466.00**
XI	**DRENAJES**															
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	21.80	$ 422,631.00	$ 9,213,356.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	43.60	$ 1,159,538.00	$ 50,555,857.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 59,769,213.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
XII	**NO PREVISTOS**															
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 480,041,711.00**		**$ 905,607,781.00**		**$ 0.00**		**$ 844,707,338.00**		**$ 844,707,338.00**		**$ 60,900,443.00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00 **PRORROGA 1:** Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00 **PRORROGA 2:** Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00 **PRORROGA 3:** N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024 **HASTA EL:**	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

FRENTE 61 - CARRERA 12 ENTRE CALLES 3 Y 3OESTE

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.4		EJECUCION							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS									
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1,716.00	$ 0.00	746.72	$ 1,281,372.00	-	$ -	746.72	$ 1,281,372.00	746.72	$ 1,281,372.00	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	120.00	$ 6,356.00	$ 762,720.00	417.00	$ 2,650,452.00	-	$ -	417.00	$ 2,650,452.00	417.00	$ 2,650,452.00	-	$ -
Subtotal					**$ 762,720.00**		**$ 3,931,824.00**		**$ 0.00**		**$ 3,931,824.00**		**$ 3,931,824.00**		**$ 0.00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 22,513.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML		$ 9,327.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10,545.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60,034.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43,679.00	$ 0.00	767.26	$ 33,513,150.00	-	$ -	381.01	$ 16,642,136.00	381.01	$ 16,642,136.00	386.25	$ 16,871,014.00
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB	1.00	$ 2,588,680.00	$ 2,588,680.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8,282.00	$ 0.00	746.72	$ 6,184,335.00	-	$ -	746.72	$ 6,184,335.00	746.72	$ 6,184,335.00	-	$ -
Subtotal					**$ 2,588,680.00**		**$ 39,697,485.00**		**$ 0.00**		**$ 22,826,471.00**		**$ 22,826,471.00**		**$ 16,871,014.00**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3		$ 212,313.00	$ 0.00	126.88	$ 26,938,273.00	-	$ -	126.88	$ 26,938,273.00	126.88	$ 26,938,273.00	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	840.00	$ 28,591.00	$ 24,016,440.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 24,016,440.00**		**$ 26,938,273.00**		**$ 0.00**		**$ 26,938,273.00**		**$ 26,938,273.00**		**$ 0.00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4,818.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	840.00	$ 4,652.00	$ 3,907,680.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	300.00	$ 7,184.00	$ 2,155,200.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4,966.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,332,529.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	63.00	$ 1,371,977.00	$ 86,434,551.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,425,083.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 92,497,431.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

VI	**CONCRETOS**																
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	151.34	$ 6,454,651.00	-	$ -	151.34	$ 6,454,651.00	151.34	$ 6,454,651.00	-	$ -		
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 6,454,651.00**		**$ 0.00**		**$ 6,454,651.00**		**$ 6,454,651.00**		**$ 0.00**		
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**																
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	360.00	$ 3,927.00	$ 1,413,720.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	25.00	$ 64,328.00	$ 1,608,200.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 3,021,920.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
XI	**DRENAJES**																
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1.00	$ 422,631.00	$ 422,631.00	6.00	$ 2,535,786.00	-	$ -	6.00	$ 2,535,786.00	6.00	$ 2,535,786.00	-	$ -		
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	1.00	$ 1,159,538.00	$ 1,159,538.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 1,582,169.00**		**$ 2,535,786.00**		**$ 0.00**		**$ 2,535,786.00**		**$ 2,535,786.00**		**$ 0.00**		
XII	**NO PREVISTOS**																
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	746.72	$ 38,482,215.00	-	$ -	746.72	$ 38,482,215.00	746.72	$ 38,482,215.00	-	$ -		
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	457.20	$ 7,316,114.00	-	$ -	457.20	$ 7,316,114.00	457.20	$ 7,316,114.00	-	$ -		
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	154.11	$ 214,462,404.00	-	$ -	107.88	$ 150,127,858.00	107.88	$ 150,127,858.00	46.23	$ 64,334,546.00		
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	1,786.88	$ 14,718,531.00	-	$ -	2,198.31	$ 18,107,479.00	2,198.31	$ 18,107,479.00	- 411.43	-$ 3,388,948.00		
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	2.00	$ 1,640,808.00	-	$ -	2.00	$ 1,640,808.00	2.00	$ 1,640,808.00	-	$ -		
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	144.56	$ 5,373,873.00	-	$ -	144.56	$ 5,373,873.00	144.56	$ 5,373,873.00	-	$ -		
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 281,993,945.00**		**$ 0.00**		**$ 221,048,347.00**		**$ 221,048,347.00**		**$ 60,945,598.00**		
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 124,469,360.00**		**$ 361,551,964.00**		**$ 0.00**		**$ 283,735,352.00**		**$ 283,735,352.00**		**$ 77,816,612.00**		

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

				FECHA DE ELABORACION:	**23 DE NOVIEMBRE DE 2024**
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1				
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

FRENTE 62 - CARRERA 10 ENTRE CALLES 1 Y 3OESTE

CONDICIONES CONTRACTUALES						**CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.4**		**EJECUCION**							
								ACTAS ANTERIORES		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				**CANTIDADES ACTUALIZADAS**									
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1,716.00	$ 0.00	353.01	$ 605,765.00	192.80	$ 330,845.00	160.21	$ 274,920.00	353.01	$ 605,765.00	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	130.00	$ 6,356.00	$ 826,280.00	261.00	$ 1,658,916.00	221.30	$ 1,406,583.00	39.70	$ 252,333.00	261.00	$ 1,658,916.00	-	$ -
Subtotal					**$ 826,280.00**		**$ 2,264,681.00**		**$ 1,737,428.00**		**$ 527,253.00**		**$ 2,264,681.00**		**$ 0.00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 22,513.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML		$ 9,327.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103,237.00	$ 0.00	14.39	$ 1,485,839.00	14.39	$ 1,485,839.00	-	$ -	14.39	$ 1,485,839.00	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 1,485,839.00**		**$ 1,485,839.00**		**$ 0.00**		**$ 1,485,839.00**		**$ 0.00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10,545.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60,034.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43,679.00	$ 0.00	2.79	$ 121,864.00	-	$ -	2.79	$ 121,864.00	2.79	$ 121,864.00	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	194.30	$ 651,877.00	194.30	$ 651,877.00	-	$ -	194.30	$ 651,877.00	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2,588,680.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8,282.00	$ 0.00	160.21	$ 1,326,859.00	-	$ -	160.21	$ 1,326,859.00	160.21	$ 1,326,859.00	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 2,100,600.00**		**$ 651,877.00**		**$ 1,448,723.00**		**$ 2,100,600.00**		**$ -**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3		$ 212,313.00	$ 0.00	2.07	$ 439,488.00	2.07	$ 439,488.00	-	$ -	2.07	$ 439,488.00	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	910.00	$ 28,591.00	$ 26,017,810.00	192.80	$ 5,512,345.00	192.80	$ 5,512,345.00	-	$ -	192.80	$ 5,512,345.00	-	$ -
Subtotal					**$ 26,017,810.00**		**$ 5,951,833.00**		**$ 5,951,833.00**		**$ 0.00**		**$ 5,951,833.00**		**$ 0.00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4,818.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	910.00	$ 4,652.00	$ 4,233,320.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	300.00	$ 7,184.00	$ 2,155,200.00	631.80	$ 4,538,851.00	-	$ -	631.80	$ 4,538,851.00	631.80	$ 4,538,851.00	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4,966.00	$ 0.00	385.60	$ 1,914,890.00	385.60	$ 1,914,890.00	-	$ -	385.60	$ 1,914,890.00	-	$ -
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,332,529.00	$ 0.00	13.66	$ 18,205,677.00	13.66	$ 18,205,677.00	-	$ -	13.66	$ 18,205,677.00	-	$ -
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	68.25	$ 1,371,977.00	$ 93,637,430.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,425,083.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 100,025,950.00**		**$ 24,659,418.00**		**$ 20,120,567.00**		**$ 4,538,851.00**		**$ 24,659,418.00**		**$ 0.00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

VI	**CONCRETOS**																
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	6.50	$ 277,225.00	-	$ -	6.50	$ 277,225.00	6.50	$ 277,225.00	-	$ -
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 277,225.00**		**$ 0.00**		**$ 277,225.00**		**$ 277,225.00**		**$ 0.00**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**																
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	390.00	$ 3,927.00	$ 1,531,530.00	210.00	$ 824,670.00	-	$ -	210.00	$ 824,670.00	210.00	$ 824,670.00	-	$ -
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	28.00	$ 64,328.00	$ 1,801,184.00	53.96	$ 3,471,139.00	-	$ -	53.96	$ 3,471,139.00	53.96	$ 3,471,139.00	-	$ -
Subtotal					**$ 3,332,714.00**		**$ 4,295,809.00**		**$ 0.00**		**$ 4,295,809.00**		**$ 4,295,809.00**		**$ 0.00**
XI	**DRENAJES**																
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1.00	$ 422,631.00	$ 422,631.00	1.00	$ 422,631.00	-	$ -	1.00	$ 422,631.00	1.00	$ 422,631.00	-	$ -
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	1.00	$ 1,159,538.00	$ 1,159,538.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 1,582,169.00**		**$ 422,631.00**		**$ 0.00**		**$ 422,631.00**		**$ 422,631.00**		**$ 0.00**
XII	**NO PREVISTOS**																
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	160.21	$ 8,256,422.00	-	$ -	160.21	$ 8,256,422.00	160.21	$ 8,256,422.00	-	$ -
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	144.29	$ 2,308,929.00	-	$ -	144.29	$ 2,308,929.00	144.29	$ 2,308,929.00	-	$ -
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	32.12	$ 44,698,802.00	-	$ -	22.49	$ 31,297,511.00	22.49	$ 31,297,511.00	9.63	$ 13,401,291.00
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	496.91	$ 4,093,048.00	-	$ -	496.91	$ 4,093,048.00	496.91	$ 4,093,048.00	-	$ -
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	2.07	$ 76,950.00	-	$ -	11.92	$ 443,114.00	11.92	$ 443,114.00	- 9.85	-$ 366,164.00
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 59,434,151.00**		**$ 0.00**		**$ 46,399,024.00**		**$ 46,399,024.00**		**$ 13,035,127.00**
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 131,784,923.00**		**$ 100,892,187.00**		**$ 29,947,544.00**		**$ 57,909,516.00**		**$ 87,857,060.00**		**$ 13,035,127.00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC** **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00 **PRORROGA 1:** Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00 **PRORROGA 2:** Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00 **PRORROGA 3:** N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024 **HASTA EL:**	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

FRENTE 63 - CARRERA 10 ENTRE CALLES 3 Y 4

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.4		EJECUCION							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS									
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1,716.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	90.00	$ 6,356.00	$ 572,040.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 572,040.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 22,513.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML		$ 9,327.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10,545.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60,034.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43,679.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2,588,680.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8,282.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3		$ 212,313.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	630.00	$ 28,591.00	$ 18,012,330.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 18,012,330.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4,818.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	630.00	$ 4,652.00	$ 2,930,760.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	300.00	$ 7,184.00	$ 2,155,200.00	1,061.00	$ 7,622,224.00	-	$ -	1,061.00	$ 7,622,224.00	1,061.00	$ 7,622,224.00	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4,966.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,332,529.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	47.25	$ 1,371,977.00	$ 64,825,913.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,425,083.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 69,911,873.00**		**$ 7,622,224.00**		**$ 0.00**		**$ 7,622,224.00**		**$ 7,622,224.00**		**$ 0.00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

VI	**CONCRETOS**																
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**																
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	390.00	$ 3,927.00	$ 1,531,530.00	246.00	$ 966,042.00	-	$ -	246.00	$ 966,042.00	246.00	$ 966,042.00	-	$ -		
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	28.00	$ 64,328.00	$ 1,801,184.00	36.84	$ 2,369,844.00	-	$ -	36.84	$ 2,369,844.00	36.84	$ 2,369,844.00	-	$ -		
Subtotal					**$ 3,332,714.00**		**$ 3,335,886.00**		**$ 0.00**		**$ 3,335,886.00**		**$ 3,335,886.00**		**$ 0.00**		
XI	**DRENAJES**																
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1.00	$ 422,631.00	$ 422,631.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	2.00	$ 1,159,538.00	$ 2,319,076.00	1.00	$ 1,159,538.00	1.00	$ 1,159,538.00	-	$ -	1.00	$ 1,159,538.00	-	$ -		
Subtotal					**$ 2,741,707.00**		**$ 1,159,538.00**		**$ 1,159,538.00**		**$ 0.00**		**$ 1,159,538.00**		**$ 0.00**		
XII	**NO PREVISTOS**																
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	2.67	$ 137,598.00	-	$ -	2.67	$ 137,598.00	2.67	$ 137,598.00	-	$ -		
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	4.74	$ 75,849.00	-	$ -	4.74	$ 75,849.00	4.74	$ 75,849.00	-	$ -		
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 213,447.00**		**$ 0.00**		**$ 213,447.00**		**$ 213,447.00**		**$ 0.00**		

SUBTOTAL OBRAS	**$ 94,570,664.00**	**$ 12,331,095.00**	**$ 1,159,538.00**	**$ 11,171,557.00**	**$ 12,331,095.00**	**$ 0.00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC** **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00 **PRORROGA 1:** Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00 **PRORROGA 2:** Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00 **PRORROGA 3:** N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

FRENTE 64 - CARRERA 9 ENTRE CALLES 2 Y 4

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.4		EJECUCION							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS									
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1,716.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	210.00	$ 6,356.00	$ 1,334,760.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 1,334,760.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 22,513.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML		$ 9,327.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10,545.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60,034.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43,679.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2,588,680.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8,282.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3		$ 212,313.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	1,470.00	$ 28,591.00	$ 42,028,770.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 42,028,770.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4,818.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	1,470.00	$ 4,652.00	$ 6,838,440.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	300.00	$ 7,184.00	$ 2,155,200.00	582.00	$ 4,181,088.00	-	$ -	582.00	$ 4,181,088.00	582.00	$ 4,181,088.00	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4,966.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,332,529.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	110.25	$ 1,371,977.00	$ 151,260,464.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,425,083.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 160,254,104.00**		**$ 4,181,088.00**		**$ 0.00**		**$ 4,181,088.00**		**$ 4,181,088.00**		**$ 0.00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

VI	**CONCRETOS**																
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**																
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	390.00	$ 3,927.00	$ 1,531,530.00	500.00	$ 1,963,500.00	-	$ -	500.00	$ 1,963,500.00	500.00	$ 1,963,500.00	-	$ -		
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	28.00	$ 64,328.00	$ 1,801,184.00	77.00	$ 4,953,256.00	-	$ -	77.00	$ 4,953,256.00	77.00	$ 4,953,256.00	-	$ -		
Subtotal					**$ 3,332,714.00**		**$ 6,916,756.00**		**$ 0.00**		**$ 6,916,756.00**		**$ 6,916,756.00**		**$ 0.00**		
XI	**DRENAJES**																
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1.00	$ 422,631.00	$ 422,631.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	4.00	$ 1,159,538.00	$ 4,638,152.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 5,060,783.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
XII	**NO PREVISTOS**																
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	1.89	$ 97,401.00	-	$ -	1.89	$ 97,401.00	1.89	$ 97,401.00	-	$ -		
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	3.89	$ 62,248.00	-	$ -	3.89	$ 62,248.00	3.89	$ 62,248.00	-	$ -		
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	1.00	$ 820,404.00	-	$ -	1.00	$ 820,404.00	1.00	$ 820,404.00	-	$ -		
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 980,053.00**		**$ 0.00**		**$ 980,053.00**		**$ 980,053.00**		**$ 0.00**		
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 212,011,131.00**		**$ 12,077,897.00**		**$ 0.00**		**$ 12,077,897.00**		**$ 12,077,897.00**		**$ 0.00**		

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: **23 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00 **PRORROGA 1:** Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00 **PRORROGA 2:** Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00 **PRORROGA 3:** N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024 **HASTA EL:**	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

FRENTE 65 - CARRERA 6 ENTRE CALLES 2 Y 4

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.4		EJECUCION							
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1,716.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	250.00	$ 6,356.00	$ 1,589,000.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 1,589,000.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 22,513.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML		$ 9,327.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10,545.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60,034.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43,679.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2,588,680.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8,282.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3		$ 212,313.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	1,000.00	$ 28,591.00	$ 28,591,000.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 28,591,000.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4,818.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	1,000.00	$ 4,652.00	$ 4,652,000.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	200.00	$ 7,184.00	$ 1,436,800.00	623.20	$ 4,477,069.00	-	$ -	623.20	$ 4,477,069.00	623.20	$ 4,477,069.00	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4,966.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,332,529.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	50.00	$ 1,371,977.00	$ 68,598,850.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,425,083.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 74,687,650.00**		**$ 4,477,069.00**		**$ 0.00**		**$ 4,477,069.00**		**$ 4,477,069.00**		**$ 0.00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

VI	**CONCRETOS**																
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**																
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	500.00	$ 3,927.00	$ 1,963,500.00	418.00	$ 1,641,486.00	-	$ -	418.00	$ 1,641,486.00	418.00	$ 1,641,486.00	-	$ -		
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	45.00	$ 64,328.00	$ 2,894,760.00	45.48	$ 2,925,637.00	-	$ -	45.48	$ 2,925,637.00	45.48	$ 2,925,637.00	-	$ -		
Subtotal					**$ 4,858,260.00**		**$ 4,567,123.00**		**$ 0.00**		**$ 4,567,123.00**		**$ 4,567,123.00**		**$ 0.00**		
XI	**DRENAJES**																
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1.00	$ 422,631.00	$ 422,631.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	2.00	$ 1,159,538.00	$ 2,319,076.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 2,741,707.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
XII	**NO PREVISTOS**																
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 112,467,617.00**		**$ 9,044,192.00**		**$ 0.00**		**$ 9,044,192.00**		**$ 9,044,192.00**		**$ 0.00**		

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00 **PRORROGA 1:** Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00 **PRORROGA 2:** Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00 **PRORROGA 3:** N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024 **HASTA EL:**	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

FRENTE 66 - CARRERA 5 ENTRE CLL 2 a 4

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.4		EJECUCION							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS									
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1,716.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	290.00	$ 6,356.00	$ 1,843,240.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 1,843,240.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 22,513.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML		$ 9,327.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10,545.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60,034.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43,679.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2,588,680.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8,282.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3		$ 212,313.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	1,160.00	$ 28,591.00	$ 33,165,560.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 33,165,560.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4,818.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	1,160.00	$ 4,652.00	$ 5,396,320.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7,184.00	$ 0.00	767.30	$ 5,512,283.00	-	$ -	767.30	$ 5,512,283.00	767.30	$ 5,512,283.00	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4,966.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,332,529.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	58.00	$ 1,371,977.00	$ 79,574,666.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,425,083.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 84,970,986.00**		**$ 5,512,283.00**		**$ 0.00**		**$ 5,512,283.00**		**$ 5,512,283.00**		**$ 0.00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

VI	**CONCRETOS**															
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**															
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	500.00	$ 3,927.00	$ 1,963,500.00	439.00	$ 1,723,953.00	-	$ -	439.00	$ 1,723,953.00	439.00	$ 1,723,953.00	-	$ -	
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	45.00	$ 64,328.00	$ 2,894,760.00	81.52	$ 5,244,019.00	-	$ -	81.08	$ 5,215,714.00	81.08	$ 5,215,714.00	0.44	$ 28,305.00	
Subtotal					**$ 4,858,260.00**		**$ 6,967,972.00**		**$ 0.00**		**$ 6,939,667.00**		**$ 6,939,667.00**		**$ 28,305.00**	
XI	**DRENAJES**															
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1.00	$ 422,631.00	$ 422,631.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	2.00	$ 1,159,538.00	$ 2,319,076.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
Subtotal					**$ 2,741,707.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	
XII	**NO PREVISTOS**															
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**	
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 127,579,753.00**		**$ 12,480,255.00**		**$ 0.00**		**$ 12,451,950.00**		**$ 12,451,950.00**		**$ 28,305.00**	

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00 **PRORROGA 1:** Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00 **PRORROGA 2:** Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00 **PRORROGA 3:** N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024 **HASTA EL:**	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

FRENTE 67 - CARRERA 4 ENTRE CLL 1 a 3

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.4		EJECUCION							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS									
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1,716.00	$ 0.00	1,333.23	$ 2,287,823.00	1,333.23	$ 2,287,823.00	-	$ -	1,333.23	$ 2,287,823.00	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	290.00	$ 6,356.00	$ 1,843,240.00	459.60	$ 2,921,218.00	245.00	$ 1,557,220.00	214.60	$ 1,363,998.00	459.60	$ 2,921,218.00	-	$ -
Subtotal					**$ 1,843,240.00**		**$ 5,209,041.00**		**$ 3,845,043.00**		**$ 1,363,998.00**		**$ 5,209,041.00**		**$ 0.00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	50.00	$ 22,513.00	$ 1,125,650.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	70.00	$ 9,327.00	$ 652,890.00	334.12	$ 3,116,337.00	-	$ -	334.12	$ 3,116,337.00	334.12	$ 3,116,337.00	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103,237.00	$ 0.00	108.79	$ 11,231,529.00	108.79	$ 11,231,529.00	-	$ -	108.79	$ 11,231,529.00	-	$ -
Subtotal					**$ 1,778,540.00**		**$ 14,347,866.00**		**$ 11,231,529.00**		**$ 3,116,337.00**		**$ 14,347,866.00**		**$ 0.00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	10.00	$ 10,545.00	$ 105,450.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	5.00	$ 60,034.00	$ 300,170.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	10.00	$ 43,679.00	$ 436,790.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	2,290.09	$ 7,683,252.00	1,468.71	$ 4,927,522.00	821.38	$ 2,755,730.00	2,290.09	$ 7,683,252.00	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB	1.00	$ 2,588,680.00	$ 2,588,680.00	1.00	$ 2,588,680.00	1.00	$ 2,588,680.00	-	$ -	1.00	$ 2,588,680.00	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	50.00	$ 8,282.00	$ 414,100.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 3,845,190.00**		**$ 10,271,932.00**		**$ 7,516,202.00**		**$ 2,755,730.00**		**$ 10,271,932.00**		**$ -**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	10.00	$ 212,313.00	$ 2,123,130.00	73.82	$ 15,672,946.00	44.98	$ 9,549,839.00	28.84	$ 6,123,107.00	73.82	$ 15,672,946.00	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	290.00	$ 28,591.00	$ 8,291,390.00	1,333.23	$ 38,118,379.00	1,333.23	$ 38,118,379.00	-	$ -	1,333.23	$ 38,118,379.00	-	$ -
Subtotal					**$ 10,414,520.00**		**$ 53,791,325.00**		**$ 47,668,218.00**		**$ 6,123,107.00**		**$ 53,791,325.00**		**$ 0.00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4,818.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	290.00	$ 4,652.00	$ 1,349,080.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	245.00	$ 7,184.00	$ 1,760,080.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4,966.00	$ 0.00	2,666.46	$ 13,241,640.00	2,666.46	$ 13,241,640.00	-	$ -	2,666.46	$ 13,241,640.00	-	$ -
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,332,529.00	$ 0.00	105.87	$ 141,076,362.00	105.87	$ 141,076,362.00	-	$ -	105.87	$ 141,076,362.00	-	$ -
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	58.00	$ 1,371,977.00	$ 79,574,666.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,425,083.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 82,683,826.00**		**$ 154,318,002.00**		**$ 154,318,002.00**		**$ 0.00**		**$ 154,318,002.00**		**$ 0.00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

VI	**CONCRETOS**																
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML	15.00	$ 42,650.00	$ 639,750.00	135.20	$ 5,766,280.00	-	$ -	135.20	$ 5,766,280.00	135.20	$ 5,766,280.00	-	$ -
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML	2.00	$ 92,763.00	$ 185,526.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 825,276.00**		**$ 5,766,280.00**		**$ 0.00**		**$ 5,766,280.00**		**$ 5,766,280.00**		**$ 0.00**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**																
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	450.00	$ 3,927.00	$ 1,767,150.00	115.00	$ 451,605.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	115.00	$ 451,605.00
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	50.00	$ 64,328.00	$ 3,216,400.00	64.42	$ 4,144,010.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	64.42	$ 4,144,010.00
Subtotal					**$ 4,983,550.00**		**$ 4,595,615.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 4,595,615.00**
XI	**DRENAJES**																
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1.00	$ 422,631.00	$ 422,631.00	1.00	$ 422,631.00	-	$ -	1.00	$ 422,631.00	1.00	$ 422,631.00	-	$ -
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	2.00	$ 1,159,538.00	$ 2,319,076.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 2,741,707.00**		**$ 422,631.00**		**$ 0.00**		**$ 422,631.00**		**$ 422,631.00**		**$ 0.00**
XII	**NO PREVISTOS**																
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	450.58	$ 23,220,640.00	-	$ -	249.82	$ 12,874,474.00	249.82	$ 12,874,474.00	200.76	$ 10,346,166.00
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	26.00	$ 36,175,136.00	-	$ -	26.00	$ 36,175,136.00	26.00	$ 36,175,136.00	-	$ -
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	1,239.30	$ 10,208,114.00	-	$ -	1,239.30	$ 10,208,114.00	1,239.30	$ 10,208,114.00	-	$ -
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	2.00	$ 1,640,808.00	-	$ -	2.00	$ 1,640,808.00	2.00	$ 1,640,808.00	-	$ -
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	28.84	$ 1,072,098.00	-	$ -	28.84	$ 1,072,098.00	28.84	$ 1,072,098.00	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 72,316,796.00**		**$ 0.00**		**$ 61,970,630.00**		**$ 61,970,630.00**		**$ 10,346,166.00**
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 109,115,849.00**		**$ 321,039,488.00**		**$ 224,578,994.00**		**$ 81,518,713.00**		**$ 306,097,707.00**		**$ 14,941,781.00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00 **PRORROGA 1:** Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00 **PRORROGA 2:** Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00 **PRORROGA 3:** N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024 **HASTA EL:**	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

FRENTE 68 - CALLE 4 ENTRE CRA 5 a 10

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.4		EJECUCION							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS									
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1,716.00	$ 0.00	573.73	$ 984,521.00	573.73	$ 984,521.00	-	$ -	573.73	$ 984,521.00	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	180.00	$ 6,356.00	$ 1,144,080.00	141.27	$ 897,912.00	141.27	$ 897,912.00	-	$ -	141.27	$ 897,912.00	-	$ -
Subtotal					**$ 1,144,080.00**		**$ 1,882,433.00**		**$ 1,882,433.00**		**$ 0.00**		**$ 1,882,433.00**		**$ 0.00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	100.00	$ 22,513.00	$ 2,251,300.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	95.00	$ 9,327.00	$ 886,065.00	24.50	$ 228,512.00	24.50	$ 228,512.00	-	$ -	24.50	$ 228,512.00	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103,237.00	$ 0.00	39.60	$ 4,088,198.00	39.60	$ 4,088,198.00	-	$ -	39.60	$ 4,088,198.00	-	$ -
Subtotal					**$ 3,137,365.00**		**$ 4,316,710.00**		**$ 4,316,710.00**		**$ 0.00**		**$ 4,316,710.00**		**$ 0.00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	20.00	$ 10,545.00	$ 210,900.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60,034.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	20.00	$ 43,679.00	$ 873,580.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	534.60	$ 1,793,583.00	534.60	$ 1,793,583.00	-	$ -	534.60	$ 1,793,583.00	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2,588,680.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	100.00	$ 8,282.00	$ 828,200.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 1,912,680.00**		**$ 1,793,583.00**		**$ 1,793,583.00**		**$ -**		**$ 1,793,583.00**		**$ -**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	20.00	$ 212,313.00	$ 4,246,260.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	180.00	$ 28,591.00	$ 5,146,380.00	573.73	$ 16,403,514.00	573.73	$ 16,403,514.00	-	$ -	573.73	$ 16,403,514.00	-	$ -
Subtotal					**$ 9,392,640.00**		**$ 16,403,514.00**		**$ 16,403,514.00**		**$ 0.00**		**$ 16,403,514.00**		**$ 0.00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4,818.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	180.00	$ 4,652.00	$ 837,360.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7,184.00	$ 0.00	1,108.90	$ 7,966,338.00	1,108.90	$ 7,966,338.00	-	$ -	1,108.90	$ 7,966,338.00	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4,966.00	$ 0.00	1,147.46	$ 5,698,286.00	1,147.46	$ 5,698,286.00	-	$ -	1,147.46	$ 5,698,286.00	-	$ -
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,332,529.00	$ 0.00	39.88	$ 53,141,416.00	39.88	$ 53,141,416.00	-	$ -	39.88	$ 53,141,416.00	-	$ -
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	58.00	$ 1,371,977.00	$ 79,574,666.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,425,083.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 80,412,026.00**		**$ 66,806,040.00**		**$ 66,806,040.00**		**$ 0.00**		**$ 66,806,040.00**		**$ 0.00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

VI	**CONCRETOS**																
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**																
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	600.00	$ 3,927.00	$ 2,356,200.00	479.00	$ 1,881,033.00	-	$ -	479.00	$ 1,881,033.00	479.00	$ 1,881,033.00	-	$ -
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	45.00	$ 64,328.00	$ 2,894,760.00	95.96	$ 6,172,915.00	-	$ -	95.96	$ 6,172,915.00	95.96	$ 6,172,915.00	-	$ -
Subtotal					**$ 5,250,960.00**		**$ 8,053,948.00**		**$ 0.00**		**$ 8,053,948.00**		**$ 8,053,948.00**		**$ 0.00**
XI	**DRENAJES**																
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	4.00	$ 422,631.00	$ 1,690,524.00	4.00	$ 1,690,524.00	-	$ -	4.00	$ 1,690,524.00	4.00	$ 1,690,524.00	-	$ -
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	6.00	$ 1,159,538.00	$ 6,957,228.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 8,647,752.00**		**$ 1,690,524.00**		**$ 0.00**		**$ 1,690,524.00**		**$ 1,690,524.00**		**$ 0.00**
XII	**NO PREVISTOS**																
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	17.96	$ 925,569.00	-	$ -	17.96	$ 925,569.00	17.96	$ 925,569.00	-	$ -
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	42.52	$ 680,405.00	-	$ -	42.52	$ 680,405.00	42.52	$ 680,405.00	-	$ -
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	10.00	$ 8,204,040.00	-	$ -	10.00	$ 8,204,040.00	10.00	$ 8,204,040.00	-	$ -
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	5.00	$ 780,435.00	-	$ -	5.00	$ 780,435.00	5.00	$ 780,435.00	-	$ -
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 10,590,449.00**		**$ 0.00**		**$ 10,590,449.00**		**$ 10,590,449.00**		**$ 0.00**
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 109,897,503.00**		**$ 111,537,201.00**		**$ 91,202,280.00**		**$ 20,334,921.00**		**$ 111,537,201.00**		**$ 0.00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

				FECHA DE ELABORACION:	**23 DE NOVIEMBRE DE 2024**
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ]	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

FRENTE 69 - CALLE 3 ENTRE CRA 4 a 12

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.4		EJECUCION							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS									
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1,716.00	$ 0.00	59.30	$ 101,759.00	59.30	$ 101,759.00	-	$ -	59.30	$ 101,759.00	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	377.00	$ 6,356.00	$ 2,396,212.00	150.43	$ 956,133.00	150.43	$ 956,133.00	-	$ -	150.43	$ 956,133.00	-	$ -
Subtotal					**$ 2,396,212.00**		**$ 1,057,892.00**		**$ 1,057,892.00**		**$ 0.00**		**$ 1,057,892.00**		**$ 0.00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	115.00	$ 22,513.00	$ 2,588,995.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	120.00	$ 9,327.00	$ 1,119,240.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103,237.00	$ 0.00	4.45	$ 459,405.00	4.45	$ 459,405.00	-	$ -	4.45	$ 459,405.00	-	$ -
Subtotal					**$ 3,708,235.00**		**$ 459,405.00**		**$ 459,405.00**		**$ 0.00**		**$ 459,405.00**		**$ 0.00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	23.00	$ 10,545.00	$ 242,535.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60,034.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	23.00	$ 43,679.00	$ 1,004,617.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	60.07	$ 201,535.00	60.07	$ 201,535.00	-	$ -	60.07	$ 201,535.00	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2,588,680.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	115.00	$ 8,282.00	$ 952,430.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 2,199,582.00**		**$ 201,535.00**		**$ 201,535.00**		**$ -**		**$ 201,535.00**		**$ -**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	23.00	$ 212,313.00	$ 4,883,199.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	377.00	$ 28,591.00	$ 10,778,807.00	59.30	$ 1,695,446.00	59.30	$ 1,695,446.00	-	$ -	59.30	$ 1,695,446.00	-	$ -
Subtotal					**$ 15,662,006.00**		**$ 1,695,446.00**		**$ 1,695,446.00**		**$ 0.00**		**$ 1,695,446.00**		**$ 0.00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4,818.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	377.00	$ 4,652.00	$ 1,753,804.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7,184.00	$ 0.00	568.40	$ 4,083,386.00	195.60	$ 1,405,190.00	372.80	$ 2,678,196.00	568.40	$ 4,083,386.00	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4,966.00	$ 0.00	118.60	$ 588,968.00	118.60	$ 588,968.00	-	$ -	118.60	$ 588,968.00	-	$ -
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,332,529.00	$ 0.00	4.45	$ 5,929,754.00	4.45	$ 5,929,754.00	-	$ -	4.45	$ 5,929,754.00	-	$ -
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	75.40	$ 1,371,977.00	$ 103,447,066.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,425,083.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 105,200,870.00**		**$ 10,602,108.00**		**$ 7,923,912.00**		**$ 2,678,196.00**		**$ 10,602,108.00**		**$ 0.00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

				FECHA DE ELABORACION:	**23 DE NOVIEMBRE DE 2024**
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1				
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

VI	**CONCRETOS**																
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**																
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	700.00	$ 3,927.00	$ 2,748,900.00	798.40	$ 3,135,317.00	-	$ -	798.40	$ 3,135,317.00	798.40	$ 3,135,317.00	-	$ -		
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	65.00	$ 64,328.00	$ 4,181,320.00	163.76	$ 10,534,353.00	-	$ -	163.76	$ 10,534,353.00	163.76	$ 10,534,353.00	-	$ -		
Subtotal					**$ 6,930,220.00**		**$ 13,669,670.00**		**$ 0.00**		**$ 13,669,670.00**		**$ 13,669,670.00**		**$ 0.00**		
XI	**DRENAJES**																
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	4.00	$ 422,631.00	$ 1,690,524.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	6.00	$ 1,159,538.00	$ 6,957,228.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 8,647,752.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
XII	**NO PREVISTOS**																
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 144,744,877.00**		**$ 27,686,056.00**		**$ 11,338,190.00**		**$ 16,347,866.00**		**$ 27,686,056.00**		**$ 0.00**		

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

				FECHA DE ELABORACION:	**23 DE NOVIEMBRE DE 2024**
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1				
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

FRENTE 70 - CALLE 3 OESTE ENTRE CARRERAS 10 Y 12

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.4		EJECUCION							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS									
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1,716.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	54.00	$ 6,356.00	$ 343,224.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 343,224.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 22,513.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML		$ 9,327.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10,545.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60,034.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 43,679.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2,588,680.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8,282.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3		$ 212,313.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2		$ 28,591.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4,818.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2		$ 4,652.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	500.00	$ 7,184.00	$ 3,592,000.00	432.00	$ 3,103,488.00	-	$ -	432.00	$ 3,103,488.00	432.00	$ 3,103,488.00	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML	300.00	$ 14,328.00	$ 4,298,400.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4,966.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,332,529.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3		$ 1,371,977.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,425,083.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 7,890,400.00**		**$ 3,103,488.00**		**$ 0.00**		**$ 3,103,488.00**		**$ 3,103,488.00**		**$ 0.00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

VI	**CONCRETOS**																
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**																
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	162.00	$ 3,927.00	$ 636,174.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	45.00	$ 64,328.00	$ 2,894,760.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 3,530,934.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
XI	**DRENAJES**																
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 422,631.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 1,159,538.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
XII	**NO PREVISTOS**																
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 11,764,558.00**		**$ 3,103,488.00**		**$ 0.00**		**$ 3,103,488.00**		**$ 3,103,488.00**		**$ 0.00**		

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00 **PRORROGA 1:** Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00 **PRORROGA 2:** Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00 **PRORROGA 3:** N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024 **HASTA EL:**	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

FRENTE 71 - CALLE 1 ENTRE CARRERAS 4 Y 10

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.4		EJECUCION							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS									
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1,716.00	$ 0.00	1,598.46	$ 2,742,957.00	1,598.46	$ 2,742,957.00	-	$ -	1,598.46	$ 2,742,957.00	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	302.00	$ 6,356.00	$ 1,919,512.00	491.50	$ 3,123,974.00	491.50	$ 3,123,974.00	-	$ -	491.50	$ 3,123,974.00	-	$ -
Subtotal					**$ 1,919,512.00**		**$ 5,866,931.00**		**$ 5,866,931.00**		**$ 0.00**		**$ 5,866,931.00**		**$ 0.00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	20.00	$ 22,513.00	$ 450,260.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML		$ 9,327.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3	70.22	$ 103,237.00	$ 7,248,786.00	123.43	$ 12,742,607.00	123.43	$ 12,742,607.00	-	$ -	123.43	$ 12,742,607.00	-	$ -
Subtotal					**$ 7,699,046.00**		**$ 12,742,607.00**		**$ 12,742,607.00**		**$ 0.00**		**$ 12,742,607.00**		**$ 0.00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10,545.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60,034.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	87.77	$ 43,679.00	$ 3,833,651.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	1,666.31	$ 5,590,470.00	1,666.31	$ 5,590,470.00	-	$ -	1,666.31	$ 5,590,470.00	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2,588,680.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8,282.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 3,833,651.00**		**$ 5,590,470.00**		**$ 5,590,470.00**		**$ -**		**$ 5,590,470.00**		**$ -**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3		$ 212,313.00	$ 0.00	4.58	$ 972,394.00	4.58	$ 972,394.00	-	$ -	4.58	$ 972,394.00	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	1,404.30	$ 28,591.00	$ 40,150,341.00	1,598.46	$ 45,701,570.00	1,598.46	$ 45,701,570.00	-	$ -	1,598.46	$ 45,701,570.00	-	$ -
Subtotal					**$ 40,150,341.00**		**$ 46,673,964.00**		**$ 46,673,964.00**		**$ 0.00**		**$ 46,673,964.00**		**$ 0.00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4,818.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	1,053.23	$ 4,652.00	$ 4,899,603.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7,184.00	$ 0.00	626.00	$ 4,497,184.00	-	$ -	626.00	$ 4,497,184.00	626.00	$ 4,497,184.00	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4,966.00	$ 0.00	3,196.92	$ 15,875,905.00	3,196.92	$ 15,875,905.00	-	$ -	3,196.92	$ 15,875,905.00	-	$ -
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,332,529.00	$ 0.00	151.00	$ 201,214,370.00	151.00	$ 201,214,370.00	-	$ -	151.00	$ 201,214,370.00	-	$ -
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	105.32	$ 1,371,977.00	$ 144,500,048.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,425,083.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 149,399,651.00**		**$ 221,587,459.00**		**$ 217,090,275.00**		**$ 4,497,184.00**		**$ 221,587,459.00**		**$ 0.00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

VI	**CONCRETOS**																
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**																
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	906.00	$ 3,927.00	$ 3,557,862.00	824.30	$ 3,237,026.00	-	$ -	824.30	$ 3,237,026.00	824.30	$ 3,237,026.00	-	$ -
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	60.00	$ 64,328.00	$ 3,859,680.00	156.48	$ 10,066,045.00	-	$ -	156.48	$ 10,066,045.00	156.48	$ 10,066,045.00	-	$ -
Subtotal					**$ 7,417,542.00**		**$ 13,303,071.00**		**$ 0.00**		**$ 13,303,071.00**		**$ 13,303,071.00**		**$ 0.00**
XI	**DRENAJES**																
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	6.00	$ 422,631.00	$ 2,535,786.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	8.00	$ 1,159,538.00	$ 9,276,304.00	4.00	$ 4,638,152.00	2.00	$ 2,319,076.00	2.00	$ 2,319,076.00	4.00	$ 4,638,152.00	-	$ -
Subtotal					**$ 11,812,090.00**		**$ 4,638,152.00**		**$ 2,319,076.00**		**$ 2,319,076.00**		**$ 4,638,152.00**		**$ 0.00**
XII	**NO PREVISTOS**																
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	15.53	$ 800,339.00	-	$ -	15.53	$ 800,339.00	15.53	$ 800,339.00	-	$ -
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	7.00	$ 5,742,828.00	-	$ -	7.00	$ 5,742,828.00	7.00	$ 5,742,828.00	-	$ -
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 6,543,167.00**		**$ 0.00**		**$ 6,543,167.00**		**$ 6,543,167.00**		**$ 0.00**
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 222,231,833.00**		**$ 316,945,821.00**		**$ 290,283,323.00**		**$ 26,662,498.00**		**$ 316,945,821.00**		**$ 0.00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00 **PRORROGA 1:** Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00 **PRORROGA 2:** Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00 **PRORROGA 3:** N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024 **HASTA EL:**	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

FRENTE 72 - CALLE 2 ENTRE CARRERAS 4 Y 12

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.4		EJECUCION							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS									
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1,716.00	$ 0.00	621.70	$ 1,066,837.00	621.70	$ 1,066,837.00	-	$ -	621.70	$ 1,066,837.00	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	340.00	$ 6,356.00	$ 2,161,040.00	346.00	$ 2,199,176.00	346.00	$ 2,199,176.00	-	$ -	346.00	$ 2,199,176.00	-	$ -
Subtotal					**$ 2,161,040.00**		**$ 3,266,013.00**		**$ 3,266,013.00**		**$ 0.00**		**$ 3,266,013.00**		**$ 0.00**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	50.00	$ 22,513.00	$ 1,125,650.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML		$ 9,327.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3	63.24	$ 103,237.00	$ 6,528,708.00	48.00	$ 4,955,095.00	48.00	$ 4,955,095.00	-	$ -	48.00	$ 4,955,095.00	-	$ -
Subtotal					**$ 7,654,358.00**		**$ 4,955,095.00**		**$ 4,955,095.00**		**$ 0.00**		**$ 4,955,095.00**		**$ 0.00**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 10,545.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60,034.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	79.05	$ 43,679.00	$ 3,452,825.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	647.96	$ 2,173,906.00	647.96	$ 2,173,906.00	-	$ -	647.96	$ 2,173,906.00	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2,588,680.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8,282.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 3,452,825.00**		**$ 2,173,906.00**		**$ 2,173,906.00**		**$ -**		**$ 2,173,906.00**		**$ -**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3		$ 212,313.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	945.00	$ 28,591.00	$ 27,018,495.00	621.70	$ 17,775,025.00	621.70	$ 17,775,025.00	-	$ -	621.70	$ 17,775,025.00	-	$ -
Subtotal					**$ 27,018,495.00**		**$ 17,775,025.00**		**$ 17,775,025.00**		**$ 0.00**		**$ 17,775,025.00**		**$ 0.00**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4,818.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	945.00	$ 4,652.00	$ 4,396,140.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7,184.00	$ 0.00	755.00	$ 5,423,920.00	713.20	$ 5,123,629.00	41.80	$ 300,291.00	755.00	$ 5,423,920.00	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4,966.00	$ 0.00	1,243.40	$ 6,174,724.00	1,243.40	$ 6,174,724.00	-	$ -	1,243.40	$ 6,174,724.00	-	$ -
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,332,529.00	$ 0.00	48.73	$ 64,930,510.00	48.73	$ 64,930,510.00	-	$ -	48.73	$ 64,930,510.00	-	$ -
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	79.05	$ 1,371,977.00	$ 108,454,782.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,425,083.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 112,850,922.00**		**$ 76,529,154.00**		**$ 76,228,863.00**		**$ 300,291.00**		**$ 76,529,154.00**		**$ 0.00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ]	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

VI	**CONCRETOS**																
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**																
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	1,020.00	$ 3,927.00	$ 4,005,540.00	494.70	$ 1,942,687.00	-	$ -	494.70	$ 1,942,687.00	494.70	$ 1,942,687.00	-	$ -
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	60.00	$ 64,328.00	$ 3,859,680.00	116.90	$ 7,519,943.00	-	$ -	116.90	$ 7,519,943.00	116.90	$ 7,519,943.00	-	$ -
Subtotal					**$ 7,865,220.00**		**$ 9,462,630.00**		**$ 0.00**		**$ 9,462,630.00**		**$ 9,462,630.00**		**$ 0.00**
XI	**DRENAJES**																
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	12.00	$ 422,631.00	$ 5,071,572.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	12.00	$ 1,159,538.00	$ 13,914,456.00	1.00	$ 1,159,538.00	-	$ -	1.00	$ 1,159,538.00	1.00	$ 1,159,538.00	-	$ -
Subtotal					**$ 18,986,028.00**		**$ 1,159,538.00**		**$ 0.00**		**$ 1,159,538.00**		**$ 1,159,538.00**		**$ 0.00**
XII	**NO PREVISTOS**																
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	6.00	$ 936,522.00	-	$ -	6.00	$ 936,522.00	6.00	$ 936,522.00	-	$ -
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	2.00	$ 74,348.00	-	$ -	2.00	$ 74,348.00	2.00	$ 74,348.00	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 1,010,870.00**		**$ 0.00**		**$ 1,010,870.00**		**$ 1,010,870.00**		**$ 0.00**
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 179,988,888.00**		**$ 116,332,231.00**		**$ 104,398,902.00**		**$ 11,933,329.00**		**$ 116,332,231.00**		**$ 0.00**

GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	NIT [X] CC [ ]	NUMERO:	901.853.381-1	FECHA DE INICIO:	21 DE AGOSTO DE 2024
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	PRORROGA 1:	Quince (15) dias	FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	PRORROGA 2:	Siete (07) dias	FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:	
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	PRORROGA 3:	N/A		
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			PERIODO PRESENTE ACTA	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	HASTA EL: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

SUBTOTAL OBRAS	$ 3,230,897,076.00	$ 3,313,884,621.00	$ 1,691,642,435.00	$ 1,420,208,906.00	$ 3,111,851,341.00	$ 202,033,280.00
Plan de Adaptación de la Guia Ambiental - PAGA (2,02%)	$ 65,264,121.00	$ 66,246,829.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 66,246,829.00
Plan de Manejo de Transito - PMT (2,65%)	$ 85,618,773.00	$ 80,173,673.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 80,173,673.00
VALOR TOTAL	$ 3,381,779,970	$ 3,460,305,123	$ 1,691,642,435	$ 1,420,208,905	$ 3,111,851,341	$ 348,453,782

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR OBRAS PRESENTE ACTA (ACTA No. 1)	$ 1,420,208,906.00
VALOR PAGA PRESENTE ACTA (2,02%)	$ 0.00
VALOR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (2,65%)	$ 0.00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 1,420,208,906

ESTADO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00
VALOR CONTRATO CON ADICION	$ 3,460,305,123
EJECUTADO A LA FECHA	$ 3,111,851,341
VALOR PAGADO	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 1,420,208,905
PENDIENTE POR PAGAR	$ 1,691,642,435
PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 348,453,782
% EJECUTADO	89.93%
VALOR NETO A PAGAR PRESENTA ACTA	$ 1,420,208,905

IVAN CAMILO LOPEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

LINDA DANIELA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

APOYO A LA SUPERVISION
Cristian Zapata

SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ
SUB-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VIAL

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRA PRESENTADAS EN ESTA ACTA SON RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y DEL CONTRATISTA.

SOPORTES PRE ACTA DE RECIBO PARCIAL No.: 02

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Alcaldia de Santiago de Cali

PRE ACTA DE RECIBIO PARCIAL TRAMO 26 (GRANADA)

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

				FECHA DE ELABORACION:	**22 DE NOVIEMBRE DE 2024**
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PRORROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PRORROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PRORROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

LOTE 03 - COMUNA 02 SEGUNDO SECTOR Y COMUNA 08

FRENTE 26 - Avenida 9 norte entre avenida 9a N y calle 18 norte

CONDICIONES CONTRACTUALES						**CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.4**		**EJECUCION**							
								ACTAS ANTERIORES		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				**CANTIDADES ACTUALIZADAS**									
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1,716.00	$ 0.00	5,250.29	$ 9,009,498.00	5,250.29	$ 9,009,498.00	-	$ -	5,250.29	$ 9,009,498.00	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	377.00	$ 6,356.00	$ 2,396,212.00	1,002.40	$ 6,371,254.00	930.00	$ 5,911,080.00	72.40	$ 460,174.00	1,002.40	$ 6,371,254.00	-	$ -
Subtotal					**$ 2,396,212.00**		**$ 15,380,752.00**		**$ 14,920,578.00**		**$ 460,174.00**		**$ 15,380,752.00**		**$ -**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	115.00	$ 22,513.00	$ 2,588,995.00	41.11	$ 925,509.00	-	$ -	41.11	$ 925,509.00	41.11	$ 925,509.00	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	120.00	$ 9,327.00	$ 1,119,240.00	150.05	$ 1,399,516.00	26.25	$ 244,834.00	123.80	$ 1,154,682.00	150.05	$ 1,399,516.00	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103,237.00	$ 0.00	434.89	$ 44,896,764.00	434.89	$ 44,896,764.00	-	$ -	434.89	$ 44,896,764.00	-	$ -
Subtotal					**$ 3,708,235.00**		**$ 47,221,789.00**		**$ 45,141,598.00**		**$ 2,080,191.00**		**$ 47,221,789.00**		**$ -**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	23.00	$ 10,545.00	$ 242,535.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60,034.00	$ 0.00	13.30	$ 798,452.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	13.30	$ 798,452.00
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	23.00	$ 43,679.00	$ 1,004,617.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	5,871.02	$ 19,697,266.00	5,871.02	$ 19,697,266.00	-	$ -	5,871.02	$ 19,697,266.00	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2,588,680.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	115.00	$ 8,282.00	$ 952,430.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 2,199,582.00**		**$ 20,495,718.00**		**$ 19,697,266.00**		**$ -**		**$ 19,697,266.00**		**$ 798,452.00**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	23.00	$ 212,313.00	$ 4,883,199.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	377.00	$ 28,591.00	$ 10,778,807.00	5,182.11	$ 148,161,707.00	5,182.11	$ 148,161,707.00	-	$ -	5,182.11	$ 148,161,707.00	-	$ -
Subtotal					**$ 15,662,006.00**		**$ 148,161,707.00**		**$ 148,161,707.00**		**$ -**		**$ 148,161,707.00**		**$ -**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4,818.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	377.00	$ 4,652.00	$ 1,753,804.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7,184.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4,966.00	$ 0.00	10,364.22	$ 51,468,717.00	10,364.22	$ 51,468,717.00	-	$ -	10,364.22	$ 51,468,717.00	-	$ -
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,332,529.00	$ 0.00	452.43	$ 602,871,467.00	452.43	$ 602,871,467.00	-	$ -	452.43	$ 602,871,467.00	-	$ -
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	75.40	$ 1,371,977.00	$ 103,447,066.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,425,083.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 105,200,870.00**		**$ 654,340,184.00**		**$ 654,340,184.00**		**$ -**		**$ 654,340,184.00**		**$ -**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

VI	**CONCRETOS**															
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	15.40	$ 1,428,550.00	-	$ -	15.40	$ 1,428,550.00	15.40	$ 1,428,550.00	-	$ -	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 1,428,550.00**		**$ -**		**$ 1,428,550.00**		**$ 1,428,550.00**		**$**	**$ -**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**															
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	700.00	$ 3,927.00	$ 2,748,900.00	1,579.70	$ 6,203,482.00	-	$ -	995.20	$ 3,908,150.00	995.20	$ 3,908,150.00	584.50	$ 2,295,332.00
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	65.00	$ 64,328.00	$ 4,181,320.00	340.64	$ 21,912,690.00	-	$ -	230.98	$ 14,858,481.00	230.98	$ 14,858,481.00	109.66	$ 7,054,208.00
Subtotal					**$ 6,930,220.00**		**$ 28,116,172.00**		**$ -**		**$ 18,766,631.00**		**$ 18,766,631.00**		**$**	**$ 9,349,540.00**
XI	**DRENAJES**															
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	4.00	$ 422,631.00	$ 1,690,524.00	5.00	$ 2,113,155.00	-	$ -	5.00	$ 2,113,155.00	5.00	$ 2,113,155.00	-	$ -
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	6.00	$ 1,159,538.00	$ 6,957,228.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -
Subtotal					**$ 8,647,752.00**		**$ 2,113,155.00**		**$ -**		**$ 2,113,155.00**		**$ 2,113,155.00**		**$**	**$ -**
XII	**NO PREVISTOS**															
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	3.44	$ 4,787,169.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3.44	$ 4,787,169.00	$ 4,787,169.00
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	411.43	$ 3,388,949.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	411.43	$ 3,388,949.00	$ 3,388,949.00
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	13.00	$ 10,665,252.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	13.00	$ 10,665,252.00	$ 10,665,252.00
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	9.85	$ 366,164.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	9.85	$ 366,164.00	$ 366,164.00
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 19,207,534.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 19,207,534.00**	**$ 19,207,534.00**
SUBTOTAL OBRAS					**$ 144,744,877.00**		**$ 936,465,561.00**		**$ 882,261,333.00**		**$ 24,848,701.00**		**$ 907,110,034.00**		**$ 29,355,526.00**	


SUBTOTAL OBRAS	**$ -**		**$ -**	**$ 882,261,333.00**	**$ 24,848,701.00**		**$ 907,110,034.00**		**$ 29,355,526.00**
Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA (2,02%)	**$ -**		**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ -**		**$ -**
Plan de Manejo de Transito - PMT (2,65%)	**$ -**		**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ -**		**$ -**
VALOR TOTAL	**$ -**		**$ -**	**$ 882,261,333.00**	**$ 24,848,701.00**		**$ 907,110,034.00**		**$ 29,355,526.00**

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	II	**DEMOLICIONES**	FECHA:	23-nov-24
ITEM	2	**LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).**		
UNIDAD	ML			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	
TRAMO 26 - BACHEOS	1.00	45.4			45.40
TRAMO 26 - CUNETA ENTRE CALLE 9N Y CALLE 10N	1.00	27			27.00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	72.40
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	930.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	1,002.40
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1,002.40
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	72.40
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	930.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	1,002.40
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1,002.40
TOTAL POR EJECUTAR	0.00


RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	II	**DEMOLICIONES**	FECHA:	23-nov-24
ITEM	4	**DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.**		
UNIDAD	M2			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 26 - MURO DE CONTENCION	1.00	35.4	0.4		14.16
TRAMO 26 - RESALTO	1.00	10	0.4		4.00
TRAMO 26 - CUNETA ENTRE CALLE 9N Y CALLE 10N	1.00	27	0.85		22.95

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	41.11
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	41.11
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	41.11
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	41.11
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	41.11
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	41.11
TOTAL POR EJECUTAR	0.00


RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	II	**DEMOLICIONES**	FECHA:	23-nov-24
ITEM	5	**CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.**		
UNIDAD	ML			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 26 - MURO DE CONTENCION	2.00	38.4			76.80
TRAMO 26 - RESALTO	2.00	10			20.00
TRAMO 26 - CUNETA ENTRE CALLE 9N Y CALLE 10N	1.00	27			27.00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	123.80
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	26.25
CANTIDAD CONTRACTUAL	150.05
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	150.05
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	123.80
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	26.25
CANTIDAD CONTRACTUAL	150.05
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	150.05
TOTAL POR EJECUTAR	0.00


RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	18	**RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).**		
UNIDAD	M3			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**TOTAL**
	VOLUMEN DE EXCAVACION ITEM NP-7 (M3)	**FACTOR DE EXPANSION**	**DISTANCIA PUNTO DE DISPOSICION**	
TRAMO 26	0.00	1.3		0.00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	0.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	13.30
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	0.00
TOTAL POR EJECUTAR	13.30

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	0.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	13.30
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	0.00
TOTAL POR EJECUTAR	13.30


RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	77	**CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.**		
UNIDAD	ML			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	
TRAMO 26	1.00	15.4			15.40

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	15.40
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	15.40
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	15.40
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	15.40
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	15.40
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	15.40
TOTAL POR EJECUTAR	0.00


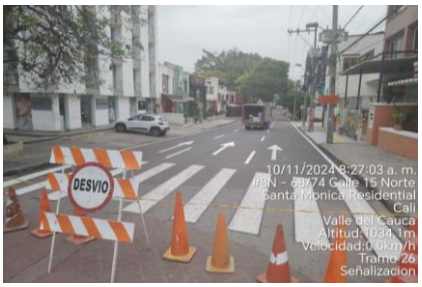
RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	IX	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	FECHA:	22-nov-24
ITEM	105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.			
UNIDAD	ML			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 26 - CALLE 17N A CALLE 16N LINEA DISCONTINUA	2.00	36			72.00
TRAMO 26 - CALLE 17N A CALLE 16N LINEA CONTINUA	2.00	73.6			147.20
TRAMO 26 - CALLE 14N A CALLE 13N LINEA DISCONTINUA	2.00	36			72.00
TRAMO 26 - CALLE 14N A CALLE 13N LINEA CONTINUA	2.00	73			146.00
TRAMO 26 - CALLE 13N A CALLE 12N LINEA DISCONTINUA	2.00	36			72.00
TRAMO 26 - CALLE 13N A CALLE 12N LINEA CONTINUA	2.00	67			134.00
TRAMO 26 - CALLE 12N A CALLE 10N LINEA DISCONTINUA	2.00	60			120.00
TRAMO 26 - CALLE 12N A CALLE 10N LINEA CONTINUA	2.00	116			232.00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	995.20
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	1,579.70
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	995.20
TOTAL POR EJECUTAR	584.50

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	995.20
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	1,579.70
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	995.20
TOTAL POR EJECUTAR	584.50

RESIDENTE DE OBRA:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA


CAPÍTULO	XI	DRENAJES	FECHA:	22-nov-24
ITEM	106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.			
UNIDAD	M2			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 26 - CALLE 16N A CALLE 17N CEBRA L=4.0 m	30.00	4	0.4		48.00
TRAMO 26 - CALLE 16N A CALLE 17N CEBRA COMPLEMENTO L= variable	1.00	4.4	0.4		1.76
TRAMO 26 - CALLE 16N A CALLE 17N LINEA PARE	1.00	8.7	0.6		5.22
TRAMO 26 - CALLE 16N A CALLE 17N FLECHA DE FRENTE	5.00	1.2			6.00
TRAMO 26 - CALLE 16N A CALLE 17N FLECHA GIRO DOBLE	1.00	2.2			2.20
TRAMO 26 - CALLE 13N A CALLE 14N CEBRA L=4.0 m	22.00	4	0.4		35.20
TRAMO 26 - CALLE 13N A CALLE 14N CEBRA COMPLEMENTO L= variable	1.00	7.4	0.4		2.96
TRAMO 26 - CALLE 13N A CALLE 14N LINEA PARE	1.00	8.7	0.6		5.22
TRAMO 26 - CALLE 13N A CALLE 14N FLECHA DE FRENTE	5.00	1.2			6.00
TRAMO 26 - CALLE 13N A CALLE 14N FLECHA GIRO DOBLE	1.00	2.2			2.20
TRAMO 26 - CALLE 12N A CALLE 13N CEBRA L= 4.0 m	26.00	4	0.4		41.60
TRAMO 26 - CALLE 12N A CALLE 13N CEBRA COMPLEMENTO L= variable	1.00	4.4	0.4		1.76
TRAMO 26 - CALLE 12N A CALLE 13N LINEA PARE	1.00	9.7	0.6		5.82
TRAMO 26 - CALLE 12N A CALLE 13N FLECHA DE FRENTE	5.00	1.2			6.00
TRAMO 26 - CALLE 12N A CALLE 13N FLECHA GIRO DOBLE	1.00	2.2			2.20
TRAMO 26 - CALLE 10N A CALLE 12N CEBRA L= 4.0 m	26.00	4	0.4		41.60
TRAMO 26 - CALLE 10N A CALLE 12N CEBRA COMPLEMENTO L= variable	1.00	9.1	0.4		3.64
TRAMO 26 - CALLE 10N A CALLE 12N LINEA PARE	1.00	9	0.6		5.40
TRAMO 26 - CALLE 10N A CALLE 12N FLECHA DE FRENTE	5.00	1.2			6.00
TRAMO 26 - CALLE 10N A CALLE 12N FLECHA GIRO DOBLE	1.00	2.2			2.20

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	230.98
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	340.64
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	230.98
TOTAL POR EJECUTAR	109.66

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XI	**DRENAJES**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	106	**DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.**		
UNIDAD	M2			

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	230.98
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	340.64
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	230.98
TOTAL POR EJECUTAR	109.66


RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XI	DRENAJES	FECHA:	22-nov-24
ITEM	119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.		
UNIDAD	UND			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 26 - K0+165 (CI)	1.00				1.00
TRAMO 26 - K0+195 (EJE)	1.00				1.00
TRAMO 26 - K0+303 (EJE)	1.00				1.00
TRAMO 26 - K0+306 (EJE)	1.00				1.00
TRAMO 26 - K0+396 (DER)	1.00				1.00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	5.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	5.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	5.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	5.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	5.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	5.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

RESIDENTE DE OBRA:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

SOPORTES PRE ACTA DE RECIBO PARCIAL No.: 02

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Alcaldia de Santiago de Cali

PRE ACTA DE RECIBIO PARCIAL TRAMO 28 (GRANADA)

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

LOTE 03 - COMUNA 02 SEGUNDO SECTOR Y COMUNA 08

FRENTE 28 - Avenida 9 norte entre calle 18 norte y calle 21 norte

		CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1		EJECUCION							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS									
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1,716.00	$ 0.00	326.82	$ 560,823.00	326.82	$ 560,823.00	-	$ -	326.82	$ 560,823.00	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	377.00	$ 6,356.00	$ 2,396,212.00	130.00	$ 826,280.00	130.00	$ 826,280.00	-	$ -	130.00	$ 826,280.00	-	$ -
Subtotal					**$ 2,396,212.00**		**$ 1,387,103.00**		**$ 1,387,103.00**		**$ -**		**$ 1,387,103.00**		**$ -**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	115.00	$ 22,513.00	$ 2,588,995.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	120.00	$ 9,327.00	$ 1,119,240.00	111.16	$ 1,036,789.00	111.16	$ 1,036,789.00	-	$ -	111.16	$ 1,036,789.00	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103,237.00	$ 0.00	26.22	$ 2,706,791.00	26.22	$ 2,706,791.00	-	$ -	26.22	$ 2,706,791.00	-	$ -
Subtotal					**$ 3,708,235.00**		**$ 3,743,580.00**		**$ 3,743,580.00**		**$ -**		**$ 3,743,580.00**		**$ -**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	23.00	$ 10,545.00	$ 242,535.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60,034.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	23.00	$ 43,679.00	$ 1,004,617.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	353.96	$ 1,187,536.00	353.96	$ 1,187,536.00	-	$ -	353.96	$ 1,187,536.00	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2,588,680.00	$ 0.00	1.00	$ 2,588,680.00	1.00	$ 2,588,680.00	-	$ -	1.00	$ 2,588,680.00	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	115.00	$ 8,282.00	$ 952,430.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 2,199,582.00**		**$ 3,776,216.00**		**$ 3,776,216.00**		**$ -**		**$ 3,776,216.00**		**$ -**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	23.00	$ 212,313.00	$ 4,883,199.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	377.00	$ 28,591.00	$ 10,778,807.00	326.82	$ 9,344,111.00	326.82	$ 9,344,111.00	-	$ -	326.82	$ 9,344,111.00	-	$ -
Subtotal					**$ 15,662,006.00**		**$ 9,344,111.00**		**$ 9,344,111.00**		**$ -**		**$ 9,344,111.00**		**$ -**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4,818.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	377.00	$ 4,652.00	$ 1,753,804.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7,184.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4,966.00	$ 0.00	653.64	$ 3,245,976.00	653.64	$ 3,245,976.00	-	$ -	653.64	$ 3,245,976.00	-	$ -

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	

SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ							**PERIODO PRESENTE ACTA**									
								DESDE EL:	12 DE OCTUBRE DE 2024		**HASTA EL:**		**HASTA EL:**	22 DE NOVIEMBRE DE 2024		
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,332,529.00	$ 0.00	26.25	$ 34,975,345.00	26.25	$ 34,975,345.00	-	$ -	26.25	$ 34,975,345.00	-	$ -		
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	75.40	$ 1,371,977.00	$ 103,447,066.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,425,083.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 105,200,870.00**		**$ 38,221,321.00**		**$ 38,221,321.00**		**$ -**		**$ 38,221,321.00**		**$ -**		
VI	**CONCRETOS**																
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**																
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	700.00	$ 3,927.00	$ 2,748,900.00	308.00	$ 1,209,516.00	-	$ -	308.00	$ 1,209,516.00	308.00	$ 1,209,516.00	-	$ -		
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	65.00	$ 64,328.00	$ 4,181,320.00	141.58	$ 9,107,558.00	-	$ -	49.00	$ 3,152,072.00	49.00	$ 3,152,072.00	92.58	$ 5,955,486.00		
Subtotal					**$ 6,930,220.00**		**$ 10,317,074.00**		**$ -**		**$ 4,361,588.00**		**$ 4,361,588.00**		**$ 5,955,486.00**		
XI	**DRENAJES**																
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	4.00	$ 422,631.00	$ 1,690,524.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	6.00	$ 1,159,538.00	$ 6,957,228.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 8,647,752.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		
XII	**NO PREVISTOS**																
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

				FECHA DE ELABORACION:	**22 DE NOVIEMBRE DE 2024**
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ]	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL:	12 DE OCTUBRE DE 2024 **HASTA EL:** **HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

Subtotal			**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$**	**-**		**$**	**-**	**$**	**-**

SUBTOTAL OBRAS			**$ 144,744,877.00**		**$ 66,789,405.00**		**$**	**56,472,331.00**		**$**	**4,361,588.00**	**$**	**60,833,919.00**	**$**	**5,955,486.00**


SUBTOTAL OBRAS	**$**	**-**		**$**	**-**		**$**	**56,472,331.00**		**$**	**4,361,588.00**	**$**	**60,833,919.00**	**$**	**5,955,486.00**
Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA (2,02%)	**$**	**-**		**$**	**-**		**$**	**-**		**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**
Plan de Manejo de Transito - PMT (2,65%)	**$**	**-**		**$**	**-**		**$**	**-**		**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**
VALOR TOTAL	**$**	**-**		**$**	**-**		**$**	**56,472,331.00**		**$**	**4,361,588.00**	**$**	**60,833,919.00**	**$**	**5,955,486.00**

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	105	**DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.**		
UNIDAD	ML			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 28 - CALLE 21N A CALLE 20N LINEA DISCONTINUA	2.00	30			60.00
TRAMO 28 - CALLE 21N A CALLE 20N LINEA CONTINUA DERECHA	1.00	76			76.00
TRAMO 28 - CALLE 21N A CALLE 20N LINEA CONTINUA IZQUIERDA	1.00	68			68.00
TRAMO 28 - CALLE 20N A CALLE 18N LINEA DISCONTINUA	2.00	21			42.00
TRAMO 28 - CALLE 20N A CALLE 18N LINEA CONTINUA	2.00	31			62.00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	308.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	308.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	308.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	308.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	308.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	308.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00


RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XI	**DRENAJES**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	106	**DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.**		
UNIDAD	M2			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 28 - CALLE 16 A CALLE 17 LINEA PARE	1.00	11	0.6		6.60
TRAMO 28 - CALLE 16 A CALLE 17 FLECHA DE FRENTE	2.00	1.2			2.40
TRAMO 28 - CALLE 16 A CALLE 17 FLECHA GIRO DOBLE	1.00	2.2			2.20
TRAMO 28 - CALLE 20N A CALLE 18N CEBRA L=4.0 m	15.00	4	0.4		24.00
TRAMO 28 - CALLE 20N A CALLE 18N CEBRA COMPLEMENTO L= variable	1.00	4.5	0.4		1.80
TRAMO 28 - CALLE 20N A CALLE 18N LINEA PARE	1.00	11	0.6		6.60
TRAMO 28 - CALLE 20N A CALLE 18N FLECHA GIRO UNICO	3.00	1.8			5.40

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	49.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	141.58
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	49.00
TOTAL POR EJECUTAR	92.58

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	49.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	141.58
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	49.00
TOTAL POR EJECUTAR	92.58

RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

SOPORTES PRE ACTA DE RECIBO PARCIAL No.: 02

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Alcaldia de Santiago de Cali

PRE ACTA DE RECIBIO PARCIAL TRAMO 39 (GRANADA)

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

				FECHA DE ELABORACION:	**22 DE NOVIEMBRE DE 2024**
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PRORROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PRORROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PRORROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

LOTE 03 - COMUNA 02 SEGUNDO SECTOR Y COMUNA 08

FRENTE 39 - Avenida 8 norte entre calle 21 norte y avenida 4 norte

CONDICIONES CONTRACTUALES						**CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1**		**EJECUCION**							
								ACTAS ANTERIORES		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				**CANTIDADES ACTUALIZADAS**									
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1,716.00	$ 0.00	10,116.43	$ 17,359,794.00	-	$ -	10,116.43	$ 17,359,794.00	10,116.43	$ 17,359,794.00	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	377.00	$ 6,356.00	$ 2,396,212.00	1,140.00	$ 7,245,840.00	-	$ -	1,140.00	$ 7,245,840.00	1,140.00	$ 7,245,840.00	-	$ -
Subtotal					**$ 2,396,212.00**		**$ 24,605,634.00**		**$ -**		**$ 24,605,634.00**		**$ 24,605,634.00**		**$ -**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	115.00	$ 22,513.00	$ 2,588,995.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	120.00	$ 9,327.00	$ 1,119,240.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103,237.00	$ 0.00	593.74	$ 61,295,936.00	-	$ -	593.74	$ 61,295,936.00	593.74	$ 61,295,936.00	-	$ -
Subtotal					**$ 3,708,235.00**		**$ 61,295,936.00**		**$ -**		**$ 61,295,936.00**		**$ 61,295,936.00**		**$ -**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	23.00	$ 10,545.00	$ 242,535.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60,034.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	23.00	$ 43,679.00	$ 1,004,617.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	8,015.49	$ 26,891,969.00	-	$ -	8,015.49	$ 26,891,969.00	8,015.49	$ 26,891,969.00	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2,588,680.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	115.00	$ 8,282.00	$ 952,430.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 2,199,582.00**		**$ 26,891,969.00**		**$ -**		**$ 26,891,969.00**		**$ 26,891,969.00**		**$ -**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	23.00	$ 212,313.00	$ 4,883,199.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	377.00	$ 28,591.00	$ 10,778,807.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 15,662,006.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4,818.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	377.00	$ 4,652.00	$ 1,753,804.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7,184.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4,966.00	$ 0.00	10,116.43	$ 50,238,191.00	-	$ -	10,116.43	$ 50,238,191.00	10,116.43	$ 50,238,191.00	-	$ -
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,332,529.00	$ 0.00	518.15	$ 690,449,636.00	-	$ -	497.73	$ 663,239,659.00	497.73	$ 663,239,659.00	20.42	$ 27,209,977.00
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	75.40	$ 1,371,977.00	$ 103,447,066.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,425,083.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 105,200,870.00**		**$ 740,687,827.00**		**$ -**		**$ 713,477,850.00**		**$ 713,477,850.00**		**$ 27,209,977.00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

				FECHA DE ELABORACION:	**22 DE NOVIEMBRE DE 2024**
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** **HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

VI	**CONCRETOS**															
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**															
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	700.00	$ 3,927.00	$ 2,748,900.00	2,286.00	$ 8,977,122.00	-	$ -	815.00	$ 3,200,505.00	815.00	$ 3,200,505.00	1,471.00	$ 5,776,617.00
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	65.00	$ 64,328.00	$ 4,181,320.00	670.77	$ 43,149,293.00	-	$ -	236.84	$ 15,235,444.00	236.84	$ 15,235,444.00	433.93	$ 27,913,849.00
Subtotal					**$ 6,930,220.00**		**$ 52,126,415.00**		**$ -**		**$ 18,435,949.00**		**$ 18,435,949.00**		**$ 33,690,466.00**
XI	**DRENAJES**															
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	4.00	$ 422,631.00	$ 1,690,524.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	6.00	$ 1,159,538.00	$ 6,957,228.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 8,647,752.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
XII	**NO PREVISTOS**															
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**

SUBTOTAL OBRAS					**$ 144,744,877.00**		**$ 905,607,781.00**		**$ -**		**$ 844,707,338.00**		**$ 844,707,338.00**		**$ 60,900,443.00**

SUBTOTAL OBRAS					**$ 144,744,877.00**		**$ 905,607,781.00**		**$ -**		**$ 844,707,338.00**		**$ 844,707,338.00**		**$ 60,900,443.00**
Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA (2,02%)					**$ 2,923,847.00**		**$ 18,293,277.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
Plan de Manejo de Transito - PMT (2,65%)					**$ 3,835,739.00**		**$ 23,998,606.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
VALOR TOTAL					**$ 151,504,463.00**		**$ 947,899,664.00**		**$ -**		**$ 844,707,338.00**		**$ 844,707,338.00**		**$ 60,900,443.00**

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	1	**LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).**		
UNIDAD	M2			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**TOTAL**
	CANTIDAD	**AREA SEGÚN CARTERA DE CAMPO**	**ESPESOR**	
TRAMO 39	1.00	10,116.43		10,116.43

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	10,116.43
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	10,116.43
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	10,116.43
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	10,116.43
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	10,116.43
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	10,116.43
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

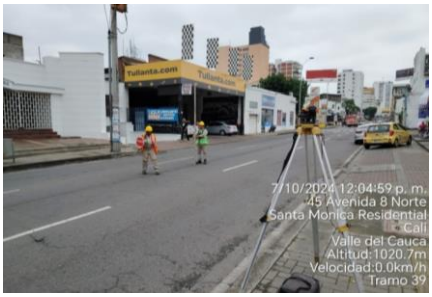
RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	II	**DEMOLICIONES**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	2	**LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).**		
UNIDAD	ML			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	
TRAMO 39	1.00	1140			1,140.00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	1,140.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	1,140.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1,140.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	1,140.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	1,140.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1,140.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	II	**DEMOLICIONES**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	6	**FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.**		
UNIDAD	M3			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**	**TOTAL**
	VOLUMEN SEGÚN CARTERA DE CAMPO	
AREA TOTAL SIN DESCUENTOS	593.74	593.74

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	593.74
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	593.74
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	593.74
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	593.74
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	593.74
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	593.74
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES TOPOGRAFIA TRAMO 39

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0745-2024.-2024 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

CONS: **CONSORCIO SAN DIEGO**

SAN DIEGO CONSORCIO

DIRECCION : CANTIDADES DE OBRA AV8N ENTRE CALLES 21N-9N TRAMO 39

COMUNA : 3
BARRIO : GRANADA

	COTAS PAVIMENTO INICIAL					COTAS FRESADO					PROMEDIO CORTE					PROM ESPESOR	ANCHO	PROM ANCHO	LONGITUD	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
ABS	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ							
K0-020	1010.871	1010.940	1011.007	1010.922	1010.841	1010.806	1010.871	1010.936	1010.854	1010.772							8.640					
											0.065	0.067	0.071	0.068	0.068	0.068		8.820	5.000	44.100	2.999	2.999
K0-015	1010.887	1010.941	1011.000	1010.919	1010.840	1010.823	1010.876	1010.928	1010.850	1010.772							9.000					
											0.063	0.064	0.072	0.069	0.067	0.067		9.180	5.000	45.900	3.084	6.083
K0-010	1010.903	1010.942	1010.993	1010.915	1010.839	1010.840	1010.880	1010.920	1010.846	1010.772							9.360					
											0.064	0.062	0.069	0.065	0.062	0.065		9.393	5.000	46.963	3.034	9.117
K0-005	1010.900	1010.931	1010.969	1010.909	1010.851	1010.834	1010.869	1010.903	1010.848	1010.793							9.425					
											0.067	0.063	0.062	0.057	0.062	0.062		9.458	5.000	47.288	2.937	12.054
K0+000	1010.896	1010.920	1010.944	1010.903	1010.881	1010.828	1010.857	1010.886	1010.850	1010.814							9.490					
											0.069	0.060	0.059	0.055	0.072	0.063		9.550	5.000	47.750	3.018	15.071
K0+005	1010.880	1010.903	1010.943	1010.906	1010.891	1010.810	1010.846	1010.882	1010.848	1010.814							9.610					
											0.071	0.054	0.062	0.060	0.072	0.064		9.670	5.000	48.350	3.090	18.161
K0+010	1010.862	1010.885	1010.941	1010.909	1010.882	1010.791	1010.834	1010.878	1010.846	1010.814							9.730					
											0.075	0.052	0.062	0.059	0.072	0.064		9.713	5.000	48.563	3.113	21.274
K0+015	1010.851	1010.876	1010.934	1010.891	1010.873	1010.773	1010.823	1010.873	1010.835	1010.796							9.695					
											0.065	0.054	0.059	0.052	0.074	0.061		9.678	5.000	48.388	2.952	24.225
K0+020	1010.806	1010.866	1010.926	1010.872	1010.849	1010.754	1010.811	1010.868	1010.823	1010.778							9.660					
											0.063	0.053	0.056	0.050	0.073	0.059		9.640	5.000	48.200	2.851	27.076
K0+025	1010.842	1010.870	1010.922	1010.876	1010.858	1010.768	1010.818	1010.868	1010.825	1010.782							9.620					
											0.066	0.050	0.052	0.052	0.066	0.057		9.600	5.000	48.000	2.748	29.824
K0+030	1010.841	1010.873	1010.918	1010.880	1010.842	1010.782	1010.825	1010.868	1010.827	1010.786							9.580					
											0.054	0.050	0.052	0.054	0.055	0.053		9.580	5.000	47.900	2.546	32.370
K0+035	1010.849	1010.891	1010.932	1010.894	1010.856	1010.799	1010.839	1010.878	1010.840	1010.801							9.580					
											0.052	0.054	0.056	0.055	0.054	0.054		9.580	5.000	47.900	2.603	34.974
K0+040	1010.870	1010.908	1010.946	1010.908	1010.870	1010.816	1010.852	1010.888	1010.852	1010.816							9.580					
											0.056	0.058	0.060	0.060	0.060	0.059		9.570	5.000	47.850	2.830	37.804
K0+045	1010.877	1010.924	1010.971	1010.930	1010.888	1010.819	1010.864	1010.908	1010.865	1010.821							9.560					
											0.060	0.063	0.065	0.069	0.065	0.064		9.550	5.000	47.750	3.077	40.882
K0+050	1010.884	1010.940	1010.996	1010.951	1010.888	1010.822	1010.875	1010.928	1010.877	1010.826							9.540					
											0.060	0.063	0.067	0.070	0.065	0.065		9.550	5.000	47.750	3.111	43.992
K0+055	1010.915	1010.962	1011.009	1010.968	1010.926	1010.856	1010.900	1010.944	1010.901	1010.858							9.560					
											0.057	0.060	0.064	0.063	0.062	0.061		9.570	5.000	47.850	2.931	46.923
K0+060	1010.946	1010.984	1011.022	1010.984	1010.946	1010.890	1010.925	1010.960	1010.925	1010.890							9.580					
											0.053	0.058	0.064	0.061	0.057	0.059		9.555	5.000	47.775	2.807	49.730
K0+065	1010.956	1011.000	1011.044	1011.002	1010.959	1010.906	1010.942	1010.978	1010.939	1010.900							9.530					
											0.054	0.057	0.068	0.064	0.060	0.061		9.505	5.000	47.525	2.897	52.627
K0+070	1010.981	1011.016	1011.066	1011.019	1010.972	1010.922	1010.959	1010.996	1010.953	1010.910							9.480					
											0.060	0.053	0.065	0.065	0.065	0.062		9.498	5.000	47.488	2.942	55.569
K0+075	1011.020	1011.040	1011.082	1011.036	1010.989	1010.958	1010.990	1011.021	1010.971	1010.921							9.515					
											0.067	0.046	0.056	0.064	0.071	0.061		9.533	5.000	47.663	2.910	58.478
K0+080	1011.067	1011.063	1011.098	1011.052	1011.006	1010.994	1011.020	1011.046	1010.989	1010.932							9.550					
											0.068	0.046	0.053	0.063	0.073	0.061		9.640	5.000	48.200	2.931	61.409
K0+085	1011.072	1011.081	1011.111	1011.073	1011.034	1011.008	1011.032	1011.056	1011.009	1010.962							9.730					
											0.057	0.051	0.056	0.064	0.071	0.060		9.820	5.000	49.100	2.941	64.350
K0+090	1011.072	1011.098	1011.124	1011.093	1011.062	1011.022	1011.044	1011.066	1011.029	1010.992							9.910					
											0.051	0.055	0.059	0.060	0.069	0.059		9.845	5.000	49.225	2.902	67.252
K0+095	1011.087	1011.114	1011.140	1011.099	1011.073	1011.034	1011.058	1011.081	1011.043	1011.004							9.780					
											0.055	0.057	0.060	0.056	0.068	0.059		9.715	5.000	48.575	2.868	70.120
K0+100	1011.102	1011.129	1011.156	1011.112	1011.083	1011.046	1011.071	1011.096	1011.056	1011.016							9.650					
											0.055	0.058	0.059	0.053	0.062	0.057		9.630	5.000	48.150	2.764	72.884
K0+105	1011.121	1011.145	1011.168	1011.121	1011.098	1011.066	1011.086	1011.111	1011.071	1011.041							9.610					
											0.054	0.059	0.055	0.057	0.055	0.056		9.590	5.000	47.950	2.695	75.579
K0+110	1011.140	1011.160	1011.180	1011.150	1011.120	1011.086	1011.101	1011.126	1011.086	1011.066							9.570					
											0.055	0.057	0.058	0.059	0.052	0.056		9.548	5.000	47.738	2.692	78.271
K0+115	1011.156	1011.186	1011.230	1011.185	1011.153	1011.099	1011.131	1011.168	1011.130	1011.102							9.525					
											0.058	0.053	0.061	0.056	0.049	0.055		9.503	5.000	47.513	2.635	80.906
K0+120	1011.171	1011.213	1011.271	1011.231	1011.185	1011.112	1011.161	1011.210	1011.174	1011.138							9.480					
											0.060	0.055	0.063	0.054	0.050	0.056		9.498	5.000	47.488	2.683	83.589
K0+125	1011.221	1011.259	1011.297	1011.258	1011.219	1011.159	1011.200	1011.232	1011.207	1011.166							9.515					
											0.063	0.063	0.070	0.054	0.055	0.061		9.533	5.000	47.663	2.905	86.494
K0+130	1011.270	1011.305	1011.328	1011.296	1011.252	1011.206	1011.238	1011.254	1011.239	1011.194							9.550					
											0.061	0.062	0.069	0.058	0.063	0.063		9.548	5.000	47.738	3.003	89.497
K0+135	1011.309	1011.344	1011.379	1011.342	1011.305	1011.250	1011.286	1011.314	1011.283	1011.237							9.545					
											0.056	0.054	0.054	0.060	0.070	0.059		9.543	5.000	47.713	2.810	92.307
K0+140	1011.348	1011.383	1011.418	1011.388	1011.352	1011.294	1011.334	1011.374	1011.327	1011.280							9.540					
											0.061	0.059	0.050	0.061	0.072	0.061		9.548	5.000	47.738	2.895	95.202
K0+145	1011.459	1011.464	1011.488	1011.455	1011.421	1011.390	1011.394	1011.433	1011.394	1011.349							9.555					
											0.072	0.071	0.061	0.061	0.069	0.067		9.563	5.000	47.813	3.196	98.398
K0+150	1011.562	1011.527	1011.558	1011.521	1011.484	1011.486	1011.454	1011.492	1011.460	1011.418							9.570					
											0.064	0.072	0.065	0.066	0.062	0.066		9.628	5.000	48.138	3.175	101.573
K0+155	1011.602	1011.587	1011.631	1011.592	1011.553	1011.550	1011.516	1011.566	1011.521	1011.495							9.685					
											0.053	0.075	0.064	0.077	0.056	0.065		9.743	5.000	48.713	3.174	104.747
K0+160	1011.668	1011.657	1011.704	1011.663	1011.627	1011.614	1011.578	1011.640	1011.581	1011.572							9.800					
											0.056	0.080	0.065	0.076	0.053	0.066		9.845	5.000	49.225	3.261	108.008
K0+165	1011.708	1011.729	1011.760	1011.718	1011.679	1011.649	1011.647	1011.694	1011.648	1011.627							9.890					
											0.062	0.068	0.067	0.064	0.061	0.064		9.935	5.000	49.675	3.202	111.209
K0+170	1011.749	1011.771	1011.816	1011.773	1011.752	1011.684	1011.716	1011.748	1011.715	1011.682							9.980					
											0.060	0.054	0.063	0.055	0.067	0.060		9.888	5.000	49.438	2.951	114.161
K0+175	1011.798	1011.832	1011.872	1011.833	1011.810	1011.744	1011.779	1011.814	1011.780	1011.746							9.795					
											0.053	0.051	0.053	0.055	0.063	0.055		9.703	5.000	48.513	2.668	116.829
K0+180	1011.856	1011.892	1011.928	1011.903	1011.871	1011.804	1011.842	1011.880	1011.845	1011.810							9.610					
											0.052	0.051	0.050	0.056	0.064	0.054		9.605	5.000	48.025	2.615	119.444
K0+185	1011.911	1011.952	1011.993	1011.959	1011.933	1011.860	1011.901	1011.941	1011.904	1011.867							9.600					
											0.051	0.052	0.054	0.055	0.060	0.054		9.595	5.000	47.975	2.603	122.047
K0+190	1011.966	1012.012	1012.058	1012.017	1011.978	1011.916	1011.959	1012.002	1011.963	1011.924							9.590					
											0.055	0.055	0.056	0.057	0.058	0.056		9.580	5.000	47.900	2.680	124.727
K0+195	1012.027	1012.061	1012.097	1012.057	1012.017	1011.968	1012.005	1012.041	1011.998	1011.955							9.570					
											0.061	0.059	0.056	0.064	0.067	0.061		9.560	5.000	47.800	2.937	127.664
K0+200	1012.083	1012.112	1012.136	1012.102	1012.058	1012.020	1012.050	1012.080	1012.033	1011.986							9.550					
											0.060	0.058	0.058	0.067	0.071	0.063		9.558	5.000	47.788	3.001	130.665
K0+205	1012.100	1012.131	1012.173	1012.137	1012.100	1012.043	1012.078	1012.112	1012.071	1012.030							9.565					
											0.065	0.061	0.063	0.064	0.064	0.064		9.573	5.000	47.863	3.044	133.709
K0+210	1012.140	1012.175	1012.210	1012.171	1012.132	1012.066	1012.105	1012.144	1012.109	1012.074							9.580					
											0.073	0.074	0.071	0.066	0.062	0.069		9.625	5.000	48.125	3.335	137.044
K0+215	1012.168	1012.214	1012.251	1012.210	1012.169	1012.096	1012.136	1012.175	1012.139	1012.103							9.670					
											0.072	0.076	0.076	0.070	0.070	0.073		9.715	5.000	48.575	3.541	140.585
K0+220	1012.198	1012.241	1012.282	1012.238	1012.206	1012.126	1012.166	1012.206	1012.169	1012.132							9.760					
											0.072	0.069	0.077	0.075	0.069	0.072		9.815	5.000	49.075	3.551	144.136
K0+225	1012.268	1012.320	1012.371	1012.327	1012.282	1012.196	1012.257	1012.293	1012.246	1012.218							9.870					
											0.065	0.058	0.074	0.074	0.059	0.066		9.925	5.000	49.625	3.273	147.408
K0+230	1012.324	1012.401	1012.450	1012.389	1012.358	1012.266	1012.348	1012.380	1012.322	1012.304							9.980					
											0.055	0.055	0.063	0.067	0.056	0.059		9.888	5.000	49.438	2.942	150.350
K0+235	1012.451	1012.519	1012.557	1012.516	1012.474	1012.398	1012.462	1012.500	1012.448	1012.416							9.795					
											0.054	0.058	0.055	0.060	0.060	0.057		9.703	5.000	48.513	2.785	153.135
K0+240	1012.585	1012.634	1012.672	1012.627	1012.590	1012.530	1012.575	1012.620	1012.574	1012.528							9.610					
											0.056	0.054	0.055	0.055	0.056	0.055		9.593	5.000	47.963	2.652	155.787
K0+245	1012.741	1012.776	1012.826	1012.779	1012.726	1012.684	1012.726	1012.768	1012.722	1012.676							9.575					
											0.054	0.055	0.061	0.058	0.054	0.056		9.558	5.000	47.788	2.700	158.487
K0+250	1012.890	1012.937	1012.981	1012.928	1012.882	1012.838	1012.877	1012.916	1012.870	1012.824							9.540					
											0.053	0.058	0.066	0.056	0.054	0.057		9.543	5.000	47.713	2.734	161.221
K0+255	1013.054	1013.099	1013.173	1013.097	1013.041	1013.001	1013.044	1013.106	1013.043	1012.990							9.545					
											0.059	0.064	0.053	0.058	0.057	0.058		9.548	5.000	47.738	2.778	163.999
K0+260	1013.228	1013.282	1013.336	1013.278	1013.220	1013.164	1013.210	1013.296	1013.216	1013.156							9.550					
											0.061	0.068	0.052	0.060	0.060	0.060		9.548	5.000	47.738	2.876	166.875
K0+265	1013.376	1013.441	1013.506	1013.444	1013.382	1013.318	1013.378	1013.442	1013.386	1013.325							9.545					
											0.055	0.059	0.069	0.056	0.053	0.059		9.543	5.000	47.713	2.794	169.669
K0+270	1013.524	1013.600	1013.662	1013.610	1013.544	1013.472	1013.545	1013.588	1013.556	1013.494							9.540					
											0.051	0.058	0.068	0.061	0.058	0.059		9.535	5.000	47.675	2.822	172.491
K0+275	1013.679	1013.744	1013.783	1013.752	1013.695	1013.629	1013.683	1013.722	1013.683	1013.629							9.530					
											0.049	0.064	0.067	0.070	0.070	0.064		9.525	5.000	47.625	3.048	175.539
K0+280	1013.834	1013.888	1013.928	1013.882	1013.838	1013.786	1013.821	1013.856	1013.810	1013.764							9.520					
											0.047	0.066	0.070	0.074	0.073	0.066		9.563	5.000	47.813	3.151	178.690
K0+285	1013.949	1014.002	1014.038	1014.008	1013.965	1013.903	1013.937	1013.971	1013.932	1013.893							9.605					
											0.045	0.064	0.067	0.077	0.073	0.065		9.648	5.000	48.238	3.150	181.840
K0+290	1014.064	1014.116	1014.154	1014.132	1014.096	1014.020	1014.053	1014.086	1014.054	1014.022							9.690					
											0.045	0.063	0.068	0.074	0.068	0.064		9.660	5.000	48.300	3.074	184.914
K0+295	1014.167	1014.210	1014.243	1014.218	1014.182	1014.120	1014.148	1014.175	1014.148	1014.120							9.630					
											0.048	0.062	0.071	0.066	0.056	0.061		9.600	5.000	48.000	2.916	187.830
K0+300	1014.270	1014.304	1014.338	1014.303	1014.268	1014.220	1014.242	1014.264	1014.241	1014.218							9.570					
											0.054	0.065	0.076	0.067	0.057	0.064		9.560	5.000	47.800	3.045	190.875
K0+305	1014.343	1014.378	1014.413	1014.373	1014.333	1014.285	1014.310	1014.335	1014.302	1014.269							9.550					
											0.062	0.071	0.080	0.075	0.071	0.072		9.540	5.000	47.700	3.430	194.305
K0+310	1014.416	1014.452	1014.488	1014.443	1014.398	1014.350	1014.378	1014.406	1014.363	1014.320							9.530					
											0.065	0.071	0.078	0.077	0.076	0.074		9.540	5.000	47.700	3.515	197.820
K0+315	1014.456	1014.489	1014.521	1014.488	1014.454	1014.393	1014.420	1014.446	1014.413	1014.379							9.550					
											0.061	0.066	0.071	0.072	0.073	0.069		9.560	5.000	47.800	3.303	201.123
K0+320	1014.496	1014.525	1014.554	1014.532	1014.510	1014.436	1014.461	1014.486	1014.462	1014.438							9.570					
											0.060	0.064	0.067	0.070	0.074	0.067		9.578	5.000	47.888	3.216	204.339
K0+325	1014.546	1014.578	1014.610	1014.582	1014.553	1014.485	1014.515	1014.544	1014.511	1014.477							9.585					
											0.061	0.063	0.065	0.071	0.073	0.067		9.593	5.000	47.963	3.206	207.545

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES TOPOGRAFIA TRAMO 39

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0745-2024.-2024 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

CONS: **CONSORCIO SAN DIEGO**

SAN DIEGO CONSORCIO

DIRECCION : CANTIDADES DE OBRA AV8N ENTRE CALLES 21N-9N TRAMO 39

COMUNA : 3
BARRIO : GRANADA

	COTAS PAVIMENTO INICIAL					COTAS FRESADO					PROMEDIO CORTE					PROM ESPESOR	ANCHO	PROM ANCHO	LONGITUD	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
ABS	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ							
K0+330	1014.596	1014.631	1014.666	1014.631	1014.586	1014.534	1014.568	1014.602	1014.559	1014.516							9.600					
											0.058	0.063	0.067	0.072	0.072	0.067		9.600	5.000	48.000	3.197	210.742
K0+335	1014.646	1014.687	1014.728	1014.689	1014.649	1014.591	1014.625	1014.658	1014.616	1014.574							9.600					
											0.051	0.062	0.073	0.073	0.072	0.066		9.600	5.000	48.000	3.187	213.929
K0+340	1014.696	1014.743	1014.790	1014.746	1014.702	1014.648	1014.681	1014.714	1014.673	1014.632							9.600					
											0.049	0.063	0.076	0.069	0.061	0.064		9.590	5.000	47.950	3.054	216.984
K0+345	1014.780	1014.815	1014.849	1014.803	1014.756	1014.729	1014.751	1014.773	1014.738	1014.703							9.580					
											0.052	0.064	0.076	0.060	0.059	0.062		9.570	5.000	47.850	2.991	219.974
K0+350	1014.864	1014.886	1014.908	1014.859	1014.840	1014.810	1014.821	1014.832	1014.803	1014.774							9.560					
											0.053	0.065	0.077	0.061	0.060	0.063		9.560	5.000	47.800	3.031	223.005
K0+355	1014.905	1014.938	1014.971	1014.932	1014.892	1014.853	1014.873	1014.892	1014.865	1014.838							9.560					
											0.051	0.066	0.076	0.072	0.063	0.065		9.560	5.000	47.800	3.131	226.136
K0+360	1014.946	1014.990	1015.025	1015.004	1014.974	1014.896	1014.924	1014.952	1014.927	1014.902							9.560					
											0.056	0.066	0.075	0.075	0.071	0.069		9.505	5.000	47.525	3.270	229.405
K0+365	1015.040	1015.072	1015.110	1015.074	1015.038	1014.977	1015.005	1015.033	1015.001	1014.968							9.450					
											0.051	0.067	0.071	0.074	0.069	0.066		9.395	5.000	46.975	3.124	232.529
K0+370	1015.098	1015.153	1015.180	1015.148	1015.102	1015.058	1015.086	1015.114	1015.074	1015.034							9.340					
											0.047	0.066	0.071	0.075	0.062	0.064		9.325	5.000	46.625	2.996	235.525
K0+375	1015.173	1015.216	1015.248	1015.223	1015.187	1015.119	1015.151	1015.172	1015.146	1015.131							9.310					
											0.061	0.064	0.077	0.074	0.055	0.066		9.295	5.000	46.475	3.079	238.604
K0+380	1015.248	1015.278	1015.308	1015.290	1015.282	1015.180	1015.215	1015.230	1015.218	1015.228							9.280					
											0.070	0.065	0.074	0.073	0.055	0.068		9.348	5.000	46.738	3.157	241.761
K0+385	1015.308	1015.339	1015.353	1015.339	1015.319	1015.236	1015.272	1015.283	1015.264	1015.262							9.415					
											0.074	0.069	0.083	0.076	0.058	0.072		9.483	5.000	47.413	3.407	245.168
K0+390	1015.368	1015.400	1015.432	1015.387	1015.354	1015.292	1015.329	1015.336	1015.310	1015.296							9.550					
											0.073	0.067	0.083	0.075	0.056	0.071		9.555	5.000	47.775	3.385	248.552
K0+395	1015.412	1015.445	1015.478	1015.434	1015.397	1015.341	1015.382	1015.408	1015.361	1015.344							9.560					
											0.068	0.059	0.057	0.072	0.052	0.062		9.565	5.000	47.825	2.948	251.501
K0+400	1015.456	1015.490	1015.524	1015.481	1015.443	1015.390	1015.435	1015.480	1015.411	1015.392							9.570					
											0.066	0.058	0.049	0.072	0.051	0.059		9.565	5.000	47.825	2.829	254.330
K0+405	1015.494	1015.532	1015.569	1015.523	1015.484	1015.428	1015.472	1015.515	1015.449	1015.433							9.560					
											0.066	0.063	0.059	0.077	0.050	0.063		9.555	5.000	47.775	3.003	257.332
K0+410	1015.532	1015.573	1015.614	1015.565	1015.523	1015.466	1015.508	1015.550	1015.486	1015.474							9.550					
											0.064	0.064	0.063	0.077	0.050	0.064		9.555	5.000	47.775	3.038	260.371
K0+415	1015.578	1015.617	1015.655	1015.610	1015.574	1015.516	1015.554	1015.592	1015.535	1015.524							9.560					
											0.060	0.061	0.062	0.073	0.052	0.062		9.565	5.000	47.825	2.956	263.326
K0+420	1015.624	1015.660	1015.696	1015.655	1015.627	1015.566	1015.600	1015.634	1015.584	1015.573							9.570					
											0.058	0.060	0.062	0.072	0.057	0.062		9.573	5.000	47.863	2.951	266.277
K0+425	1015.659	1015.701	1015.743	1015.703	1015.679	1015.602	1015.641	1015.680	1015.631	1015.619							9.575					
											0.057	0.060	0.063	0.073	0.058	0.062		9.578	5.000	47.888	2.967	269.244
K0+430	1015.694	1015.742	1015.789	1015.752	1015.721	1015.638	1015.682	1015.726	1015.678	1015.665							9.580					
											0.059	0.061	0.064	0.076	0.053	0.062		9.555	5.000	47.775	2.986	272.230
K0+435	1015.747	1015.788	1015.830	1015.785	1015.741	1015.686	1015.725	1015.764	1015.708	1015.692							9.530					
											0.064	0.065	0.067	0.077	0.050	0.064		9.505	5.000	47.525	3.065	275.295
K0+440	1015.800	1015.835	1015.870	1015.814	1015.768	1015.734	1015.768	1015.802	1015.737	1015.718							9.480					
											0.070	0.070	0.070	0.078	0.050	0.068		9.488	5.000	47.438	3.212	278.507
K0+445	1015.828	1015.878	1015.928	1015.871	1015.824	1015.755	1015.805	1015.855	1015.792	1015.774							9.495					
											0.064	0.076	0.075	0.079	0.051	0.069		9.503	5.000	47.513	3.283	281.790
K0+450	1015.831	1015.921	1015.986	1015.925	1015.880	1015.776	1015.842	1015.908	1015.846	1015.829							9.510					
											0.063	0.075	0.075	0.077	0.051	0.068		9.523	5.000	47.613	3.245	285.035
K0+455	1015.925	1015.983	1016.040	1015.982	1015.937	1015.854	1015.911	1015.968	1015.907	1015.887							9.535					
											0.066	0.068	0.069	0.075	0.050	0.066		9.548	5.000	47.738	3.134	288.168
K0+460	1015.994	1016.044	1016.094	1016.044	1015.994	1015.932	1015.980	1016.028	1015.968	1015.945							9.560					
											0.065	0.066	0.067	0.076	0.049	0.065		9.568	5.000	47.838	3.095	291.264
K0+465	1016.094	1016.139	1016.184	1016.139	1016.094	1016.026	1016.071	1016.116	1016.063	1016.045							9.575					
											0.071	0.070	0.069	0.077	0.050	0.067		9.583	5.000	47.913	3.225	294.488
K0+470	1016.194	1016.234	1016.274	1016.234	1016.194	1016.120	1016.162	1016.204	1016.157	1016.144							9.590					
											0.075	0.071	0.067	0.074	0.050	0.067		9.755	5.000	48.775	3.287	297.776
K0+475	1016.298	1016.349	1016.400	1016.350	1016.299	1016.221	1016.279	1016.337	1016.278	1016.250							9.920					
											0.078	0.069	0.060	0.069	0.049	0.065		10.085	5.000	50.425	3.278	301.053
K0+480	1016.402	1016.464	1016.526	1016.465	1016.404	1016.322	1016.396	1016.470	1016.399	1016.355							10.250					
											0.072	0.063	0.053	0.065	0.049	0.060		10.318	5.000	51.588	3.116	304.169
K0+485	1016.487	1016.539	1016.590	1016.543	1016.496	1016.422	1016.481	1016.540	1016.479	1016.448							10.385					
											0.063	0.062	0.047	0.063	0.048	0.057		10.453	5.000	52.263	2.958	307.127
K0+490	1016.582	1016.633	1016.654	1016.621	1016.588	1016.522	1016.566	1016.610	1016.559	1016.540							10.520					
											0.064	0.064	0.050	0.065	0.046	0.058		10.563	5.000	52.813	3.058	310.185
K0+495	1016.686	1016.724	1016.762	1016.723	1016.684	1016.618	1016.663	1016.707	1016.655	1016.639							10.605					
											0.077	0.069	0.061	0.072	0.043	0.064		10.648	5.000	53.238	3.423	313.608
K0+500	1016.800	1016.835	1016.870	1016.825	1016.780	1016.714	1016.759	1016.804	1016.750	1016.738							10.690					
											0.083	0.073	0.063	0.069	0.044	0.066		10.398	5.000	51.988	3.434	317.042
K0+505	1016.857	1016.900	1016.943	1016.903	1016.862	1016.778	1016.831	1016.884	1016.840	1016.817							10.105					
											0.076	0.066	0.056	0.057	0.047	0.060		9.813	5.000	49.063	2.951	319.993
K0+510	1016.914	1016.965	1017.016	1016.980	1016.944	1016.842	1016.903	1016.963	1016.930	1016.896							9.520					
											0.070	0.059	0.065	0.057	0.048	0.060		9.528	5.000	47.638	2.845	322.838
K0+515	1016.990	1017.030	1017.105	1017.061	1017.016	1016.922	1016.974	1017.027	1016.998	1016.969							9.535					
											0.067	0.052	0.074	0.069	0.047	0.061		9.543	5.000	47.713	2.933	325.771
K0+520	1017.066	1017.094	1017.161	1017.141	1017.088	1017.001	1017.046	1017.091	1017.067	1017.042							9.550					
											0.059	0.044	0.075	0.069	0.046	0.059		9.555	5.000	47.775	2.798	328.570
K0+525	1017.131	1017.169	1017.242	1017.201	1017.159	1017.079	1017.128	1017.162	1017.138	1017.113							9.560					
											0.046	0.040	0.069	0.057	0.046	0.052		9.565	5.000	47.825	2.469	331.039
K0+530	1017.196	1017.249	1017.290	1017.260	1017.230	1017.156	1017.210	1017.233	1017.209	1017.184							9.570					
											0.040	0.040	0.056	0.052	0.049	0.047		9.573	5.000	47.863	2.270	333.309
K0+535	1017.268	1017.319	1017.369	1017.328	1017.287	1017.228	1017.279	1017.315	1017.275	1017.235							9.575					
											0.041	0.043	0.053	0.054	0.055	0.049		9.578	5.000	47.888	2.360	335.668
K0+540	1017.340	1017.394	1017.448	1017.396	1017.344	1017.299	1017.348	1017.396	1017.341	1017.286							9.580					
											0.046	0.050	0.054	0.056	0.058	0.053		9.573	5.000	47.863	2.528	338.197
K0+545	1017.427	1017.472	1017.516	1017.471	1017.427	1017.377	1017.418	1017.460	1017.414	1017.369							9.565					
											0.055	0.057	0.059	0.058	0.058	0.057		9.558	5.000	47.788	2.747	340.943
K0+550	1017.514	1017.549	1017.584	1017.547	1017.509	1017.454	1017.489	1017.523	1017.487	1017.451							9.550					
											0.057	0.056	0.055	0.053	0.051	0.055		9.528	5.000	47.638	2.603	343.547
K0+555	1017.580	1017.615	1017.649	1017.607	1017.566	1017.526	1017.563	1017.600	1017.560	1017.521							9.505					
											0.052	0.048	0.051	0.049	0.045	0.049		9.483	5.000	47.413	2.316	345.863
K0+560	1017.646	1017.680	1017.728	1017.684	1017.637	1017.597	1017.637	1017.676	1017.634	1017.591							9.460					
											0.048	0.045	0.050	0.047	0.043	0.047		9.485	5.000	47.425	2.209	348.071
K0+565	1017.694	1017.733	1017.771	1017.728	1017.684	1017.647	1017.685	1017.724	1017.684	1017.645							9.510					
											0.046	0.049	0.052	0.048	0.044	0.048		9.535	5.000	47.675	2.280	350.351
K0+570	1017.742	1017.785	1017.828	1017.787	1017.746	1017.697	1017.734	1017.771	1017.735	1017.698							9.560					
											0.050	0.054	0.057	0.055	0.053	0.054		9.528	5.000	47.638	2.559	352.911
K0+575	1017.824	1017.862	1017.900	1017.861	1017.821	1017.769	1017.806	1017.843	1017.803	1017.764							9.495					
											0.061	0.059	0.058	0.060	0.062	0.060		9.463	5.000	47.313	2.828	355.739
K0+580	1017.906	1017.939	1017.972	1017.934	1017.896	1017.840	1017.877	1017.914	1017.872	1017.830							9.430					
											0.065	0.060	0.056	0.059	0.062	0.060		9.488	5.000	47.438	2.859	358.598
K0+585	1017.966	1018.005	1018.044	1018.003	1017.962	1017.903	1017.947	1017.990	1017.947	1017.905							9.545					
											0.062	0.057	0.052	0.053	0.053	0.055		9.603	5.000	48.013	2.651	361.250
K0+590	1018.026	1018.071	1018.116	1018.072	1018.028	1017.966	1018.016	1018.066	1018.023	1017.979							9.660					
											0.059	0.056	0.053	0.056	0.059	0.056		9.630	5.000	48.150	2.718	363.968
K0+595	1018.077	1018.134	1018.191	1018.142	1018.092	1018.020	1018.077	1018.135	1018.079	1018.024							9.600					
											0.056	0.058	0.059	0.069	0.071	0.063		9.570	5.000	47.850	2.993	366.961
K0+600	1018.128	1018.197	1018.266	1018.211	1018.142	1018.073	1018.139	1018.204	1018.136	1018.068							9.540					
											0.056	0.059	0.062	0.073	0.074	0.065		9.553	5.000	47.763	3.095	370.056
K0+605	1018.212	1018.271	1018.330	1018.279	1018.223	1018.155	1018.211	1018.268	1018.208	1018.149							9.565					
											0.058	0.060	0.063	0.068	0.071	0.064		9.578	5.000	47.888	3.065	373.121
K0+610	1018.296	1018.345	1018.394	1018.346	1018.298	1018.237	1018.284	1018.331	1018.281	1018.230							9.590					
											0.061	0.062	0.063	0.066	0.068	0.064		9.583	5.000	47.913	3.060	376.181
K0+615	1018.341	1018.391	1018.441	1018.395	1018.349	1018.278	1018.328	1018.379	1018.330	1018.281							9.575					
											0.065	0.064	0.062	0.066	0.069	0.065		9.568	5.000	47.838	3.111	379.292
K0+620	1018.386	1018.437	1018.488	1018.444	1018.400	1018.319	1018.373	1018.426	1018.379	1018.331							9.560					
											0.066	0.063	0.060	0.063	0.065	0.063		9.560	5.000	47.800	3.017	382.309
K0+625	1018.438	1018.483	1018.527	1018.485	1018.442	1018.374	1018.422	1018.470	1018.425	1018.381							9.560					
											0.063	0.059	0.055	0.057	0.058	0.058		9.560	5.000	47.800	2.781	385.090
K0+630	1018.490	1018.528	1018.566	1018.525	1018.484	1018.429	1018.471	1018.513	1018.472	1018.430							9.560					
											0.060	0.059	0.058	0.059	0.060	0.059		9.560	5.000	47.800	2.838	387.928
K0+635	1018.531	1018.578	1018.625	1018.580	1018.535	1018.472	1018.517	1018.562	1018.515	1018.469							9.560					
											0.059	0.064	0.069	0.070	0.072	0.067		9.560	5.000	47.800	3.189	391.117
K0+640	1018.572	1018.628	1018.684	1018.635	1018.586	1018.514	1018.562	1018.610	1018.559	1018.508							9.560					
											0.056	0.062	0.067	0.070	0.071	0.065		9.565	5.000	47.825	3.107	394.225
K0+645	1018.635	1018.680	1018.725	1018.680	1018.632	1018.581	1018.623	1018.664	1018.616	1018.569							9.570					
											0.051	0.053	0.054	0.057	0.056	0.054		9.575	5.000	47.875	2.591	396.816
K0+650	1018.697	1018.731	1018.765	1018.724	1018.678	1018.648	1018.683	1018.718	1018.674	1018.629							9.580					
											0.054	0.052	0.050	0.053	0.051	0.052		9.583	5.000	47.913	2.491	399.307
K0+655	1018.782	1018.824	1018.867	1018.822	1018.774	1018.723	1018.768	1018.813	1018.767	1018.721							9.585					
											0.063	0.060	0.057	0.057	0.055	0.059		9.588	5.000	47.938	2.809	402.117
K0+660	1018.866	1018.917	1018.968	1018.919	1018.870	1018.798	1018.853	1018.907	1018.860	1018.813							9.590					
											0.063	0.064	0.060	0.059	0.058	0.061		9.585	5.000	47.925	2.923	405.040
K0+665	1018.970	1019.025	1019.069	1019.032	1018.994	1018.912	1018.961	1019.010	1018.972	1018.934							9.580					
											0.055	0.064	0.058	0.060	0.061	0.060		9.575	5.000	47.875	2.858	407.898
K0+670	1019.079	1019.133	1019.170	1019.144	1019.118	1019.026	1019.070	1019.113	1019.084	1019.055							9.570					
											0.062	0.062	0.050	0.056	0.067	0.059		9.723	5.000	48.613	2.891	410.789
K0+675	1019.248	1019.292	1019.324	1019.300	1019.283	1019.177	1019.231	1019.280	1019.248	1019.213							9.875					
											0.072	0.060	0.049	0.048	0.074	0.061		10.028	5.000	50.138	3.035	413.824

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES TOPOGRAFIA TRAMO 39

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0745-2024.-2024 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

CONS: **CONSORCIO SAN DIEGO**

SAN DIEGO CONSORCIO

DIRECCION : CANTIDADES DE OBRA AV8N ENTRE CALLES 21N-9N TRAMO 39

COMUNA : 3
BARRIO : GRANADA

	COTAS PAVIMENTO INICIAL					COTAS FRESADO					PROMEDIO CORTE					PROM ESPESOR	ANCHO	PROM ANCHO	LONGITUD	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
ABS	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ							
K0+680	1019.401	1019.450	1019.501	1019.456	1019.448	1019.328	1019.392	1019.447	1019.413	1019.370							10.180					
											0.071	0.055	0.049	0.050	0.076	0.060		10.148	5.000	50.738	3.062	416.886
K0+685	1019.564	1019.611	1019.648	1019.628	1019.608	1019.496	1019.558	1019.604	1019.571	1019.534							10.115					
											0.068	0.054	0.058	0.064	0.072	0.063		10.083	5.000	50.413	3.184	420.070
K0+690	1019.730	1019.780	1019.832	1019.800	1019.768	1019.663	1019.725	1019.760	1019.729	1019.698							10.050					
											0.057	0.050	0.067	0.067	0.068	0.062		9.928	5.000	49.638	3.074	423.143
K0+695	1019.900	1019.947	1019.993	1019.957	1019.920	1019.853	1019.901	1019.932	1019.893	1019.854							9.805					
											0.048	0.045	0.056	0.060	0.064	0.055		9.683	5.000	48.413	2.647	425.790
K0+700	1020.090	1020.122	1020.154	1020.113	1020.072	1020.042	1020.077	1020.103	1020.057	1020.010							9.560					
											0.048	0.047	0.056	0.061	0.065	0.055		9.560	5.000	47.800	2.642	428.432
K0+705	1020.289	1020.323	1020.356	1020.321	1020.286	1020.240	1020.274	1020.296	1020.256	1020.219							9.560					
											0.050	0.051	0.065	0.069	0.070	0.061		9.560	5.000	47.800	2.907	431.340
K0+710	1020.488	1020.523	1020.558	1020.529	1020.500	1020.438	1020.470	1020.488	1020.456	1020.428							9.560					
											0.048	0.052	0.070	0.070	0.067	0.061		9.625	5.000	48.125	2.954	434.294
K0+715	1020.739	1020.784	1020.829	1020.788	1020.747	1020.693	1020.733	1020.760	1020.721	1020.685							9.690					
											0.045	0.050	0.069	0.064	0.057	0.057		9.755	5.000	48.775	2.777	437.070
K0+720	1020.990	1021.045	1021.100	1021.047	1020.994	1020.947	1020.996	1021.031	1020.987	1020.942							9.820					
											0.043	0.051	0.068	0.065	0.055	0.056		9.768	5.000	48.838	2.751	439.821
K0+725	1021.293	1021.338	1021.383	1021.342	1021.288	1021.251	1021.284	1021.316	1021.273	1021.231							9.715					
											0.042	0.056	0.067	0.073	0.062	0.060		9.663	5.000	48.313	2.902	442.723
K0+730	1021.596	1021.631	1021.666	1021.637	1021.587	1021.554	1021.572	1021.600	1021.560	1021.520							9.610					
											0.042	0.057	0.066	0.071	0.067	0.061		9.623	5.000	48.113	2.922	445.645
K0+735	1021.955	1021.990	1022.011	1021.960	1021.914	1021.912	1021.935	1021.945	1021.896	1021.847							9.635					
											0.043	0.054	0.072	0.072	0.072	0.063		9.648	5.000	48.238	3.023	448.668
K0+740	1022.314	1022.349	1022.367	1022.312	1022.250	1022.270	1022.297	1022.289	1022.232	1022.174							9.660					
											0.044	0.052	0.073	0.078	0.075	0.064		9.805	5.000	49.025	3.151	451.819
K0+745	1022.677	1022.719	1022.752	1022.712	1022.658	1022.633	1022.668	1022.684	1022.637	1022.585							9.950					
											0.044	0.051	0.064	0.062	0.060	0.056		10.095	5.000	50.475	2.833	454.652
K0+750	1023.040	1023.089	1023.138	1023.090	1023.042	1022.996	1023.038	1023.079	1023.042	1022.995							10.240					
											0.045	0.051	0.057	0.048	0.050	0.050		10.720	5.000	53.600	2.677	457.329
K0+755	1023.454	1023.500	1023.546	1023.551	1023.549	1023.408	1023.450	1023.492	1023.504	1023.496							11.200					
											0.047	0.050	0.052	0.050	0.049	0.050		11.680	5.000	58.400	2.900	460.229
K0+760	1023.868	1023.911	1023.954	1024.020	1024.042	1023.820	1023.861	1023.905	1023.966	1023.997							12.160					
											0.058	0.060	0.055	0.050	0.046	0.054		12.158	5.000	60.788	3.281	463.510
K0+765	1024.150	1024.253	1024.306	1024.342	1024.378	1024.082	1024.183	1024.245	1024.295	1024.331							12.155					
											0.073	0.068	0.067	0.059	0.059	0.065		12.153	5.000	60.763	3.957	467.467
K0+770	1024.420	1024.570	1024.658	1024.696	1024.734	1024.343	1024.504	1024.585	1024.625	1024.664							12.150					
											0.077	0.065	0.072	0.066	0.061	0.068		11.920	5.000	59.600	4.063	471.530
K0+775	1024.500	1024.670	1024.805	1024.812	1024.819	1024.424	1024.606	1024.735	1024.751	1024.767							11.690					
											0.085	0.069	0.069	0.056	0.050	0.066		11.460	5.000	57.300	3.772	475.302
K0+780	1024.600	1024.780	1024.952	1024.928	1024.917	1024.505	1024.707	1024.884	1024.877	1024.870							11.230					
											0.086	0.073	0.068	0.055	0.048	0.066		10.930	5.000	54.650	3.608	478.910
K0+785	1024.750	1024.901	1025.017	1024.979	1024.941	1024.674	1024.828	1024.949	1024.920	1024.892							10.630					
											0.072	0.066	0.069	0.063	0.057	0.065		10.330	5.000	51.650	3.371	482.282
K0+790	1024.910	1025.007	1025.082	1025.030	1024.978	1024.842	1024.948	1025.013	1024.964	1024.914							10.030					
											0.069	0.056	0.063	0.062	0.060	0.062		9.928	5.000	49.638	3.081	485.363
K0+795	1025.008	1025.068	1025.128	1025.079	1025.030	1024.938	1025.015	1025.071	1025.022	1024.974							9.825					
											0.061	0.051	0.052	0.052	0.052	0.053		9.723	5.000	48.613	2.597	487.960
K0+800	1025.084	1025.129	1025.174	1025.128	1025.082	1025.033	1025.081	1025.128	1025.081	1025.034							9.620					
											0.055	0.058	0.050	0.054	0.048	0.053		9.605	5.000	48.025	2.548	490.508
K0+805	1025.174	1025.225	1025.245	1025.214	1025.165	1025.116	1025.156	1025.190	1025.153	1025.117							9.590					
											0.062	0.077	0.059	0.067	0.049	0.063		9.575	5.000	47.875	3.007	493.515
K0+810	1025.264	1025.317	1025.315	1025.299	1025.248	1025.198	1025.231	1025.252	1025.226	1025.199							9.560					
											0.073	0.082	0.064	0.076	0.049	0.069		9.563	5.000	47.813	3.287	496.802
K0+815	1025.391	1025.451	1025.436	1025.412	1025.348	1025.312	1025.373	1025.371	1025.334	1025.298							9.565					
											0.078	0.073	0.067	0.080	0.050	0.069		9.568	5.000	47.838	3.315	500.117
K0+820	1025.502	1025.582	1025.557	1025.525	1025.447	1025.426	1025.515	1025.489	1025.443	1025.397							9.570					
											0.074	0.064	0.071	0.083	0.050	0.068		9.528	5.000	47.638	3.255	503.372
K0+825	1025.667	1025.728	1025.745	1025.715	1025.641	1025.596	1025.667	1025.672	1025.631	1025.590							9.485					
											0.069	0.074	0.076	0.086	0.051	0.071		9.443	5.000	47.213	3.353	506.725
K0+830	1025.832	1025.907	1025.932	1025.906	1025.834	1025.765	1025.820	1025.854	1025.819	1025.783							9.400					
											0.068	0.081	0.075	0.084	0.050	0.072		9.450	5.000	47.250	3.390	510.115
K0+835	1026.067	1026.134	1026.139	1026.111	1026.042	1025.998	1026.060	1026.067	1026.029	1025.992							9.500					
											0.077	0.069	0.069	0.079	0.049	0.069		9.550	5.000	47.750	3.273	513.388
K0+840	1026.314	1026.362	1026.345	1026.316	1026.249	1026.230	1026.299	1026.279	1026.240	1026.200							9.600					
											0.068	0.065	0.062	0.071	0.050	0.063		9.615	5.000	48.075	3.044	516.433
K0+845	1026.584	1026.657	1026.644	1026.612	1026.563	1026.532	1026.590	1026.585	1026.546	1026.512							9.630					
											0.059	0.060	0.055	0.062	0.052	0.058		9.645	5.000	48.225	2.786	519.219
K0+850	1026.901	1026.935	1026.942	1026.909	1026.876	1026.834	1026.882	1026.890	1026.852	1026.823							9.660					
											0.062	0.058	0.051	0.056	0.062	0.058		9.998	5.000	49.988	2.891	522.109
K0+855	1027.177	1027.231	1027.241	1027.215	1027.190	1027.119	1027.168	1027.190	1027.161	1027.119							10.335					
											0.065	0.067	0.050	0.053	0.072	0.061		10.673	5.000	53.363	3.275	525.385
K0+860	1027.476	1027.526	1027.539	1027.521	1027.489	1027.404	1027.455	1027.490	1027.469	1027.415							11.010					
											0.072	0.061	0.049	0.050	0.067	0.060		10.235	5.000	51.175	3.058	528.442
K0+865	1027.805	1027.822	1027.838	1027.835	1027.817	1027.734	1027.771	1027.789	1027.786	1027.757							9.460					
											0.053	0.046	0.048	0.047	0.050	0.049		8.685	5.000	43.425	2.121	530.564
K0+870	1028.098	1028.127	1028.136	1028.149	1028.138	1028.064	1028.086	1028.088	1028.103	1028.098							7.910					
											0.043	0.043	0.048	0.049	0.045	0.046		7.508	5.000	37.538	1.715	532.279
K0+875	1028.411	1028.439	1028.467	1028.491	1028.497	1028.359	1028.394	1028.418	1028.438	1028.448							7.105					
											0.061	0.053	0.049	0.056	0.047	0.053		6.703	5.000	33.513	1.780	534.059
K0+880	1028.724	1028.761	1028.798	1028.832	1028.842	1028.654	1028.701	1028.748	1028.773	1028.798							6.300					
											0.067	0.057	0.047	0.053	0.045	0.054		6.320	5.000	31.600	1.692	535.751
K0+885	1029.001	1029.020	1029.040	1029.057	1029.070	1028.938	1028.967	1028.996	1029.010	1029.024							6.340					
											0.060	0.050	0.046	0.044	0.045	0.049		6.360	5.000	31.800	1.552	537.303
K0+890	1029.278	1029.280	1029.292	1029.289	1029.293	1029.222	1029.233	1029.244	1029.247	1029.250							6.380					
											0.054	0.047	0.055	0.044	0.047	0.049		6.360	5.000	31.800	1.573	538.875
K0+895	1029.545	1029.552	1029.580	1029.558	1029.555	1029.492	1029.505	1029.518	1029.511	1029.504							6.340					
											0.051	0.049	0.074	0.052	0.046	0.054		6.320	5.000	31.600	1.721	540.596
K0+900	1029.811	1029.828	1029.879	1029.834	1029.798	1029.762	1029.777	1029.792	1029.775	1029.758							6.300					
											0.048	0.048	0.075	0.053	0.045	0.054		6.328	5.000	31.638	1.704	542.299
K0+905	1030.083	1030.099	1030.135	1030.095	1030.074	1030.036	1030.054	1030.071	1030.048	1030.024							6.355					
											0.045	0.049	0.052	0.047	0.046	0.048		6.383	5.000	31.913	1.529	543.828
K0+910	1030.354	1030.382	1030.391	1030.367	1030.332	1030.310	1030.330	1030.350	1030.320	1030.290							6.410					
											0.046	0.052	0.045	0.045	0.046	0.047		6.398	5.000	31.988	1.495	545.323
K0+915	1030.673	1030.694	1030.708	1030.674	1030.651	1030.625	1030.642	1030.659	1030.631	1030.602							6.385					
											0.047	0.048	0.049	0.043	0.046	0.047		6.373	5.000	31.863	1.483	546.807
K0+920	1030.986	1030.997	1031.018	1030.984	1030.956	1030.940	1030.954	1030.968	1030.941	1030.914							6.360					
											0.047	0.047	0.047	0.044	0.042	0.045		6.535	5.000	32.675	1.479	548.285
K0+925	1031.274	1031.291	1031.299	1031.278	1031.252	1031.227	1031.241	1031.255	1031.233	1031.210							6.710					
											0.045	0.047	0.044	0.047	0.042	0.045		6.885	5.000	34.425	1.556	549.841
K0+930	1031.558	1031.573	1031.587	1031.572	1031.548	1031.514	1031.528	1031.542	1031.524	1031.506							7.060					
											0.044	0.046	0.043	0.048	0.044	0.045		6.888	5.000	34.438	1.548	551.389
K0+935	1031.851	1031.883	1031.907	1031.889	1031.864	1031.806	1031.836	1031.866	1031.842	1031.818							6.715					
											0.047	0.046	0.047	0.046	0.048	0.047		6.543	5.000	32.713	1.531	552.920
K0+940	1032.147	1032.189	1032.244	1032.204	1032.180	1032.098	1032.144	1032.190	1032.160	1032.130							6.370					
											0.045	0.045	0.049	0.045	0.048	0.046		6.368	5.000	31.838	1.472	554.393
K0+945	1032.390	1032.434	1032.475	1032.447	1032.419	1032.350	1032.390	1032.430	1032.402	1032.373							6.365					
											0.043	0.047	0.043	0.044	0.044	0.044		6.363	5.000	31.813	1.405	555.797
K0+950	1032.648	1032.686	1032.711	1032.685	1032.658	1032.602	1032.636	1032.670	1032.643	1032.616							6.360					
											0.047	0.045	0.041	0.042	0.041	0.043		6.385	5.000	31.925	1.383	557.180
K0+955	1032.763	1032.780	1032.805	1032.775	1032.745	1032.715	1032.739	1032.763	1032.734	1032.704							6.410					
											0.049	0.043	0.042	0.044	0.045	0.045		6.435	5.000	32.175	1.436	558.616
K0+960	1032.878	1032.888	1032.898	1032.870	1032.842	1032.828	1032.842	1032.856	1032.824	1032.792							6.460					
											0.048	0.044	0.044	0.043	0.046	0.045		6.465	5.000	32.325	1.454	560.070
K0+965	1032.812	1032.822	1032.839	1032.806	1032.780	1032.765	1032.780	1032.794	1032.766	1032.738							6.470					
											0.046	0.041	0.045	0.041	0.044	0.043		6.475	5.000	32.375	1.398	561.468
K0+970	1032.746	1032.756	1032.776	1032.750	1032.731	1032.702	1032.717	1032.732	1032.708	1032.684							6.480					
											0.043	0.040	0.047	0.049	0.057	0.047		6.448	5.000	32.238	1.522	562.989
K0+975	1032.519	1032.543	1032.568	1032.542	1032.516	1032.477	1032.503	1032.518	1032.486	1032.448							6.415					
											0.040	0.042	0.058	0.068	0.065	0.054		6.383	5.000	31.913	1.738	564.727
K0+980	1032.291	1032.331	1032.370	1032.342	1032.274	1032.252	1032.288	1032.304	1032.263	1032.212							6.350					
											0.040	0.043	0.061	0.072	0.068	0.057		6.328	5.000	31.638	1.797	566.524
K0+985	1031.929	1031.968	1032.008	1031.979	1031.943	1031.888	1031.925	1031.951	1031.915	1031.869							6.305					
											0.042	0.044	0.052	0.057	0.068	0.053		6.283	5.000	31.413	1.652	568.176
K0+990	1031.567	1031.606	1031.645	1031.617	1031.588	1031.524	1031.561	1031.598	1031.567	1031.526							6.260					
											0.045	0.046	0.047	0.050	0.062	0.050		6.225	5.000	31.125	1.552	569.729
K0+995	1031.206	1031.232	1031.259	1031.226	1031.193	1031.159	1031.186	1031.212	1031.176	1031.130							6.190					
											0.049	0.048	0.046	0.050	0.063	0.051		6.155	5.000	30.775	1.570	571.299
K1+000	1030.845	1030.859	1030.872	1030.835	1030.797	1030.794	1030.810	1030.826	1030.785	1030.734							6.120					
											0.049	0.047	0.044	0.047	0.067	0.051		6.155	5.000	30.775	1.558	572.857
K1+005	1030.455	1030.470	1030.484	1030.464	1030.444	1030.407	1030.425	1030.443	1030.420	1030.373							6.190					
											0.046	0.043	0.039	0.041	0.074	0.049		6.225	5.000	31.125	1.515	574.372
K1+010	1030.065	1030.081	1030.096	1030.093	1030.090	1030.020	1030.040	1030.059	1030.056	1030.012							6.260					
											0.044	0.043	0.042	0.043	0.074	0.049		6.298	5.000	31.488	1.555	575.927
K1+015	1029.684	1029.705	1029.727	1029.715	1029.702	1029.640	1029.660	1029.680	1029.666	1029.632							6.335					
											0.043	0.048	0.053	0.054	0.066	0.053		6.373	5.000	31.863	1.680	577.606
K1+020	1029.302	1029.330	1029.358	1029.336	1029.314	1029.260	1029.280	1029.300	1029.276	1029.252							6.410					
											0.042	0.045	0.051	0.054	0.055	0.049		6.413	5.000	32.063	1.584	579.190
K1+025	1028.919	1028.941	1028.967	1028.940	1028.911	1028.877	1028.900	1028.922	1028.893	1028.863							6.415					
											0.043	0.045	0.046	0.048	0.047	0.046		6.418	5.000	32.088	1.470	580.660

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES TOPOGRAFIA TRAMO 39

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0745-2024.-2024 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

CONS: **CONSORCIO SAN DIEGO**

SAN DIEGO CONSORCIO

DIRECCION : **CANTIDADES DE OBRA AV8N ENTRE CALLES 21N-9N TRAMO 39**

COMUNA : 3
BARRIO : GRANADA

	COTAS PAVIMENTO INICIAL					COTAS FRESADO					PROMEDIO CORTE					PROM ESPESOR	ANCHO	PROM ANCHO	LONGITUD	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO
ABS	**DER**	**1/4**	**EJE**	**1/4**	**IZQ**	**DER**	**1/4**	**EJE**	**1/4**	**IZQ**	**DER**	**1/4**	**EJE**	**1/4**	**IZQ**							
K1+030	1028.539	1028.568	1028.591	1028.558	1028.520	1028.494	1028.519	1028.544	1028.509	1028.474							6.420					
											0.045	0.045	0.042	0.047	0.047	0.046		6.385	5.000	31.925	1.453	582.113
K1+035	1028.179	1028.191	1028.207	1028.189	1028.166	1028.133	1028.151	1028.169	1028.143	1028.117							6.350					
											0.049	0.044	0.041	0.045	0.050	0.046		6.315	5.000	31.575	1.455	583.568
K1+040	1027.824	1027.832	1027.839	1027.822	1027.811	1027.772	1027.783	1027.794	1027.777	1027.760							6.280					
											0.053	0.050	0.046	0.047	0.050	0.049		6.358	5.000	31.788	1.562	585.131
K1+045	1027.491	1027.518	1027.543	1027.531	1027.518	1027.438	1027.467	1027.496	1027.482	1027.468							6.435					
											0.054	0.049	0.047	0.050	0.051	0.050		6.513	5.000	32.563	1.638	586.768
K1+050	1027.158	1027.199	1027.245	1027.238	1027.229	1027.104	1027.151	1027.198	1027.187	1027.176							6.590					
											0.052	0.049	0.047	0.050	0.051	0.050		6.543	5.000	32.713	1.633	588.402
K1+055	1026.906	1026.953	1026.999	1026.983	1026.964	1026.856	1026.903	1026.951	1026.933	1026.915							6.495					
											0.048	0.049	0.051	0.050	0.049	0.049		6.448	5.000	32.238	1.595	589.997
K1+060	1026.653	1026.703	1026.759	1026.729	1026.704	1026.607	1026.656	1026.704	1026.679	1026.654							6.400					
											0.044	0.049	0.052	0.048	0.050	0.049		6.395	5.000	31.975	1.558	591.555
K1+065	1026.508	1026.557	1026.598	1026.578	1026.565	1026.466	1026.507	1026.549	1026.532	1026.514							6.390					
											0.041	0.049	0.052	0.049	0.049	0.048		6.385	5.000	31.925	1.532	593.086
K1+070	1026.363	1026.408	1026.448	1026.435	1026.422	1026.324	1026.359	1026.394	1026.384	1026.374							6.380					
											0.040	0.049	0.050	0.052	0.050	0.048		6.440	5.000	32.200	1.557	594.643
K1+075	1026.224	1026.263	1026.289	1026.276	1026.256	1026.183	1026.213	1026.243	1026.223	1026.203							6.500					
											0.043	0.050	0.053	0.061	0.061	0.054		6.560	5.000	32.800	1.763	596.406
K1+080	1026.087	1026.118	1026.151	1026.132	1026.102	1026.042	1026.067	1026.092	1026.062	1026.032							6.620					
											0.044	0.050	0.057	0.066	0.066	0.057		6.600	5.000	33.000	1.868	598.274
K1+085	1026.000	1026.029	1026.058	1026.038	1026.009	1025.956	1025.980	1026.004	1025.976	1025.947							6.580					
											0.044	0.050	0.052	0.057	0.057	0.052		6.560	5.000	32.800	1.707	599.981
K1+090	1025.915	1025.944	1025.966	1025.941	1025.914	1025.870	1025.893	1025.916	1025.889	1025.862							6.540					
											0.046	0.052	0.050	0.052	0.052	0.050		6.610	5.000	33.050	1.665	601.646
K1+095	1025.869	1025.893	1025.908	1025.906	1025.901	1025.822	1025.840	1025.858	1025.853	1025.848							6.680					
											0.048	0.053	0.050	0.053	0.053	0.051		6.750	5.000	33.750	1.722	603.368
K1+100	1025.823	1025.839	1025.850	1025.870	1025.887	1025.774	1025.787	1025.800	1025.817	1025.834							6.820					
											0.047	0.051	0.047	0.049	0.049	0.048		6.728	5.000	33.638	1.629	604.997
K1+105	1025.793	1025.820	1025.838	1025.873	1025.906	1025.748	1025.771	1025.794	1025.827	1025.860							6.635					
											0.049	0.052	0.047	0.048	0.045	0.048		6.543	5.000	32.713	1.578	606.575
K1+110	1025.775	1025.809	1025.839	1025.888	1025.931	1025.722	1025.755	1025.788	1025.837	1025.886							6.450					
											0.054	0.053	0.049	0.049	0.047	0.050		6.455	5.000	32.275	1.622	608.197
K1+115	1025.817	1025.849	1025.875	1025.906	1025.934	1025.763	1025.797	1025.829	1025.859	1025.886							6.460					
											0.061	0.053	0.048	0.048	0.050	0.052		6.455	5.000	32.275	1.678	609.875
K1+120	1025.870	1025.893	1025.919	1025.929	1025.938	1025.803	1025.839	1025.869	1025.880	1025.886					CORTE	0.059	6.450			**10260.90**	**609.87**	**609.87**

Firma :
Nombre : ALEXANDER AMAYA
Cargo : Topografo
Matricula : 01-14526

AREA DESCUENTOS			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**L*A**	**AREA**
CAM	43	R=0.7	66.193
SUM SENCILLO	30	0.9*2.38	64.26
SUM DOBLE	1	3.25*0.92	2.99
PLACA EN CONCRETO	2	2.47*1.7	8.4
CAJAS	3	2.5*1.97	14.775
CAJAS TELEFONOS	6	4.139	24.834
			181.452

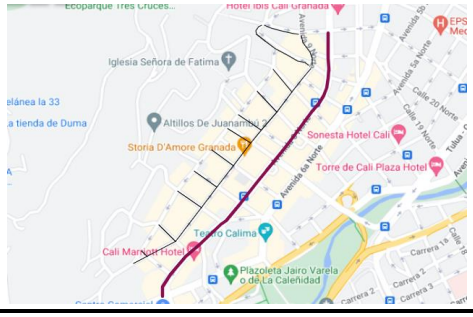
VOLUMEN TOTAL FRESADO	612.045
VOLUMEN DESCUENTO FRESADO	**593.740**
VOLUMEN FRE. COMPLEMENTARIA	2.171
AREA TOTAL	10,297.882
AREA CON DESCUENTO	**10,116.430**
AREA COMPLEMENTARIA	36.982

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	23	**ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.**		
UNIDAD	M3/KM			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**TOTAL**
	VOLUMEN FRESADO ITEM 6 (M3)	**FACTOR DE EXPANSION**	**DISTANCIA PUNTO DE DISPOSICION**	
TRAMO 39	593.74	1.35	10	8,015.49

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	8,015.49
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	8,015.49
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	8,015.49
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	8,015.49
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	8,015.49
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	8,015.49
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

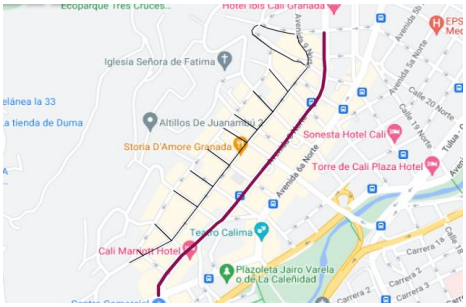
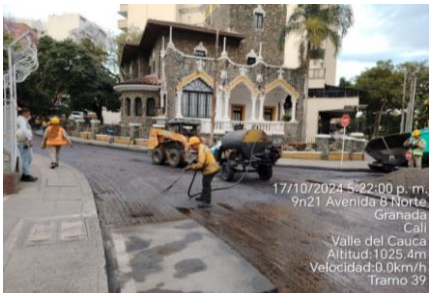
RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	V	**PAVIMENTO ASFALTICO**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	54	**RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.**		
UNIDAD	M2			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**	**TOTAL**
	AREA INTERVENCION SEGÚN CARTERA DE CAMPO	
AREA TOTAL SIN DESCUENTOS	10,116.43	10,116.43

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	10,116.43
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	10,116.43
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	10,116.43
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	10,116.43
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	10,116.43
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	10,116.43
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	V	**PAVIMENTO ASFALTICO**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	55	**CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.**		
UNIDAD	M3			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**		**TOTAL**
	VOLUMEN SEGÚN CARTERA DE CAMPO	**PORCENTAJE A COBRAR**	
TRAMO 39	526.70	**94.50%**	497.73

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	497.73
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	518.15
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	497.73
TOTAL POR EJECUTAR	20.42

ESQUEMA



FOTOGRAFIA



OBSERVACIONES:
El valor resultante de las carteras corresponde a 546.928, sin embargo, teniendo en cuenta los ajustes que se debieron realizar al balance presupuestal, se reconoce un total de 526.70 m3, correspondiente al mismo valor descontando 2 mm de espesor. Cantidad que se espera hacer cobro en el acta final.

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	497.73
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	518.15
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	497.73
TOTAL POR EJECUTAR	20.42

RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

MEMORIA DE CANTIDADES TOPOGRAFIA TRAMO 39

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0745-2024.-2024 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

CONS: **CONSORCIO SAN DIEGO**

SAN DIEGO CONSORCIO

DIRECCION : CANTIDADES DE OBRA AV8N ENTRE CALLES 21N-9N TRAMO 39
COMUNA : 3
BARRIO : GRANADA

	COTAS PAVIMENTO INSTALADO					COTAS FRESADO					PROMEDIO CORTE					PROM ESPESOR	ANCHO	PROM ANCHO	LONGITUD	AREA	VOLUMEN SECCION	VOLUMEN ACUMULADO
ABS	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ							
K0-020	1010.855	1010.922	1010.986	1010.903	1010.823	1010.806	1010.871	1010.936	1010.854	1010.772							8.64					
											0.049	?-)17)+(E19-)	0.05	-L17)+(G19-	0.05175	0.050		8.82	5	44.10	2.216	2.216
K0-015	1010.872	1010.927	1010.978	1010.900	1010.825	1010.823	1010.876	1010.928	1010.850	1010.772							9					
											0.049	0.051	0.05	0.04975	0.05325	0.051		9.18	5	45.90	2.323	4.539
K0-010	1010.889	1010.931	1010.970	1010.896	1010.826	1010.840	1010.880	1010.920	1010.846	1010.772							9.36					
											0.05225	0.05325	0.052	0.04775	0.0495	0.051		9.3925	5	46.96	2.393	6.931
K0-005	1010.890	1010.924	1010.957	1010.894	1010.838	1010.834	1010.869	1010.903	1010.848	1010.793							9.425					
											0.05875	0.05775	0.056	0.04675	0.0405	0.052		9.4575	5	47.29	2.457	9.388
K0+000	1010.890	1010.917	1010.944	1010.898	1010.850	1010.828	1010.857	1010.886	1010.850	1010.814							9.49					
											0.05925	0.05775	0.056	0.0465	0.0345	0.051		9.55	5	47.75	2.426	11.814
K0+005	1010.866	1010.901	1010.936	1010.893	1010.847	1010.810	1010.846	1010.882	1010.848	1010.814							9.61					
											0.05375	0.05325	0.052	0.0465	0.0315	0.047		9.67	5	48.35	2.292	14.105
K0+010	1010.842	1010.885	1010.928	1010.894	1010.844	1010.791	1010.834	1010.878	1010.846	1010.814							9.73					
											0.04975	0.04975	0.049	0.04875	0.034	0.046		9.7125	5	48.56	2.246	16.351
K0+015	1010.821	1010.871	1010.921	1010.884	1010.834	1010.773	1010.823	1010.873	1010.835	1010.796							9.695					
											0.04725	0.04725	0.047	0.04975	0.042	0.047		9.6775	5	48.39	2.257	18.609
K0+020	1010.800	1010.857	1010.914	1010.873	1010.824	1010.754	1010.811	1010.868	1010.823	1010.778							9.66					
											0.0465	0.0445	0.0455	0.0485	0.0475	0.046		9.64	5	48.20	2.241	20.850
K0+025	1010.815	1010.861	1010.913	1010.872	1010.831	1010.768	1010.818	1010.868	1010.825	1010.782							9.62					
											0.046	0.0415	0.0445	0.0475	0.0505	0.046		9.6	5	48.00	2.208	23.058
K0+030	1010.827	1010.865	1010.912	1010.875	1010.838	1010.782	1010.825	1010.868	1010.827	1010.786							9.58					
											0.0455	0.04175	0.0465	0.048	0.0495	0.046		9.58	5	47.90	2.215	25.273
K0+035	1010.845	1010.882	1010.927	1010.888	1010.848	1010.799	1010.839	1010.878	1010.840	1010.801							9.58					
											0.043	0.04525	0.0515	0.048	0.0445	0.046		9.58	5	47.90	2.225	27.498
K0+040	1010.856	1010.899	1010.942	1010.900	1010.858	1010.816	1010.852	1010.888	1010.852	1010.816							9.58					
											0.046	0.05075	0.0555	0.05175	0.048	0.050		9.57	5	47.85	2.412	29.910
K0+045	1010.871	1010.918	1010.965	1010.920	1010.875	1010.819	1010.864	1010.908	1010.865	1010.821							9.56					
											0.058	0.05825	0.0585	0.05925	0.06	0.059		9.55	5	47.75	2.808	32.718
K0+050	1010.886	1010.937	1010.988	1010.940	1010.892	1010.822	1010.875	1010.928	1010.877	1010.826							9.54					
											0.0605	0.061	0.0615	0.06125	0.061	0.061		9.55	5	47.75	2.915	35.633
K0+055	1010.913	1010.960	1011.007	1010.961	1010.914	1010.856	1010.900	1010.944	1010.901	1010.858							9.56					
											0.0535	0.059	0.0645	0.05775	0.051	0.057		9.57	5	47.85	2.735	38.367
K0+060	1010.940	1010.983	1011.026	1010.981	1010.936	1010.890	1010.925	1010.960	1010.925	1010.890							9.58					
											0.05	0.05775	0.0655	0.05725	0.049	0.056		9.555	5	47.78	2.671	41.038
K0+065	1010.956	1011.000	1011.043	1010.998	1010.952	1010.906	1010.942	1010.978	1010.939	1010.900							9.53					
											0.05	0.05725	0.0645	0.05975	0.055	0.057		9.505	5	47.53	2.723	43.761
K0+070	1010.972	1011.016	1011.060	1011.014	1010.968	1010.922	1010.959	1010.996	1010.953	1010.910							9.48					
											0.047	0.05125	0.0585	0.0575	0.0565	0.054		9.4975	5	47.49	2.571	46.333
K0+075	1011.002	1011.035	1011.074	1011.025	1010.976	1010.958	1010.990	1011.021	1010.971	1010.921							9.515					
											0.047	0.04475	0.0475	0.0505	0.0535	0.049		9.5325	5	47.66	2.319	48.651
K0+080	1011.044	1011.064	1011.088	1011.036	1010.984	1010.994	1011.020	1011.046	1010.989	1010.932							9.55					
											0.046	0.044	0.0465	0.04675	0.057	0.048		9.64	5	48.20	2.316	50.967
K0+085	1011.050	1011.076	1011.107	1011.056	1011.024	1011.008	1011.032	1011.056	1011.009	1010.962							9.73					
											0.044	0.0435	0.0555	0.04625	0.067	0.051		9.82	5	49.10	2.516	53.484
K0+090	1011.068	1011.087	1011.126	1011.075	1011.064	1011.022	1011.044	1011.066	1011.029	1010.992							9.91					
											0.0505	0.0475	0.0595	0.05025	0.071	0.056		9.845	5	49.23	2.744	56.228
K0+095	1011.089	1011.110	1011.140	1011.097	1011.074	1011.034	1011.058	1011.081	1011.043	1011.004							9.78					
											0.0595	0.0565	0.0585	0.05875	0.069	0.060		9.715	5	48.58	2.936	59.164
K0+100	1011.110	1011.132	1011.154	1011.119	1011.084	1011.046	1011.071	1011.096	1011.056	1011.016							9.65					
											0.06	0.0615	0.0605	0.0655	0.0655	0.063		9.63	5	48.15	3.014	62.179
K0+105	1011.122	1011.148	1011.174	1011.139	1011.104	1011.066	1011.086	1011.111	1011.071	1011.041							9.61					
											0.052	0.0625	0.0655	0.0705	0.0605	0.062		9.59	5	47.95	2.982	65.161
K0+110	1011.134	1011.164	1011.194	1011.159	1011.124	1011.086	1011.101	1011.126	1011.086	1011.066							9.57					
											0.0525	0.0605	0.061	0.06625	0.0565	0.059		9.5475	5	47.74	2.833	67.994
K0+115	1011.156	1011.189	1011.222	1011.190	1011.157	1011.099	1011.131	1011.168	1011.130	1011.102							9.525					
											0.0615	0.0555	0.047	0.05275	0.0535	0.054		9.5025	5	47.51	2.568	70.562
K0+120	1011.178	1011.214	1011.250	1011.220	1011.190	1011.112	1011.161	1011.210	1011.174	1011.138							9.48					
											0.057	0.04825	0.0435	0.04775	0.0485	0.049		9.4975	5	47.49	2.327	72.889
K0+125	1011.207	1011.243	1011.279	1011.256	1011.211	1011.159	1011.200	1011.232	1011.207	1011.166							9.515					
											0.049	0.04475	0.0505	0.04925	0.0415	0.047		9.5325	5	47.66	2.240	75.129
K0+130	1011.256	1011.284	1011.308	1011.288	1011.232	1011.206	1011.238	1011.254	1011.239	1011.194							9.55					
											0.049	0.047	0.0505	0.0465	0.0405	0.047		9.5475	5	47.74	2.229	77.359
K0+135	1011.298	1011.334	1011.361	1011.327	1011.280	1011.250	1011.286	1011.314	1011.283	1011.237							9.545					
											0.054	0.049	0.0435	0.044	0.0455	0.047		9.5425	5	47.71	2.252	79.611
K0+140	1011.354	1011.384	1011.414	1011.371	1011.328	1011.294	1011.334	1011.374	1011.327	1011.280							9.54					
											0.056	0.05	0.0425	0.04225	0.044	0.047		9.5475	5	47.74	2.241	81.852
K0+145	1011.442	1011.444	1011.478	1011.434	1011.389	1011.390	1011.394	1011.433	1011.394	1011.349							9.555					
											0.048	0.0475	0.0495	0.04325	0.045	0.047		9.5625	5	47.81	2.230	84.083
K0+150	1011.530	1011.499	1011.546	1011.506	1011.468	1011.486	1011.454	1011.492	1011.460	1011.418							9.57					
											0.042	0.04875	0.049	0.04675	0.0485	0.047		9.6275	5	48.14	2.262	86.345
K0+155	1011.590	1011.569	1011.610	1011.568	1011.542	1011.550	1011.516	1011.566	1011.521	1011.495							9.685					
											0.048	0.05775	0.04	0.04325	0.0475	0.047		9.7425	5	48.71	2.304	88.649
K0+160	1011.670	1011.641	1011.676	1011.620	1011.620	1011.614	1011.578	1011.640	1011.581	1011.572							9.8					
											0.0495	0.05875	0.0375	0.039	0.0455	0.046		9.845	5	49.23	2.267	90.916
K0+165	1011.692	1011.702	1011.733	1011.687	1011.670	1011.649	1011.647	1011.694	1011.648	1011.627							9.89					
											0.0465	0.05375	0.0405	0.039	0.046	0.045		9.935	5	49.68	2.243	93.159
K0+170	1011.734	1011.769	1011.790	1011.754	1011.731	1011.684	1011.716	1011.748	1011.715	1011.682							9.98					
											0.049	0.05025	0.0445	0.04075	0.0455	0.046		9.8875	5	49.44	2.274	95.433
K0+175	1011.792	1011.827	1011.861	1011.823	1011.788	1011.744	1011.779	1011.814	1011.780	1011.746							9.795					
											0.047	0.04825	0.0495	0.04425	0.043	0.046		9.7025	5	48.51	2.251	97.684
K0+180	1011.850	1011.891	1011.932	1011.891	1011.854	1011.804	1011.842	1011.880	1011.845	1011.810							9.61					
											0.0455	0.049	0.0525	0.04475	0.0495	0.048		9.605	5	48.03	2.317	100.001
K0+185	1011.905	1011.950	1011.994	1011.948	1011.922	1011.860	1011.901	1011.941	1011.904	1011.867							9.6					
											0.0445	0.049	0.0535	0.04225	0.0475	0.047		9.595	5	47.98	2.272	102.273
K0+190	1011.960	1012.008	1012.056	1012.004	1011.964	1011.916	1011.959	1012.002	1011.963	1011.924							9.59					
											0.046	0.04975	0.0535	0.04275	0.042	0.047		9.58	5	47.90	2.242	104.514
K0+195	1012.016	1012.055	1012.094	1012.043	1011.999	1011.968	1012.005	1012.041	1011.998	1011.955							9.57					
											0.05	0.05125	0.0525	0.04625	0.046	0.049		9.56	5	47.80	2.352	106.866
K0+200	1012.072	1012.102	1012.132	1012.081	1012.034	1012.020	1012.050	1012.080	1012.033	1011.986							9.55					
											0.0535	0.05525	0.0585	0.056	0.0465	0.054		9.5575	5	47.79	2.578	109.444
K0+205	1012.098	1012.136	1012.177	1012.135	1012.075	1012.043	1012.078	1012.112	1012.071	1012.030							9.565					
											0.0595	0.06175	0.0655	0.0595	0.0455	0.058		9.5725	5	47.86	2.793	112.237
K0+210	1012.130	1012.170	1012.210	1012.164	1012.120	1012.066	1012.105	1012.144	1012.109	1012.074							9.58					
											0.061	0.06375	0.062	0.0585	0.0495	0.059		9.625	5	48.13	2.837	115.074
K0+215	1012.154	1012.198	1012.233	1012.201	1012.156	1012.096	1012.136	1012.175	1012.139	1012.103							9.67					
											0.062	0.06525	0.063	0.063	0.0565	0.062		9.715	5	48.58	3.009	118.083
K0+220	1012.192	1012.234	1012.274	1012.233	1012.192	1012.126	1012.166	1012.206	1012.169	1012.132							9.76					
											0.071	0.0685	0.067	0.068	0.059	0.067		9.815	5	49.08	3.273	121.357
K0+225	1012.272	1012.326	1012.359	1012.318	1012.276	1012.196	1012.257	1012.293	1012.246	1012.218							9.87					
											0.0735	0.067	0.065	0.069	0.057	0.066		9.925	5	49.63	3.290	124.647
K0+230	1012.337	1012.413	1012.444	1012.388	1012.360	1012.266	1012.348	1012.380	1012.322	1012.304							9.98					
											0.0715	0.0605	0.058	0.06175	0.0495	0.060		9.8875	5	49.44	2.979	127.625
K0+235	1012.470	1012.518	1012.552	1012.506	1012.459	1012.398	1012.462	1012.500	1012.448	1012.416							9.795					
											0.063	0.0515	0.046	0.05875	0.0455	0.053		9.7025	5	48.51	2.569	130.194
K0+240	1012.584	1012.622	1012.660	1012.634	1012.576	1012.530	1012.575	1012.620	1012.574	1012.528							9.61					
											0.0495	0.044	0.0445	0.054	0.044	0.047		9.5925	5	47.96	2.264	132.458
K0+245	1012.729	1012.767	1012.817	1012.770	1012.716	1012.684	1012.726	1012.768	1012.722	1012.676							9.575					
											0.0505	0.0475	0.0525	0.053	0.045	0.050		9.5575	5	47.79	2.375	134.833
K0+250	1012.894	1012.931	1012.972	1012.928	1012.874	1012.838	1012.877	1012.916	1012.870	1012.824							9.54					
											0.0515	0.04975	0.051	0.0555	0.051	0.052		9.5425	5	47.71	2.469	137.302
K0+255	1013.048	1013.089	1013.152	1013.096	1013.042	1013.001	1013.044	1013.106	1013.043	1012.990							9.545					
											0.0485	0.04375	0.0445	0.0535	0.053	0.049		9.5475	5	47.74	2.322	139.624
K0+260	1013.214	1013.252	1013.339	1013.270	1013.210	1013.164	1013.210	1013.296	1013.216	1013.156							9.55					
											0.051	0.04625	0.043	0.0535	0.054	0.050		9.5475	5	47.74	2.365	141.990
K0+265	1013.370	1013.428	1013.485	1013.439	1013.379	1013.318	1013.378	1013.442	1013.386	1013.325							9.545					
											0.053	0.04825	0.0475	0.049	0.054	0.050		9.5425	5	47.71	2.402	144.392
K0+270	1013.526	1013.591	1013.640	1013.601	1013.548	1013.472	1013.545	1013.588	1013.556	1013.494							9.54					
											0.0505	0.044	0.047	0.043	0.0505	0.047		9.535	5	47.68	2.241	146.633
K0+275	1013.676	1013.725	1013.764	1013.724	1013.676	1013.629	1013.683	1013.722	1013.683	1013.629							9.53					
											0.0475	0.044	0.047	0.0435	0.0435	0.045		9.525	5	47.63	2.148	148.781
K0+280	1013.834	1013.867	1013.908	1013.856	1013.804	1013.786	1013.821	1013.856	1013.810	1013.764							9.52					
											0.0465	0.044	0.0515	0.04875	0.046	0.047		9.5625	5	47.81	2.264	151.045
K0+285	1013.948	1013.979	1014.022	1013.984	1013.945	1013.903	1013.937	1013.971	1013.932	1013.893							9.605					
											0.0465	0.0445	0.0505	0.05425	0.058	0.051		9.6475	5	48.24	2.448	153.493
K0+290	1014.068	1014.100	1014.136	1014.111	1014.086	1014.020	1014.053	1014.086	1014.054	1014.022							9.69					
											0.045	0.047	0.0555	0.058	0.0605	0.053		9.66	5	48.30	2.570	156.062
K0+295	1014.162	1014.195	1014.236	1014.207	1014.177	1014.120	1014.148	1014.175	1014.148	1014.120							9.63					
											0.041	0.0515	0.0665	0.06	0.0535	0.054		9.6	5	48.00	2.616	158.678
K0+300	1014.260	1014.298	1014.336	1014.302	1014.268	1014.220	1014.242	1014.264	1014.241	1014.218							9.57					
											0.0445	0.0575	0.0705	0.05975	0.049	0.056		9.56	5	47.80	2.689	161.367
K0+305	1014.334	1014.369	1014.404	1014.361	1014.317	1014.285	1014.310	1014.335	1014.302	1014.269							9.55					
											0.0535	0.0605	0.0675	0.05725	0.047	0.057		9.54	5	47.70	2.726	164.093
K0+310	1014.408	1014.440	1014.472	1014.419	1014.366	1014.350	1014.378	1014.406	1014.363	1014.320							9.53					
											0.0595	0.062	0.0645	0.056	0.0475	0.058		9.54	5	47.70	2.762	166.855
K0+315	1014.454	1014.482	1014.509	1014.469	1014.428	1014.393	1014.420	1014.446	1014.413	1014.379							9.55					
											0.0625	0.062	0.0615	0.056	0.0505	0.058		9.56	5	47.80	2.796	169.651
K0+320	1014.500	1014.523	1014.546	1014.518	1014.490	1014.436	1014.461	1014.486	1014.462	1014.438							9.57					
											0.0635	0.061	0.0585	0.05575	0.053	0.058		9.5775	5	47.89	2.794	172.446
K0+325	1014.548	1014.575	1014.601	1014.566	1014.531	1014.485	1014.515	1014.544	1014.511	1014.477							9.585					
											0.0625	0.059	0.0555	0.05525	0.055	0.057		9.5925	5	47.96	2.755	175.201
K0+330	1014.596	1014.626	1014.656	1014.614	1014.572	1014.534	1014.568	1014.602	1014.559	1014.516							9.6					
											0.062	0.05825	0.0545	0.05425	0.054	0.057		9.6	5	48.00	2.717	177.918
K0+335	1014.653	1014.683	1014.713	1014.670	1014.626	1014.591	1014.625	1014.658	1014.616	1014.574							9.6					
											0.062	0.05875	0.0555	0.05275	0.05	0.056		9.6	5	48.00	2.678	180.596
K0+340	1014.710	1014.740	1014.770	1014.725	1014.680	1014.648	1014.681	1014.714	1014.673	1014.632							9.6					
											0.056	0.05675	0.0575	0.05725	0.057	0.057		9.59	5	47.95	2.728	183.325
K0+345	1014.779	1014.806	1014.832	1014.801	1014.769	1014.729	1014.751	1014.773	1014.738	1014.703							9.58					
											0.05	0.05225	0.0605	0.06075	0.075	0.060		9.57	5	47.85	2.857	186.181
K0+350	1014.860	1014.871	1014.894	1014.862	1014.858	1014.810	1014.821	1014.832	1014.803	1014.774							9.56					
											0.047	0.05125	0.0615	0.06325	0.079	0.060		9.56	5	47.80	2.887	189.068
K0+355	1014.897	1014.925	1014.953	1014.933	1014.912	1014.853	1014.873	1014.892	1014.865	1014.838							9.56					
											0.047	0.05375	0.0605	0.06475	0.069	0.059		9.56	5	47.80	2.820	191.888
K0+360	1014.946	1014.979	1015.012	1014.989	1014.966	1014.896	1014.924	1014.952	1014.927	1014.902							9.56					
											0.046	0.052	0.058	0.06025	0.0625	0.056		9.505	5	47.53	2.650	194.538

MEMORIA DE CANTIDADES TOPOGRAFIA TRAMO 39

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0745-2024.-2024 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

CONS: **CONSORCIO SAN DIEGO**

DIRECCION : CANTIDADES DE OBRA AV8N ENTRE CALLES 21N-9N TRAMO 39
COMUNA : 3
BARRIO : GRANADA

	COTAS PAVIMENTO INSTALADO					COTAS FRESADO					PROMEDIO CORTE					PROM ESPESOR	ANCHO	PROM ANCHO	LONGITUD	AREA	VOLUMEN SECCION	VOLUMEN ACUMULADO
ABS	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ							
K0+365	1015.019	1015.054	1015.089	1015.059	1015.029	1014.977	1015.005	1015.033	1015.001	1014.968							9.45					
											0.044	0.048	0.054	0.05675	0.0595	0.052		9.395	5	46.98	2.464	197.002
K0+370	1015.104	1015.133	1015.166	1015.129	1015.092	1015.058	1015.086	1015.114	1015.074	1015.034							9.34					
											0.0485	0.04625	0.048	0.0525	0.0515	0.049		9.325	5	46.63	2.301	199.303
K0+375	1015.170	1015.196	1015.216	1015.196	1015.176	1015.119	1015.151	1015.172	1015.146	1015.131							9.31					
											0.0595	0.04725	0.048	0.0475	0.0445	0.049		9.295	5	46.48	2.294	201.596
K0+380	1015.248	1015.264	1015.282	1015.263	1015.272	1015.180	1015.215	1015.230	1015.218	1015.228							9.28					
											0.0685	0.0475	0.057	0.047875	0.04525	0.053		9.3475	5	46.74	2.488	204.084
K0+385	1015.305	1015.318	1015.345	1015.315	1015.309	1015.236	1015.272	1015.283	1015.264	1015.262							9.415					
											0.0605	0.0465	0.051	0.053625	0.05375	0.053		9.4825	5	47.41	2.516	206.600
K0+390	1015.344	1015.376	1015.376	1015.367	1015.357	1015.292	1015.329	1015.336	1015.310	1015.296							9.55					
											0.05825	0.0475	0.044	0.057	0.06175	0.054		9.555	5	47.78	2.566	209.166
K0+395	1015.406	1015.430	1015.456	1015.418	1015.407	1015.341	1015.382	1015.408	1015.361	1015.344							9.56					
											0.06175	0.049	0.052	0.05425	0.06325	0.056		9.565	5	47.83	2.681	211.846
K0+400	1015.449	1015.485	1015.536	1015.462	1015.456	1015.390	1015.435	1015.480	1015.411	1015.392							9.57					
											0.06175	0.05325	0.061	0.05475	0.0595	0.058		9.565	5	47.83	2.776	214.623
K0+405	1015.493	1015.528	1015.581	1015.507	1015.488	1015.428	1015.472	1015.515	1015.449	1015.433							9.56					
											0.06725	0.06475	0.071	0.06825	0.0505	0.064		9.555	5	47.78	3.074	217.697
K0+410	1015.536	1015.581	1015.626	1015.564	1015.520	1015.466	1015.508	1015.550	1015.486	1015.474							9.55					
											0.069	0.07175	0.0745	0.0715	0.04675	0.067		9.555	5	47.78	3.187	220.884
K0+415	1015.584	1015.625	1015.665	1015.600	1015.571	1015.516	1015.554	1015.592	1015.535	1015.524							9.56					
											0.067	0.06925	0.0715	0.069	0.04825	0.065		9.565	5	47.83	3.109	223.992
K0+420	1015.632	1015.668	1015.704	1015.657	1015.622	1015.566	1015.600	1015.634	1015.584	1015.573							9.57					
											0.07	0.07	0.07	0.072	0.0505	0.066		9.5725	5	47.86	3.183	227.175
K0+425	1015.676	1015.713	1015.750	1015.702	1015.671	1015.602	1015.641	1015.680	1015.631	1015.619							9.575					
											0.072	0.074	0.07	0.0655	0.0535	0.067		9.5775	5	47.89	3.208	230.384
K0+430	1015.708	1015.758	1015.796	1015.738	1015.720	1015.638	1015.682	1015.726	1015.678	1015.665							9.58					
											0.068	0.075	0.0705	0.06725	0.05825	0.068		9.555	5	47.78	3.239	233.623
K0+435	1015.752	1015.799	1015.835	1015.782	1015.753	1015.686	1015.725	1015.764	1015.708	1015.692							9.53					
											0.0665	0.073	0.0715	0.06925	0.06475	0.069		9.505	5	47.53	3.279	236.902
K0+440	1015.801	1015.840	1015.874	1015.801	1015.786	1015.734	1015.768	1015.802	1015.737	1015.718							9.48					
											0.0665	0.0695	0.0715	0.06675	0.06875	0.069		9.4875	5	47.44	3.254	240.156
K0+445	1015.821	1015.872	1015.926	1015.861	1015.843	1015.755	1015.805	1015.855	1015.792	1015.774							9.495					
											0.0705	0.073	0.0665	0.06775	0.06525	0.069		9.5025	5	47.51	3.259	243.415
K0+450	1015.851	1015.921	1015.970	1015.912	1015.890	1015.776	1015.842	1015.908	1015.846	1015.829							9.51					
											0.0695	0.0695	0.066	0.0645	0.064	0.067		9.5225	5	47.61	3.176	246.591
K0+455	1015.918	1015.971	1016.038	1015.970	1015.954	1015.854	1015.911	1015.968	1015.907	1015.887							9.535					
											0.068	0.0655	0.0715	0.0665	0.067	0.068		9.5475	5	47.74	3.232	249.823
K0+460	1016.004	1016.051	1016.101	1016.038	1016.012	1015.932	1015.980	1016.028	1015.968	1015.945							9.56					
											0.0755	0.0745	0.075	0.06875	0.06725	0.072		9.5675	5	47.84	3.454	253.277
K0+465	1016.105	1016.149	1016.193	1016.130	1016.112	1016.026	1016.071	1016.116	1016.063	1016.045							9.575					
											0.0775	0.078	0.0765	0.06425	0.06975	0.073		9.5825	5	47.91	3.507	256.784
K0+470	1016.196	1016.240	1016.280	1016.218	1016.216	1016.120	1016.162	1016.204	1016.157	1016.144							9.59					
											0.0745	0.066	0.0645	0.061	0.06875	0.067		9.755	5	48.78	3.265	260.050
K0+475	1016.294	1016.333	1016.390	1016.339	1016.315	1016.221	1016.279	1016.337	1016.278	1016.250							9.92					
											0.073	0.055	0.0515	0.055	0.06225	0.059		10.085	5	50.43	2.993	263.042
K0+480	1016.395	1016.452	1016.520	1016.448	1016.414	1016.322	1016.396	1016.470	1016.399	1016.355							10.25					
											0.0735	0.053	0.049	0.05275	0.06075	0.058		10.3175	5	51.59	2.982	266.024
K0+485	1016.496	1016.531	1016.588	1016.536	1016.510	1016.422	1016.481	1016.540	1016.479	1016.448							10.385					
											0.071	0.06	0.057	0.05975	0.06425	0.062		10.4525	5	52.26	3.261	269.285
K0+490	1016.590	1016.636	1016.676	1016.622	1016.606	1016.522	1016.566	1016.610	1016.559	1016.540							10.52					
											0.067	0.06725	0.0605	0.0685	0.061	0.065		10.5625	5	52.81	3.425	272.710
K0+495	1016.684	1016.727	1016.762	1016.729	1016.695	1016.618	1016.663	1016.707	1016.655	1016.639							10.605					
											0.067	0.06175	0.0495	0.07	0.051	0.060		10.6475	5	53.24	3.186	275.896
K0+500	1016.782	1016.818	1016.848	1016.816	1016.784	1016.714	1016.759	1016.804	1016.750	1016.738							10.69					
											0.061	0.058625	0.04925	0.060625	0.048	0.055		10.3975	5	51.99	2.885	278.782
K0+505	1016.832	1016.889	1016.938	1016.895	1016.867	1016.778	1016.831	1016.884	1016.840	1016.817							10.105					
											0.057	0.057875	0.04475	0.049875	0.052	0.052		9.8125	5	49.06	2.566	281.348
K0+510	1016.902	1016.960	1016.998	1016.974	1016.950	1016.842	1016.903	1016.963	1016.930	1016.896							9.52					
											0.05525	0.055125	0.038	0.043	0.048	0.048		9.5275	5	47.64	2.281	283.628
K0+515	1016.972	1017.027	1017.068	1017.040	1017.011	1016.922	1016.974	1017.027	1016.998	1016.969							9.535					
											0.04975	0.050375	0.044	0.0435	0.049	0.047		9.5425	5	47.71	2.258	285.886
K0+520	1017.050	1017.094	1017.138	1017.112	1017.098	1017.001	1017.046	1017.091	1017.067	1017.042							9.55					
											0.04625	0.047125	0.0465	0.04225	0.0575	0.048		9.555	5	47.78	2.290	288.176
K0+525	1017.122	1017.174	1017.208	1017.177	1017.172	1017.079	1017.128	1017.162	1017.138	1017.113							9.56					
											0.04425	0.044375	0.0455	0.03925	0.0585	0.046		9.565	5	47.83	2.218	290.394
K0+530	1017.201	1017.252	1017.278	1017.248	1017.242	1017.156	1017.210	1017.233	1017.209	1017.184							9.57					
											0.04475	0.047	0.04325	0.039625	0.0555	0.046		9.5725	5	47.86	2.203	292.597
K0+535	1017.272	1017.330	1017.356	1017.315	1017.288	1017.228	1017.279	1017.315	1017.275	1017.235							9.575					
											0.04675	0.0475	0.04775	0.039875	0.0495	0.046		9.5775	5	47.89	2.216	294.813
K0+540	1017.348	1017.391	1017.450	1017.381	1017.332	1017.299	1017.348	1017.396	1017.341	1017.286							9.58					
											0.04825	0.04775	0.04975	0.04025	0.04775	0.047		9.5725	5	47.86	2.238	297.050
K0+545	1017.424	1017.470	1017.505	1017.455	1017.418	1017.377	1017.418	1017.460	1017.414	1017.369							9.565					
											0.04575	0.05025	0.04925	0.04075	0.05125	0.047		9.5575	5	47.79	2.268	299.318
K0+550	1017.498	1017.537	1017.576	1017.528	1017.504	1017.454	1017.489	1017.523	1017.487	1017.451							9.55					
											0.04525	0.044	0.04825	0.039125	0.059	0.047		9.5275	5	47.64	2.245	301.563
K0+555	1017.572	1017.602	1017.643	1017.598	1017.586	1017.526	1017.563	1017.600	1017.560	1017.521							9.505					
											0.04875	0.042	0.04675	0.041375	0.06	0.048		9.4825	5	47.41	2.265	303.828
K0+560	1017.648	1017.681	1017.726	1017.679	1017.646	1017.597	1017.637	1017.676	1017.634	1017.591							9.46					
											0.045	0.045375	0.05175	0.0465	0.04825	0.047		9.485	5	47.43	2.247	306.075
K0+565	1017.686	1017.732	1017.777	1017.732	1017.686	1017.647	1017.685	1017.724	1017.684	1017.645							9.51					
											0.045	0.054125	0.06325	0.0545	0.04575	0.053		9.535	5	47.68	2.504	308.579
K0+570	1017.748	1017.796	1017.844	1017.796	1017.748	1017.697	1017.734	1017.771	1017.735	1017.698							9.56					
											0.04925	0.05875	0.06825	0.060625	0.053	0.058		9.5275	5	47.64	2.762	311.341
K0+575	1017.816	1017.861	1017.906	1017.863	1017.820	1017.769	1017.806	1017.843	1017.803	1017.764							9.495					
											0.04575	0.05225	0.05875	0.058875	0.059	0.055		9.4625	5	47.31	2.599	313.939
K0+580	1017.884	1017.926	1017.968	1017.930	1017.892	1017.840	1017.877	1017.914	1017.872	1017.830							9.43					
											0.047	0.05	0.053	0.057375	0.06175	0.054		9.4875	5	47.44	2.553	316.492
K0+585	1017.953	1017.998	1018.042	1018.004	1017.966	1017.903	1017.947	1017.990	1017.947	1017.905							9.545					
											0.053	0.052	0.051	0.056125	0.06125	0.055		9.6025	5	48.01	2.625	319.118
K0+590	1018.022	1018.069	1018.116	1018.078	1018.040	1017.966	1018.016	1018.066	1018.023	1017.979							9.66					
											0.05425	0.050375	0.0465	0.057625	0.06875	0.056		9.63	5	48.15	2.672	321.790
K0+595	1018.072	1018.125	1018.178	1018.139	1018.100	1018.020	1018.077	1018.135	1018.079	1018.024							9.6					
											0.05075	0.045125	0.0465	0.061875	0.06925	0.055		9.57	5	47.85	2.617	324.407
K0+600	1018.122	1018.181	1018.254	1018.200	1018.130	1018.073	1018.139	1018.204	1018.136	1018.068							9.54					
											0.0485	0.043375	0.04525	0.062875	0.0685	0.054		9.5525	5	47.76	2.565	326.972
K0+605	1018.203	1018.256	1018.308	1018.270	1018.224	1018.155	1018.211	1018.268	1018.208	1018.149							9.565					
											0.0475	0.045125	0.04275	0.060625	0.0745	0.054		9.5775	5	47.89	2.591	329.563
K0+610	1018.284	1018.330	1018.376	1018.340	1018.304	1018.237	1018.284	1018.331	1018.281	1018.230							9.59					
											0.0465	0.046875	0.04725	0.059	0.07075	0.054		9.5825	5	47.91	2.591	332.154
K0+615	1018.324	1018.376	1018.428	1018.388	1018.348	1018.278	1018.328	1018.379	1018.330	1018.281							9.575					
											0.0455	0.048625	0.05175	0.058	0.06425	0.054		9.5675	5	47.84	2.565	334.719
K0+620	1018.364	1018.422	1018.480	1018.436	1018.392	1018.319	1018.373	1018.426	1018.379	1018.331							9.56					
											0.045	0.050125	0.05525	0.0575	0.05975	0.054		9.56	5	47.80	2.558	337.278
K0+625	1018.419	1018.473	1018.526	1018.483	1018.439	1018.374	1018.422	1018.470	1018.425	1018.381							9.56					
											0.045	0.051375	0.05775	0.0575	0.05725	0.054		9.56	5	47.80	2.570	339.848
K0+630	1018.474	1018.523	1018.572	1018.529	1018.486	1018.429	1018.471	1018.513	1018.472	1018.430							9.56					
											0.04575	0.05275	0.05975	0.058875	0.058	0.055		9.56	5	47.80	2.630	342.478
K0+635	1018.518	1018.570	1018.622	1018.576	1018.529	1018.472	1018.517	1018.562	1018.515	1018.469							9.56					
											0.04725	0.05425	0.06125	0.061625	0.062	0.057		9.56	5	47.80	2.738	345.216
K0+640	1018.562	1018.617	1018.672	1018.622	1018.572	1018.514	1018.562	1018.610	1018.559	1018.508							9.56					
											0.045	0.054	0.063	0.063625	0.06425	0.058		9.565	5	47.83	2.773	347.989
K0+645	1018.623	1018.676	1018.728	1018.681	1018.633	1018.581	1018.623	1018.664	1018.616	1018.569							9.57					
											0.0455	0.052	0.065	0.064875	0.06475	0.058		9.575	5	47.88	2.797	350.786
K0+650	1018.697	1018.734	1018.784	1018.739	1018.694	1018.648	1018.683	1018.718	1018.674	1018.629							9.58					
											0.0475	0.051875	0.06275	0.061625	0.0605	0.057		9.5825	5	47.91	2.724	353.509
K0+655	1018.769	1018.821	1018.872	1018.825	1018.777	1018.723	1018.768	1018.813	1018.767	1018.721							9.585					
											0.051	0.053625	0.05625	0.053875	0.0515	0.053		9.5875	5	47.94	2.553	356.062
K0+660	1018.854	1018.907	1018.960	1018.910	1018.860	1018.798	1018.853	1018.907	1018.860	1018.813							9.59					
											0.0595	0.058	0.0565	0.054	0.0515	0.056		9.585	5	47.93	2.679	358.741
K0+665	1018.975	1019.023	1019.070	1019.030	1018.990	1018.912	1018.961	1019.010	1018.972	1018.934							9.58					
											0.0665	0.065	0.0635	0.062	0.0605	0.064		9.575	5	47.88	3.040	361.781
K0+670	1019.096	1019.138	1019.180	1019.150	1019.120	1019.026	1019.070	1019.113	1019.084	1019.055							9.57					
											0.072	0.068	0.0585	0.064625	0.06125	0.065		9.7225	5	48.61	3.154	364.935
K0+675	1019.251	1019.298	1019.330	1019.312	1019.270	1019.177	1019.231	1019.280	1019.248	1019.213							9.875					
											0.0705	0.067	0.051	0.061875	0.06575	0.063		10.0275	5	50.14	3.170	368.105
K0+680	1019.395	1019.458	1019.499	1019.473	1019.444	1019.328	1019.392	1019.447	1019.413	1019.370							10.18					
											0.07325	0.059125	0.04675	0.060875	0.071	0.062		10.1475	5	50.74	3.156	371.261
K0+685	1019.575	1019.610	1019.645	1019.632	1019.602	1019.496	1019.558	1019.604	1019.571	1019.534							10.115					
											0.06525	0.049375	0.04575	0.061625	0.07	0.058		10.0825	5	50.41	2.944	374.205
K0+690	1019.714	1019.772	1019.810	1019.791	1019.770	1019.663	1019.725	1019.760	1019.729	1019.698							10.05					
											0.05025	0.048	0.04875	0.060875	0.072	0.056		9.9275	5	49.64	2.778	376.983
K0+695	1019.902	1019.950	1019.979	1019.953	1019.926	1019.853	1019.901	1019.932	1019.893	1019.854							9.805					
											0.04875	0.0455	0.04625	0.058625	0.071	0.054		9.6825	5	48.41	2.615	379.599
K0+700	1020.090	1020.119	1020.148	1020.114	1020.080	1020.042	1020.077	1020.103	1020.057	1020.010							9.56					
											0.05	0.04625	0.04275	0.052125	0.0605	0.050		9.56	5	47.80	2.406	382.004
K0+705	1020.292	1020.324	1020.336	1020.303	1020.270	1020.240	1020.274	1020.296	1020.256	1020.219							9.56					
											0.05	0.04825	0.04525	0.047375	0.0505	0.048		9.56	5	47.80	2.308	384.312
K0+710	1020.486	1020.516	1020.538	1020.504	1020.478	1020.438	1020.470	1020.488	1020.456	1020.428							9.56					
											0.04675	0.046	0.04725	0.046375	0.0515	0.048		9.625	5	48.13	2.290	386.601
K0+715	1020.738	1020.779	1020.804	1020.766	1020.738	1020.693	1020.733	1020.760	1020.721	1020.685							9.69					
											0.04425	0.0485	0.04475	0.049125	0.0635	0.050		9.755	5	48.78	2.440	389.041
K0+720	1020.990	1021.047	1021.076	1021.040	1021.016	1020.947	1020.996	1021.031	1020.987	1020.942							9.82					
											0.04375	0.0475	0.04375	0.049375	0.0665	0.050		9.7675	5	48.84	2.450	391.492
K0+725	1021.295	1021.328	1021.358	1021.319	1021.290	1021.251	1021.284	1021.316	1021.273	1021.231							9.715					
											0.04525	0.045	0.04375	0.044625	0.0515	0.046		9.6625	5	48.31	2.224	393.715
K0+730	1021.600	1021.618	1021.645	1021.604	1021.564	1021.554	1021.572	1021.600	1021.560	1021.520							9.61					
											0.046	0.04625	0.05025	0.057125	0.0575	0.051		9.6225	5	48.11	2.474	396.190
K0+735	1021.958	1021.981	1022.000	1021.966	1021.918	1021.912	1021.935	1021.945	1021.896	1021.847							9.635					
											0.052	0.04375	0.05325	0.058375	0.0635	0.054		9.6475	5	48.24	2.613	398.803
K0+740	1022.328	1022.338	1022.340	1022.278	1022.230	1022.270	1022.297	1022.289	1022.232	1022.174							9.66					
											0.0535	0.04375	0.0545	0.058625	0.05875	0.054		9.805	5	49.03	2.639	401.442
K0+745	1022.682	1022.714	1022.742	1022.708	1022.646	1022.633	1022.668	1022.684	1022.637	1022.585							9.95					
											0.046	0.04675	0.0515	0.058375	0.05625	0.052		10.095	5	50.48	2.613	404.055

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES TOPOGRAFIA TRAMO 39

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0745-2024.-2024 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

SAN DIEGO CONSORCIO

CONS: **CONSORCIO SAN DIEGO**

DIRECCION : CANTIDADES DE OBRA AV8N ENTRE CALLES 21N-9N TRAMO 39
COMUNA : 3
BARRIO : GRANADA

	COTAS PAVIMENTO INSTALADO					COTAS FRESADO					PROMEDIO CORTE					PROM ESPESOR	ANCHO	PROM ANCHO	LONGITUD	AREA	VOLUMEN SECCION	VOLUMEN ACUMULADO
ABS	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ							
K0+750	1023.039	1023.085	1023.124	1023.088	1023.046	1022.996	1023.038	1023.079	1023.042	1022.995	0.0435	0.044	0.043	0.0485	0.0555	0.047	10.24	10.72	5	53.60	2.514	406.569
K0+755	1023.452	1023.491	1023.533	1023.555	1023.556	1023.408	1023.450	1023.492	1023.504	1023.496	0.045	0.043	0.044	0.0575	0.0605	0.050	11.2	11.68	5	58.40	2.920	409.489
K0+760	1023.866	1023.906	1023.952	1024.030	1024.058	1023.820	1023.861	1023.905	1023.966	1023.997	0.04975	0.04625	0.0525	0.06825	0.05525	0.054	12.16	12.1575	5	60.79	3.311	412.800
K0+765	1024.135	1024.230	1024.303	1024.369	1024.380	1024.082	1024.183	1024.245	1024.295	1024.331	0.06025	0.04675	0.0635	0.06975	0.05625	0.059	12.155	12.1525	5	60.76	3.599	416.399
K0+770	1024.410	1024.550	1024.654	1024.690	1024.727	1024.343	1024.504	1024.585	1024.625	1024.664	0.067	0.04525	0.06425	0.05637	0.0655	0.060	12.15	11.92	5	59.60	3.557	419.955
K0+775	1024.491	1024.650	1024.794	1024.798	1024.835	1024.424	1024.606	1024.735	1024.751	1024.767	0.067	0.04525	0.05475	0.04612	0.054	0.053	11.69	11.46	5	57.30	3.061	423.017
K0+780	1024.572	1024.753	1024.934	1024.922	1024.910	1024.505	1024.707	1024.884	1024.877	1024.870	0.06125	0.04575	0.04975	0.04587	0.042	0.049	11.23	10.93	5	54.65	2.674	425.690
K0+785	1024.729	1024.873	1024.998	1024.967	1024.936	1024.674	1024.828	1024.949	1024.920	1024.892	0.04975	0.04575	0.04925	0.04762	0.046	0.048	10.63	10.33	5	51.65	2.462	428.153
K0+790	1024.886	1024.994	1025.062	1025.012	1024.962	1024.842	1024.948	1025.013	1024.964	1024.914	0.04775	0.04575	0.04475	0.04637	0.048	0.047	10.03	9.9275	5	49.64	2.309	430.462
K0+795	1024.989	1025.060	1025.111	1025.067	1025.022	1024.938	1025.015	1025.071	1025.022	1024.974	0.05525	0.04525	0.04225	0.04212	0.048	0.047	9.825	9.7225	5	48.61	2.264	432.726
K0+800	1025.092	1025.126	1025.172	1025.121	1025.082	1025.033	1025.081	1025.128	1025.081	1025.034	0.05175	0.043	0.044	0.04262	0.04725	0.046	9.62	9.605	5	48.03	2.196	434.922
K0+805	1025.160	1025.197	1025.234	1025.199	1025.163	1025.116	1025.156	1025.190	1025.153	1025.117	0.0442S	0.044	0.05	0.04787	0.04575	0.046	9.59	9.575	5	47.88	2.220	437.143
K0+810	1025.242	1025.278	1025.308	1025.276	1025.244	1025.198	1025.231	1025.252	1025.226	1025.199	0.042	0.049625	0.05875	0.05112	0.0485	0.050	9.56	9.5625	5	47.81	2.391	439.533
K0+815	1025.352	1025.425	1025.432	1025.386	1025.350	1025.312	1025.373	1025.371	1025.334	1025.298	0.045	0.059875	0.06425	0.05237	0.0555	0.055	9.565	9.5675	5	47.84	2.650	442.183
K0+820	1025.476	1025.582	1025.556	1025.496	1025.456	1025.426	1025.515	1025.489	1025.443	1025.397	0.04775	0.059125	0.06225	0.05337	0.0595	0.056	9.57	9.5275	5	47.64	2.687	444.870
K0+825	1025.641	1025.718	1025.729	1025.685	1025.650	1025.596	1025.667	1025.672	1025.631	1025.590	0.04325	0.042375	0.05275	0.05412	0.0605	0.051	9.485	9.4425	5	47.21	2.389	447.259
K0+830	1025.806	1025.854	1025.902	1025.873	1025.844	1025.765	1025.820	1025.854	1025.819	1025.783	0.04475	0.03925	0.05175	0.06675	0.06975	0.054	9.4	9.45	5	47.25	2.573	449.832
K0+835	1026.046	1026.104	1026.122	1026.108	1026.070	1025.998	1026.060	1026.067	1026.029	1025.992	0.04725	0.04375	0.05825	0.07075	0.07225	0.058	9.5	9.55	5	47.75	2.791	452.623
K0+840	1026.276	1026.342	1026.340	1026.302	1026.266	1026.230	1026.299	1026.279	1026.240	1026.200	0.0445	0.043375	0.05925	0.05937S	0.06725	0.055	9.6	9.615	5	48.08	2.632	455.255
K0+845	1026.575	1026.634	1026.642	1026.602	1026.580	1026.532	1026.590	1026.585	1026.546	1026.512	0.0445	0.047125	0.06275	0.06012S	0.05975	0.055	9.63	9.645	5	48.23	2.645	457.900
K0+850	1026.880	1026.932	1026.958	1026.916	1026.874	1026.834	1026.882	1026.890	1026.852	1026.823	0.044	0.046125	0.062	0.0545	0.0485	0.051	9.66	9.9975	5	49.99	2.551	460.451
K0+855	1027.161	1027.210	1027.246	1027.206	1027.165	1027.119	1027.168	1027.190	1027.161	1027.119	0.043	0.042375	0.05	0.043	0.0435	0.044	10.335	10.6725	5	53.36	2.368	462.819
K0+860	1027.448	1027.498	1027.534	1027.510	1027.456	1027.404	1027.455	1027.490	1027.469	1027.415	0.0455	0.04425	0.0425	0.0445	0.05075	0.046	11.01	10.235	5	51.18	2.328	465.147
K0+865	1027.781	1027.816	1027.830	1027.834	1027.817	1027.734	1027.771	1027.789	1027.786	1027.757	0.0535	0.04475	0.0435	0.0485	0.05825	0.050	9.46	8.685	5	43.43	2.158	467.305
K0+870	1028.124	1028.130	1028.134	1028.152	1028.154	1028.064	1028.086	1028.088	1028.103	1028.098	0.0555	0.04425	0.043	0.04975	0.064	0.051	7.91	7.5075	5	37.54	1.926	469.231
K0+875	1028.410	1028.438	1028.458	1028.489	1028.520	1028.359	1028.394	1028.418	1028.438	1028.448	0.0465	0.04625	0.041	0.05125	0.071	0.051	7.105	6.7025	5	33.51	1.716	470.947
K0+880	1028.696	1028.749	1028.790	1028.825	1028.868	1028.654	1028.701	1028.748	1028.773	1028.798	0.045	0.0465	0.042	0.05275	0.0675	0.051	6.3	6.32	5	31.60	1.604	472.551
K0+885	1028.986	1029.012	1029.038	1029.064	1029.089	1028.938	1028.967	1028.996	1029.010	1029.024	0.051	0.0495	0.048	0.05425	0.0605	0.053	6.34	6.36	5	31.80	1.674	474.225
K0+890	1029.276	1029.287	1029.298	1029.302	1029.306	1029.222	1029.233	1029.244	1029.247	1029.250	0.0505	0.052	0.0535	0.055	0.0565	0.053	6.38	6.36	5	31.80	1.701	475.926
K0+895	1029.539	1029.555	1029.571	1029.566	1029.561	1029.492	1029.505	1029.518	1029.511	1029.504	0.0435	0.048	0.0525	0.055	0.0575	0.051	6.34	6.32	5	31.60	1.621	477.547
K0+900	1029.802	1029.823	1029.844	1029.830	1029.816	1029.762	1029.777	1029.792	1029.775	1029.758	0.045	0.05025	0.0555	0.05925	0.063	0.055	6.3	6.3275	5	31.64	1.727	479.275
K0+905	1030.086	1030.108	1030.130	1030.111	1030.092	1030.036	1030.054	1030.071	1030.048	1030.024	0.055	0.05875	0.0625	0.06575	0.0665	0.062	6.355	6.3825	5	31.91	1.969	481.244
K0+910	1030.370	1030.393	1030.416	1030.388	1030.355	1030.310	1030.330	1030.350	1030.320	1030.290	0.056	0.05875	0.0615	0.06575	0.0635	0.061	6.41	6.3975	5	31.99	1.954	483.198
K0+915	1030.677	1030.697	1030.716	1030.694	1030.664	1030.625	1030.642	1030.659	1030.631	1030.602	0.048	0.05025	0.0525	0.05925	0.062	0.054	6.385	6.3725	5	31.86	1.733	484.931
K0+920	1030.984	1031.000	1031.016	1030.996	1030.976	1030.940	1030.954	1030.968	1030.941	1030.914	0.053	0.056	0.059	0.06175	0.064	0.059	6.36	6.535	5	32.68	1.920	486.851
K0+925	1031.289	1031.307	1031.325	1031.301	1031.276	1031.227	1031.241	1031.255	1031.233	1031.210	0.065	0.068	0.065	0.06425	0.066	0.066	6.71	6.885	5	34.43	2.260	489.111
K0+930	1031.582	1031.598	1031.602	1031.584	1031.572	1031.514	1031.528	1031.542	1031.524	1031.506	0.069	0.0725	0.062	0.0615	0.061	0.065	7.06	6.8875	5	34.44	2.245	491.356
K0+935	1031.876	1031.911	1031.930	1031.905	1031.874	1031.806	1031.836	1031.866	1031.842	1031.818	0.07	0.079	0.08	0.065	0.062	0.071	6.715	6.5425	5	32.71	2.329	493.685
K0+940	1032.168	1032.227	1032.286	1032.227	1032.198	1032.098	1032.144	1032.190	1032.160	1032.130	0.068	0.07825	0.0885	0.06825	0.0685	0.074	6.37	6.3675	5	31.84	2.366	496.051
K0+945	1032.416	1032.464	1032.511	1032.471	1032.442	1032.350	1032.390	1032.430	1032.402	1032.373	0.064	0.06875	0.0735	0.06525	0.0625	0.067	6.365	6.3625	5	31.81	2.125	498.176
K0+950	1032.664	1032.700	1032.736	1032.704	1032.672	1032.602	1032.636	1032.670	1032.643	1032.616	0.0615	0.061	0.0605	0.057	0.0535	0.059	6.36	6.385	5	31.93	1.874	500.050
K0+955	1032.776	1032.797	1032.818	1032.787	1032.755	1032.715	1032.739	1032.763	1032.734	1032.704	0.0605	0.055	0.0495	0.049	0.0485	0.053	6.41	6.435	5	32.18	1.689	501.739
K0+960	1032.888	1032.894	1032.900	1032.869	1032.838	1032.828	1032.842	1032.856	1032.824	1032.792	0.0545	0.0505	0.0465	0.04675	0.047	0.049	6.46	6.465	5	32.33	1.586	503.325
K0+965	1032.814	1032.829	1032.843	1032.815	1032.786	1032.765	1032.780	1032.794	1032.766	1032.738	0.0465	0.0475	0.0515	0.05025	0.049	0.049	6.47	6.475	5	32.38	1.585	504.910
K0+970	1032.746	1032.763	1032.786	1032.760	1032.734	1032.702	1032.717	1032.732	1032.708	1032.684	0.044	0.04575	0.048	0.048	0.0505	0.047	6.48	6.4475	5	32.24	1.523	506.433
K0+975	1032.521	1032.548	1032.560	1032.530	1032.499	1032.477	1032.503	1032.518	1032.486	1032.448	0.047	0.04675	0.043	0.0425	0.0515	0.046	6.415	6.3825	5	31.91	1.473	507.906
K0+980	1032.302	1032.336	1032.348	1032.304	1032.264	1032.252	1032.288	1032.304	1032.263	1032.212	0.0535	0.04625	0.0425	0.0425	0.0475	0.046	6.35	6.3275	5	31.64	1.470	509.375
K0+985	1031.945	1031.969	1031.992	1031.959	1031.912	1031.888	1031.925	1031.951	1031.915	1031.869	0.0605	0.04775	0.0425	0.042	0.044	0.047	6.305	6.2825	5	31.41	1.487	510.862
K0+990	1031.588	1031.612	1031.642	1031.607	1031.571	1031.524	1031.561	1031.598	1031.567	1031.526	0.0595	0.04975	0.045	0.044	0.0425	0.048	6.26	6.225	5	31.13	1.499	512.361
K0+995	1031.214	1031.234	1031.258	1031.224	1031.170	1031.159	1031.186	1031.212	1031.176	1031.130	0.0505	0.04875	0.047	0.0455	0.0425	0.047	6.19	6.155	5	30.78	1.442	513.803
K1+000	1030.840	1030.859	1030.874	1030.828	1030.779	1030.794	1030.810	1030.826	1030.785	1030.734	0.0485	0.048625	0.04675	0.04137S	0.045	0.046	6.12	6.155	5	30.78	1.417	515.220
K1+005	1030.458	1030.473	1030.488	1030.460	1030.418	1030.407	1030.425	1030.443	1030.420	1030.373	0.0535	0.048875	0.04425	0.042125	0.0465	0.047	6.19	6.225	5	31.13	1.464	516.685
K1+010	1030.076	1030.089	1030.102	1030.100	1030.060	1030.020	1030.040	1030.059	1030.056	1030.012	0.056	0.054125	0.05225	0.04887S	0.0565	0.054	6.26	6.2975	5	31.49	1.686	518.371
K1+015	1029.696	1029.719	1029.741	1029.719	1029.697	1029.640	1029.660	1029.680	1029.666	1029.632	0.056	0.063375	0.06175	0.057125	0.0685	0.061	6.335	6.3725	5	31.86	1.955	520.326
K1+020	1029.316	1029.348	1029.362	1029.337	1029.324	1029.260	1029.280	1029.300	1029.276	1029.252	0.058	0.0655	0.064	0.0625	0.067	0.063	6.41	6.4125	5	32.06	2.033	522.358
K1+025	1028.937	1028.963	1028.988	1028.957	1028.925	1028.877	1028.900	1028.922	1028.893	1028.863	0.062	0.0605	0.059	0.0525	0.052	0.057	6.415	6.4175	5	32.09	1.835	524.194
K1+030	1028.558	1028.577	1028.596	1028.550	1028.516	1028.494	1028.519	1028.544	1028.509	1028.474	0.0575	0.05575	0.054	0.0415	0.0445	0.051	6.42	6.385	5	31.93	1.617	525.811
K1+035	1028.184	1028.205	1028.225	1028.185	1028.164	1028.133	1028.151	1028.169	1028.143	1028.117	0.0495	0.05125	0.058	0.0445	0.0455	0.050	6.35	6.315	5	31.58	1.571	527.382
K1+040	1027.820	1027.832	1027.854	1027.824	1027.804	1027.772	1027.783	1027.794	1027.777	1027.760	0.048	0.048	0.053	0.044	0.045	0.048	6.28	6.3575	5	31.79	1.513	528.895
K1+045	1027.486	1027.514	1027.542	1027.523	1027.514	1027.438	1027.467	1027.496	1027.482	1027.468	0.053	0.046	0.044	0.043	0.047	0.047	6.435	6.5125	5	32.56	1.517	530.412
K1+050	1027.162	1027.196	1027.240	1027.232	1027.224	1027.104	1027.151	1027.198	1027.187	1027.176	0.061	0.046625	0.0415	0.044	0.04475	0.048	6.59	6.5425	5	32.71	1.556	531.968
K1+055	1026.920	1026.952	1026.992	1026.976	1026.957	1026.856	1026.903	1026.951	1026.933	1026.915	0.067	0.049875	0.042	0.041	0.04325	0.049	6.495	6.4475	5	32.24	1.568	533.536
K1+060	1026.677	1026.707	1026.747	1026.718	1026.699	1026.607	1026.656	1026.704	1026.679	1026.654	0.06325	0.048125	0.043	0.041	0.049	0.049	6.4	6.395	5	31.98	1.563	535.099
K1+065	1026.522	1026.552	1026.592	1026.575	1026.567	1026.466	1026.507	1026.549	1026.532	1026.514	0.04975	0.046375	0.044	0.045	0.057	0.048	6.39	6.385	5	31.93	1.546	536.645
K1+070	1026.367	1026.407	1026.439	1026.431	1026.435	1026.324	1026.359	1026.394	1026.384	1026.374	0.046	0.0495	0.043	0.04925	0.062	0.050	6.38	6.44	5	32.20	1.608	538.253
K1+075	1026.232	1026.264	1026.284	1026.275	1026.266	1026.183	1026.213	1026.243	1026.223	1026.203	0.052	0.051	0.044	0.05375	0.064	0.053	6.5	6.56	5	32.80	1.737	539.990
K1+080	1026.097	1026.118	1026.139	1026.118	1026.097	1026.042	1026.067	1026.092	1026.062	1026.032	0.0565	0.05	0.0455	0.0555	0.0675	0.055	6.62	6.6	5	33.00	1.815	541.805
K1+085	1026.014	1026.029	1026.048	1026.031	1026.017	1025.956	1025.980	1026.004	1025.976	1025.947	0.0595	0.048	0.0475	0.0545	0.0725	0.056	6.58	6.56	5	32.80	1.850	543.655
K1+090	1025.931	1025.940	1025.967	1025.943	1025.937	1025.870	1025.893	1025.916	1025.889	1025.862	0.0605	0.04825	0.048	0.05475	0.07	0.056	6.54	6.61	5	33.05	1.861	545.515
K1+095	1025.882	1025.890	1025.903	1025.909	1025.913	1025.822	1025.840	1025.858	1025.853	1025.848	0.0525	0.05075	0.0525	0.05625	0.06	0.054	6.68	6.75	5	33.75	1.836	547.351
K1+100	1025.819	1025.839	1025.860	1025.874	1025.889	1025.774	1025.787	1025.800	1025.817	1025.834	0.048	0.05825	0.069	0.0605	0.0525	0.058	6.82	6.7275	5	33.64	1.939	549.291
K1+105	1025.799	1025.836	1025.872	1025.891	1025.910	1025.748	1025.771	1025.794	1025.827	1025.860	0.054	0.07075	0.075	0.0674	0.0475	0.063	6.635	6.5425	5	32.71	2.059	551.349
K1+110	1025.779	1025.832	1025.860	1025.908	1025.931	1025.722	1025.755	1025.788	1025.837	1025.886	0.18040205	0.06775	0.07225	0.06465	0.046	0.086	6.45	6.455	5	32.28	2.782	554.132
K1+115	1025.817	1025.859	1025.901	1025.917	1025.933	1025.513	1025.801	1025.829	1025.859	1025.886	0.178	0.053	0.060	0.052	0.048	0.078	6.46	6.455	5	32.28	2.525	556.657
K1+120	1025.356	1025.893	1025.917	1025.926	1025.935	1025.304	1025.846	1025.869	1025.880	1025.886					LLENO PR	0.054	6.45			10260.90	556.657	556.657

AREA DESCUENTOS		VOLUMEN ASFALTO	558.656	VALOR AJUSTADO	OBSERVACION

MEMORIA DE CANTIDADES TOPOGRAFIA TRAMO 39

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0745-2024.-2024 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

CONS: CONSORCIO SAN DIEGO

DIRECCION : CANTIDADES DE OBRA AV8N ENTRE CALLES 21N-9N TRAMO 39
COMUNA : 3
BARRIO : GRANADA

	COTAS PAVIMENTO INSTALADO					COTAS FRESADO					PROMEDIO CORTE					PROM ESPESOR	ANCHO	PROM ANCHO	LONGITUD	AREA	VOLUMEN SECCION	VOLUMEN ACUMULADO
ABS	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ							
																545.928	526.70	CORRESPONDE AL VALOR AJUSTADO RESTANDO 2 MM DE ESPESOR				

Firma :
Nombre : ALEXANDER AMAYA
Cargo : Topografo
Matricula : 01-14526

DESCRIPCION	CANTIDAD	L*A	AREA
CAM	43	R=0.7	66.193
SUM SENCILLA	30	0.9*2.38	64.26
SUM DOBLE	1	3.25*0.92	2.99
PLACA EN CO	2	2.47*1.7	8.4
CAJAS	3	2.5*1.97	14.775
CAJAS TELEF	6	4.139	24.834
			181.452

VOL. TOTAL ASFALTO	545.928
VOL. ASFALTO COMPLEMENTARI	1.999
AREA TOTAL	10,297.882
AREA CON DESCUENTO	10,116.430
AREA COMPLEMENTARIA	36.982

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	105	**DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.**		
UNIDAD	ML			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 39 - CALLE 16N A CALLE 17N LINEA DISCONTINUA	2.00	36			72.00
TRAMO 39 - CALLE 16N A CALLE 17N LINEA CONTINUA	2.00	70			140.00
TRAMO 39 - CALLE 17N A CALLE 17AN LINEA DISCONTINUA	2.00	24			48.00
TRAMO 39 - CALLE 17N A CALLE 17AN LINEA CONTINUA	2.00	49			98.00
TRAMO 39 - CALLE 17AN A CALLE 18N LINEA DISCONTINUA	2.00	15			30.00
TRAMO 39 - CALLE 17AN A CALLE 18N LINEA CONTINUA	2.00	47			94.00
TRAMO 39 - CALLE 18N A CALLE 20N LINEA DISCONTINUA	2.00	24			48.00
TRAMO 39 - CALLE 18N A CALLE 20N LINEA CONTINUA	2.00	42.5			85.00
TRAMO 39 - CALLE 20N A CALLE 21N LINEA DISCONTINUA	2.00	33			66.00
TRAMO 39 - CALLE 20N A CALLE 21N LINEA CONTINUA	2.00	67			134.00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	815.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	2,286.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	815.00
TOTAL POR EJECUTAR	1,471.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	815.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	2,286.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	815.00
TOTAL POR EJECUTAR	1,471.00

RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

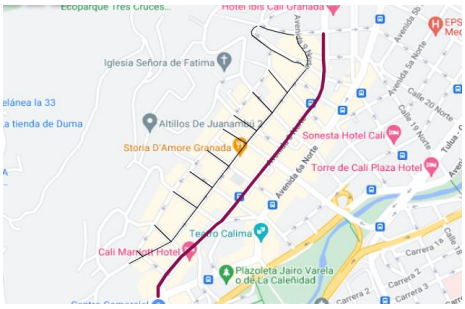
CAPÍTULO	XI	DRENAJES	FECHA:	22-nov-24
ITEM	106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.			
UNIDAD	M2			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 39 - CALLE 16N A CALLE 17N CEBRA L=4.0 m	24.00	4	0.4		38.40
TRAMO 39 - CALLE 16N A CALLE 17N LINEA PARE	1.00	9.3	0.6		5.58
TRAMO 39 - CALLE 16N A CALLE 17N FLECHA DE FRENTE	5.00	1.2			6.00
TRAMO 39 - CALLE 16N A CALLE 17N FLECHA GIRO DOBLE	1.00	2.2			2.20
TRAMO 39 - CALLE 17N A CALLE 17AN CEBRA L= 4.0 m	12.00	4	0.4		19.20
TRAMO 39 - CALLE 17N A CALLE 17AN LINEA PARE	1.00	9.3	0.6		5.58
TRAMO 39 - CALLE 17N A CALLE 17AN FLECHA DE FRENTE	5.00	1.2			6.00
TRAMO 39 - CALLE 17N A CALLE 17AN FLECHA GIRO DOBLE	1.00	2.2			2.20
TRAMO 39 - CALLE 17AN A CALLE 18N CEBRA L=4.0 m	12.00	4	0.4		19.20
TRAMO 39 - CALLE 17AN A CALLE 18N FLECHA DE FRENTE	5.00	1.2			6.00
TRAMO 39 - CALLE 17AN A CALLE 18N FLECHA GIRO DOBLE	1.00	2.2			2.20
TRAMO 39 - CALLE 18N A CALLE 20N CEBRA L= 4.0 m	11.00	4	0.4		17.60
TRAMO 39 - CALLE 18N A CALLE 20N LINEA PARE	1.00	9.3	0.6		5.58
TRAMO 39 - CALLE 18N A CALLE 20N FLECHA DE FRENTE	5.00	1.2			6.00
TRAMO 39 - CALLE 18N A CALLE 20N FLECHA GIRO DOBLE	1.00	2.2			2.20
TRAMO 39 - CALLE 20N A CALLE 21N CEBRA L=4.0 m	26.00	4	0.4		41.60
TRAMO 39 - CALLE 20N A CALLE 21N CEBRA COMPLEMENTO L= variable	1.00	10.7	0.4		4.28
TRAMO 39 - CALLE 20N A CALLE 21N LINEA PARE	1.00	10.4	0.6		6.24
TRAMO 39 - CALLE 20N A CALLE 21N FLECHA DE FRENTE	5.00	1.2			6.00
TRAMO 39 - CALLE 20N A CALLE 21N FLECHA GIRO DOBLE	1.00	2.2			2.20
TRAMO 39 - INTERSECCION CALLE 21N HACIA CALLE 22N / CEBRA L= 4.0 m	12.00	4	0.4		19.20
TRAMO 39 - INTERSECCION CALLE 21N HACIA CALLE 22N LINEA PARE	1.00	9.3	0.6		5.58
TRAMO 39 - CALLE 12N FLECHA DE FRENTE	5.00	1.2			6.00
TRAMO 39 - CALLE 12N FLECHA GIRO UNICO	1.00	1.8			1.80

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	236.84
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	670.77
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	236.84
TOTAL POR EJECUTAR	433.93

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XI	**DRENAJES**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	106	**DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.**		
UNIDAD	M2			

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	236.84
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	670.77
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	236.84
TOTAL POR EJECUTAR	433.93

RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

SOPORTES PRE ACTA DE RECIBO PARCIAL No.: 02

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Alcaldia de Santiago de Cali

PRE ACTA DE RECIBIO PARCIAL TRAMO 61 (SAN ANTONIO)

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

				FECHA DE ELABORACION:	**22 DE NOVIEMBRE DE 2024**
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PRORROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PRORROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PRORROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

LOTE 03 - COMUNA 02 SEGUNDO SECTOR Y COMUNA 08

FRENTE 61 - CARRERA 12 ENTRE CALLES 3 Y 3OESTE

CONDICIONES CONTRACTUALES						**CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1**		**EJECUCION**							
								ACTAS ANTERIORES		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				**CANTIDADES ACTUALIZADAS**									
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1,716.00	$ 0.00	746.72	$ 1,281,372.00	-	$ -	746.72	$ 1,281,372.00	746.72	$ 1,281,372.00	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	377.00	$ 6,356.00	$ 2,396,212.00	417.00	$ 2,650,452.00	-	$ -	417.00	$ 2,650,452.00	417.00	$ 2,650,452.00	-	$ -
Subtotal					**$ 2,396,212.00**		**$ 3,931,824.00**		**$ -**		**$ 3,931,824.00**		**$ 3,931,824.00**		**$ -**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	115.00	$ 22,513.00	$ 2,588,995.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	120.00	$ 9,327.00	$ 1,119,240.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103,237.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 3,708,235.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	23.00	$ 10,545.00	$ 242,535.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60,034.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	23.00	$ 43,679.00	$ 1,004,617.00	767.26	$ 33,513,150.00	-	$ -	381.01	$ 16,642,136.00	381.01	$ 16,642,136.00	386.25	$ 16,871,014.00
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2,588,680.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	115.00	$ 8,282.00	$ 952,430.00	746.72	$ 6,184,335.00	-	$ -	746.72	$ 6,184,335.00	746.72	$ 6,184,335.00	-	$ -
Subtotal					**$ 2,199,582.00**		**$ 39,697,485.00**		**$ -**		**$ 22,826,471.00**		**$ 22,826,471.00**		**$ 16,871,014.00**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	23.00	$ 212,313.00	$ 4,883,199.00	126.88	$ 26,938,273.00	-	$ -	126.88	$ 26,938,273.00	126.88	$ 26,938,273.00	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	377.00	$ 28,591.00	$ 10,778,807.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 15,662,006.00**		**$ 26,938,273.00**		**$ -**		**$ 26,938,273.00**		**$ 26,938,273.00**		**$ -**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4,818.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	377.00	$ 4,652.00	$ 1,753,804.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7,184.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4,966.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,332,529.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	75.40	$ 1,371,977.00	$ 103,447,066.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,425,083.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 105,200,870.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

VI	**CONCRETOS**															
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	151.34	$ 6,454,651.00	-	$ -	151.34	$ 6,454,651.00	151.34	$ 6,454,651.00	-	$ -
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 6,454,651.00**		**$ -**		**$ 6,454,651.00**		**$ 6,454,651.00**		**$ -**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**															
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	700.00	$ 3,927.00	$ 2,748,900.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	65.00	$ 64,328.00	$ 4,181,320.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 6,930,220.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
XI	**DRENAJES**															
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	4.00	$ 422,631.00	$ 1,690,524.00	6.00	$ 2,535,786.00	-	$ -	6.00	$ 2,535,786.00	6.00	$ 2,535,786.00	-	$ -
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	6.00	$ 1,159,538.00	$ 6,957,228.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 8,647,752.00**		**$ 2,535,786.00**		**$ -**		**$ 2,535,786.00**		**$ 2,535,786.00**		**$ -**
XII	**NO PREVISTOS**															
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	746.72	$ 38,482,215.00	-	$ -	746.72	$ 38,482,215.00	746.72	$ 38,482,215.00	-	$ -
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	457.20	$ 7,316,114.00	-	$ -	457.20	$ 7,316,114.00	457.20	$ 7,316,114.00	-	$ -
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	154.11	$ 214,462,404.00	-	$ -	107.88	$ 150,127,858.00	107.88	$ 150,127,858.00	46.23	$ 64,334,546.00
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	1,786.88	$ 14,718,531.00	-	$ -	2,198.31	$ 18,107,479.00	2,198.31	$ 18,107,479.00	- 411.43	-$ 3,388,949.00
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	2.00	$ 1,640,808.00	-	$ -	2.00	$ 1,640,808.00	2.00	$ 1,640,808.00	-	$ -
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	144.56	$ 5,373,873.00	-	$ -	144.56	$ 5,373,873.00	144.56	$ 5,373,873.00	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 281,993,945.00**		**$ -**		**$ 221,048,347.00**		**$ 221,048,347.00**		**$ 60,945,597.00**
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 144,744,877.00**		**$ 361,551,964.00**		**$ -**		**$ 283,735,352.00**		**$ 283,735,352.00**		**$ 77,816,611.00**


SUBTOTAL OBRAS	**$ 144,744,877.00**	**$ 361,551,964.00**	**$ -**	**$ 283,735,352.00**	**$ 283,735,352.00**	**$ 77,816,611.00**
Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA (2,02%)	**$ 2,923,847.00**	**$ 7,303,350.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Plan de Manejo de Transito - PMT (2,65%)	**$ 3,835,739.00**	**$ 9,581,127.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
VALOR TOTAL	**$ 151,504,463.00**	**$ 378,436,441.00**	**$ -**	**$ 283,735,352.00**	**$ 283,735,352.00**	**$ 77,816,611.00**

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	1	**LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).**		
UNIDAD	M2			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**TOTAL**
	CANTIDAD	**AREA SEGÚN CARTERA DE CAMPO**	**ESPESOR**	
TRAMO 61	1.00	746.72		746.72

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	746.72
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	746.72
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	746.72
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	746.72
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	746.72
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	746.72
TOTAL POR EJECUTAR	0.00


RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	II	DEMOLICIONES	FECHA:	22-nov-24
ITEM	2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).		
UNIDAD	ML			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 61	1.00	417			417.00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	417.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	417.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	417.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	417.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	417.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	417.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00


RESIDENTE DE OBRA:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	19	**RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).**		
UNIDAD	M3			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**TOTAL**
	VOLUMEN DE EXCAVACION	**FACTOR DE EXPANSION**	**RELACION - DISTANCIA PUNTO DE**	
TRAMO 61 - NP-01 (5 KM ADICIONALES A BOTADERO)	152.49	1.3	0.5	99.12
TRAMO 61 - NP-07 (15 KM DISTANCIA A BOTADERO)	144.56	1.3	1.5	281.89

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	381.01
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	767.26
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	381.01
TOTAL POR EJECUTAR	386.25

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	381.01
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	767.26
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	381.01
TOTAL POR EJECUTAR	386.25


RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	26	**ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.**		
UNIDAD	M2			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**	**TOTAL**
	VOLUMEN SEGÚN CARTERA DE CAMPO	
TRAMO 61	746.72	746.72

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	746.72
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	746.72
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	746.72
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	746.72
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	746.72
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	746.72
TOTAL POR EJECUTAR	0.00


RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	IV	**RELLENOS Y BASES**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	28	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.**		
UNIDAD	M3			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**	**TOTAL**
	VOLUMEN SEGÚN CARTERA DE CAMPO	
TRAMO 61	126.88	126.88

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	126.88
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	126.88
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	126.88
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	126.88
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	126.88
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	126.88
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

MEMORIA DE CANTIDADES TOPOGRAFIA DE TRAMO 61 BASE

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0745-2024.-2024 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

CONS: CONSORCIO SAN DIEGO

COMUNA : 3
BARRIO : San Antonio

CANTIDADES DE OBRA: CARRERA 10 ENTRE CALLE 1OE- 2OE TRAMO 61 LOTE 3 CALZADA LOSAS DE CONCRETO

	COTAS BASE					COTAS EXCAVACION					DIFERENCIA					PROM	ANCHO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	AREA EN PLANTA
ABS	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ						
K0+256.0	1067.024	1066.793	1066.563	1066.288	1065.958	1066.845	1066.614	1066.382	1066.109	1065.777	0.179	0.179	0.181	0.179	0.181	0.160	6.570	1.050	3.745	3.745	23.395
K0+259.6	1066.551	1066.555	1066.533	1066.448	1066.306	1066.371	1066.374	1066.352	1066.268	1066.126	0.180	0.181	0.181	0.180	0.180	0.160	6.320	1.014	3.871	7.617	24.238
K0+263.5	1066.531	1066.521	1066.497	1066.521	1066.534	1066.352	1066.342	1066.318	1066.342	1066.355	0.179	0.179	0.179	0.179	0.179	0.159	6.110	0.971	3.796	11.413	23.829
K0+267.4	1066.542	1066.568	1066.580	1066.516	1066.483	1066.362	1066.389	1066.401	1066.336	1066.303	0.180	0.179	0.179	0.180	0.180	0.160	6.110	0.975	4.395	15.807	27.500
K0+271.8	1066.609	1066.621	1066.612	1066.561	1066.539	1066.428	1066.442	1066.432	1066.382	1066.358	0.181	0.179	0.180	0.179	0.181	0.160	6.390	1.022	4.033	19.840	25.220
K0+275.8	1066.601	1066.676	1066.654	1066.600	1066.559	1066.420	1066.497	1066.475	1066.420	1066.379	0.181	0.179	0.179	0.180	0.180	0.160	6.220	0.994			
															ESPESOR	0.160				19.840	124.183

Firma :
Nombre : ALEXANDER AMAYA
Cargo : Topografo
Matricula : 01-14526

AREA DESCUENTOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	L*A	AREA
CAM	1	R=0.7	1.54
SUM	2	0.88*2.00	3.52
A. DE LOSA NO FUNDIDA	1	3.195*3.572	11.42
			16.48

VOLUMEN TOTAL DE BASE	18.015
AREA TOTAL	124.183
AREA CON DESCUENTO	**107.703**
VOLUMEN DE DESCUENTO	1.825
9 LOSAS FUNDIDAS	

MEMORIA DE CANTIDADES TOPOGRAFIA DE TRAMO 61 BASE

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0745-2024.-2024 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

CONS: CONSORCIO SAN DIEGO

COMUNA : 3
BARRIO : San Antonio

CANTIDADES DE OBRA: CARRERA 10 ENTRE CALLE 1OE- 2OE TRAMO 61 LOTE 3 CALZADA LOSAS DE CONCRETO

	COTAS BASE					COTAS EXCAVACION					DIFERENCIA					PROM	ANCHO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	AREA EN PLANTA
ABS	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ						
K0+280.0	1066.733	1066.675	1066.712	1066.654	1066.588	1066.555	1066.497	1066.532	1066.474	1066.408	0.178	0.178	0.180	0.180	0.180	0.164	6.500	1.067	4.587	4.587	27.950
K0+284.3	1066.795	1066.706	1066.787	1066.734	1066.631	1066.616	1066.527	1066.608	1066.555	1066.452	0.179	0.179	0.179	0.179	0.179	0.164	6.500	1.066	4.224	8.811	25.680
K0+288.3	1066.807	1066.824	1066.766	1066.714	1066.734	1066.629	1066.644	1066.586	1066.534	1066.552	0.178	0.180	0.180	0.180	0.182	0.165	6.340	1.046	4.214	13.024	25.600
K0+292.3	1066.866	1066.826	1066.816	1066.771	1066.788	1066.688	1066.647	1066.636	1066.592	1066.608	0.178	0.179	0.180	0.179	0.180	0.164	6.460	1.061	4.229	17.254	25.740
K0+296.3	1066.923	1066.895	1066.887	1066.848	1066.809	1066.744	1066.715	1066.708	1066.668	1066.630	0.179	0.180	0.179	0.180	0.179	0.164	6.410	1.054	4.190	21.443	25.500
K0+300.3	1067.040	1066.981	1066.903	1066.898	1066.924	1066.862	1066.802	1066.723	1066.719	1066.744	0.178	0.179	0.180	0.179	0.180	0.164	6.340	1.041	4.318	25.761	26.281
K0+304.4	1067.050	1067.033	1067.037	1066.969	1066.934	1066.871	1066.853	1066.858	1066.789	1066.755	0.179	0.180	0.179	0.180	0.179	0.164	6.480	1.065	3.956	29.717	24.013
K0+308.1	1067.179	1067.096	1067.038	1067.054	1066.944	1066.999	1066.917	1066.858	1066.874	1066.763	0.180	0.179	0.180	0.181	0.181	0.165	6.500	1.073	1.384	31.101	8.398
K0+309.4	1067.186	1067.109	1067.080	1066.943	1066.833	1067.006	1066.929	1066.901	1066.764	1066.654	0.180	0.180	0.179	0.179	0.179	0.164	6.420	1.055	4.937	36.037	30.010
K0+314.1	1067.326	1067.233	1067.193	1067.046	1066.792	1067.147	1067.054	1067.013	1066.866	1066.612	0.179	0.179	0.180	0.180	0.180	0.165	6.350	1.045	3.491	39.529	21.235
K0+317.4	1067.426	1067.391	1067.345	1067.162	1066.976	1067.248	1067.211	1067.166	1066.983	1066.796	0.178	0.180	0.179	0.179	0.180	0.164	6.520	1.071	4.274	43.803	26.000
K0+321.4	1067.760	1067.659	1067.595	1067.552	1067.434	1067.581	1067.479	1067.415	1067.372	1067.255	0.179	0.180	0.180	0.180	0.179	0.165	6.480	1.067	4.323	48.126	26.343
K0+325.5	1068.126	1068.054	1068.034	1068.003	1068.006	1067.948	1067.875	1067.855	1067.824	1067.828	0.178	0.179	0.179	0.179	0.178	0.164	6.370	1.042	4.046	52.172	24.687
K0+329.4	1068.692	1068.665	1068.668	1068.610	1068.640	1068.513	1068.485	1068.490	1068.430	1068.461	0.179	0.180	0.178	0.180	0.179	0.164	6.290	1.033	3.537	55.709	21.551
K0+334.0	1069.336	1069.299	1069.270	1069.223	1069.216	1069.158	1069.119	1069.091	1069.043	1069.038	0.178	0.180	0.179	0.180	0.178	0.164	3.080	0.505			
															ESPESOR	0.164				55.709	338.988

Firma :
Nombre : ALEXANDER AMAYA
Cargo : Topografo
Matrícula : 01-14526

AREA DESCUENTOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	L*A	AREA
CAM	3	R=0.7	4.62
SUM	0	0.88*2.00	0
FUNDIDA	4		44.749
			49.369

VOLUMEN TOTAL DE BASE	48.355
AREA TOTAL	338.988
AREA CON DESCUENTO	289.619
VOLUMEN DE DESCUENTO	7.354
24 LOSAS FUNDIDAS	

MEMORIA DE CANTIDADES TOPOGRAFIA DE TRAMO 61 BASE

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0745-2024.-2024 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

CONS: CONSORCIO SAN DIEGO

COMUNA : 3
BARRIO : San Antonio

CANTIDADES DE OBRA: CARRERA 10 ENTRE CALLE 1OE- 2OE TRAMO 61 LOTE 3 CALZADA LOSAS DE CONCRETO

	COTAS BASE					COTAS EXCAVACION					DIFERENCIA					PROM	ANCHO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	AREA EN PLANTA
ABS	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ						
K0+337.9			1070.086	1070.043	1070.062			1069.906	1069.864	1069.882			0.180	0.179	0.180	0.170	3.210	0.545	2.226	2.226	13.120
K0+341.9			1070.758	1070.704	1070.664			1070.578	1070.524	1070.485			0.180	0.180	0.179	0.170	3.350	0.568	2.265	4.491	13.400
K0+345.9			1071.351	1071.345	1071.270			1071.173	1071.166	1071.092			0.178	0.179	0.178	0.168	3.350	0.564			
															ESPESOR	0.169				4.491	26.520

Firma :
Nombre : ALEXANDER AMAYA
Cargo : Topografo
Matricula : 01-14526

AREA DESCUENTOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	L*A	AREA
CAM	0		0
SUM	0		0
FUNDIDA	0		0
			0

VOLUMEN TOTAL DE BASE	4.491
AREA TOTAL	26.520
AREA CON DESCUENTO	0.000
2 LOSAS FUNDIDAS	

MEMORIA DE CANTIDADES TOPOGRAFIA DE TRAMO 61 BASE

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0745-2024.-2024 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

CONS: CONSORCIO SAN DIEGO

COMUNA : 3
BARRIO : San Antonio

CANTIDADES DE OBRA: CARRERA 10 ENTRE CALLE 1OE- 2OE TRAMO 61 LOTE 3 CALZADA LOSAS DE CONCRETO

	COTAS BASE					COTAS EXCAVACION					DIFERENCIA					PROM	ANCHO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	AREA EN PLANTA
ABS	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ						
K0+349.9			1072.083	1072.031	1072.100			1071.895	1071.875	1071.854			0.188	0.157	0.246	0.187	3.300	0.617	2.417	2.417	13.220
K0+353.9			1072.783	1072.742	1072.693			1072.594	1072.551	1072.507			0.189	0.192	0.186	0.179	3.310	0.592	2.356	4.773	13.469
K0+358.0			1073.342	1073.311	1073.304			1073.155	1073.138	1073.121			0.187	0.173	0.183	0.171	3.260	0.557	2.300	7.073	13.202
K0+362.1			1073.642	1073.622	1073.590			1073.450	1073.431	1073.411			0.192	0.192	0.179	0.178	3.180	0.564	2.151	9.224	12.850
K0+366.0			1073.703	1073.651	1073.620			1073.522	1073.490	1073.458			0.181	0.161	0.162	0.158	3.410	0.539	3.187	12.412	19.900
K0+370.0	1073.525	1073.533	1073.533	1073.483	1073.461	1073.344	1073.349	1073.354	1073.329	1073.303	0.181	0.184	0.179	0.155	0.158	0.161	6.540	1.055	4.025	16.437	25.525
K0+373.9	1073.274	1073.286	1073.294	1073.293	1073.255	1073.114	1073.124	1073.134	1073.115	1073.095	0.160	0.162	0.160	0.178	0.160	0.154	6.550	1.009			
															ESPESOR	**0.170**				**16.437**	**98.166**

Firma :
Nombre : ALEXANDER AMAYA
Cargo : Topografo
Matricula : 01-14526

AREA DESCUENTOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	L*A	AREA
CAM	2	R=0.7	3.078
SUM	0	0.88*2.00	0
FUNDIDA	0		0
			3.078

VOLUMEN TOTAL DE BASE	16.437
AREA TOTAL	98.166
AREA CON DESCUENTO	95.088
VOLUMEN DE DESCUENTO	0.000
8 LOSAS FUNDIDAS	

MEMORIA DE CANTIDADES TOPOGRAFIA DE TRAMO 61 BASE

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0745-2024.-2024 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

CONS: CONSORCIO SAN DIEGO

COMUNA : 3
BARRIO : San Antonio

CANTIDADES DE OBRA: CARRERA 10 ENTRE CALLE 1OE- 2OE TRAMO 61 LOTE 3 CALZADA LOSAS DE CONCRETO

	COTAS BASE					COTAS EXCAVACION					DIFERENCIA					PROM	ANCHO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	AREA EN PLANTA
ABS	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ						
K0+377.9	1072.291	1072.294	1072.779	1072.747	1072.708	1072.599	1072.594	1072.589	1072.559	1072.529	0.192	0.200	0.190	0.188	0.179	0.180	6.460	1.162	3.615	3.615	20.011
K0+381.0	1072.294	1072.326	1072.358	1072.305	1072.242	1072.104	1072.134	1072.163	1072.110	1072.057	0.190	0.193	0.195	0.195	0.185	0.182	6.450	1.171	4.560	8.175	26.466
K0+385.1	1071.647	1071.666	1071.676	1071.595	1071.456	1071.454	1071.486	1071.518	1071.412	1071.305	0.193	0.180	0.158	0.184	0.151	0.163	6.460	1.054	2.687	10.861	16.238
K0+387.6	1071.318	1071.280	1071.256	1071.088	1070.908	1071.133	1071.112	1071.090	1070.906	1070.721	0.185	0.168	0.166	0.183	0.187	0.168	6.530	1.096	2.773	13.634	16.150
K0+390.1	1070.954	1070.918	1070.866	1070.621	1070.354	1070.761	1070.731	1070.700	1070.431	1070.162	0.193	0.188	0.166	0.190	0.192	0.176	6.390	1.123	5.185	18.819	29.900
K0+394.7	1070.356	1070.333	1070.291	1070.125	1069.906	1070.162	1070.144	1070.126	1069.933	1069.740	0.194	0.189	0.165	0.192	0.166	0.171	6.610	1.132	4.591	23.410	26.100
K0+398.7	1070.058	1070.065	1070.025	1069.956	1069.907	1069.861	1069.861	1069.861	1069.795	1069.729	0.197	0.204	0.164	0.161	0.178	0.181	6.440	1.164	4.461	27.871	25.780
K0+402.7	1069.878	1069.853	1069.796	1069.761	1069.772	1069.694	1069.664	1069.633	1069.609	1069.584	0.184	0.190	0.163	0.153	0.188	0.165	6.450	1.067	2.491	30.363	14.847
K0+405.0	1069.794	1069.756	1069.747	1069.681	1069.646	1069.606	1069.575	1069.544	1069.514	1069.484	0.188	0.181	0.203	0.167	0.162	0.170	6.460	1.099	4.336	34.699	25.920
K0+409.0	1069.682	1069.656	1069.597	1069.579	1069.547	1069.517	1069.477	1069.436	1069.399	1069.361	0.165	0.180	0.161	0.181	0.186	0.164	6.500	1.069	3.947	38.646	24.179
K0+412.7	1069.585	1069.537	1069.488	1069.447	1069.395	1069.425	1069.373	1069.321	1069.265	1069.208	0.160	0.164	0.167	0.183	0.187	0.162	6.570	1.065	4.486	43.132	26.360
K0+416.7	1069.576	1069.502	1069.408	1069.336	1069.240	1069.391	1069.310	1069.229	1069.140	1069.051	0.185	0.192	0.179	0.196	0.189	0.178	6.610	1.178	1.499	44.631	8.528
K0+418.0	1069.550	1069.461	1069.375	1069.282	1069.212	1069.354	1069.277	1069.199	1069.111	1069.023	0.196	0.184	0.176	0.171	0.189	0.173	6.510	1.128			
															ESPESOR	0.172				44.631	260.478

Firma :
Nombre : ALEXANDER AMAYA
Cargo : Topoorafo
Matricula : 01-14526

AREA DESCUENTOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	L*A	AREA
CAM	1	R=0.7	1.54
CAJA	1	1.32*1.34	1.768
FUNDIDA	3		29.376
			32.684

VOLUMEN TOTAL DE BASE	39.584
AREA TOTAL	260.478
AREA CON DESCUENTO	227.794
VOLUMEN DE DESCUENTO	5.047
21 LOSAS FUNDIDAS	


BASE TOTAL TRAMO 61	126.882

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	VI	**CONCRETOS**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	76	**CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.**		
UNIDAD	ML			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	
TRAMO 61	1.00	151.34			151.34

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	151.34
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	151.34
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	151.34
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	151.34
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	151.34
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	151.34
TOTAL POR EJECUTAR	0.00


RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XI	DRENAJES	FECHA:	22-nov-24
ITEM	119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.		
UNIDAD	UND			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 61 - K0+261 (EJE)	1.00				1.00
TRAMO 61 - K0+314 (EJE)	1.00				1.00
TRAMO 61 - K0+317 (IZQ)	1.00				1.00
TRAMO 61 - K0+329,6 (EJE)	1.00				1.00
TRAMO 61 - K0+358 (IZQ)	1.00				1.00
TRAMO 61 - K0+364 (IZQ)	1.00				1.00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	6.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	6.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	6.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	6.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	6.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	6.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

RESIDENTE DE OBRA:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU


CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XII	**NO PREVISTOS**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	NP-1	**DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.**		
UNIDAD	M2			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**	**TOTAL**
	AREA DE DEMOLICION SEGÚN CARTERA DE CAMPO	
TRAMO 61	746.72	746.72

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	746.72
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	746.72
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	746.72
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA



FOTOGRAFIA



OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	746.72
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	746.72
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	746.72
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

MEMORIA DE CANTIDADES TOPOGRAFIA DE TRAMO 61 DEMOLICION PLACA EN CONCRETO

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0745-2024.-2024 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

CONS: CONSORCIO SAN DIEGO

COMUNA : 3
BARRIO : San Antonio

CANTIDADES DE OBRA: CARRERA 10 ENTRE CALLE 1OE- 2OE TRAMO 61 LOTE 3 CALZADA LOSAS DE CONCRETO

	COTAS INICIALES RASANTE					COTAS DE DEMOLICION PLACA EN CONCRETO					DIFERENCIA					PROM	ANCHO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	AREA EN PLANTA
ABS	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ						
K0+256.0	1067.228	1066.995	1066.762	1066.488	1066.159	1067.027	1066.794	1066.562	1066.289	1065.958	0.201	0.201	0.200	0.199	0.201	0.200	6.570	1.317	4.684	4.684	23.395
K0+259.6	1066.752	1066.753	1066.730	1066.650	1066.509	1066.551	1066.554	1066.531	1066.450	1066.308	0.201	0.199	0.199	0.200	0.201	0.200	6.320	1.264	4.852	9.536	24.238
K0+263.5	1066.733	1066.722	1066.701	1066.722	1066.736	1066.532	1066.522	1066.500	1066.522	1066.535	0.201	0.200	0.201	0.200	0.201	0.200	6.110	1.224	4.771	14.307	23.829
K0+267.4	1066.741	1066.768	1066.782	1066.717	1066.685	1066.542	1066.569	1066.581	1066.516	1066.485	0.199	0.199	0.201	0.201	0.200	0.200	6.110	1.222	5.504	19.811	27.500
K0+271.8	1066.809	1066.821	1066.811	1066.761	1066.741	1066.608	1066.621	1066.611	1066.561	1066.540	0.201	0.199	0.200	0.200	0.201	0.200	6.390	1.280	5.053	24.864	25.220
K0+275.8	1066.842	1066.877	1066.853	1066.803	1066.761	1066.641	1066.677	1066.654	1066.602	1066.560	0.201	0.200	0.199	0.201	0.201	0.200	6.220	1.246			
															ESPESOR	0.200				24.864	124.183

VOLUMEN TOTAL DE DEMOLICION	22.577
AREA TOTAL	124.183
AREA CON DESCUENTO	107.703
VOLUMEN DE DESCUENTO	2.287
9 LOSAS FUNDIDAS	

AREA DESCUENTOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	L*A	AREA
CAM	1	R=0.7	1.54
SUM	2	0.88*2.00	3.52
A. DE LOSA NO FUNDIDA	1	3.195*3.572	11.42
			16.48

Firma :
Nombre : ALEXANDER AMAYA
Cargo : Topografo
Matricula : 01-14526

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES TOPOGRAFIA DE TRAMO 61 DEMOLICION PLACA EN CONCRETO

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0745-2024.-2024 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

CONS: CONSORCIO SAN DIEGO

SAN DIEGO CONSORCIO

COMUNA : 3
BARRIO : San Antonio

CANTIDADES DE OBRA: CARRERA 10 ENTRE CALLE 1OE- 2OE TRAMO 61 LOTE 3 CALZADA LOSAS DE CONCRETO

	COTAS INICIALES RASANTE					COTAS DE DEMOLICION PLACA EN CONCRETO					DIFERENCIA					PROM	ANCHO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	AREA EN PLANTA
ABS	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ						
K0+280.0	1066.957	1066.897	1066.929	1066.872	1066.807	1066.756	1066.697	1066.731	1066.673	1066.609	0.201	0.200	0.198	0.199	0.198	0.199	6.500	1.295	5.570	5.570	27.950
K0+284.3	1067.016	1066.929	1067.006	1066.952	1066.853	1066.817	1066.728	1066.807	1066.754	1066.653	0.199	0.201	0.199	0.198	0.200	0.199	6.500	1.296	5.131	10.701	25.680
K0+288.3	1067.028	1067.044	1066.986	1066.934	1066.954	1066.828	1066.845	1066.785	1066.735	1066.752	0.200	0.199	0.201	0.199	0.202	0.200	6.340	1.269	5.119	15.820	25.600
K0+292.3	1067.087	1067.047	1067.036	1066.992	1067.009	1066.889	1066.848	1066.836	1066.792	1066.807	0.198	0.198	0.200	0.200	0.202	0.200	6.460	1.290	5.144	20.964	25.740
K0+296.3	1067.145	1067.114	1067.106	1067.069	1067.031	1066.943	1066.915	1066.907	1066.869	1066.830	0.202	0.198	0.199	0.199	0.201	0.200	6.410	1.282	5.104	26.068	25.500
K0+300.3	1067.262	1067.203	1067.121	1067.118	1067.145	1067.062	1067.001	1066.922	1066.919	1066.943	0.200	0.201	0.199	0.199	0.202	0.200	6.340	1.270	5.251	31.319	26.281
K0+304.4	1067.271	1067.252	1067.256	1067.189	1067.155	1067.072	1067.053	1067.057	1066.988	1066.956	0.199	0.198	0.199	0.201	0.199	0.199	6.480	1.291	4.786	36.104	24.013
K0+308.1	1067.397	1067.317	1067.258	1067.274	1067.161	1067.198	1067.116	1067.059	1067.074	1066.963	0.199	0.200	0.199	0.200	0.198	0.199	6.500	1.295	1.677	37.781	8.398
K0+309.4	1067.407	1067.329	1067.300	1067.166	1067.054	1067.207	1067.128	1067.101	1066.965	1066.855	0.200	0.201	0.199	0.201	0.199	0.200	6.420	1.284	5.990	43.771	30.010
K0+314.1	1067.544	1067.456	1067.410	1067.266	1067.011	1067.346	1067.254	1067.212	1067.066	1066.812	0.198	0.201	0.198	0.199	0.199	0.199	6.350	1.265	4.232	48.003	21.235
K0+317.4	1067.649	1067.610	1067.563	1067.384	1067.193	1067.447	1067.410	1067.365	1067.184	1066.995	0.202	0.199	0.198	0.199	0.198	0.199	6.520	1.300	5.188	53.192	26.000
K0+321.4	1067.981	1067.878	1067.815	1067.772	1067.654	1067.780	1067.679	1067.614	1067.573	1067.455	0.201	0.199	0.201	0.198	0.199	0.200	6.480	1.294	5.255	58.447	26.343
K0+325.5	1068.346	1068.273	1068.255	1068.224	1068.228	1068.147	1068.074	1068.055	1068.024	1068.029	0.199	0.199	0.200	0.199	0.199	0.199	6.370	1.270	4.919	63.366	24.687
K0+329.4	1068.911	1068.883	1068.890	1068.831	1068.860	1068.712	1068.684	1068.691	1068.630	1068.661	0.199	0.198	0.199	0.200	0.199	0.199	6.290	1.253	4.297	67.663	21.551
K0+334.0	1069.557	1069.519	1069.491	1069.443	1069.437	1069.359	1069.318	1069.292	1069.242	1069.237	0.198	0.201	0.199	0.201	0.200	0.200	3.080	0.615			
															ESPESOR	0.200				67.663	338.988

Firma :
Nombre : ALEXANDER AMAYA
Cargo : Topografo
Matricula : 01-14526

AREA DESCUENTOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	L*A	AREA
CAM	3	R=0.7	4.62
SUM	0	0.88*2.00	0
FUNDIDA	4		44.749
			49.369

VOLUMEN TOTAL DE EXCAVACION	**58.731**
AREA TOTAL	338.988
AREA CON DESCUENTO	**289.619**
VOLUMEN DE DESCUENTO	8.932
24 LOSAS FUNDIDAS	

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES TOPOGRAFIA DE TRAMO 61 DEMOLICION PLACA EN CONCRETO

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0745-2024.-2024 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

CONS: CONSORCIO SAN DIEGO

SAN DIEGO CONSORCIO

COMUNA : 3
BARRIO : San Antonio

CANTIDADES DE OBRA: CARRERA 10 ENTRE CALLE 1OE- 2OE TRAMO 61 LOTE 3 CALZADA LOSAS DE CONCRETO

	COTAS INICIALES RASANTE					COTAS DE DEMOLICION PLACA EN CONCRETO					DIFERENCIA					PROM	ANCHO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	AREA EN PLANTA
ABS	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ						
K0+337.9			1070.089	1070.046	1070.063			1069.888	1069.848	1069.864			0.201	0.198	0.199	0.199	3.210	0.640	2.622	2.622	13.120
K0+341.9			1070.759	1070.705	1070.667			1070.558	1070.507	1070.465			0.201	0.198	0.202	0.200	3.350	0.671	2.678	5.300	13.400
K0+345.9			1071.355	1071.349	1071.275			1071.157	1071.148	1071.076			0.198	0.201	0.199	0.199	3.350	0.668			
															ESPESOR	0.200				5.300	26.520

Firma :
Nombre : ALEXANDER AMAYA
Cargo : Topografo
Matricula : 01-14526

AREA DESCUENTOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	L*A	AREA
CAM	0		0
SUM	0		0
FUNDIDA	0		0
			0

VOLUMEN TOTAL DE EXCAVACION	5.300
AREA TOTAL	26.520
AREA CON DESCUENTO	26.520
2 LOSAS FUNDIDAS	

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES TOPOGRAFIA DE TRAMO 61 DEMOLICION PLACA EN CONCRETO

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0745-2024.-2024 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

CONS: CONSORCIO SAN DIEGO

SAN DIEGO CONSORCIO

COMUNA : 3
BARRIO : San Antonio

CANTIDADES DE OBRA: CARRERA 10 ENTRE CALLE 1OE- 2OE TRAMO 61 LOTE 3 CALZADA LOSAS DE CONCRETO

	COTAS INICIALES RASANTE					COTAS DE DEMOLICION PLACA EN CONCRETO					DIFERENCIA					PROM	ANCHO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	AREA EN PLANTA
ABS	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ						
K0+349.9			1072.087	1072.035	1072.104			1071.885	1071.834	1071.903			0.202	0.201	0.201	0.201	3.300	0.664	2.651	2.651	13.220
K0+353.9			1072.787	1072.746	1072.697			1072.589	1072.547	1072.495			0.198	0.199	0.202	0.200	3.310	0.661	2.691	5.342	13.469
K0+358.0			1073.346	1073.315	1073.308			1073.146	1073.116	1073.107			0.200	0.199	0.201	0.200	3.260	0.652	2.643	7.985	13.202
K0+362.1			1073.646	1073.626	1073.594			1073.445	1073.427	1073.393			0.201	0.199	0.201	0.200	3.180	0.637	2.566	10.550	12.850
K0+366.0			1073.707	1073.655	1073.624			1073.509	1073.457	1073.423			0.198	0.198	0.201	0.199	3.410	0.679	3.989	14.539	19.900
K0+370.0	1073.529	1073.537	1073.537	1073.487	1073.465	1073.328	1073.335	1073.335	1073.287	1073.264	0.201	0.202	0.202	0.200	0.201	0.201	6.540	1.316	5.115	19.654	25.525
K0+373.9	1073.278	1073.290	1073.298	1073.297	1073.259	1073.076	1073.092	1073.099	1073.098	1073.059	0.202	0.198	0.199	0.199	0.200	0.200	6.550	1.307			
															ESPESOR	0.200				19.654	98.166

Firma :
Nombre : ALEXANDER AMAYA
Cargo : Topografo
Matricula : 01-14526

AREA DESCUENTOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	L*A	AREA
CAM	2	R=0.7	3.078
SUM	0	0.88*2.00	0
FUNDIDA	0		0
			3.078

VOLUMEN TOTAL DE EXCAVACION	19.654
AREA TOTAL	98.166
AREA CON DESCUENTO	95.088
VOLUMEN DE DESCUENTO	0.000
8 LOSAS FUNDIDAS	

MEMORIA DE CANTIDADES TOPOGRAFIA DE TRAMO 61 DEMOLICION PLACA EN CONCRETO

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0745-2024.-2024 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

CONS: CONSORCIO SAN DIEGO

COMUNA : 3
BARRIO : San Antonio

CANTIDADES DE OBRA: CARRERA 10 ENTRE CALLE 1OE- 2OE TRAMO 61 LOTE 3 CALZADA LOSAS DE CONCRETO

	COTAS INICIALES RASANTE					COTAS DE DEMOLICION PLACA EN CONCRETO					DIFERENCIA					PROM	ANCHO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	AREA EN PLANTA
ABS	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ						
K0+377.9	1072.794	1072.797	1072.782	1072.750	1072.711	1072.593	1072.595	1072.581	1072.550	1072.513	0.201	0.202	0.201	0.200	0.198	0.200	6.460	1.295	4.012	4.012	20.011
K0+381.0	1072.297	1072.329	1072.361	1072.308	1072.245	1072.095	1072.127	1072.160	1072.108	1072.047	0.202	0.202	0.201	0.200	0.198	0.201	6.450	1.294	5.306	9.318	26.466
K0+385.1	1071.650	1071.669	1071.679	1071.598	1071.459	1071.452	1071.468	1071.478	1071.397	1071.258	0.198	0.201	0.201	0.201	0.201	0.200	6.460	1.295	3.244	12.563	16.238
K0+387.6	1071.321	1071.283	1071.259	1071.091	1070.911	1071.123	1071.083	1071.058	1070.892	1070.713	0.198	0.200	0.201	0.199	0.198	0.199	6.530	1.301	3.227	15.789	16.150
K0+390.1	1070.957	1070.921	1070.869	1070.624	1070.357	1070.758	1070.720	1070.668	1070.424	1070.156	0.199	0.201	0.201	0.200	0.201	0.200	6.390	1.281	5.980	21.769	29.900
K0+394.7	1070.359	1070.336	1070.294	1070.128	1069.909	1070.159	1070.138	1070.093	1069.929	1069.709	0.200	0.198	0.201	0.199	0.200	0.200	6.610	1.319	5.225	26.994	26.100
K0+398.7	1070.061	1070.068	1070.028	1069.959	1069.910	1069.860	1069.867	1069.827	1069.758	1069.710	0.201	0.201	0.201	0.201	0.200	0.201	6.440	1.293	5.177	32.171	25.780
K0+402.7	1069.881	1069.856	1069.799	1069.764	1069.775	1069.680	1069.655	1069.599	1069.563	1069.574	0.201	0.201	0.200	0.201	0.201	0.201	6.450	1.295	2.975	35.146	14.847
K0+405.0	1069.797	1069.759	1069.750	1069.684	1069.649	1069.599	1069.558	1069.551	1069.483	1069.448	0.198	0.201	0.199	0.201	0.201	0.200	6.460	1.292	5.179	40.325	25.920
K0+409.0	1069.685	1069.659	1069.600	1069.582	1069.550	1069.486	1069.458	1069.402	1069.381	1069.351	0.199	0.201	0.198	0.201	0.199	0.200	6.500	1.297	4.819	45.144	24.179
K0+412.7	1069.588	1069.540	1069.491	1069.450	1069.398	1069.389	1069.341	1069.293	1069.251	1069.198	0.199	0.199	0.198	0.199	0.200	0.199	6.570	1.307	5.256	50.400	26.360
K0+416.7	1069.579	1069.505	1069.411	1069.339	1069.243	1069.377	1069.306	1069.213	1069.138	1069.044	0.202	0.199	0.198	0.201	0.199	0.200	6.610	1.321	1.707	52.107	8.528
K0+418.0	1069.553	1069.464	1069.378	1069.285	1069.215	1069.351	1069.265	1069.178	1069.084	1069.014	0.202	0.199	0.200	0.201	0.201	0.201	6.510	1.306			
															ESPESOR	0.200				52.107	260.478

Firma :
Nombre : ALEXANDER AMAYA
Cargo : Topografo
Matricula : 01-14526

AREA DESCUENTOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	L*A	AREA
CAM	1	R=0.7	1.54
CAJA	1	1.32*1.34	1.768
FUNDIDA	3		29.376
			32.684

VOLUMEN TOTAL DE EXCAVACION	46.229
AREA TOTAL	260.478
AREA CON DESCUENTO	227.794
VOLUMEN DE DESCUENTO	5.878
21 LOSAS FUNDIDAS	


VOLUMEN DE EXCAVACION TOTAL TRAMO 61	152.491
AREA DE EXCAVACION TOTAL TRAMO 61	746.723

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XII	**NO PREVISTOS**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	NP-2	**CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.**		
UNIDAD	ML			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 61	1.00	457.2			457.20

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	457.20
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	457.20
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	457.20
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	457.20
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	457.20
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	457.20
TOTAL POR EJECUTAR	0.00


RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XII	**NO PREVISTOS**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	NP-3	**CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.**		
UNIDAD	M3			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**		**TOTAL**
	VOLUMEN SEGÚN CARTERA DE CAMPO	**PORCENTAJE A COBRAR EN PRESENTE ACTA**	
TRAMO 61	154.11	**70%**	107.88

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	107.88
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	154.11
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	107.88
TOTAL POR EJECUTAR	46.23

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	107.88
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	154.11
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	107.88
TOTAL POR EJECUTAR	46.23

RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES TOPOGRAFIA DE TRAMO 61 CONCRETO

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0745-2024.-2024 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

CONS: CONSORCIO SAN DIEGO

SAN DIEGO CONSORCIO

COMUNA : 3
BARRIO : San Antonio

CANTIDADES DE OBRA: CARRERA 10 ENTRE CALLE 1OE- 2OE TRAMO 61 LOTE 3 CALZADA LOSAS DE CONCRETO

	COTAS FINALES CONCRETO					COTAS DE SUB-BASE					DIFERENCIA					PROM	ANCHO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	AREA EN PLANTA
ABS	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ						
K0+256.0	1067.228	1066.995	1066.762	1066.488	1066.159	1067.027	1066.794	1066.562	1066.289	1065.958	0.201	0.201	0.200	0.199	0.201	0.200	6.570	1.317	4.684	4.684	23.395
K0+259.6	1066.752	1066.753	1066.730	1066.650	1066.509	1066.551	1066.554	1066.531	1066.450	1066.308	0.201	0.199	0.199	0.200	0.201	0.200	6.320	1.264	4.852	9.536	24.238
K0+263.5	1066.733	1066.722	1066.701	1066.722	1066.736	1066.532	1066.522	1066.500	1066.522	1066.535	0.201	0.200	0.201	0.200	0.201	0.200	6.110	1.224	4.771	14.307	23.829
K0+267.4	1066.741	1066.768	1066.782	1066.717	1066.685	1066.542	1066.569	1066.581	1066.516	1066.485	0.199	0.199	0.201	0.201	0.200	0.200	6.110	1.222	5.504	19.811	27.500
K0+271.8	1066.809	1066.821	1066.811	1066.761	1066.741	1066.608	1066.621	1066.611	1066.561	1066.540	0.201	0.199	0.200	0.200	0.201	0.200	6.390	1.280	5.053	24.864	25.220
K0+275.8	1066.842	1066.877	1066.853	1066.803	1066.761	1066.641	1066.677	1066.654	1066.602	1066.560	0.201	0.200	0.199	0.201	0.201	0.200	6.220	1.246			
															ESPESOR	0.200				24.864	124.183

Firma :
Nombre : ALEXANDER AMAYA
Cargo : Topografo
Matricula : 01-14526

AREA DESCUENTOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	L*A	AREA
CAM	1	R=0.7	1.54
SUM	2	0.88*2.00	3.52
A. DE LOSA NO FUNDIDA	1	3.195*3.572	11.42
			16.48

VOLUMEN TOTAL DE DEMOLICION	22.577
AREA TOTAL	124.183
AREA CON DESCUENTO	**107.703**
VOLUMEN DE DESCUENTO	2.287
9 LOSAS FUNDIDAS	

MEMORIA DE CANTIDADES TOPOGRAFIA DE TRAMO 61 CONCRETO

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0745-2024.-2024 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

CONS: CONSORCIO SAN DIEGO

COMUNA : 3
BARRIO : San Antonio

CANTIDADES DE OBRA: CARRERA 10 ENTRE CALLE 1OE- 2OE TRAMO 61 LOTE 3 CALZADA LOSAS DE CONCRETO

	COTAS FINALES CONCRETO					COTAS DE SUB-BASE					DIFERENCIA					PROM	ANCHO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	AREA EN PLANTA
ABS	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ						
K0+280.0	1066.957	1066.897	1066.929	1066.872	1066.807	1066.756	1066.697	1066.731	1066.673	1066.609	0.201	0.200	0.198	0.199	0.198	0.199	6.500	1.295	5.570	5.570	27.950
K0+284.3	1067.016	1066.929	1067.006	1066.952	1066.853	1066.817	1066.728	1066.807	1066.754	1066.653	0.199	0.201	0.199	0.198	0.200	0.199	6.500	1.296	5.131	10.701	25.680
K0+288.3	1067.028	1067.044	1066.986	1066.934	1066.954	1066.828	1066.845	1066.785	1066.735	1066.752	0.200	0.199	0.201	0.199	0.202	0.200	6.340	1.269	5.119	15.820	25.600
K0+292.3	1067.087	1067.047	1067.036	1066.992	1067.009	1066.889	1066.848	1066.836	1066.792	1066.807	0.198	0.198	0.200	0.200	0.202	0.200	6.460	1.290	5.144	20.964	25.740
K0+296.3	1067.145	1067.114	1067.106	1067.069	1067.031	1066.943	1066.915	1066.907	1066.869	1066.830	0.202	0.198	0.199	0.199	0.201	0.200	6.410	1.282	5.104	26.068	25.500
K0+300.3	1067.262	1067.203	1067.121	1067.118	1067.145	1067.062	1067.001	1066.922	1066.919	1066.943	0.200	0.201	0.199	0.199	0.202	0.200	6.340	1.270	5.251	31.319	26.281
K0+304.4	1067.271	1067.252	1067.256	1067.189	1067.155	1067.072	1067.053	1067.057	1066.988	1066.956	0.199	0.198	0.199	0.201	0.199	0.199	6.480	1.291	4.786	36.104	24.013
K0+308.1	1067.397	1067.317	1067.258	1067.274	1067.161	1067.198	1067.116	1067.059	1067.074	1066.963	0.199	0.200	0.199	0.200	0.198	0.199	6.500	1.295	1.677	37.781	8.398
K0+309.4	1067.407	1067.329	1067.300	1067.166	1067.054	1067.207	1067.128	1067.101	1066.965	1066.855	0.200	0.201	0.199	0.201	0.199	0.200	6.420	1.284	5.990	43.771	30.010
K0+314.1	1067.544	1067.456	1067.410	1067.266	1067.011	1067.346	1067.254	1067.212	1067.066	1066.812	0.198	0.201	0.198	0.199	0.199	0.199	6.350	1.265	4.232	48.003	21.235
K0+317.4	1067.649	1067.610	1067.563	1067.384	1067.193	1067.447	1067.410	1067.365	1067.184	1066.995	0.202	0.199	0.198	0.199	0.198	0.199	6.520	1.300	5.188	53.192	26.000
K0+321.4	1067.981	1067.878	1067.815	1067.772	1067.654	1067.780	1067.629	1067.614	1067.573	1067.455	0.201	0.199	0.201	0.198	0.199	0.200	6.480	1.294	5.255	58.447	26.343
K0+325.5	1068.346	1068.273	1068.255	1068.224	1068.228	1068.147	1068.074	1068.055	1068.024	1068.029	0.199	0.199	0.200	0.199	0.199	0.199	6.370	1.270	4.919	63.366	24.687
K0+329.4	1068.911	1068.883	1068.890	1068.831	1068.860	1068.712	1068.684	1068.691	1068.630	1068.661	0.199	0.198	0.199	0.200	0.199	0.199	6.290	1.253	4.297	67.663	21.551
K0+334.0	1069.557	1069.519	1069.491	1069.443	1069.437	1069.359	1069.318	1069.292	1069.242	1069.237	0.198	0.201	0.199	0.201	0.200	0.200	3.080	0.615			
															ESPESOR	0.200				67.663	338.988

Firma :
Nombre : ALEXANDER AMAYA
Cargo : Topografo
Matricula : 01-14526

AREA DESCUENTOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	L*A	AREA
CAM	3	R=0.7	4.62
SUM	0	0.88*2.00	0
FUNDIDA	4		44.749
			49.369

VOLUMEN TOTAL DE EXCAVACION	**58.731**
AREA TOTAL	338.988
AREA CON DESCUENTO	**289.619**
VOLUMEN DE DESCUENTO	8.932
24 LOSAS FUNDIDAS	

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES TOPOGRAFIA DE TRAMO 61 CONCRETO

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0745-2024.-2024 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

CONS: CONSORCIO SAN DIEGO

SAN DIEGO CONSORCIO

COMUNA : 3
BARRIO : San Antonio

CANTIDADES DE OBRA: CARRERA 10 ENTRE CALLE 1OE- 2OE TRAMO 61 LOTE 3 CALZADA LOSAS DE CONCRETO

	COTAS FINALES CONCRETO					COTAS DE SUB-BASE					DIFERENCIA					PROM	ANCHO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	AREA EN PLANTA
ABS	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ						
K0+337.9			1070.089	1070.046	1070.063			1069.888	1069.848	1069.864			0.201	0.198	0.199	0.199	3.210	0.640	2.622	2.622	13.120
K0+341.9			1070.759	1070.705	1070.667			1070.558	1070.507	1070.465			0.201	0.198	0.202	0.200	3.350	0.671	2.678	5.300	13.400
K0+345.9			1071.355	1071.349	1071.275			1071.157	1071.148	1071.076			0.198	0.201	0.199	0.199	3.350	0.668			
															ESPESOR	0.200				5.300	26.520

Firma :
Nombre : ALEXANDER AMAYA
Cargo : Topografo
Matricula : 01-14526

AREA DESCUENTOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	L*A	AREA
CAM	0		0
SUM	0		0
FUNDIDA	0		0
			0

VOLUMEN TOTAL DE EXCAVACION	5.300
AREA TOTAL	26.520
AREA CON DESCUENTO	0.000
2 LOSAS FUNDIDAS	

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES TOPOGRAFIA DE TRAMO 61 CONCRETO

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0745-2024.-2024 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

CONS: CONSORCIO SAN DIEGO

SAN DIEGO CONSORCIO

COMUNA : 3
BARRIO : San Antonio

CANTIDADES DE OBRA: CARRERA 10 ENTRE CALLE 1OE- 2OE TRAMO 61 LOTE 3 CALZADA LOSAS DE CONCRETO

	COTAS FINALES CONCRETO					COTAS DE SUB-BASE					DIFERENCIA					PROM	ANCHO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	AREA EN PLANTA
ABS	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ						
K0+349.9			1072.087	1072.035	1072.104			1071.885	1071.834	1071.903			0.202	0.201	0.201	0.201	3.300	0.664	2.651	2.651	13.220
K0+353.9			1072.787	1072.746	1072.697			1072.589	1072.547	1072.495			0.198	0.199	0.202	0.200	3.310	0.661	2.691	5.342	13.469
K0+358.0			1073.346	1073.315	1073.308			1073.146	1073.116	1073.107			0.200	0.199	0.201	0.200	3.260	0.652	2.643	7.985	13.202
K0+362.1			1073.646	1073.626	1073.594			1073.445	1073.427	1073.393			0.201	0.199	0.201	0.200	3.180	0.637	2.566	10.550	12.850
K0+366.0			1073.707	1073.655	1073.624			1073.509	1073.457	1073.423			0.198	0.198	0.201	0.199	3.410	0.679	3.989	14.539	19.900
K0+370.0	1073.529	1073.537	1073.537	1073.487	1073.465	1073.328	1073.335	1073.335	1073.287	1073.264	0.201	0.202	0.202	0.200	0.201	0.201	6.540	1.316	5.115	19.654	25.525
K0+373.9	1073.278	1073.290	1073.298	1073.297	1073.259	1073.076	1073.092	1073.099	1073.098	1073.059	0.202	0.198	0.199	0.199	0.200	0.200	6.550	1.307			
															ESPESOR	0.200				19.654	98.166

Firma :
Nombre : ALEXANDER AMAYA
Cargo : Topografo
Matricula : 01-14526

AREA DESCUENTOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	L*A	AREA
CAM	2	R=0.7	3.078
SUM	0	0.88*2.00	0
FUNDIDA	0		0
			3.078

VOLUMEN TOTAL DE EXCAVACION	19.654
AREA TOTAL	98.166
AREA CON DESCUENTO	95.088
VOLUMEN DE DESCUENTO	0.000
8 LOSAS FUNDIDAS	

MEMORIA DE CANTIDADES TOPOGRAFIA DE TRAMO 61 CONCRETO

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0745-2024.-2024 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

CONS: CONSORCIO SAN DIEGO

COMUNA : 3
BARRIO : San Antonio

CANTIDADES DE OBRA: CARRERA 10 ENTRE CALLE 1OE- 2OE TRAMO 61 LOTE 3 CALZADA LOSAS DE CONCRETO

	COTAS FINALES CONCRETO					COTAS DE SUB-BASE					DIFERENCIA					PROM	ANCHO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	AREA EN PLANTA
ABS	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ						
K0+377.9	1072.794	1072.797	1072.782	1072.750	1072.711	1072.586	1072.588	1072.574	1072.543	1072.506	0.208	0.209	0.208	0.207	0.205	0.207	6.460	1.340	4.152	4.152	20.011
K0+381.0	1072.297	1072.329	1072.361	1072.308	1072.245	1072.088	1072.120	1072.153	1072.101	1072.040	0.209	0.209	0.208	0.207	0.205	0.208	6.450	1.339	5.492	9.644	26.466
K0+385.1	1071.650	1071.669	1071.679	1071.598	1071.459	1071.445	1071.461	1071.471	1071.390	1071.251	0.205	0.208	0.208	0.208	0.208	0.207	6.460	1.340	3.358	13.002	16.238
K0+387.6	1071.321	1071.283	1071.259	1071.091	1070.911	1071.116	1071.076	1071.051	1070.885	1070.706	0.205	0.207	0.208	0.206	0.205	0.206	6.530	1.346	3.340	16.341	16.150
K0+390.1	1070.957	1070.921	1070.869	1070.624	1070.357	1070.751	1070.713	1070.661	1070.417	1070.149	0.206	0.208	0.208	0.207	0.208	0.207	6.390	1.325	6.189	22.530	29.900
K0+394.7	1070.359	1070.336	1070.294	1070.128	1069.909	1070.152	1070.131	1070.086	1069.922	1069.702	0.207	0.205	0.208	0.206	0.207	0.207	6.610	1.366	5.408	27.938	26.100
K0+398.7	1070.061	1070.068	1070.028	1069.959	1069.910	1069.853	1069.860	1069.820	1069.751	1069.703	0.208	0.208	0.208	0.208	0.207	0.208	6.440	1.338	5.357	33.295	25.780
K0+402.7	1069.881	1069.856	1069.799	1069.764	1069.775	1069.673	1069.648	1069.592	1069.556	1069.567	0.208	0.208	0.207	0.208	0.208	0.208	6.450	1.340	3.079	36.374	14.847
K0+405.0	1069.797	1069.759	1069.750	1069.684	1069.649	1069.592	1069.551	1069.544	1069.476	1069.441	0.205	0.208	0.206	0.208	0.208	0.207	6.460	1.337	5.360	41.735	25.920
K0+409.0	1069.685	1069.659	1069.600	1069.582	1069.550	1069.479	1069.451	1069.395	1069.374	1069.344	0.206	0.208	0.205	0.208	0.206	0.207	6.500	1.343	4.988	46.723	24.179
K0+412.7	1069.588	1069.540	1069.491	1069.450	1069.398	1069.382	1069.334	1069.286	1069.244	1069.191	0.206	0.206	0.205	0.206	0.207	0.206	6.570	1.353	5.441	52.164	26.360
K0+416.7	1069.579	1069.505	1069.411	1069.339	1069.243	1069.370	1069.299	1069.206	1069.131	1069.037	0.209	0.206	0.205	0.208	0.206	0.207	6.610	1.367	1.767	53.931	8.528
K0+418.0	1069.553	1069.464	1069.378	1069.285	1069.215	1069.344	1069.258	1069.171	1069.077	1069.007	0.209	0.206	0.207	0.208	0.208	0.208	6.510	1.351			
															ESPESOR	0.207				53.931	260.478

Firma :
Nombre : ALEXANDER AMAYA
Cargo : Topografo
Matricula : 01-14526

AREA DESCUENTOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	L*A	AREA
CAM	1	R=0.7	1.54
CAJA	1	1.32*1.34	1.768
FUNDIDA	3		29.376
			32.684

VOLUMEN TOTAL DE EXCAVACION	47.847	
AREA TOTAL	260.478	
AREA CON DESCUENTO	227.794	746.723
VOLUMEN DE DESCUENTO	6.084	906.931
21 LOSAS FUNDIDAS		

EXCAVACION TOTAL TRAMO 61	154.109


CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XII	NO PREVISTOS	FECHA:	22-nov-24
ITEM	NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.		
UNIDAD	KG			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	REFUERZO LOSAS DE CONCRETO		REFUERZO SARDINEL		
	CANTIDAD DE ELEMENTOS	CANTIDAD POR ELEMENTO	LONGITUD	PESO POR ML	
TRAMO 61 - PASAJUNTAS LOSAS DE CONCRETO PASADORES 1 1/4"	55.00	10.00	0.35	6.40	1,232.00
TRAMO 61 - PASAJUNTAS LOSAS DE CONCRETO CANASTILLA 3/8"	55.00	4.00	3	0.56	367.62
TRAMO 61 - PASAJUNTAS LOSAS DE CONCRETO GANCHOS CANASTILLA 1/4"	55.00	22.00	0.15	0.25	45.38
TRAMO 61 - PASAJUNTAS LOSAS DE CONCRETO ATIESADORES 1/4"	55.00	8.00	0.45	0.25	49.50
TRAMO 61 - SARDINEL (ML) REFUERZO LONGITUDINAL 3/8"	151.34	0.30	0.30	0.56	7.63
TRAMO 61 - SARDINEL (ML) REF. TRANSVERSAL (GANCHOS) 3/8"	151.34	1.00	1.00	0.56	84.75
TRAMO 61 - MURO DE CONTENCION ESTRIBOS D= 3/8"	81.00	2.60	0.56		117.94
TRAMO 61 - MURO DE CONTENCION REFUERZO LONGITUDINAL D= 3/8"	10.00	20.00	0.56		112.00
TRAMO 61 - SARDINEL REFUERZO LONGITUDINAL D= 3/8"	79.00	0.60	0.56		26.54
TRAMO 61 - SARDINEL ESTRIBOS D=3/8	2.00	15.40	0.56		17.25
TRAMO 61 - CUNETA ENTRE CALLE 9N Y CALLE 10N	1.00	27.00	5.1		137.70

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	2,198.31
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	1,786.88
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	2,198.31
TOTAL POR EJECUTAR	-411.43

ESQUEMA



FOTOGRAFIA



OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	2,198.31
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	1,786.88
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	2,198.31
TOTAL POR EJECUTAR	-411.43


RESIDENTE DE OBRA:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XII	**NO PREVISTOS**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	NP-5	**REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).**		
UNIDAD	UND			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	
TRAMO 61 - K0+260 (IZQ)	1.00				1.00
TRAMO 61 - K0+260 (DER)	1.00				1.00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	2.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	2.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	2.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	2.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	2.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	2.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00


RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XII	**NO PREVISTOS**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	NP-7	**EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)**		
UNIDAD	M3			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**	**TOTAL**
	VOLUMEN SEGÚN CARTERA DE CAMPO	
TRAMO 61	144.56	144.56

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	144.56
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	144.56
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	144.56
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	144.56
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	144.56
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	144.56
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

MEMORIA DE CANTIDADES TOPOGRAFIA DE TRAMO 61 EXCAVACION

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0745-2024.-2024 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

CONS: CONSORCIO SAN DIEGO

COMUNA : 3
BARRIO : San Antonio

CANTIDADES DE OBRA: CARRERA 10 ENTRE CALLE 1OE- 2OE TRAMO 61 LOTE 3 CALZADA LOSAS DE CONCRETO

	COTAS SUB-BASE EXISTENTE					COTAS EXCAVACION TEORICA					DIFERENCIA					PROM	ANCHO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	AREA EN PLANTA
ABS	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ						
K0+256.0	1067.027	1066.794	1066.562	1066.289	1065.958	1066.845	1066.614	1066.382	1066.109	1065.777	0.182	0.180	0.180	0.180	0.181	0.181	6.570	1.187	4.225	4.225	23.395
K0+259.6	1066.551	1066.554	1066.531	1066.450	1066.308	1066.371	1066.374	1066.352	1066.268	1066.126	0.180	0.180	0.179	0.182	0.182	0.181	6.320	1.141	4.375	8.600	24.238
K0+263.5	1066.532	1066.522	1066.500	1066.522	1066.535	1066.352	1066.342	1066.318	1066.342	1066.355	0.180	0.180	0.182	0.180	0.180	0.180	6.110	1.102	4.299	12.899	23.829
K0+267.4	1066.542	1066.569	1066.581	1066.516	1066.485	1066.362	1066.389	1066.401	1066.336	1066.303	0.180	0.180	0.180	0.180	0.182	0.180	6.110	1.102	4.953	17.852	27.500
K0+271.8	1066.608	1066.621	1066.611	1066.561	1066.540	1066.428	1066.442	1066.432	1066.382	1066.358	0.180	0.179	0.179	0.179	0.182	0.180	6.390	1.149	4.644	22.496	25.220
K0+275.8	1066.641	1066.677	1066.654	1066.602	1066.560	1066.420	1066.497	1066.475	1066.420	1066.379	0.221	0.180	0.179	0.182	0.181	0.189	6.220	1.173			
															ESPESOR	0.182				22.496	124.183

VOLUMEN TOTAL DE EXCAVACION	20.420
AREA TOTAL	124.183
AREA CON DESCUENTO	107.703
VOLUMEN DE DESCUENTO	2.075
9 LOSAS FUNDIDAS	

Firma :
Nombre : ALEXANDER AMAYA
Cargo : Topografo
Matricula : 01-14526

AREA DESCUENTOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	L*A	AREA
CAM	1	R=0.7	1.54
SUM	2	0.88*2.00	3.52
A. DE LOSA NO FUNDIDA	1	3.195*3.572	11.42
			16.48

MEMORIA DE CANTIDADES TOPOGRAFIA DE TRAMO 61 EXCAVACION

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0745-2024.-2024 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

CONS: CONSORCIO SAN DIEGO

COMUNA : 3
BARRIO : San Antonio

CANTIDADES DE OBRA: CARRERA 10 ENTRE CALLE 1OE- 2OE TRAMO 61 LOTE 3 CALZADA LOSAS DE CONCRETO

	COTAS SUB-BASE EXISTENTE					COTAS EXCAVACION TEORICA					DIFERENCIA					PROM	ANCHO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	AREA EN PLANTA
ABS	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ						
K0+280.0	1066.756	1066.697	1066.731	1066.673	1066.609	1066.555	1066.497	1066.532	1066.474	1066.408	0.201	0.200	0.199	0.199	0.201	0.200	6.500	1.300	5.593	5.593	27.950
K0+284.3	1066.817	1066.728	1066.807	1066.754	1066.653	1066.616	1066.527	1066.608	1066.555	1066.452	0.201	0.201	0.199	0.199	0.201	0.200	6.500	1.301	5.139	10.731	25.680
K0+288.3	1066.828	1066.845	1066.785	1066.735	1066.752	1066.629	1066.644	1066.586	1066.534	1066.552	0.199	0.201	0.199	0.201	0.200	0.200	6.340	1.268	5.123	15.854	25.600
K0+292.3	1066.889	1066.848	1066.836	1066.792	1066.807	1066.688	1066.647	1066.636	1066.592	1066.608	0.201	0.201	0.200	0.200	0.199	0.200	6.460	1.293	5.148	21.002	25.740
K0+296.3	1066.943	1066.915	1066.907	1066.869	1066.830	1066.744	1066.715	1066.708	1066.668	1066.630	0.199	0.200	0.199	0.201	0.200	0.200	6.410	1.281	5.090	26.092	25.500
K0+300.3	1067.062	1067.001	1066.922	1066.919	1066.943	1066.862	1066.802	1066.723	1066.719	1066.744	0.200	0.199	0.199	0.200	0.199	0.199	6.340	1.264	5.248	31.340	26.281
K0+304.4	1067.072	1067.053	1067.057	1066.988	1066.956	1066.871	1066.853	1066.858	1066.789	1066.755	0.201	0.200	0.199	0.199	0.201	0.200	6.480	1.296	4.800	36.140	24.013
K0+308.1	1067.198	1067.116	1067.059	1067.074	1066.963	1066.999	1066.917	1066.858	1066.874	1066.763	0.199	0.199	0.201	0.200	0.200	0.200	6.500	1.299	1.680	37.821	8.398
K0+309.4	1067.207	1067.128	1067.101	1066.965	1066.855	1067.006	1066.929	1066.901	1066.764	1066.654	0.201	0.199	0.200	0.201	0.201	0.200	6.420	1.287	6.002	43.823	30.010
K0+314.1	1067.346	1067.254	1067.212	1067.066	1066.812	1067.147	1067.054	1067.013	1066.866	1066.612	0.199	0.200	0.199	0.200	0.200	0.200	6.350	1.267	4.236	48.059	21.235
K0+317.4	1067.447	1067.410	1067.365	1067.184	1066.995	1067.248	1067.211	1067.166	1066.983	1066.796	0.199	0.199	0.199	0.201	0.199	0.199	6.520	1.300	5.190	53.249	26.000
K0+321.4	1067.780	1067.679	1067.614	1067.573	1067.455	1067.581	1067.479	1067.415	1067.372	1067.255	0.199	0.200	0.199	0.201	0.200	0.200	6.480	1.295	5.263	58.512	26.343
K0+325.5	1068.147	1068.074	1068.055	1068.024	1068.029	1067.948	1067.875	1067.855	1067.824	1067.828	0.199	0.199	0.200	0.200	0.201	0.200	6.370	1.273	4.932	63.445	24.687
K0+329.4	1068.712	1068.684	1068.691	1068.630	1068.661	1068.513	1068.485	1068.490	1068.430	1068.461	0.199	0.199	0.201	0.200	0.200	0.200	6.290	1.257	4.306	67.750	21.551
K0+334.0	1069.359	1069.318	1069.292	1069.242	1069.237	1069.158	1069.119	1069.091	1069.043	1069.038	0.201	0.199	0.201	0.199	0.199	0.200	3.080	0.615			
															ESPESOR	0.200				67.750	338.988

Firma :
Nombre : ALEXANDER AMAYA
Cargo : Topografo
Matricula : 01-14526

AREA DESCUENTOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	L*A	AREA
CAM	3	R=0.7	4.62
SUM	0	0.88*2.00	0
FUNDIDA	4		44.749
			49.369

VOLUMEN TOTAL DE EXCAVACION	58.807
AREA TOTAL	338.988
AREA CON DESCUENTO	289.619
VOLUMEN DE DESCUENTO	8.944
24 LOSAS FUNDIDAS	

MEMORIA DE CANTIDADES TOPOGRAFIA DE TRAMO 61 EXCAVACION

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0745-2024.-2024 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

CONS: CONSORCIO SAN DIEGO

COMUNA : 3
BARRIO : San Antonio

CANTIDADES DE OBRA: CARRERA 10 ENTRE CALLE 1OE- 2OE TRAMO 61 LOTE 3 CALZADA LOSAS DE CONCRETO

	COTAS SUB-BASE EXISTENTE					COTAS EXCAVACION TEORICA					DIFERENCIA					PROM	ANCHO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	AREA EN PLANTA
ABS	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ						
K0+337.9			1070.089	1070.046	1070.063			1069.906	1069.864	1069.882			0.183	0.182	0.181	0.182	3.210	0.584	2.383	2.383	13.120
K0+341.9			1070.759	1070.705	1070.667			1070.578	1070.524	1070.485			0.181	0.181	0.182	0.181	3.350	0.607	2.439	4.822	13.400
K0+345.9			1071.355	1071.349	1071.275			1071.173	1071.166	1071.092			0.182	0.183	0.183	0.183	3.350	0.612			
															ESPESOR	0.182				4.822	26.520

Firma :
Nombre : ALEXANDER AMAYA
Cargo : Topografo
Matricula : 01-14526

AREA DESCUENTOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	L*A	AREA
CAM	0		0
SUM	0		0
FUNDIDA	0		0
			0

VOLUMEN TOTAL DE EXCAVACION	4.822
AREA TOTAL	26.520
AREA CON DESCUENTO	0.000
2 LOSAS FUNDIDAS	

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES TOPOGRAFIA DE TRAMO 61 EXCAVACION

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0745-2024.-2024 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

CONS: CONSORCIO SAN DIEGO

SAN DIEGO CONSORCIO

COMUNA : 3
BARRIO : San Antonio

CANTIDADES DE OBRA: CARRERA 10 ENTRE CALLE 1OE- 2OE TRAMO 61 LOTE 3 CALZADA LOSAS DE CONCRETO

	COTAS SUB-BASE EXISTENTE					COTAS EXCAVACION TEORICA					DIFERENCIA					PROM	ANCHO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	AREA EN PLANTA
ABS	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ						
K0+349.9			1071.885	1071.834	1072.104			1071.704	1071.652	1071.854			0.181	0.182	0.250	0.204	3.300	0.674	2.569	2.569	13.220
K0+353.9			1072.589	1072.547	1072.697			1072.408	1072.365	1072.507			0.181	0.182	0.190	0.184	3.310	0.610	2.485	5.054	13.469
K0+358.0			1073.146	1073.116	1073.308			1072.963	1072.932	1073.121			0.183	0.184	0.187	0.185	3.260	0.602	2.429	7.483	13.202
K0+362.1			1073.445	1073.427	1073.594			1073.262	1073.243	1073.411			0.183	0.184	0.183	0.183	3.180	0.583	2.320	9.804	12.850
K0+366.0			1073.509	1073.457	1073.624			1073.324	1073.274	1073.458			0.185	0.183	0.166	0.178	3.410	0.607	3.547	13.351	19.900
K0+370.0	1073.328	1073.335	1073.335	1073.287	1073.465	1073.145	1073.152	1073.152	1073.104	1073.305	0.183	0.183	0.183	0.183	0.160	0.178	6.540	1.167	4.564	17.915	25.525
K0+373.9	1073.076	1073.092	1073.099	1073.098	1073.259	1072.893	1072.908	1072.916	1072.915	1073.096	0.183	0.184	0.183	0.183	0.163	0.179	6.550	1.174			
															ESPESOR	**0.185**				**17.915**	**98.166**

Firma :
Nombre : ALEXANDER AMAYA
Cargo : Topografo
Matricula : 01-14526

AREA DESCUENTOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	L*A	AREA
CAM	2	R=0.7	3.078
SUM	0	0.88*2.00	0
FUNDIDA	0		0
			3.078

VOLUMEN TOTAL DE EXCAVACION	17.915
AREA TOTAL	98.166
AREA CON DESCUENTO	**95.088**
VOLUMEN DE DESCUENTO	0.000
8 LOSAS FUNDIDAS	

MEMORIA DE CANTIDADES TOPOGRAFIA DE TRAMO 61 EXCAVACION

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0745-2024.-2024 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

CONS: CONSORCIO SAN DIEGO

COMUNA : 3
BARRIO : San Antonio

CANTIDADES DE OBRA: CARRERA 10 ENTRE CALLE 1OE- 2OE TRAMO 61 LOTE 3 CALZADA LOSAS DE CONCRETO

	COTAS SUB-BASE EXISTENTE					COTAS EXCAVACION TEORICA					DIFERENCIA					PROM	ANCHO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	AREA EN PLANTA
ABS	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ						
K0+377.9	1072.778	1072.778	1072.765	1072.735	1072.696	1072.593	1072.595	1072.581	1072.550	1072.513	0.185	0.183	0.184	0.185	0.183	0.184	6.460	1.189	3.684	3.684	20.011
K0+381.0	1072.278	1072.312	1072.344	1072.292	1072.232	1072.095	1072.127	1072.160	1072.108	1072.047	0.183	0.185	0.184	0.184	0.185	0.184	6.450	1.188	4.875	8.559	26.466
K0+385.1	1071.635	1071.652	1071.663	1071.582	1071.442	1071.452	1071.468	1071.478	1071.397	1071.258	0.183	0.184	0.185	0.185	0.184	0.184	6.460	1.190	2.991	11.550	16.238
K0+387.6	1071.306	1071.267	1071.242	1071.077	1070.898	1071.123	1071.083	1071.058	1070.892	1070.713	0.183	0.184	0.184	0.185	0.185	0.184	6.530	1.203	2.978	14.528	16.150
K0+390.1	1070.941	1070.905	1070.854	1070.609	1070.340	1070.758	1070.720	1070.668	1070.424	1070.156	0.183	0.185	0.186	0.185	0.184	0.185	6.390	1.180	5.520	20.047	29.900
K0+394.7	1070.342	1070.322	1070.279	1070.114	1069.894	1070.159	1070.138	1070.093	1069.929	1069.709	0.183	0.184	0.186	0.185	0.185	0.185	6.610	1.220	4.813	24.860	26.100
K0+398.7	1070.043	1070.052	1070.011	1069.943	1069.894	1069.860	1069.867	1069.827	1069.758	1069.710	0.183	0.185	0.184	0.185	0.184	0.184	6.440	1.186	4.759	29.619	25.780
K0+402.7	1069.865	1069.839	1069.785	1069.748	1069.759	1069.680	1069.655	1069.599	1069.563	1069.574	0.185	0.184	0.186	0.185	0.185	0.185	6.450	1.193	2.744	32.363	14.847
K0+405.0	1069.784	1069.743	1069.735	1069.668	1069.632	1069.599	1069.558	1069.551	1069.483	1069.448	0.185	0.185	0.184	0.185	0.184	0.185	6.460	1.193	4.774	37.137	25.920
K0+409.0	1069.670	1069.642	1069.584	1069.565	1069.536	1069.486	1069.458	1069.402	1069.381	1069.351	0.184	0.184	0.182	0.184	0.185	0.184	6.500	1.195	4.444	41.582	24.179
K0+412.7	1069.574	1069.524	1069.477	1069.434	1069.382	1069.389	1069.341	1069.293	1069.251	1069.198	0.185	0.183	0.184	0.183	0.184	0.184	6.570	1.208	4.856	46.437	26.360
K0+416.7	1069.561	1069.491	1069.398	1069.322	1069.229	1069.377	1069.306	1069.213	1069.138	1069.044	0.184	0.185	0.185	0.184	0.185	0.185	6.610	1.220	1.571	48.008	8.528
K0+418.0	1069.536	1069.448	1069.362	1069.267	1069.198	1069.351	1069.265	1069.178	1069.084	1069.014	0.185	0.183	0.184	0.183	0.184	0.184					
															ESPESOR	0.184				48.008	260.478

Firma :
Nombre : ALEXANDER AMAYA
Cargo : Topografo
Matricula : 01-14526

AREA DESCUENTOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	L*A	AREA
CAM	1	R=0.7	1.54
CAJA	1	1.32*1.34	1.768
FUNDIDA	3		29.376
			32.684

VOLUMEN TOTAL DE EXCAVACION	42.595
AREA TOTAL	260.478
AREA CON DESCUENTO	227.794
VOLUMEN DE DESCUENTO	5.413
21 LOSAS FUNDIDAS	

EXCAVACION TOTAL TRAMO 61	144.559

SOPORTES PRE ACTA DE RECIBO PARCIAL No.: 02

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Alcaldia de Santiago de Cali

PRE ACTA DE RECIBIO PARCIAL TRAMO 62 (SAN ANTONIO)

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: **22 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

LOTE 03 - COMUNA 02 SEGUNDO SECTOR Y COMUNA 08

FRENTE 62 - CARRERA 10 ENTRE CALLES 1 Y 3OESTE

CONDICIONES CONTRACTUALES						**CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1**		**EJECUCIÓN**							
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				**CANTIDADES ACTUALIZADAS**		**ACTAS ANTERIORES**		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1,716.00	$ 0.00	353.01	$ 605,765.00	192.80	$ 330,845.00	160.21	$ 274,920.00	353.01	$ 605,765.00	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	377.00	$ 6,356.00	$ 2,396,212.00	261.00	$ 1,658,916.00	221.30	$ 1,406,583.00	39.70	$ 252,333.00	261.00	$ 1,658,916.00	-	$ -
Subtotal					**$ 2,396,212.00**		**$ 2,264,681.00**		**$ 1,737,428.00**		**$ 527,253.00**		**$ 2,264,681.00**		**$ -**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	115.00	$ 22,513.00	$ 2,588,995.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	120.00	$ 9,327.00	$ 1,119,240.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103,237.00	$ 0.00	14.39	$ 1,485,839.00	14.39	$ 1,485,839.00	-	$ -	14.39	$ 1,485,839.00	-	$ -
Subtotal					**$ 3,708,235.00**		**$ 1,485,839.00**		**$ 1,485,839.00**		**$ -**		**$ 1,485,839.00**		**$ -**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	23.00	$ 10,545.00	$ 242,535.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60,034.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	23.00	$ 43,679.00	$ 1,004,617.00	2.79	$ 121,864.00	-	$ -	2.79	$ 121,864.00	2.79	$ 121,864.00	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	194.30	$ 651,877.00	194.30	$ 651,877.00	-	$ -	194.30	$ 651,877.00	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2,588,680.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	115.00	$ 8,282.00	$ 952,430.00	160.21	$ 1,326,859.00	-	$ -	160.21	$ 1,326,859.00	160.21	$ 1,326,859.00	-	$ -
Subtotal					**$ 2,199,582.00**		**$ 2,100,600.00**		**$ 651,877.00**		**$ 1,448,723.00**		**$ 2,100,600.00**		**$ -**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	23.00	$ 212,313.00	$ 4,883,199.00	2.07	$ 439,488.00	2.07	$ 439,488.00	-	$ -	2.07	$ 439,488.00	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	377.00	$ 28,591.00	$ 10,778,807.00	192.80	$ 5,512,345.00	192.80	$ 5,512,345.00	-	$ -	192.80	$ 5,512,345.00	-	$ -
Subtotal					**$ 15,662,006.00**		**$ 5,951,833.00**		**$ 5,951,833.00**		**$ -**		**$ 5,951,833.00**		**$ -**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4,818.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	377.00	$ 4,652.00	$ 1,753,804.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7,184.00	$ 0.00	631.80	$ 4,538,851.00	-	$ -	631.80	$ 4,538,851.00	631.80	$ 4,538,851.00	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4,966.00	$ 0.00	385.60	$ 1,914,890.00	385.60	$ 1,914,890.00	-	$ -	385.60	$ 1,914,890.00	-	$ -
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,332,529.00	$ 0.00	13.66	$ 18,205,677.00	13.66	$ 18,205,677.00	-	$ -	13.66	$ 18,205,677.00	-	$ -
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	75.40	$ 1,371,977.00	$ 103,447,066.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,425,083.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 105,200,870.00**		**$ 24,659,418.00**		**$ 20,120,567.00**		**$ 4,538,851.00**		**$ 24,659,418.00**		**$ -**
VI	**CONCRETOS**														
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	6.50	$ 277,225.00	-	$ -	6.50	$ 277,225.00	6.50	$ 277,225.00	-	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."		**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024	
			FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ		**PERIODO PRESENTE ACTA**		
			DESDE EL:	12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 277,225.00**		**$ -**		**$ 277,225.00**		**$ 277,225.00**		**$ -**		
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**																
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	700.00	$ 3,927.00	$ 2,748,900.00	210.00	$ 824,670.00	-	$ -	210.00	$ 824,670.00	210.00	$ 824,670.00	-	$ -	
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	65.00	$ 64,328.00	$ 4,181,320.00	53.96	$ 3,471,139.00	-	$ -	53.96	$ 3,471,139.00	53.96	$ 3,471,139.00	-	$ -	
Subtotal					**$ 6,930,220.00**		**$ 4,295,809.00**		**$ -**		**$ 4,295,809.00**		**$ 4,295,809.00**		**$ -**		
XI	**DRENAJES**																
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	4.00	$ 422,631.00	$ 1,690,524.00	1.00	$ 422,631.00	-	$ -	1.00	$ 422,631.00	1.00	$ 422,631.00	-	$ -	
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	6.00	$ 1,159,538.00	$ 6,957,228.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
Subtotal					**$ 8,647,752.00**		**$ 422,631.00**		**$ -**		**$ 422,631.00**		**$ 422,631.00**		**$ -**		
XII	**NO PREVISTOS**																
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	160.21	$ 8,256,422.00	-	$ -	160.21	$ 8,256,422.00	160.21	$ 8,256,422.00	-	$ -		
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	144.29	$ 2,308,929.00	-	$ -	144.29	$ 2,308,929.00	144.29	$ 2,308,929.00	-	$ -		
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS. CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	32.12	$ 44,698,802.00	-	$ -	22.49	$ 31,297,511.00	22.49	$ 31,297,511.00	9.63	$ 13,401,291.00		
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	496.91	$ 4,093,048.00	-	$ -	496.91	$ 4,093,048.00	496.91	$ 4,093,048.00	-	$ -		
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	2.07	$ 76,950.00	-	$ -	11.92	$ 443,114.00	11.92	$ 443,114.00	- 9.85	-$ 366,164.00		
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 59,434,151.00**		**$ -**		**$ 46,399,024.00**		**$ 46,399,024.00**		**$ 13,035,127.00**		
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 144,744,877.00**		**$ 100,892,187.00**		**$ 29,947,544.00**		**$ 57,909,516.00**		**$ 87,857,060.00**		**$ 13,035,127.00**		

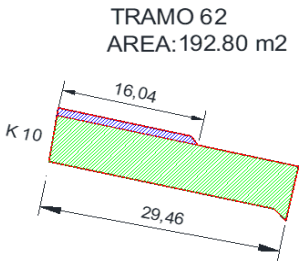
SUBTOTAL OBRAS	**$ -**	**$ -**	**$ 29,947,544.00**	**$ 57,909,516.00**	**$ 87,857,060.00**	**$ 13,035,127.00**
Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA (2,02%)	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Plan de Manejo de Transito - PMT (2,65%)	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
VALOR TOTAL	**$ -**	**$ -**	**$ 29,947,544.00**	**$ 57,909,516.00**	**$ 87,857,060.00**	**$ 13,035,127.00**

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	1	**LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).**		
UNIDAD	M2			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**	**TOTAL**
	AREA SEGÚN CARTERA DE CAMPO	
TRAMO 62	160.21	160.21

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	160.21
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	192.80
CANTIDAD CONTRACTUAL	353.01
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	353.01
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	160.21
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	192.80
CANTIDAD CONTRACTUAL	353.01
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	353.01
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

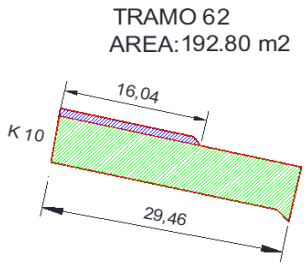
RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	II	**DEMOLICIONES**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	2	**LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).**		
UNIDAD	ML			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	
TRAMO 62	1.00	39.7			39.70

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	39.70
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	221.30
CANTIDAD CONTRACTUAL	261.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	261.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	39.70
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	221.30
CANTIDAD CONTRACTUAL	261.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	261.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

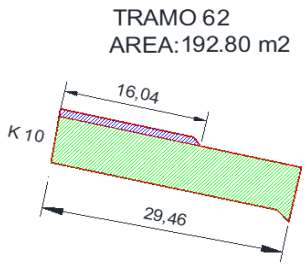
RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	19	**RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).**		
UNIDAD	M3			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	VOLUMEN TRANSPORTADO (NP-7)	**FACTOR DE EXPANSION**	**DISTANCIA PUNTO DE DISPOSICION**		
TRAMO 62	2.07	1.35			2.79

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	2.79
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	2.79
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	2.79
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	2.79
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	2.79
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	2.79
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

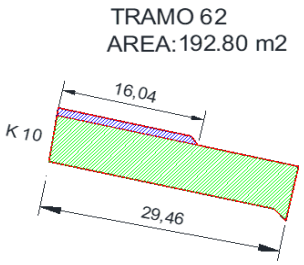
RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	26	**ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.**		
UNIDAD	M2			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**	**TOTAL**
	AREA SEGÚN CARTERA DE CAMPO	
TRAMO 62	160.21	160.21

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	160.21
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	160.21
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	160.21
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	160.21
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	160.21
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	160.21
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

MEMORIA DE CANTIDADES TOPOGRAFIA DEMOLICION PLACAS DE CONCRETO

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0745-2024.-2024 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

CONS: CONSORCIO SAN DIEGO

COMUNA : 3
BARRIO : San Antonio

CANTIDADES DE OBRA: CARRERA 10 ENTRE CALLE 10E- 20E TRAMO 62 LOTE 3 CALZADA LOSAS DE CONCRETO

	COTAS RASANTE EXISTENTE					COTAS DEMOLICION					DIFERENCIA					PROM	ANCHO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	AREA EN PLANTA
ABS	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ						
K0+113.8	1086.596	1086.599	1086.602	1086.602	1086.602	1086.394	1086.398	1086.403	1086.403	1086.403	0.202	0.201	0.199	0.199	0.199	0.200	4.580	0.916	2.131	2.131	10.672
K0+116.1	1086.620	1086.622	1086.624	1086.628	1086.632	1086.421	1086.420	1086.425	1086.429	1086.434	0.199	0.202	0.199	0.199	0.198	0.199	4.700	0.937	4.214	6.345	21.113
K0+120.4	1086.660	1086.669	1086.678	1086.684	1086.690	1086.460	1086.468	1086.476	1086.486	1086.492	0.200	0.201	0.202	0.198	0.198	0.200	5.120	1.023	3.154	9.500	15.780
K0+123.4	1086.704	1086.716	1086.728	1086.736	1086.744	1086.503	1086.517	1086.527	1086.537	1086.544	0.201	0.199	0.201	0.199	0.200	0.200	5.400	1.080	3.287	12.787	16.447
K0+126.5	1086.749	1086.768	1086.786	1086.794	1086.782	1086.550	1086.566	1086.586	1086.585	1086.583	0.199	0.201	0.200	0.199	0.199	0.200	5.385	1.075	4.023	16.810	20.130
K0+130.1	1086.796	1086.814	1086.832	1086.823	1086.814	1086.596	1086.614	1086.632	1086.622	1086.615	0.200	0.200	0.200	0.201	0.199	0.200	5.645	1.129	3.489	20.299	17.421
K0+133.1	1086.856	1086.8645	1086.873	1086.8665	1086.86	1086.655	1086.6645	1086.672	1086.664	1086.662	0.201	0.200	0.201	0.203	0.198	0.201	5.969	1.197	3.484	23.783	17.391
K0+136.1	1086.896	1086.906	1086.916	1086.909	1086.902	1086.694	1086.705	1086.717	1086.708	1086.704	0.202	0.201	0.199	0.201	0.198	0.200	5.625	1.126	3.443	27.226	17.213
K0+139.2	1086.954	1086.952	1086.95	1086.948	1086.946	1086.756	1086.751	1086.75	1086.746	1086.748	0.198	0.201	0.200	0.202	0.198	0.200	5.48	1.095	3.284	30.510	16.410
K0+142.2	1087.023	1087.0275	1087.032	1087.019	1087.006	1086.821	1086.824	1086.832	1086.82	1086.808	0.202	0.204	0.200	0.199	0.198	0.201	5.46	1.095	3.265	33.775	16.340
K0+145.2	1087.114	1087.122	1087.13	1087.107	1087.084	1086.914	1086.924	1086.931	1086.907	1086.885	0.200	0.198	0.199	0.200	0.199	0.199	5.433	1.082	3.359	37.134	16.853
K0+148.3	1087.196	1087.206	1087.216	1087.204	1087.192	1086.998	1087.006	1087.017	1087.003	1086.993	0.198	0.200	0.199	0.201	0.199	0.199	5.44	1.085	3.241	40.376	16.223
K0+151.3	1087.274	1087.289	1087.304	1087.288	1087.272	1087.071	1087.09	1087.103	1087.089	1087.073	0.203	0.199	0.201	0.199	0.199	0.200	5.375	1.076			
															ESPESOR	0.200				40.376	201.992

AREA DESCUENTOS			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**L*A**	**AREA**
CAM	2	R=0.7	3.08
SUM	1	0.60*2.17	1.3
A. DE LOSA NO FUNDIDA	7		57.6
			61.98

VOLUMEN TOTAL DE EXCAVACION	**27.986**
AREA TOTAL	201.992
AREA CON DESCUENTO	**140.012**
VOLUMEN DE DESCUENTO	12.390
17 LOSAS FUNDIDAS	

Firma :
Nombre : ALEXANDER AMAYA
Cargo : Topografo
Matricula : 01-14526

MEMORIA DE CANTIDADES TOPOGRAFIA DEMOLICION PLACAS DE CONCRETO

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0745-2024.-2024 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

CONS: CONSORCIO SAN DIEGO

COMUNA : 3
BARRIO : San Antonio

CANTIDADES DE OBRA: CARRERA 10 ENTRE CALLE 10E- 20E TRAMO 62 LOTE 3 CALZADA LOSAS DE CONCRETO

	COTAS RASANTE EXISTENTE					COTAS DEMOLICION					DIFERENCIA					PROM	ANCHO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	AREA EN PLANTA
ABS	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ						
K0+214.9	1087.692	1087.734	1087.776			1087.502	1087.524	1087.566			0.190	0.210	0.210			0.203	2.920	0.594	1.903	1.903	9.207
K0+218.0	1087.538	1087.584	1087.630			1087.348	1087.364	1087.410			0.190	0.220	0.220			0.210	3.020	0.634	2.234	4.137	10.989
K0+221.7	1087.350	1087.403	1087.456			1087.161	1087.213	1087.246			0.189	0.190	0.210			0.196	2.920	0.573			
															ESPESOR	0.203				4.137	20.196

AREA DESCUENTOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	L*A	AREA
CAM	0	R=3.7	0
SUM	0	0.60*2.17	0
A. DE LOSA NO FUNDIDA	0		0
			0

VOLUMEN TOTAL DE EXCAVACION	4.137
AREA TOTAL	20.196
2 LOSAS FUNDIDAS	

VOLUMEN TOTAL DEMOLICION	32.123
AREA TOTAL DEMOLICION	160.208

Firma :
Nombre : ALEXANDER AMAYA
Cargo : Topografo
Matricula : 01-14526


CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

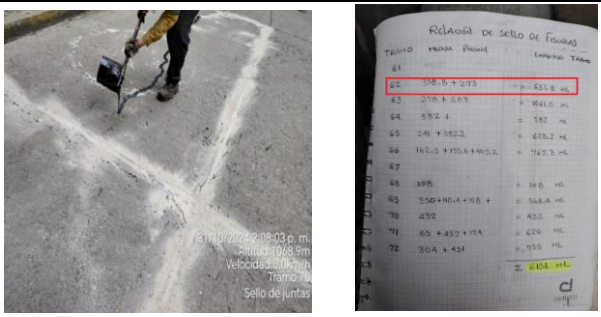
CAPÍTULO	V	**PAVIMENTO ASFALTICO**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	49	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN**		
UNIDAD	ML			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	
TRAMO 62	1.00	631.8			631.80

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	631.80
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	631.80
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	631.80
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA





OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	631.80
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	631.80
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	631.80
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

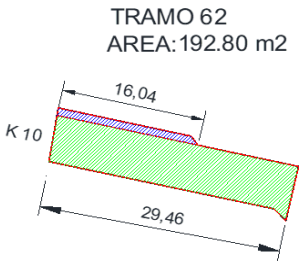
RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	VI	**CONCRETOS**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	76	**CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.**		
UNIDAD	ML			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	
TRAMO 62	1.00	6.5			6.50

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	6.50
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	6.50
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	6.50
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	6.50
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	6.50
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	6.50
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

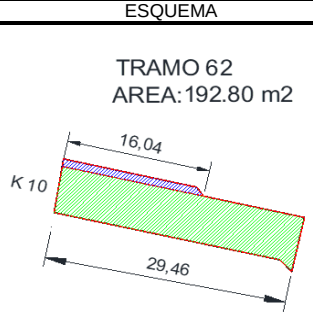
RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	105	**DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.**		
UNIDAD	ML			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	
TRAMO 62 - CALLE 1 OESTE A CALLE 3 OESTE LINEA CONTINUA	2.00	85			170.00
TRAMO 62 - CALLE 1 OESTE A CALLE 3 OESTE LINEA DISCONTINUA	1.00	40			40.00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	210.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	210.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	210.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	210.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	210.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	210.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

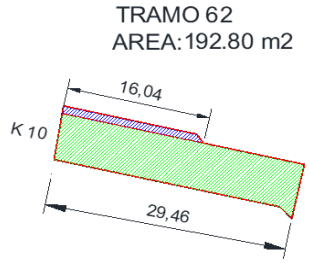
RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XI	**DRENAJES**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	106	**DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.**		
UNIDAD	M2			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 62 - CALLE 1 OESTE A CALLE 2N CEBRA L=4.0 m	26.00	4	0.4		41.60
TRAMO 62 - CALLE 1 OESTE A CALLE 2N CEBRA COMPLEMENTO L= variable	1.00	8.4	0.4		3.36
TRAMO 62 - CALLE 1 OESTE A CALLE 2N LINEA PARE	1.00	7	0.6		4.20
TRAMO 62 - CALLE 1 OESTE A CALLE 2N FLECHA DE FRENTE	4.00	1.2			4.80

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	53.96
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	53.96
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	53.96
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	53.96
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	53.96
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	53.96
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

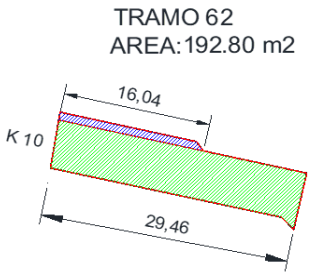
RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XI	**DRENAJES**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	119	**NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.**		
UNIDAD	UND			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	
TRAMO 62 - K0+141 (EJE)	1.00				1.00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	1.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	1.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

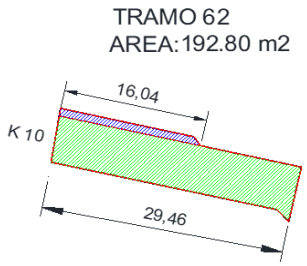
RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XII	**NO PREVISTOS**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	NP-1	**DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.**		
UNIDAD	M2			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**TOTAL**
	CANTIDAD	**AREA SEGÚN CARTERA DE CAMPO**	**ESPESOR**	
TRAMO 62	1.00	160.21		160.21

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	160.21
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	160.21
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	160.21
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	160.21
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	160.21
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	160.21
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

MEMORIA DE CANTIDADES TOPOGRAFIA DEMOLICION PLACAS DE CONCRETO

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0745-2024.-2024 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

CONS: CONSORCIO SAN DIEGO

SAN DIEGO CONSORCIO

COMUNA : 3
BARRIO : San Antonio

CANTIDADES DE OBRA: CARRERA 10 ENTRE CALLE 10E- 20E TRAMO 62 LOTE 3 CALZADA LOSAS DE CONCRETO

	COTAS RASANTE EXISTENTE					COTAS DEMOLICION					DIFERENCIA					PROM	ANCHO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	AREA EN PLANTA
ABS	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ						
K0+113.8	1086.596	1086.599	1086.602	1086.602	1086.602	1086.394	1086.398	1086.403	1086.403	1086.403	0.202	0.201	0.199	0.199	0.199	0.200	4.580	0.916	2.131	2.131	10.672
K0+116.1	1086.620	1086.622	1086.624	1086.628	1086.632	1086.421	1086.420	1086.425	1086.429	1086.434	0.199	0.202	0.199	0.199	0.198	0.199	4.700	0.937	4.214	6.345	21.113
K0+120.4	1086.660	1086.669	1086.678	1086.684	1086.690	1086.460	1086.468	1086.476	1086.486	1086.492	0.200	0.201	0.202	0.198	0.198	0.200	5.120	1.023	3.154	9.500	15.780
K0+123.4	1086.704	1086.716	1086.728	1086.736	1086.744	1086.503	1086.517	1086.527	1086.537	1086.544	0.201	0.199	0.201	0.199	0.200	0.200	5.400	1.080	3.287	12.787	16.447
K0+126.5	1086.749	1086.768	1086.786	1086.794	1086.782	1086.550	1086.566	1086.586	1086.585	1086.583	0.199	0.201	0.200	0.199	0.199	0.200	5.385	1.075	4.023	16.810	20.130
K0+130.1	1086.796	1086.814	1086.832	1086.823	1086.814	1086.596	1086.614	1086.632	1086.622	1086.615	0.200	0.200	0.200	0.201	0.199	0.200	5.645	1.129	3.489	20.299	17.421
K0+133.1	1086.856	1086.8645	1086.873	1086.8665	1086.86	1086.655	1086.6645	1086.672	1086.664	1086.662	0.201	0.200	0.201	0.203	0.198	0.201	5.969	1.197	3.484	23.783	17.391
K0+136.1	1086.896	1086.906	1086.916	1086.909	1086.902	1086.694	1086.705	1086.717	1086.708	1086.704	0.202	0.201	0.199	0.201	0.198	0.200	5.625	1.126	3.443	27.226	17.213
K0+139.2	1086.954	1086.952	1086.95	1086.948	1086.946	1086.756	1086.751	1086.75	1086.746	1086.748	0.198	0.201	0.200	0.202	0.198	0.200	5.48	1.095	3.284	30.510	16.410
K0+142.2	1087.023	1087.0275	1087.032	1087.019	1087.006	1086.821	1086.824	1086.832	1086.82	1086.808	0.202	0.204	0.200	0.199	0.198	0.201	5.46	1.095	3.265	33.775	16.340
K0+145.2	1087.114	1087.122	1087.13	1087.107	1087.084	1086.914	1086.924	1086.931	1086.907	1086.885	0.200	0.198	0.199	0.200	0.199	0.199	5.433	1.082	3.359	37.134	16.853
K0+148.3	1087.196	1087.206	1087.216	1087.204	1087.192	1086.998	1087.006	1087.017	1087.003	1086.993	0.198	0.200	0.199	0.201	0.199	0.199	5.44	1.085	3.241	40.376	16.223
K0+151.3	1087.274	1087.289	1087.304	1087.288	1087.272	1087.071	1087.09	1087.103	1087.089	1087.073	0.203	0.199	0.201	0.199	0.199	0.200	5.375	1.076			
															ESPESOR	0.200				40.376	201.992

AREA DESCUENTOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	L*A	AREA
CAM	2	R=0.7	3.08
SUM	1	0.60*2.17	1.3
A. DE LOSA NO FUNDIDA	7		57.6
			61.98

VOLUMEN TOTAL DE EXCAVACION	**27.986**
AREA TOTAL	201.992
AREA CON DESCUENTO	**140.012**
VOLUMEN DE DESCUENTO	12.390
17 LOSAS FUNDIDAS	

Firma :
Nombre : ALEXANDER AMAYA
Cargo : Topografo
Matricula : 01-14526

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	**MEMORIA DE CANTIDADES TOPOGRAFIA DEMOLICION PLACAS DE CONCRETO**	SAN DIEGO CONSORCIO
	CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0745-2024.-2024 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	
	CONS: CONSORCIO SAN DIEGO	

COMUNA : 3
BARRIO : San Antonio

CANTIDADES DE OBRA: CARRERA 10 ENTRE CALLE 10E- 20E TRAMO 62 LOTE 3 CALZADA LOSAS DE CONCRETO

	COTAS RASANTE EXISTENTE					COTAS DEMOLICION					DIFERENCIA					PROM	ANCHO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	AREA EN PLANTA
ABS	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ						
K0+214.9	1087.692	1087.734	1087.776			1087.502	1087.524	1087.566			0.190	0.210	0.210			0.203	2.920	0.594	1.903	1.903	9.207
K0+218.0	1087.538	1087.584	1087.630			1087.348	1087.364	1087.410			0.190	0.220	0.220			0.210	3.020	0.634	2.234	4.137	10.989
K0+221.7	1087.350	1087.403	1087.456			1087.161	1087.213	1087.246			0.189	0.190	0.210			0.196	2.920	0.573			
															ESPESOR	0.203				4.137	20.196

AREA DESCUENTOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	L*A	AREA
CAM	0	R=3.7	0
SUM	0	0.60*2.17	0
A. DE LOSA NO FUNDIDA	0		0
			0

VOLUMEN TOTAL DE EXCAVACION	4.137
AREA TOTAL	20.196
2 LOSAS FUNDIDAS	

VOLUMEN TOTAL DEMOLICION	32.123
AREA TOTAL DEMOLICION	160.208

Firma :
Nombre : ALEXANDER AMAYA
Cargo : Topografo
Matricula : 01-14526

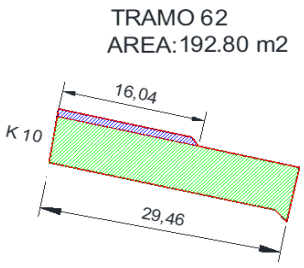
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XII	**NO PREVISTOS**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	NP-2	**CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.**		
UNIDAD	ML			

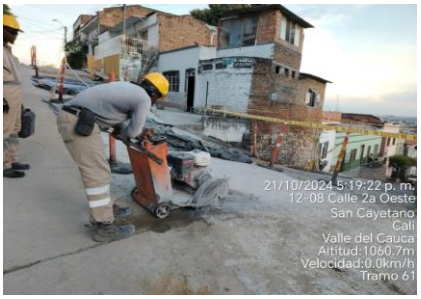
UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 62	1.00	144.29			144.29

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	144.29
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	144.29
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	144.29
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA



FOTOGRAFIA



OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	144.29
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	144.29
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	144.29
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

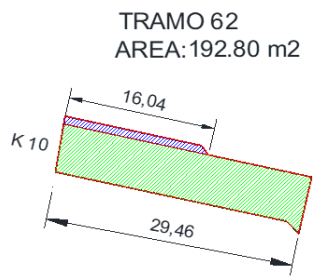
RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XII	**NO PREVISTOS**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	NP-3	**CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.**		
UNIDAD	M3			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**		**TOTAL**
	VOLUMEN SEGÚN CARTERA DE CAMPO	**PORCENTAJE A COBRAR EN PRESENTE ACTA**	
TRAMO 62	32.12	**70%**	22.49

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	22.49
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	32.12
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	22.49
TOTAL POR EJECUTAR	9.63

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	22.49
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	32.12
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	22.49
TOTAL POR EJECUTAR	9.63

RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	**MEMORIA DE CANTIDADES TOPOGRAFIA CONCRETO** CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0745-2024.-2024 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI." CONS: CONSORCIO SAN DIEGO	SAN DIEGO CONSORCIO

COMUNA : 3
BARRIO : San Antonio

CANTIDADES DE OBRA: CARRERA 10 ENTRE CALLE 10E- 20E TRAMO 62 LOTE 3 CALZADA LOSAS DE CONCRETO

	COTAS CONCRETO					COTAS BASE EXISTENTE					DIFERENCIA					PROM	ANCHO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	AREA EN PLANTA
ABS	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ						
K0+113.8	1086.596	1086.599	1086.602	1086.602	1086.602	1086.394	1086.398	1086.403	1086.403	1086.403	0.202	0.201	0.199	0.199	0.199	0.200	4.580	0.916	2.131	2.131	10.672
K0+116.1	1086.620	1086.622	1086.624	1086.628	1086.632	1086.421	1086.420	1086.425	1086.429	1086.434	0.199	0.202	0.199	0.199	0.198	0.199	4.700	0.937	4.214	6.345	21.113
K0+120.4	1086.660	1086.669	1086.678	1086.684	1086.690	1086.460	1086.468	1086.476	1086.486	1086.492	0.200	0.201	0.202	0.198	0.198	0.200	5.120	1.023	3.154	9.500	15.780
K0+123.4	1086.704	1086.716	1086.728	1086.736	1086.744	1086.503	1086.517	1086.527	1086.537	1086.544	0.201	0.199	0.201	0.199	0.200	0.200	5.400	1.080	3.287	12.787	16.447
K0+126.5	1086.749	1086.768	1086.786	1086.794	1086.782	1086.550	1086.566	1086.586	1086.585	1086.583	0.199	0.201	0.200	0.199	0.199	0.200	5.385	1.075	4.023	16.810	20.130
K0+130.1	1086.796	1086.814	1086.832	1086.823	1086.814	1086.596	1086.614	1086.632	1086.622	1086.615	0.200	0.200	0.200	0.201	0.199	0.200	5.645	1.129	3.489	20.299	17.421
K0+133.1	1086.856	1086.8645	1086.873	1086.8665	1086.86	1086.655	1086.6645	1086.672	1086.664	1086.662	0.201	0.200	0.201	0.203	0.198	0.201	5.969	1.197	3.484	23.783	17.391
K0+136.1	1086.896	1086.906	1086.916	1086.909	1086.902	1086.694	1086.705	1086.717	1086.708	1086.704	0.202	0.201	0.199	0.201	0.198	0.200	5.625	1.126	3.443	27.226	17.213
K0+139.2	1086.954	1086.952	1086.95	1086.948	1086.946	1086.756	1086.751	1086.75	1086.746	1086.748	0.198	0.201	0.200	0.202	0.198	0.200	5.48	1.095	3.284	30.510	16.410
K0+142.2	1087.023	1087.0275	1087.032	1087.019	1087.006	1086.821	1086.824	1086.832	1086.82	1086.808	0.202	0.204	0.200	0.199	0.198	0.201	5.46	1.095	3.265	33.775	16.340
K0+145.2	1087.114	1087.122	1087.13	1087.107	1087.084	1086.914	1086.924	1086.931	1086.907	1086.885	0.200	0.198	0.199	0.200	0.199	0.199	5.433	1.082	3.359	37.134	16.853
K0+148.3	1087.196	1087.206	1087.216	1087.204	1087.192	1086.998	1087.006	1087.017	1087.003	1086.993	0.198	0.200	0.199	0.201	0.199	0.199	5.44	1.085	3.241	40.376	16.223
K0+151.3	1087.274	1087.289	1087.304	1087.288	1087.272	1087.071	1087.09	1087.103	1087.089	1087.073	0.203	0.199	0.201	0.199	0.199	0.200	5.375	1.076			
															ESPESOR	0.200				40.376	201.992

AREA DESCUENTOS			
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**L*A**	**AREA**
CAM	2	R=0.7	3.08
SUM	1	0.60*2.17	1.3
A. DE LOSA NO FUNDIDA	7		57.6
			61.98

VOLUMEN TOTAL DE EXCAVACION	**27.986**
AREA TOTAL	201.992
AREA CON DESCUENTO	**140.012**
VOLUMEN DE DESCUENTO	12.390
17 LOSAS FUNDIDAS	

Firma :
Nombre : ALEXANDER AMAYA
Cargo : Topografo
Matricula : 01-14526

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	**MEMORIA DE CANTIDADES TOPOGRAFIA CONCRETO** CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0745-2024.-2024 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI." CONS: CONSORCIO SAN DIEGO	SAN DIEGO CONSORCIO

COMUNA : 3
BARRIO : San Antonio

CANTIDADES DE OBRA: CARRERA 10 ENTRE CALLE 10E- 20E TRAMO 62 LOTE 3 CALZADA LOSAS DE CONCRETO

	COTAS RASANTE CONCRETO					COTAS BASE EXISTENTE					DIFERENCIA					PROM	ANCHO	AREA	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	AREA EN PLANTA
ABS	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ	DER	1/4	EJE	1/4	IZQ						
K0+214.9	1087.692	1087.734	1087.776			1087.502	1087.524	1087.566			0.190	0.210	0.210			0.203	2.920	0.594	1.903	1.903	9.207
K0+218.0	1087.538	1087.584	1087.630			1087.348	1087.364	1087.410			0.190	0.220	0.220			0.210	3.020	0.634	2.234	4.137	10.989
K0+221.7	1087.350	1087.403	1087.456			1087.161	1087.213	1087.246			0.189	0.190	0.210			0.196	2.920	0.573			
															ESPESOR	0.203				4.137	20.196

AREA DESCUENTOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	L*A	AREA
CAM	0	R=3.7	0
SUM	0	0.60*2.17	0
A. DE LOSA NO FUNDIDA	0		0
			0

VOLUMEN TOTAL DE EXCAVACION	4.137
AREA TOTAL	20.196
2 LOSAS FUNDIDAS	

VOLUMEN TOTAL DE CONCRETO	32.123

160.208

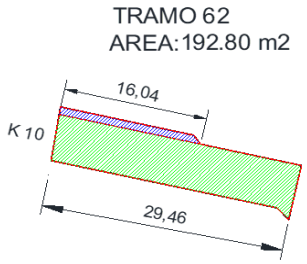
Firma :
Nombre : ALEXANDER AMAYA
Cargo : Topoografo
Matricula : 01-14526

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XII	**NO PREVISTOS**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	NP-4	**REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.**		
UNIDAD	KG			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	
TRAMO 62 - PASAJUNTAS LOSAS DE CONCRETO PASADORES 1 1/4"	16.00	10.00	0.35	6.40	358.40
TRAMO 62 - PASAJUNTAS LOSAS DE CONCRETO CANASTILLA 3/8"	16.00	4.00	3	0.56	106.94
TRAMO 62 - PASAJUNTAS LOSAS DE CONCRETO GANCHOS CANASTILLA 1/4"	16.00	22.00	0.15	0.25	13.20
TRAMO 62 - PASAJUNTAS LOSAS DE CONCRETO ATIESADORES 1/4"	16.00	8.00	0.45	0.25	14.40
TRAMO 62 - SARDINEL (ML) REFUERZO LONGITUDINAL 3/8"	6.50	0.30	0.30	0.56	0.33
TRAMO 62 - SARDINEL (ML) REF. TRANSVERSAL (GANCHOS) 3/8"	6.50	1.00	1.00	0.56	3.64

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	496.91
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	496.91
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	496.91
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	496.91
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	496.91
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	496.91
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

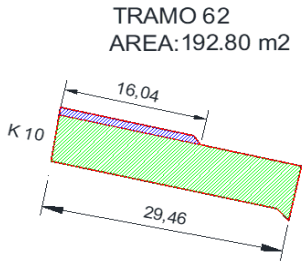
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XII	NO PREVISTOS	FECHA:	22-nov-24
ITEM	NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)		
UNIDAD	M3			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 62	1.00	2.07			2.07
TRAMO 62	1.00	20.00	1.00	0.40	8.00
TRAMO 62	1.00	15.40	0.40	0.30	1.85

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	11.92
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	2.07
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	11.92
TOTAL POR EJECUTAR	-9.85

ESQUEMA



FOTOGRAFIA



OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	11.92
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	2.07
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	11.92
TOTAL POR EJECUTAR	-9.85

RESIDENTE DE OBRA:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

SOPORTES PRE ACTA DE RECIBO PARCIAL No.: 02

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Alcaldia de Santiago de Cali

PRE ACTA DE RECIBIO PARCIAL TRAMO 63 (SAN ANTONIO)

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

				FECHA DE ELABORACION:	**22 DE NOVIEMBRE DE 2024**
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1				
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

LOTE 03 - COMUNA 02 SEGUNDO SECTOR Y COMUNA 08

FRENTE 63 - CARRERA 10 ENTRE CALLES 3 Y 4

		CONDICIONES CONTRACTUALES				**CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1**		**EJECUCION**							
								ACTAS ANTERIORES		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES**				**CANTIDADES ACTUALIZADAS**									
		UND.	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1,716.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	377.00	$ 6,356.00	$ 2,396,212.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 2,396,212.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	115.00	$ 22,513.00	$ 2,588,995.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	120.00	$ 9,327.00	$ 1,119,240.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103,237.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 3,708,235.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	23.00	$ 10,545.00	$ 242,535.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60,034.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	23.00	$ 43,679.00	$ 1,004,617.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2,588,680.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	115.00	$ 8,282.00	$ 952,430.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 2,199,582.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	23.00	$ 212,313.00	$ 4,883,199.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	377.00	$ 28,591.00	$ 10,778,807.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 15,662,006.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4,818.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	377.00	$ 4,652.00	$ 1,753,804.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7,184.00	$ 0.00	1,061.00	$ 7,622,224.00	-	$ -	1,061.00	$ 7,622,224.00	1,061.00	$ 7,622,224.00	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4,966.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** **HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,332,529.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	75.40	$ 1,371,977.00	$ 103,447,066.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,425,083.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 105,200,870.00**		**$ 7,622,224.00**		**$ -**		**$ 7,622,224.00**		**$ 7,622,224.00**		**$ -**		
VI	**CONCRETOS**																
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**																
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	700.00	$ 3,927.00	$ 2,748,900.00	246.00	$ 966,042.00	-	$ -	246.00	$ 966,042.00	246.00	$ 966,042.00	-	$ -	-	$ -
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	65.00	$ 64,328.00	$ 4,181,320.00	36.84	$ 2,369,844.00	-	$ -	36.84	$ 2,369,844.00	36.84	$ 2,369,844.00	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 6,930,220.00**		**$ 3,335,886.00**		**$ -**		**$ 3,335,886.00**		**$ 3,335,886.00**		**$ -**		
XI	**DRENAJES**																
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	4.00	$ 422,631.00	$ 1,690,524.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	6.00	$ 1,159,538.00	$ 6,957,228.00	1.00	$ 1,159,538.00	1.00	$ 1,159,538.00	-	$ -	1.00	$ 1,159,538.00	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 8,647,752.00**		**$ 1,159,538.00**		**$ 1,159,538.00**		**$ -**		**$ 1,159,538.00**		**$ -**		
XII	**NO PREVISTOS**																
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	2.67	$ 137,598.00	-	$ -	2.67	$ 137,598.00	2.67	$ 137,598.00	-	$ -	-	$ -
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	4.74	$ 75,849.00	-	$ -	4.74	$ 75,849.00	4.74	$ 75,849.00	-	$ -	-	$ -
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: **22 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00 **PRORROGA 1:** Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00 **PRORROGA 2:** Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00 **PRORROGA 3:** N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 213,447.00**		**$ -**		**$ 213,447.00**		**$ 213,447.00**		**$ -**	

SUBTOTAL OBRAS					**$ 144,744,877.00**		**$ 12,331,095.00**		**$ 1,159,538.00**		**$ 11,171,557.00**		**$ 12,331,095.00**		**$ -**	

SUBTOTAL OBRAS					**$ -**		**$ 12,331,095.00**		**$ 1,159,538.00**		**$ 11,171,557.00**		**$ 12,331,095.00**		**$ -**	
Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA (2,02%)					**$ -**		**$ 249,088.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
Plan de Manejo de Transito - PMT (2,65%)					**$ -**		**$ 326,774.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
VALOR TOTAL					**$ -**		**$ 12,906,957.00**		**$ 1,159,538.00**		**$ 11,171,557.00**		**$ 12,331,095.00**		**$ -**	

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	V	**PAVIMENTO ASFALTICO**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	49	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN**		
UNIDAD	ML			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	
TRAMO 63	1.00	1061			1,061.00

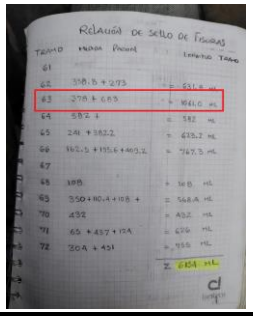
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	1,061.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	1,061.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1,061.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA



FOTOGRAFIA





OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	1,061.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	1,061.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1,061.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	105	**DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.**		
UNIDAD	ML			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	
TRAMO 63 - CALLE 3N A CALLE 4N LINEA CONTINUA	2.00	97			194.00
TRAMO 63 - KR 9 ENTRE CLL 3 Y CLL 4 LINEA DISCONTINUA	1.00	52			52.00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	246.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	246.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	246.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	246.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	246.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	246.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XI	**DRENAJES**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	106	**DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.**		
UNIDAD	M2			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 63 - KR 9 ENTRE CLL 3 Y CLL 4 CEBRA	17.00	4	0.4		27.20
TRAMO 63 - KR 9 ENTRE CLL 3 Y CLL 4 LINEA PARE	1.00	6.4	0.6		3.84
TRAMO 63 - KR 9 ENTRE CLL 3 Y CLL 4 FLECHA DE FRENTE	3.00	1.2			3.60
TRAMO 63 - KR 9 ENTRE CLL 3 Y CLL 4 FLECHA DOBLE	1.00	2.2			2.20

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	36.84
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	36.84
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	36.84
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	36.84
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	36.84
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	36.84
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

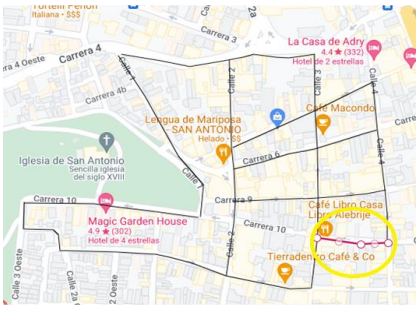
RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XII	**NO PREVISTOS**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	NP-1	**DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.**		
UNIDAD	M2			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	
TRAMO 63	1.00	2.67			2.67

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	2.67
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	2.67
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	2.67
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	2.67
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	2.67
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	2.67
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XII	**NO PREVISTOS**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	NP-2	**CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.**		
UNIDAD	ML			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	
TRAMO 63	1.00	4.74			4.74

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	4.74
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	4.74
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	4.74
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	4.74
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	4.74
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	4.74
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

SOPORTES PRE ACTA DE RECIBO PARCIAL No.: 02

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Alcaldia de Santiago de Cali

PRE ACTA DE RECIBIO PARCIAL TRAMO 64 (SAN ANTONIO)

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

				FECHA DE ELABORACION:	**22 DE NOVIEMBRE DE 2024**
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1				
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

LOTE 03 - COMUNA 02 SEGUNDO SECTOR Y COMUNA 08

FRENTE 64 - CARRERA 9 ENTRE CALLES 2 Y 4

		CONDICIONES CONTRACTUALES				**CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1**		**EJECUCION**							
								ACTAS ANTERIORES		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				**CANTIDADES ACTUALIZADAS**									
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1,716.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	377.00	$ 6,356.00	$ 2,396,212.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 2,396,212.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	115.00	$ 22,513.00	$ 2,588,995.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	120.00	$ 9,327.00	$ 1,119,240.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103,237.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 3,708,235.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	23.00	$ 10,545.00	$ 242,535.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60,034.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	23.00	$ 43,679.00	$ 1,004,617.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2,588,680.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	115.00	$ 8,282.00	$ 952,430.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 2,199,582.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	23.00	$ 212,313.00	$ 4,883,199.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	377.00	$ 28,591.00	$ 10,778,807.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 15,662,006.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4,818.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	377.00	$ 4,652.00	$ 1,753,804.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7,184.00	$ 0.00	582.00	$ 4,181,088.00	-	$ -	582.00	$ 4,181,088.00	582.00	$ 4,181,088.00	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4,966.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** **HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,332,529.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	75.40	$ 1,371,977.00	$ 103,447,066.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,425,083.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 105,200,870.00**		**$ 4,181,088.00**		**$ -**		**$ 4,181,088.00**		**$ 4,181,088.00**		**$ -**		**$ -**
VI	**CONCRETOS**																
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**																
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	700.00	$ 3,927.00	$ 2,748,900.00	500.00	$ 1,963,500.00	-	$ -	500.00	$ 1,963,500.00	500.00	$ 1,963,500.00	-	$ -	-	$ -
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	65.00	$ 64,328.00	$ 4,181,320.00	77.00	$ 4,953,256.00	-	$ -	77.00	$ 4,953,256.00	77.00	$ 4,953,256.00	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 6,930,220.00**		**$ 6,916,756.00**		**$ -**		**$ 6,916,756.00**		**$ 6,916,756.00**		**$ -**		**$ -**
XI	**DRENAJES**																
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	4.00	$ 422,631.00	$ 1,690,524.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	6.00	$ 1,159,538.00	$ 6,957,228.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 8,647,752.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
XII	**NO PREVISTOS**																
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	1.89	$ 97,401.00	-	$ -	1.89	$ 97,401.00	1.89	$ 97,401.00	-	$ -	-	$ -
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	3.89	$ 62,248.00	-	$ -	3.89	$ 62,248.00	3.89	$ 62,248.00	-	$ -	-	$ -
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	1.00	$ 820,404.00	-	$ -	1.00	$ 820,404.00	1.00	$ 820,404.00	-	$ -	-	$ -
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: **22 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ]	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL:	12 DE OCTUBRE DE 2024
				HASTA EL:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024

Subtotal			**$ 0.00**		**$ 980,053.00**		**$** -		**$ 980,053.00**		**$ 980,053.00**		**$** -
SUBTOTAL OBRAS			**$ 144,744,877.00**		**$ 12,077,897.00**		**$** -		**$ 12,077,897.00**		**$ 12,077,897.00**		**$** -

SUBTOTAL OBRAS			**$ 144,744,877.00**		**$ 12,077,897.00**		**$** -		**$ 12,077,897.00**		**$ 12,077,897.00**		**$** -
Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA (2,02%)			**$ 2,923,847.00**		**$ 243,974.00**		**$** -		**$** -		**$** -		**$** -
Plan de Manejo de Transito - PMT (2,65%)			**$ 3,835,739.00**		**$ 320,064.00**		**$** -		**$** -		**$** -		**$** -
VALOR TOTAL			**$ 151,504,463.00**		**$ 12,641,935.00**		**$** -		**$ 12,077,897.00**		**$ 12,077,897.00**		**$** -

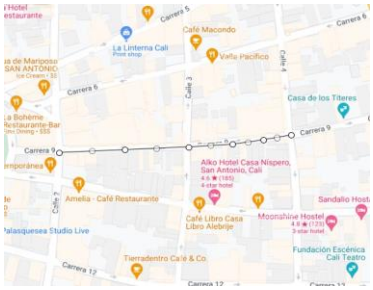
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	V	**PAVIMENTO ASFALTICO**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	49	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN**		
UNIDAD	ML			

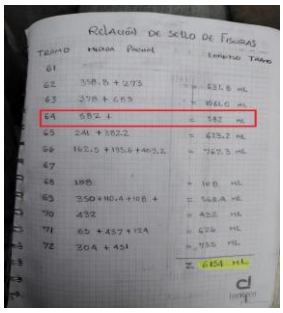
UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 64	582.00				582.00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	582.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	582.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	582.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA







OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	582.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	582.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	582.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

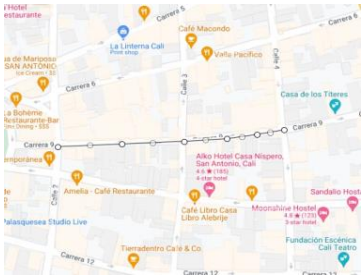
RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	105	**DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.**		
UNIDAD	ML			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	
TRAMO 64 - KR 9 ENTRE CLL 2 Y CLL3 LINEA CONTINUA	2.00	112			224.00
TRAMO 64 - KR 9 ENTRE CLL 3 Y CLL 4 LINEA DISCONTINUA	1.00	51			51.00
TRAMO 64 - KR 9 ENTRE CLL 3 Y CLL 4 LINEA CONTINUA	2.00	90			180.00
TRAMO 64 - KR 9 ENTRE CLL 3 Y CLL 4 LINEA DISCONTINUA	1.00	45			45.00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	500.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	500.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	500.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	500.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	500.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	500.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

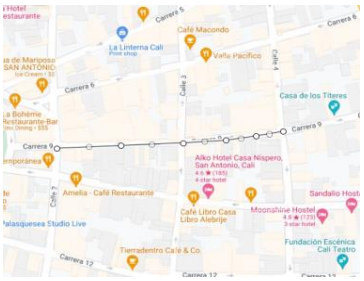
RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XI	DRENAJES	FECHA:	22-nov-24
ITEM	106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.			
UNIDAD	M2			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 64 - KR 9 ENTRE CLL 2 Y CLL3 CEBRA	15.00	4	0.4		24.00
TRAMO 64 - KR 9 ENTRE CLL 2 Y CLL3 LINEA PARE	1.00	4.5	0.6		2.70
TRAMO 64 - KR 9 ENTRE CLL 2 Y CLL3 FLECHA DE FRENTE	3.00	1.2			3.60
TRAMO 64 - KR 9 ENTRE CLL 2 Y CLL3 FLECHA DOBLE	1.00	2.2			2.20
TRAMO 64 - KR 9 ENTRE CLL 3 Y CLL 4 CEBRA	20.00	4	0.4		32.00
TRAMO 64 - KR 9 ENTRE CLL 3 Y CLL 4 CEBRA COMPLEMENTO	1.00	7.3	0.4		2.92
TRAMO 64 - KR 9 ENTRE CLL 3 Y CLL 4 LINEA PARE	1.00	6.3	0.6		3.78
TRAMO 64 - KR 9 ENTRE CLL 3 Y CLL 4 FLECHA DE FRENTE	3.00	1.2			3.60
TRAMO 64 - KR 9 ENTRE CLL 3 Y CLL 4 FLECHA DOBLE	1.00	2.2			2.20

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	77.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	77.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	77.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	77.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	77.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	77.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

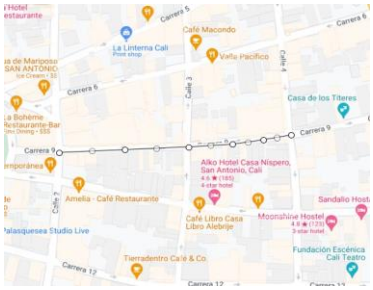
RESIDENTE DE OBRA:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XII	**NO PREVISTOS**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	NP-1	**DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.**		
UNIDAD	M2			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	
TRAMO 64	1.00	1.89			1.89

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	1.89
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.89
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1.89
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	1.89
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.89
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1.89
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XII	**NO PREVISTOS**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	NP-2	**CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.**		
UNIDAD	ML			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 64	1.00	3.89			3.89

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	3.89
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	3.89
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	3.89
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	3.89
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	3.89
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	3.89
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

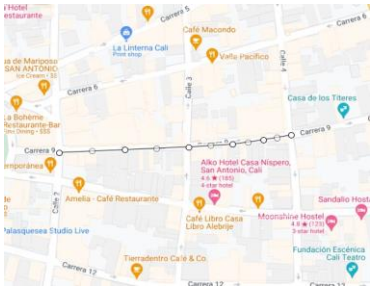
RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XII	**NO PREVISTOS**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	NP-5	**REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).**		
UNIDAD	UND			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	
TRAMO 64 - K0+005 (CD)	1.00				1.00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	1.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	1.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

SOPORTES PRE ACTA DE RECIBO PARCIAL No.: 02

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Alcaldia de Santiago de Cali

PRE ACTA DE RECIBIO PARCIAL TRAMO 65 (SAN ANTONIO)

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

				FECHA DE ELABORACION:	**22 DE NOVIEMBRE DE 2024**
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1				
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

LOTE 03 - COMUNA 02 SEGUNDO SECTOR Y COMUNA 08

FRENTE 65 - CARRERA 6 ENTRE CALLES 2 Y 4

		CONDICIONES CONTRACTUALES				**CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1**		**EJECUCION**							
								ACTAS ANTERIORES		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				**CANTIDADES ACTUALIZADAS**									
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1,716.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	377.00	$ 6,356.00	$ 2,396,212.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 2,396,212.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	115.00	$ 22,513.00	$ 2,588,995.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	120.00	$ 9,327.00	$ 1,119,240.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103,237.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 3,708,235.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	23.00	$ 10,545.00	$ 242,535.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60,034.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	23.00	$ 43,679.00	$ 1,004,617.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2,588,680.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	115.00	$ 8,282.00	$ 952,430.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 2,199,582.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	23.00	$ 212,313.00	$ 4,883,199.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	377.00	$ 28,591.00	$ 10,778,807.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 15,662,006.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4,818.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	377.00	$ 4,652.00	$ 1,753,804.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7,184.00	$ 0.00	623.20	$ 4,477,069.00	-	$ -	623.20	$ 4,477,069.00	623.20	$ 4,477,069.00	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4,966.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	

SUPERVISOR:			SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ						**PERIODO PRESENTE ACTA**									
									DESDE EL:	12 DE OCTUBRE DE 2024		**HASTA EL:**			**HASTA EL:**	22 DE NOVIEMBRE DE 2024		
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,332,529.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	-	$ -	-	-	$ -	-	-	$ -
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	75.40	$ 1,371,977.00	$ 103,447,066.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	-	$ -	-	-	$ -	-	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,425,083.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	-	$ -	-	-	$ -	-	-	$ -
Subtotal					**$ 105,200,870.00**		**$ 4,477,069.00**		**$**	**-**		**$**	**4,477,069.00**		**$**	**4,477,069.00**		**$**	**-**
VI	**CONCRETOS**																	
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	-	$ -	-	-	$ -	-	-	$ -
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	-	$ -	-	-	$ -	-	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$**	**-**		**$**	**-**		**$**	**-**		**$**	**-**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**																	
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	700.00	$ 3,927.00	$ 2,748,900.00	418.00	$ 1,641,486.00	-	$ -	418.00	$ 1,641,486.00	418.00	$ 1,641,486.00	-	$ -
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	65.00	$ 64,328.00	$ 4,181,320.00	45.48	$ 2,925,637.00	-	$ -	45.48	$ 2,925,637.00	45.48	$ 2,925,637.00	-	$ -
Subtotal					**$ 6,930,220.00**		**$ 4,567,123.00**		**$**	**-**		**$**	**4,567,123.00**		**$**	**4,567,123.00**		**$**	**-**
XI	**DRENAJES**																	
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	4.00	$ 422,631.00	$ 1,690,524.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	-	$ -	-	-	$ -	-	-	$ -
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	6.00	$ 1,159,538.00	$ 6,957,228.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	-	$ -	-	-	$ -	-	-	$ -
Subtotal					**$ 8,647,752.00**		**$ 0.00**		**$**	**-**		**$**	**-**		**$**	**-**		**$**	**-**
XII	**NO PREVISTOS**																	
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	-	$ -	-	-	$ -	-	-	$ -
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	-	$ -	-	-	$ -	-	-	$ -
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	-	$ -	-	-	$ -	-	-	$ -
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	-	$ -	-	-	$ -	-	-	$ -
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	-	$ -	-	-	$ -	-	-	$ -
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	-	$ -	-	-	$ -	-	-	$ -
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	-	$ -	-	-	$ -	-	-	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: **22 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00 **PRORROGA 1:** Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00 **PRORROGA 2:** Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00 **PRORROGA 3:** N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

Subtotal			**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$** -		**$** -		**$** -		**$** -
SUBTOTAL OBRAS			**$ 144,744,877.00**		**$ 9,044,192.00**		**$** -		**$ 9,044,192.00**		**$ 9,044,192.00**		**$** -

SUBTOTAL OBRAS			**$ 144,744,877.00**		**$ 9,044,192.00**		**$** -		**$ 9,044,192.00**		**$ 9,044,192.00**		**$** -
Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA (2,02%)			**$ 2,923,847.00**		**$ 182,693.00**		**$** -		**$** -		**$** -		**$** -
Plan de Manejo de Transito - PMT (2,65%)			**$ 3,835,739.00**		**$ 239,671.00**		**$** -		**$** -		**$** -		**$** -
VALOR TOTAL			**$ 151,504,463.00**		**$ 9,466,556.00**		**$** -		**$ 9,044,192.00**		**$ 9,044,192.00**		**$** -

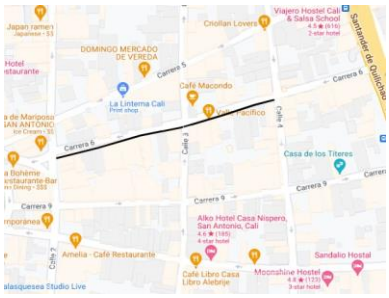
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	V	**PAVIMENTO ASFALTICO**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	49	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN**		
UNIDAD	ML			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	
TRAMO 65	1.00	623.2			623.20


TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	623.20
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	623.20
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	623.20
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA



FOTOGRAFIA





OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	623.20
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	623.20
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	623.20
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

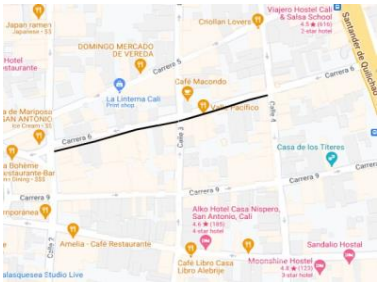
RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	105	**DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.**		
UNIDAD	ML			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	
TRAMO 65 - KR 6 ENTRE CLL 2 Y CLL3 LINEA CONTINUA	2.00	123			246.00
TRAMO 65 - KR 6 ENTRE CLL 3 Y CLL 4 LINEA CONTINUA	2.00	86			172.00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	418.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	418.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	418.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	418.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	418.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	418.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

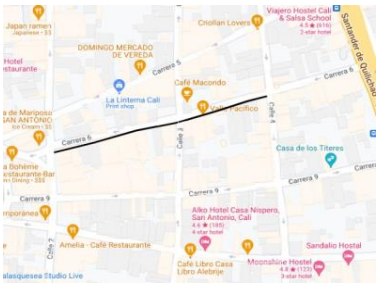
RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XI	**DRENAJES**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	106	**DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.**		
UNIDAD	M2			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 65 - KR 6 ENTRE CLL 2 Y CLL3 CEBRA	10.00	3.355	0.4		13.42
TRAMO 65 - KR 6 ENTRE CLL 2 Y CLL3 CEBRA COMPLEMENTO	1.00	4.2	0.4		1.68
TRAMO 65 - KR 6 ENTRE CLL 2 Y CLL3 LINEA PARE	1.00	3.8	0.6		2.28
TRAMO 65 - KR 6 ENTRE CLL 2 Y CLL3 FLECHA DE FRENTE	1.00	1.2			1.20
TRAMO 65 - KR 6 ENTRE CLL 2 Y CLL3 FLECHA UNICO GIRO	1.00	1.8			1.80
TRAMO 65 - KR 6 ENTRE CLL 3 Y CLL 4 CEBRA	11.00	4	0.4		17.60
TRAMO 65 - KR 6 ENTRE CLL 3 Y CLL 4 CEBRA COMPLEMENTO	1.00	5	0.4		2.00
TRAMO 65 - KR 6 ENTRE CLL 3 Y CLL 4 LINEA PARE	1.00	3.5	0.6		2.10
TRAMO 65 - KR 6 ENTRE CLL 3 Y CLL 4 FLECHA DE FRENTE	1.00	1.2			1.20
TRAMO 65 - KR 6 ENTRE CLL 3 Y CLL 4 FLECHA DOBLE	1.00	2.2			2.20

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	45.48
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	45.48
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	45.48
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	45.48
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	45.48
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	45.48
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

SOPORTES PRE ACTA DE RECIBO PARCIAL No.: 02

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Alcaldia de Santiago de Cali

PRE ACTA DE RECIBIO PARCIAL TRAMO 66 (SAN ANTONIO)

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

				FECHA DE ELABORACION:	**22 DE NOVIEMBRE DE 2024**
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ]	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

LOTE 03 - COMUNA 02 SEGUNDO SECTOR Y COMUNA 08

FRENTE 66 - CARRERA 5 ENTRE CLL 2 a 4

		CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1		EJECUCION							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS									
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1,716.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	377.00	$ 6,356.00	$ 2,396,212.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 2,396,212.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	115.00	$ 22,513.00	$ 2,588,995.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	120.00	$ 9,327.00	$ 1,119,240.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103,237.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 3,708,235.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	23.00	$ 10,545.00	$ 242,535.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60,034.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	23.00	$ 43,679.00	$ 1,004,617.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2,588,680.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	115.00	$ 8,282.00	$ 952,430.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 2,199,582.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	23.00	$ 212,313.00	$ 4,883,199.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	377.00	$ 28,591.00	$ 10,778,807.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 15,662,006.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4,818.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	377.00	$ 4,652.00	$ 1,753,804.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7,184.00	$ 0.00	767.30	$ 5,512,283.00	-	$ -	767.30	$ 5,512,283.00	767.30	$ 5,512,283.00	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4,966.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	

SUPERVISOR:			SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ						**PERIODO PRESENTE ACTA**								
									DESDE EL:	12 DE OCTUBRE DE 2024		**HASTA EL:**			**HASTA EL:**	22 DE NOVIEMBRE DE 2024	
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,332,529.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	75.40	$ 1,371,977.00	$ 103,447,066.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,425,083.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 105,200,870.00**		**$ 5,512,283.00**		**$ -**		**$ -**		**$ 5,512,283.00**		**$ 5,512,283.00**		**$ -**
VI	**CONCRETOS**																
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**																
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	700.00	$ 3,927.00	$ 2,748,900.00	439.00	$ 1,723,953.00	-	$ -	439.00	$ 1,723,953.00	439.00	$ 1,723,953.00	-	$ -
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	65.00	$ 64,328.00	$ 4,181,320.00	81.52	$ 5,244,019.00	-	$ -	81.08	$ 5,215,714.00	81.08	$ 5,215,714.00	0.44	$ 28,304.00
Subtotal					**$ 6,930,220.00**		**$ 6,967,972.00**		**$ -**		**$ 6,939,667.00**		**$ 6,939,667.00**		**$ 28,304.00**
XI	**DRENAJES**																
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	4.00	$ 422,631.00	$ 1,690,524.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	6.00	$ 1,159,538.00	$ 6,957,228.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 8,647,752.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
XII	**NO PREVISTOS**																
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: **22 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00 **PRORROGA 1:** Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00 **PRORROGA 2:** Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00 **PRORROGA 3:** N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

Subtotal			**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$** -		**$** -		**$** -		**$** -
SUBTOTAL OBRAS			**$ 144,744,877.00**		**$ 12,480,255.00**		**$** -		**$ 12,451,950.00**		**$ 12,451,950.00**		**$ 28,304.00**

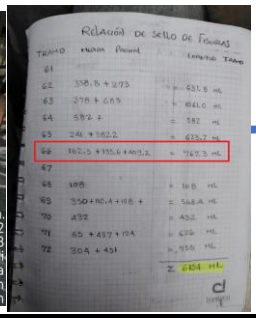
SUBTOTAL OBRAS			**$ 144,744,877.00**		**$ 12,480,255.00**		**$** -		**$ 12,451,950.00**		**$ 12,451,950.00**		**$ 28,304.00**
Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA (2,02%)			**$ 2,923,847.00**		**$ 252,101.00**		**$** -		**$** -		**$** -		**$** -
Plan de Manejo de Transito - PMT (2,65%)			**$ 3,835,739.00**		**$ 330,727.00**		**$** -		**$** -		**$** -		**$** -
VALOR TOTAL			**$ 151,504,463.00**		**$ 13,063,083.00**		**$** -		**$ 12,451,950.00**		**$ 12,451,950.00**		**$ 28,304.00**

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	V	**PAVIMENTO ASFALTICO**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	49	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN**		
UNIDAD	ML			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 66	1.00	767.3			767.30

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	767.30
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	767.30
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	767.30
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	 

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	767.30
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	767.30
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	767.30
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	IX	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	FECHA:	22-nov-24
ITEM	105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.			
UNIDAD	ML			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 66 - KR 5 ENTRE CLL 2 Y CLL3 LINEA CONTINUA	2.00	112			224.00
TRAMO 66 - KR 5 ENTRE CLL 2 Y CLL3 LINEA DISCONTINUA	1.00	45			45.00
TRAMO 66 - KR 5 ENTRE CLL 3 Y CLL 4 LINEA CONTINUA	2.00	85			170.00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	439.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	439.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	439.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	439.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	439.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	439.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

RESIDENTE DE OBRA:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XI	DRENAJES	FECHA:	22-nov-24
ITEM	106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.			
UNIDAD	M2			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 66 - KR 5 ENTRE CLL 2 Y CLL3 CEBRA	16.00	4.0000	0.4		25.60
TRAMO 66 - KR 5 ENTRE CLL 2 Y CLL3 CEBRA COMPLEMENTO	1.00	10.7	0.4		4.28
TRAMO 66 - KR 5 ENTRE CLL 2 Y CLL3 LINEA PARE	1.00	5	0.6		3.00
TRAMO 66 - KR 5 ENTRE CLL 2 Y CLL3 FLECHA DE FRENTE	3.00	1.2			3.60
TRAMO 66 - KR 5 ENTRE CLL 2 Y CLL3 FLECHA DOBLE	1.00	2.2			2.20
TRAMO 66 - KR 5 ENTRE CLL 3 Y CLL 4 CEBRA	19.00	4	0.4		30.40
TRAMO 66 - KR 5 ENTRE CLL 3 Y CLL 4 CEBRA COMPLEMENTO	1.00	14	0.4		5.60
TRAMO 66 - KR 5 ENTRE CLL 3 Y CLL 4 LINEA PARE	1.00	5	0.6		3.00
TRAMO 66 - KR 5 ENTRE CLL 3 Y CLL 4 FLECHA DE FRENTE	1.00	1.2			1.20
TRAMO 66 - KR 5 ENTRE CLL 3 Y CLL 4 FLECHA DOBLE	1.00	2.2			2.20

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	81.08
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	81.52
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	81.08
TOTAL POR EJECUTAR	0.44

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	81.08
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	81.52
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	81.08
TOTAL POR EJECUTAR	0.44

RESIDENTE DE OBRA:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

SOPORTES PRE ACTA DE RECIBO PARCIAL No.: 02

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Alcaldia de Santiago de Cali

PRE ACTA DE RECIBIO PARCIAL TRAMO 67 (SAN ANTONIO)

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

				FECHA DE ELABORACION:	**22 DE NOVIEMBRE DE 2024**
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1				
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

LOTE 03 - COMUNA 02 SEGUNDO SECTOR Y COMUNA 08

FRENTE 67 - CARRERA 4 ENTRE CLL 1 a 3

		CONDICIONES CONTRACTUALES				**CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1**		**EJECUCION**							
								ACTAS ANTERIORES		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				**CANTIDADES ACTUALIZADAS**									
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1,716.00	$ 0.00	1,333.23	$ 2,287,823.00	1,333.23	$ 2,287,823.00	-	$ -	1,333.23	$ 2,287,823.00	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	377.00	$ 6,356.00	$ 2,396,212.00	459.60	$ 2,921,218.00	245.00	$ 1,557,220.00	214.60	$ 1,363,998.00	459.60	$ 2,921,218.00	-	$ -
Subtotal					**$ 2,396,212.00**		**$ 5,209,041.00**		**$ 3,845,043.00**		**$ 1,363,998.00**		**$ 5,209,041.00**		**$ -**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	115.00	$ 22,513.00	$ 2,588,995.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	120.00	$ 9,327.00	$ 1,119,240.00	334.12	$ 3,116,337.00	-	$ -	334.12	$ 3,116,337.00	334.12	$ 3,116,337.00	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103,237.00	$ 0.00	108.79	$ 11,231,529.00	108.79	$ 11,231,529.00	-	$ -	108.79	$ 11,231,529.00	-	$ -
Subtotal					**$ 3,708,235.00**		**$ 14,347,866.00**		**$ 11,231,529.00**		**$ 3,116,337.00**		**$ 14,347,866.00**		**$ -**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	23.00	$ 10,545.00	$ 242,535.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60,034.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	23.00	$ 43,679.00	$ 1,004,617.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	2,290.09	$ 7,683,252.00	1,468.71	$ 4,927,522.00	821.38	$ 2,755,730.00	2,290.09	$ 7,683,252.00	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2,588,680.00	$ 0.00	1.00	$ 2,588,680.00	1.00	$ 2,588,680.00	-	$ -	1.00	$ 2,588,680.00	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	115.00	$ 8,282.00	$ 952,430.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 2,199,582.00**		**$ 10,271,932.00**		**$ 7,516,202.00**		**$ 2,755,730.00**		**$ 10,271,932.00**		**$ -**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	23.00	$ 212,313.00	$ 4,883,199.00	73.82	$ 15,672,946.00	44.98	$ 9,549,839.00	28.84	$ 6,123,107.00	73.82	$ 15,672,946.00	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	377.00	$ 28,591.00	$ 10,778,807.00	1,333.23	$ 38,118,379.00	1,333.23	$ 38,118,379.00	-	$ -	1,333.23	$ 38,118,379.00	-	$ -
Subtotal					**$ 15,662,006.00**		**$ 53,791,325.00**		**$ 47,668,218.00**		**$ 6,123,107.00**		**$ 53,791,325.00**		**$ -**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4,818.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	377.00	$ 4,652.00	$ 1,753,804.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7,184.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4,966.00	$ 0.00	2,666.46	$ 13,241,640.00	2,666.46	$ 13,241,640.00	-	$ -	2,666.46	$ 13,241,640.00	-	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	

SUPERVISOR:			SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ						**PERIODO PRESENTE ACTA**										
									DESDE EL:	12 DE OCTUBRE DE 2024		**HASTA EL:**			**HASTA EL:**	22 DE NOVIEMBRE DE 2024		
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,332,529.00	$ 0.00	105.87	$ 141,076,362.00	105.87	$ 141,076,362.00	-	$ -	105.87	$ 141,076,362.00	-	$ -				
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	75.40	$ 1,371,977.00	$ 103,447,066.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -				
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,425,083.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -				
Subtotal					**$ 105,200,870.00**		**$ 154,318,002.00**		**$ 154,318,002.00**		**$ -**		**$ 154,318,002.00**		**$ -**				
VI	**CONCRETOS**																		
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	135.20	$ 5,766,280.00	-	$ -	135.20	$ 5,766,280.00	135.20	$ 5,766,280.00	-	$ -				
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -				
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 5,766,280.00**		**$ -**		**$ 5,766,280.00**		**$ 5,766,280.00**		**$ -**				
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**																		
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	700.00	$ 3,927.00	$ 2,748,900.00	115.00	$ 451,605.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	115.00	$ 451,605.00				
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	65.00	$ 64,328.00	$ 4,181,320.00	64.42	$ 4,144,010.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	64.42	$ 4,144,010.00				
Subtotal					**$ 6,930,220.00**		**$ 4,595,615.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 4,595,615.00**				
XI	**DRENAJES**																		
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	4.00	$ 422,631.00	$ 1,690,524.00	1.00	$ 422,631.00	-	$ -	1.00	$ 422,631.00	1.00	$ 422,631.00	-	$ -				
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	6.00	$ 1,159,538.00	$ 6,957,228.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -				
Subtotal					**$ 8,647,752.00**		**$ 422,631.00**		**$ -**		**$ 422,631.00**		**$ 422,631.00**		**$ -**				
XII	**NO PREVISTOS**																		
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	450.58	$ 23,220,640.00	-	$ -	249.82	$ 12,874,474.00	249.82	$ 12,874,474.00	200.76	$ 10,346,167.00				
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -				
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	26.00	$ 36,175,136.00	-	$ -	26.00	$ 36,175,136.00	26.00	$ 36,175,136.00	-	$ -				
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	1,239.30	$ 10,208,114.00	-	$ -	1,239.30	$ 10,208,114.00	1,239.30	$ 10,208,114.00	-	$ -				
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	2.00	$ 1,640,808.00	-	$ -	2.00	$ 1,640,808.00	2.00	$ 1,640,808.00	-	$ -				
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -				
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	28.84	$ 1,072,098.00	-	$ -	28.84	$ 1,072,098.00	28.84	$ 1,072,098.00	-	$ -				

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

				FECHA DE ELABORACION:	**22 DE NOVIEMBRE DE 2024**
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ]	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

Subtotal			**$ 0.00**		**$ 72,316,796.00**		**$**	**-**		**$**	**61,970,630.00**		**$**	**61,970,630.00**	**$**	**10,346,167.00**
SUBTOTAL OBRAS			**$ 144,744,877.00**		**$ 321,039,488.00**		**$**	**224,578,994.00**		**$**	**81,518,713.00**		**$**	**306,097,707.00**	**$**	**14,941,782.00**


SUBTOTAL OBRAS	**$**	**-**		**$**	**-**		**$**	**224,578,994.00**		**$**	**81,518,713.00**		**$**	**306,097,707.00**	**$**	**14,941,782.00**
Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA (2,02%)	**$**	**-**		**$**	**-**		**$**	**-**		**$**	**-**		**$**	**-**	**$**	**-**
Plan de Manejo de Transito - PMT (2,65%)	**$**	**-**		**$**	**-**		**$**	**-**		**$**	**-**		**$**	**-**	**$**	**-**
VALOR TOTAL	**$**	**-**		**$**	**-**		**$**	**224,578,994.00**		**$**	**81,518,713.00**		**$**	**306,097,707.00**	**$**	**14,941,782.00**

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	II	**DEMOLICIONES**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	2	**LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).**		
UNIDAD	ML			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	
TRAMO 67 - CUNETA K0+000 SEMAFORO CALLE 1	1.00	166.00			166.00
TRAMO 67 - CUNETA CRUCE CALLE 1 CON CALLE 4	1.00	48.60			48.60

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	214.60
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	245.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	459.60
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	459.60
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	214.60
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	245.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	459.60
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	459.60
TOTAL POR EJECUTAR	0.00


RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	II	DEMOLICIONES	FECHA:	22-nov-24
ITEM	5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.		
UNIDAD	ML			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 67	1.00	24.50			24.50
TRAMO 67 - CUNETA K0+000 SEMAFORO CALLE 1	1.00	166.00			166.00
TRAMO 67 - CUNETA CRUCE CALLE 1 CON CALLE 4	1.00	48.60			48.60
TRAMO 67 - CUNETA ACCESOS VEHICULARES	1.00	31.10			31.10
TRAMO 67 - DILATACION DE PLACAS	1.00	63.92			63.92

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	334.12
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	334.12
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	334.12
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	334.12
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	334.12
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	334.12
TOTAL POR EJECUTAR	0.00


RESIDENTE DE OBRA:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	III	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE	FECHA:	22-nov-24
ITEM	23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.		
UNIDAD	M3/KM			

UBICACIÓN	DIMENSIONES					TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	FACTOR DE EXPANSION	DISTANCIA	
TRAMO 67 - CUNETA K0+000 SEMAFORO CALLE 1 - DEMOLICION	166.00	0.85	0.2	1.5	5	211.65
TRAMO 67 - CUNETA CRUCE CALLE 1 CON CALLE 4 - DEMOLICION	48.60	0.65	0.2	1.5	5	47.39
TRAMO 67 - CUNETA K0+000 SEMAFORO CALLE 1 - EXCAVACION	166.00	0.70	0.2	1.3	15	453.18
TRAMO 67 - CUNETA ACCESOS VEHICULARES - EXCAVACION	31.10	0.90	0.2	1.3	15	109.16

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	821.38
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	1,468.71
CANTIDAD CONTRACTUAL	2,290.09
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	2,290.09
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	821.38
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	1,468.71
CANTIDAD CONTRACTUAL	2,290.09
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	2,290.09
TOTAL POR EJECUTAR	0.00


RESIDENTE DE OBRA:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	IV	**RELLENOS Y BASES**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	28	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.**		
UNIDAD	M3			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	
TRAMO 67 - CUNETA K0+000 SEMAFORO CALLE 1	1.00	166.00	0.7	0.2	23.24
TRAMO 67 - CUNETA ACCESOS VEHICULARES	1.00	31.10	0.9	0.2	5.60

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	28.84
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	44.98
CANTIDAD CONTRACTUAL	73.82
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	73.82
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	28.84
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	44.98
CANTIDAD CONTRACTUAL	73.82
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	73.82
TOTAL POR EJECUTAR	0.00


RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	VI	**CONCRETOS**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	76	**CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.**		
UNIDAD	ML			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	
TRAMO 67 - CUNETA K0+000 SEMAFORO CALLE 1	1.00	135.20			135.20

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	135.20
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	135.20
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	135.20
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	135.20
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	135.20
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	135.20
TOTAL POR EJECUTAR	0.00


RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XI	DRENAJES	FECHA:	22-nov-24
ITEM	119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.		
UNIDAD	UND			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 67 - K0+233 (EJE)	1.00				1.00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	1.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	1.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00


RESIDENTE DE OBRA:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XII	NO PREVISTOS	FECHA:	22-nov-24
ITEM	NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.		
UNIDAD	M2			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 67 - CUNETA K0+000 SEMAFORO CALLE 1 - DEMOLICION	1.00	166.00	0.85		141.10
TRAMO 67 - CUNETA CRUCE CALLE 1 CON CALLE 4 - DEMOLICION	1.00	48.60	0.65		31.59
TRAMO 67 - CUNETA ACCESOS VEHICULARES - DEMOLICION	1.00	31.10	0.90		27.99
TRAMO 67 - BORDILLO EXISTENTE - DEMOLICION	1.00	245.70	0.20		49.14

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	249.82
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	450.58
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	249.82
TOTAL POR EJECUTAR	200.76

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	249.82
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	450.58
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	249.82
TOTAL POR EJECUTAR	200.76


RESIDENTE DE OBRA:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XII	**NO PREVISTOS**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	NP-3	**CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.**		
UNIDAD	M3			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	
TRAMO 67 - CUNETA K0+000 SEMAFORO CALLE 1	1.00	166.00	0.70	0.15	17.44
TRAMO 67 - CUNETA CRUCE CALLE 1 CON CALLE 4	1.00	48.60	0.65	0.15	4.74
TRAMO 67 - CUNETA ACCESOS VEHICULARES	1.00	31.10	0.818	0.15	3.82

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	26.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	26.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	26.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	26.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	26.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	26.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00


RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XII	**NO PREVISTOS**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	NP-4	**REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.**		
UNIDAD	KG			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**PESO POR ML**		
TRAMO 67 - CUNETA K0+000 SEMAFORO CALLE 1	1.00	166.00	5.4		896.40
TRAMO 67 - CUNETA CRUCE CALLE 1 CON CALLE 4	1.00	48.60	3.6		174.96
TRAMO 67 - CUNETA ACCESOS VEHICULARES	1.00	31.10	5.4		167.94

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	1,239.30
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	1,239.30
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1,239.30
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	1,239.30
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	1,239.30
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1,239.30
TOTAL POR EJECUTAR	0.00


RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XII	NO PREVISTOS	FECHA:	22-nov-24
ITEM	NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).		
UNIDAD	UND			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 67 - K0+194	1.00				1.00
TRAMO 67 - K0+198	1.00				1.00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	2.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	2.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	2.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	2.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	2.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	2.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00


RESIDENTE DE OBRA:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XII	**NO PREVISTOS**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	NP-7	**EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)**		
UNIDAD	M3			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	
TRAMO 67 - CUNETA K0+000 SEMAFORO CALLE 1	1.00	166.00	0.7	0.2	23.24
TRAMO 67 - CUNETA ACCESOS	1.00	31.10	0.9	0.2	5.60

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	28.84
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	28.84
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	28.84
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	28.84
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	28.84
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	28.84
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

SOPORTES PRE ACTA DE RECIBO PARCIAL No.: 02

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Alcaldia de Santiago de Cali

PRE ACTA DE RECIBIO PARCIAL TRAMO 68 (SAN ANTONIO)

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ]	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

LOTE 03 - COMUNA 02 SEGUNDO SECTOR Y COMUNA 08

FRENTE 68 - CALLE 4 ENTRE CRA 5 a 10

		CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1		EJECUCION							
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS									
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR	Cant	VALOR
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1,716.00	$ 0.00	573.73	$ 984,521.00	573.73	$ 984,521.00	-	$ -	573.73	$ 984,521.00	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	377.00	$ 6,356.00	$ 2,396,212.00	141.27	$ 897,912.00	141.27	$ 897,912.00	-	$ -	141.27	$ 897,912.00	-	$ -
Subtotal					**$ 2,396,212.00**		**$ 1,882,433.00**		**$ 1,882,433.00**		**$ -**		**$ 1,882,433.00**		**$ -**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	115.00	$ 22,513.00	$ 2,588,995.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	120.00	$ 9,327.00	$ 1,119,240.00	24.50	$ 228,512.00	24.50	$ 228,512.00	-	$ -	24.50	$ 228,512.00	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103,237.00	$ 0.00	39.60	$ 4,088,198.00	39.60	$ 4,088,198.00	-	$ -	39.60	$ 4,088,198.00	-	$ -
Subtotal					**$ 3,708,235.00**		**$ 4,316,710.00**		**$ 4,316,710.00**		**$ -**		**$ 4,316,710.00**		**$ -**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	23.00	$ 10,545.00	$ 242,535.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60,034.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	23.00	$ 43,679.00	$ 1,004,617.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	534.60	$ 1,793,583.00	534.60	$ 1,793,583.00	-	$ -	534.60	$ 1,793,583.00	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2,588,680.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	115.00	$ 8,282.00	$ 952,430.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 2,199,582.00**		**$ 1,793,583.00**		**$ 1,793,583.00**		**$ -**		**$ 1,793,583.00**		**$ -**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	23.00	$ 212,313.00	$ 4,883,199.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	377.00	$ 28,591.00	$ 10,778,807.00	573.73	$ 16,403,514.00	573.73	$ 16,403,514.00	-	$ -	573.73	$ 16,403,514.00	-	$ -
Subtotal					**$ 15,662,006.00**		**$ 16,403,514.00**		**$ 16,403,514.00**		**$ -**		**$ 16,403,514.00**		**$ -**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4,818.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	377.00	$ 4,652.00	$ 1,753,804.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7,184.00	$ 0.00	1,108.90	$ 7,966,338.00	1,108.90	$ 7,966,338.00	-	$ -	1,108.90	$ 7,966,338.00	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4,966.00	$ 0.00	1,147.46	$ 5,698,286.00	1,147.46	$ 5,698,286.00	-	$ -	1,147.46	$ 5,698,286.00	-	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."		**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024	
			FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	

SUPERVISOR: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ

PERIODO PRESENTE ACTA

DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024 **HASTA EL:** **HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,332,529.00	$ 0.00	39.88	$ 53,141,416.00	39.88	$	53,141,416.00	-	$	-	39.88	$	53,141,416.00	-	$ -
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	75.40	$ 1,371,977.00	$ 103,447,066.00	-	$ 0.00	-	$	-	-	$	-	-	$	-	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,425,083.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$	-	-	$	-	-	$	-	-	$ -
Subtotal					**$ 105,200,870.00**		**$ 66,806,040.00**		**$**	**66,806,040.00**		**$**	**-**		**$**	**66,806,040.00**		**$ -**
VI	**CONCRETOS**																	
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$	-	-	$	-	-	$	-	-	$ -
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$	-	-	$	-	-	$	-	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$**	**-**		**$**	**-**		**$**	**-**		**$ -**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**																	
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	700.00	$ 3,927.00	$ 2,748,900.00	479.00	$ 1,881,033.00	-	$	-	479.00	$	1,881,033.00	479.00	$	1,881,033.00	-	$ -
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	65.00	$ 64,328.00	$ 4,181,320.00	95.96	$ 6,172,915.00	-	$	-	95.96	$	6,172,915.00	95.96	$	6,172,915.00	-	$ -
Subtotal					**$ 6,930,220.00**		**$ 8,053,948.00**		**$**	**-**		**$**	**8,053,948.00**		**$**	**8,053,948.00**		**$ -**
XI	**DRENAJES**																	
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	4.00	$ 422,631.00	$ 1,690,524.00	4.00	$ 1,690,524.00	-	$	-	4.00	$	1,690,524.00	4.00	$	1,690,524.00	-	$ -
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	6.00	$ 1,159,538.00	$ 6,957,228.00	-	$ 0.00	-	$	-	-	$	-	-	$	-	-	$ -
Subtotal					**$ 8,647,752.00**		**$ 1,690,524.00**		**$**	**-**		**$**	**1,690,524.00**		**$**	**1,690,524.00**		**$ -**
XII	**NO PREVISTOS**																	
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	17.96	$ 925,569.00	-	$	-	17.96	$	925,569.00	17.96	$	925,569.00	-	$ -
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	42.52	$ 680,405.00	-	$	-	42.52	$	680,405.00	42.52	$	680,405.00	-	$ -
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$	-	-	$	-	-	$	-	-	$ -
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$	-	-	$	-	-	$	-	-	$ -
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	10.00	$ 8,204,040.00	-	$	-	10.00	$	8,204,040.00	10.00	$	8,204,040.00	-	$ -
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	5.00	$ 780,435.00	-	$	-	5.00	$	780,435.00	5.00	$	780,435.00	-	$ -
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$	-	-	$	-	-	$	-	-	$ -

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: **22 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
		FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00 **PRORROGA 1:** Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00 **PRORROGA 2:** Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00 **PRORROGA 3:** N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	**PERIODO PRESENTE ACTA**	
		DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

Subtotal			**$ 0.00**		**$ 10,590,449.00**		**$** -		**$ 10,590,449.00**		**$ 10,590,449.00**		**$** -
SUBTOTAL OBRAS			**$ 144,744,877.00**		**$ 111,537,201.00**		**$ 91,202,280.00**		**$ 20,334,921.00**		**$ 111,537,201.00**		**$** -


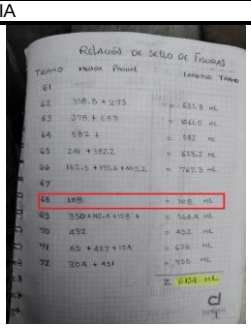
SUBTOTAL OBRAS			**$ 144,744,877.00**		**$ 111,537,201.00**		**$ 91,202,280.00**		**$ 20,334,921.00**		**$ 111,537,201.00**		**$** -
Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA (2,02%)			**$ 2,923,847.00**		**$ 2,253,051.00**		**$** -		**$** -		**$** -		**$** -
Plan de Manejo de Transito - PMT (2,65%)			**$ 3,835,739.00**		**$ 2,955,736.00**		**$** -		**$** -		**$** -		**$** -
VALOR TOTAL			**$ 151,504,463.00**		**$ 116,745,988.00**		**$ 91,202,280.00**		**$ 20,334,921.00**		**$ 111,537,201.00**		**$** -

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	V	**PAVIMENTO ASFALTICO**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	49	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN**		
UNIDAD	ML			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 68 - COBRADO ACTA No 1.	-1.00	1108.9			-1,108.90
TRAMO 68 - EJECUTADO	1.00	108			108.00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	-1,000.90
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	1,108.90
CANTIDAD CONTRACTUAL	1,108.90
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	108.00
TOTAL POR EJECUTAR	1,000.90

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	 

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	-1,000.90
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	1,108.90
CANTIDAD CONTRACTUAL	1,108.90
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	108.00
TOTAL POR EJECUTAR	1,000.90


RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	IX	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	FECHA:	22-nov-24
ITEM	105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.		
UNIDAD	ML			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 68 - CLL 4 ENTRE KR 10 Y KR 9 LINEA DISCONTINUA EJE	1.00	33			33.00
TRAMO 68 - CLL 4 ENTRE KR 10 Y KR 9 LINEA CONTINUA	2.00	73.5			147.00
TRAMO 68 - CL 4 ENTRE KR 9 Y KR 6 LINEA EJE	1.00	7			7.00
TRAMO 68 - CL 4 ENTRE KR 9 Y KR 6 LINEA CONTINUA	2.00	81			162.00
TRAMO 68 - CL 4 ENTRE KR 6 Y KR 5 LINEA CONTINUA	2.00	65			130.00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	479.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	479.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	479.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	479.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	479.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	479.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

RESIDENTE DE OBRA:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU


CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XI	DRENAJES	FECHA:	22-nov-24
ITEM	106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.			
UNIDAD	M2			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 68 - CLL 4 ENTRE KR 10 Y KR 9 CEBRA COSTADO KR 10	7.00	4	0.4		11.20
TRAMO 68 - CLL 4 ENTRE KR 10 Y KR 9 CEBRA COSTADO KR 9	7.00	4	0.4		11.20
TRAMO 68 - CLL 4 ENTRE KR 10 Y KR 9 CEBRA COMPLEMENTOS	1.00	3.21	0.4		1.28
TRAMO 68 - CLL 4 ENTRE KR 10 Y KR 9 LINEA PARE	1.00	6.4	0.6		3.84
TRAMO 68 - CLL 4 ENTRE KR 10 Y KR 9 FLECHA DE FRENTE	3.00	1.2			3.60
TRAMO 68 - CLL 4 ENTRE KR 10 Y KR 9 FLECHA GIRO DOBLE	1.00	2.2			2.20
TRAMO 68 - CLL 4 ENTRE KR 9 Y KR 6 CEBRA	14.00	4	0.4		22.40
TRAMO 68 - CLL 4 ENTRE KR 9 Y KR 6 CEBRA COMPLEMENTOS	1.00	3.4	0.4		1.36
TRAMO 68 - CLL 4 ENTRE KR 9 Y KR 6 LINEA PARE	1.00	5	0.6		3.00
TRAMO 68 - CLL 4 ENTRE KR 9 Y KR 6 FLECHA DE FRENTE	2.00	1.2			2.40
TRAMO 68 - CLL 4 ENTRE KR 9 Y KR 6 FLECHA DOBLE	1.00	2.2			2.20
TRAMO 68 - CLL 4 ENTRE KR 6 Y KR 5 CEBRA	16.00	4	0.4		25.60
TRAMO 68 - CLL 4 ENTRE KR 9 Y KR 6 FLECHA DE FRENTE	1.00	1.2			1.20
TRAMO 68 - CLL 4 ENTRE KR 9 Y KR 6 FLECHA DOBLE	1.00	2.2			2.20
TRAMO 68 - CLL 4 ENTRE KR 9 Y KR 6 LINEA PARE	1.00	3.8	0.6		2.28

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	95.96
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	95.96
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	95.96
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA



FOTOGRAFIA



CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XI	**DRENAJES**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	106	**DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.**		
UNIDAD	M2			

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	95.96
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	95.96
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	95.96
TOTAL POR EJECUTAR	0.00


RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XI	**DRENAJES**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	119	**NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.**		
UNIDAD	UND			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	
TRAMO 68 - K0+172,5 (EJE)	1.00				1.00
TRAMO 68 - K0+079,5 (EJE)	1.00				1.00
TRAMO 68 - K0+073 (EJE)	1.00				1.00
TRAMO 68 - K0+078 (EJE)	1.00				1.00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	4.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	4.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	4.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	4.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	4.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	4.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU


CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XII	NO PREVISTOS	FECHA:	22-nov-24
ITEM	NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.		
UNIDAD	M2			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 68	17.96				17.96

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	17.96
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	17.96
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	17.96
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA



FOTOGRAFIA



OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	17.96
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	17.96
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	17.96
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

RESIDENTE DE OBRA:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU


CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XII	**NO PREVISTOS**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	NP-2	**CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.**		
UNIDAD	ML			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	
TRAMO 68	1.00	42.52			42.52

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	42.52
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	42.52
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	42.52
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA



FOTOGRAFIA



OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	42.52
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	42.52
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	42.52
TOTAL POR EJECUTAR	0.00


RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XII	NO PREVISTOS	FECHA:	22-nov-24
ITEM	NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).		
UNIDAD	UND			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 68 - K0+255 (IZAQ)	1.00				1.00
TRAMO 68 - K0+184 (IZQ)	1.00				1.00
TRAMO 68 - K0+184 (DER)	1.00				1.00
TRAMO 68 - K0+173,5 (DER)	1.00				1.00
TRAMO 68 - K0+164 (IZQ)	1.00				1.00
TRAMO 68 - K0+164 (DER)	1.00				1.00
TRAMO 68 - K0+079,5 (DER)	1.00				1.00
TRAMO 68 - K0+078 (IZQ)	1.00				1.00
TRAMO 68 - K0+005 (DER)	1.00				1.00
TRAMO 68 - K0+000 (DER)	1.00				1.00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	10.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	10.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	10.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	10.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	10.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	10.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00


RESIDENTE DE OBRA:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XII	NO PREVISTOS	FECHA:	22-nov-24
ITEM	NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.		
UNIDAD	UND			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 68 - K0+173,5 (IZQ)	1.00				1.00
TRAMO 68 - K0+173,8 (IZQ)	1.00				1.00
TRAMO 68 - K0+068 (IZQ)	1.00				1.00
TRAMO 68 - K0+068,3 (IZQ)	1.00				1.00
TRAMO 68 - K0+068,5 (IZQ)	1.00				1.00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	5.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	5.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	5.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	5.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	5.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	5.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

RESIDENTE DE OBRA:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

SOPORTES PRE ACTA DE RECIBO PARCIAL No.: 02

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Alcaldia de Santiago de Cali

PRE ACTA DE RECIBIO PARCIAL TRAMO 69 (SAN ANTONIO)

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

				FECHA DE ELABORACION:	**22 DE NOVIEMBRE DE 2024**
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1				
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

LOTE 03 - COMUNA 02 SEGUNDO SECTOR Y COMUNA 08

FRENTE 69 - CALLE 3 ENTRE CRA 4 a 12

		CONDICIONES CONTRACTUALES				**CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1**		**EJECUCION**							
								ACTAS ANTERIORES		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				**CANTIDADES ACTUALIZADAS**									
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1,716.00	$ 0.00	59.30	$ 101,759.00	59.30	$ 101,759.00	-	$ -	59.30	$ 101,759.00	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	377.00	$ 6,356.00	$ 2,396,212.00	150.43	$ 956,133.00	150.43	$ 956,133.00	-	$ -	150.43	$ 956,133.00	-	$ -
Subtotal					**$ 2,396,212.00**		**$ 1,057,892.00**		**$ 1,057,892.00**		**$ -**		**$ 1,057,892.00**		**$ -**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	115.00	$ 22,513.00	$ 2,588,995.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	120.00	$ 9,327.00	$ 1,119,240.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103,237.00	$ 0.00	4.45	$ 459,405.00	4.45	$ 459,405.00	-	$ -	4.45	$ 459,405.00	-	$ -
Subtotal					**$ 3,708,235.00**		**$ 459,405.00**		**$ 459,405.00**		**$ -**		**$ 459,405.00**		**$ -**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	23.00	$ 10,545.00	$ 242,535.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60,034.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	23.00	$ 43,679.00	$ 1,004,617.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	60.07	$ 201,535.00	60.07	$ 201,535.00	-	$ -	60.07	$ 201,535.00	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2,588,680.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	115.00	$ 8,282.00	$ 952,430.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 2,199,582.00**		**$ 201,535.00**		**$ 201,535.00**		**$ -**		**$ 201,535.00**		**$ -**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	23.00	$ 212,313.00	$ 4,883,199.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	377.00	$ 28,591.00	$ 10,778,807.00	59.30	$ 1,695,446.00	59.30	$ 1,695,446.00	-	$ -	59.30	$ 1,695,446.00	-	$ -
Subtotal					**$ 15,662,006.00**		**$ 1,695,446.00**		**$ 1,695,446.00**		**$ -**		**$ 1,695,446.00**		**$ -**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4,818.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	377.00	$ 4,652.00	$ 1,753,804.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7,184.00	$ 0.00	568.40	$ 4,083,386.00	195.60	$ 1,405,190.00	372.80	$ 2,678,195.00	568.40	$ 4,083,386.00	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4,966.00	$ 0.00	118.60	$ 588,968.00	118.60	$ 588,968.00	-	$ -	118.60	$ 588,968.00	-	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL:	12 DE OCTUBRE DE 2024
				HASTA EL:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024

55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,332,529.00	$ 0.00	4.45	$ 5,929,754.00	4.45	$ 5,929,754.00	-	$ -	4.45	$ 5,929,754.00	-	$ -
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	75.40	$ 1,371,977.00	$ 103,447,066.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,425,083.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 105,200,870.00**		**$ 10,602,108.00**		**$ 7,923,912.00**		**$ 2,678,195.00**		**$ 10,602,108.00**		**$ -**
VI	**CONCRETOS**														
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**														
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	700.00	$ 3,927.00	$ 2,748,900.00	798.40	$ 3,135,317.00	-	$ -	798.40	$ 3,135,317.00	798.40	$ 3,135,317.00	-	$ -
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	65.00	$ 64,328.00	$ 4,181,320.00	163.76	$ 10,534,353.00	-	$ -	163.76	$ 10,534,353.00	163.76	$ 10,534,353.00	-	$ -
Subtotal					**$ 6,930,220.00**		**$ 13,669,670.00**		**$ -**		**$ 13,669,670.00**		**$ 13,669,670.00**		**$ -**
XI	**DRENAJES**														
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	4.00	$ 422,631.00	$ 1,690,524.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	6.00	$ 1,159,538.00	$ 6,957,228.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 8,647,752.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
XII	**NO PREVISTOS**														
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

				FECHA DE ELABORACION:	**22 DE NOVIEMBRE DE 2024**
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ]	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL:	12 DE OCTUBRE DE 2024
				HASTA EL:	
				HASTA EL:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024

Subtotal			**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$**	**-**		**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**
SUBTOTAL OBRAS			**$ 144,744,877.00**		**$ 27,686,056.00**		**$**	**11,338,190.00**		**$**	**16,347,865.00**	**$**	**27,686,056.00**	**$**	**-**

SUBTOTAL OBRAS		**$ 144,744,877.00**		**$ 27,686,056.00**		**$**	**11,338,190.00**		**$**	**16,347,865.00**	**$**	**27,686,056.00**	**$**	**-**
Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA (2,02%)		**$ 2,923,847.00**		**$ 559,258.00**		**$**	**-**		**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**
Plan de Manejo de Transito - PMT (2,65%)		**$ 3,835,739.00**		**$ 733,680.00**		**$**	**-**		**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**
VALOR TOTAL		**$ 151,504,463.00**		**$ 28,978,994.00**		**$**	**11,338,190.00**		**$**	**16,347,865.00**	**$**	**27,686,056.00**	**$**	**-**


CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	V	**PAVIMENTO ASFALTICO**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	49	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN**		
UNIDAD	ML			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 69	1.00	372.8			372.80

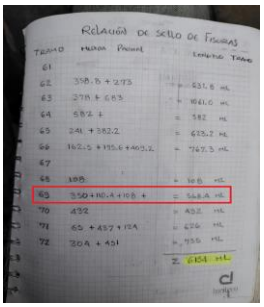
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	372.80
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	195.60
CANTIDAD CONTRACTUAL	568.40
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	568.40
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA



FOTOGRAFIA





OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	372.80
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	195.60
CANTIDAD CONTRACTUAL	568.40
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	568.40
TOTAL POR EJECUTAR	0.00


RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	IX	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	FECHA:	22-nov-24
ITEM	105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.		
UNIDAD	ML			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TRAMO 69 - CARRERA 4 A CARRERA 5 LINEA CONTINUA	2.00	81.40			162.80
TRAMO 69 - CARRERA 4 A CARRERA 5 LINEA DISCONTINUA	1.00	45.00			45.00
TRAMO 69 - CARRERA 5 A CARRERA 6 LINEA CONTINUA	2.00	45.50			91.00
TRAMO 69 - CARRERA 5 A CARRERA 6 LINEA DISCONTINUA	1.00	27.00			27.00
TRAMO 69 - CARRERA 6 A CARRERA 9 LINEA CONTINUA	2.00	70.00			140.00
TRAMO 69 - CARRERA 6 A CARRERA 9 LINEA DISCONTINUA	1.00	36.00			36.00
TRAMO 69 - CARRERA 9 A CARRERA 10 LINEA CONTINUA	2.00	45.30			90.60
TRAMO 69 - CARRERA 9 A CARRERA 10 LINEA DISCONTINUA	1.00	27.00			27.00
TRAMO 69 - CARRERA 10 A CARRERA 12 LINEA CONTINUA	2.00	71.50			143.00
TRAMO 69 - CARRERA 10 A CARRERA 12 LINEA DISCONTINUA	1.00	36.00			36.00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	798.40
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	798.40
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	798.40
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	798.40
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	798.40
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	798.40
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

RESIDENTE DE OBRA:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA


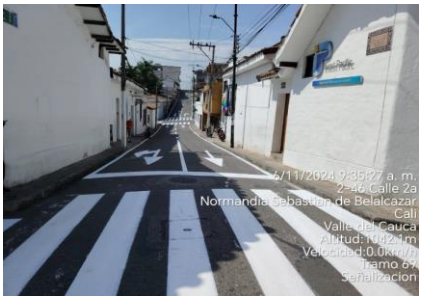
CAPÍTULO	XI	DRENAJES	FECHA:	22-nov-24
ITEM	106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.			
UNIDAD	M2			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	AREA		ALTURA	
TRAMO 69 - CARRERA 4 A CARRERA 5 CEBRA L= 4.0 m	15.00	4	0.4		24.00
TRAMO 69 - CARRERA 4 A CARRERA 5 CEBRA COMPLEMENTO L= variable	1.00	11.61	0.4		4.64
TRAMO 69 - CARRERA 4 A CARRERA 5 LINEA PARE	1.00	5.2	0.6		3.12
TRAMO 69 - CARRERA 4 A CARRERA 5 FLECHA DE FRENTE	2.00	1.2			2.40
TRAMO 69 - CARRERA 4 A CARRERA 5 FLECHA GIRO UNICO	2.00	1.8			3.60
TRAMO 69 - CARRERA 5 A CARRERA 6 CEBRA L= 4.0 m	9.00	4	0.4		14.40
TRAMO 69 - CARRERA 5 A CARRERA 6 CEBRA COMPLEMENTO L= variable	1.00	12.4	0.4		4.96
TRAMO 69 - CARRERA 5 A CARRERA 6 LINEA PARE	1.00	5.3	0.6		3.18
TRAMO 69 - CARRERA 5 A CARRERA 6 FLECHA DE FRENTE	2.00	1.2			2.40
TRAMO 69 - CARRERA 5 A CARRERA 6 FLECHA DOBLE	1.00	2.2			2.20
TRAMO 69 - CARRERA 6 A CARRERA 9 CEBRA L= 4.0 m	13.00	4	0.4		20.80
TRAMO 69 - CARRERA 6 A CARRERA 9 LINEA PARE	1.00	5.3	0.6		3.18
TRAMO 69 - CARRERA 6 A CARRERA 9 FLECHA DE FRENTE	3.00	1.2			3.60
TRAMO 69 - CARRERA 6 A CARRERA 9 FLECHA GIRO DOBLE	1.00	2.2			2.20
TRAMO 69 - CARRERA 9 A CARRERA 10 CEBRA L= 4.0 m	14.00	4	0.4		22.40
TRAMO 69 - CARRERA 9 A CARRERA 10 LINEA PARE	1.00	4.8	0.6		2.88
TRAMO 69 - CARRERA 9 A CARRERA 10 FLECHA DE FRENTE	3.00	1.2			3.60
TRAMO 69 - CARRERA 9 A CARRERA 10 FLECHA DOBLE	1.00	2.2			2.20
TRAMO 69 - CARRERA 10 A CARRERA 12 CEBRA L=4.0 m	15.00	4	0.4		24.00
TRAMO 69 - CARRERA 10 A CARRERA 12 CEBRA COMPLEMENTO L= variable	1.00	11.8	0.4		4.72
TRAMO 69 - CARRERA 10 A CARRERA 12 LINEA PARE	1.00	5.8	0.6		3.48
TRAMO 69 - CARRERA 10 A CARRERA 12 FLECHA DE FRENTE	3.00	1.2			3.60
TRAMO 69 - CARRERA 10 A CARRERA 12 FLECHA GIRO DOBLE	1.00	2.2			2.20

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	163.76
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	163.76
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	163.76
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XI	**DRENAJES**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	106	**DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.**		
UNIDAD	M2			

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	163.76
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	163.76
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	163.76
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

SOPORTES PRE ACTA DE RECIBO PARCIAL No.: 02

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Alcaldia de Santiago de Cali

PRE ACTA DE RECIBIO PARCIAL TRAMO 70 (SAN ANTONIO)

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: **22 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PRORROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PRORROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PRORROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

LOTE 03 - COMUNA 02 SEGUNDO SECTOR Y COMUNA 08

FRENTE 70 - CALLE 3 OESTE ENTRE CARRERAS 10 Y 12

CONDICIONES CONTRACTUALES						**CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1**		**EJECUCIÓN**							
								ACTAS ANTERIORES		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				**CANTIDADES ACTUALIZADAS**									
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1,716.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	377.00	$ 6,356.00	$ 2,396,212.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 2,396,212.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	115.00	$ 22,513.00	$ 2,588,995.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	120.00	$ 9,327.00	$ 1,119,240.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103,237.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 3,708,235.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	23.00	$ 10,545.00	$ 242,535.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60,034.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	23.00	$ 43,679.00	$ 1,004,617.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2,588,680.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	115.00	$ 8,282.00	$ 952,430.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 2,199,582.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	23.00	$ 212,313.00	$ 4,883,199.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	377.00	$ 28,591.00	$ 10,778,807.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 15,662,006.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4,818.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	377.00	$ 4,652.00	$ 1,753,804.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7,184.00	$ 0.00	432.00	$ 3,103,488.00	-	$ -	432.00	$ 3,103,488.00	432.00	$ 3,103,488.00	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4,966.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,332,529.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	75.40	$ 1,371,977.00	$ 103,447,066.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,425,083.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 105,200,870.00**		**$ 3,103,488.00**		**$ -**		**$ 3,103,488.00**		**$ 3,103,488.00**		**$ -**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

				FECHA DE ELABORACION:	**22 DE NOVIEMBRE DE 2024**
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

VI	**CONCRETOS**															
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**															
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	700.00	$ 3,927.00	$ 2,748,900.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	65.00	$ 64,328.00	$ 4,181,320.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
Subtotal					**$ 6,930,220.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
XI	**DRENAJES**															
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	4.00	$ 422,631.00	$ 1,690,524.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	6.00	$ 1,159,538.00	$ 6,957,228.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
Subtotal					**$ 8,647,752.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
XII	**NO PREVISTOS**															
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	

SUBTOTAL OBRAS					**$ 144,744,877.00**		**$ 3,103,488.00**		**$ -**		**$ 3,103,488.00**		**$ 3,103,488.00**		**$ -**	

SUBTOTAL OBRAS					**$ 144,744,877.00**		**$ 3,103,488.00**		**$ -**		**$ 3,103,488.00**		**$ 3,103,488.00**		**$ -**	
Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA (2,02%)					**$ 2,923,847.00**		**$ 62,690.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
Plan de Manejo de Transito - PMT (2,65%)					**$ 3,835,739.00**		**$ 82,242.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
VALOR TOTAL					**$ 151,504,463.00**		**$ 3,248,420.00**		**$ -**		**$ 3,103,488.00**		**$ 3,103,488.00**		**$ -**	

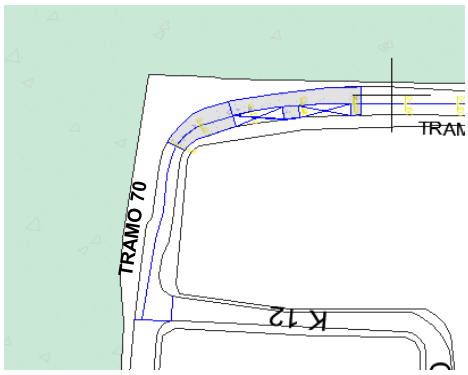
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	V	PAVIMENTO ASFALTICO	FECHA:	22-nov-24
ITEM	49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN		
UNIDAD	ML			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTURA	
TRAMO 70	1.00	432.00			432.00

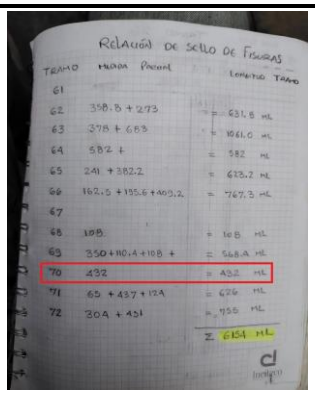
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	432.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	432.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	432.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA



FOTOGRAFIA





OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	432.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	432.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	432.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

RESIDENTE DE OBRA:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

SOPORTES PRE ACTA DE RECIBO PARCIAL No.: 02

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Alcaldia de Santiago de Cali

PRE ACTA DE RECIBIO PARCIAL TRAMO 71 (SAN ANTONIO)

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

				FECHA DE ELABORACION:	**22 DE NOVIEMBRE DE 2024**
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ] **NUMERO:** 901.853.381-1				
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

LOTE 03 - COMUNA 02 SEGUNDO SECTOR Y COMUNA 08

FRENTE 71 - CALLE 1 ENTRE CARRERAS 4 Y 10

		CONDICIONES CONTRACTUALES				**CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1**		**EJECUCION**							
								ACTAS ANTERIORES		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				**CANTIDADES ACTUALIZADAS**									
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1,716.00	$ 0.00	1,598.46	$ 2,742,957.00	1,598.46	$ 2,742,957.00	-	$ -	1,598.46	$ 2,742,957.00	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	377.00	$ 6,356.00	$ 2,396,212.00	491.50	$ 3,123,974.00	491.50	$ 3,123,974.00	-	$ -	491.50	$ 3,123,974.00	-	$ -
Subtotal					**$ 2,396,212.00**		**$ 5,866,931.00**		**$ 5,866,931.00**		**$ -**		**$ 5,866,931.00**		**$ -**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	115.00	$ 22,513.00	$ 2,588,995.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	120.00	$ 9,327.00	$ 1,119,240.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103,237.00	$ 0.00	123.43	$ 12,742,607.00	123.43	$ 12,742,607.00	-	$ -	123.43	$ 12,742,607.00	-	$ -
Subtotal					**$ 3,708,235.00**		**$ 12,742,607.00**		**$ 12,742,607.00**		**$ -**		**$ 12,742,607.00**		**$ -**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	23.00	$ 10,545.00	$ 242,535.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60,034.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	23.00	$ 43,679.00	$ 1,004,617.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	1,666.31	$ 5,590,470.00	1,666.31	$ 5,590,470.00	-	$ -	1,666.31	$ 5,590,470.00	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2,588,680.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	115.00	$ 8,282.00	$ 952,430.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 2,199,582.00**		**$ 5,590,470.00**		**$ 5,590,470.00**		**$ -**		**$ 5,590,470.00**		**$ -**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	23.00	$ 212,313.00	$ 4,883,199.00	4.58	$ 972,394.00	4.58	$ 972,394.00	-	$ -	4.58	$ 972,394.00	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	377.00	$ 28,591.00	$ 10,778,807.00	1,598.46	$ 45,701,570.00	1,598.46	$ 45,701,570.00	-	$ -	1,598.46	$ 45,701,570.00	-	$ -
Subtotal					**$ 15,662,006.00**		**$ 46,673,964.00**		**$ 46,673,964.00**		**$ -**		**$ 46,673,964.00**		**$ -**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4,818.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	377.00	$ 4,652.00	$ 1,753,804.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7,184.00	$ 0.00	626.00	$ 4,497,184.00	-	$ -	626.00	$ 4,497,184.00	626.00	$ 4,497,184.00	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4,966.00	$ 0.00	3,196.92	$ 15,875,905.00	3,196.92	$ 15,875,905.00	-	$ -	3,196.92	$ 15,875,905.00	-	$ -

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	

SUPERVISOR:			SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ						**PERIODO PRESENTE ACTA**									
									DESDE EL:	12 DE OCTUBRE DE 2024		**HASTA EL:**			**HASTA EL:**	22 DE NOVIEMBRE DE 2024		
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,332,529.00	$ 0.00	151.00	$ 201,214,370.00	151.00	$ 201,214,370.00	-	$ -	151.00	$ 201,214,370.00	-	$ -
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	75.40	$ 1,371,977.00	$ 103,447,066.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,425,083.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 105,200,870.00**		**$ 221,587,459.00**		**$ 217,090,275.00**		**$ 4,497,184.00**		**$ 221,587,459.00**		**$ -**
VI	**CONCRETOS**														
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**														
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	700.00	$ 3,927.00	$ 2,748,900.00	824.30	$ 3,237,026.00	-	$ -	824.30	$ 3,237,026.00	824.30	$ 3,237,026.00	-	$ -
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	65.00	$ 64,328.00	$ 4,181,320.00	156.48	$ 10,066,045.00	-	$ -	156.48	$ 10,066,045.00	156.48	$ 10,066,045.00	-	$ -
Subtotal					**$ 6,930,220.00**		**$ 13,303,071.00**		**$ -**		**$ 13,303,071.00**		**$ 13,303,071.00**		**$ -**
XI	**DRENAJES**														
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	4.00	$ 422,631.00	$ 1,690,524.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	6.00	$ 1,159,538.00	$ 6,957,228.00	4.00	$ 4,638,152.00	2.00	$ 2,319,076.00	2.00	$ 2,319,076.00	4.00	$ 4,638,152.00	-	$ -
Subtotal					**$ 8,647,752.00**		**$ 4,638,152.00**		**$ 2,319,076.00**		**$ 2,319,076.00**		**$ 4,638,152.00**		**$ -**
XII	**NO PREVISTOS**														
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	15.53	$ 800,339.00	-	$ -	15.53	$ 800,339.00	15.53	$ 800,339.00	-	$ -
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	7.00	$ 5,742,828.00	-	$ -	7.00	$ 5,742,828.00	7.00	$ 5,742,828.00	-	$ -
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: **22 DE NOVIEMBRE DE 2024**

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** [X] **CC** [ ]	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL:	12 DE OCTUBRE DE 2024
				HASTA EL:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024

Subtotal			**$ 0.00**		**$ 6,543,167.00**		**$**	**-**		**$**	**6,543,167.00**	**$**	**6,543,167.00**	**$**	**-**
SUBTOTAL OBRAS			**$ 144,744,877.00**		**$ 316,945,821.00**		**$**	**290,283,323.00**		**$**	**26,662,498.00**	**$**	**316,945,821.00**	**$**	**-**

SUBTOTAL OBRAS		**$**	**-**		**$**	**-**		**$**	**290,283,323.00**	**$**	**26,662,498.00**	**$**	**316,945,821.00**	**$**	**-**
Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA (2,02%)		**$**	**-**		**$**	**-**		**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**
Plan de Manejo de Transito - PMT (2,65%)		**$**	**-**		**$**	**-**		**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**
VALOR TOTAL		**$**	**-**		**$**	**-**		**$**	**290,283,323.00**	**$**	**26,662,498.00**	**$**	**316,945,821.00**	**$**	**-**

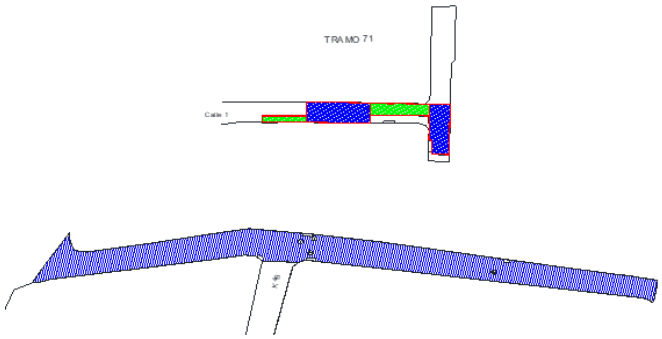
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	V	**PAVIMENTO ASFALTICO**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	49	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN**		
UNIDAD	ML			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTURA	
TRAMO 71	1.00	626.00			626.00

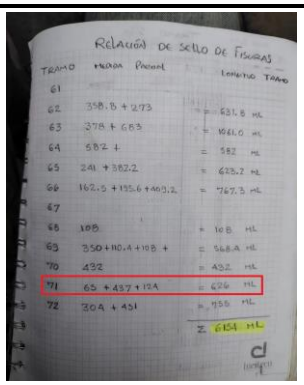
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	626.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	626.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	626.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA



FOTOGRAFIA





OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	626.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	626.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	626.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

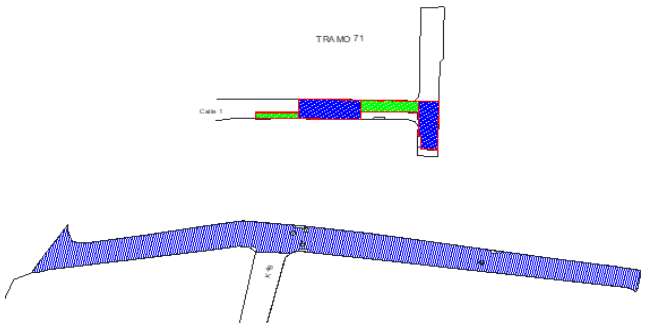
RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	IX	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	FECHA:	22-nov-24
ITEM	105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.			
UNIDAD	ML			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTURA	
TRAMO 71 - KR9 DESDE CL 1 A CL 2 LINEA CONTINUA	2.00	31.00			62.00
TRAMO 71 - KR9 DESDE CL 1 A CL 2 LINEA DISCONTINUA	1.00	21.00			21.00
TRAMO 71 - CL 1 OE CON KR10 A KR 12 LINEA CONTINUA	1.00	110.30			110.30
TRAMO 71 - CL 1 OE CON KR10 A KR 12 LINEA DISCONTINUA	1.00	27.00			27.00
TRAMO 71 - KR 10 CON CL 1 OE A CL 1 LINEA CONTINUA	2.00	53.00			106.00
TRAMO 71 - KR 10 CON CL 1 OE A CL 1 LINEA DISCONTINUA	1.00	30.00			30.00
TRAMO 71 - CL 1 CON KR4 A KR 10 LINEA CONTINUA BLANCA	1.00	316.00			316.00
TRAMO 71 - CL 1 CON KR4 A KR 10 LINEA AMARILLA	1.00	152.00			152.00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	824.30
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	824.30
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	824.30
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	824.30
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	824.30
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	824.30
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

RESIDENTE DE OBRA:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

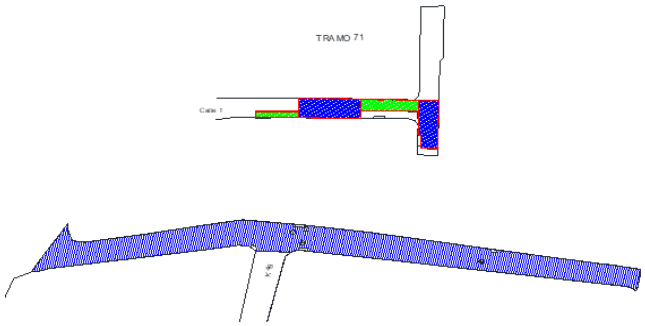
CAPÍTULO	XI	DRENAJES	FECHA:	22-nov-24
ITEM	106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.			
UNIDAD	M2			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTURA	
TRAMO 71 - KR9 DESDE CL 1 A CL 2 CEBRA L=4.0 m	19.00	4	0.4		30.40
TRAMO 71 - KR9 DESDE CL 1 A CL 2 CEBRA COMPLEMENTO L= variable	1.00	12.5	0.4		5.00
TRAMO 71 - KR9 DESDE CL 1 A CL 2 LINEA PARE	1.00	6.5	0.6		3.90
TRAMO 71 - KR9 DESDE CL 1 A CL 2 FLECHA DE FRENTE	3.00	1.2			3.60
TRAMO 71 - KR9 DESDE CL 1 A CL 2 FLECHA GIRO DOBLE	1.00	2.2			2.20
TRAMO 71 - CL 1 OE CON KR10 A KR 12 CEBRA L=4.0 m	14.00	4	0.4		22.40
TRAMO 71 - CL 1 OE CON KR10 A KR 12 CEBRA COMPLEMENTO L= variable	1.00	8	0.4		3.20
TRAMO 71 - CL 1 OE CON KR10 A KR 12 LINEA PARE	1.00	5.6	0.6		3.36
TRAMO 71 - CL 1 OE CON KR10 A KR 12 FLECHA DE FRENTE	3.00	1.2			3.60
TRAMO 71 - CL 1 OE CON KR10 A KR 12 FLECHA GIRO DOBLE	1.00	2.2			2.20
TRAMO 71 - KR 10 CON CL 1 OE A CL 1 CEBRA L=4.0 m	7.00	4	0.4		11.20
TRAMO 71 - KR 10 CON CL 1 OE A CL 1 CEBRA COMPLEMENTO L= variable	1.00	4	0.4		1.60
TRAMO 71 - KR 10 CON CL 1 OE A CL 1 LINEA PARE	1.00	5.8	0.6		3.48
TRAMO 71 - KR 10 CON CL 1 OE A CL 1 FLECHA DE FRENTE	3.00	1.2			3.60
TRAMO 71 - KR 10 CON CL 1 OE A CL 1 FLECHA GIRO DOBLE	1.00	2.2			2.20
TRAMO 71 - CL 1 CON KR4 A KR 10 CEBRA L=4.0 m	17.00	4	0.4		27.20
TRAMO 71 - CL 1 CON KR4 A KR 10 CEBRA COMPLEMENTO L= variable	1.00	20	0.4		8.00
TRAMO 71 - CL 1 CON KR4 A KR 10 LINEA PARE	1.00	6.9	0.6		4.14
TRAMO 71 - CL 1 CON KR4 A KR 10 FLECHA DE FRENTE	4.00	1.2			4.80
TRAMO 71 - CL 1 CON KR4 A KR 10 FLECHA GIRO AMBOS SENTIDOS	1.00	2.8			2.80
TRAMO 71 - CL 1 CON KR4 A KR 10 FLECHA GIRO DOBLE	2.00	2.2			4.40
TRAMO 71 - CL 1 CON KR4 A KR 10 FLECHA GIRO TRIPLE	1.00	3.2			3.20

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	156.48
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	156.48
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	156.48
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XI	**DRENAJES**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	106	**DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.**		
UNIDAD	M2			

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	156.48
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	156.48
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	156.48
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

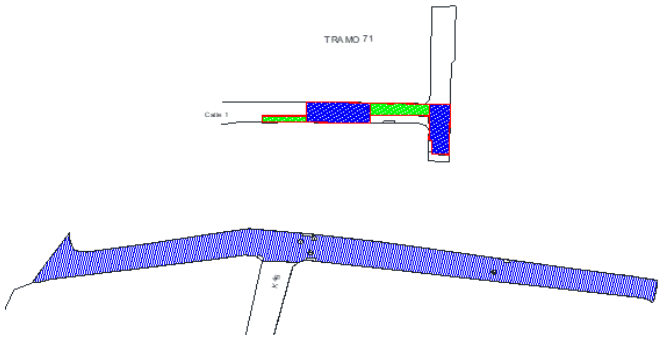
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XI	DRENAJES	FECHA:	22-nov-24
ITEM	126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).		
UNIDAD	UND			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTURA	
TRAMO 71 - K0+415 (IZQ)	1.00				1.00
TRAMO 71 - K0+250 (IZQ)	1.00				1.00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	2.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	2.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	4.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	4.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA



FOTOGRAFIA



OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	2.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	2.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	4.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	4.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

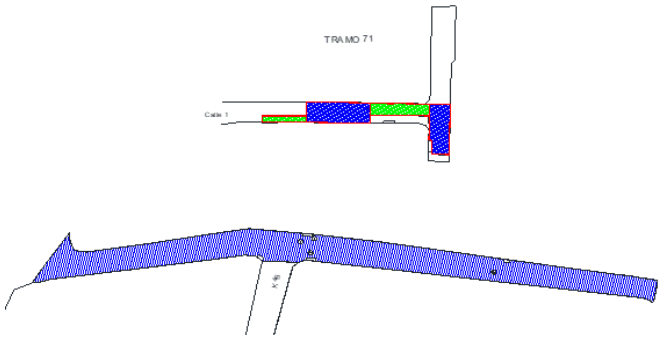
RESIDENTE DE OBRA:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XII	NO PREVISTOS	FECHA:	22-nov-24
ITEM	NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.		
UNIDAD	M2			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTURA	
TRAMO 71	1.00	15.53			15.53

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	15.53
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	15.53
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	15.53
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	15.53
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	15.53
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	15.53
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

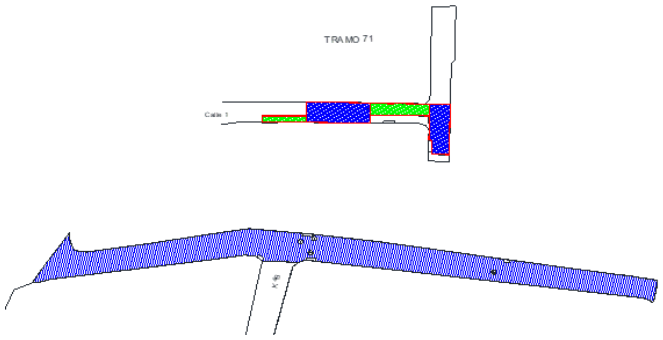
RESIDENTE DE OBRA:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XII	NO PREVISTOS	FECHA:	22-nov-24
ITEM	NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).		
UNIDAD	UND			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTURA	
TRAMO 71 - K0+315 (IZQ)	1.00				1.00
TRAMO 71 - K0+360 (IZQ)	1.00				1.00
TRAMO 71 - K0+360 (DER)	1.00				1.00
TRAMO 71 - K0+417 (DER)	1.00				1.00
TRAMO 71 - K0+478 (IZQ)	1.00				1.00
TRAMO 71 - K0+475 (DER)	1.00				1.00
TRAMO 71 - K0+200 (DER)	1.00				1.00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	7.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	7.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	7.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	7.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	7.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	7.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

RESIDENTE DE OBRA:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

SOPORTES PRE ACTA DE RECIBO PARCIAL No.: 02

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Alcaldia de Santiago de Cali

PRE ACTA DE RECIBIO PARCIAL TRAMO 72 (SAN ANTONIO)

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

				FECHA DE ELABORACION:	**22 DE NOVIEMBRE DE 2024**
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PRORROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PRORROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PRORROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

LOTE 03 - COMUNA 02 SEGUNDO SECTOR Y COMUNA 08

FRENTE 72 - CALLE 2 ENTRE CARRERAS 4 Y 12

CONDICIONES CONTRACTUALES						**CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No.1**		**EJECUCION**							
								ACTAS ANTERIORES		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO A LA FECHA**		**PENDIENTE POR EJECUTAR**	
		CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES				**CANTIDADES ACTUALIZADAS**									
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**	**Cant**	**VALOR**
I	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1,716.00	$ 0.00	621.70	$ 1,066,837.00	621.70	$ 1,066,837.00	-	$ -	621.70	$ 1,066,837.00	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	377.00	$ 6,356.00	$ 2,396,212.00	346.00	$ 2,199,176.00	346.00	$ 2,199,176.00	-	$ -	346.00	$ 2,199,176.00	-	$ -
Subtotal					**$ 2,396,212.00**		**$ 3,266,013.00**		**$ 3,266,013.00**		**$ -**		**$ 3,266,013.00**		**$ -**
II	**DEMOLICIONES**														
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	115.00	$ 22,513.00	$ 2,588,995.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	120.00	$ 9,327.00	$ 1,119,240.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 103,237.00	$ 0.00	48.00	$ 4,955,095.00	48.00	$ 4,955,095.00	-	$ -	48.00	$ 4,955,095.00	-	$ -
Subtotal					**$ 3,708,235.00**		**$ 4,955,095.00**		**$ 4,955,095.00**		**$ -**		**$ 4,955,095.00**		**$ -**
III	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**														
17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	23.00	$ 10,545.00	$ 242,535.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 60,034.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	23.00	$ 43,679.00	$ 1,004,617.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3,355.00	$ 0.00	647.96	$ 2,173,906.00	647.96	$ 2,173,906.00	-	$ -	647.96	$ 2,173,906.00	-	$ -
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB		$ 2,588,680.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	115.00	$ 8,282.00	$ 952,430.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 2,199,582.00**		**$ 2,173,906.00**		**$ 2,173,906.00**		**$ -**		**$ 2,173,906.00**		**$ -**
IV	**RELLENOS Y BASES**														
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	23.00	$ 212,313.00	$ 4,883,199.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	377.00	$ 28,591.00	$ 10,778,807.00	621.70	$ 17,775,025.00	621.70	$ 17,775,025.00	-	$ -	621.70	$ 17,775,025.00	-	$ -
Subtotal					**$ 15,662,006.00**		**$ 17,775,025.00**		**$ 17,775,025.00**		**$ -**		**$ 17,775,025.00**		**$ -**
V	**PAVIMENTO ASFALTICO**														
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4,818.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	377.00	$ 4,652.00	$ 1,753,804.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7,184.00	$ 0.00	755.00	$ 5,423,920.00	713.20	$ 5,123,629.00	41.80	$ 300,291.00	755.00	$ 5,423,920.00	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML		$ 14,328.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	RIEGO DE LIGA PARA ÁREAS.	M2		$ 4,966.00	$ 0.00	1,243.40	$ 6,174,724.00	1,243.40	$ 6,174,724.00	-	$ -	1,243.40	$ 6,174,724.00	-	$ -
55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,332,529.00	$ 0.00	48.73	$ 64,930,510.00	48.73	$ 64,930,510.00	-	$ -	48.73	$ 64,930,510.00	-	$ -
56	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA DE RODADURA	M3	75.40	$ 1,371,977.00	$ 103,447,066.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1,425,083.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal					**$ 105,200,870.00**		**$ 76,529,154.00**		**$ 76,228,863.00**		**$ 300,291.00**		**$ 76,529,154.00**		**$ -**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No.: 02
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024

FECHA DE ELABORACION: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.	4151.010.26.1.0745-2024 de 2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT** X **CC**	**NUMERO:**	901.853.381-1		
OBJETO :	LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."			**FECHA DE INICIO:**	21 DE AGOSTO DE 2024
				FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3,381,779,970.00	**PRORROGA 1:**	Quince (15) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 1:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICION No.1	$ 78,525,153.00	**PRORROGA 2:**	Siete (07) dias	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 2:**	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	$ 3,460,305,123.00	**PRORROGA 3:**	N/A	**FECHA DE FINALIZACION PROROGA 3:**	
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			**PERIODO PRESENTE ACTA**	
				DESDE EL: 12 DE OCTUBRE DE 2024	**HASTA EL:** 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

VI	**CONCRETOS**															
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL Y REFUERZO.	ML		$ 42,650.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 92,763.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
IX	**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**															
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	700.00	$ 3,927.00	$ 2,748,900.00	494.70	$ 1,942,687.00	-	$ -	494.70	$ 1,942,687.00	494.70	$ 1,942,687.00	-	$ -
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	65.00	$ 64,328.00	$ 4,181,320.00	116.90	$ 7,519,943.00	-	$ -	116.90	$ 7,519,943.00	116.90	$ 7,519,943.00	-	$ -
Subtotal					**$ 6,930,220.00**		**$ 9,462,630.00**		**$ -**		**$ 9,462,630.00**		**$ 9,462,630.00**		**$ -**	
XI	**DRENAJES**															
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	4.00	$ 422,631.00	$ 1,690,524.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	6.00	$ 1,159,538.00	$ 6,957,228.00	1.00	$ 1,159,538.00	-	$ -	1.00	$ 1,159,538.00	1.00	$ 1,159,538.00	-	$ -	-
Subtotal					**$ 8,647,752.00**		**$ 1,159,538.00**		**$ -**		**$ 1,159,538.00**		**$ 1,159,538.00**		**$ -**	
XII	**NO PREVISTOS**															
NP-1	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 51,535.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
NP-2	CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	ML		$ 16,002.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3		$ 1,391,619.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
NP-4	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 8,237.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
NP-5	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND		$ 820,404.00	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 156,087.00	$ 0.00	6.00	$ 936,522.00	-	$ -	6.00	$ 936,522.00	6.00	$ 936,522.00	-	$ -	-
NP-7	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3		$ 37,174.00	$ 0.00	2.00	$ 74,348.00	-	$ -	2.00	$ 74,348.00	2.00	$ 74,348.00	-	$ -	-
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 1,010,870.00**		**$ -**		**$ 1,010,870.00**		**$ 1,010,870.00**		**$ -**	
SUBTOTAL OBRAS					**$ 144,744,877.00**		**$ 116,332,231.00**		**$ 104,398,902.00**		**$ 11,933,329.00**		**$ 116,332,231.00**		**$ -**	

SUBTOTAL OBRAS					**$ -**		**$ -**		**$ 104,398,902.00**		**$ 11,933,329.00**		**$ 116,332,231.00**		**$ -**	
Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA (2,02%)					**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
Plan de Manejo de Transito - PMT (2,65%)					**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
VALOR TOTAL					**$ -**		**$ -**		**$ 104,398,902.00**		**$ 11,933,329.00**		**$ 116,332,231.00**		**$ -**	

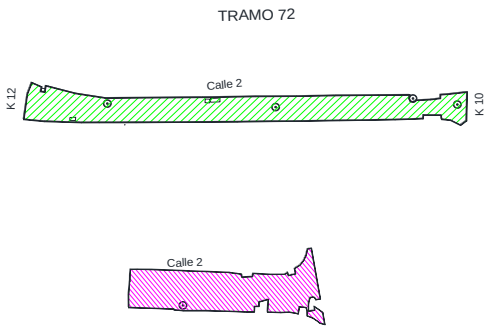
CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	V	**PAVIMENTO ASFALTICO**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	49	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN**		
UNIDAD	ML			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTURA**	
TRAMO 72	1.00	41.80			41.80

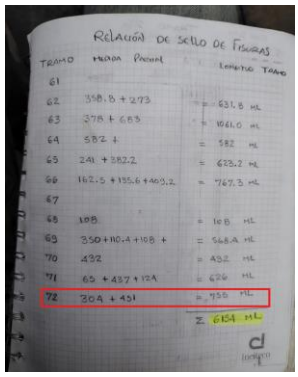
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	41.80
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	713.20
CANTIDAD CONTRACTUAL	755.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	755.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA



FOTOGRAFIA





OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	41.80
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	713.20
CANTIDAD CONTRACTUAL	755.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	755.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

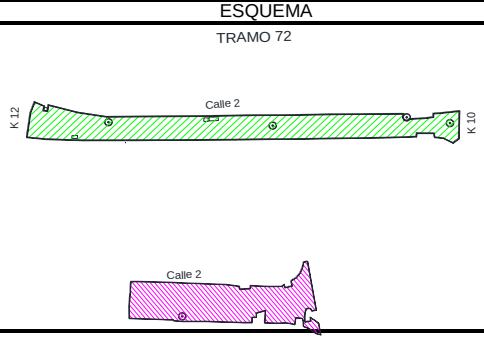
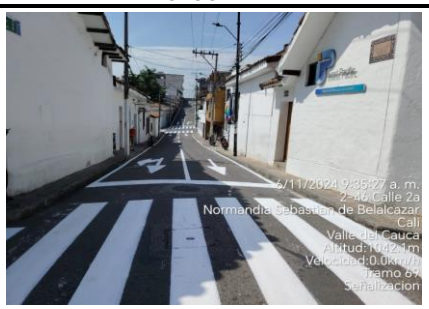
RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	IX	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	FECHA:	22-nov-24
ITEM	105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.			
UNIDAD	ML			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTURA	
TRAMO 72 - CL 2 ENTRE KR 10 Y KR 9 LINEA CONTINUA	2.00	66.00			132.00
TRAMO 72 - CL 2 ENTRE KR 9 Y KR 5 LINEA CONTINUA	2.00	48.35			96.70
TRAMO 72 - CL 2 ENTRE KR 4 Y KR 5 LINEA EJE IZQUIERDO	1.00	125.5			125.50
TRAMO 72 - CL 2 ENTRE KR 4 Y KR 5 LINEA EJE CENTRAL	1.00	15			15.00
TRAMO 72 - CL 2 ENTRE KR 4 Y KR 5 LINEA EJE DERECHO	1.00	125.5			125.50

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	494.70
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	494.70
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	494.70
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	494.70
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	494.70
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	494.70
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

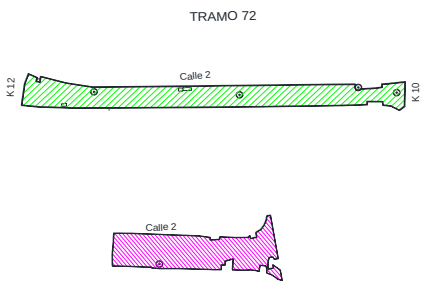
RESIDENTE DE OBRA:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XI	DRENAJES	FECHA:	22-nov-24
ITEM	106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.			
UNIDAD	M2			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTURA	
TRAMO 72 - CL 2 ENTRE KR 10 Y KR 9 CEBRA L=4.0 m	15.00	4	0.4		24.00
TRAMO 72 - CL 2 ENTRE KR 10 Y KR 9 CEBRA COMPLEMENTO L= variable	1.00	11	0.4		4.40
TRAMO 72 - CL 2 ENTRE KR 10 Y KR 9 LINEA PARE	1.00	5.8	0.6		3.48
TRAMO 72 - CL 2 ENTRE KR 10 Y KR 9 FLECHA DE FRENTE	1.00	1.2			1.20
TRAMO 72 - CL 2 ENTRE KR 10 Y KR 9 FLECHA GIRO UNICO	1.00	1.8			1.80
TRAMO 72 - CL 2 ENTRE KR 9 Y KR 5 CEBRA L=4.0 m	18.00	4	0.4		28.80
TRAMO 72 - CL 2 ENTRE KR 9 Y KR 5 LINEA PARE	1.00	6.3	0.6		3.78
TRAMO 72 - CL 2 ENTRE KR 9 Y KR 5 FLECHA DE FRENTE	2.00	1.2			2.40
TRAMO 72 - CL 2 ENTRE KR 9 Y KR 5 FLECHA GIRO DOBLE	2.00	2.2			4.40
TRAMO 72 - CL 2 ENTRE KR 4 Y KR 5 CEBRA L=4.0 m	17.00	4	0.4		27.20
TRAMO 72 - CL 2 ENTRE KR 4 Y KR 5 CEBRA COMPLEMENTO L= variable	1.00	20.5	0.4		8.20
TRAMO 72 - CL 2 ENTRE KR 4 Y KR 5 LINEA PARE	1.00	4.4	0.6		2.64
TRAMO 72 - CL 2 ENTRE KR 4 Y KR 5 FLECHA DE FRENTE	2.00	1.2			2.40
TRAMO 72 - CL 2 ENTRE KR 4 Y KR 5 FLECHA GIRO DOBLE	1.00	2.2			2.20

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	116.90
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	116.90
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	116.90
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XI	**DRENAJES**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	106	**DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.**		
UNIDAD	M2			

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	116.90
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	116.90
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	116.90
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

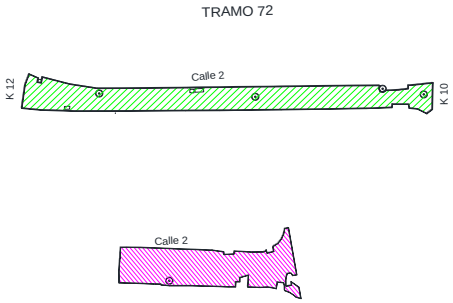
RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XI	**DRENAJES**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	126	**REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).**		
UNIDAD	UND			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTURA**	
TRAMO 72 - K0+074 (DER)	1.00				1.00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	1.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	1.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

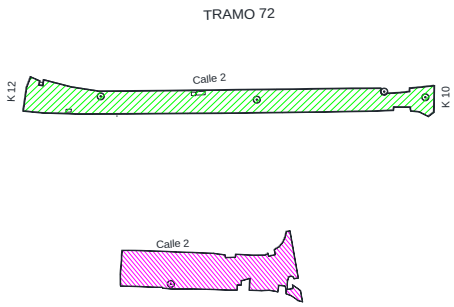
RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XII	NO PREVISTOS	FECHA:	22-nov-24
ITEM	NP-6	NIVELACIÓN DE CAJA DOMICILIARIA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.		
UNIDAD	UND			

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTURA	
TRAMO 72 - K0+034 (DER)	1.00				1.00
TRAMO 72 - K0+034,5 (DER)	1.00				1.00
TRAMO 72 - K0+035 (DER)	1.00				1.00
TRAMO 72 - K0+036 (IZQ)	1.00				1.00
TRAMO 72 - K0+007 (DER)	1.00				1.00
TRAMO 72 - K0+002 (IZQ)	1.00				1.00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	6.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	6.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	6.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	6.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	6.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	6.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

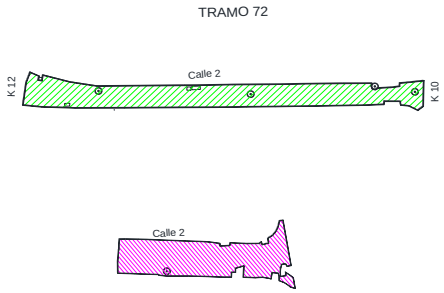
RESIDENTE DE OBRA:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU

CONTRATO No.4151.010.26.1.0745-2024 de 2024//CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO //LOTE 3 "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI."	MEMORIAS DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	XII	**NO PREVISTOS**	FECHA:	22-nov-24
ITEM	NP-7	**EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)**		
UNIDAD	M3			

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	CANTIDAD	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTURA**	
TRAMO 72 - NIVELACION CAJAS	2.00				2.00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	2.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	2.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	2.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

ESQUEMA	FOTOGRAFIA
	

OBSERVACIONES:

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	2.00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD CONTRACTUAL	2.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	2.00
TOTAL POR EJECUTAR	0.00

RESIDENTE DE OBRA:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:**
ING. ROVINSON RIVERA	ING. MILENA KATHERINE MORENO
T.P. N°25202-097533 CND	T.P. N° 19202-120697 CAU
