Educación

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
No. CO1.PCCNTR.5090635 DE 2023

Agosto 26 de 2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial


Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

LÍNEA MEJORAMIENTO

25 PROCESOS DE OBRA
PROCESOS DE INTV

$ 116.450

370 Proyectos

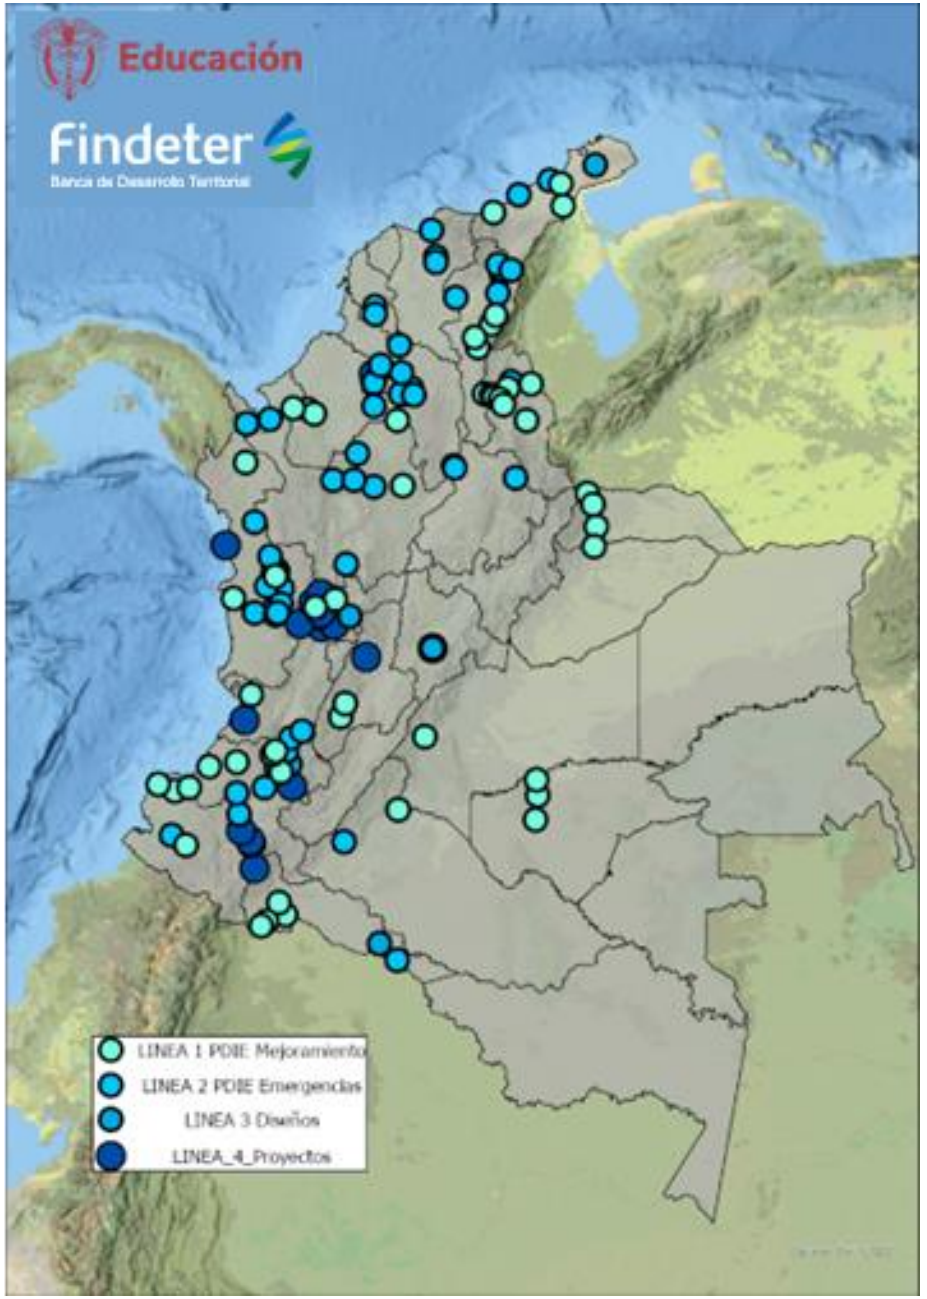

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Numero	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	No. Sedes	GRUPO	ESTADO OBRA	ESTADO INTERVENTORIA	CONVOCATORIA DE OBRA	CONVOCATORIA DE INTERVENTORIA	PROPONENTES ADJUDICADOS	% AVANCE
Grupo 1	Rioblanco	Tolima	16	32	EN EJECUCION INICIO: 01/02/2024 FIN: 09/09/2024	EN EJECUCION INICIO: 01/02/2024 FIN: 09/11/2024	PAF-MENPNIE-O-090-2023	PAF-MENPNIE-I-085-2023	CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S	93%
	Chaparral	Tolima	16						CONSTRUOBRAS C&M SAS	
Grupo 2	Tame	Arauca	20	20	SUSPENDIDO 17/07/2024	SUSPENDIDO 17/07/2024	PAF-MENPNIE-O-091-2023	PAF-MENPNIE-I-086-2023	CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS TAME	49,5 %
									CONSORCIO INTERVENTORES 086	
Grupo 3	Saravena	Arauca	4	11	EN EJECUCIÓN 21/07/2024	EN EJECUCIÓN 21/07/2024	PAF-MENPNIE-O-092-2023	PAF-MENPNIE-I-087-2023	SITTCA CONSTRUCCIONES S.A.S.	41.65%
	Fortul	Arauca	3							
	Hato Corozal	Casanare	4						CONSORCIO SAN JOSUE	
Grupo 4	Timbiquí	Cauca	10	10	EN CONTRATACION DERIVADA PARA CONV. PRIVADA	SUSPENDIDO	PAF-MENPNIE-O-093-2023	PAF-MENPNIE-I-088-2023		0%
									Publicado 5 de agosto	
Grupo 5	Morales	Cauca	8	13	EN EJECUCIÓN INICIO: 19/02/2024 FIN: 19/11/2024	EN EJECUCIÓN INICIO: 19/02/2024 FIN: 19/01/2025	PAF-MENPNIE-O-094-2023	PAF-MENPNIE-I-089-2023	NATALIA MARCELA ROSERO PALACIOS	81,93%
	Piendamó	Cauca	5						CONSORCIO FINDETER G3	
Grupo 6	Suárez	Cauca	7	14	CONTRATACION DIRECTA EN PROCESO DE INVITACIÓN	CONTRATACION DIRECTA EN PROCESO DE INVITACIÓN	PAF-MENPNIE-O-49-2024	PAF-MENPNIE-I-050-2024		0%
	Buenos Aires	Cauca	7						En Comité técnico	
Grupo 7	López	Cauca	16	16	EN CONTRATACION DERIVADA PARA CONV. PRIVADA	SUSPENDIDO	PAF-MENPNIE-O-095-2023	PAF-MENPNIE-I-090-2023		0%
									Publicado 5 de agosto	
Grupo 8	Bajo Baudó	Chocó	3	17	EN ESTRUCTURACIÓN PARA UN NUEVO PROCESO (el 23/08, se llevó a cabo una Rueda de negocios con 3 empresas)	SUSPENDIDO	PAF-MENPNIE-O-096-2023	PAF-MENPNIE-I-091-2023		0%
	Riosucio	Chocó	1						HABILITADOS 3	
	Quibdó	Chocó	13							
Grupo 9	La Jagua De Ibirico	Cesar	7	23	EN EJECUCIÓN 26/02/2024	EN EJECUCIÓN 26/02/2024	PAF-MENPNIE-O-097-2023	PAF-MENPNIE-I-092-2023	CONSORCIO EDUCATIVO CESAR	30 %
	Curumaní	Cesar	6							
	Chiriguana	Cesar	4						INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S	
	Becerril	Cesar	5							
Grupo 10	Valencia	Córdoba	15	18	TERMINADO 15/08/2024	EN EJECUCIÓN 15/02/2024	PAF-MENPNIE-O-098-2023	PAF-MENPNIE-I-093-2023	AZUL CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA S.A.S,	100,00%
	San Pedro de Urabá	Antioquia	3						CONSTRUOBRAS C&M S.A.S,	
Grupo 11	Tierralta	Córdoba	23	23	EN EJECUCIÓN 15/02/2024	EN EJECUCIÓN 15/02/2024	PAF-MENPNIE-O-099-2023	PAF-MENPNIE-I-094-2023	CONSORCIO NUEVO HORIZONTE	94,97%
									CONSORCIO INTER-EDUCATIVO	
Grupo 12	La Tola	Nariño	6	13	ADJUDICADA : $2.628.232.452,00 ACTA DE COMITE FIDUCIARIO No 54 del 12/07/2024- perfeccionamiento de contrato y tramite de pólizas	DESIERTA (Informado por el Comité de Contratación No. 136, sesionado el 30 de julio de 2024)	DIRECTA: PAF-MENPNIE-O-088-2024	PRIVADA: PAF-MENPNIE-I-075-2024	CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA NARIÑO	0%
	Santa Barbara	Nariño	6							
	Mosquera	Nariño	1							
Grupo 13	Barbacoas	Nariño	15	15	EN EJECUCIÓN 30/04/2024 Con Apremio #1 en Firme y Con Apremio # 2 en Proceso	EN EJECUCIÓN 30/04/2024 Con 1 Apremio en Proceso	PAF-MENPNIE-O-115-2023	PAF-MENPNIE-I-113-2023	CONSTRUCCIONES B&M S.A.S.	1,38%
									UNIÓN TEMPORAL BARBACOAS	

Estado contrataciones derivadas

Numero	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	No. Sedes	GRUPO	OBRA	INTERVENTORIA	CONVOCATORIA DE OBRA	CONVOCATORIA DE INTERVENTORIA	PROPONENTES ADJUDICADOS	% AVANCE
Grupo 14	Puerto Asís	Putumayo	10	21	EN EJECUCION 12/06/2024	EN EJECUCION 12/06/2024	PAF-MENPNIE-O-106-2023	PAF-MENPNIE-I-104-2023	CONSORCIO PUTUMAYO 2024	2%
	Valle Guamez	Putumayo	5						ALFA & OMEGA INGENIEROS S.A.S	
	San Miguel	Putumayo	4							
	Puerto Caicedo	Putumayo	2							
Grupo 15	Tibú	Norte de Santander	9	16	EN EJECUCION 17/06/24	EN EJECUCION 17/06/24	PAF-MENPNIE-O-034-2024	PAF-MENPNIE-I-109-2023	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTOS ESCUELAS FINDETER GRUPO 15.	2,25%
	El Tarra	Norte de Santander	7						CONSORCIO SAN MARTIN 109	
Grupo 16	El Carmen	Norte de Santander	5	14	RUEDA DE NEGOCICOS	SUSPENDIDA	PAF-MENPNIE-O-118-2023	PAF-MENPNIE-I-116-2023		0%
	Convención	Norte de Santander	9							
Grupo 17	Teorama	Norte de Santander	5	14	EN ESTRUCTURACION PARA UN NUEVO PROCESO (recientemente, el 14/08/2024 Rueda de Negocios)	SUSPENDIDO	PAF-MENPNIE-O-025-2024	PAF-MENPNIE-I-100-2023		0%
	San Calixto	Norte de Santander	4							
	Hacarí	Norte de Santander	5						HABILITADOS 3	
Grupo 18	Sardinata	Norte de Santander	16		RETIRADO	RETIRADO				
Grupo 19	Segovia	Antioquia	3	11	EN EJECUCION 09/05/2024	EN EJECUCION 09/05/2024	PAF-MENPNIE-O-116-2023	PAF-MENPNIE-I-114-2023	CONSTRUCCIONES B & M S.A.S	5,96%
	Nechí	Antioquia	8						CONSORCIO INESGON	
Grupo 20	Quinchia	Risaralda	3	12	EN EJECUCIÓN 16/08/2024	EN EJECUCIÓN 16/08/2024	PAF-MENPNIE-O-051-2024	PAF-MENPNIE-I-017-2024	UNIÓN TEMPORAL MARCELLA 6	1%
	Mistrató	Risaralda	4						CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20	
	Apia	Risaralda	1							
	Marsella	Risaralda	3							
	Guatica	Risaralda	1							
Grupo 21	Uribia	La Guajira	21	21	EN EJECUION 21/4/2024	EN EJECUION 21/4/2024	PAF-MENPNIE-O-120-2023	PAF-MENPNIE-I-117-2023	SITTCA CONSTRUCCIONES S.A.S.	1.36% - EN PROCESO DE APREMIO
									CONSORCIO CDG GUAJIRA	
Grupo 22	Dibulla	La Guajira	6	6	EN EJECUCIÓN 29/02/2024	EN EJECUCIÓN 29/02/2024	PAF-MENPNIE-O-113-2023	PAF-MENPNIE-I-108-2023	CONSOCIO VERTICE	38.98% - SUSPENDIDO OP
									CAMILO PEDRAZA	
Grupo 23	Maicao	La Guajira	21	21	EN EJECUCIÓN 02/07/2024	EN EJECUCIÓN 02/07/2024	PAF-MENPNIE-O-022-2024	PAF-MEPENIE-I-020-2024	CONSORCIO AULAS MAICAO 2024	C1: 100% Contrato Total:2.03%
									ROBERTO JOSÉ CUELLO BUCHAAR	

Estado contrataciones derivadas

Numero	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	No. Sedes	GRUPO	OBRA	INTERVENTORIA	CONVOCATORIA DE OBRA	CONVOCATORIA DE INTERVENTORIA	PROPONENTES	% AVANCE
Grupo 24	El Retorno	Guaviare	4	16	ADJUDICADO $4.990.202.000,00 Acta del Comité Fiduciario 43 Sesionada entre el 4 al 5 de junio de 2024 (el 22/08, se llevó a cabo reunión de Contextualización)	ADJUDICADO $329.395.922,00 Acta del Comité Fiduciario 45 Sesionada entre el 7 al 11 de junio del 2024 (el 22/08, se llevó a cabo reunión de Contextualización)	PAF-MENPNIE-O-073-2024	PAF-MENPNIE-I-115-2023	CARLOS DARÍO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	0%
	San José Del Guaviare	Guaviare	8							
	Calamar	Guaviare	2						CONSORCIO INTERVENTORES GC 115	
	San Vicente del Caguán	Caquetá	1							
	Uribe	Meta	1							
Grupo 25	Buenaventura	Valle del cauca	15	15	En ejecución 0,5%	En ejecución 0,5%	PAF-MENPNIE-O-043-2024	PAF-MENPNIE-I-034-2024	CONSORCIO G25 2024	0,5%
									CONSORCIO OM INGENIEROS	
Grupo 26	Pueblo Rico	Risaralda	12	12	Acta de inicio 16/08/2024	Acta de inicio 16/08/2024	PAF-MENPNIE-O-050-2024	PAF-MENPNIE-I-018-2024	GRUPO TITANIUM SAS	0%
									CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26	

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 1, departamento del Tolima

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



Sede Camilo Torres



Sede Las Mirlas



Sede Los Angeles



Sede El Cedral



Sede Los Cristales



Sede Las Mercedes

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



Sede Los Guayabos



Sede Campohermoso



Sede Las Palmas



Sede el Diamante



Sede San Rafael



Brisas del Parman

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

SOCIALIZACIONES DE CIERRE









SEDES: 32
TERMINADAS: 24
EJECUCION: 8
ENTREGADAS: 24
ACTA FIRMADA: 6
ACTA EN PROCESO: 18

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



Sede Agustin Nieto Caballero



Sede La Unión



Sede Bajo Cusay



Sede Nápoles 1



Sede Alto Cauca



Sede Gonzalo Jiménez de Quesada

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



Sede Caño Limón



Sede Aires de Monte Alegre



Sede Antonio Ricaurte



Sede La Palestina



Sede Los Turpiales

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 3, Arauca y Casanare

REGISTRO FOTOGRAFICO



Sede El Jardín. Saravena. Arauca.



Sede José Odel Lizarazo. Saravena Arauca



Sede Policarpa Salavarrieta. Fortul. Arauca



Sede Alejandro Humboldt. Fortul. Arauca



Sede Epifanio Mejía. Saravena. Arauca.

Programado: 78.17%

Ejecutado: 41.65%

Retraso: 36.12%

SEDES POR INICIAR: (6)

- ***EL Edén. Fortul. Arauca.***
- ***Centro indígena San Emilio. Saravena. Arauca.***
- ***Girasoles. Hato Corozal. Casanare***
- ***El Suni. Hato Corozal. Casanare***
- ***Las Tapias. Hato Corozal. Casanare***
- ***San Luis Beltrán. Hato Corozal. Casanare***

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



Sede El Rosal



Sede Pan de Azucar



Sede la Floresta



Sede Mataredonda



Sede El Maco



Sede Corrales principal

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



Sede El Oasis



Sede Caña Dulce



Sede Integrada



Sede Antonio Rada Principal



Sede Los Pinos



Sede El Diviso

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

SEDE VILLARICA – ALCANCE PROPUESTO



- Cambio de teja **bloque auditorio** (incluye bajantes)
- Cambio de teja e implementación de estructura metálica para el **bloque de biblioteca y administración** (incluye mantenimiento de estructura existente, canales bajantes).
- Enchape de piso y pintura **bloque de biblioteca**
- Adecuación de baterías sanitarias (**3 baterías sanitarias**)
- Reposición de **cocina comedor** (incluye cambio de cubierta, canales, bajantes, pinturas enchapes)











CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



SEDE CASA BLANCA – BECERRIL



SEDE LAS PIÑAS - BECERRIL



SEDE EL CENTRO - BECERRIL



SEDE EL REMOLINO – BECERRIL



SEDE ARGENTINA NORTE – LA JAGUA DE IBIRICO



SEDE ARACORAIMA– LA JAGUA DE IBIRICO



LA TRINIDAD– LA JAGUA DE IBIRICO



SEDE EL ZUMBADOR ALTO – LA JAGUA DE IBIRICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



MARTIN EMILIO HERNANDEZ – LA JAGUA DE IBIRICO



SEDE LA LIBERTAD – LA JAGUA DE IBIRICO



SEDE EL CENTRO - BECERRIL



SEDE CAMPO ALEGRE – CURUMANI



SEDE PARAISO PORVENIR – CURUMANI



SEDE LA CONQUISTA No 2- CURUMANI



SEDE NUEVA IDEA – CURUMANI



SAN RAFAEL – CURUMANI

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



AGUA FRIA-
CHIRIGUANA



ANIME-CHIRIGUANA



EL HATILLO-
CHIRIGUANA

Tomas de muestras estudios de suelo: San Isidro









LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 10, Departamentos. (Córdoba. y Antioquia)

Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



Sede Manuela Beltrán Ppal



Sede Catalino Gulfo Ppal



I.E. Antonia Santos Sede Los Ángeles



I.E. Camilo Torres Sede Camilo Torres



I.E. Manuela Beltrán Sede El Bongo



I.E. Mata de Maíz Sede Ppal

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 10, Departamentos. (Córdoba y Antioquía)

Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



Sede María Auxiliadora



Sede Nstra. Sra. Del Carmen ; El Pital



I.E. José María Carbonell



I.E. Antonia Santos Sede Ppal.



I.E. las Nubes Sede Las Cruces



I.E. Mata de Maíz Sede Brillante Sta. Clara

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 10, Departamentos (Córdoba y Antioquia)

Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



I.E. Villanueva Sede Tinajones



I.E. Antonia Santos Sede Guásimo Central



I.E. Sn. Pablo Apóstol Sede Sta. Rosa



I.E. Antonia Santos Sede Guadal Piedra



I.E. Antonio Nariño Sede Pelayito

PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL DE GRUPO 10		
Programado	100,00%	
Ejecutado	100,00%	

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 11, Departamento de Córdoba

Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



IE CAMPOBELLO



IE 1 DE MAYO



IE CAMPAMENTO



IE SAN JOSE



IE 1 LA OSSA



IE CARRIZOLA

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 11, Departamento de Córdoba

Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



IE CAÑA FINA



IE ANTONIO SANTOS



IE ANTONIO NARIÑO



IE SAN RAFAEL



IE 1 LA ESMERALDA



IE JUNIN

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 11, Departamento de Córdoba

Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



IE KOREDO



IE LOS VOLCANES



IE NUEVA PAZ



IE SANTA ANA



IE TUIS TUIS



IE PUEBLO NUEVO

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



Sede Candillas



Sede Guelmambi Caraño



Sede Anzamapi



Sede Honda Río Guisa



Sede Chimbagal

Sede Guelmambi

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 13, Departamento. (Nariño)

Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO





Sede Chagui




Sede San Antonio






Sede Pambil





Sede Guiguay



Sede Tigrillo



Sede El Playón

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 13, Departamento. (Nariño)

REGISTRO FOTOGRAFICO



Sede Alto Pali



Sede Guayabal



Sede Pipalta Palbi

Dos soldados a resultaron heridos por mina en Barbacoas, Nariño

El área en donde se presentaron los hechos es uno de los sitios donde hacen presencia las disidencias de las FARC.

Alejandro Rosero Montenegro

Publicado: Lunes, Junio 17, 2024 - 08:09
Actualizado: Lunes, Junio 17, 2024 - 08:10



Mina antipersona
Colprensa

Cuando realizaban operativos de control en **zona rural de Barbacoas**, Pacífico de Nariño, **dos soldados** profesionales adscritos a la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, resultaron afectados por la activación de una mina antipersonal.

Dos soldados profesionales de la Fuerza de Tarea Hércules resultaron heridos al pisar una mina antipersona en la zona rural del municipio de Barbacoas, región del Telembí, departamento de Nariño. Este incidente eleva a siete el número de personas, entre militares y civiles, afectadas por campos minados en lo que va del año.

Los hechos ocurrieron en la vereda Guayabal, donde el pelotón realizaba operaciones de registro y control. Según informes de habitantes locales, en esta área operan guerrilleros del ELN frente comuneros del Sur y disidencias de la Segunda Marquetalia.

Los militares heridos, cuyas identidades se mantienen en reserva, fueron trasladados a Cali para recibir atención médica. Un reporte inicial indica que uno de ellos perdió su pierna izquierda, mientras que el otro evoluciona satisfactoriamente.

Benildo Estupiñán, secretario de Gobierno de Nariño, expresó a Blu Radio su esperanza de que en la próxima mesa de diálogos con la Segunda Marquetalia, programada para el 24 de junio, se aborde prioritariamente un cese bilateral del fuego y se acuerde un desminado humanitario.

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
	COMPONENTE I			
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. COMPONENTE I	$ 68.358.378,00	100,00%	-12,00%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. COMPONENTE I	$ 60.155.372,64	88,00%	
	COMPONENTE II			
3	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. COMPONENTE II	$ 2.928.042.096,80	68,00%	-68,00%
4	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. COMPONENTE II	$ -	0,00%	
	CONTRATO			
3	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. CONTRATO	$ 2.996.400.474,80	68,50%	-67,12%
4	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. CONTRATO	$ 60.155.372,64	1,38%	

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 14, Departamento. (Putumayo)

Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



Sede ESC URB MIX PTO CAICEDO



Sede ESC URB MIX PTO CAICEDO



Sede ESC URB MIX PTO CAICEDO



Sede ESC URB MIX PTO CAICEDO



Sede ESC URB MIX PTO CAICEDO



Sede ESC URB MIX PTO CAICEDO

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 14, Departamento. (Putumayo)

Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



Sede ESC URB MIX PTO CAICEDO

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 15, Departamento. (Norte de Santander)

1. INSTITUTO EDUCATIVO INTEGRADO LA LLANA SEDE LA VALERA (24-2)





Inicio de Ejecución: Lunes 12 de agosto del 2024

Se han realizado actividades de escarificación de paredes y empañetado.

PRESUPUESTO: $311.539.778,93

2. INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA SERPENTINA SEDE PRINCIPAL (360-11)



Actualmente tienen 5 aulas fuera de servicio por riesgo de colapso según la O. de Gestión de Riesgo.

Reposición Aula nueva.

Aprobados Diseños el 22 de agosto.

Inician obra el 26 de agosto

3. INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO BARCO SEDE PTO BARCO (200-8)



Los diagnósticos se aprobaron el 12 de agosto .

Se realiza socialización el día 16 de agosto del 2024.

PRESUPUESTO: $ 219.922.918,28

4. CENTRO EDUCATIVO RURAL BERTRANIA SEDE PRINCIPAL (520-11)



Reposición de Batería Sanitaría existente de acuerdo a presupuesto con todas las actividades.

Aprobados Diseños el 22 de agosto.

Inician obra el 26 de agosto.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 15, Dep. (Norte de Santander)

5. INSTITUTO EDUCATIVO RURAL KM 15 SEDE PRINCIPAL (280-10)





Inicio de Ejecución: Lunes 12 de agosto del 2024

Se ejecutan obras de escarificación de paredes, desmonte de cielo rasos y empañetado de paredes

PRESUPUESTO: $ 311.366.950,58

6. INSTITUTO EDUCATIVO RURAL KM 15 SEDE CAMPO GILES (220-10)





Inicio de ejecución: jueves 08 de agosto del 2024

Se ejecutan obras de escarificación de paredes, desmonte de cielo rasos y empañetado de paredes

PRESUPUESTO: $ 349.078,468,91

7. INSTITUTO EDUCATIVO RURAL KM 15 SEDE LLANO GRANDE (160-6)





Inicio de ejecución: jueves 08 de agosto del 2024

Se ejecutan obras de empañetado de los muros del restaurante escolar

PRESUPUESTO: $ 279,009,157,31

9. INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PTO BARCO SEDE MI PEQUEÑO MUNDO (10-1)



Se remiten observaciones al contratista para subsanación y pronta aprobación por parte de la interventoría

PRESUPUESTO: $ 217.431.573,46 pesos

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 15, Dep. (Norte de Santander)

10. INSTITUCION EDUCATIVO ORU BAJO SEDE ORU BAJO (140-6)





Inicio de ejecución: miércoles 14 de agosto del 2024

Se ejecutan obras de escarificación de muros y desmonte de cielo raso

PRESUPUESTO: $ 375.190.772,75

11. CENTRO EDUCATIVO RURAL BELLAVISTA SEDE LAS TORRES (51-4)



Se recibe oficio **025-PAF-MENPNIE-I-109-2024-051**

Dentro del predio no hay espacio para realizar la reposición de aula, de igual manera, la nueva estructura construida no cumple con los diseños.

Se mantiene el presupuesto y la propuesta de intervención inicial.
PRESUPUESTO: $ 193.989.290,51

12. CENTRO EDUCATIVO RURAL BELLAVISTA SEDE LA ESPERANZA (10-1)



Se remiten subsanaciones al contratista, sede en proceso de aprobación**.**

PRESUPUESTO: $ 203.036.485,86

13. CENTRO EDUCATIVO RURAL BELLAVISTA SEDE KM 92 VISTA HERMOSA (110-4)



Se da recibe oficio **025-PAF-MENPNIE-I-109-2024-057**

Se continua con el diagnóstico inicial de mejoramientos. Aulas y baterías.

PRESUPUESTO: $ 208.022.956,52 pesos

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 15, Dep. (Norte de Santander)

14. CENTRO EDUCATIVO RURAL DOMINGO SAVIO SEDE BRISAS DEL TARRA (7-1)





15. C.E. RURAL DOMINGO SAVIO SEDE LOS BALSOS (13-1)





16. CENTRO EDUCATIVO RURAL BRACITOS SEDE SAN LUIS DEL ESPEJO (14-1)



Actualmente presenta una inviabilidad jurídica, debido a que la ubicación actual de la sede se encuentra dentro de un predio privado.

La comunidad argumenta que se tuvo que trasladar la sede por problemas de orden público.

Aun no cuenta con documento de sana posesión por parte de la alcaldía del el Tarra

8. CENTRO EDUCATIVO RURAL TRES BRASOS SEDE LA CUATRO (60-5)



Se entrego estudio de Suelos el 21 de Agosto. Está en estudio el Proyecto del Aula Múltiple.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



IE PUERTO ASTILLA



IE PUERTO ASTILLA



IE 1 LA CONCHA



IE PUERTO ASTILLA

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO

Socializaciones con comunidades







LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 21, Uribia - Departamento (La Guajira)

Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO

SIERRA MAESTRA






GUARERPA




CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 22,Dibulla - Departamento (La Guajira)

Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



Las Flores



La Punta



Rio Ancho



Palomino



Campana

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 23, Maicao - Departamento (La Guajira)

Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



I.E.I. No.9 Sede Yaraliwou



I.E.I. No.6 Sede Machetsumana



I.E.I. No.9 Sede Warralarain



I.E.I. No.9 Sede Montañita



I.E.I. No.9 Sede Toolomana



I.E.I. No.9 Sede Ruanamana

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 23, Maicao - Departamento (La Guajira)

Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



I.E.I. No.6 Sede Waruttamana



I.E.I. No.7 Sede Kalinchon



I.E.I. No.6 Sede Kulinatchi



I.E.I. No.9 Sede Youyoupana



I.E.I. No.9 Sede Uruwamana



I.E.I. No.9 Sede Jepirralut

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 23, Maicao - Departamento (La Guajira)

Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



I.E.I. No.7 Sede Emiijslee



I.E.I. No.9 Sede Paraguana



I.E.I. No.9 Sede Ushuru



I.E.I. No.4 Sede Jepein



I.E.I. No.4 Sede Ekimaana



I.E.I. No.6 Sede Ichiimaana

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 23, Maicao - Departamento (La Guajira)

Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



I.E.I. No.6 Sede Koushalain

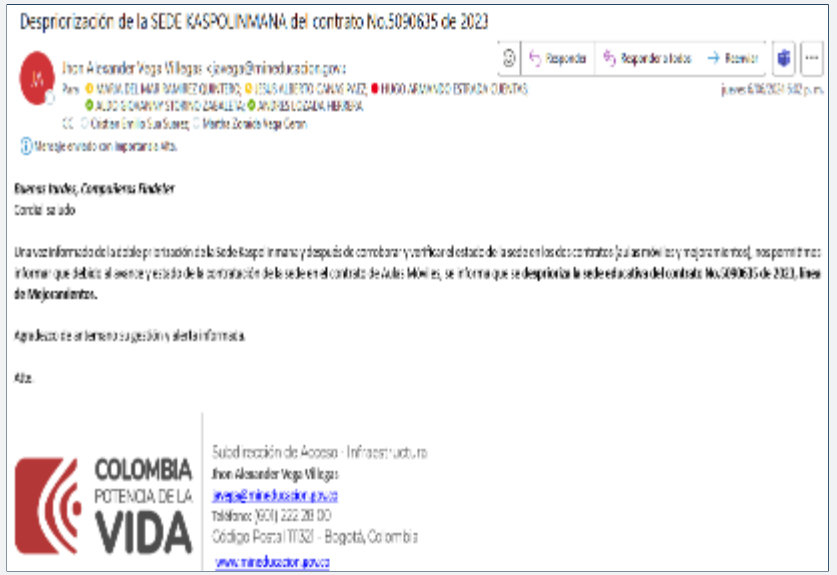

I.E.I. No.6 Sede Kaspolimana (DESPRIORIZADA x CRUCE con G7 Línea AM)



I.E.I. No.9
Sede Ulain (DESPRIORIZADA x GUERRA INTERCLANIL)

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
	CONTRATO			
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente del contrato.	185.547.990,49	2,79%	-0,75%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados en el contrato.	135.318.956,24	2,03%	
	COMPONENTE 1			
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente del componente 1.	133.280.000,00	100,00%	0,00%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados en el componente 1.	133.280.000,00	100,00%	
	COMPONENTE 2			
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente del componente 2.	52.267.990,49	0,80%	-0,77%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados en el componente 2.	2.038.956,24	0,03%	

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 25, Buenaventura, Valle del Cauca

Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



I.E. NONAM.

SEDE PRINCIPAL NONAM.



I.E. NONAM.

SEDE SAN JUAN BAUTISTA.



I.E. NONAM.

SEDE SANTA ROSA DE GUAYACÁN.



I.E. ANTONIO NARIÑO.

SEDE LA NUEVA COLOMBIA.



I.E. ATANASIO GIRARDOT.

SEDE PRINCIPAL ATANASIO GIRARDOT.



I.E. FRANCISCO JAVIER CISNEROS.

SEDE LA GRAN COLOMBIA.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 25, Buenaventura, Valle del Cauca

Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



I.E. FRANCISCO JAVIER CISNEROS.

SEDE HÉCTOR EPALZA QUÍNTERO.



I.E. AGROPECUARIA JOSÉ MARIA CÓRDOBA.

SEDE PRINCIPAL AGROPECUARIA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA.



I.E. AGROPECUARIA JOSÉ MARIA CÓRDOBA.

SEDE SAN CIPRIANO.



I.E. JOSÉ RAMÓN BEJARANO.

SEDE LA COMUNA.



I.E. SIMÓN BOLIVAR.

SEDE GRANADINOS.



I.E. JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ.

SEDE PRINCIPAL JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ.

LINEA DE MEJORAMIENTOS- GRUPO 25, Buenaventura, Valle del Cauca

Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



I.E. JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ.

SEDE SANTA FILOMENA.



I.E. JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ.

SEDE SANTA LUCIA DE TIMBA.



I.E. JAIME ROOCK.

SEDE PRINCIPAL JAIME ROOCK.

Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO, Socializaciones comunidades



SOCIALIZACION PUERTO LETICIA




SOCIALIZACION LA PUNTA- BAJO SANJUAN



SOCIALIZACION PUERTO LETICIA



SOCIALIZACION LA PUNTA- BAJO SANJUAN

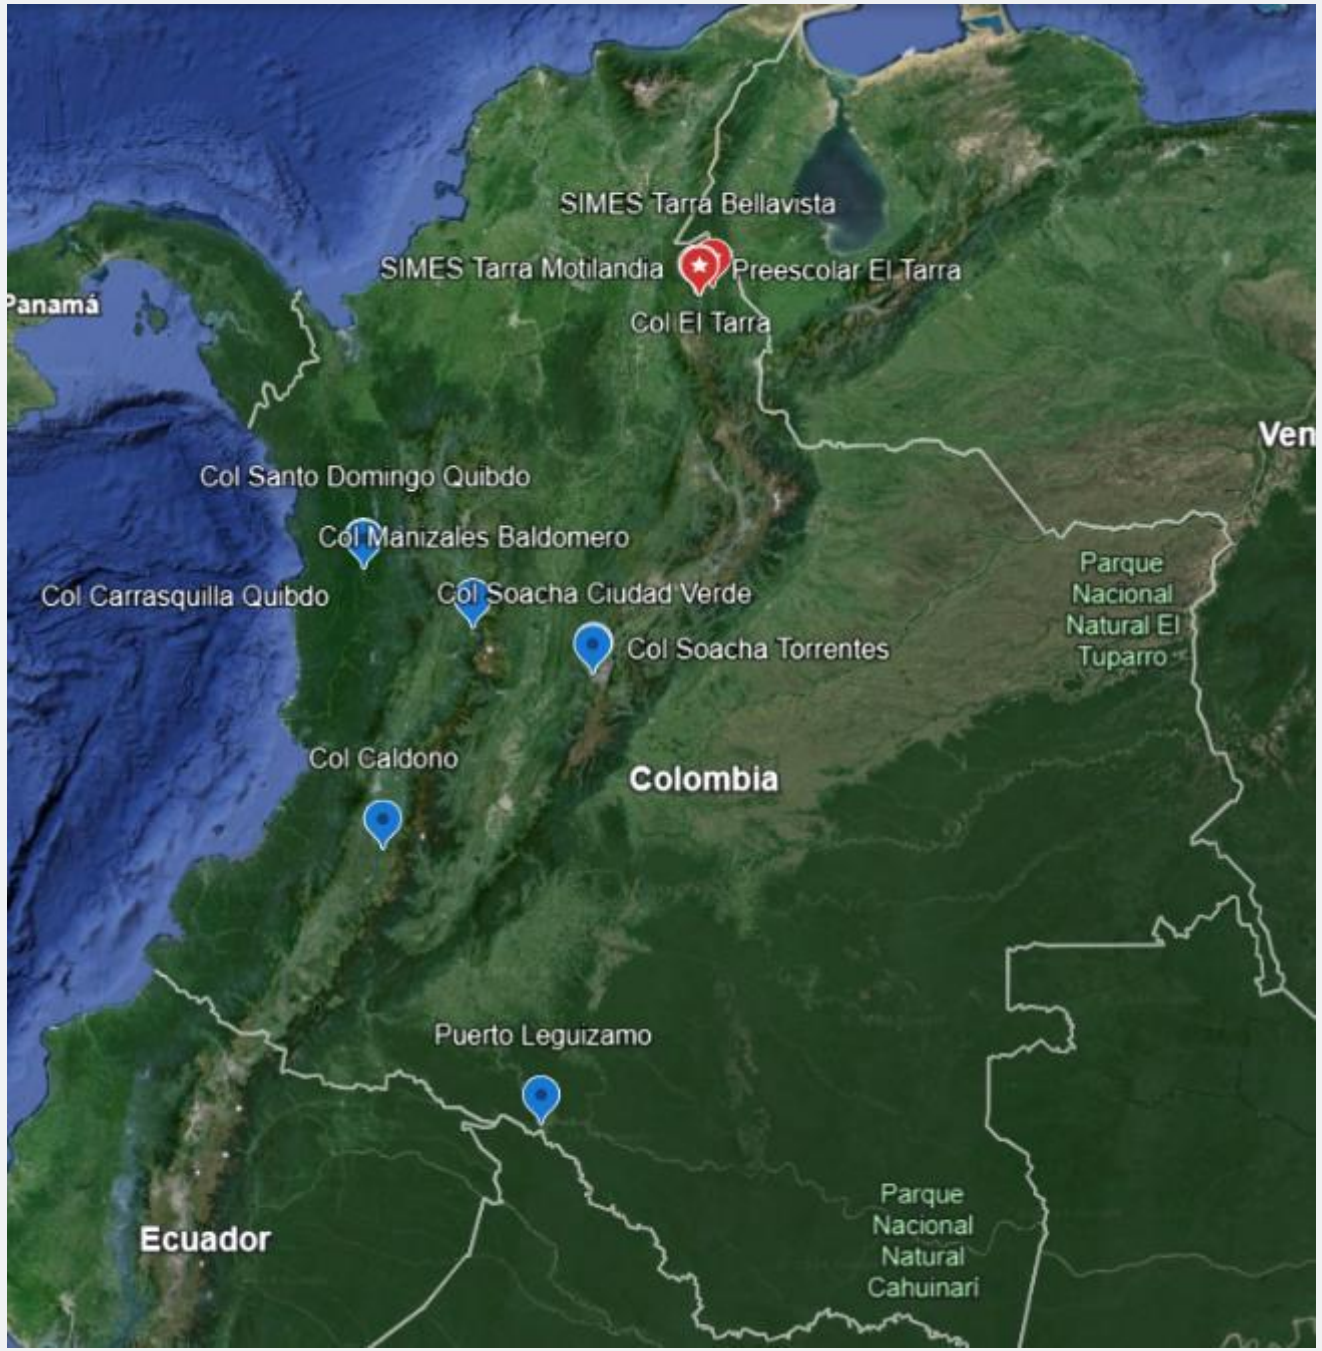

LÍNEA DISEÑOS

9 PROCESOS DE CONSULTORÍA
PROCESOS DE INTV

9 PROYECTO SIMES

$ 5.000

18 Proyectos

CONSULTORIAS

17 CONSULTORÍAS INTERVENTORÍAS

$ 29.143

9 Proyectos

ID	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	ESTADO	OBSERVACIONES
1	SOACHA - TORRENTES	CUNDINAMARCA	Cuenta con diseños	• A la espera de definición por parte del MEN respecto a las acciones a seguir sobre el proyecto, en caso de construcción este proceso pasaría a la línea de estratégicos • Se adelanto mesa de trabajo con secretaria de Educación MEN el 8 de agosto pendiente definición entre reunión MEN y Soacha • Los lotes cuentan con viabilidad técnica y jurídica
2	SOACHA - CIUDAD VERDE	CUNDINAMARCA	Cuenta con diseños	
3	MANIZALES	CALDAS	Cuenta con diseños	• Referente a la viabilidad jurídica es viable, según la ficha expedida el 19/02/2024 por el abogado. • El 25/06/2024 se realiza la reunión con el Secretario de Educación del Municipio de Manizales, en la cual este informa que por razones a criterios técnicos y financieros que orienten la inversión con responsabilidad, buscando el mayor impacto de la inversión en términos de población estudiantil beneficiada; solicita la realización de una mesa de trabajo entre el MEN y la alcaldía para concertar una posible inversión conjunta, en infraestructura educativa que beneficie a la mayor cantidad de niños y niños del municipio. • El 10/07/2024 Se realiza reunión de seguimiento interna del CI y se informa que se envié oficio al municipio ratificando la des priorización del proyecto, según lo señalado en reunión antes citada. • 30/07/2024 Se remite oficio con radicado 2202452007676, mediante el cual se informa al Municipio de Manizales sobre su decisión de des priorizar el proyecto.
4	PUERTO LEGUÍZAMO	PUTUMAYO	Sin diseños	Consultoría: Convocatoria PAF-MENPNIE-C-003-2024: Informe definitivo 20 de junio de 2024, quedando habilitada una firma se suspende convocatoria el 25 de junio de 2024. •Interventoría: Convocatoria PAF-MENPNIE-I-049-2024: Acta de cierre del 13 de junio de 2024 en donde consta que no se recibieron ofertas. El 30 de julio fueron recibidas observaciones del componente técnico al estudio previo, por parte del área de contratación, las cuales fueron subsanadas y/o aclaradas, y posteriormente nuevamente fue remitido el estudio previo al área de contratación el 31 de julio de 2024. •El 13 de agosto fueron recibidas nuevas observaciones del componente técnico al estudio previo, por parte del área de contratación, con base en los últimos ajustes remitidos. Se adelantan los ajustes correspondientes solicitados. •Se programó nueva rueda de negocios para dar a conocer la convocatoria el 23 de agosto de 2024 a nuevos posibles proponentes. Por lo anterior una vez surtida la rueda de negocios, se entregan el resultado de dicha rueda y los ajustes realizados, la siguiente semana para continuar con el proceso correspondiente.

CONSULTORIAS

9 CONSULTORIAS INTERVENTORIAS

$ 29.143

9 Proyectos

ID	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	ESTADO	OBSERVACIONES
5	CALDONO	CAUCA	Sin Diseños	• **Consultoría Convocatoria PAF-MENPNIE-C-008-2024:** • Se suspende el proceso toda vez que la interventoría se fue desierta. • **Interventoría Convocatoria PAF-MENPNIE-I-071-2024:** • Se publicó el acta de comité fiduciario en donde se declara desierta la convocatoria del 24 al 26 de julio de 2024. Publicación declaratoria desierta el 2 de agosto de 2024. • Se están realizando las gestiones con la Gerencia de infraestructura para la obtención de empresas interesadas en participar en el proceso de convocatoria privada
6	QUIBDO - IE CARRASQUILLA	CHOCO	Sin Diseños	• **Consultoría Convocatoria PAF-MENPNIE-O-083-2024:** • Se suspende el proceso toda vez que la interventoría se fue desierta. • **Interventoría: Convocatoria PAF-MENPNIE-I-068-2024:** • Se publicó el acta de comité fiduciario en donde se declara desierta la convocatoria el 31 de julio de 2024. Publicación declaratoria desierta el 30 de julio de 2024. • Se realizó rueda de negocios el 20 y 23 de agosto de 2024 con 8 empresas posibles interesadas en participar en el proceso de convocatoria privada (4 empresas manifestaron interés)
7	QUIBDO - IE SANTO DOMINGO DE GUZMAN	CHOCO	Sin Diseños	• Se cuenta con el Acta de reparto notarial de la Superintendencia de notariado y registro. En revisión jurídica de Findeter • Pendiente certificación de disponibilidad de energía por parte de DISPAC S.A.S.
8	URIBIA - NAZARETH	LA GUAJIRA	Sin reporte	• **Retira de la priorizacion**

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

CONSULTORIAS

9 CONSULTORIAS INTERVENTORIAS

$ 29.143

9 Proyectos

ID	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	ESTADO	OBSERVACIONES
9	CATATUMBO – EL TARRA	NORTE DE SANTANDER	Diseños en proceso (nivel anteproyecto)	Consultoría: Convocatoria PAF-MENPNIE-C-007-2024: Acta de cierre del 26 de julio de 2024 en donde se declara desierta se han realizado dos ruedas de negocio la ultima el pasado 23 de agosto a la espera de entrega documental dado que solo fueron habilitados dos posibles proponentes Interventoría: Convocatoria PAF-MENPNIE-I-063-2024: Acta de cierre del 26 de julio de 2024 en donde se declara desierta dos ruedas de negocio la ultima el pasado 23 de agosto a la espera de entrega documental dado que solo fue habilitado un posibles proponente
10	MOMPOX - COLEGIO TECNICO NACIONAL PINILLOS	BOLIVAR	En viabilidad	• Se realizó visita al Colegio el 11 de julio de 2024 • Se remitió solicitud de documentación para viabilización técnica y jurídica el 22 de julio. • El 25 de julio, se recibió por parte del rector de la información solicitada, la cual se encuentra en revisión técnica y jurídica.
11	MOMPOX - ESCUELA NORMAL SUPERIOR	BOLIVAR	En viabilidad	• Se realizó visita al Colegio el 12 de julio de 2024 • Se remitió solicitud de documentación para viabilización técnica y jurídica el 22/07/2024, reiteración solicitud 13/08/2024. No se ha recibido respuesta. • Funcionarios de la Secretaria de Educación de la Gobernación informan que la Gobernación se encuentra adelantando el proceso para contratar una consultoría para la intervención en la IE (01/08/2024). Se ha solicitado reunión vía telefónica (02/08/2024, 12/08/2024) sin respuesta.
12	CENTRO EDUCATIVO LA LOMA SEDE POGUE	CHOCO	En viabilidad	•18 de julio reunión con funcionarios de la Secretaria de Educación Departamental. •Se remitió solicitud de documentación para viabilización técnica y jurídica el 22/07/2024

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

CONSULTORIAS

9 CONSULTORIAS INTERVENTORIAS

$ 29.143

9 Proyectos

ID	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	ESTADO	OBSERVACIONES
13-21	CONVENCIÓN, EL TARRA, TIBU PROGRAMA SIMES	NORTE DE SANTANDER	Viabilización	• Convención: Se cuenta con información pedagógica de cada uno de los espacios. No obstante un se encuentra pendiente documentación para viabilidad técnica y jurídica • El Tarra se cuenta con viabilidad jurídica a la espera de entrega documentación total para viabilidad técnica • Tibú anexa parte de la documentación faltante, en particular para el Instituto Tres Bocas Sede J10 el certificado y sana posesión, mientras que a la sede Francisco José de Caldas solo emiten el VUR relacionando 4 matriculas inmobiliarias que hacen parte del colegio. Se solicitó mediante correo el 20/08/2024 por favor radicar la información faltante y corregir la documentación aportada. • Se remite presentación con posible cuantificación de costeos de los estudios y diseños al MEN a la espera de definición para estructuración de proceso independiente se continua con las viabilidades de

Cruce	NOMBRE_ESTABLECIMIENTO	CODIGO_DANE_SEDE	NOMBRE_SEDE	Total general	AMPLIACIÓN	GRADO	2024	2025	2026	Deficit de estudiantes	Necesidad de espacios	cantidad de aulas	area estimada aula m2	Total area aulas	Ambientes pedagogicos complementarios	metros cuadrados complementario	AREA EXTERIORES
Convención	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL HONDURAS MOTILONIA	254206001030	SEDE HONDURAS MOTILONIA - SEDE PRINCIPAL	364	AMPLIACIÓN 6 A 11	0	0			168	Aulas basica secundaria y areas complementarias	6	54	324	A5	598	1680
Convención	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PEREZ	254206001102	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA TRINIDAD	411	AMPLIACIÓN	0	0				Areas Complementarias		45	0	A5	598	1680
El Tarra	CENTRO EDUCATIVO RURAL DOMINGO SAVIO	254250000270	SEDE LA MOTILANDIA	330	AMPLIACIÓN 6 A 9	6	53	53	53	240	Aulas basica secundaria y areas complementarias	6	66	396	A5	598	1680
El Tarra	CENTRO EDUCATIVO RURAL BELLAVISTA	254670000488	CENT EDUC RUR BELLAVISTA	112	AMPLIACIÓN 8 A 11	8	11			200	Aulas basica secundaria y areas complementarias	6	66	396	A5	598	1680
El Tarra	INSTITUCION EDUCATIVA FILO EL GRINGO	254810000629	INSTITUCION EDUCATIVA FILO EL GRINGO - SEDE PRINCIPAL	740	AMPLIACIÓN	0	0			150	Aulas basica secundaria y areas complementarias	5	54	270	A5	598	1680
Tibú	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL TRES BOCAS	254810000327	SEDE J10	113	AMPLIACIÓN 6 A 9	6	13	13	13	170	Aulas multigrados y areas complementarias	5	54	270	A4	293,9	1680
Tibú	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL KILOMETRO 15	254810000343	SEDE CAMPO TRES	217	AMPLIACIÓN 10 A 11	10	12			60	Aulas multigrados y areas complementarias	2	54	108	A4	293,9	1680
Tibú	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL KILOMETRO 15	254810001013	SEDE KILOMETRO 15 - SEDE PRINCIPAL	227	AMPLIACIÓN 11	11	16			60	Aulas multigrados y areas complementarias	2	54	108	A4	293,9	1680
Tibú	COL INTEG FRANCISCO JOSE DE CALDAS	154810003020	COL INTEG FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2251	AMPLIACIÓN	0	0			300	Aulas basica secundaria y areas complementarias	8	66	528	A6	863,4	1680

CONSULTORIAS

9 CONSULTORIAS INTERVENTORIAS

$ 29.143

9 Proyectos

GRUPOS	PROYECTO	ALCANCE	PLAZO	CONSULTORIA (aprox)	INTERV (aprox)	TOTAL APROX
1	SIMES Convención_ Colegio Motilonia	Estudios, diseños y diagnostico	3 MESES	$253.991.910	$197.233.200	$765.898.430
	SIMES_Convención_IE La Trinidad					
	SIMES_EL Tarra_ Colegio Motilandia		4 MESES			
	SIMES_El Tarra_ Colegio Bellavista					
	SIMES_El Tarra_ Filo Gringo					
2	SIMES_Tibú_ Tres Bocas	Estudios, diseños y diagnostico	4 MESES Y QUINCE (15) DIAS	$ 166.847.490	$ 147.825.830	
	SIMES_Tibú_ Km 15 Campo Tres					
	SIMES_Tibú_ Km 15_Sede Principal					
	SIMES_Tibú_ Francisco Jose de Caldas					

Nota: Al plazo indicado se suman 2 meses a las interventorías para las liquidaciones



LÍNEA PROYECTOS ESTRATEGICOS

28 PROCESOS DE OBRA
PROCESOS DE INTV

$ 94,836

28 Proyectos
72 Intervenciones en IE


PROYECTOS ESTRATEGICOS Visitas Técnicas

NO.	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	SEDES	FECHA	OBSERVACIONES
1	Infraestructura Educativa - Mesas de Trabajo con EL PUEBLO AWA	TUMACO	Nariño	20	Por definir	Recursos por definir

- Viabilidad jurídica: El grupo AWA está en proceso de recolección de documentos con las IE
- El 11-12/04/2024, se realizó mesa de trabajo con el MEN, FINDETER y representantes de Pueblo AWUA, el marco de la cual fueron priorizadas 7 sedes por parte del MEN
- Se ajusto el cronograma a 20 mejoramientos
- Pendiente confirmación respecto a validación de HV de miembros de la comunidad AWA para realizar las visitas técnicas coordinadas por FINDETER





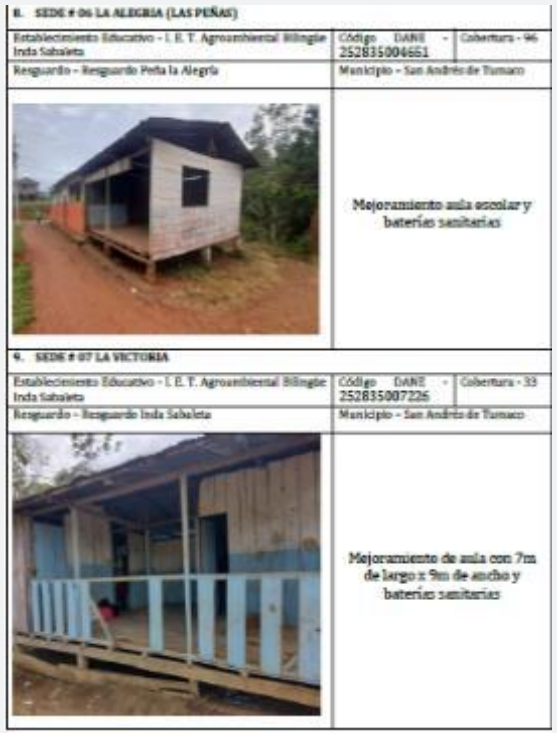

	Infraestructura Educativa Pueblo AWÁ (UNIPA)	SEDE	Localización
1	I.E BILINGÜE AWA TECNICO AGROINDUSTRIAL PIANULPI	I.E BILINGÜE AWA TECNICO AGROINDUSTRIAL PIANULPI	TUMACO
2	I.E.T AGROPAMBIENTAL BILINGÜE INDA SABALETA	LA ALEGRIA (LAS PEÑAS)	TUMACO
3	C.E. INDIG AWA EL VERDE	EL VERDE	TUMACO
4	C.E. INDIG AWA EL VERDE	PIZDE PIALQUER	TUMACO
5	C.E. INDIGENA AWA CALVI	ANGOSTURA DOS	TUMACO
6	C.E. INDIGENA AWA CALVI	ALTO PALAY	TUMACO
7	C.E. INDIGENA AWA HOJAL	HOJAL	TUMACO
8	C.E. INDIGENA AWA HOJAL	BOCA IMBAPI	TUMACO
9	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA AWA QUEJUAMBI	PUEDRA SELLADA	TUMACO
10	C.E. INDIG AWA EL HOJAL	INDEG AWA IMBAPI	TUMACO
11	C.E. INDIG AWA EL VERDE	INDIGENA AWA ALBICITO	TUMACO
12	C.E. INDIG AWA EL VERDE	INDIGENA AWA VIOLIN ARENAL	TUMACO
13	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA AWA QUEJUAMBI	INDIGENA AWA SAN GULPI PALMAR	TUMACO
14	I.E. BILINGÜE AWA TECNICO AGROINDUSTRIAL PIANULPI	INDIGENA AWA LA PLANADA	TUMACO
15	I.E. BILINGÜE AWA TECNICO AGROINDUSTRIAL PIANULPI	INDIGENA AWA CUASAMBI	TUMACO
16	I.E.T. AGROP-AMBIENTAL BILINGUE INDA SABALETA	INDIGENA AWA LA VICTORIA	TUMACO
17	C.E INDIGENA AWA LOS TELEMBIES	PULGANDE TROQUERIA	Barbacoas
18	C.E INDIGENA AWA EL GRAN SABALO	KUMBI	Barbacoas
19	C.E INDIGENA AWA LISANDRO NASTACUAS	DOS QUEBRADAS TELEMBI	Barbacoas
20	INST. EDU. TECNICA AGROAMBIENTAL BILINGÜE AWA - IETABA	NACEDERA	Barbacoas

CCUM-FO-001 V18 / 1-JUN-2023 / Clasificada

PROYECTOS ESTRATEGICOS Visitas Técnicas

NO.	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	SEDES	FECHA	OBSERVACIONES
2	INSTITUCION EDUCATIVA SANTO THOMAS SEDE JORGE ISAAC CALI,	Buenaventura	Valle del cauca	1	06/03/2024	Recursos por definir

- Viabilidad jurídica: Se realizó solicitud de la Escritura Pública - La IE está en proceso de solicitud ante Secretaría de Planeación distrital.
  Última solicitud de documentos 15/04/2024
- Viabilidad Técnica: 06/03/2024.
- 1 proceso obra y 1 proceso interventoría
- El proyecto cuenta con estudios y diseños, los cuales aún no han sido aportados para verificación.
- En visita se observa el desalojo de la Institución Educativa, esto a partir de un requerimiento de la ETC de Cali.
- Para esta Institución se recomienda realizar demolición de toda la infraestructura y realizar obra nueva de los espacios ya que la infraestructura existente no es apta para para el desarrollo de actividades.













PROYECTOS ESTRATEGICOS

NO.	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NO. SEDES	TOTAL SEDES GRUPO	TOTAL DE INVERSIÓN MAX POR GRUPO
Grupo 1	IE Jose Antonio Ricaurte	Ibagué	Tolima	1	1	$ 20.000.000.000,00

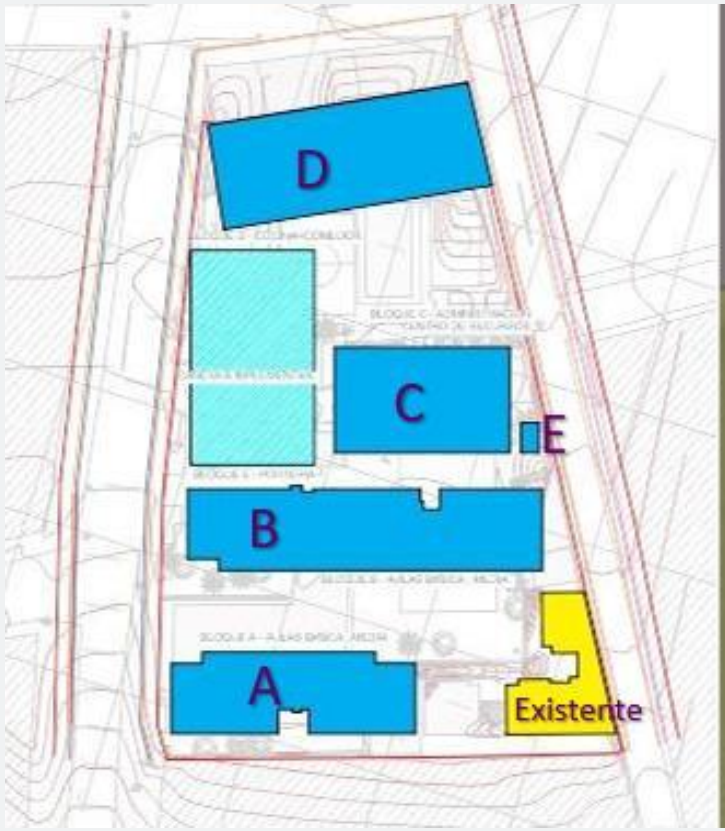

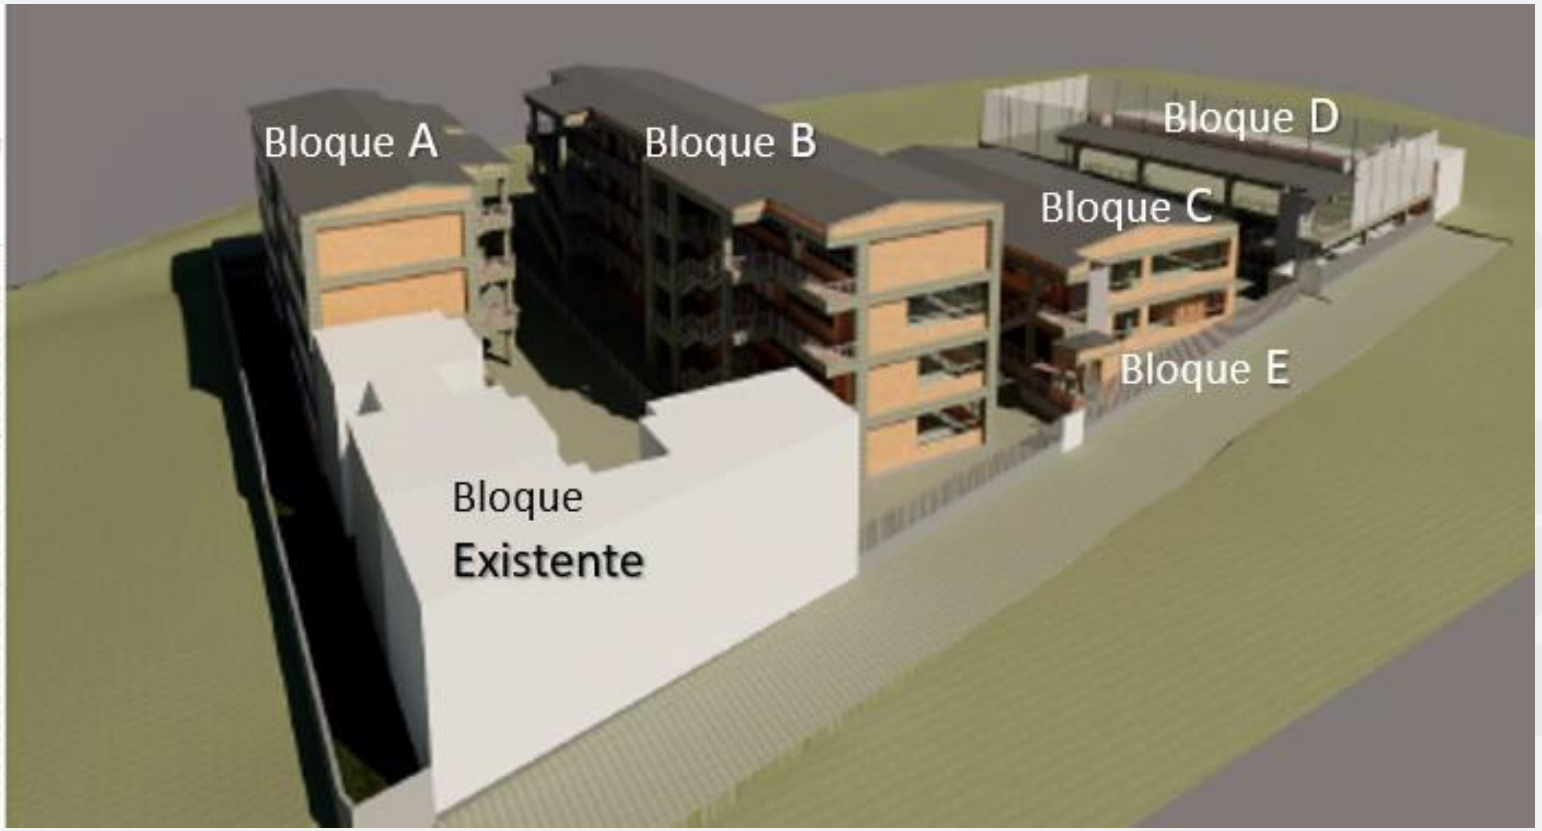

Institución Educativa – Proyecto con Licencia de Construcción vigente 2021 Res. No. 73001-1-21-0556 (Nota 3)

NOTA 3: La licencia vigente será objeto de modificación teniendo en cuenta que no están incluidos los ajustes y complementación a los estudios y diseños iniciales objeto de revisión y tampoco están incluidas las intervenciones del bloque existente.

CONTRATOS DERIVADOS

Convenio Interadministrativo No. 0120-2024

FINDETER – Municipio de IBAGUE

03-ABR-2024

PROCESO	ADJUDICACIÓN	CONVOCATORIA	RECURSOS MEN
Obra	$ 16.014.417.534,00	$ 16.809.507.226,00	$ 20.000.000.000,00
Interventoría	$ 1.204.351.093,00	$ 1.320.560.410,00	
TOTALES	**$ 17.218.768.627,00**	**$ 18.130.067.636,00**	**$ 2.781.231.373,00**

OBRA	Contrato No. 014-PAF-MENPNIE-O-127-2023
CONTRATISTA	COSORCIO BB IBAGUE
OBJETO	LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Actividad de estudios y diseños y obtención de permisos y/o licencias: **CUATRO (4) MESES** Actividad de construcción: **DIEZ (10) MESES***
$	**$ 16.014.417.534,00** incluye AIU e IVA sobre Utilidad
TRAZABILIDAD CONVOCATORIA	• **29/12/2023:** Publicación convocatoria • **29/02/2024:** Publicación adjudicación convocatoria • **15/04/2024:** Suscripción Contrato Derivado • **30/04/2024:** Suscripción Acta Inicio Contrato
ESTADO ACTUAL	• **En revisión de Estudios y diseños iniciales** • **En revisión y verificación de Presupuesto de construcción inicial**

INTERV.	Contrato No. 011-PAF-MENPNIE-I-125-2023
CONTRATISTA	COSORCIO EDIFICACIONES 2024
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Actividad de estudios y diseños y obtención de permisos y/o licencias: **CUATRO (4) MESES** Actividad de construcción + cierre: **DIEZ (12) MESES***
$	**$ 1.204.351.093,00** incluye IVA
TRAZABILIDAD CONVOCATORIA	• **29/12/2023:** Publicación convocatoria • **29/02/2024:** Publicación adjudicación convocatoria • **16/04/2024:** Suscripción Contrato Derivado • **30/04/2024:** Suscripción Acta Inicio Contrato
ESTADO ACTUAL	• **En revisión de Estudios y diseños iniciales** • **En revisión y verificación de Presupuesto de construcción inicial**

Construcción I.E. José Antonio Ricaurte Sede Principal (Ibagué, Tolima)

Cronograma de ejecución

		ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN	2024 abr MES 0	may MES 1	jun MES 2	jul MES 3	ago MES 4	sep MES 5	oct MES 6	nov MES 7	dic MES 8	2025 ene MES 9	feb MES 10	mar MES 11	abr MES 12	may MES 13	jun MES 14
ETAPA I ESTUDIOS Y DISEÑOS		**I) ETAPA I: Revisión ajuste y complementación de estudios y diseños y permisos de**		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4										
	I.1	**ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y GESTIONES COMPLEMENTARIAS**															
	I.1.1	PLAN GESTION SOCIAL															
	I.1.2	ELABORACION ACTAS DE VECINDAD															
	I.1.3	REUNION INICIAL CON LA COMUNIDAD		1	1.1				2			3				4	
	I.1.4	PLAN MANEJO AMBIENTAL															
	I.1.5	PLAN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL															
	I.1.6	PERMISO TALA ARBOLES (CORTOLIMA)															
	I.2	**REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES (Iniciales entregados por el MEN)**															
	I.2.1	INFORME DIAGNÓSTICO DE REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES															
	I.2.2	GEOTECNIA															
	I.2.4	TOPOGRAFIA															
	I.2.5	ARQUITECTURA Y BIOCLIMATICA															
	I.2.6	ESTRUCTURA															
	I.2.8	REDES HUMEDAS, SECAS Y OTROS ESTUDIOS															
	I.3	**AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (modificación licencia de construcción)**															
	I.3.1	INFORME AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES															
	I.3.2	GEOTECNIA															
	I.3.3	TOPOGRAFIA															
	I.3.4	PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN (incluye cantidades de obra y APUs)															
	I.3.5	**BLOQUE A Y B**															
	I.3.5.1	ARQUITECTURA Y BIOCLIMATICA															
	I.3.5.2	ESTRUCTURA															
	I.3.5.3	REDES HUMEDAS, SECAS Y OTROS ESTUDIOS															
	I.3.6	**BLOQUE C,D,E , EXTERIORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**															
	I.3.6.1	ARQUITECTURA Y BIOCLIMATICA															
	I.3.6.2	ESTRUCTURA															
	I.3.6.3	REDES HUMEDAS, SECAS Y OTROS ESTUDIOS															
	I.3.7	**TRÁMITE LICENCIA DE CONSTRUCCION (Nota 1)**															
	I.3.7.1	MODIFICACIÓN LC EJECUTORIADA: Modalidad ampliacion y modificación															
	I.3.7.2	TRAMITE NUEVO LC: Modalidad ampliacion y modificación															
	I.3.8	**GESTION EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO**															
	I.3.9	**GESTION ENTREGA PREDIOS (Convenio Interadministrativo No. 0120-2024 SEMI)**															
ETAPA II CONSTRUCCIÓN		**II) ETAPA II: Construcción de la IE José Antonio Ricaurte SP Ibagué**					Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	
	II.1	**PRELIMINARES**															
	II.2	**CONSTRUCCIÓN BLOQUE A Y B (Aulas)**															
	II.2.1	**CIMENTACIONES**															
	II.3	**BLOQUE C,D Y E**															
	II.4	**OBRAS EXTERIORES**															
	II.5	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**															

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

ACTIVIDADES INICIALES DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES

LC 2021 – Res. No. 73001-1-21-0556

Prorroga 2023 - Res. No. 73001-1-23-0520

➢ **NSR 10:**

- EVACUACIÓN Y EXTINCIÓN_ TÍTULOS J Y K: Verificación de cumplimiento de condiciones normativas

➢ **NORMA URBANA:**

- Verificación de condiciones de incorporación del bloque existente: validación de gestiones previas para el bloque existente y otras actuaciones para esta edificación
- Verificación de cumplimiento de condiciones de edificabilidad (índices de ocupación y construcción)

➢ **NORMATIVIDAD INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – MEN**

- Aplicabilidad de la NTC 4595 y otras normas de infraestructura educativa

➢ **REVISIONES GENERALES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:**

- Comunicación horizontal entre bloques (Circulaciones e integración)
- Tanque de reserva
- Espacios de servicios generales y complementarios para infraestructura educativa
- Inclusión de atención a primera infancia (Prejardín y Jardín)

➢ **OTRAS GESTIONES:**

- CORTOLIMA
- EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS
- CURADURÍA URBANA

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

ACTIVIDADES REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES

Avances en los componentes del proyecto (corte al 23/06/2024)

AVANCE DE EJECUCUCIÓN

General contrato
✓ 1,13% Programado
✓ 1,43% Ejecutado

Etapa I
Estudios y Diseños
✓ 50% Programado
✓ 62% Ejecutado

➢ **TOPOGRAFÍA:**
- 100% programado, 100% ejecutado

➢ **GEOTECNIA:**
- 100% programado, 94% ejecutado

➢ **ARQUITECTURA Y BIOCLIMÁTICA:**
- 55% programado, 82% ejecutado
- El esquema base fue aprobado el 14/06/2024 por el MEN con base a mesas de trabajo con Curaduría 1,

➢ **ESTRUCTURA:**
➢ 47% programado,55% ejecutado

➢ **REDES:**
- 36% programado, 44% ejecutado

➢ **COSTOS Y PRESUPUESTO:**
- 0% programado, 9% ejecutado

PROPUESTA 1



➢ BLOQUE A Y BLOQUE B

- Comunicación horizontal
- Se incluye un núcleo con ascensor y escalera exterior
- Escalera protegida en cada uno de los bloques

➢ BLOQUE C

- Se mantiene de 2 niveles
- Se mantiene el ascensor
- Se desplaza ubicación

➢ BLOQUE E

- Se desplaza ubicación entre bloque c y d para amortiguar el acceso frente al parque existente frente al colegio

➢ BLOQUE F (Bloque Existente)

- Se mantiene y se adecua para educación prescolar garantizando acceso independiente y zona de recreación independiente.

➢ EXTERIORES

- Se disponen las edificaciones como paramento, reduciendo ML de cerramiento
- Se incorporan zonas verdes y arborización



➢ BLOQUE D

- Se mantiene Cancha en cubierta
- Se mantiene el ascensor

PROPUESTA 2



➢ BLOQUE A Y BLOQUE B

- Comunicación horizontal
- Se incluye un núcleo con ascensor y escalera exterior
- Escalera protegida en cada uno de los bloques

➢ BLOQUE C

- Se amplía a 3 niveles
- Se mantiene el ascensor
- Se desplaza ubicación

➢ BLOQUE D

- Se elimina la Cancha en cubierta
- Se elimina ascensor
- Se incluye aula múltiple que sirve para integrar una cacha pintada al interior.

➢ BLOQUE E

- Se desplaza ubicación entre bloque c y d para amortiguar el acceso frente al parque existente frente al colegio

➢ BLOQUE F (Bloque Existente)

- Se demuele y se diseña un nuevo espacio para educación prescolar garantizando acceso independiente y zona de recreación independiente.

➢ EXTERIORES

- Se disponen las edificaciones como paramento, reduciendo ML de cerramiento
- Se incorporan zonas verdes y arborización



ACTIVIDADES INICIALES DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES

LC 2021 – Res. No. 73001-1-21-0556

Prorroga 2023 - Res. No. 73001-1-23-0520

LOCALIZACIÓN DE SONDEOS



NOTA: Informe comparativo 31/05/2024 CONSORCIO BB IBAGUE (Contratista) Validado por CONSORCIO EDIFICACIONES 2024 (Interventoria)

CERCANÍA DE LOS SONDEOS

2024	2018	2020	Bloque
S1	2, 1 y 3	NA	D
S2	4	8 y 11	C
S3	NA	NA	B
S4	6 y 7	10	A
NA	5	9	B
NA	NA	8	C
NA	NA	9	B

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

ACTIVIDADES INICIALES DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES

LC 2021 – Res. No. 73001-1-21-0556

Prorroga 2023 - Res. No. 73001-1-23-0520

COMPARACIÓN DE SONDEOS

	B-D	B-D	B-D	B-D	B-C	B-C	B-C	B-C	B-A	B-A	B-A	B-A	B-B	B-C	B-B
	AÑO 2024	AÑO 2018			AÑO 2024	AÑO 2018	AÑO 2020	AÑO 2024	AÑO 2024	AÑO 2018	AÑO 2020	AÑO 2018	AÑO 2018	AÑO 2020	AÑO 2020
Prof. (m)	S1	S1	S2	S3	S2	S4	S11	S3	S4	S6	S10	S7	S5	S8	S9
	(Golpes pie)														
0.0-0.5	5	NA	NA	NA	6	NA		7	5	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0.5-1.0	9	NA	NA	NA	13	NA	25	10	2	NA	NA	NA	NA	26	
1.0 – 1.5	15	6	6	7	13	30		11	7	4	43	NA	8	24	42
1.5 – 2.0	11	7	7	8	10	35		11	12	11		22	12		
2.0 – 2.5	12	10	10	8	12	41		13	17	28		18	14		
2.5 – 3.0	10	4	10	8	16	62	35	11	20	32	50	8	14	16	30
3.0 – 3.5	11	6	12	8	12	33		12	17	38		10	11		
3.5 – 4.0	10	14	17	R	16	16		9	18	14		10	14		
4.0 – 4.5	17	R	R		26	16	56	8	12	16	48	11	16	49	41
4.5 –5.0	17				23	16		12	14	R		12	16		
5.0 –5.5	13						63	16	17	18	91		16		95
5.5-6.0	20							35	23	R				57	
6.0-6.5	22									RT			RT		
6.5-7.0	26					RT				RT				75	
7.0-7.5										RT					
7.5-8.0										RT					
8.0-8.5										RT					
8.5-9.0										RT					
9.0-9.5										RT					
9.5-10.0										RT					
10.0-10.5										RT					

Línea sísmica (Nota 1)

0-10	Sueltos/blandos
11-20	Algo denso
21-30	Denso
>30	Aparentemente muy denso
33	Valores Afectados por gravas

RESUMEN			
	ALT 1	ALT 2	ESCENARIO PROYECTO
UBUCACION	MICROPILOTE	ZAP+ CICL	
CIMENTACION BLOQUE A	$ 369.524.470,07		$ 369.524.470,07
CIMENTACION BLOQUE B	$ 510.412.359,00	$ 779.792.450,29	$ 510.412.359,00
CIMENTACION BLOQUE C		$ 212.342.193,46	$ 212.342.193,46
CIMENTACION BLOQUE D		$ 438.903.596,28	$ 438.903.596,28
			$ 1.531.182.618,80

NOTA 1: Se realizó un estudio de LINEA SISMICA corroborando la información de los sondeos del 2024, razón por lo cual se determina realizar ajustes en la cimentación de las edificaciones

-2023 / Clasificada

ACTIVIDADES RELEVANTES DEL PROYECTO

Con corte al 16/06/2024

➢ EXPEDICIÓN PERMISO FORESTAL CORTOLIMA

El día 19/06/2024 se realizo la publicación por parte del contratista en la plataforma de CORTOLIMA. En proceso de validación por parte de la entidad para

➢ ENTREGA DEL PREDIO

- Se informó por parte de la SEMI y la CGR las acciones respecto a la biblioteca
- Respecto a la continuidad de la comunidad educativa en la edificación existente, se nos informó por parte de la SEMI que se definió por parte de la alcaldesa la reubicación con el fin de poder disponer del predio durante el desarrollo de la ejecución de las obras.

➢ INICIO DE ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION (ETAPA II)

El 15/07/2024 se tiene previsto el inicio de construcción

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PROYECTOS ESTRATEGICOS

NO.	SUPERVISOR	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NO. SEDES	TOTAL SEDES GRUPO	TOTAL DE INVERSIÓN MAX POR GRUPO
Grupo 2	Iván Mantilla	IE San José	San José del Palmar	Chocó	1	1	$ 15.000.000.000,00

- Viabilidad jurídica: 10/10/2023.
- 1 proceso de obra y 1 proceso de interventoría.
- El viernes 19 de enero en comité de contratación se votaron positivamente los procesos de obra e interventoría.
- Se publicarán los procesos el 23 de enero de 2024.

En Comité Fiduciario No. 20 sesionado virtualmente entre el 12 al 13 de marzo de 2024, se aprobó la DECLARATORIA DE DESIERTA de la Convocatoria Pública PAF-MENPNIE-O-012-2024.


Mediante Comité Fiduciario No. 40 sesionado virtualmente entre el 30 y 31 de Mayo, se aprobó la declaratoria desierta de la convocatoria Privada No. PAF-MENPNIE-O-046-2024. Indicando: "…NO SE ALLEGARON PROPUESTAS A LA CONVOCATORIA RESPECTIVA".


Se hizo rueda de negocios el 14 de junio de 2024 donde se presentaron 3 empresas que se está analizando la concentración de contratos y le experiencia de las mismas para Invitarlas a una nueva Convocatoria Privada.

PROCESO	Plazo	Vlr. Convocatoria	Recursos MEN Proyecto
OBRA	3 ET1+9 ET2	$ 13.586.357.614,00	$ 15.000.000.000,00
INTV	3 ET1+11ET2	$ 962.283.090,00	
TOTALES		$ 14.548.640.704,00	$ 451.359.296,00





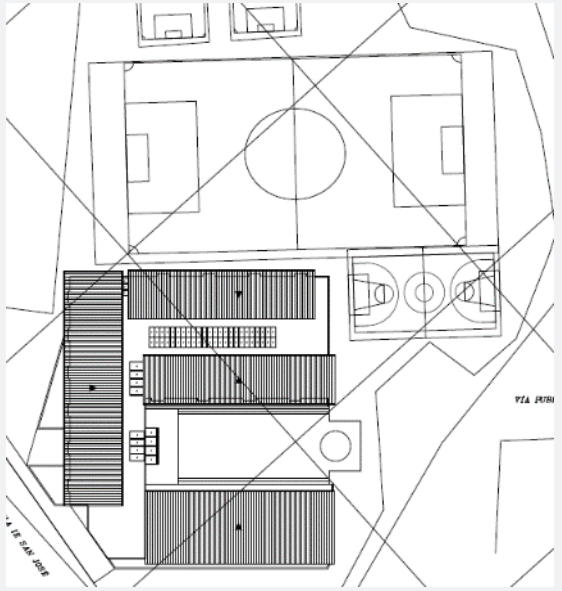

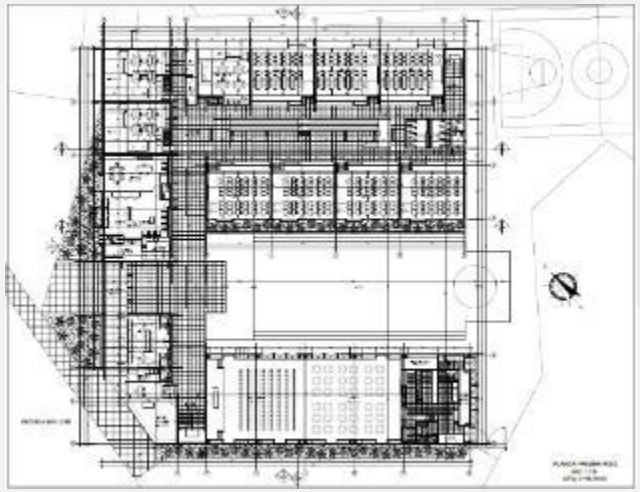

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PROYECTOS ESTRATEGICOS

NO.	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NO. SEDES	TOTAL SEDES GRUPO	TOTAL DE INVERSIÓN MAX POR GRUPO
Grupo 3	I.E. Eugenio Díaz Castro sede Principal - El Charquito	Soacha	Cundinamarca	1	1	$ 13.066.299.432,00






Edificación 1: COLEGIO EXISTENTE



Edificación 2: IGLESIA EXISTENTE

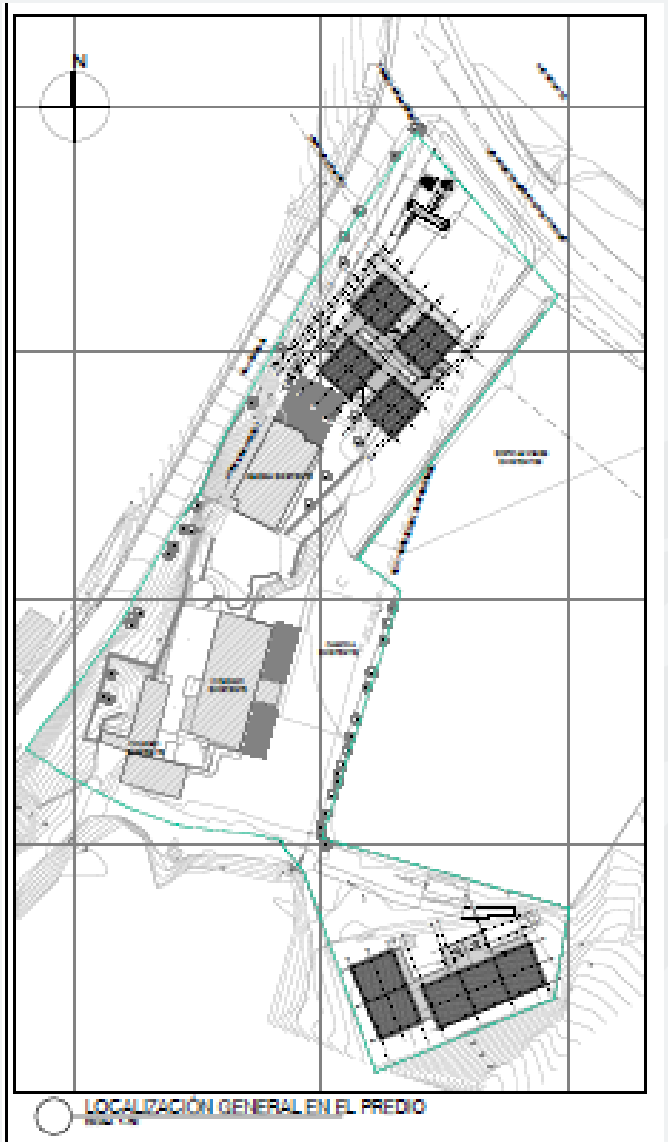

I.E. Eugenio Díaz Castro, Sede Principal
EL CHARQUITO_ SOACHA

CONTRATOS DERIVADOS

PROCESO	ADJUDICACIÓN	CONVOCATORIA	RECURSOS MEN
Obra	$ 11.406.316.041,00	$ 11.881.579.210,00	**$ 13.066.299.432,00**
Interventoría	$ 984.452.667,00	$ 1.038.090.820,00	
TOTALES	**$ 12.390.768.708,00**	**$ 12.919.670.030,00**	**$ 675.530.724,00**

OBRA	Contrato de Obra No. 014-2023 PAF-MENPNIE-O-101-2023
OBJETO	LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUGENIO DIAZ CASTRO SEDE EL CHARQUITO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**ETAPA I:** Revisión, ajuste complementación de estudios y diseños y obtención de permisos y/o licencias — **CUATRO (4) MESES** **ETAPA II:** Ampliación y mejoramiento de la Institución Educativa Eugenio Díaz Castro — **SIETE (7) MESES** **ONCE (11) MESES**
$	**$ 11.406.316.041,00** incluye AIU e IVA sobre Utilidad - Adición 1 INTV $ 116,750,900,00 (Vlr. Asumido contratista por mayor permanencia de INTV)
ESTADO ACTUAL	• **25/01/2024:** Firma acta de inicio • **24/05/2024:** Aprobación Prorroga (60 días) • En ejecución ETAPA I

Fecha Estimada Terminación ejecución: 26/02/2025

INTERV.	Contrato de Interventoría No. 003-2023 PAF-MENPNIE-I-096-2023
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**ETAPA I:** Interventoría a la revisión, ajuste complementación de estudios y diseños y obtención de permisos y/o licencias — **CUATRO (4) MESES** **ETAPA II:** Interventoría a la ampliación y mejoramiento de la Institución Educativa Eugenio Díaz Castro, incluye cierre contractual — **SIETE (9) MESES** **TRECE (13) MESES**
$	**$ 1.101.203.567,00** incluye IVA Adición 1 INTV $ 116,750,900,00
ESTADO ACTUAL	• **25/01/2024:** Firma acta de inicio • **24/05/2024:** Aprobación Prorroga (60 días) • En ejecución ETAPA I

Fecha Estimada Terminación Etapa 1: 24/07/2024

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

GESTIONES Y AVANCES

I.E. Eugenio Díaz Castro, Sede Principal
EL CHARQUITO_ SOACHA

24,32% Ejecución Etapa 1 (Con corte al 23/06/2024 – prorroga 1)

- ✓ **16/04/2024:** Se sostiene reunión en las instalaciones de la Secretaría de Educación municipal, con presencia de representante de las Secretaría de Educación, Curaduría Urbana 2 de Soacha, Secretaria de Ambiente, Ordenamiento Territorial, Catastro, FINDETER, con el fin de aclarar afectaciones del proyecto:

La reunión, fue convocada dado que la Curaduría Urbana 2 de Soacha, informó a la supervisión de FINDETER que el proyecto presuntamente tenía afectaciones relacionadas por la sentencia del río Bogotá (2014) las cuales imposibilitaban la construcción del proyecto como se tenia prevista, dado que en la ronda del rio en una proximidad de 300 metros, no era posible construir el uso del proyecto. Sin embargo, se verificó y concertó con las entidades municipales que, esta interpretación no era precisa dado que en el área rural estaba excluida esta condición.


- ✓ **14/06/2024:** Se sostiene reunión en las instalaciones de la Secretaría de ambiente, con presencia de representantes de Secretaría de Educación, Secretaria de Ambiente, CAR, Contratista e interventoria, con el fin de aclarar afectaciones ambientales del proyecto respecto al humedal, frente a lo cual el municipio indico que se debía solicitar un concepto integral del Humedal

- ✓ **18/06/2024:** Se sostiene reunión FINDETER, con presencia de representantes de Secretaría de planeación, en el marco de la cual se contempló la posibilidad de integrar el predio de la biblioteca al proyecto para el desarrollo del bloque 2 o del proyecto. Se debe validar con secretaria de cultura y secretaria de educación.

- ➢ **28/06/2024:** Se tiene prevista reunión con Secretarias de educación, planeación, ambiente, cultira, FINDETER, Contratista e Interventoria (Y MEN, debe confirmar) en el municipio de Soacha para definir nueva disposición de predio para desarrollar el bloque 2.


I.E. Eugenio Díaz Castro, Sede Principal
EL CHARQUITO_ SOACHA



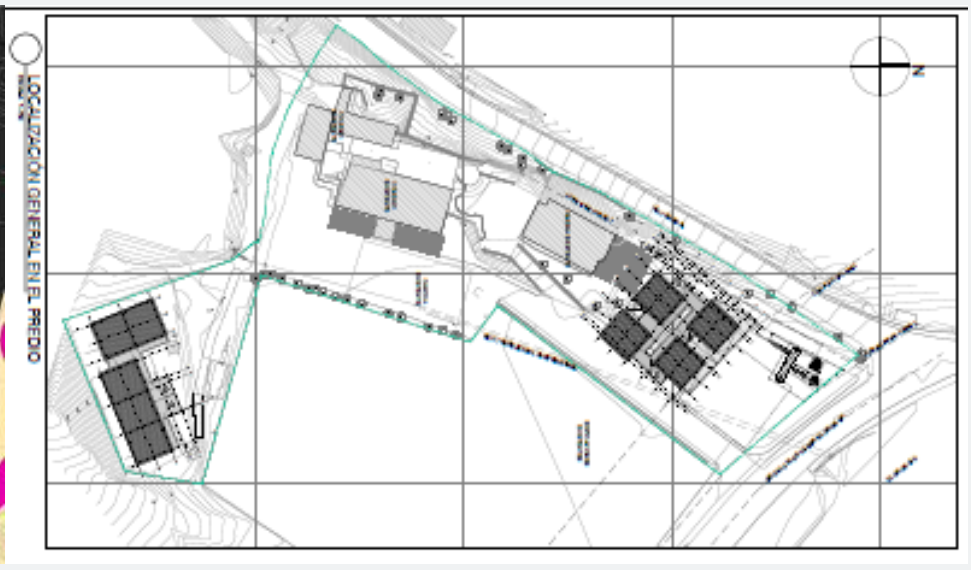

- Plano oficio 20232053487 CAR 29/06/2023
- Alcance inicial proyecto – Diseños FFIE

- Solicitud FINDETER 20/06/2024 se oficio No. 2202452006107 dirigido al municipio de Soacha

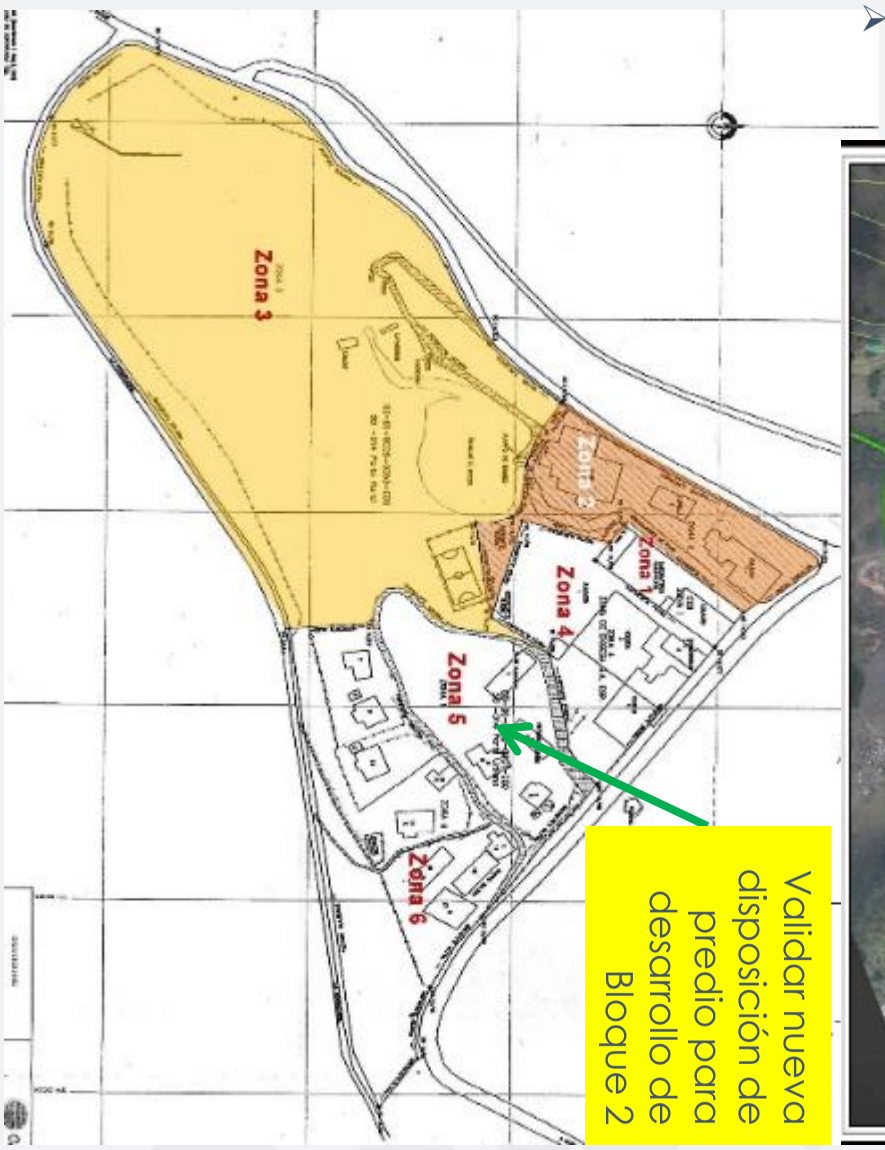

- oficio SAMDRPA 0523 a Secretaria de Ambiente 23/04/2024



PROYECTOS ESTRATEGICOS

NO.	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPTO.	TOTAL DE INVERSIÓN MAX POR GRUPO	ESTADO
Grupo 4	Infraestructura Educativa Pueblos Emberá RISARALDA 1	COMPROMISOS PUEBLOS EMBERA Mistrató; Marsella, Apía, Quinchia, Guatica	Risaralda	$ 11.024.565.520,55	Estas sedes se atenderán por el Grupo 20 Línea Mejoramientos Actualmente en convocatoria: - OBRA No. PAF-MENPNIE-O-051-2024 - INTRV No. PAF-MENPNIE-I-017-2024: suspendido hasta adjudicación de obra
Grupo 5	Infraestructura Educativa Pueblos Emberá RISARALDA 2	COMPROMISOS PUEBLOS EMBERA 2 - Pueblo Rico			Estas sedes se atenderán por el Grupo 26 Línea Mejoramientos Actualmente en convocatoria: - OBRA No. PAF-MENPNIE-O-050-2024. - INTRV No. PAF-MENPNIE-I-018-2024: suspendido hasta adjudicación de obra

Grupo 4 Estratégicos = Grupo 20 Línea Mejoramientos (12 sedes) – se adjudica 31/05/2024

Grupo 5 Estratégicos = Grupo 26 Línea Mejoramientos (12 sedes) – se adjudica 31/05/2024

- Teniendo en cuenta que habían sido canceladas las convocatorias de obra (grupo 20 y grupo 26 Línea 1M), el 16/04/2024 se decide retomar los procesos de convocatoria, por lo que fueron llevados comité de contratación el 17/04/2024.
- El 18/04/2024 se llevó a cabo una reunión en Balboa (RIS) con la minga con el fin de presentar los avances al respeto de las intervenciones.
- Está pendiente incorporar 6 sedes de la Línea de Estratégicos y 3 sedes de la Línea de mejoramientos
- Actualmente se encuentra en votación de comité técnico (24/04/2024)

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PROYECTOS ESTRATEGICOS

NO.	SUPERVISOR	PROYECTO	MUNICIPIO	DPTO	NO. SEDES	TOTAL SEDES GRUPO	TOTAL DE INVERSIÓN MAX POR GRUPO	
Grupo 6	Iván Mantilla	Infraestructura Educativa SEDES AFRO Litoral de San Juan 1	Compromisos Litoral de San Juan Sedes AFRO	Chocó	6	10	Obra: $ 3.287.318.135,00 Interventoría: $ 453.721.390,00 **Total: $3.741.148.261,00**	**$ 5.887.873.451,00**
Grupo 7	Cristian Zipa	Infraestructura Educativa SEDES INDIGENA Litoral de San Juan 2	Compromisos Litoral de San Juan Sedes INDÍGENA		4		Obra: $1.791.287.225,00 Interventoría: $355.437.965,00 **Total: $2.146.725.190,00**	

ESTADO:

- 2 procesos obra
- 2 procesos Interventoría

Visitas realizadas entre el 8 y 11 de septiembre.

- 19 Viabilidades Técnicas Afros (6 Focalizadas)
- 11 Viabilidades Técnicas Indígenas (7 focalizadas).

INDÍGENAS: 4 sedes

- La convocatoria pública de Obra No. PAF-MENPNIE-O-041-2024 se declaró desierta el 7 de mayo de 2024. Actualmente se adelanta el ajuste de los estudios previos para el proceso de convocatoria privada.
- La adjudicación de la convocatoria de Interventoría No. PAF-MENPNIE-I-032-2024 se encuentra suspendida según acta suscrita el 8 de mayo, hasta tanto no se adjudique el proceso de obra. A la fecha cuenta con 5 proponentes habilitados.

- AFRO: 6 sedes
- Está en proceso de revisión final en la jefatura de contratación derivada para radicar en la dirección de contratación los procesos de obra e interventoría. Se estima publicación para 28/06/2024

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PROYECTOS ESTRATEGICOS

NO.	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NO. SEDES	TOTAL SEDES GRUPO	TOTAL DE INVERSIÓN MAX POR GRUPO
Grupo 8	Infraestructura Educativa Olaya Herrera, Nariño	ENCUENTRO SANQUIANGA	Nariño	9	9	$ 1.440.000.000,00

ESTADO	Olaya Herrera – Nariño 1	ENCUENTROS SANQUIANGA 6 Sedes $ 1.080.000.000,00	IE. Rurales: 4 2 IE. Urbanas 1. IE. Las Marías: Viabilidad jurídica 08/11/2023 PE: $ 200.000.000 - Mejoras 6 Aulas, cocina y comedor, auditorio, sala informática 2. IE Merizalde Porvenir: Viabilidad jurídica 31/10/2023 PE: $ 980.000.000 - Reposición 5 aulas, mejoras 7 Aulas, baterías sanitarias cocina y comedor. 3. IE San José Calabazal: Solicitud de Doc 15/04/2024 PE: $ 570.000.000 - Reposición 7 aulas, Mejoras 2 Aulas , baterías sanitarias. 4. IE Agro Río Sanquianga: Viabilidad jurídica 14/11/2023 PE: 880.000.000 - Reposición 8 aulas, Mejoras 8 Aulas, baterías sanitarias, cocina, auditorio. 5. IE Litoral Pacifico: Viabilidad jurídica 19/11/2023 PE: 1.260.000.000 - Obra nueva 6 aulas, Mejoras 5 Aulas, baterías sanitarias cocina y auditorio. 6. Inmaculada: Viabilidad jurídica 17/11/2023 PE: 950.000.000 - Obra nueva 3 aulas, Mejoras 12 Aulas , baterías sanitarias cocina y comedor Visitas técnicas realizadas entre el 28 de noviembre y el 01 de diciembre del 2023.
	Olaya Herrera – Nariño 2	ENCUENTROS SANQUIANGA 2 Sedes $ 360.000.000,00	7. Tórtola: Viabilidad jurídica 24/11/2023 PE: 310.000.000 - Obra nueva 2 aulas, Mejoras 5 Aulas , baterías sanitarias cocina y comedor 8. Víbora Paraiso: Solicitud de Doc. a rector 15/04/2024 PE: 50.000.000 - Obra nueva 1 aula, Mejoras 1 Aulas , baterías sanitarias cocina y comedor Visitas técnicas realizadas entre el 28 de noviembre y el 01 de diciembre del 2023 (8 sedes visitadas). VISITA PENDIENTE SAN JOSE DE ROBLES, programada para el mes de mayo.

- En proceso de estructuración de los estudios previos de las 8 sedes
- Los Estudios Previos Se encuentran en revision por parte de contratacion derivada y del area tecnica
- Total, sedes focalizadas $5.200.000.000 (Incluye todas las sedes con intervenciones básicas)
- Total, Propuesta de intervención $4.388.000.000 (aulas + baterías sanitarias – Sedes 2,4,5,6,7)

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PROYECTOS ESTRATEGICOS

NO.	SUPERVISOR	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NO. SEDES	TOTAL SEDES GRUPO	TOTAL DE INVERSIÓN MAX POR GRUPO
Grupo 9	Pedro José Jaller Sofán	CENTRO EDUCATIVO ESMERALDAS	Mercaderes (Corregimiento Esmeraldas)	Cauca	1	1	$ 5.839.076.493,00

ESTADO:	• Contacto con el Alcalde y el rector del CE. • Radicado en C. Derivada (en revisión) • Viabilidad jurídica: 26/09/2023 • **PPT diseño $6.269.907.795,** • **Vlr. asignado por el MEN $5.839.076.493,00** • **Se aprobo en comité de contratacion.** • **Se encuentra siendo votado en comité tecnico.**
SIMAT:	• Reporte CE Esmeraldas (rector): 85 • Reporte CE Esmeraldas (ETC): 85

VALOR T. ASIGNADO MEN		**$**	**5.839.076.493,00**
OBRA	E1	$	200.192.160,00
	E2 TOTAL	$	5.011.752.000,00
	TOTAL OBRA	**$**	**5.211.944.160,00**
INTV	E1	$	84.564.550,00
	E2	$	522.486.000,00
	TOTAL INTV	**$**	**607.050.550,00**
SALDO A FAVOR PROYECTO		**$**	**20.081.783,00**



- Se cuenta con la siguiente documentación como parte de los Estudios y Diseños iniciales:

✓ Diseño Arquitectónico
✓ Diseño Estructural
✓ Diseño Electrico
✓ Diseño Hidráulico
✓ Estudio de Suelos
✓ Levantamiento Topográfico
✓ Presupuesto Base (supera Disponibilidad Presupuestal MEN)



PROYECTOS ESTRATEGICOS

NO.	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NO. SEDES	TOTAL SEDES GRUPO	TOTAL DE INVERSIÓN MAX POR GRUPO
Grupo 10	I. E. AGROPECUARIA PUEBLO TOTOROEZ, SEDE BETÁNIA	Totoró	Cauca	1	1	$ 2.695.988.000,00

- Viabilidad jurídica: 23/10/2023
- Este proyecto cuenta con la totalidad de los estudios y diseños en etapa de anteproyecto arquitectónico. Se tiene el contrato de soporte de la consultoría contratada por el municipio de Totoró.

➢ DISEÑO para 195 Estudiantes
➢ SIMAT 14/02/2024 306 Estudiantes

- **OBRA PAF-MENPNIE-O-033-2024**

Se presentaron 2 proponentes. Al corte del presente periodo se informa que, el proceso se declaró desierto puesto que ninguno de los proponentes resulto habilitado en el marco del proceso de evaluación. Actualmente en proceso de convocatoria privada.

- **INTERVENTORIA PAF-MENPNIE-I-025-2024**

Se presentaron 4 proponentes de los cuales 2 resultaron habilitados. El proceso se encuentra suspendido hasta tanto no se resuelva el proceso de obra.



		ETAPAS	VALOR ETAPA	VALOR CONVOCATORIA	TOTAL, PROYECTO	RECURSOS MEN
TOTORO	OBRA	ETAPA I:	$169.214.359,00	$2.380.838.359	$2.690.737.169,00	$2.695.988.000,00
		ETAPA II:	$2.211.624.000,00			
	INTERV	ETAPA I:	$38.698.810,00	$309.898.810,00		
		ETAPA II:	$271.200.000,00			

Diferencia: $5.250.831,00

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PROYECTOS ESTRATEGICOS

NO.	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NO. SEDES	TOTAL SEDES GRUPO	TOTAL DE INVERSIÓN MAX POR GRUPO
Grupo 11	I.E. Agropecuaria San Carlos,vereda El Gaubo,Corregimiento San Carlos.	Colon	Nariño	1	1	$ 6.500.586.706,00

- Viabilidad jurídica: 30/10/2023 APROBADA
- Alcance: Rediseño de la IE teniendo en cuenta las edificaciones construidas (bloque de 8 aulas y baterías sanitarias), y la matricula del SIMAT actualizada.
- Se cuenta con documentación de Estudios y Diseños.
- Planos Record de la construcción de 8 aulas existentes.

Procesos de contratación: Mediante acta de comité fiduciario No. 65 sesionado el 22 de agosto de 2024 se aprueba el orden de elegibilidad y adjudicar las convocatorias de obra e interventoría.

- **Proceso de obra** PAF-MENPNIE-O-067-2024 CONSORCIO SAN CARLOS 2024 - $ 5.458.250.573
- **Proceso de interventoría** PAF-MENPNIE-I-079-2024 ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS - $ 740.376.374

Proceso		Valor
Obra	E1	$ 222.250.573,00
	E2	$ 5.236.000.000,00
	Total obra	$ 5.458.250.573,00
Interventoría	E1	$ 104.638.505,00
	E2	$ 635.737.869,00
	Total interventoría	$ 740.376.374,00
Total proyecto		$ 6.198.626.947,00
Total disponible		$ 6.500.586.706,00
Saldo		$ 301.959.759,00



PROYECTOS ESTRATEGICOS

NO.	SUPERVISOR	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NO. SEDES	TOTAL SEDES GRUPO	TOTAL DE INVERSIÓN MAX POR GRUPO
Grupo 12	Laura Delgado	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA SEDE PRINCIPAL	Caimito	Sucre	1	1	$ 3.857.427.662,00

- La visita técnica realizada por Findeter: 13/09/2023
- Viabilidad técnica: 13/09/2023
- Viabilidad jurídica: 18/10/2023
- Publicación del informe definitivo **27/02/2024**
- **Actualmente en proceso de legalización de los contratos derivados**
- **Convocatoria Obra PAF-MENPNIE-O-006-2024**

adjudicado UNIÓN TEMPORAL IE CAIMITO - Suspendido proceso de legalización de contrato por validación de documentación aportada por uno de los miembros de la unión temporal en el marco de la vinculación del Sarlaft. Proceso priorizado por secretaria general FINDETER (24/04/2024)

- **Convocatoria Interventoría PAF-MENPNIE-I-007-2024**

Aadjudicado INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S. – Contrato Suscrito con garantías aprobadas. A la espera de definición contractual proceso de OBRA.



ADJUDICACIÓN			VALOR CONVOCATORIA	RECURSOS MEN
OBRA	UNIÓN TEMPORAL IE CAIMITO	$ 3.239.074.000,00	$ 3.414.281.550	$ 3.857.427.662,00
INTERV	INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S	$ 389.595.668,02	$ 413.483.220,00	
		$ 3.628.669.668,02	$ 3.827.764.770	$ 228.757.993,98

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PROYECTOS ESTRATEGICOS

NO.	SUPERVISOR	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NO. SEDES	TOTAL SEDES GRUPO	TOTAL DE INVERSIÓN MAX POR GRUPO
Grupo 12	Laura Delgado	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA SEDE PRINCIPAL	Caimito	Sucre	1	1	$ 3.857.427.662,00

- La visita técnica realizada por Findeter: 13/09/2023
- Viabilidad técnica: 13/09/2023
- Viabilidad jurídica: 18/10/2023
- Publicación del informe definitivo **27/02/2024**

ADJUDICACIÓN			VALOR CONVOCATORIA	RECURSOS MEN
OBRA	**CONSORCIO INSTITUCIÓN SAN JUAN BAUTISTA**	$ 3.221.231.493,00	$ 3.414.281.550	**$ 3.857.427.662,00**
INTERV	**INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS SAS**	$ 389.595.668,02	$ 413.483.220,00	
		$ 3.610.827.161,02	**$ 3.827.764.770,00**	**$ 246.600.500,98**

- **Contrato Obra No. 029- PAF-MENPNIE-O-006-2024 - CONSORCIO INSTITUCIÓN SAN JUAN BAUTISTA**

Adjudicado a CONSORCIO INSTITUCIÓN SAN JUAN BAUTISTA – en proceso de legalización de contrato

- **Contrato Interventoría No. 016-PAF-MENPNIE-I-007-2024 - INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS SAS**

adjudicado INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S. – Contrato Suscrito con garantías aprobadas. A la espera de legalización contrato obra

- 19/06/2024: Acta de contextualización proyecto con contratista e interventoria

PROYECTOS ESTRATEGICOS

NO.	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NO. SEDES	TOTAL SEDES GRUPO	TOTAL DE INVERSIÓN MAX POR GRUPO
Grupo 13 (G 25 LM)	Infraestructura Educativa - Mesas de Trabajo con la ETC de Buenaventura	Buenaventura	Valle del cauca	12 (+3)	4	$ 4.660.000,000,00

Las 15 sedes inicialmente focalizadas, se atenderán por la línea de Mejoramientos (12 LE + 3 LM)
grupo 25 de línea de mejoramientos – adjudicación 10/05/2024

- Obra **PAF-MENPNIE-O-043-2024** cierre 15/04/2024 se presentaron 2 proponentes
- Interventoría **PAF-MENPNIE-I-034-2024** cierre 16/04/2024 se presentaron 10 proponentes

1. I.E. Atanasio Girardot sede Atanasio Girardot. Viabilidad jurídica: 23/11/2023 APROBADA
2. I.E. Simón Bolívar sede Granadinos: Viabilidad jurídica: 14/12/2023 APROBADA
3. I.E. José Ramón Bejarano sede La Comuna: Viabilidad jurídica: 30/01/2024 APROBADA
4. I.E. Antonio Nariño sede La Nueva Colombia: Viabilidad jurídica: 20/12/2023 APROBADA
5. I.E. Jaime Roock sede Jaime Roock. Viabilidad jurídica: 30/01/2024 APROBADA
6. I.E. Agropecuaria José María Córdoba sede José María Córdoba. Viabilidad jurídica: 30/01/2024 APROBADA
7. I.E. José María Córdoba sede San Cipriano. Viabilidad jurídica: 30/01/2024 APROBADA
8. I.E. Francisco Javier Cisneros sede La Gran Colombia. Solicitud de Doc al Rector 13/02/2024
9. IE Francisco Javier Cisneros sede Héctor Epalza Quintero. Solicitud de Doc al Rector 13/02/2024
10. I.E. Nonam sede Nonam: Viabilidad jurídica: 28/02/2024 APROBADA
11. .I.E. Nonam sede San Juan Bautista. Viabilidad jurídica: 28/02/2024 APROBADA
12. .I.E. Nonam sede Comunidad Indigena de Santa Rosa de Guayacán: Viabilidad jurídica: 23/04/2024 APROBADA
13. .I.E. Normal superior Juan ladrilleros: En revisión por Jurídica: 22/04/2024
14. .I.E San Rafael: En revisión por Jurídica: 22/04/2024

Visitas técnicas realizadas entre el 28 y el 30 de Noviembre del 2023 (12 sedes).

- Las 3 sedes de Nonam no fueron visitadas por orden Público.

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada


PROYECTOS ESTRATEGICOS

NO.	SUPERVISOR	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NO. SEDES	TOTAL SEDES GRUPO	TOTAL DE INVERSIÓN MAX POR GRUPO
Grupo 14	Cristian Zipa	Infraestructura Educativa CRIHU	Compromisos CRIHU	Huila	4	4	$ 1.252.960.880

ESTADO:

Suscritos los contratos de obra 031-2024 e interventoría 030-2024, y una vez adelantado el proceso de legalización de las garantías y atención de las obligaciones previas, el 30 de julio se realizó la suscripción del acta de inicio y componente 1 correspondiente a los diagnósticos, estudios y diseños. A la fecha, se realizaron las visitas iniciales para el levantamiento y elaboración de las propuestas técnicas de intervención.

PROCESO	VALOR ADJUDICADO
OBRA	$ 968.394.297
INTERVENTORÍA	$ 227.100.006
TOTAL	**$1.195.494.303**

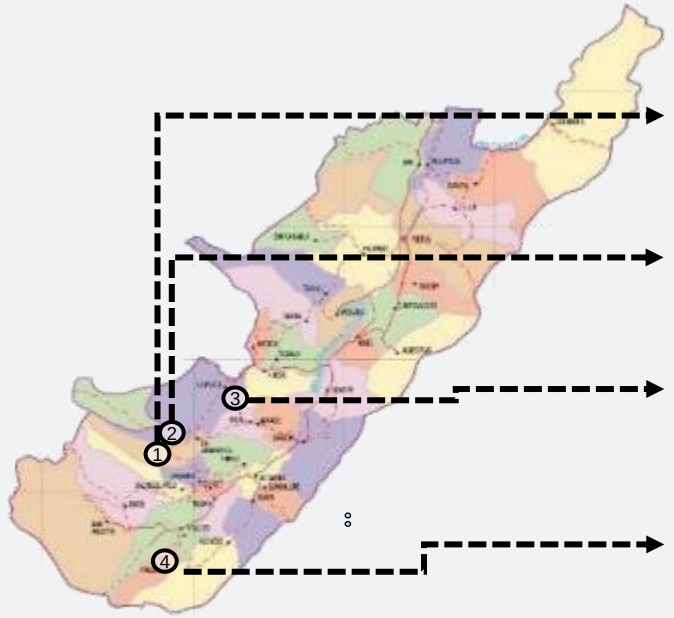

1. Centro Etnoeducativo Namui Nu Mai - Sede La Cristalina (43,4KM):
2. Institución Educativa Yu Luucx Pishau - Sede Peñón de Tálaga (41,3KM):
3. Institución Educativa Yu Luucx Pishau - Sede Potrerito (15,1KM):
4. Institución Etnoeducativa Yachay Wasi Runa Yanakuna - Sede Yakuas (1,3KM):

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PROYECTOS ESTRATEGICOS

NO.	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	NO. SEDES	TOTAL SEDES GRUPO	TOTAL DE INVERSIÓN MAX POR GRUPO
Grupo 16	I.E. NORMAL SUPERIOR LA INMACULADA DE LA ITALIA SEDE ESCUELA SAN PIO XII DE SAN PEDRO.	**San José del Palmar**	Chocó	1	1	Se tiene presupuesto de 250 millones para la obra.

ESTADO:	• Se realizó la visita de obra el 17 de marzo de 2024. • Se tiene la ficha de viabilidad jurídica del 27 de mayo de 2024. • Se tiene la ficha de viabilidad técnica del 27 de mayo de 2024. • En elaboración del Estudio Previo. • Colapso parcial de la infraestructura en una esquina. • Presupuesto de 250 millones para reforzamiento estructural y mejoramiento. • **<u>Se atenderá por el grupo 8 de la línea de MEJORAMIENTOS</u>**

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

LÍNEA EMERGENCIAS

8 PROCESOS DE OBRA
PROCESOS DE INTV

$ 21.780

46 Proyectos



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

EMERGENCIA

PROCESOS DE OBRA
PROCESOS DE INTV

$ 29,800

63 Sedes a intervenir

Resumen Avance Verificación Técnica

SEDES LISTADO INICIAL (63)	
SEDES A INTERVENIR	60
SEDES NO INTERVENIDAS EN ESTE CI	3
TOTAL	63

Nota: Las dos sedes que no serán intervenidas en este contrato, es debido a que ya serán intervenidas por otro contrato o en su defecto por otras entidades territoriales.

Resumen Avance Verificación Predial

Resultados de verificación predial sobre 63 sedes institucionales

SEDES TOTAL	
POSIBLE VIABILIDAD	6**
VIABLES	**54**
TOTAL	60

** Posible Viabilidad:
- Falta documentación soporte para continuar con revisión
- Pendientes gestiones con terceros para saneamiento predial
- Trámites para obtención de sana posesión
- Pendiente postulación nuevo predio

Estado GRUPO 3, Departamentos de Cauca - Valle del Cauca - Choco

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENPNIE-O-009-2024 HUGO HINESTROZA

Contratista Interventor PAF-MENPNIE-I-009-2024 – UNIÓN TEMPORAL SEDES 24

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO E1	FECHA FIN E1	FECHA INICIO E2	FECHA FIN E2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O: $ 2,637,246,083 I: $ 539,120,789 P:$ 3,176,366,872	14/05/24	29/07/24	30/07/24	29/12/24	Programado	14,47%	-0,10%
AVANCE POR COMPONENTE	Programado	100 %	Programado	0,90 %	Ejecutado	14,37%	
	Ejecutado	100 %	Ejecutado	0,78 %			

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	IE	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	BATERAS SANITARIAS
Cauca	Buenos Aires	I.E. Mazamorrero	Principal		2	
Cauca	Puerto Tejada	I.E. San Pedro Claver	Principal		2	
Cauca	Santander de Quilichao	I.E. Limbania Velazco	Principal		total cubierta	
Cauca	Suarez	C.E. ATH FXINXI DXI´J	Unión Olivares	Resta.Es		
Valle del Cauca	Buenaventura	I.E. Jaime Rock	Sagrado Corazón		2	
Valle del Cauca	Florida	I.E Las Américas	Principal		total	
Choco	Bajo Baudó	I.E. Sagrado Corazón de Virudó	Principal		3	1

Información Detallada

18/06/24. Se encuentra en estudio para aprobación los diagnósticos de 5 sedes. Se está trabajando en los PGSR, de Ambiente y Seguridad. 23/08/24 Se realizaron las Socializaciones de todas las Sedes. Se inició obra en la Sede Suarez. Se recibió el Estudio de patología de la I.E. Las Américas para dar inicio al mejoramiento de pañetes y pintura. El 13 de agosto se recibió la aprobación por parte del MEN para el cambio total de la Cubierta de la Sede Santander de Quilichao. Por solicitud enviada por el Rector se dará inicio el 26 agosto. La sede I.E. Las Américas por solicitud enviada por el Sr. Rector, iniciará obras el 26 de agosto.

Registro Fotográfico actual:

Suarez







Restaurante Escolar : Desmonte manual de tejas de asbesto cemento, cimentación y placa

Santander de Quilichao

Inicio Obra : 26 Agosto
Cambio Cubierta.



Florida



Inicio Obra : 26 Agosto : Resanes, pintura muros.

Virudó Buenaventura



Se realizó socialización el 23 de agosto



Puerto Tejada

Inicio Obra : A partir del 19 de agosto se realizaron los trámites afiliación personal y llegada de material a la sede.

Estado GRUPO 6, Departamentos de Antioquia – Bolívar - Santander

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENPNIE-O-054-2024: CONSORCIO GRUPO 6 2024

Contratista Interventor Por Definir

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO E1	FECHA FIN E1	FECHA INICIO E2	FECHA FIN E2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O: $ 2. 335.418.322 I: $ 502.109.790 P:$ 2.837.528.112	20/08/2024	04/11/2024	07/11/2024	07/04/2025	Programado	0%	
AVANCE POR COMPONENTE	Programado	0%	Programado	0%	Ejecutado	0%	
	Ejecutado	0%	Ejecutado	0%			

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	IE	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	BATERAS SANITARIAS
ANTIOQUIA	ITUANGO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS MARIA PRECIADO ECHAVARRIA	LAS LOMITA			
ANTIOQUIA	SANTA BARBARA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUAYABO	EL GUAYABO			
ANTIOQUIA	SEGOVIA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBORIO BATALLER	CER SANTA ISABEL DE AMARA			
ANTIOQUIA	VALDIVIA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALDIVIA	CER SANTA ISABEL			
BOLIVAR	CANTAGALLO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA JOSE MARIA CUELLAR DIAZ	SEDE SINZONA SEDE PATICO BAJO			
SANTANDER	PUERTO WILCHES	ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO	ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO			

Información Detallada

20/08/2024: se suscriben acta de inicio de los contratos de obra e interventoría, donde el contratista se encuentra terminando de realizar las visitas a cada institución educativa para identificar la necesidad y definir al alcance de intervención.

Estado GRUPO 7, Departamentos de Antioquia – Choco – Bolívar - Sucre

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENPNIE-O-004-2024 CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024

Contratista Interventor PAF-MENPNIE-I-009-2024 – LUIS GUILLERMO NARVAEZ

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO E1	FECHA FIN E1	FECHA INICIO E2	FECHA FIN E2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O: $ 2. 254.604.891 I: $ 471.983.203 P:$ 2.276.588.094	03/04/2024	09/06/2024	09/07/2024	18/11/2024	Programado	32,72%	
AVANCE POR COMPONENTE	Programado	100%	Programado	16,29%	Ejecutado	41,25%	
	Ejecutado	100%	Ejecutado	24,81%			

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	IE	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	BATERAS SANITARIAS
ANTIOQUIA	SAN PEDRO DE URABÁ	CER BETANIA	CER SAN EMIGDIO		3	
CORDOBA	LORICA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ	PRINCIPAL	2		
CHOCÓ	UNGUÍA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALCIDES FERNANDEZ	PRINCIPAL		3	
BOLIVAR	MAGANGUÉ	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES	ILUSIÓN		3	1
BOLIVAR	SAN JACINTO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PARAÍSO	SAN JOSE DE MORENA ABAJO	1		1
SUCRE	SAN BENITO ABAD	CENTRO EDUCATIVO LA CEIBA	PRINCIPAL	2		

Información Detallada

09/07/2024: se inician obras del componente ll del contrato

Nota: el día 13 de agosto se llevó a cabo la socialización de con los directivos de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ.

Registro Fotográfico:

San Jacinto



San Benito



Magangué



San Pedro de Urabá



Unguía



Loríca



Estado GRUPO 9, Departamentos de Cesar y Magdalena

Contratista de Diseño y 018-PAF-MENPNIE-O-021-2024 DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.
Contratista Interventor 017-PAF-MENPNIE-I-019-2024 – LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO E1	FECHA FIN E1	FECHA INICIO E2	FECHA FIN E2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O: $2.256.714.724 I: $471.983.203 P:$2.728.697.927	15/05/2024	30/07/2024	Por confirmar en cada sede según recibo final de E1	30/12/2024 Por confirmar según resultados E1 de cada sede	Programado	15,9%	0,0%
AVANCE POR COMPONENTE	Programado	100%	Programado	0%	Ejecutado	15,9%	
	Ejecutado	100%	Ejecutado	0%			

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	IE	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	BATERAS SANITARIAS MEJORADAS
CESÁR	AGUSTIN CODAZZI	IE NACIONAL AGUSTIN CODAZZI	IE NACIONAL AGUSTIN CODAZZI	0	8	7
CESÁR	BOSCONIA	IE ELOY QUINTERO ARAUJO	IE ELOY QUINTERO ARAUJO	0	9	6
CESÁR	MANAURE BALCÓN DEL CESAR	IE SAN ANTONIO	SABANAS DE LEON	0	3	1
CESÁR	VALLEDUPAR	IE VILLA CORELCA	VILLA CORELCA	0	7	1
MAGDALENA	ARACATACA	IE DEPARTAMENTAL JHON F KENNEDY	COLEGIO JHON F KENNEDY	0	9	6
MAGDALENA	FUNDACIÓN	IE DEPARTAMENTAL JHON F KENNEDY	CENTRO EDUCATIVO 16 DE JULIO	0	8	4

Registro Fotográfico:

ARACATACA - COLEGIO DEPARTAMENTAL JOHN F. KENNEDY



FUNDACION - COLEGIO DEPARTAMENTAL JOHN F. KENNEDY



BOSCONIA - I.E. ELOY QUINTERO ARAUJO



VALLEDUPAR - COLEGIO VILLA CORELCA



MANAURE - I. E SAN ANTONIO, SEDE: SABANAS DE LEON



AGUSTIN CODAZZI - I.E. NACIONAL AGUSTIN C.



Información Detallada

Se terminaron los ajustes del Informe del Componente I (APU de ítems no previstos y presupuesto del Componente II de cada institución educativa) y se está gestionando la confirmación de la necesidad o no de permisos o licencias con las entidades correspondientes en 4 sedes para establecer la posible fecha del inicio del Componente II (se tienen 2 con permisos para inicio). Como valor aproximado (en gestión de aprobación de la interventoría) se tiene la siguiente proyección en millones para el Componente II (manteniendo el valor contractual global): Agustín Codazzi $314, Bosconia $317, Manaure $318, Valledupar $313, Aracataca $320, Fundación $315.

Estado GRUPO 10, Departamento La Guajira

Contratista de Diseño y Obra: PAF-MENPNIE-O-023-2024 CONSORCIO LA GUAJIRA MEDTEC 2024

Contratista Interventor: PAF-MENPNIE-I-021-2024 – CONSORCIO GUAJIRO 021

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO E1	FECHA FIN E1	FECHA INICIO E2	FECHA FIN E2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O: $**1.465.491.420** I: $ **337.131.848** P: $ **1.802.623.268**	30mayo2024	30julio2024	31julio2024	30nov2024	**Programado**	16.50%	**+0.02%**
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	**100.00%**	**Programado**	**0,30%**	**Ejecutado**	16,52%	
	Ejecutado	**100.00%**	**Ejecutado**	**1,72%**			

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	IE	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	BATERAS SANITARIAS
LA GUAJIRA	URIBIA	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DEL CABO DE LA VELA	AIPIR	1	0	0
LA GUAJIRA	RIOHACHA	INSTITUCION EDUCATIVA ALMIRANTE PADILLA	PRINCIPAL	0	6	0
LA GUAJIRA	MAICAO	INSTITUCION EDUCATIVA NO. 3	MARÍA EUGÉNIA	0	0	1
LA GUAJIRA	MANAURE	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ESCUELA RURAL INDÍGENA PRESIARU	2	0	0

OBRA: A corte del 18agosto2024 se ha hecho entrega de todos los productos del componente I (estudios y diseños) los cuales fueron revisados y aprobados por interventoría .

INTERVENTORIA: A corte del 18agosto2024 se ha hecho entrega de doce (12) INFORMES SEMANALES y dos (02) mensuales.

Registro Fotográfico:



RETIRO MANTO EN MAL ESTADO CUBIERTA SEDE ALMIRANTE PADILLA RIOHACHA



RETIRO TEJAS TIPO SANDWICH SEDE ALMIRANTE PADILLA RIOHACHA



DESMONTE MUROE EN DRYWALL AULAS SEDE ALMIRANTE PADILLA RIOHACHA



IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS SEDE ALMIRANTE PADILLA RIOHACHA



DESCARGUE MATERIALES PARA DOS (02) AULAS EN SEDE ERI PRESIARU MANAURE



ACOPIO AGREGADOS PARA DOS (02) AULAS EN SEDE ERI PRESIARU MANAURE

GRUPO 4 - Departamento del Chocó
(46) INSTITUCION EDUCATIVA BORAUDO - SEDE: BORAUDO - SEDE PRINCIPAL
Caso especial, modificación alcance

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Condiciones actuales Centro Educativo Boraudo








- Se priorizó el reasentamiento y construcción de la nueva Institución educativa en el nuevo Boraudo, debido a las condiciones de riesgo de inundación que existen en el viejo Boraudo.

Viabilidad técnica y jurídica

- Se cuenta con viabilidad jurídica debidamente aprobada, debido a que se cuenta con la documentación completa de los predios en los cuales será construida la nueva institución educativa, en medio del reasentamiento integral de la comunidad de Boraudo, en el municipio de Lloró, en el departamento del Chocó.

- Igualmente, después de realizar la visita y realizar inspección visual del predio, se cuenta con la viabilidad técnica para realizar la construcción en la zona asignada donde se está llevando a cabo el reasentamiento de la comunidad, teniendo en cuenta que, durante la fase de estudios y diseños de la ejecución del contrato, se deberá hacer un estudio topográfico y de suelos para revalidar dicha viabilidad.

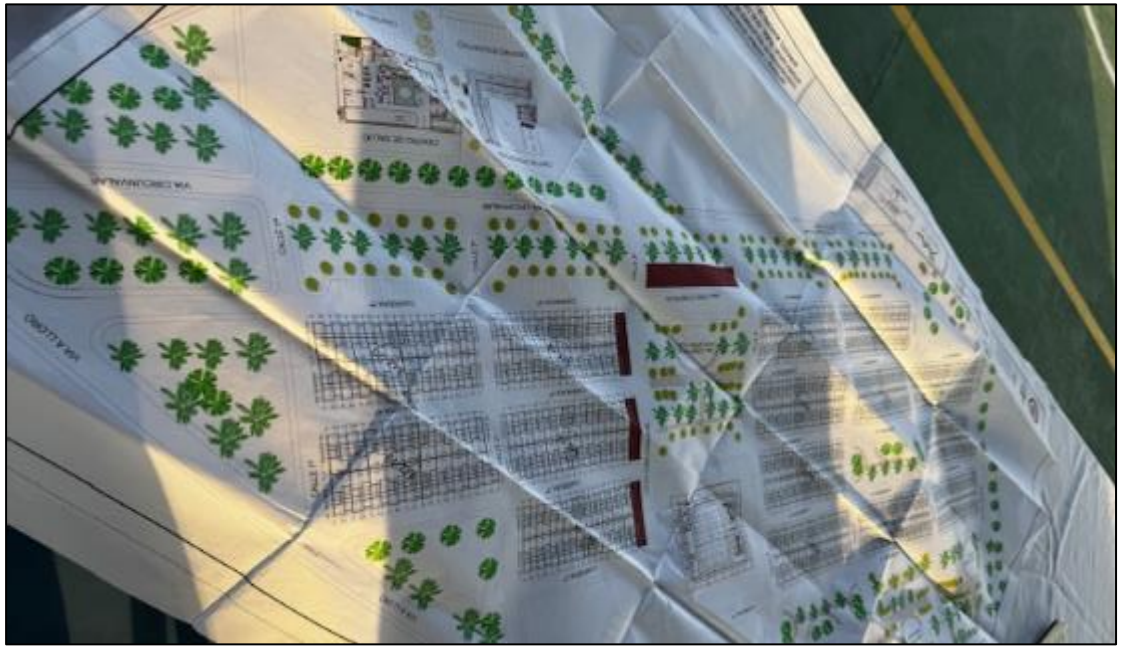

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

PRESUPUESTO ESTIMADO

- Sistema palafitos

Aulas 52,4 m2 – 30 alumnos

INTERVENCIÓN	AREA/ UN	VALOR
Aulas (12)	628,8 m2	$ 2.338.868.988,00
Cocina - comedor	102,8 m2	$ 272.327.050,65
Laboratorio mixto	52,4 m2	$ 194.905.749,00
Batería sanitaria con sistema de tratamiento de aguas residuales	36 m2	$ 140.280.000,00
Tanque plástico cap:2000L (Incluye suministro, accesorios y conexión)	2 un	$ 1.958.030,00
Componente Deportivo (Cancha sintética Futbol 8, Cancha Múltiple)	400 m2	$ 158.562.231
Juegos infantiles (incluye los elementos del parque de juegos y espacio motriz)	1 (Gl)	$ 89.117.285
Urbanismos (Zonas duras y blandas)	514 m2	$ 151.258.968
Total Obra		**$ 3.152.372.552,65**
Interventoría (8%)		$ 252.189.804,21
Diseño (4%)		$ 126.094.902,11
TOTAL		**$ 3.530.657.258,97**

Línea 2 - Mejoramiento en Sedes Afectadas por Emergencia

Estado Grupos de Contratación

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEDE	INVERSION PRIORIZADA POR GRUPO	CONVOCATORIA OBRA	VALOR PO OBRA	ESTADO COV. OBRA	CONVOCATORIA INTYERVENTORIA	VALOR PO INTERVENTORIA	ESTADO COV. INTERV	VALOR PO OBRA + OINTERV	OBSERVACIONES
2	Cauca	Argelia	LA PRIMAVERA (sede principal)	1.900.764.019	PAF-MENPNIE-O-017-2024	1.900.764.019	RADICADO LOS EP / CONVOCATORIA PRIVADA	PAF-MENPNIE-I-015-2024	464.289.510	SUSPENDIDA	2.365.053.529	Abogado CD O+I: Andrea Jaimes EP Obra: Radicado en contratacion EP Interventoría: Radicado en contratación CDR obra e interventoría aprobados el 22 dic 2023 Comité de contratación el 01 febrero Aprobado Comité Técnico 2 feb 2024 Publicado 7 febrero 2024 08/04/2023. Rueda de negocios. Interventoría Suspendida el día 28/02/2024 Se radico los EP para la convocatoria privada el 10/04/2024 24/05/24 Publicada Convocatoria Privada Convocatoria Privada desierta junio 4 . A la fecha se han realizado dos Rueda de Negocios: el 28 de mayo y el 14 de junio. En espera de documentos para terminar E.P. y radicarlos. 23/08/24 Se programa nueva Rueda de Negocios para el 26 de agosto.
		Balboa	BUENAVISTA									
		El Tambo	LA PAZ (sede principal)									
		López(Micay)	PABLO VI (SEDE PRINCIPAL)									
	Nariño	Roberto Payán(San José)	SEDE 11 FATIMA									
4	Chocó	Bojayá(Bellavista)	SEDE LA BOBA	2.365.089.901	PAF-MENPNIE-O-018-2024	1.900.764.019	EN CONVOCATORIA PRIVADA	PAF-MENPNIE-I-016-2024	464.289.510	SUSPENDIDO	2.365.053.529	Publicado 7 febrero 2024 Cierre 22 febrero 2024. Declaratoria Desierta : 11 de marzo 2024 Estado Convocatoria Interventoría: Suspendida 08/04/2024- Rueda de negocios 08/04/2024 15/04/2024 Se realizaron las visitas pendientes el 18, el 19 y el 20 de abril. Se realizó rueda de negocios el 08/04/2024 y 15/04/2024 para la convocatoria privada Se realizó rueda de negocios el 20/05/2024 Se radicó EP para convocatoria privada el 30/05/2024 3/07/2024 Contratación derivada devuelve estudios previos con ajuste de oferentes para rueda de negocios 4/07/2024 Nueva rueda de negocios y ajuste de EP 8/07/2024 EP para convocatoria privada radicados en contratación derivada 23/07/2024 Comité técnico 24/07/2024 Se realizó ajuste de invitados conforme observación del MEN, rueda de negocios y radicación nuevamente de EP para convocatoria privada 2/08/2024 Inicio convocatoria privada 3/08/2024 Acta cierre convocatoria privada se presentó un proponente 23/08/2024 Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes (proponente habilitado). Se cierra el 29/08/2024
		Lloró	CE BORAUDO - SEDE PRINCIPAL									
		Medio Atrato	SEDE VILLA DE BEBARA									
		Quibdó	SEDE MIS ESFUERZOS									
		Río Quito	SEDE LA SOLEDAD									
5	Chocó	Condoto	SEDE ARCO	2.838.107.882	PAF-MENPNIE-O-010-2024	2.335.418.322	EN ESTRUCTURACIÓN DE CONVOCATORIA PRIVADA	PAF-MENPNIE-I-010-2024	502.109.790	SUSPENDIDO	2.837.528.112	CDR obra aprobados el 22 dic 2023 Publicado Cierre 21 Febrero 2024 Declaratoria Desierta : 7 de Marzo. Comité 54. Estado Convocatoria Interventoría: Suspendida 8 marzo 2024. 22/04/2024 En rueda de negocios. 08/04/2024- Rueda de negocios 08/04/2024 15/04/2024 Se radico los EP el 19 de abril para la convocatoria privada. 28/05/24 Convocatoria Privada No. PAF-MENPNIE-O-061-2024 Desierta mayo 28. A la fecha se han realizado dos Rueda de Negocios: el 29 de mayo y el 14 de junio. En espera de documentos para terminar E.P. y radicarlos. 23/08/24 e programa nueva Rueda de Negocios para el 26 de agosto.
		Itsmina	IE PUERTO SALAZAR - SEDE PRINCIPAL									
		Medio Baudó	IE NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA - SEDE PRINCIPAL									
		Río Iró	IE SAN JOSE DE VIRO VIRO - SEDE PRINCIPAL									
		Tadó	SEDE SIMON BOLIVAR									
	Risaralda	Pueblo Rico	SE BICHUBARA									

CCOM-FO-001 V17 / 19-May-2023 / Clasificada

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial



Gracias

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol
@findeter linkedin.com/company/findeter

Hacienda

FOTO: Pueblo Kankuamo

ISO 27001 Certified
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
