
INFORME DE OBRA MENSUAL No. 03

CONTRATO DE OBRA No. 095 DE 2024

DEL 30 DE OCTUBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024

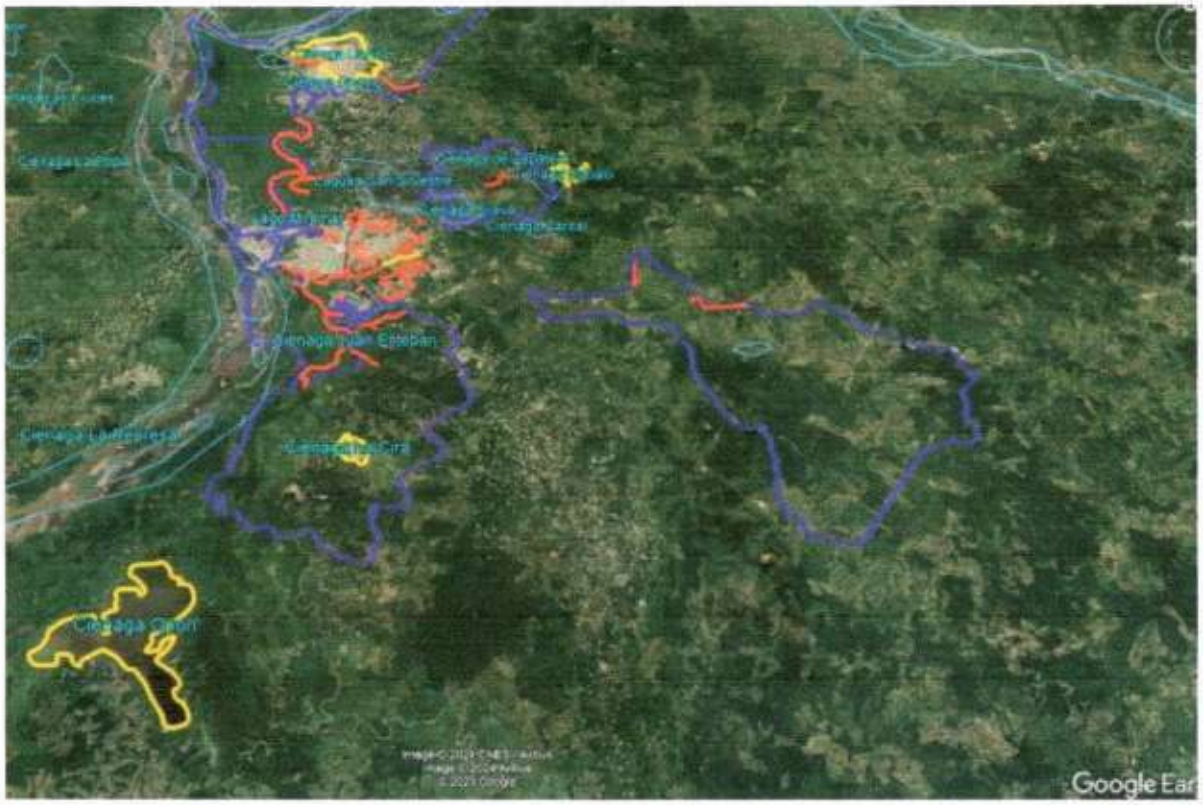

UNIÓN TEMPORAL LIMPIEZA INCO 2024

R/L. JOSÉ JULIÁN CHACÓN AVENDAÑO

DICIEMBRE DE 2024

BARRANCABERMEJA

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 4
2 OBJETIVOS 5
2.1 GENERAL 5
2.2 ESPECÍFICOS 5
3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO. 6
3.1 Localización del Proyecto 7
3.2 Antecedentes del Proyecto 10
3.3 Plazo de Ejecución 10
3.4 LICENCIAS, CERTIFICACIONES Y/O PERMISOS REQUERIDOS. 10
4 EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 11
4.1 Actividades Desarrolladas. 11
4.2 Limpieza de caños de 0 a 5 metros de ancho (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado). 12
4.3 Limpieza de caños entre 5 a 10 metros (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado) 24
4.4 Rocería menor a 1 metro de alto (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado). 28
4.5 Rocería mayor a 1 metro de alto (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado). 40
4.6 Limpieza de caños mayores a 10 metros de ancho. 45
4.7 Limpieza, destronque y rocería mayor a 1 metro de alto. 51
4.8 Limpieza y Retiro del Material Emergente, flotante y medial que se encuentre en el espejo de agua y laderas (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado) 56
4.9. Suministro e instalación de valla con enfoque en la conservación de cuerpos hídricos en el perímetro urbano (De acuerdo a especificaciones) 59
4.10. Suministro e instalación de valla con enfoque en la conservación de cuerpos hídricos en zona rural (De acuerdo a especificaciones)) 59

4.11. Control de avance. 60
5. ASPECTOS LOGÍSTICOS. 61
5.1. Observaciones presentadas durante la ejecución. 61
5.1.1. Estado del tiempo. **62**
5.2. Personal de Obra 64
5.3. Hojas de Vida 72
6. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y LEGALES DEL CONTRATO 72
6.1. Actas Suscritas 72
6.2. Relación de Pagos y/o actas parciales. 73
6.3. Control de Garantías 73
6.4. Control de Pagos Parafiscales 74
6.5. Registro Diario de Actividades (Bitácora). 74
6.6. Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social. 74
7. CONCLUSIONES 75

ANEXOS

- CERTIFICACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL.
- ACTA PARCIAL
- MEMORIAS DE CANTIDAD
- SEGURIDAD SOCIAL
- BITÁCORA
- INFORME SST
- ACTAS DE COMITÉ
- CORRESPONDENCIA
- PERSONAL VINCULADO

1 INTRODUCCIÓN

La Piscícola San Silvestre S.A, mediante el contrato de obra 095 de 2024, adelantó un proceso para realizar actividades de limpieza, según se enmarca en el objeto del contrato en mención, "CONTRATO DE OBRA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA MANUAL Y ROCERÍA EN LOS CAÑOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD HÍDRICA EN SUS CUERPOS LENTICOS Y LOTICOS", contrato adjudicado a la UNIÓN TEMPORAL LIMPIEZA INCO 2024, identificada con NIT 901 864 847 – 7 y representada legalmente por JOSÉ JULIÁN CHACÓN AVENDAÑO, el cual contempla una duración de cuatro (4) meses a partir de la firma del acta de inicio y un valor de SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS ($ 6.730.321.175).

En el marco del proyecto de fortalecimiento ambiental del distrito, se ha diseñado un plan de rehabilitación ecológica para varios caños urbanos. Este plan incluye una serie de actividades clave orientadas a mejorar la funcionalidad hidrológica de los cuerpos de agua seleccionados, favoreciendo así su conservación y la recuperación de su capacidad ecológica. Las acciones contemplan la limpieza manual de los caños, retirando tanto residuos vegetales como inorgánicos que afectan su cauce. Adicionalmente, se realizarán labores de rocería en la vegetación circundante, con el fin de garantizar acceso seguro al personal encargado de la intervención y mejorar la seguridad de los habitantes cercanos a estos ecosistemas. Es importante destacar que las zonas de intervención incluyen caños ubicados en las siete comunas del distrito y en algunas veredas, asegurando una cobertura integral. La limpieza y restauración de estos espejos de agua no solo es fundamental para restaurar el flujo hídrico, sino que también juega un papel esencial en la preservación de la biodiversidad, el control de inundaciones y la mejora de la calidad del agua, contribuyendo así a la sostenibilidad ambiental del territorio.

Esta intervención es vital no solo para mitigar los efectos negativos de las alteraciones humanas en los ecosistemas acuáticos, sino también para promover un equilibrio ecológico que permita la recuperación y el mantenimiento de estos cuerpos hídricos a largo plazo.

A través de este informe se presenta el seguimiento y control de las actividades, derivadas del objeto contractual y las eventualidades que se presentan durante el desarrollo del proyecto en mención.

2 OBJETIVOS

2.1 GENERAL

- Exponer el estado técnico, administrativo y financiero del contrato ejecutado por el contratista UT LIMPIEZA INCO 2024 durante el periodo comprendido entre el 30 de octubre y el 10 de Diciembre de 2024.

2.2 ESPECÍFICOS

- Informar a la entidad contratante el avance físico y Financiero de las actividades contractuales ejecutadas.

- Brindar conocimiento claro y oportuno de las diferentes actividades ejecutadas que el contratista, desarrollo durante el presente periodo de ejecución del proyecto.

- Presentar informe de las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución comprendido entre el contratista UT LIMPIEZA INCO 2024 durante el periodo comprendido entre el 30 de octubre al 10 de Diciembre de 2024.

3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

CONTRATO No.	095 DE 2024
OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA MANUAL Y ROCERÍA EN LOS CAÑOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD HÍDRICA EN SUS CUERPOS LENTICOS Y LOTICOS
CONTRATISTA DE OBRA:	UNION TEMPORAL LIMPIEZA INCO 2024 NIT. 901.864.847-7 R/L JOSÉ JULIÁN CHACÓN AVENDAÑO
CONTRATANTE	PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A. NIT. 829.000.291-4
SUPERVISOR	JOHN EDUARDO RODRÍGUEZ Supervisor designado
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES
VALOR CONTRACTUAL:	SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 6.730.321.175)
FECHA ACTA DE INICIO:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 DE DICIEMBRE DE 2024

3.1 Localización del Proyecto



El proyecto se encuentra ubicado en el Distrito especial, portuario, biodiverso, industrial y turístico de Barrancabermeja, ubicado a orillas del río Magdalena, en la parte occidental del departamento de Santander. Es la ciudad industrial más importante del departamento de Santander, sede de la refinería de petróleo más grande del país y es la capital de la Provincia de Yariguíes Latitud Norte 7°03'55" y Longitud Oeste 73°51.283'.

Límites del municipio: Limita al norte con el municipio de Puerto Wilches, al sur con los municipios de Puerto Parra, Simacota y San Vicente de Chucurí, al oriente con el municipio de San Vicente de Chucurí y Girón, y al occidente con el Río Magdalena y el municipio de Yondó, departamento de Antioquia.

Su Cabecera municipal se encuentra dividida en 7 comunas (compuestas en promedio de 30 a 50 barrios cada una) y 6 corregimientos.

Dentro del alcance del proyecto se espera intervenir caños urbanos en las diferentes comunas del distrito impactando los barrios y corregimientos que se exponen a continuación:

Barrio	Comuna	Barrio	Comuna
Arenal	Comuna1	Colinas Del Norte	Comuna 3
Buenos Aires	Comuna1	Cortijillo	Comuna 3
Buenos Aires II	Comuna1	Cristo Rey	Comuna 3
Cardales	Comuna1	Eduardo Rolón (Coviba)	Comuna 3
David Núñez Cala	Comuna1	Internacional	Comuna 3
El Cruce	Comuna1	22 De Marzo	Comuna 3
El Dorado	Comuna1	Jerusalén	Comuna 3
El Recreo	Comuna1	La Paz	Comuna 3
Invasión San Luis	Comuna1	La Paz II	Comuna 3
Isla del Zapato	Comuna1	La Tora	Comuna 3
La campana	Comuna1	Las Camelias.	Comuna 3
La Victoria	Comuna1	Autoconstrucción VII Etapa Cincuentenario	Comuna 4
La Victoria II	Comuna1	Bellavista	Comuna 4
Las Margaritas	Comuna1	Bosques De La Cira	Comuna 4
Las Playas	Comuna1	Bosques De La Cira II	Comuna 4
Palmira	Comuna1	Buenavista	Comuna 4
San Francisco	Comuna1	Buenavista II	Comuna 4
Sector Comercial y Muelle	Comuna1	Cincuentenario	Comuna 4
Tres Unidos	Comuna1	Ciudadela Del Cincuentenario	Comuna 4
Olaya Herrera	Comuna 2	El Bosque	Comuna 4
Parnaso	Comuna 2	El Castillo	Comuna 4
Barrio Pueblo Nuevo	Comuna 2	El Palmar	Comuna 4
Barrio Uribe Uribe	Comuna 2	El Refugio	Comuna 4
Barrio Villa Luz.	Comuna 2	La Península	Comuna 4
Algarrobos	Comuna 3	Los Lagos	Comuna 4
Alto De Los Ángeles	Comuna 3	Marsella	Comuna 4
Asentamiento Humano Caminos De San Silvestre	Comuna 3	Santa Bárbara	Comuna 4
Belén	Comuna 3	Villa De Leyva	Comuna 4
Brisas Del 20 De enero	Comuna 3	Villa Rosa	Comuna 4
Campo Hermoso	Comuna 3	Yarima	Comuna 4
Ciudadela Pipatón	Comuna 3	Alcázar	Comuna 5

Barrio	Comuna	Barrio	Comuna
Asentamiento Humano Colinas Del Seminario	Comuna 5	J.V.C. Veinte De Agosto	Comuna 6
Asentamiento Humano La Nueva Esperanza	Comuna 5	Kennedy	Comuna 6
Asentamiento Humano Las Torres	Comuna 5	Las Granjas	Comuna 6
Asentamiento Humano Nuevo Milenio	Comuna 5	Puerta Del Sol	Comuna 6
J.V.C. Ramaral	Comuna 5	San Pedro	Comuna 6
La Candelaria	Comuna 5	Brisas Del Oriente	Comuna 6
La Esperanza	Comuna 5	Corintos	Comuna 6
La Independencia	Comuna 5	Danubio	Comuna 6
Las Mercedes	Comuna 5	16 De marzo	Comuna 7
La Tora	Comuna 5	9 De abril	Comuna 7
Las Américas	Comuna 5	Asentamiento Humano Las Palmas	Comuna 7
Las Camelias	Comuna 5	Asentamiento Humano Villa Aura	Comuna 7
Las Malvinas Bajas	Comuna 5	Campestre	Comuna 7
Los Rosales	Comuna 5	Colinas Del Campestre	Comuna 7
Malvinas Alta	Comuna 5	Divino Niño	Comuna 7
Miraflores	Comuna 5	El Campin	Comuna 7
Primero De Mayo	Comuna 5	Las Flores	Comuna 7
San Pedro Claver	Comuna 5	María Eugenia	Comuna 7
Santa Ana	Comuna 5	Minas Del Paraíso	Comuna 7
Santander	Comuna 5	Nuevo Horizonte	Comuna 7
Simón Bolívar	Comuna 5	Prados Del Campestre	Comuna 7
Versalles	Comuna 5	Urbanización Los Corales	Comuna 7
Antonio Nariño	Comuna 6	Urbanización Minas Del Paraíso VI Etapa	Comuna 7
Benjamín Herrera	Comuna 6	Vereda La Independencia	Comuna 7
Boston	Comuna 6	Villarelis Dos	Comuna 7
Brisas De San Martin	Comuna 6	Villarelis Uno	Comuna 7
Brisas De Versalles J.V.C	Comuna 6	Villarelis Tres	Comuna 7

CORREGIMIENTOS
El llanito
La Fortuna
Ciénega del Opón
San Rafael de Chucurí

3.2 Antecedentes del Proyecto

El proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones hidráulicas de los cuerpos hídricos mediante la eliminación de material emergente, flotante, residuos sólidos y vegetación que puedan obstruir su flujo. Esto permitirá una mayor conectividad y recuperación del cuerpo de agua, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

Incluye las actividades para recuperar la capacidad hidráulica de cuerpos de agua con miras a recuperar sus servicios ecosistémicos, entre ellos, prevención de inundaciones, oferta de agua, la capacidad de almacenamiento de agua, conectividad hidráulica, hábitat para especies acuáticas.

3.3 Plazo de Ejecución

El plazo inicial de ejecución del proyecto es de cuatro (4) meses contados a partir del perfeccionamiento del contrato (suscripción del acta de inicio). El día treinta (30) de agosto de 2024, se suscribió Acta de iniciación del proyecto, quedando como fecha de finalización el día veintinueve (29) de diciembre de 2024.

3.4 LICENCIAS, CERTIFICACIONES Y/O PERMISOS REQUERIDOS.

Para el presente proyecto, se tramitó los siguientes certificados:

Se expone en el presente informe la certificación del material retirado tanto orgánico como inorgánico expedido por los sitios autorizados para su disposición final, estos lugares cuentan con los permisos requeridos para su operación. Se anexa registro fotográfico sobre actividades de recolección.

4 EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

4.1 Actividades Desarrolladas.

Durante la ejecución de las actividades derivadas del objeto contractual del contrato en mención, se consideró y se siguieron las recomendaciones y requerimiento presentados por el ente contratante, las actividades se desarrollaron en diferentes comunas del distrito de Barrancabermeja.

Es importante establecer los sitios prioritarios para llevar a cabo las actividades de limpieza, se debe tener en cuenta el tipo de material vegetal que se va a remover y la cantidad que será removida, analizar en qué forma puede afectar la regulación hídrica y proteger la micro hábitat que ya se han desarrollado dentro del tapón y si esta afecta la diversidad biológica del cuerpo de agua objeto de la limpieza.

Debemos asegurar en el presente proyecto que la limpieza no afectara de manera negativa el humedal, sino que, por el contrario, se asegure el crecimiento y la supervivencia de las especies nativas del humedal.

la metodología de limpieza y remoción de la vegetación que constituye el tapón, se plantea que tanto las orillas coma los causes o en general cualquier área de un ecosistema hídrico puede ser víctima de un proceso de repoblamiento vegetal, causado generalmente por factores antrópicos que ocasionan la pérdida del recurso hídrico, la conectividad generando obstrucción e inundaciones que anegan las orillas y taponan los caños principales.

Las actividades contemplan remover todo material flotante dentro del espejo de la ciénaga y caño rurales, actividades desarrolladas manualmente con número de personas en campo se dispone a orilla el material acumulado realizando disposición temporal del material acopiado a orillas de la fuente de agua intervenida, con el fin de deshidratar la vegetación del sedimento acumulado y luego ser transportado y dispuestos en punto de acopio autorizado por la secretaria de medio ambiente.

Igualmente, dentro de las actividades contratadas se contempla un ítem de rocería rural, que consiste en realizar limpieza de franjas laterales con el fin de evitar acumulación de vectores y despejar las áreas cercanas sobre todo en los trayectos de los caños priorizados para mejorar la visibilidad durante el tránsito de los motores y evitar su

colmatación.

Dentro de las actividades en campo sobre la zona rural se cuenta con recurso humano, mano de obra obrera, con herramientas menores tales como (sogas, ganchos, rastrillos, pala, machetas, limas y traseros) en cuanto a maquinaria se cuenta con motosierra y guadañas, el transporte para el desarrollo de cada actividad como contratista se contrató canoa palera y motor canoa.

A continuación, se presenta un resumen de las actividades y cantidades ejecutadas durante el periodo del presente informe.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT
1.1	**Caños Urbanos**	
1.1.1	Limpieza de caños de 0 a 5 metros de ancho (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado).	10697 m
1.1.2	Limpieza de caños entre 5 a 10 metros (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado)	6680 m
1.1.3	Rocería menor a 1 metro de alto (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado).	43564 m²
1.1.4	Rocería mayor a 1 metro de alto (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado)	29896 m²
1.2	**Caños Rurales**	
1.2.1	Limpieza de caños mayores a 10 metros de ancho	30726 m
1.2.2	Limpieza, destronque y rocería mayor a 1 metro de alto.	130535 m²
2.1	**Limpieza Manual**	
2.1.1	Limpieza y Retiro del Material Emergente, flotante y medial que se encuentre en el espejo de agua y laderas (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado)	149340m²

4.2 Limpieza de caños de 0 a 5 metros de ancho (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado).

En el periodo del presente informe se realizó limpieza manual de de caños de 0 a 5 metros de ancho (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado) , sea material orgánico e inorgánico, entre los materiales inorgánicos se encuentran: botellas plásticas, vasos desechables, bolsas plásticas, papel y cartón contaminado, colchones, muebles,

inodoros y demás materiales considerados no aprovechables, para su posterior retiro en los sitios autorizados según el tipo de material.

La limpieza se realiza con previa inspección al sitio de trabajo, evaluando los riesgos para adecuar la zona de ingreso y de trabajo para garantizar la seguridad del personal en la realización de las actividades, en el cauce del caño se retiran los residuos sólidos presentes en el mismo, ya sean orgánicos o inorgánicos, realizando su separación, y se recolecta en sacas para su retiro. Posteriormente con ganchos de acero se remueven el material vegetal sedimentado para mejorar el cauce del caño

En la realización de la limpieza manual se utilizan herramientas como machetes, rulas, ganchos de acero, carretillas, picos, palas.

A continuación, se presenta registro fotográfico, en el cual se evidencian las actividades ejecutadas en los diferentes caños del distrito de Barrancabermeja, durante el periodo del presente informe de interventoría:

LOCALIZACION	CANTIDAD
Comuna 3	
Caño sector 22 de marzo- Brisas de Altamira	596
Caño 22 marzo	604
Urbanización San Silvestre	513
Caño 20 enero - Rosario	456
Caño Sector Antonio Nariño	573
Caño Sector La mina	814
Comuna 5	
CAÑO SECTOR SIMÓN BOLIVAR (CANAL)	320
CAÑO 1 SECTOR MIRAFLORES (CANAL)	201
Caño 2 sector Miraflores	210
Caño sector Santana	412
Comuna 6	
Caño Sector Oro negro I	169
Caño Sector Progreso Oro Negro	530
Caño sencillo 3 Bendición de Dios	216
Caño Sencillo 2 Bendición De Dios	212

Caño Sencillo 1 Bendición de Dios	178
Caño Sector Playita-manzanares	653
Caño Bendición de Dios etapa I	583
Caño Puerta del sol 2	197
Caño Sector el Boston	466
Caño Sector Boston 2	219
Comuna 7	
Caño Asn 03 de Octubre	163
Caño Prados del Campestre	208
Caño Cielos Abiertos	401
Caño Brisas Villarelys	753
Caño Sectores Brisas del Poblado- Villa Aura	340
REPOSICIÓN	
Caño San Francisco Cardales	502
Caño Puerto 65- Vía fertilizantes	90
Caño Danubio Sector los abuelos	119
TOTAL	**10697**

Registro Fotográfico

Comuna 3

Caño sector 22 de Marzo-Brisas de Altamira





Caño 22 de marzo





Urbanización San Silvestre





Caño 20 de enero - rosario





Caño sector Antonio Nariño





Caño sector la mina





Comuna 5

Caño Sector Simón Bolívar





Caño 1 sector Miraflores





Caño 2 sector Miraflores





Caño sector Santana





Comuna 6

Caño sector Oro Negro 1



Caño sector Progreso-Oro Negro



Caño sencillo 3 bendición de Dios



Caño Sencillo 2 Sector Bendición de Dios





Caño sencillo 1 Sector Bendición de Dios





Caño sector Playita-Manzanares





Caño Bendición de Dios Etapa I





Caños Puerta del sol 2





Caños Sector El Boston





Caños Sector El Boston 2





Comuna 7

Caño Asn. 03 DE OCTUBRE





Prados del Campestre





Caño Cielos Abiertos





Caño brisas villarelys





Caño sectores Brisas del Poblado- Villa Aura





Reposición

Caño San Francisco Cardales





Caño Puerto 65- Vía Fertilizantes





Caño Danubio Sector los Abuelos





4.3 Limpieza de caños entre 5 a 10 metros (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado)

Durante el mes del informe se realizó limpieza manual de de caños entre 5 a 10 metros (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado), en este tipo de caños debido a su tamaño y topografía, la limpieza se ejecutó empleando canoas, retirando material orgánico e inorgánico, para su posterior retiro en los sitios autorizados según el tipo de material.

La limpieza se realiza con previa inspección al sitio de trabajo, evaluando los riesgos para adecuar la zona de ingreso y de trabajo, así mismo se realizan inspecciones diarias a las canoas y herramientas empleadas en dicha actividad, garantizando así la seguridad del personal, en el cauce del caño se retiran los residuos sólidos presentes en el mismo, ya sean orgánicos o inorgánicos, realizando su separación, posteriormente, se recolecta en sacas para su retiro.

En la realización de la limpieza manual se utilizan herramientas como machetes, rulas, ganchos de acero, carretillas, picos, palas.

A continuación, se presenta registro fotográfico, en el cual se evidencian las actividades ejecutadas en los diferentes caños del distrito de Barrancabermeja, durante el periodo del presente informe:

LOCALIZACION	CANTIDAD
Comuna 1	
Pozo 7- Santa bárbara - ISLA DEL ZAPATO	1427
Comuna 2	
Caño Camelias Sector Floresta Baja-UIS	311
Caño camelias Sector Villaluz- POLICÍA	961
Comuna 3	
Caño Internacional Sector PTAR- San Silvestre	1160

Comuna 5	
Caño Camelias Sector las Camelias	212
Comuna 7	
Pozo 7- Las torres-SANTA BARBARA	1.717
Caño Sector los Corales	492
REPOSICIÓN	
Boxculver Entrada Isla del Zapato	400
TOTAL	**6680**


Registro fotográfico

Comuna 1

pozo 7 -santa bárbara- isla del zapato		
		

Comuna 2

Caño Camelias Sector Floresta baja- UIS

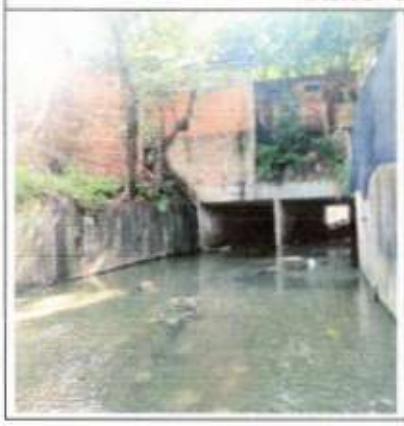



Caño Camelias Sector Villaluz- POLICIA





Comuna 3

Caño Internacional Sector PTAR San Silvestre



Comuna 7

Caño Pozo 7- Las Torres- Santa Barbara



Caño Sector los Corales		
		

REPOSICIÓN

Caño isla del zapato Box Colbert (reposición)		
		

4.4 Rocería menor a 1 metro de alto (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado).

Complementando las actividades de limpieza, se realizó rocería menor a 1 metro de alto (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado) Al costado de los caños conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas del proyecto
A continuación, se presenta registro fotográfico, en el cual se evidencian las actividades ejecutadas durante el periodo del presente informe:

LOCALIZACION	CANTIDAD
Comuna 3	
Caño sector 22 de Marzo- Brisas de Altamira	2384
Caño 22 Marzo	2416
Urbanización San Silvestre	2052
Caño 20 Enero - Rosario	1752
Caño Sector Antonio Nariño	2292
Caño Sector La mina	3256
Caño Sector Villa Luisa Etapa I	776
Comuna 5	
CAÑO SECTOR SIMÓN BOLIVAR (CANAL)	1280
CAÑO 1 SECTOR MIRAFLORES (CANAL)	804
Caño 2 sector Miraflores	840
Caño sector Santana	1644
Comuna 6	
Caño Sector Oro negro I	676
Caño Sector Progreso Oro Negro	2120
Caño sencillo 3 Bendición de Dios	864
Caño Sencillo 2 Bendición De Dios	848
Caño Sencillo 1 Bendición de Dios	712
Caño Sector Playita-manzanares	2612
Caño Bendición de Dios etapa I	2332
Caño puerta del sol 2	788
Caño Sector el Boston	1864
Caño Sector el Bostón 2	876
Comuna 7	
Caño Asn 03 de Octubre	576
Caño Prados del Campestre	832
Caño Cielos Abiertos	1604
Caño Brisas Villarelys	3012
Caño Sectores Brisas del Poblado- Villa Aura	1360
REPOSICIÓN	
Caño San Francisco Cardales	2008
Caño Puerto 65- Vía fertilizantes	360
Caño Danubio Sector los abuelos	476

Caño Cll 63 La Esperanza	148
TOTAL	**43564**

Registro fotográfico

Comuna 3

Caño 22 de Marzo- Brisas de Altamira





Caño 22 de marzo





Caño sector la mina





Caño 20 de enero – rosario





Urbanización San Silvestre





Caño 20 de Enero- Rosario





Caño Antonio Nariño





Caño Antonio Nariño





Caño Sector la Mina		
		

Caño Sector Villa Luisa Etapa I		
		

Comuna 5

Caño Sector Simón Bolívar		
		

Caño 1 Sector Miraflores		
		

Caño 2 Sector Miraflores		
		

Caño sector Santana		
		

Comuna 6

Caño sector Oro Negro 1





Caño sector Progreso-Oro Negro





Caño sencillo 3 bendición de Dios





Caño sencillo 2 sector Bendición de Dios





Caño sencillo 1 sector Bendición de Dios





Caño sector Playita-Manzanares





Caño Bendición de Dios Etapa I





Caños puerta del sol 2





Caños Sector El Boston





Caños Sector El Boston 2		
		

Comuna 7

Caño Asn. 03 DE OCTUBRE		
		

Prados de campestre		
		

Caño Cielos Abiertos





Caño Brisas Villarelys





Caño sectores Brisas del Poblado- Villa Aura





Reposición

Caño San Francisco Cardales		
		

Caño Puerto 65- Vía Fertilizantes		
		

4.5 Rocería mayor a 1 metro de alto (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado).

Complementando las actividades de limpieza, se realizó rocería mayor a 1 metro de alto (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado) Al costado de los caños conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas del proyecto
A continuación, se presenta registro fotográfico, en el cual se evidencian las actividades ejecutadas durante el periodo del presente informe:

LOCALIZACION	CANTIDAD
Comuna 1	
Pozo 7- Santa bárbara - ISLA DEL ZAPATO	5708
Comuna 2	
Caño Camelias Sector Floresta Baja-UIS	1244
Caño camelias Sector Villaluz- POLICIA	3844
Comuna 3	
Caño Internacional Sector PTAR- San Silvestre	4640
Comuna 5	
Caño Camelias Sector las Camelias	544
Comuna 7	
Pozo 7- Las torres-SANTA BARBARA	6.868
Caño Sector los Corales	1968
Pozo 7- Diamante- Las torres	3176
REPOSICION	
Boxculver Entrada Isla del Zapato	1600
Cristo Petrolero	304
TOTAL	**29896**

Comuna 1

Pozo 7 -Santa bárbara- Isla del zapato





Comuna 2

Caño Camelias Sector Floresta Baja- UIS



Caño Camelias Sector Villaluz- Policía



Comuna 3

Caño Internacional Sector PTAR San Silvestre



Comuna 5

Caño Camelias sector Las Camelias





Comuna 7

Caño Pozo 7- La Torres Santa Barbara





Caño sector Los Corales





Caño Pozo 7- Diamante-Las Torres		
		

Reposición

Boxculver Entrada Isla del Zapato		
		

Cristo Petrolero		
		

4.6 Limpieza de caños mayores a 10 metros de ancho.

Durante el mes del informe se realizó limpieza manual de de caños mayores a 10 metros (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado), en este tipo de caños debido a su tamaño y topografía, la limpieza se ejecutó empleando canoas, retirando material orgánico e inorgánico, para su posterior retiro en los sitios autorizados según el tipo de material.

La limpieza se realiza con previa inspección al sitio de trabajo, evaluando los riesgos para adecuar la zona de ingreso y de trabajo, así mismo se realizan inspecciones diarias a las canoas y herramientas empleadas en dicha actividad, garantizando así la seguridad del personal, en el cauce del caño se retiran los residuos sólidos presentes en el mismo, ya sean orgánicos o inorgánicos, realizando su separación, posteriormente, se recolecta en sacas para su retiro.

LOCALIZACION	CANTIDAD
Caño el Cuarenta(peroles) bajos	2541
Caño Palotal	1749
Caño Rosario	3975
Caño el deseo- Sector Ciénaga San Silvestre	5325
Caño Buenavista (Sector Ciénaga el Castillo)	857
Vía Aeropuerto Carrilera	632
Caño Conexión la Carrilera	276
Caño la Carrilera- Sector Buenavista	890
Caño Guadualito	2493
Quebrada la Roja	1837
Caño Viejo- Juan Esteban	708
Caño Cuatro Bocas Juan Esteban	3279
Caño Natural el Llanito	2707
REPOSICIÓN	
Caño Vía Principal la Fortuna	28
Caño Chucuri	2735
TOTAL	**30716**

Registro fotográfico

Caño el Cuarenta Peroles Bajos





Caño Palotal





Caño Rosario





Caño el Deseo- Sector Ciénaga San Silvestre





Caño Buenavista (Sector ciénaga el castillo)





Vía Aeropuerto- Carrilera





Caño conexión la carrilera





Caño la carrilera Sector Buenavista





Caño Guadualito





Quebrada La Roja		
		

Caño Viejo- Juan Esteban		
		

Caño Cuatro Bocas Juan Esteban		
		

Caño Natural el Llanito		
		

Caño Principal la Fortuna		
		

Caño Chucurí		
		

4.7 Limpieza, destronque y rocería mayor a 1 metro de alto.

Complementando las actividades de limpieza, se realizó Limpieza, destronque y rocería a 1 metro de alto en la zona rural, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas del proyecto

A continuación, se presenta registro fotográfico, en el cual se evidencian las actividades ejecutadas durante el periodo del presente informe:

LOCALIZACION	CANTIDAD
Caño el Cuarenta(peroles) bajos	10164
Caño Palotal	6.996
Caño Rosario	15900
Caño el deseo- Sector Ciénaga San Silvestre	21300
Caño Buenavista (Sector Ciénaga el Castillo)	2484
Vía Aeropuerto Carrilera	2528
Caño Conexión la Carrilera	1104
Caño la Carrilera- Sector Buenavista	3560
Caño Guadualito	7479
Quebrada la Roja	7348
Caño Viejo- Juan Esteban	2832
Caño Cuatro Bocas Juan Esteban	13116
Caño Natural el Llanito	10828
REPOSICIÓN	
Caño Vía Principal la Fortuna	13676
Caño Chucuri	11220
	130535


REGISTRO FOTOGRÁFICO

Caño el Cuarenta(peroles) bajos





Caño Palotal





Caño Rosario





Caño El Deseo- Sector Ciénaga San Silvestre





Vía aeropuerto- Carrilera





Caño Buenavista (Sector Ciénaga el castillo)





Caño conexión la carrilera



Caño la carrilera sector Buenavista



Caño Guadualito



Quebrada La Roja		
		

Caño Viejo- Juan Esteban		
		

Caño Cuatro Bocas- Juan Esteban		
		

REPOSICIÓN

Caño Principal La Fortuna		
		

Caño Chucuri		
		

4.8 Limpieza y Retiro del Material Emergente, flotante y medial que se encuentre en el espejo de agua y laderas (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado)

Continuando las actividades de limpieza, se realizó Limpieza y retiro del material emergente, flotante y medial que se encuentre en el espejo de agua y laderas (Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado) en la zona rural, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas del proyecto

A continuación, se presenta registro fotográfico, en el cual se evidencian las actividades ejecutadas durante el periodo del presente informe:

LOCALIZACION	CANTIDAD
Ciénaga San Rafael de chucuri	35200
Ciénaga Opón	36990
Ciénaga Zapatero	30000
Ciénaga la Cira	37267.3
Ciénaga el llanito	10000
TOTAL	**149457.3**

REGISTRO FOTOGRAFICO

Ciénaga San Rafael de chucuri





Ciénaga Opón





Ciénaga Zapatero





Ciénaga la Cira





Ciénaga el Ilanito





4.9. Suministro e instalación de valla con enfoque en la conservación de cuerpos hídricos en el perímetro urbano (De acuerdo a especificaciones)

Se realiza el suministro e instalación de valla con enfoque en la conservación de cuerpos hídricos en el perímetro urbano (De acuerdo a especificaciones), en el área de influencia del proyecto en el distrito de Barrancabermeja, dichas vallas se instalaron en el perímetro urbano, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. A continuación, se presenta el registro fotográfico de dicha actividad:

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD
Comuna 7	1
TOTAL	**1**

Comuna 7	
	

4.10. Suministro e instalación de valla con enfoque en la conservación de cuerpos hídricos en zona rural (De acuerdo a especificaciones)).

Se realiza el suministro e instalación de valla con enfoque en la conservación de cuerpos hídricos en la zona rural del distrito de Barrancabermeja, (De acuerdo a especificaciones), en el área de influencia del proyecto, dichas vallas se instalaron los diferentes corregimientos en los cuales se realizaron actividades de limpieza y remoción,

conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. A continuación, se presenta el registro fotográfico de dicha actividad:

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD
Llanito	2
La Cira	2
TOTAL	**4**

Llanito	
	

La Cira	
	

4.11. Control de avance.

A fecha 10 de diciembre de 2024 en el presente informe mensual, se reporta el siguiente

avance en tiempo, físico y financiero.

- Control de avance Tiempo

Plazo de ejecución	Cuatro (4) meses.
Tiempo transcurrido	Dos (3) mes
Porcentaje de tiempo transcurrido	3 meses y 11 Días

- Control de avance Físico

Porcentaje programado en el periodo	26,72%
Porcentaje físico ejecutado en el periodo	67,52%
Porcentaje programado acumulado	92,91%
Porcentaje físico acumulado	90,00%
Porcentaje físico por ejecutar	10,00%

- Control de avance Financiero

Inversión Contratada	$ 6.730.321.175,00
Inversión ejecutada en el periodo	$ 4.544.079.451
Inversión Ejecutada	$ 6.057.294.799
Inversión por ejecutar	$ 673.026.376

5. ASPECTOS LOGÍSTICOS.

5.1. Observaciones presentadas durante la ejecución.

Para el segundo mes de ejecución del contrato de obra 095-2024 en el distrito de Barrancabermeja, se continuo la ejecución de las actividades y se verifico la eficiencia del aumento de personal para mejorar el rendimiento en las diferentes actividades a ejecutar en el proyecto.

A la fecha de corte del presente informe, 10 de Diciembre de 2024 la unión temporal limpieza Inco 2024, expone una cantidad de 267 personas activas para el desarrollo de las actividades, reflejando un buen rendimiento en los frentes de trabajo del distrito de Barrancabermeja y en las veredas donde se están desarrollando los trabajos, dichos sitios se expusieron en la sección, localización del proyecto.
En el periodo del presente informe se inició la intervención de los caños rurales y la limpieza de los cuerpos de agua cenagosos, complementando las actividades contratadas dentro del contrato de obra pública 095 de 2024.

5.1.1. Estado del tiempo.

Durante los días laborales en campo, se presentó una leve afectación ya que las lluvias se presentaron en horas de la mañana y en algunos casos impidieron el inicio normal de las actividades, según pronósticos del tiempo para el último trimestre del año se espera temporada de lluvia.

Se presenta en la siguiente tabla una descripción de los días con presencia de lluvias o clima nublado al inicio de las actividades.

FECHA	ESTADO DEL CLIMA
Miércoles, 30 de octubre de 2024	Soleado
Jueves 31 de octubre de 2024	Soleado
Viernes 1 de noviembre de 2024	soleado
Sábado 2 de noviembre de 2024	soleado
Domingo 3 de noviembre de 2024	soleado
Lunes,4 de noviembre de 2024	Festivo
Martes 5 de noviembre de 2024	soleado
Miércoles 6 de noviembre de 2024	soleado
Jueves 7 de noviembre de 2024	soleado
Viernes 8 de noviembre de 2024	Soleado
Sábado 9 de noviembre de 2024	soleado
Domingo 10 de noviembre de 2024	soleado
Lunes 11 de noviembre de 2024	Festivo

Martes 12 de noviembre de 2024	soleado
Miércoles 13 de noviembre de 2024	soleado
Jueves 14 de noviembre de 2024	soleado
Viernes 15 de noviembre de 2024	soleado
Sábado 16 de noviembre de 2024	Día lluvioso
Domingo 17 de noviembre de 2024	soleado
Lunes 18 de noviembre de 2024	Soleado
Martes 19 de noviembre de 2024	soleado
Miércoles 20 de noviembre de 2024	soleado
Jueves 21 de noviembre de 2024	soleado
Viernes 22 de noviembre de 2024	soleado
Sábado 23 de noviembre de 2024	soleado
Lunes 25 de noviembre de 2024	Soleado
Martes 26 de noviembre de 2024	soleado
Miércoles 27 de noviembre de 2024	soleado
Jueves 28 de noviembre de 2024	soleado
Viernes 29 de noviembre de 2024	Soleado
Sábado 30 de noviembre de 2024	Soleado
Lunes 2 de diciembre de 2024	Soleado
Martes 3 de diciembre de 2024	Soleado
Miércoles 4 de diciembre de 2024	Soleado
Jueves 5 de diciembre de 2024	Soleado
Viernes 6 de diciembre de 2024	Soleado
Sábado 7 de diciembre de 2024	Soleado
Lunes 9 de diciembre de 2024	Soleado
Martes 10 de diciembre de 2024	Soleado

5.2. Personal de Obra

A continuación, se relaciona el personal que fue contratado para la ejecución de actividades del contrato 095 de 2024, a corte 10 de Diciembre de 2024.

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ESTADO
1	JOSE JULIAN CHACON AVENDAÑO	1.098.678.531	INGENIERO	ACTIVO
2	JAVIER GALEANO LARA	1.096.187.648	GUADAÑADOR	ACTIVO
3	GUILLERMO PARRA TOLOZA	91.437.928	CAPATAZ	ACTIVO
4	YAIRA KATERINE JIMENEZ SUAREZ	1.096.190.326	OBRERO	ACTIVO
5	WILSON ENRIQUE GALVIS GAMARRA	1.096.230.164	OBRERO	ACTIVO
6	NANCY ESTER ARNACHE MESTRA	28.019.950	OBRERO	ACTIVO
7	PEDRO CHAMPEN RUIZ	91.439.383	OBRERO	ACTIVO
8	CAROLINA ORTEGA PABON	1.096.210.111	OBRERO	ACTIVO
9	ARGENIS GALLEGO MORENO	1.096.221.434	OBRERO	ACTIVO
10	MILEYDIS BECERRA BOHORQUEZ	1.096.255.585	OBRERO	ACTIVO
11	AROLDO DE JESUS MORALES TERAN	1.196.968.540	OBRERO	ACTIVO
12	LINDA PAOLA TORRES ZUÑIGA	1.096.199.626	OBRERO	ACTIVO
13	LUZ MARINA GONZALEZ MONSALVE	63.466.768	OBRERO	ACTIVO
14	JHEFFERSON HUNDELHAUSEN ALARCON	1.096.204.514	OBRERO	ACTIVO
15	HENRY VELASQUEZ PULGARIN	91.441.607	OBRERO	ACTIVO
16	ROSALBA CAMARGO MEJIA	37.578.799	OBRERO	ACTIVO
17	ELDA ISABEL MARTINEZ CESPEDES	1.005.180.560	OBRERO	ACTIVO
18	CLAUDIA YOLANDA ARENAS BALAGUERA	63.473.674	OBRERO	ACTIVO
19	LISNEY MARIA BLUM	63.473.725	OBRERO	ACTIVO
20	MARIA INES MEJIA ANGARITA	63.471.821	OBRERO	ACTIVO
21	HEIDA RIOS ANGULO	37.938.004	OBRERO	ACTIVO
22	ELMER DAVID PARRA MARAGUA	72.163.850	OBRERO	ACTIVO
23	ANA BELEN BENAVIDES MORENO	63.469.282	OBRERO	ACTIVO
24	LEIDIS TATIANA RUIZ TREJOS	1.096.213.981	OBRERO	ACTIVO
25	GILBERTO MORA PEREZ	91.432.450	OBRERO	ACTIVO
26	ORLANDO ENRIQUE VERGARA FUENTES	91.439.575	APOYO HSE	ACTIVO
27	CESAR JULIO ARIAS GOMEZ	8.126.302	ING AMBIENTAL	ACTIVO
28	EDGAR BERNARDO LONDOÑO ACOSTA		CONDUCTOR	ACTIVO
29	MONICA MARCELA MORALES AYALA	1.096.255.289	TEC.HSE	ACTIVO
30	OLGA CECILIA BLANQUICETT PINEDA	1.096.208.077	ING AMBIENTAL	ACTIVO
31	MANUEL SEBASTIAN FERNANDEZ BLANCO	78.321.299	GUADAÑADOR	ACTIVO
32	SANDRA LILIANA ACUÑA ENTRALGO	63.351.293	CAPATAZ	ACTIVO
33	MARCELA GOMEZ CASTELLON	1.096.203.495	OBRERO	ACTIVO
34	SHAROOL ARGELY AMADO JIMENEZ	1.097.184.373	OBRERO	ACTIVO
35	MARILYN DEL CARMEN SANCHEZ MONTOYA		OBRERO	ACTIVO
36	CINDY TATIANA MUÑOZ SEGOVIA	1.085.041.512	OBRERO	ACTIVO
37	SEVERIANO TILANO RUBIO	13.861.719	OBRERO	ACTIVO

38	LIBINTON MEJIA CORTES	13.852.739	OBRERO	ACTIVO
39	JOHANA MILENA PLATA	37.579.724	OBRERO	ACTIVO
40	YARLE MILENA ROJAS BELTRAN	28.060.899	OBRERO	ACTIVO
41	LUZ NORALBA SANCHEZ MONSALVE	1.096.242.478	OBRERO	ACTIVO
42	NOHORA YELISA VARGAS MARTINEZ	37.575.113	OBRERO	ACTIVO
43	DIANA PATRICIA ACUÑA MONTESINO	1.096.185.610	OBRERO	ACTIVO
44	ANA MILENA GUZMAN VASQUEZ	28.061.347	OBRERO	ACTIVO
45	YINIDLAY DIAZ PICO	1.096.249.537	OBRERO	ACTIVO
46	ALEXANDER ENRIQUE TAMARA MARTINEZ	92.537.664	OBRERO	ACTIVO
47	STEFANNY RUEDA CAMARGO	1.096.239.061	ING AMBIENTAL	ACTIVO
48	WILLY ALEXANDER SALOM RICO	1.096.240.780	ING AMBIENTAL	ACTIVO
49	CARLOS MARIO PUMAREJO LERMA	1.096.240.144	ING AMBIENTAL	ACTIVO
50	YULEIDIS MARTINEZ ZAMBRANO	1.096.229.791	TECNICO HSE	ACTIVO
51	XIMENA CAMARGO THOMAS	1.096.211.230	ING PRODUCCION	ACTIVO
52	MANUEL EMILIO CUEVA CHACON	13.565.963	OBRERO	ACTIVO
53	MOISES GALEANO MARINO	91.427.684	CAPATAZ	ACTIVO
54	DEISY ARROYO MARTINEZ	30.798.409	OBRERO	ACTIVO
55	HARRISON ARLEY BALDOVINO NUÑEZ	1.096.238.035	OBRERO	ACTIVO
56	FRANCIA ELENA SCAARPETTA ACEVEDO	1.096.193.073	OBRERO	ACTIVO
57	MARIA ANGELICA ALVAREZ SANCHEZ	1.096.184.267	OBRERO	ACTIVO
58	ANDERSON ALVAREZ CHAVEZ	1.096.223.921	OBRERO	ACTIVO
59	DENIS GRAU CONTRERAS	63.456.198	OBRERO	ACTIVO
60	MARELY CECILIA PIÑEREZ VILLAZON	37.876.323	OBRERO	ACTIVO
61	LESLY ZABETH RAMOS BALDOVINO	37.580.784	OBRERO	ACTIVO
62	ROCIO MARGARITA MUÑOZ CASTRILLO	37.925.742	OBRERO	ACTIVO
63	HERNAN VILLEGAS RUIZ	77.150.699	OBRERO	ACTIVO
64	ESTHER MORENO DE ARGEL	37.926.582	OBRERO	ACTIVO
65	MELYS THOMAS HERNANDEZ	1.048.557.239	OBRERO	ACTIVO
66	JESUS ERNEY GRANADA ALBA	13.569.257	OBRERO	ACTIVO
67	GUILLERMO ANTONIO VELASQUEZ CAMELO	1.067.401.684	OBRERO	ACTIVO
68	BRAYAN STEVEN BORJA VILLEGAS	1.005.177.383	OBRERO	ACTIVO
69	MARTA CECILIA CAMACHO BAUTISTA	37.577.934	OBRERO	ACTIVO
70	YUDY HERNANDEZ GOMEZ	28.070.232	OBRERO	ACTIVO
71	KAROL MICHELLE MEDINA SIERRA	1.097.182.004	OBRERO	ACTIVO
72	ALBERTO MERCADO ORTIZ	1.137.195.076	OBRERO	ACTIVO
73	SIRLEY URIBE LOZANO	37.575.906	OBRERO	ACTIVO
74	MARIA AZUCENA CALVO GAITAN	43.649.189	OBRERO	ACTIVO
75	EMILIA MERCEDES QUIROGA OLIVEROS	1.096.198.793	OBRERO	ACTIVO
76	HENRY BARXILAY SANABRIA VEGA	74.754.474	OBRERO	ACTIVO
77	KATY ELENA CORRALES ORTEGA	1.096.206.611	OBRERO	ACTIVO
78	YARLENIS MOSQUERA CASTILLO	45.504.023	OBRERO	ACTIVO
79	JULIETH PAOLA MIRANDA CHACON	1.096.234.976	OBRERO	ACTIVO
80	ANGELA MARIA RAMOS MARTINEZ	37.579.022	OBRERO	ACTIVO

81	MAIRA ALEJANDRA CONTRERAS SILVA	1.003.258.449	OBRERO	ACTIVO
82	ANGIE PAOLA BETANCOURT COGOLLO	1.002.237.273	OBRERO	ACTIVO
83	ANA DEYSI BARRAZA PEÑA	37.930.740	OBRERO	ACTIVO
84	ESNELDA PATRICIA GIL QUIROGA	1.096.235.854	OBRERO	ACTIVO
85	INGRIS KATHERINE RAMIREZ ALVARINO	1.098.777.707	OBRERO	ACTIVO
86	KATHHYEL YIRLESSA BELTRAN OSMA	1.096.224.609	ING AMBIENTAL	ACTIVO
87	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ HERNANDEZ	13.830.218	GUADAÑADOR	ACTIVO
88	JHON JAIRO CUETO VASQUEZ	1.096.224.983	GUADAÑADOR	ACTIVO
89	WILSON BELEÑO CRUZ	1.096.215.114	GUADAÑADOR	ACTIVO
90	ARLEY GALEANO LARA	1.096.204.823	TALADOR	ACTIVO
91	LUIS CARLOS MADRIGAL TABORDA	70.254.181	TALADOR	ACTIVO
92	CARLOS ARTURO PUMAREJO ARIAS	91.438.434	CAPATAZ	ACTIVO
93	RONALD ALEXANDER CORPAS CASTILLO	1.096.237.273	OBRERO	ACTIVO
94	YERSON MARTINEZ CARRASQUILLA	88.217.901	OBRERO	ACTIVO
95	JOHANA GARCIA PUERTA	63.464.214	OBRERO	ACTIVO
96	JESUS DIMAS	13.891.648	OBRERO	ACTIVO
97	RUBEN SALINAS SANCHEZ	91.435.313	OBRERO	ACTIVO
98	BYSMAR JHANNYR PULGARIN RODRIGUEZ	1.022.995.104	OBRERO	ACTIVO
99	REINALDO LOBO JAIMES	91.431.684	OBRERO	ACTIVO
100	XIOMARA DEL SOCORRO JIMENEZ PIEDRAHITA	37.578.115	OBRERO	ACTIVO
101	ALONSO MARTINEZ PINZON	71.182.374	OBRERO	ACTIVO
102	WENDY MILENA RESTREPO	1.096.234.779	OBRERO	ACTIVO
103	IMER HERNANDEZ JIMENEZ	13.850.607	OBRERO	ACTIVO
104	CARLOS EDUARDO PABA CORONADO	85.202.188	OBRERO	ACTIVO
105	LEONARDO ROA DURAN	91.436.294	OBRERO	ACTIVO
106	OSCAR EDUARDO FLOREZ ORTIZ	13.850.301	OBRERO	ACTIVO
107	ANGIE PAOLA LOPEZ GARCIA	1.096.197.727	OBRERO	ACTIVO
108	JHON FREDDY SAJONERO BARRERA	1.005.189.758	OBRERO	ACTIVO
109	LINA MARCELA RAMOS GALVIS	37.579.926	OBRERO	ACTIVO
110	SHIRLEY GOMEZ RODRIGUEZ	63.471.165	OBRERO	ACTIVO
111	CESAR JULIO LOZANO CORTES	71.183.549	OBRERO	ACTIVO
112	HUGO ARMANDO MORON HERNANDEZ	13.569.792	CAPATAZ	ACTIVO
113	YINET PAOLA AYALA ZUÑIGA	1.096.255.449	OBRERO	ACTIVO
114	CAROLINA DURAN PEREZ	28.070.103	OBRERO	ACTIVO
115	LUZ AMPARO PEREZ SAAVEDRA	37.929.534	OBRERO	ACTIVO
116	OSWALDO ALVAREZ CERVANTES	91.424.161	OBRERO	ACTIVO
117	CAMILO ANDRES BORJA RODRIGUEZ	1.096.237.133	OBRERO	ACTIVO
118	CLAUDIA CECILIA ROJAS CUELLAR	1.096.197.560	OBRERO	ACTIVO
119	ROQUE LASCANO DIAZ	91.432.079	OBRERO	ACTIVO
120	ANDRUZ YESID RODRIGUEZ HERRERA	1.096.231.508	OBRERO	ACTIVO
121	BRANDON ESTID VILLAMIZAR JAIMES	1.097.182.060	OBRERO	ACTIVO
122	FRANKLIN TAFUR GUERRA	91.440.075	OBRERO	ACTIVO
123	BRIAN MIRANDA ROBLES	1.096.215.640	OBRERO	ACTIVO
124	ANA ROSA GARCIA CANOLES	63.469.620	OBRERO	ACTIVO

125	LEONAR SANCHEZ CHAVEZ	1.096.195.862	OBRERO	ACTIVO
126	JHON ALBERTO FERNANDEZ MORENO	13.568.359	OBRERO	ACTIVO
127	PEDRO GARCIA CHACON	91.442.841	CAPATAZ	ACTIVO
128	TANIA EGEA AVELLANEDA	52.766.806	OBRERO	ACTIVO
129	LUIS CARLOS TORO FAJARDO	91.429.209	OBRERO	ACTIVO
130	BREYNER SMITH GONZALEZ MARTINEZ	1.096.801.573	OBRERO	ACTIVO
131	ELIAN JIMENEZ BALLESTEROS	1.096.190.181	OBRERO	ACTIVO
132	LEIDY JOHANA GUTIERREZ HURTADO	1.096.229.540	OBRERO	ACTIVO
133	EZEQUIEL GUERRERO RODRIGUEZ	91.444.698	OBRERO	ACTIVO
134	SERGIO MAURICIO MENDOZA MACHADO	1.096.241.976	OBRERO	ACTIVO
135	VICENTE ARIAS MENDOZA	5.793.978	OBRERO	ACTIVO
136	RAMIRO RONDON DORIA	91.420.025	OBRERO	ACTIVO
137	ELSI CASTRO MORENO	37.687.492	OBRERO	ACTIVO
138	EMERSON DAVID CARDILES AVILA	1.005.221.939	OBRERO	ACTIVO
139	SANDRA MILENA URREA MAZO	44.160.088	OBRERO	ACTIVO
140	EDGAR LEONARDO LONDOÑO VILLARREAL	1.096.184.462	OBRERO	ACTIVO
141	FREDY ALCOCER NARVAEZ	1.096.188.847	OBRERO	ACTIVO
142	JEIMY LUCERO DIAZ QUIROGA	1.096.210.596	OBRERO	ACTIVO
143	DEIMER URIBE VANEGAS	1.096.247.442	OBRERO	ACTIVO
144	JOHANNA RANGEL PEREZ	1.096.189.187	OBRERO	ACTIVO
145	JORGE ELIECER CORTES QUIROS	91.441.375	OBRERO	ACTIVO
146	NICOLL MICHELL ROJAS PINEDA	1.005.240.478	OBRERO	ACTIVO
147	IBET GUEVARA JACOME	1.116.786.431	OBRERO	ACTIVO
148	DANIEL SNATAMARIA VESGA	1.096.202.293	OBRERO	ACTIVO
149	ROGELIO MARTINEZ CRUZADO	13.891.129	CAPATAZ	ACTIVO
150	JOSE GREGORIO SERRANO GUERRERO	1.096.246.643	OBRERO	ACTIVO
151	ENEL DE JESUS CHACON MEJIA	13.890.061	OBRERO	ACTIVO
152	JOSE ENCARNACIÓN NAVARRO DIAZ	13.882.829	OBRERO	ACTIVO
153	NAYERLYS PAOLA CEBALLOS SEVILLA	1.049.316.391	OBRERO	ACTIVO
154	ARELIS TELLEZ ACENCIO	43.693.635	OBRERO	ACTIVO
155	ADALBERTO RODRIGUEZ BELEÑO	13.886.569	OBRERO	ACTIVO
156	FERNANDO ALVEAR FRUTO	91.421.617	OBRERO	ACTIVO
157	ALFREDO SAUCEDO MARTINEZ	91.435.564	OBRERO	ACTIVO
158	HUMBERTO LERMA JARABA	1.085.102.639	OBRERO	ACTIVO
159	CESAR IVAN ZAPA ALVAREZ	73.193.871	OBRERO	ACTIVO
160	HERNEIDES JOSE CADENA URIBE	1.096.187.948	OBRERO	ACTIVO
161	SERGIO SANCHEZ MARIN	1.096.236.639	OBRERO	ACTIVO
162	LUZ AYDA VELASQUEZ BRICEÑO	28.070.523	OBRERO	ACTIVO
163	DILIA ROSA COGOLLO MARTINEZ	30.824.755	OBRERO	ACTIVO
164	ROBERTO SANDOVAL	91.438.003	OBRERO	ACTIVO
165	BENJAMIN GUZMAN	10.170.387	OBRERO	ACTIVO
166	VENERANDA VICTORIA UPARELA COMBER	63.464.957	OBRERO	ACTIVO
167	HECTOR MANUEL MORA CADAVID	91.446.194	OBRERO	ACTIVO
168	ELKI PEDROZO SILVA	1.026.562.274	OBRERO	ACTIVO

169	MIBIAM JANETH MILLAN QUIROGA	37.652.395	OBRERO	ACTIVO
170	OLGA LUCIA PICO	63.463.606	OBRERO	ACTIVO
171	FERNEY GONZALEZ GONZALEZ	1.024.470.533	OBRERO	ACTIVO
172	IDINAEL DE LA CRUZ MARTINEZ VELASQUEZ	49.860.026	OBRERO	ACTIVO
173	ANNIES JIMENEZ SILVA	13.566.113	OBRERO	ACTIVO
174	CIPRIANO NOYA CORTEZ	2.713.460	OBRERO	ACTIVO
175	HECTOR EUSEBIO CAMACHO ALFONSO	13.894.791	OBRERO	ACTIVO
176	EMERITA RONDON PATIÑO	28.060.647	OBRERO	ACTIVO
177	JOSE CONCEPCION LUNA FLORES	13.881.095	OBRERO	ACTIVO
178	LUDYS JAIMES AGUAS	37.580.774	OBRERO	ACTIVO
179	JESUS MARIA ISAZA ECHEVERRIA	85.442.246	OBRERO	ACTIVO
180	LUIS CARLOS RUEDA MARTINEZ	1.005.186.465	OBRERO	ACTIVO
181	AMARILDO CUADRADO SERPA	3.909.286	OBRERO	ACTIVO
182	YADIRE MARQUEZ MARTINEZ	1.096.209.825	OBRERO	ACTIVO
183	ALBEYS MURILLO MENDOZA	91.447.720	OBRERO	ACTIVO
184	DEICY MARGARITA ARRIETA CAMPOS	39.020.744	OBRERO	ACTIVO
185	YADIRA AMARIS NAVARRO	37.576.448	OBRERO	ACTIVO
186	DELIA FONSECA AVENDAÑO	21.949.845	OBRERO	ACTIVO
187	JUAN DAVID RENGIFO MUÑOZ	1.005.179.373	OBRERO	ACTIVO
188	LUIS EVELIO CAICEDO OLIVERO	1.005.182.975	CONDUCTOR	ACTIVO
189	SINDY PAOLA GONZALEZ ZABALA	1.042.211.131	SUPERVISOR	ACTIVO
190	BRAYAN ANDRES POZO RINCON	1.096.255.116	OBRERO	ACTIVO
191	JHAN CARLOS HERNANDEZ JAIMES	1.127.340.428	OBRERO	ACTIVO
192	ALBA LORENA ROBLES MANCERA	37.581.604	VIGIA HSE	ACTIVO
193	VERONICA PALMERA GOMEZ	37.578.686	OBRERO	ACTIVO
194	KAREN NATALIA HERNANDEZ GARNICA	1.096.200.281	OBRERO	ACTIVO
195	ROSA MARIA FLOREZ MAZO	1.096.199.406	OBRERO	ACTIVO
196	JOSEFINA PINTO GONZALEZ	28.337.558	OBRERO	ACTIVO
197	JULIAN RAMON ARROYO	91.436.832	OBRERO	ACTIVO
198	ROSA MARIA BAUTISTA QUINTERO	1.074.190.270	OBRERO	ACTIVO
199	ANDYS DAYANNA LOPEZ ALVEAR	1.062.904.594	OBRERO	ACTIVO
200	KARI SILVANA ACUÑA SANCHEZ	1.005.449.355	OBRERO	ACTIVO
201	HARY ANDREA YEPES GUEVARA	1.002.249.751	OBRERO	ACTIVO
202	CELSO MAYORGA MARTINEZ	5.640.875	OBRERO	ACTIVO
203	MANUEL DE JESUS ARRIETA PEREZ	13.891.826	OBRERO	ACTIVO
204	YODIS CORTES SILVA	1.096.239.301	OBRERO	ACTIVO
205	ESNEIDER DE JESUS MENCO BELEÑO	1.099.964.020	OBRERO	ACTIVO
206	DAIRO RAMIREZ SILVA	1.002.304.397	OBRERO	ACTIVO
207	CRISANTO CORREA HOYOS	1.096.193.494	OBRERO	ACTIVO
208	ANA GABRIELA BELEÑO RIOS	1.096.247.946	OBRERO	ACTIVO
209	JUAN MEJIA ORTEGA	3.929.962	OBRERO	ACTIVO
210	RUBEN SALAS TORO	13.565.291	OBRERO	ACTIVO
211	GEOGINA CORREA HOYOS	28.489.235	OBRERO	ACTIVO
212	JIMER ANTONIO CONTRERAS SERNA	13.854.549	OBRERO	ACTIVO

213	FLOR MARIA ARRIETA GALINDO	1.096.229.824	OBRERO	ACTIVO
214	HEIDER ALEXANDER OVIEDO PACHECO	1.096.185.565	OBRERO	ACTIVO
215	CRISTIAN LOPEZ CORREA	1.096.228.324	OBRERO	ACTIVO
216	BRAYAN ANDRES RODRIGUEZ TORRES	1.002.364.016	OBRERO	ACTIVO
217	MARIANA DIAZ SIERRA	1.005.189.440	OBRERO	ACTIVO
218	JAMEZ ACEVEDO CHAVEZ	91.435.210	OBRERO	ACTIVO
219	DEYVIS ACEVEDO SEGOVIA	1.096.239.230	OBRERO	ACTIVO
220	ARGENIDA LEON TORRES	37.932.457	OBRERO	ACTIVO
221	GABRIEL MEJIA LEON	13.569.911	OBRERO	ACTIVO
222	EDER VERGARA OSPINO	1.103.674.080	OBRERO	ACTIVO
223	LUIS EMILIO BOHORQUEZ MONSALVE	91.437.588	OBRERO	ACTIVO
224	LICETH LILIANA TORO LASCARRO	1.096.192.145	OBRERO	ACTIVO
225	JAIRO ANDRES BELEÑO HERAZO	1.051.734.721	OBRERO	ACTIVO
226	YADIRA MERCEDES MENCO BELEÑO	23.206.428	OBRERO	ACTIVO
227	MARIA ORFILA ARCILA	37.578.417	OBRERO	ACTIVO
228	VIRGINIA XIMENA ALVAREZ JIMENEZ	63.350.141	OBRERO	ACTIVO
229	FRANCISCO ZAMBRANO DIAZ	85.160.078	OBRERO	ACTIVO
230	OSCAR DAVID MATIAS PEREZ	1.096.255.935	OBRERO	ACTIVO
231	ALDAIR CAMELO TOLOSA	1.096.252.542	OBRERO	ACTIVO
232	JOSE ANTONIO CAÑAS	91.421.520	OBRERO	ACTIVO
233	LEONEL ENRIQUE CAMELO BLANCO	13.893.668	OBRERO	ACTIVO
234	FABIO JIMENEZ BANDERA	7.997.015	OBRERO	ACTIVO
235	ALEJANDRA PATRICIA COLMENARES LOSANO	1.098.650.250	OBRERO	ACTIVO
236	ROSMIRA TORRES GARCIA	28.488.635	OBRERO	ACTIVO
237	MARISOL VERGARA OSPINO	1.070.959.085	OBRERO	ACTIVO
238	LEIDA LUZ BENAVIDES LOPES	37.581.576	AUX ADMINIST	ACTIVO
239	OSCAR ALIRIO CASTIBLANCO ULLOA	91.426.551	OBRERO	ACTIVO
240	NYDIA PEREZ ARIAS	37.580.259	OBRERO	ACTIVO
241	RUBIELA ANDRADE VALENCIA	63.514.657	OBRERO	ACTIVO
242	JOSE JOAQUIN CUESTA VELASQUEZ	13.893.928	OBRERO	ACTIVO
243	FABIAN ANDRES CARDONA GOMEZ	1.005.179.136	OBRERO	ACTIVO
244	MARILYN RAMIREZ RAMIREZ	1.096.217.795	OBRERO	ACTIVO
245	YULITZA MORENO URBINA	1.005.185.296	OBRERO	ACTIVO
246	ELIAN JAMAICA PALOMINO	PPT- 5675019	OBRERO	ACTIVO
247	ALBEIS BOHORQUEZ DURAN	1.096.189.216	OBRERO	ACTIVO
248	MARCO TULIO VALENCIA ZARATE	91.429.939	OBRERO	ACTIVO
249	MIGUEL NAVARRO MEJIA	91.443.684	OBRERO	ACTIVO
250	JAIDER MACHAO GOMEZ	1.005.183.472	OBRERO	ACTIVO
251	JUAN CARLOS GOMEZ PETRO	1.096.188.397	OBRERO	ACTIVO
252	JOSE GAMALIER GARCIA ACOSTA	9.196.487	OBRERO	ACTIVO
253	JULIO CESAR CARVAJAL VELEZ	78.026.839	OBRERO	ACTIVO
254	BERTA JUSTINA AREVALO AGUDELO	37.581.250	OBRERO	ACTIVO
255	DANIEL GREGORIO QUIÑONES ALVAREZ	91.446.304	OBRERO	ACTIVO
256	SERAFIN SEPULVEDA CASTILLO	91.426.928	OBRERO	ACTIVO

257	CARLOS HUMBERTO CADENA PUENTES	13.723.067	OBRERO	ACTIVO
258	MAGDA LUCIA GARCIA ACERO	28.070.285	OBRERO	ACTIVO
259	DANIELA ALEXANDRA SALOM CARRILLO	1.005.186.378	OBRERO	ACTIVO
260	ANA LICETH REQUENES GALINDO	1.096.215.182	OBRERO	ACTIVO
261	JOHAN ARLEY BRAM MORALES	1.005.188.238	OBRERO	ACTIVO
262	AMAURYS ANDRES MEJIA MARTINEZ	1.096.223.481	OBRERO	ACTIVO
263	KEYNER GOMEZ PEÑATES	1.100.693.640	OBRERO	ACTIVO
264	LINO ALBERTO AREVALO CHINCHILLA	1.003.247.964	OBRERO	ACTIVO
265	JORGE ADOLFO MARTINEZ TOBAR	1.096.198.788	OBRERO	ACTIVO
266	CLAUDIA PATRICIA VASQUEZ TRISTANCHO	37.576.547	OBRERO	ACTIVO
267	EDILBERTO PEREZ AGUILAR	1.096.209.366	OBRERO	ACTIVO
268	JUAN JOSE CARMONA URIELES	1.005.189.284	OBRERO	INACTIVO
269	RUBEN DARIO LOPEZ PAEZ	1.193.229.410	OBRERO	INACTIVO
270	KATTY NATASHA OCHOA MEDINA	1.096.237.719	OBRERO	INACTIVO
271	JOSE GREGORIO QUIROZ FUNEZ	91.444.311	OBRERO	INACTIVO
272	EDWIN CORDERO CRUZ	13.854.640	OBRERO	INACTIVO
273	EDILIA PINTO BUITRAGO	63.467.117	OBRERO	INACTIVO
274	YERI JAHIZULI BADILLO SERRANO	37.576.390	OBRERO	INACTIVO
275	INDIRA YESENIA BARRAGAN ZEIJA	1.096.234.665	OBRERO	INACTIVO
276	LUIS DANIEL GAMARRA CELIS	1.102.383.771	OBRERO	INACTIVO
277	MARIA YANET PAEZ DAZA	37.933.555	OBRERO	INACTIVO
278	ALEIDA GELVES CALDERON	1.095.947.952	OBRERO	INACTIVO
279	ELIANA DEL CARMEN CRISTO LINARES	1.096.202.501	OBRERO	INACTIVO
280	BLANCA YURLEY BARRERO VASQUEZ	1.096.214.824	OBRERO	INACTIVO
281	KARINA ALEJANDRA CABALLERO RANGEL	1.005.176.538	OBRERO	INACTIVO
282	FERNANDO PATIÑO	13.851.129	OBRERO	INACTIVO
283	JENNY DEL PILAR TINJACA CONTRERAS	1.096.205.461	OBRERO	INACTIVO
284	INGRID YULIANA MONTEZUMA SENEGAL	1.005.176.420	OBRERO	INACTIVO
285	NOHEMI ROJAS PLATA	37.934.516	OBRERO	INACTIVO
286	LINA MAYERLY GALEANO ARRIETA	1.096.223.220	OBRERO	INACTIVO
287	DANIEL ARIAS	91.424.437	OBRERO	INACTIVO
288	RODOLFO CUELLAR MONTERO	91.440.112	OBRERO	INACTIVO
289	GERALDINE CENTENO BETANCUR	1.005.183.790	OBRERO	INACTIVO
290	EFRAIN MARTINEZ FLOREZ	1.096.250.944	OBRERO	INACTIVO
291	ESTHER ARIAS PACHECO	37.930.064	OBRERO	INACTIVO
292	MIGUEL BELEÑO RANGEL	3.864.632	OBRERO	INACTIVO
293	YENNY FERD ANGULO NIÑO	1.096.249.790	OBRERO	INACTIVO
294	NELLIVE CASTRO GALVAN	33.309.873	OBRERO	INACTIVO
295	CLAUDIA PATRICIA PALACIOS TORRES	63.465.163	OBRERO	INACTIVO
296	FLOR ALBA GUARIN LAN	1.096.196.600	OBRERO	INACTIVO
297	JASON GABRIEL RAPALINO WILCHES	13.854.242	OBRERO	INACTIVO
298	JESUS ALBERTO QUIJANO PEÑA	1.096.217.910	OBRERO	INACTIVO
299	MARIA EUGENIA ROJAS RINCON	63.457.543	OBRERO	INACTIVO
300	DISNEY MAGALY MARTINEZ GARAVIS	1.096.198.492	OBRERO	INACTIVO

301	WILLIAM VALBUENA RIVERA	91.514.536	OBRERO	INACTIVO
302	FEIVER BAÑOS PERALES	13.865.416	OBRERO	INACTIVO
303	ASTRID CAROLINA REY CACERES	1.096.234.281	OBRERO	INACTIVO
304	JESSICA PAOLA CIFUENTES RIVERO	1.006.440.608	OBRERO	INACTIVO
305	YAZMIN MARTINEZ AYALA	1.096.184.027	OBRERO	INACTIVO
306	ALBEIRO ARNEY PEÑA MORALES	1.005.188.308	OBRERO	INACTIVO
307	CESAR EDUARDO ESCAÑO GUAYARA	1.096.196.042	OBRERO	INACTIVO
308	ROSA ISABEL GORDILLO MARTINEZ	63.473.467	OBRERO	INACTIVO
309	YULEIMY ANDREA CUEVAS RODRIGUEZ	1.096.249.402	OBRERO	INACTIVO
310	DELCY LISETH RUIZ PINEDA	1.012.433.294	OBRERO	INACTIVO
311	ELBA VICTORIA ROJAS TASCO	63.456.811	OBRERO	INACTIVO
312	DIANA CAROLINA POVEDA GUEVARA	1.005.241.453	OBRERO	INACTIVO
313	FERNANDO CATAÑO PEREZ	91.438.837	OBRERO	INACTIVO
314	LUIS FERNANDO RIOS LOPEZ	1.005.180.616	OBRERO	INACTIVO
315	MANUEL ANTONIO RUZ VERA	1.007.949.030	OBRERO	INACTIVO
316	DIANA MARCELA CUELLAR MONTERO	37.575.904	OBRERO	INACTIVO
317	NATALIA RIOS CASTRO	1.096.252.403	OBRERO	INACTIVO
318	WILLIAM PEDROZO ORTIZ	1.096.188.962	OBRERO	INACTIVO
319	OLGER MORENO RUIZ	91.433.015	OBRERO	INACTIVO
320	ANA LUCIA GUEVARA VELEZ	37.576.892	OBRERO	INACTIVO
321	JHONNIS TORREJANO CASTRO	91.436.647	OBRERO	INACTIVO
322	EDINSON QUIROZ CHACÓN	91.431.450	OBRERO	INACTIVO
323	HOLMAN JOSE CASTRO RODRIGUEZ	91.427.192	OBRERO	INACTIVO
324	MAURICIO ANDRES BAZA QUINTERO	1.096.196.328	OBRERO	INACTIVO
325	DALMIRO ALBERTO AGAMEZ HURTADO	73.236.470	OBRERO	INACTIVO
326	MEYERLY GRANDAS RODRIGUEZ	1.097.993.489	OBRERO	INACTIVO
327	KAROL VANESSA MEJIA MORALES	1.005.654.318	OBRERO	INACTIVO
328	JOSE MIGUEL ARCILA SOTELO	1.054.543.926	OBRERO	INACTIVO
329	DAYANA MARCELA DONADO FAJARDO	1.096.239.441	OBRERO	INACTIVO
330	LAURA VANESSA RODRIGUEZ TORRES	1.005.655.147	OBRERO	INACTIVO
331	ILSA TOVAR	37.575.783	OBRERO	INACTIVO
332	ARNALDO ARDILA ROBLES	1.096.183.034	OBRERO	INACTIVO
333	YEIDER STIVEN REYES MORALES	1.005.183.438	OBRERO	INACTIVO
334	CARLOS CESAR VIZCAINO VILLALBA	91.447.281	OBRERO	INACTIVO
335	LEONILDA RODRIGUEZ NOGUERA	28.020.659	OBRERO	INACTIVO
336	ORQUIDEA ARIAS CHACON	63.474.437	OBRERO	INACTIVO
337	IRIANA FLORIAN TOBAR	1.096.249.930	OBRERO	INACTIVO
338	DARWIN RODRIGUEZ MARTINEZ	13.566.467	OBRERO	INACTIVO
339	OMAR PEDROZO ORTIZ	91.424.520	OBRERO	INACTIVO
340	LIBARDO PEDROZO ORTIZ	91.437.690	OBRERO	INACTIVO
341	LEILA BORJA FLORIAN	28.020.623	OBRERO	INACTIVO
342	EDELINDA QUINTERO CUADRADO	37.579.534	OBRERO	INACTIVO
343	AMAURIS CASTRO HERNANDEZ	91.447.089	OBRERO	INACTIVO
344	DIOSI MENDEZ SANCHEZ	1.085.094.974	OBRERO	INACTIVO

345	DAYXY ESTHER BELEÑO PASO	1.118.567.286	OBRERO	INACTIVO
346	LUIS MANUEL JIMENEZ ASPRILLA	1.094.831.762	GUADAÑADOR	INACTIVO
347	WILLIAM DIOMEDES VILLAFAÑE PEÑALOZA	13.854.309	OBRERO	INACTIVO
348	JOSE ENRIQUE BADILLO PIÑERES	1.001.815.344	OBRERO	INACTIVO
349	ANGIE TATIANA RODRIGUEZ MORENO	1.096.243.475	OBRERO	INACTIVO
350	JIMMY ALEXANDER ARIAS ROJAS	1.096.235.786	OBRERO	INACTIVO
351	OMAR ALFREDO PACHECO PADILLA	91.433.330	OBRERO	INACTIVO
352	AYIRIS BOLIVAR SALGADO	13.566.606	OBRERO	INACTIVO
353	MARCIAL ANTONIO MORALES MUÑOZ	1.005.653.707	OBRERO	INACTIVO
354	CARLOS ALBERTO MERCADO JIMENEZ	1.096.244.012	OBRERO	INACTIVO
355	EDAIN MORENO HOYOS	19.711.025	OBRERO	INACTIVO
356	YONATAN YOHAN CARRASQUILLA PORRAS	1.096.241.560	OBRERO	INACTIVO
357	EXNEYER MEJIA TURIZO	1.096.802.259	OBRERO	INACTIVO
358	JANER SIERRA ARRIETA	1.096.212.482	OBRERO	INACTIVO
359	JORGE LINDOLFO PEINADO MANRIQUE	5.591.543	OBRERO	INACTIVO
360	SEYED GEOFFREDIE PEDROZO LOBO	13.865.275	OBRERO	INACTIVO

5.3. Hojas de Vida

Las Hojas de vida junto con sus respectivas afiliaciones, así como los contratos del personal se adjuntan al presente informe.

6. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y LEGALES DEL CONTRATO

6.1. Actas Suscritas

A la fecha se ha suscrito las siguientes actas:

NOMBRE ACTA	FECHA
Acta de Inicio	30 de agosto de 2024
Acta de comité No 1	13 de septiembre de 2024
Acta de Modificatorio 1.	20 de septiembre de 2024
Acta de comité No 2	20 de septiembre de 2024
Acta de comité No 3	27 de septiembre de 2024
Acta de comité No 4	4 de octubre de 2024
Acta de Modificatorio 2.	4 de octubre de 2024
Acta de comité No 5	11 de octubre de 2024

Acta de comité No 6	18 de octubre de 2024
Acta de comité No 7	25 de octubre de 2024
Acta de comité No 8	01 de noviembre de 2024
Acta de comité No 9	15 de noviembre de 2024
Acta de comité No 10	29 de noviembre de 2024

6.2. Relación de Pagos y/o actas parciales.

A la fecha no se ha efectuado ningún pago para el contrato 095 de 2024.

6.3. Control de Garantías

El contratista presentó a la entidad contratante póliza No 56-44-101008392 y No. 56-40-101003673 Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. para amparar los riesgos de Cumplimiento del Contrato, Pago de Salarios prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales, buen manejo y correcta inversión del anticipo y calidad del servicio, para la ejecución del contrato de Obra No. 095 DE 2024.

PÓLIZA	ASEGURADORA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	MONTO
Cumplimiento del contrato	Seguros del Estado S.A.	29/08/2024	29/04/2025	$ 673.032.117.50
Salarios, prestaciones sociales Legales e indemnizaciones Laborales	Seguros del Estado S.A.	29/08/2024	29/12/2027	$ 673.032.117.50
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Seguros del Estado S.A.	29/08/2024	29/12/2024	$ 2.019.096.352.50
Predio, labores y operaciones	Seguros del Estado S.A.	29/08/2024	29/04/2025	$ 1.346.064.235.00

Se presenta actualización de la póliza según acta de inicio, las garantías quedan con los siguientes cubrimientos:

PÓLIZA	ASEGURADORA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	MONTO
Cumplimiento del contrato	Seguros del Estado S.A.	30/09/2024	30/12/2027	30/04/2025
Salarios, prestaciones sociales Legales e indemnizaciones Laborales	Seguros del Estado S.A.	30/09/2024	30/12/2027	$ 673.032.117.50
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Seguros del Estado S.A.	30/09/2024	30/12/2024	$ 2.019.096.352.50
Predio, labores y operaciones	Seguros del Estado S.A.	30/09/2024	30/04/2025	$ 1.346.064.235.00

6.4. Control de Pagos Parafiscales

El contratista de obra presenta a la supervisión del contrato las planillas de seguridad social del personal involucrado en las diferentes actividades derivadas del objeto contractual para la correcta ejecución del proyecto. Dichas planillas permiten asegurar la correcta afiliación del personal al sistema de salud, pensión, arl y cajas de compensación familiar.

6.5. Registro Diario de Actividades (Bitácora).

En el presente informe, se adjunta la bitácora del proyecto la cual es diligenciada por parte del personal de obra y el supervisor designado para el contrato de obra 095 de 2024, día a día en obra; allí se plasman aspectos tales como el estado del tiempo, personal en obra, equipos y herramientas utilizados en la ejecución del contrato, las actividades ejecutadas y observaciones en caso de llegar a presentarse.

6.6. Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social.

Para el periodo reportado en el presente informe se anexa tanto el pago de la planilla de seguridad social como las afiliaciones y certificaciones al régimen de seguridad social del personal vinculado.

7. CONCLUSIONES

En el desarrollo del contrato de obra pública que tiene por objeto: "CONTRATO DE OBRA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA MANUAL Y ROCERÍA EN LOS CAÑOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD HÍDRICA EN SUS CUERPOS LENTICOS Y LOTICOS", se presenta un evidente aumento en el rendimiento de las actividades en la zona rural, gracias a la implementación de un plan de acción el cual consistió en reforzar el personal en los diferentes corregimientos del distrito de Barrancabermeja.

Cabe resaltar, que para el presente informe se finalizó la limpieza y rocería de los caños urbanos de 0 a 5 metros de ancho los caños urbanos, restando solo la ejecución de dos caños de 5 a 10 metros de ancho en la zona urbana.

Finalmente se cumple con el objetivo del informe, el cual da a conocer el avance físico a la fecha de del 90%, exponiendo la gestión del contratista de obra en aras de la correcta y efectiva la ejecución de actividades del contrato.

JOSÉ JULIÁN CHACÓN AVENDAÑO
R/L UT LIMPIEZA INCO 2024
