	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. Convenio 3596 de 2023; Convenio 3991 de 2023; Convenio 488 de 2023; Convenio 4727 de 2023; Convenio 3413 de 2023

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN AGUSTIN; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUNIN; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CRISTALINA DE ESTRECHO OBANDO; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION PUERTO QUINCHANA; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VILLA FATIMA

Contrato de Interventoría No. 2762 DE 2023

Interventoría: CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO

Objeto Contrato de Obra:
"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO JUNIN DEL MUNICIPIO DE ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ESTRECHO OBANDO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

INFORME MENSUAL No. 7

MES O PERIODO: DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Página 1

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____
Nombre:WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Convenio 3596 de 2023 cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**.

Convenio 3991 de 2023 cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO JUNIN DEL MUNICIPIO DE ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**.

Convenio 4818 cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ESTRECHO OBANDO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Convenio 4727 cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Convenio 3413 cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

.

CONTRATISTA

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDAS DE SAN AGUSTIN
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PUERTO QUINCHANA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VILLA FÁTIMA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ESTRECHO OBANDO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO JUNÍN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

INFORME MES DE SEPTIEMBRE 2024

1 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Tabla de contenido

1. INTRODUCCION 4

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6

2.1 LOCALIZACIÓN 6

3. INFORMACIÓN CONVENIOS 7

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS 7

3.1.1 ASOJUNTAS 7

3.1.2 JUNIN 8

3.1.3 ESTRECHO OBANDO 8

3.1.4 PUERTO QUINCHANA 9

3.1.5 VILLA FATIMA 9

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 10

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 14

4.1 AVANCE DE OBRA 14

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 15

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 15

5.2.1 INFORME DE DIRECTOR, RESIDENTE Y INSPECTOR DE INTERVENTORIA VER (ANEXO 11) 16

5.2.2 INFORME AMBIENTAL, SOCIAL Y SISO VER (ANEXO 12) 16

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 16

6.2 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 16

6.2.1 ANEXO 11: REGISTRO FOTOGRÁFICO 16

6.2.2 ANEXO 12: APROBACION DE HOJAS DE VIDA, PROROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 4576 DE 2023. 16

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 16

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE INTERVENTORIA, CONTRATISTA DE OBRA Y INVIAS. 17

1. INTRODUCCION

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, mediante oficio con radicado 2023S-VHUI-030866 entrega orden de inicio a partir del 22 de diciembre de 2023 al CONSORCIO R&C cuyo representante legal es CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO, para la ejecución de la OFERTA No.4762 DE 2023 el cual fue firmado el día 30 de noviembre de 2023, y cuenta con un plazo de ejecución inicial de tres (3) meses.

La vía objeto de las obras son muy necesarios para el Municipio de San Agustín - Isnos – del Departamento del Huila, ya que son corredores rurales productivos de vital importancia. El Instituto Nacional de Vías – INVIAS – ha puesto su interés en las intervenciones necesarias con la finalidad de apoyar el desarrollo rural, garantizando la calidad y estabilidad de las obras diseñadas, aumentar la capacidad y nivel de servicio y brindarles comodidad y seguridad a los usuarios.

El objeto de dicho OFERTA No. 47626 DE 2023, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN AGUSTIN E ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

El Consorcio R&C en calidad de Interventor, de los convenios: - Convenio 3596 de 2023 cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"** - Convenio 3991 de 2023 cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO JUNIN DEL MUNICIPIO DE ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"** - Convenio 4818 cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ESTRECHO OBANDO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" -** Convenio 4727 cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL**

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - Convenio 3413 cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, los cuales ejecutaran las juntas de acción comunal de las mencionadas veredas y que tiene como supervisor del proyecto al ingeniero WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR del Instituta Nacional de Vías – INVIAS, dando así a conocer el presente informe No 09 correspondiente al periodo del 1 de Septiembre de 2024 al 30 de Septiembre de 2024, en el cual relacionamos el desarrollo y avance de las actividades programadas, a efecto de constatar el cumplimiento por parte de la juntas de Acción Comunal.


2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto se desarrollará en los municipios de San Agustín e Isnos del Departamento del Huila, con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidarios en el programa "*Caminos Comunitarios de la Paz Total*"

MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

San Agustín es un municipio colombiano ubicado en el sur del departamento de Huila. Hace parte de la región del Sur del Alto Magdalena, donde se encuentra el más alto valle del río Magdalena, resguardado por las primeras estribaciones de las cordilleras central y oriental. Yace sobre la parte oriental del macizo colombiano. Su extensión territorial es de 1.574 km², su altura es de 1.730 m s. n. m. y su temperatura promedio es de 18 °C.

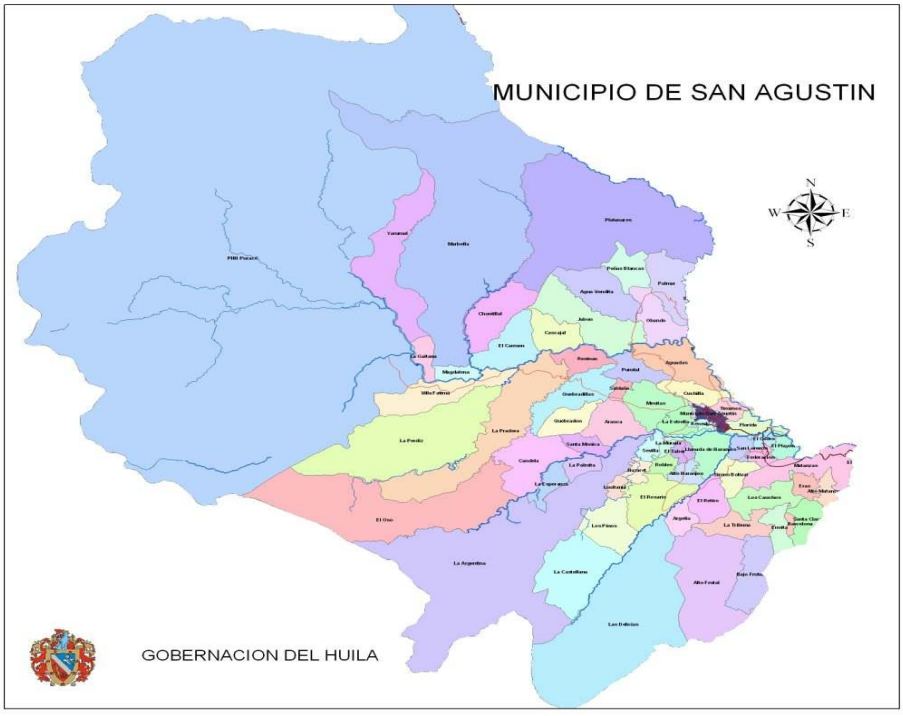

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE ISNOS

Isnos es un municipio colombiano ubicado en el suroccidente del departamento de Huila. Yace sobre la faja intertropical del mundo, en la cadena montañosa de la cordillera central, en el Sur del Alto Magdalena y sobre el Macizo Colombiano, considerado como la estrella fluvial más importante de Colombia que alberga gran parte de las riquezas en diversidad biológica y ecológica. Su extensión territorial es de 697 km², su altura es de 1.700 m s. n. m. y su temperatura promedio es de 18 °C.



3. INFORMACIÓN CONVENIOS
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS

3.1.1 ASOJUNTAS

Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN AGUSTIN
Representante legal:	YENSY MILENA GALINDEZ BURBANO
Nit.	900.773.779-1
Convenio No.	3596 de 2023

Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor convenio:	$ 188.564.775
Valor Adiciones	N/A
Valor Acumulado del Contrato	$ 188.564.775
Plazo:	Hasta el 30 de septiembre de 2024
Fecha de inicio:	05 de diciembre de 2023

3.1.2 JUNIN

Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA JUNIN
Representante legal:	VICTOR LOPEZ ORTIZ
Nit.	800.247.404-5
Convenio No.	3991 de 2023
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO JUNIN DEL MUNICIPIO DE ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor convenio:	**$**189.449.501
Valor Adiciones	N/A
Valor Acumulado del Contrato	**$**189.449.501
Plazo:	Hasta el 30 de septiembre de 2024
Fecha de inicio:	27 de diciembre de 2023

3.1.3 ESTRECHO OBANDO

Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE ESTRECHO OBANDO
Representante legal:	JOSE DEMETRIO ANACONA BOLAÑO
Nit.	813.003.979-8
Convenio No.	4818 de 2023

Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ESTRECHO OBANDO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor convenio:	$ 189.544.876
Valor Adiciones	N/A
Valor Acumulado del Contrato	$ 189.544.876
Plazo:	Hasta el 30 de septiembre de 2024
Fecha de inicio:	28 de diciembre de 2023

3.1.4 PUERTO QUINCHANA

Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL INSPECCION PUERTO QUINCHANA
Representante legal:	HENRY MARTINEZ MARTINEZ
Nit.	891.103.553-7
Convenio No.	4727 de 2023
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCION DE PUERTO QUINCHANA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor convenio:	$ 189.085.518
Valor Adiciones	N/A
Valor Acumulado del Contrato	$ 189.085.518
Plazo:	Hasta el 30 de septiembre de 2024
Fecha de inicio:	27 de diciembre de 2023

3.1.5 VILLA FATIMA

Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VILLA FATIMA
Representante legal:	OLMAN ANCIZAR SANCHEZ
Nit.	813.003.285-5
Convenio No.	3413 de 2023

Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA FATIMA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor convenio:	$ 200.803.236
Valor Adiciones	N/A
Valor Acumulado del Contrato	$ 189.269.182
Plazo:	Hasta el 30 de septiembre de 2024
Fecha de inicio:	5 de diciembre de 2023

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades realizadas durante el presente periodo por la interventoría consistieron en comités presencial y virtual, visita a las veredas de Villa Fátima, Puerto Quinchana, Estrecho Obando, Asojuntas del municipio de san Agustín y Bajo Junín del Municipio de Isnos.

ASOJUNTAS:

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 32 desde el 02 de Septiembre al 08 de Septiembre del 2024:

- Encofrado de la huella central para el ciclópeo
- Amarre de acero refuerzo para huellas laterales, cunetas y bordillos
- Fundición de concreto huellas, cunetas y bordillos con acabados
- Perfilamiento y excavaciones para las cunetas y vigas riostras
-Texturización de las huellas laterales
- Instalación de concreto en huellas cunetas y bordillos
- Instalación periódica de cinta de señalización
- Aseo general a la obra.

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 33 desde el 09 de Septiembre al 15 de Septiembre del 2024:

- Construcción del tramo adicional de la placa huella de acuerdo al balance financiero aprobado
- Encofrado de la huella central para el ciclópeo

- Amarre de acero refuerzo para huellas laterales, cunetas y bordillos
- Fundición de concreto huellas, cunetas y bordillos con acabados
- Perfilamiento y excavaciones para las cunetas y vigas riostras
-Texturización de las huellas y aplicación de antisol
- Instalación periódica de cinta de señalización en zona de obra
- Aseo general a la obra.

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 34 desde el 16 de Septiembre al 22 de Septiembre del 2024:

- Continua la construcción del tramo adicional de la placa huella de acuerdo al balance financiero aprobado
- Rocería del tramo de la vereda la Pradera
- Amarre de acero refuerzo para huellas laterales, cunetas y bordillos
- Fundición de concreto huellas, cunetas y bordillos con acabados
- Perfilamiento y excavaciones para las cunetas y vigas riostras
- Texturización de las huellas y aplicación de antisol
- Instalación periódica de cinta de señalización en zona de obra
- Aseo general a la obra.

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 35 desde el 23 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2024:

- Rocería del tramo de la vereda la Pradera
- Limpieza de alcantarillas de la zona de la vereda la Pradera
- Aseo general a la obra
- Informes y documentación para realización de cierre financiero y así la liquidación del convenio.

ESTRECHO OBANDO

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 5 desde el 02 al 08 de Septiembre del 2024:

- Nivelación y compactación para instalación de canastillas y formaletas de madera del carril izquierdo
- Instalación de Señalización vial y barricadas
- Instalación de canastillas y dovelas
- Fundición de losas de concreto
- Aplicación de antisol a losas de concreto fundidas
- Texturizado de las losas de concreto
- Instalación de acero de refuerzo longitudinal
- Toma de muestras de concreto para ensayos de Flexión
- Realización de cortes en las losas de concreto

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 6 desde el 09 al 15 de Septiembre del 2024:

- Inicio de actividades del tramo adicional a lo contractual
- Rocería a los costados de la vía principal
- Excavación, nivelación, llenado y compactación del tramo adicional
- Instalación de Señalización vial y barricadas
- Instalación de canastillas y dovelas
- Fundición de losas de concreto
- Aplicación de antisol a losas de concreto fundidas
- Texturizado de las losas de concreto
- Instalación de acero de refuerzo longitudinal
- Toma de muestras de concreto para ensayos de Flexión
- Realización de cortes en las losas de concreto.

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 7 desde el 16 al 22 de Septiembre del 2024:

- Inicio de actividades del tramo adicional a lo contractual
- Rocería a los costados de la vía principal
- Excavación, nivelación, llenado y compactación del tramo adicional
- Instalación de señalización vial y barricadas
- Instalación de canastillas y dovelas
- Fundición de losas de concreto
- Aplicación de antisol a losas de concreto fundidas
- Texturizado de las losas de concreto
- Instalación de acero de refuerzo longitudinal
- Toma de muestras de concreto para ensayos de Flexión
- Realización de cortes en las losas de concreto.

Las actividades realizadas en el transcurso de la semana 8 desde el 23 al 29 de Septiembre del 2024:

- Inicio de actividades de la obra social (Tarima)
- Instalación permanente de señalización vial y barricadas
- Excavaciones para zapatas y vigas de cimentación para la tarima
- Flejado y cortes del acero de refuerzo tanto para las zapatas como para las columnas de la tarima
- Fundición de columnas de concreto de 3000 PSI
- Instalación de perfiles metálicos que servirán como vigas de amarre y encima de ellos la lámina de Metaldeck para posteriormente fundir la placa.

Registro fotográfico:

ASOJUNTA

	
Amarre de acero refuerzo para huellas laterales, cunetas y bordillos	Texturización de las huellas laterales
	
Rocería y aseo general de la obra	Rocería y aseo general de la obra

ESTRECHO OBANDO

	
Fundición de losas de concreto	Excavación, nivelación, llenado y compactación
	
Inicio de actividades del tramo adicional	Instalación de perfiles metálicos que servirán como vigas de amarre y encima de ellos la lámina de Metaldeck para posteriormente fundir la placa

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 AVANCE DE OBRA

Durante el periodo comprendido entre el 1 de Septiembre del 2024 al 30 de Septiembre del 2024 las Juntas de acción comunal presentaron un avance del 100%, completando el total de la obra.

4.1.1. ANEXO 01: CRONOGRAMA DE OBRA
4.1.2. ANEXO 02 : INFORME SEMANAL (MEPI-MN-IN-15-FR-3)
4.1.3. ANEXO 03: MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN1-IN-15-FR-4).
4.1.4. ANEXO 04: PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN1-IN-15-FR-6).
4.1.5. ANEXO 05: INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN1-IN-15-FR-8).
4.1.6. ANEXO 06: ESTADO GENERAL DEL TIEMPO (MEPI-MN1-IN-15-FR-10).
4.1.7. ANEXO 07: RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO (MEPI-MN1-IN-15-FR-11).
4.1.8. ANEXO 08: SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN1-IN-15-FR-12).
4.1.9. ANEXO 09: OTROS DOCUMENTO SEGUIMIENTO MENSUAL
4.1.10. ANEXO 10: ACTA DE REUNIÓN (MEPI-MN-IN-14-FR-2)

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INTERVENTOR	**CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO**
Nit	7.703.837
Dirección	Cra. 8 B No. 27- 32
Teléfono	3168747742
Contrato de Interventoría N.º	4762 de 2023
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN AGUSTIN E ISNOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
Valor del contrato:	$ 75.007.262
Valor Adición	$0,00
Valor Acumulado del Contrato	$ 75.007.262
Plazo inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Prorroga No.1:	Hasta el 30 Abril de 2024

Prorroga No.2:	Hasta el 30 Julio de 2024
Prorroga No.3:	Hasta el 30 Agosto de 2024
Prorroga No.4:	Hasta el 30 Septiembre de 2024

5.2. INFORMES ESPECIALISTA Y PROFESIONALES

5.2.1 INFORME DE DIRECTOR, RESIDENTE Y INSPECTOR DE INTERVENTORIA VER (ANEXO 11)

5.2.2 INFORME AMBIENTAL, SOCIAL Y SISO VER (ANEXO 12)

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.2 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

6.2.1 ANEXO 11: REGISTRO FOTOGRÁFICO

6.2.2 ANEXO 12: APROBACION DE HOJAS DE VIDA, PROROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 4576 DE 2023.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Agilizar procesos de construcción
- Mejorar los terminado de placa huella.

8 OTROS ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE INTERVENTORIA, CONTRATISTA DE OBRA Y INVIAS.

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORIA			
FECHA DEL OFICIO	**NOMBRE ENTIDAD REMITENTE**	**NOMBRE DEL DESTINATARIO**	**ASUNTO**
9-sep	CONSORCIO R&C	INVIAS	Corrección Plan de inversión convenio 3596 - 2023
9-sep	CONSORCIO R&C	INVIAS	Corrección Plan de inversión convenio 3991 - 2023
9-sep	CONSORCIO R&C	INVIAS	Corrección Plan de inversión convenio 4727 - 2023
9-sep	CONSORCIO R&C	INVIAS	Corrección Plan de inversión convenio 3413 - 2023
27-sep	CONSORCIO R&C	SUPERVISOR WILDER	ACTAS DE COSTO No. 7 - 8 - ISNOS - SAN AGUSTIN - SOPORTES
28-sep	CONSORCIO R&C	SUPERVISOR WILDER	CORRECCIÓN ACTAS DE COSTO No. 7 - 8 - ISNOS - SAN AGUSTIN - SOPORTES

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA				
NOMBRE ENTIDAD REMITENTE	**RADICADO**	**FECHA (dd-mm-aa)**	**NOMBRE DEL DESTINATARIO**	**ASUNTO (Tema principal del oficio)**
INVIAS	2024S-VBOG-061406	2-sep	CONSORCIO R&C	Radicado # 2024S-VBOG-061406 - Comunicado de Salida
JAC VILLA FATIMA		2-sep	CONSORCIO R&C	ENTREGA INFORME MES DE AGOSTO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST
JAC PTO QUINCHANA		2-sep	CONSORCIO R&C	ENTREGA INFORME MES DE AGOSTO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST
INVIAS		3-sep	CONSORCIO R&C	Radicado # 2024S-VBOG-061623 - Comunicado de Salida
INVIAS		3-sep	CONSORCIO R&C	Radicado # 2024S-VBOG-061633 - Comunicado de Salida
AFJ SERVICIOS		3-sep	CONSORCIO R&C	Solicitud traslado rendimientos consolidados 4 JAC San Agustin

JAC BAJO JUNIN		4-sep	CONSORCIO R&C	CONVENIO3991 - SOLICITUD DE PAGO ULTIMA SEMANA DE TRABAJO DE OBREROS Y SEGURIDAD SOCIAL
JAC BAJO JUNIN		6-sep	CONSORCIO R&C	INFORME No. 02 - AGOSTO CONVENIO 3991
JAC BAJO JUNIN		6-sep	CONSORCIO R&C	SOLICITUD DE TRASLADO DE RENDIMIENTOS AGOSTO CONVENIO 3991
JAC VILLA FATIMA		9-sep	CONSORCIO R&C	ENTREGA INFORME MES DE JULIO CONVENIO No 3413 DE 2023
JAC PTO QUINCHANA		9-sep	CONSORCIO R&C	ENTREGA INFORME MENSUAL AGOSTO, CONVENIO 4727 DE 2023
JAC VILLA FATIMA		9-sep	CONSORCIO R&C	ENTREGA INFORME MES DE AGOSTO CONVENIO No 3413 DE 2023
AFJ SERVICIOS		10-sep	CONSORCIO R&C	SOLICITUD 4 DE TRANSFERENCIAS ESTRECHO OBANDO
INVIAS	2024E-VUVRAZ-087303	10-sep	CONSORCIO R&C	Resultado Radicación de Solicitud 3413 - 2023
INVIAS	2024E-VUVRAZ-087302	10-sep	CONSORCIO R&C	Resultado Radicación de Solicitud 4727 - 2023
INVIAS	2024E-VUVRAZ-087300	10-sep	CONSORCIO R&C	Resultado Radicación de Solicitud 3991 - 2023
INVIAS	2024E-VUVRAZ-087293	10-sep	CONSORCIO R&C	Resultado Radicación de Solicitud 3596 - 2023
JAC BAJO JUNIN		11-sep	CONSORCIO R&C	SOLICITUD DE RECURSOS PARA OBRA SOCIAL
AFJ SERVICIOS		11-sep	CONSORCIO R&C	SOLICITUD 10 DE TRASNFERENCIAS VILLA FATIMA
AFJ SERVICIOS		12-sep	CONSORCIO R&C	SOLICITUD 10 DE TRASNFERENCIAS ASOCOMUNAL
AFJ SERVICIOS		13-sep	CONSORCIO R&C	Solicitud 9 de trasnferencias Puerto Quinchana
JAC PTO QUINCHANA		13-sep	CONSORCIO R&C	SOLICITUD DESEMBOLSO RECURSOS INVERSION SOCIAL CONVENIO NO
JAC BAJO JUNIN		13-sep	CONSORCIO R&C	SOLICITUD DE RECURSOS PARA OBRA SOCIAL
JAC VILLA FATIMA		13-sep	CONSORCIO R&C	SOLICITUD DESEMBOLSO RECURSOS COMPONENTE SOCIAL CONVENIO No 3413 de 2023
DUVAN GUTIERREZ		16-sep	CONSORCIO R&C	Cotizaciones y Oficio para Inversión del PAGA_Obando

JAC ASOCOMUNAL		16-sep	CONSORCIO R&C	CARTA DE SOLICITUD RECURSOS PAGA INVIAS
AFJ SERVICIOS		17-sep	CONSORCIO R&C	Solicitud recurson PAGA Asocomunal
AFJ SERVICIOS		17-sep	CONSORCIO R&C	Solicitud recursos ESTRECHO OBANDO.
AFJ SERVICIOS		19-sep	CONSORCIO R&C	Solicitud recursos PAGA JAC Puerto Quinchana
AFJ SERVICIOS		19-sep	CONSORCIO R&C	Solicitud recursos PAGA JAC Villa Fátima
JAC BAJO JUNIN		19-sep	CONSORCIO R&C	CONVENIO 3991 SOLICITUD DE PAGO 23
AFJ SERVICIOS		20-sep	CONSORCIO R&C	SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS 6 ESTRECHO OBANDO
JAC VILLA FATIMA		22-sep	CONSORCIO R&C	SOLICITUD CAMBIO DE PROVEEDOR DOTACION DE MENAJE RECURSOS PAGA CONVENIO No 3413 de 2023.
OSCAR AREVALO LAB. SUELOS		23-sep	CONSORCIO R&C	FACTURA DE VENTA NO. FE199
DUVAN GUTIERREZ		23-sep	CONSORCIO R&C	Paso de vehiculos_placa huella Vereda Pradera
INVIAS	2024S-VHUIL-068011	23-sep	CONSORCIO R&C	Radicado # 2024S-VHUI-068011
JAC PTO QUINCHANA		23-sep	CONSORCIO R&C	ENTREGA INFORMACION AMBIENTAL, SOCIAL Y SST CONVENIO 4727 DE 2023
JAC VILLA FATIMA		23-sep	CONSORCIO R&C	ENTREGA INFORMACION AMBIENTAL, SOCIAL Y SST CONVENIO 3413 DE 2023.
JAC PTO QUINCHANA		23-sep	CONSORCIO R&C	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN FINAL PARA LIQUIDACIÓN CONVENIO No 4727 de 2023
JAC PTO QUINCHANA		23-sep	CONSORCIO R&C	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN FINAL PARA LIQUIDACIÓN CONVENIO No 4727 de 2023.
JAC VILLA FATIMA		23-sep	CONSORCIO R&C	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN FINAL PARA LIQUIDACIÓN CONVENIO No 3413 de 2023
AFJ SERVICIOS		24-sep	CONSORCIO R&C	SOLCITUD DE TRANSFERENCIAS 11 PUERTO QUINCHANA
AFJ SERVICIOS		24-sep	CONSORCIO R&C	SOLICITUD 12 TRANSFERENCIAS VILLA FATIMA
NELSON EDWIN INVIAS		24-sep	CONSORCIO R&C	solicitud respuesta sostenibilidad gestión ambiental
DUVAN GUTIERREZ		24-sep	CONSORCIO R&C	Certificados y documentos Pradera

DUVAN GUTIERREZ		24-sep	CONSORCIO R&C	Certificados Ambientales,social,SST_Obando
INVIAS		24-sep	CONSORCIO R&C	Radicado # 2024S-VHUI-068774 - Comunicado de Salida
INVIAS		25-sep	CONSORCIO R&C	Radicado # 2024S-VHUI-068774
MARIA FERNANDA CHILA		26-sep	CONSORCIO R&C	DILIGENCIAMIENTO FORMATOS PARA ENTREGA Y RECIBO DE LOS CONVENIOS A CARGO CTO INTERVENTORÍA 4762-2023
JAC PTO QUINCHANA		27-sep	CONSORCIO R&C	Segunda entrega documentación ambiental para liquidación de obra.
JAC VILLA FATIMA		27-sep	CONSORCIO R&C	Segunda entrega documentación ambiental para liquidación de obra VILLAFATIMA
MARIA FERNANDA CHILA		27-sep	CONSORCIO R&C	Formato Informe inversioìn buen manejo desembolso.
DUVAN GUTIERREZ		27-sep	CONSORCIO R&C	Informes Semanales y Mensuales de Obando
MARIA FERNANDA CHILA		28-sep	CONSORCIO R&C	FORMATOS ENTREGA Y RECIBO DE CONVENIOS- ACTA DE RECIBO PARCIAL

Cordialmente,

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 01:

CRONOGRAMA DE OBRA

ANEXO 02:

INFORME SEMANAL (MEPI-MN-IN-15-FR-3)

ANEXO 03:

MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN-IN-15-FR-4)

ANEXO 04:

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN-IN-15-FR-6)

ANEXO 05:

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN-IN-15-FR-8)

ANEXO 06:

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO (MEPI-MN-IN-15-FR-10)

ANEXO 07:

Resumen Ensayos de Laboratorio (MEPI-MN-IN-15-FR-11)

ANEXO 08:

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN-IN-15-FR-12).

ANEXO 09:

OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

ANEXO 10:

ACTA DE REUNION (MEPI-MN-IN-14-FR-2)

ASOJUNTAS

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 005	Regional INVIAS: Huila	Fecha: 07/09/2024

Vereda – Municipio - Departamento: Estrecho Obando – San Agustín - Huila
No. Convenio(s) Solidario(s): 3596 de 2023 – Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN AGUSTÍN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Ejecutor(es): JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTÍN

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
YENSY GALINDEZ	JAC ASOJUNTAS	PRESIDENTE
YOLANDA CHICANGANA	VEEDURIA	SECRETARIA
DUVAN GUTIERREZ	JAC ASOJUNTAS	ING RESIDENTE OBRA
ALBENIZ FORERO	JAC ASOJUNTAS	CONTADOR PUBLICO
CARLOS CHAVARRO	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA
IVAN SANDOVAL	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Revisión y aprobación del segundo balance del proyecto ajustado a las condiciones de la ejecución.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Revisión y aprobación de Balance No. 2 para aumentar la cantidad de obra en el proyecto.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar).*

Tema	Resumen
1.	La revisión de la documentación correspondiente al segundo Balance de del proyecto, en el cual se presentó un restante de recursos y materiales, por lo que se propuso un aumento en la cantidad de obra a realizar.
2.	

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	De acuerdo a la evaluación realizada a la situación mencionada, se decidió construir 20 ML de obra adicionales, destinando de la manera más idónea el uso de este material.
2.	

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: YENSY GALINDEZ
Cargo: Presidente JAC

Nombre: CARLOS ANDRES CHAVARRO
Cargo: Director Interventoría

Nombre: RUBER GIOVANI GUAMANGA
Cargo: Presidente veeduría ciudadana

Nombre: IVAN SANDOVAL CARDOZO
Cargo: Interventoría

Nombre: DUVAN SAID GUTIERREZ
Cargo: Ing. Residente JAC

Nombre: ALBENIZ ARMIDA FORERO
Cargo: Tesorero JAC

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | INVIAS

BALANCE DE OBRA N2

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (Km)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN	FECHA DE BALANCE N1	FECHA DE BALANCE N2	LONGITUD DE LA PLACA HUELLA	ANCHO PLACA HUELLA
HUILA	SAN AGUSTIN	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PRADERA	3.50	HUILA	11/07/2023	6/06/2024	20/09/2024	155.00	4.50

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

					CONDICIONES CONTRACTUALES				MODIFICACIONES N1				MODIFICACIONES N2				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2013	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																		
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																		
1.0	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	120.00	$ 63,146.00	$ 7,577,520.00		120.00	$ 63,146.00	7,577,520.00		120.00	$ 63,146.00	7,577,520.00	120.00	7,577,520.00
							SUB-TOTAL	**$ 7,577,520.00**				**$ 7,577,520.00**				**$ 7,577,520.00**		**$ 7,577,520.00**
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																		
2.0	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1.40	$ 177,008.00	$ 247,811.00		1.40	$ 177,008.00	247,811.00		1.40	$ 177,008.00	247,811.00	1.40	247,811.00
							SUB-TOTAL	**$ 247,811.00**				**$ 247,811.00**				**$ 247,811.00**		**$ 247,811.00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																		
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA																		
3.0	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5.00	$ 24,149.00	$ 120,697.00		3.95	$ 24,149.00	95,389.00		4.5	$ 24,149.00	108,671.00	4.50	108,671.00
4.0	310.10	320-13		Conformación de la calzada existente	M2			$ -		688.50	$ 1,422.00	979,047.00		790.50	$ 1,422.00	1,124,091.00	790.50	1,124,091.00
5.0	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	130.43	$ 122,135.00	$ 15,930,373.00		102.50	$ 151,814.00	15,561,314.00		117.690291	$ 136,216.00	16,031,301.00	117.69	16,031,301.00
6.0	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	90.12	$ 818,075.00	$ 73,722,465.00		94.19	$ 876,618.00	82,568,649.00		101.11	$ 777,272.00	78,589,972.00	101.11	78,589,972.00
7.0	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	39.66	$ 351,044.00	$ 13,921,563.00		17.35	$ 370,876.00	6,434,699.00		19.83	$ 341,820.00	6,778,291.00	19.83	6,778,291.00
8.0	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4,188.15	$ 7,004.00	$ 29,333,807.00		3903.35	$ 7,017.00	27,389,807.00		4457.63	$ 6,819.00	30,396,579.00	4457.63	30,396,579.00
							SUB-TOTAL	**$ 133,028,905.00**				**$ 133,028,905.00**				**$ 133,028,905.00**		**$ 133,028,905.00**
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$ 140,854,236.00**				**$ 140,854,236.00**				**$ 140,854,236.00**		**$ 140,854,236.00**
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	**$ 4,225,627.00**				**$ 4,225,627.00**				**$ 4,225,627.00**		**$ 4,225,627.00**
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 41,813,457.00**				**$ 41,813,457.00**				**$ 41,813,457.00**		**$ 41,813,457.00**
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	**$ 186,893,320.00**				**$ 186,893,320.00**				**$ 186,893,320.00**		**$ 186,893,320.00**

Elaboro:
DUVAN SAID GUTIERREZ
MP. 25202-315117 CND
Cargo: Residente de Obra JAC

Revisó:
CARLOS ANDRES CHAVARRO
MP: 25202-190958 CND
Cargo: RL. R&C Interventoría

Aprobó:
WILDER ORLEY SALAZAR
Cargo: Supervisor

ESTRECHO OBANDO

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 006	Regional INVIAS: Huila	Fecha: 07/09/2024

Vereda – Municipio - Departamento: Estrecho Obando – San Agustín - Huila
No. Convenio(s) Solidario(s): 4818 de 2023 – Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ESTRECHO OBANDO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Ejecutor(es): JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ESTRECHO OBANDO

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
JOSE DEMETERIO ANACONA BOLAÑOS	JAC ESTRECHO OBANDO	PRESIDENTE
TITO MUÑOZ ORDOÑEZ	JAC ESTRECHO OBANDO	TESORERO
LUIS FERNEY ANACONA BOLAÑOS	VEEDURIA	VEEDOR
RAMIRO ANDRES RINCÓN	JAC ESTRECHO OBANDO	ING RESIDENTE OBRA
CARLOS ANDRES CHAVARRO	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA
IVAN SANDOVAL CARDOZO	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Revisión y aprobación del segundo balance del proyecto ajustado a las condiciones de la ejecución.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Revisión y aprobación de Balance No. 2 para aumentar la cantidad de obra en el proyecto.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar).*

Tema	Resumen
1.	La revisión de la documentación correspondiente al segundo Balance de del proyecto, en el cual se presentó un restante de recursos y materiales, por lo que se propuso un aumento en la cantidad de obra a realizar.
2.	

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	De acuerdo a la evaluación realizada a la situación mencionada, se decidió construir 17.5 ML de obra adicionales, destinando de la manera más idónea el uso de este material.
2.	

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución


PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación


FIRMAS DE ASISTENTES:



Nombre: **JOSE DEMETERIO ANACONA BOLAÑOS**
Cargo: Presidente JAC




Nombre: **CARLOS ANDRES CHAVARRO**
Cargo: Interventoría




Nombre: **LUIS FERNEY** ANACONA BOLAÑOS
Cargo: Presidente veeduría ciudadana



Nombre: **IVAN SANDOVAL CARDOZO**
Cargo: Interventoría



Nombre: **RAMIRO ANDRES RINCÓN**
Cargo: Ing. Residente JAC



Nombre: **TITO MUÑOZ ORDOÑEZ**
Cargo: Tesorero JAC

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL — INVIAS

BALANCE DE OBRA N2

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ESTRECHO OBANDO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (Km)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN		FECHA BALANCE N2	LONGITUD (M)	ANCHO (M)
HUILA	SAN AGUSTIN	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA OBANDO	3.50	HUILA	1/08/2024		16/09/2024	101.50	6.00

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

					CONDICIONES CONTRACTUALES				BALANCE N1			BALANCE N2			CONDICIONES ACTUALIZADAS		
No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2013	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																	
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																	
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	36.00	$ 63,146.00	$ 2,273,256.00	36.00	$ 65,771.00	$ 2,367,756.00	36.00	$ 65,771.00	$ 2,367,756.00	36.00	$ 65,771.00	$ 2,367,756.00
							SUB-TOTAL	**$ 2,273,256.00**			**$ 2,367,756.00**			**$ 2,367,756.00**			**$ 2,367,756.00**
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																	
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1.40	$ 177,008.00	$ 247,811.00	1.40	$ 179,633.00	$ 251,486.00	1.40	$ 179,633.00	$ 251,486.00	1.40	$ 179,633.00	$ 251,486.00
							SUB-TOTAL	**$ 247,811.00**			**$ 251,486.00**			**$ 251,486.00**			**$ 251,486.00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO, ANCHO 6 M																	
P'RELIMINARES																	
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	112.84	$ 24,149.00	$ 2,725,036.00	106.67	$ 24,149.00	$ 2,576,012.00	130.45	$ 24,149.00	$ 3,150,184.00	130.45	$ 24,149.00	$ 3,150,184.00
4	310.1P	310.00		Conformación de la calzada existente	M2	504.00	$ 1,355.00	$ 682,920.00	498.00	$ 1,355.00	$ 674,790.00	609.00	$ 1,355.00	$ 825,195.00	609.00	$ 1,355.00	$ 825,195.00
5	320.3.1			Suministro, extendida y compactación de material de subbase granular Clase C. (Estructura del pavimento y reemplazo de subrasante)	M3				79.45	$ 169,952.00	$ 13,502,012.00	96.88	$ 135,343.00	$ 13,111,966.00	96.88	$ 135,343.00	$ 13,111,966.00
6	630.1.4.1	630-13		Pavimento concreto hidráulico MR 40	M3	107.96	$ 1,161,218.00	$ 125,361,379.00	102.59	$ 1,013,192.00	$ 103,941,341.00	125.45400	$ 824,112.00	$ 103,388,147.00	125.45	$ 824,112.00	$ 103,388,147.00
	672.4			Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; incluye la preparación de la superficie de apoyo	M	168.00	$ 42,187.80	$ 7,087,551.00	0.00	$ -	$ -	0.00	$ -	$ -	0.00	$ -	$ -
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) PAV y Bordillo	KG	583.70	$ 7,004.00	$ 4,088,200.00	1358.53	$ 7,004.00	$ 9,515,128.00	1639.3440000	$ 6,545.00	$ 10,729,506.00	1639.34400	$ 6,545.00	$ 10,729,506.00
8				Construcción bordillo en concreto 21 MPa 0.40 m x 0.15 m	M				166.00	$ 58,058.00	$ 9,637,628.00	203.00	$ 42,571.00	$ 8,641,913.00	203.00	$ 42,571.00	$ 8,641,913.00
							SUB-TOTAL	**$ 139,945,086.00**			**$ 139,846,911.00**			**$ 139,846,911.00**			**$ 139,846,911.00**
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$ 142,466,153.00**			**$ 142,466,153.00**			**$ 142,466,153.00**			**$ 142,466,153.00**
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	**$ 4,273,985.00**			**$ 4,273,985.00**			**$ 4,273,985.00**			**$ 4,273,985.00**
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 41,819,905.00**			**$ 41,819,905.00**			**$ 41,819,905.00**			**$ 41,819,905.00**
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	**$ 188,560,043.00**			**$ 188,560,043.00**			**$ 188,560,043.00**			**$ 188,560,043.00**

Elaboro:
RAMIRO ANDRES RINCON
MP. 19202-152709 CAU
Cargo: Residente de Obra JAC

Revisó:
CARLOS ANDRES CHAVARRO
MP: 25202-190958 CND
Cargo: RL. R&C Interventoría

Aprobó:
WILDER ORLEY SALAZAR
Cargo: Supervisor

ANEXO 11:

INFORME DE PROFESIONALES, TOPOGRAFIA Y ESPECIALISTA DE INTERVENTORIA MES DE SEPTIEMBRE

ANEXO 12:

INFORME AMBIENTAL, SOCIAL Y SISO MES DE ENERO

ANEXO 13:
REGISTRO FOTOGRÁFICO

ASOJUNTA

	
Visita de campo Verificación de obras	Visita de campo Verificación de obras
	
Visita de campo Verificación de obras	Visita de campo Verificación de obras

ESTRECHO OBANDO

	
Visita de campo Verificación de obras	Visita de campo Verificación de obras
	
Visita de campo Verificación de obras	Visita de campo Verificación de obras
