AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

LISTA DE CHEQUEO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PAGOS

112-ECP-FR-213-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	112 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500047

PAGOS	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A
ACUERDO INCORPORACIÓN RECURSOS AL PRESUPUESTO (Municipio o Entidad)	-	N/A
PLAN DE COBROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO (Aplica en el primer pago)	112-ECP-FR-105	N/A
PLAN DE INVERSIÓN Y AUTORIZACIÓN PAGO ANTICIPO CONVENIO	112-ECP-FR-219	N/A
ACTA DE PAGO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	112-ECP-FR-106	SI
FACTURA O CUENTA DE COBRO	-	SI
CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA (Vigencia 30 Dias)	-	SI
INFORME SUPERVISOR ENTIDAD (Con los soportes indicados en la Minuta)	-	SI
INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	112-ECP-FR-092	SI
INFORME DE SUPERVISIÓN CPS	112-ECP-FR-067	N/A
ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO (Elabora el Contratista)	130-GFI-FR-017	SI

NOTAS

*TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA Y A COLOR, SERÁN RADICADOS ÚNICAMENTE POR EL SUPERVISOR A LA GERENCIA DONDE DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y CARGADOS A LAS PLATAFORMAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD .

*LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AQUI ESTABLECIDOS.

***ANEXAR PANTALLAZO DEL CARGUE A SECOP Y CARGUE A SIGA**

OBSERVACIONES

Firma
Nombre: ROSBEY ALIRIO AGUDELO BOBADILLA
SUPERVISOR ENTIDAD
N° Matrícula Profesional: 25202 - 149645 CND

Firma
Nombre: LUZ NELLY MONZON DIAZ
SUPERVISOR AIM
N° Matrícula Profesional: A 25700 - 52133

Firma
Nombre: NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERON
APOYO A LA SUPERVISIÓN
N° Matrícula Profesional: 25202 - 356838 CND

V°B°
Nombre:
REVISÓ

Firma
Nombre: ANGELLY XAMIRA CHEEDIAK
RESPONSABLE DE ARCHIVO

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA PAGO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

112-ECP-FR-106-V04
09/09/2024

CONVENIO N°	112 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500047

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL CALVARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$ 185.308.728,82
ENTIDAD O INSTITUCIÓN:	MUNICIPIO DE EL CALVARIO
NIT o PERSONERIA JURIDICA:	892.099.001-1
REPRESENTANTE LEGAL:	HÉCTOR YESID RINCÓN VELASQUEZ
CORREO ELECTRONICO:	alcaldia@elcalvario-meta.gov.co
SUPERVISOR ENTIDAD:	ROSBEY ALIRIO AGUDELO BOBADILLA
CORREO ELECTRONICO:	secretariadegobiernoyplaneacion@elcalvario-meta.gov.co
SUPERVISOR AIM:	LUZ NELLY MONZÓN DIAZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	BRYAM STIBEN VALDERRAMA REYES (04/07/2024 – 15/11/2024) NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERON (23/10/2024 – 26/12/2024)
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	159 DE 2024 380 DE 2024
CORREO ELECTRONICO:	Ndaza54@hotmail.com

VIGENCIA					
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	5	Meses		Días	
FECHA DE INICIACIÓN:	12/07/2024				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/12/2024				

1. REGISTRO PRESUPUESTAL

Los registros presupuestales que amparan el convenio y los ajustes causados son los siguientes:

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
285	17/06/2024	1003-2.3.24.2402.0600.002.2.3.2.02.02.005-23	$ 185.308.728,82

2. ORDEN DE PAGO REALIZADOS:

Orden de pago realizada al convenio se presenta a continuación:

ACTA N°	% EJECUCION	EGRESO N°	FECHA	VALOR ACTA PARCIAL
1	50,00%	1321	11/09/2024	$ 92.654.364,41

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA PAGO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

112-ECP-FR-106-V04
09/09/2024

CONVENIO N°	112 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500047

3. BALANCE GENERAL

El balance del convenio se presenta a continuación:

BALANCE GENERAL DEL CONVENIO N° 140 DE 2024					
ACTA DE PAGO	CONCEPTO	VR. BASE	VR. AMORTIZACIÓN	VR. NETO A PAGAR	VR. ACUMULADO
ACTA No 1	PRIMER DESEMBOLSO	$ 92.654.364,41	$ 0,00	$ 92.654.364,41	$ 92.654.364,41
PRESENTE ACTA	SEGUNDO DESEMBOLSO	$ 92.654.364,41	$ 0,00	$ 92.654.364,41	$ 185.308.728,82

En Villavicencio; a los 10 días del mes de diciembre de 2024; se reunieron HÉCTOR YESID RINCÓN VELASQUEZ como Representante Legal del municipio de El Calvario, ROSBEY ALIRIO AGUDELO BOBADILLA como Supervisor del conveniente, LUZ NELLY MONZÓN DIAZ como Supervisor AIM, NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERÓN como Apoyo a la Supervisión; con el fin de dejar constancia de los requisitos establecidos, para el segundo pago del convenio Interadministrativo N° 112 de 2024 de acuerdo con la Cláusula tercera establecida en la minuta del convenio anteriormente mencionado. De igual manera, la supervisión AIM certifica que el conveniente HÉCTOR YESID RINCÓN VELASQUEZ como Representante Legal de municipio de El Calvario identificado con NIT 892.099.001-1 cumplió con la cláusula tercera forma de entrega.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día martes, 10 de diciembre de 2024.

(Firma)
Nombre: Héctor Yesid Rincón Velasquez
REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD

(Firma)
Nombre: Rosbey Alirio Agudelo Bobadilla
SUPERVISOR ENTIDAD
N° Matrícula Profesional: 25202 - 149645 CND

(Firma)
Nombre: Luz Nelly Monzón Diaz
SUPERVISOR AIM
N° Matrícula Profesional: A 25700 - 52133

(Firma)
Nombre: Nicolas Alberto Daza Calderón
APOYO A LA SUPERVISIÓN
N° Matrícula Profesional: 25202 - 356838 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
095be120182d04c8384e442a55fbd354bd596911964b35c265ba3a32d2fd5339ba0cde1d550203180e379627c57d5bac

Número de Factura: FE-6
Fecha de Emisión: 10/12/2024
Fecha de Vencimiento: 09/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MUNICIPIO DE EL CALVARIO
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE EL CALVARIO
Nit del Emisor: 892099001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8412

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: El Calvario
Dirección: ED PALACIO MUNICIPAL CL 6 N 5 12
Teléfono / Móvil: 3134413274
Correo: secretariafinanciera@elcalvario-meta.gov.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META- AIM
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900220547
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CCL 15 40 01 CC PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 P 8
Teléfono / Móvil: 3114711803
Correo: efactura@aim-meta.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	003	segundo pago de convenio 112 DE 2024 proyecto 2024005500047	NIU	1,00	$ 92.654.364,41	$ 0,00	$ 0,00					$ 92.654.364,41

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
10/12/2024 19:56:22
Documento validado por la DIAN:
10/12/2024 19:56:22
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	92654364.41
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	92654364.41
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	92654364.41
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 92654364.41

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	92.654.364,41
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	92.654.364,41
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	92.654.364,41
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $92.654.364,41

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764077412554 Rango desde: 3 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-08-19

247
~~118~~

Banco de Bogotá | Cambiando Contigo

GERENCIA BANCA OFICIAL META - 1533

INFORMA:

Que EL **MUNICIPIO DE EL CALVARIO-**, Identificado con Nit **892.099.001-1**, está vinculado con el BANCO DE BOGOTA titular de la cuenta de ahorros número **364898643** denominada MUNICIPIO DE EL CALVARIO – CONVENIO AIM 112 DE 2024, abierta desde el 14 de agosto de 2024, la cual se encuentra activa y vigente a la fecha.

Se expide en la ciudad de Villavicencio, a los catorce (14) días del mes de agosto de 2024, a solicitud del interesado.

Cordialmente,

Mary Luz Rojas Gamboa
Gerente Banca Oficial Meta
Vicepresidencia Banca de Empresas
Carrera 31 38-41
Villavicencio • Colombia
317 3832757
mroja41@bancodebogota.com.co

A.I.M.
SUBGECORP.
RAD N° 1401
FECHA: 11 DIC 2024
06:00p

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

AIM

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 112 DE 2024



INFORME PARA PAGO

23 de Agosto al 10 de Diciembre de 2024

1. INTRODUCCIÓN

Las vías son sin duda es uno de los componentes más importantes en el desarrollo de nuestro Municipio

Se definen como las arterias por las que late la economía ya que es por medio de estas que se vinculan los productores con los mercados, los trabajadores con los trabajos, los estudiantes en sus internados y los enfermos con los hospitales, las carreteras son vitales para cualquier programa de desarrollo".

El presente informe presenta el avance y los resultados preliminares de la ejecución del Convenio Interadministrativo No 112 de 2024, suscrito entre la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM) y el municipio de El Calvario, Meta. Este convenio, que comenzó formalmente con la firma del Acta de Inicio el 12 de julio de 2024, busca mejorar, rehabilitar y mantener las vías estratégicas del municipio, con el objetivo de fortalecer la conectividad y garantizar condiciones óptimas para el tránsito vehicular.

El Acta de Inicio fue firmada por Héctor Yesid Rincón Velásquez, alcalde del municipio de El Calvario; Rosbey Alirio Agudelo Bobadilla, secretario de Gobierno, Planeación e Infraestructura del municipio de El Calvario; Luz Nelly Monzón Díaz, supervisora por parte de la AIM; y Bryan Steben Valderrama Reyes, como apoyo a la supervisión.

La administración municipal ha presentado un total de cuatro informes, el primer informe de avance del 12 al 31 de julio y un informe para pago correspondiente al 50% según cláusula del convenio con fecha de corte al 22 de agosto del 2024, un informe correspondiente al mes de septiembre, un informe del mes de octubre de 2024 y el informe del mes de noviembre.

Este documento detalla las actividades desarrolladas del 12 de julio al 10 de diciembre de 2024, los recursos empleados, el estado actual de las obras, y los desafíos enfrentados durante la ejecución del convenio, con el fin de dar cumplimiento a la totalidad de la ejecución del convenio en referencia

2. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONVENIO.

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL CALVARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	Ciento Ochenta y cinco Millones Trescientos Ocho Mil Setecientos Ochenta y Dos Pesos con Ochenta y dos Centavos M/Cte. ($185.308.728,82)
ENTIDAD O INSTITUCION:	ALCALDIA DE EL CALVARIO META
NIT O PERSONERIA	892.099.001-1
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR YESID RINCON VELASQUEZ
CORREO ELECTRONICO:	alcaldia@elcalvario-meta.gov.co
SUPERVISOR DE LA ENTIDAD:	ROSBEY ALIRIO AGUDELO BOBADILLA
CORREO ELECTRONICO:	secretariadegobiernoyplaneacion@elcalvario-
SUPERVISOR AIM:	Luz Nelly Monzón Díaz
APOYO A LA SUPERVISION:	Bryan Steven Valderrama Reyes
ACTA DE INICIO	12 de julio de 2024
ACTA MODIFICATORIA	

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Las actividades objeto del convenio interadministrativo de No. 112 de 2024, se desarrollaron en el mantenimiento de la malla vial del municipio de El calvario; vías que se encuentra a lo largo del territorio municipal





4. EJECUCIÓN DEL CONVENIO

4.1. ALCANCE DEL CONVENIO

Inicialmente el convenio estableció la ejecución de 38.6 Kilómetros de vía

ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR DE OBRA
CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACION)	KM	38.60	$4.800.744,27	$ **185,308,728,82**

El día 17 de mayo de 2024, el municipio de El Calvario declaró la calamidad pública mediante el Decreto No. 100.15.11, debido a la ola invernal que afecta la región. Desde esa fecha, el banco de maquinaria del municipio ha estado dedicado a la remoción de derrumbes a lo largo de los 38.6 kilómetros de vías. Tras la firma del Acta de Inicio del Convenio, la maquinaria del municipio ha realizado actividades de remoción de derrumbes

Por lo anterior, la administración municipal se encuentra elaborando los estudios previos para la realización de un objeto contractual que permita realizar los mantenimientos correctivos y preventivos necesarios para el correcto funcionamiento del kit de maquinaria de la administración municipal.

4.2. Ejecución de actividades

SECTOR	COORDENADAS		DISTANCIA (KM)	Periodo: 12-07 al 31-08-2024		Periodo: 01-09 al 30-09-2024		Periodo: 01-10 al 31-10-2024		Periodo: 01-11 al 10-12-2024	
	INICIAL	FINAL		KM EJECUTADO	% AVANCE	KM EJECUTADO	% AVANCE	KM EJECUTADO	% AVANCE	KM EJECUTADO	% AVANCE
El Calvario-Santa María	Latitud: 4°21'28.68"N Longitud: 73°43'1.29"O	Latitud: 4°23'47.96"N Longitud: 73°42'12.06"O	10	0	0%	8	80%	8	80%	2	20%

El Calvario-San Bernardo	Latitud: 4°21'7.80"N Longitud: 73°42'49.90"O	Latitud: 4°20'19.05"N Longitud: 73°45'50.14"O	11,25	11,25	100%	11,25	100%	11,25	100%	11,25	100%
San Bernardo-San Francisco	Latitud: 4°20'19.05"N Longitud: 73°45'49.87"O	Latitud: 4°22'43.71"N Longitud: 73°45'32.55"O	6,6	5,35	81%	6,60	100%	6,60	100%	6,60	100%
El Calvario-Lourdes	Latitud: 4°21'7.80"N Longitud: 73°42'49.90"O	Latitud: 4°21'33.24"N Longitud: 73°42'19.98"O	2	0	0%	2	100%	2	100%	2	100%
San Francisco - Alto de El Cristo	Latitud: 4°22'43.71"N Longitud: 73°45'32.55"O	Latitud: 4°22'51.55"N Longitud: 73°47'41.82"O	8,75	0	0%	0	0%	0	0%	8,75	100%
TOTAL			**38,6**	**16,60**	**43,01%**	**27,85**	**72,16%**	**27,85**	**72,16%**	**38,6**	**100,00 %**

Para lo descrito anteriormente se anexa actas de ejecución de obra con sus respectivas memorias de cálculo de los meses relacionados.

4.3 EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

La ejecución financiera del convenio está respaldada con el registro presupuestal No 285 de 2024 por valor de ciento ochenta y cinco millones trescientos ocho mil setecientos veintiocho pesos moneda legal colombiana ($ 185.308.728.82) expedido por la dirección de presupuesto del AIM.

Para el manejo de los recursos la administración municipal de El calvario abrirá cuenta de ahorros en entidad financiera con sede en la ciudad de Villavicencio. Cuenta que se utilizara exclusivamente para el manejo de los recursos asignados por el AIM para la ejecución del convenio 112 de 2024.

El día 4 de julio de 2024 se expide decreto N. 100.15.22 Por medio del cual se realiza una modificación (adición recursos transferencias de capital - cofinanciación

Departamental), al Decreto de liquidación al presupuesto de la actual vigencia fiscal 2024

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS		
Dependencia: 01 - ADMINISTRACION CENTRAL		
Cuenta	Nombre	Apropiación
2	Gastos	185.308.728,82
24	Sector: Transporte	185.308.728,82
24.02	Programa: Infraestructura Red Vial Regional	185.308.728,82
24.02.0600	Subprograma: Intersubsectorial Transporte	185.308.728,82
24.02.0600.096	Producto: Via Terciaria Atendida Por Emergencia	185.308.728,82
24.02.0600.096-01-2024502450016-1.3.1.1.07	Proyecto: Mejoramiento De La Infraestructural Vial En El Municipio De El Calvario Meta - 1.3.1.1.07 Transferencias De Capital De Otras Entidades Del Gobierno General	185.308.728,82

DATOS AVANCE FINANCIERO			
Valor Convenio Inicial			$185.308.728,82
Valor Adición			$0
Anticipo 50%			$92.654.364,41
Valor Obra Ejecutada Mes 1			$79.692.354,88
Valor Obra Ejecutada Mes 2			$23.763.684,14
Valor Obra Ejecutada Mes 3			$ 25.683.981,84
Valor Obra Ejecutada Mes 4			$57.608.931,24
VALOR ACUMULADO EJECUTADO			$185.308.728,82
OBRA EJECUTADA ACUMULADA		**OBRA POR EJECUTAR**	
Valor	%	Valor	%
$185.308.728,82	100	0	0

4.4 SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La administración municipal al 10 de Diciembre de 2024 se encuentra a paz y salvo con las obligaciones de seguridad social y parafiscales a su cargo; por otra parte, los operadores de la maquinaria también se encuentran al día con el pago de seguridad social y parafiscales como independientes.

Para lo anterior se anexa certificación expedida por la contadora del municipio.

4.5 CONTRATOS DERIVADOS

A continuación se presenta la información de los contratos derivados del convenio 112 de 2024 hasta la fecha.

4.5.1 CONTRATO DE SUMINISTRO C101.40.13.02.04 DE 2024

CONTRATO DE SUMINISTRO C101.40.13.02.04 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL CALVARIO-META y ESTACION DE SERVICIO QUETAME LAS PALMAS CON NIT. 3140137 , REPRESENTADA LEGALMENTE POR, GENARO CRUZ VELASQUEZ, CON CEDULA DE CIUDADANÍA 3140137 DE QUETAME-CUNDINAMARCA.	
CONTRATANTE	***NOMBRE*** ***MUNICIPIO DE EL CALVARIO*** ***NIT*** ***892 099 001 - 1***
CONTRATISTA	**CONTRATISTA y ESTACION DE SERVICIO QUETAME LAS PALMAS** **NIT 3140137** **R/L GENARO CRUZ VELASQUEZ** **CC 3140137 DE QUETAME-CUNDINAMARCA** **EMAIL** cruzvelasquezg@gmail.com
OBJETO	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE KIT DE MAQUINARIA AMARILLA Y DOS (2) VOLQUETAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL UTILIZADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 112 DE 2024.**
VALOR CONTRATO	**TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($36.372.210,00) M/CTE.**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	***CDP 107 de 24 de JULIO de 2024****, con los* ***Rubros*** 24.02.0600.096-2024502450016-01-1.3.1.1.07, Proyecto: Mejoramiento De La Infraestructural Vial En El Municipio De El Calvario Meta - -Convenio Interadministrativo No.112-2024 - Aunar Esfuerzos Para El Mantenimiento De Las Vías - 1.3.1.1.07 Transferencias De Capital De Otras Entidades Del Gobierno General. valor :. **TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS** ($ 36.374.741,00) **M/CTE** expedido por la secretaria administrativa y financiera del Municipio de El Calvario Meta
PLAZO DE EJECUCIÓN	SESENTA **(60) DIAS CALENDARIOS**
FECHAS DE SUSCRIPCIÓN	**12 DE AGOSTO DE 2024**
FECHA DE INICIO	**12 DE AGOSTO DE 2024**
FECHA DE TERMINACIÓN	**11 DE OCTUBRE DE 2024**
ACTA DE LIQUIDACIÓN	**11 DE OCTUBRE DE 2024**

El suministro de combustible para el kit de maquinaria amarilla y 2 volquetas del municipio de El Calvario fue Trasportado desde el vecino municipio de Quetame-Cundinamarca, el trasporte de combustible estuvo a cargo del mismo municipio por medio de sus volquetas.

Debido a las condiciones de cierre de la via que duraron durante un periodo de tres meses aproximadamente, este combustible tuvo que ser trasbordado en los diferentes deslizamientos.

A continuación se presenta la relación de combustible recibido por el municipio

CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	COMP. INGRESO ALMACÉN
890	$ 11.123,00	$ 9.899.470,00	100.04.25.01.06
840	$ 11.123,00	$ 9.343.320,00	100.04.25.01.07
835	$ 11.123,00	$ 9.287.705,00	100.04.25.01.09
705	$ 11.123,00	$ 7.841.715,00	100.04.25.01.10
TOTAL		**$ 36.372.210,00**	

Evidencias fotográficas

Cargue de combustible, estación de servicio



Trasbordo de contenedores con combustible



4.5.2 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 101.40.13.03.28 DE 2024.

CONTRATO NUMERO	No. 101.40.13.03.28 DE 2024.
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ENTIDAD CONTRATANTE NIT:	MUNICIPIO EL CALVARIO META - 892099001-1
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA MAQUINARIA AMARILLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE EL CALVARIO EL CUAL ESTA DESTINADO A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 112 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL CALVARIO Y LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META (AIM)
CONTRATISTA:	MV SERVICIOS S.A.S. NIT: 901.525.219-8 R/L MARIO ANDRÉS VÉLEZ COLORADO 86086388 de Villavicencio
PLAZO INICIAL	UN (01) MES
VALOR:	CIENTO CATORCE MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 00/100 ($114,126,593.00) M/CTE
SUPERVISOR:	ING. ROSBEY ALIRIO AGUDELO BOBADILLA SECRETARIO DE PLANEACIÓN
FECHA DE INICIO	CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	TRECE (13) DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA ACTA MODIFICATORIA NO. 1	18 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR CONTRATO SEGÚN ACTA MODIFICATORIA	CIENTO CATORCE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($ 114.118.593,00) M/CTE.
ACTA DE RECIBO FINAL	10 DE DICIEMBRE DE 2024

Dentro de las actividades objeto del contrato se encuentra el mantenimiento correctivo y preventivo del kit de maquinaria del municipio, el cual cuenta con una retroexcavadora marca CASE 590 SUPER N, un Vibro compactador, dos volquetas y un bulldozer, a los cuales se les debía hacer una mantenimiento y cambio de algunos elementos indispensables para el correcto funcionamiento, entre ellos se encuentra el cambio de filtros, de aceite, cambio de llantas entre otros.

A continuación se relaciona el listado de actividades actualizadas por medio del acta modificatoria realizada el día 18 de noviembre de 2024.

CONDICIONES CONTRATADAS		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
No	**DESCRIPCIÓN**	**CANT.**	**V.TOTAL**
1	**REPUESTOS**		
	VOLQUETA INTERNACIONAL MD 2019		
	FILTRO COMBUSTIBLE FS19551	3,00	$ 690.525,00
	FILTRO COMBUSTIBLE FF5632	3,00	$ 434.775,00
	FILTRO AIRE 2602212C1	2,00	$ 1.424.350,00
	FILTRO HIDRAULICO 921999	3,00	$ 163.680,00
	FILTRO UREA AS2474	2,00	$ 136.400,00
	FILTRO AGUA AW2010SP	1,00	$ 59.675,00
	FILTRO ACEITE MOTOR LF3970	3,00	$ 230.175,00
	ACEITE MOTOR CANECA 55 GL	-	$ -
	UREA LITROS	120,00	$ 1.140.000,00
	ACEITE HIDRAULICO CANECA 55 GL	-	$ -
	LLANTA 12R22.5 TRAC	2,00	$ 5.115.000,00
	LLANTA 12R22.5 DIR	2,00	$ 5.456.000,00
INP-01	RIN 22.5 EN HIERRO	-	$ -
	TOTAL REPUETOS VOLQUETA INTERNACIONAL MD 2019		**$ 14.850.580,00**
	VOLQUETA INTERNACIONAL MD 1995		
	FILTRO COMBUSTIBLE 1822588C1	3,00	$ 627.750,00
	FILTRO AIRE SFA1596	2,00	$ 1.395.000,00
	FILTRO AGUA AW2010SP	2,00	$ 108.500,00
	FILTRO ACEITE MOTOR	3,00	$ 209.250,00
	LLANTA 12R22.5 TRAC	-	$ -
	LLANTA 12R22.5 DIR	-	$ -
	TOTAL REPUETOS VOLQUETA INTERNACIONAL MD 1995	-	**$ 2.340.500,00**
	RETROEXCAVADORA CASE 590 SUPER N		
	FILTRO COMBUSTIBLE BF7954-D	3,00	$ 696.721,20
	FILTRO COMBUSTIBLE RACOR 500 F	3,00	$ 363.989,34
	FILTRO AIRE 84217229	2,00	$ 392.319,66
	FILTRO COMBUSTIBLE BF7922	2,00	$ 1.216.180,00
	FILTRO HIDRAULICO 84475948	2,00	$ 1.222.844,00
	FILTRO HIDRAULICO 47833556	2,00	$ 419.414,00
	FILTRO ACEITE MOTOR 84228488	3,00	$ 416.078,49
	LLANTAS TRACERAS	2,00	$ 14.366.950,00
	LLANTAS DELANTERAS	2,00	$ 8.740.000,00

	INYECTORES DE RETROEXCAVAODRA 590SN	4,00	$	9.996.480,00
	TOTAL REPUETOS RETROEXCAVADORA CASE 590 SUPER N		**$**	**37.830.976,69**
	BULLDOZER CASE 1150M			
	FILTRO COMBUSTIBLE 84412164	3,00	$	482.856,00
	FILTRO AIRE 87682990	2,00	$	1.425.498,36
	FILTRO COMBUSTIBLE 84273566	3,00	$	429.362,76
	FILTRO HIDRAULICO 47833564	2,00	$	1.613.859,30
	FILTRO ACEITE MOTOR 84228488	3,00	$	548.504,43
	TURBOCARGADOR PARA CASE BULLDOZER SERIE MJLC105722	1,00	$	10.587.264,00
	SELENOIDES DE SISTEMA HIDRRAULICO	2,00	$	9.968.000,00
	TOTAL REPUETOS CASE 1150M		**$**	**25.055.344,85**
	VIBRO CASE SV208			
	FILTRO COMBUSTIBLE FS19805	2,00	$	327.865,30
	FILTRO AIRE P777638	2,00	$	241.087,00
	FILTRO COMBUSTIBLE RACOR 500FG	2,00		139.450,40
	FILTRO COMBUSTIBLE FF5638	2,00	$	165.900,92
	FILTRO HIDRAULICO P165332	2,00	$	278.900,80
	FILTRO ACEITE MOTOR 84475542	2,00	$	282.037,00
	TOTAL REPUETOS VIBRO CASE SV208		**$**	**1.435.241,42**
2	**GRASAS Y LUBRICANTES**			
	ACEITE MOTOR CANECA 55 GL	1,00	$	6.001.600,00
	ACEITE HIDRAULICO CANECA 55 GL	1,00	$	5.234.350,00
ITEM NO PREVISTO	GRASA PARA RODAMIENTOS CANEC 55 GL	1,00	$	4.500.000,00
	TOTAL GRASAS Y LUBRICANTES		**$**	**15.735.950,00**
	1. TOTAL Y REPUESTOS Y LUBRICANTES		**$**	**97.248.593,00**
	2. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y MECANICA			
	VOLQUETA INTERNACIONAL MD 2019			
	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1,00	$	180.000,00
	DESMOTAJE E INTALACION DE MUELLES DELANTEROS	-	$	-
	ADAPTACION DE MUELLES DE BALLESTAS DELANTEROS	2,00	$	8.380.000,00
	TOTAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MECANICA VOLQUETA INTERNACIONAL MD 2019		**$**	**8.560.000,00**
	VOLQUETA INTERNACIONAL MD 1995			
	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1,00	$	180.000,00
	DESMONTE Y MONTAJE DE LLANTAS	-	$	-
	VOTOTAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MECANICA LQUETA INTERNACIONAL MD 1995		**$**	**180.000,00**
	RETROEXCAVADORA CASE 590 SUPER N			
	CAMBIO DE INYECTORIES (INSTALACION Y PUESTA A PUNTO)	1,00	$	2.800.000,00
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR	1,00	$	1.400.000,00

	DESMONTE Y MONTAJE DE LLANTAS	4,00	$	800.000,00
	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1,00	$	250.000,00
	TOTAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MECANICA RETROEXCAVADORA CASE 590 SUPER N		**$**	**5.250.000,00**
	BULLDOZER CASE 1150M			
	CAMBIO Y PUESTA A PUNTO DE TURBO CARGADOR	1,00	$	2.100.000,00
	CAMBIO Y PUESTA A PUNTO DE SELENOIDES	1,00	$	600.000,00
	TOTAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MECANICA BULLDOZER CASE 1150M		**$**	**2.700.000,00**
	VIBRO CASE SV208			
	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1,00	$	180.000,00
	TOTAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MECANICA VIBRO CASE SV208		**$**	**180.000,00**
	2. TOTAL SERVICIO DE MANTENIMINTO Y MECANICA			$16.870.000,00
	TOTAL REPUESTOS Y LYBRICANTES +SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MECANICA (1+2)			$114.118.593,00

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Cambio de Inyectores, instalación de filtros y mantenimiento de Retroexcavadora CASE 590 SUPER N



Filtros retroexcavadora CASE 590 SUPER N





Llantas Retroexcavadora CASE 590 SUPER N










www.elcalvario-meta.gov.co
alcaldia@elcalvario-meta.gov.co
Código postal 501041 El Calvario Meta
Celular 3134413274

	MUNICIPIO DE EL CALVARIO META NIT 892-099-001-1 *SECRETARIA DE GOBIERNO, PLANEACION E INFRAESTRUCTURA*			
	CODIGO	**VERSIÓN**	**FECHA**	**PÁGINA**
	101	01	21/11/2013	**16 de 21**

Mantenimiento y cambio de filtros de Bulldozer Marca CASE 1150M





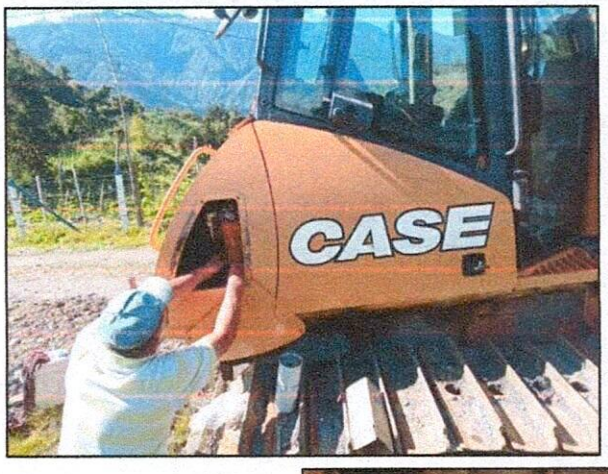






MUNICIPIO DE EL CALVARIO META NIT 892-099-001-1 *SECRETARIA DE GOBIERNO, PLANEACION E INFRAESTRUCTURA*			
CODIGO	**VERSIÓN**	**FECHA**	**PÁGINA**
101	01	21/11/2013	**17** de **21**

Mantenimiento, instalación de Filtros y Llantas de VOLQUETA INTERNACIONAL MD 2019

Filtros Nuevos



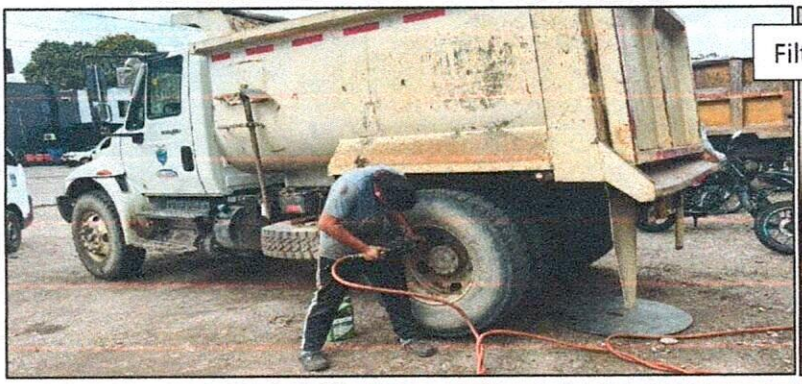

Filtros viejos







Mantenimiento, instalación de Filtros VOLQUETA INTERNACIONAL MD 1995




4.5.3 CONTRATO DE COMPRAVENTA 101.40.13.10.06 DE 2024.

CONTRATO NUMERO	No. 101.40.13.10.06 DE 2024.
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA
ENTIDAD CONTRATANTE NIT:	MUNICIPIO EL CALVARIO META - 892099001-1
OBJETO:	COMPRAVENTA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE KIT DE MAQUINARIA AMARILLA Y DOS (2) VOLQUETAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL UTILIZADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 112 DE 2024.
CONTRATISTA:	GRUPO CALDERON SAS EN REORGANIZACIÓN Nit 900327307 R/L LUIS ALEJANDRO CALDERON LAVERDE CC: 80016148
PLAZO INICIAL	QUINCE (15) DIAS
VALOR:	TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($34.807.394,00) M/CTE
SUPERVISOR:	ING. ROSBEY ALIRIO AGUDELO BOBADILLA
FECHA DE INICIO	TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	CATORCE (14) DE DICIEMBRE DEL 2024
ACTA DE RECIBO FINAL	10 DE DICIEMBRE DE 2024

En el marco del convenio interadministrativo 112 de 2024, suscrito entre el municipio de El Calvario y la Agencia de Infraestructura del Meta AIM, se realizo un contrato de compraventa de combustible (ACPM) para el kit de maquinaria del municipio, en este contrato se realizó lo siguiente;

No.	DESCRIPCION ACTIVIDADES DEL OBJETO CONTRACTUAL	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE COMBUSTIBLE PARA MOTORES (ACPM)	GALON	2300	$15.133,6495	$ 34.807.394,00
TOTAL APROXIMADO AL PESO					$ 34.807.394,00

A continuación, se presenta evidencia fotográfica.

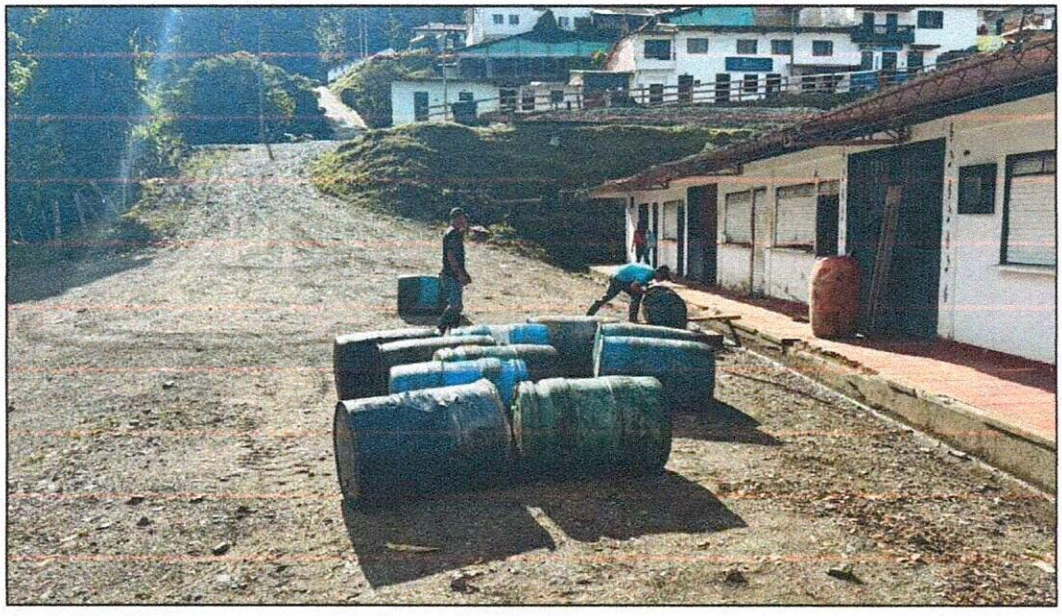



5. Conclusiones

Como resultado de la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 112 de 2024, se logró intervenir y mejorar 38,6 kilómetros de vías terciarias en el municipio de El Calvario, lo cual representa un avance significativo en términos de conectividad y movilidad para las comunidades rurales. Estas obras no solo facilitan el acceso a bienes y servicios esenciales, sino que también impulsan el desarrollo económico local, al mejorar las condiciones para el transporte de productos agrícolas y ganaderos, pilares fundamentales de la economía del municipio. Además, estas intervenciones han contribuido directamente al bienestar de los habitantes, al reducir tiempos de desplazamiento y aumentar la seguridad vial.

Paralelamente, se efectuó un mantenimiento preventivo y correctivo integral al kit de maquinaria amarilla del municipio. Estas labores, que incluyeron la reparación de averías, el suministro de insumos y el ajuste de componentes clave, garantizaron la operatividad continua de los equipos. Esto no solo asegura su disponibilidad para futuras intervenciones en infraestructura vial, sino que también prolonga su vida útil, optimizando el uso de los recursos del municipio.

ROSBEY ALIRIO AGUDELO BOBADILLA

Secretario De Gobierno Planeación e Infraestructura

Municipio De El Calvario - Meta

SECRETARIA DE GOBIENRNO PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

EL CALVARIO - META

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS PERIODO 1 Y 2

CONVENIO No	112 DE 2024	**VALOR INICIAL**	$ 185.308.728,82
OBJETO CONTRATO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMINETO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL CALVARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL**	CINCO (5) MES
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	12 DE JULIO DE 2024|
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE EL CALVARIO - 892.099.001-1	**FECHA DE INICIO:**	12 DE JULIO DE 2024|
		FECHA DE TERMINACIÓN:	11 DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR ALCALDIA	ROSBEY ALIRIO AGUDELO BOBADILLA	**PERIODO DE CORTE**	12/07/2024 A 30/08/2024
SUPERVISOR AIM	LUZ NELLY MONZON DIAZ- A-27500-52133	**FECHA DE PRESENTE ACTA**	N/A

CONDICIONES CONVENIDAS									AVANCE 12/07/2024 A 30/08/2024		VALOR ACOMULADO	
No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	PRECIO VLR UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
1	1,1	11060101,	11060101-P	CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE(INCLUYE ESCARIFICAR PERFILAER ESTENDER CUNETEAR RIEGO Y COMPACTACION	KM	38,60	$ 4.800.744,27	$ 185.308.728,82	16,60	$ 79.692.354,88	16,60	$ 79.692.354,88
							VALOR COSTO DIRECTO	**$ 185.308.728,82**		**$ 79.692.354,88**		**$ 79.692.354,88**

DATOS AVANCE FINANCIERO		
VALOR CONTRATO INICIAL:	$	185.308.728,82
ADICIÓN:	$	-
ANTICIPO 50%	$	92.654.364,41
VALOR OBRA EJECUTADA MES 1	$	79.692.354,88
VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$	79.692.354,88
VALOR OBRA POR EJECUTAR	$	105.616.373,94
% DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA		43,01%

Firma:
Nombre:MUNICIPIO DE EL CALVARIO
ROSBEY ALIRIO AGUDELO BOBADILLA
SUPERVISOR

Firma:
Nombre:MUNICIPIO DE EL CALVARIO
HECTOR YESID RINCON VELASQUEZ
ALCALDE EL CALVARIO

Firma:
Nombre: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
LUZ NELLY MONZON DIAZ
SUPERVISORA-AIM

Firma:
Nombre: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
BRYAM STIBEN VALDERRAMA
APOYO A LA SUPERVISORA-AIM

SECRETARIA DE GOBIENRNO PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

EL CALVARIO - META

DEPARTAMENTO DEL META

MEMORIAS DE CALCULO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMINETO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL CALVARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA DE	MUNICIPIO DE EL CALVARIO - 892.099.001-1
SUPERVISOR ALCALDIA	ROSBEY ALIRIO AGUDELO BOBADILLA
SUPERVISOR AIM	LUZ NELLY MONZON DIAZ- A-27500-52133

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS PERIODO 1 Y 2

DESCRIPCIÓN	CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE(INCLUYE ESCARIFICAR PERFILAER		
ÍTEM	1	**VALOR UNITARIO**	$ 185.308.728,82
UNIDAD	KM		

ESQUEMA

conformacion limpieza de cunetas, estendido de material y compactacion en el tramo San Bernardo centro poblado de San Francisco desde el K0+000 hasta el K5+535






conformacin de via se realiza adicion de material para estabilizar diferentes puntos de tramo comprendido entre el casco urbano del municipio y el cruce de San Bernardo






TRAMO	KILOMETRO INICIAL	KILOMETRO FINAL	LONGITU	MEDIDA TOTAL
El Calvario- San Bernardo	K,0	K11,25	11,25	11,25
San Bernardo- San Francisco	K,0	K5,35	5,35	5,35
SUB TOTAL				16,60
VIENEN				0,00
TOTAL				16,60





Nombre:MUNICIPIO DE EL CALVARIO
ROSBEY ALIRIO AGUDELO BOBADILLA
SUPERVISOR

Nombre: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
LUZ NELLY MONZON DIAZ
SUPERVISORA-AIM

SECRETARIA DE GOBIENRNO PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

EL CALVARIO - META

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS PERIODO 3 Y 4

CONVENIO No	112 DE 2024	**VALOR INICIAL**	$ 185.308.728,82
OBJETO CONTRATO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMINETO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL CALVARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	CINCO (5) MES
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	12 DE JULIO DE 2024
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE EL CALVARIO - 892.099.001-1	**FECHA DE INICIO:**	12 DE JULIO DE 2024
		FECHA DE TERMINACIÓN:	11 DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR ALCALDIA	ROSBEY ALIRIO AGUDELO BOBADILLA	**PERIODO DE CORTE**	01/09/2024 A 31/10/2024
SUPERVISOR AIM	LUZ NELLY MONZON DIAZ- A-27500-52133	**FECHA DE PRESENTE ACTA**	2/10/2024

CONDICIONES CONVENIDAS									AVANCE 12/07/2024 A 31/08/2024		AVANCE PRESENTE ACTA		VALOR ACOMULADO	
No	**ITEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIONES**		**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT.**	**PRECIO VLR UNITARIO**	**V. TOTAL**	**CANT.**	**V.TOTAL**	**CANT.**	**V.TOTAL**	**CANT.**	**V.TOTAL**
		GENERAL	**PARTICULAR**											
1	1,1	11060101,	11060101-P	CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE(INCLUYE ESCARIFICAR PERFILAER ESTENDER CUNETEAR RIEGO Y COMPACTACION	KM	38,60	$ 4.800.744,27	$ 185.308.728,82	16,60	$ 79.692.354,88	11,25	$ 54.008.373,04	27,85	$ 133.700.727,92
							VALOR COSTO DIRECTO	**$ 185.308.728,82**		**$ 79.692.354,88**		**$ 54.008.373,04**		**$ 133.700.727,92**

DATOS AVANCE FINANCIERO		
VALOR CONTRATO INICIAL:	$	185.308.728,82
ADICIÓN:	$	-
ANTICIPO 50%	$	92.654.364,41
VALOR OBRA EJECUTADA MES 1	$	79.692.354,88
VALOR OBRA EJECUTADA MES 2	$	54.008.373,04
VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$	133.700.727,92
VALOR OBRA POR EJECUTAR	$	51.608.000,90
% DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA		72,16%

Firma:
Nombre:MUNICIPIO DE EL CALVARIO
ROSBEY ALIRIO AGUDELO BOBADILLA
SUPERVISOR

Firma:
Nombre:MUNICIPIO DE EL CALVARIO
HECTOR YESID RINCON VELASQUEZ
ALCALDE EL CALVARIO

Firma:
Nombre: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
LUZ NELLY MONZON DIAZ
SUPERVISORA AIM

Firma:
Nombre: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
BRYAM STIBEN VALDERRAMA
APOYO A LA SUPERVISORA-AIM

SECRETARIA DE GOBIENRNO PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

EL CALVARIO - META

DEPARTAMENTO DEL META

MEMORIAS DE CALCULO


OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMINETO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL CALVARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	**ACTA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS PERIODO 3 Y 4**			
CONTRATISTA DE	MUNICIPIO DE EL CALVARIO - 892.099.001-1	**DESCRIPCIÓN**	CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE(INCLUYE ESCARIFICAR PERFILAER		
SUPERVISOR ALCALDIA	ROSBEY ALIRIO AGUDELO BOBADILLA	**ÍTEM**	1	**VALOR UNITARIO**	**$ 185.308.728,82**
SUPERVISOR AIM	LUZ NELLY MONZON DIAZ- A-27500-52133	**UNIDAD**	KM		

ESQUEMA

TRAMO	KILOMETRO INICIAL	KILOMETRO FINAL	LONGITU	MEDIDA TOTAL
El Calvario- Lourdes	K,0	K2,0	2,00	2,00
San Bernardo - San Francisco	K5,35	K6,6	1,25	1,25
El Calvario- Santa María	K,0	K8,0	8,00	8,00
SUB TOTAL				11,25
VIENEN PERIODO 1 Y 2				16,60
TOTAL				27,85

conformacion limpieza de cunetas, estendido de material y compactacion en el tramo El Calvario- Lourdes l K0+000 hasta el K2+000






conformacion limpieza de cunetas, estendido de material y compactacion en el tramo San Bernardo- San Francisco K5+350 hasta el k6+600








SECRETARIA DE GOBIENRNO PLANEACION E INFRAESTRUCTURA


EL CALVARIO - META


DEPARTAMENTO DEL META

MEMORIAS DE CALCULO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMINETO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL CALVARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	**ACTA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS PERIODO 3 Y 4**			
CONTRATISTA DE	MUNICIPIO DE EL CALVARIO - 892.099.001-1	**DESCRIPCIÓN**	CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE(INCLUYE ESCARIFICAR PERFILAER		
SUPERVISOR ALCALDIA	ROSBEY ALIRIO AGUDELO BOBADILLA	**ÍTEM**	1	**VALOR UNITARIO**	**$ 185.308.728,82**
SUPERVISOR AIM	LUZ NELLY MONZON DIAZ- A-27500-52133	**UNIDAD**	KM		

conformacion de via se realiza adicion de maerial de prestamo para estabilizar diferentes puntos de tramo comprendido entre el casco urbano del municipio y la vereda Santa Maria K0+000 hasta el K 8+000








Nombre:MUNICIPIO DE EL CALVARIO
ROSBEY ALIRIO AGUDELO BOBADILLA
SUPERVISOR

Nombre: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
LUZ NELLY MONZON DIAZ
SUPERVISORA-AIM

	SECRETARIA DE GOBIENRNO PLANEACION E INFRAESTRUCTURA **EL CALVARIO - META** **ACTA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS PERIODO 5 Y 6**	

CONVENIO No	112 DE 2024	**VALOR INICIAL**	$ 185.308.728,82
OBJETO CONTRATO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMINETO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL CALVARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	CINCO (5) MES
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	12 DE JULIO DE 2024|
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE EL CALVARIO - 892.099.001-1	**FECHA DE INICIO:**	12 DE JULIO DE 2024|
		FECHA DE TERMINACIÓN:	11 DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR ALCALDIA	ROSBEY ALIRIO AGUDELO BOBADILLA	**PERIODO DE CORTE**	01/11/2024 A 10/12/2024
SUPERVISOR AIM	LUZ NELLY MONZON DIAZ- A-27500-52133	**FECHA DE PRESENTE ACTA**	2/09/2024

CONDICIONES CONVENIDAS									**AVANCE 12/07/2024 A 31/10/2024**		**AVANCE PRESENTE ACTA**		**VAÑLOR ACOMULADO**	
No	**ITEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIONES**		**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT.**	**PRECIO VLR UNITARIO**	**V. TOTAL**	**CANT.**	**V.TOTAL**	**CANT.**	**V.TOTAL**	**CANT.**	**V.TOTAL**
		GENERAL	**PARTICULAR**											
1	1,1	11060101.	11060101-P	CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE(INCLUYE ESCARIFICAR PERFILAER ESTENDER CUNETEAR RIEGO Y COMPACTACION	KM	38,60	$ 4.800.744,27	$ 185.308.728,82	27,85	$ 133.700.727,92	10,75	$ 51.608.000,90	38,60	$ 185.308.728,82
							VALOR COSTO DIRECTO	**$ 185.308.728,82**		**$ 133.700.727,92**		**$ 51.608.000,90**		**$ 185.308.728,82**

DATOS AVANCE FINANCIERO		
VALOR CONTRATO INICIAL:	$	185.308.728,82
ADICIÓN:	$	-
ANTICIPO 50%	$	92.654.364,41
VALOR OBRA EJECUTADA MES 1, 2, 3 Y 4	$	133.700.727,92
VALOR OBRA EJECUTADA MES 5 Y 6	$	51.608.000,90
VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$	185.308.728,82
VALOR OBRA POR EJECUTAR	$	-
% DE OBRA EJECUTADA ACUMULADA		100,00%

Firma:
Nombre:MUNICIPIO DE EL CALVARIO
ROSBEY ALIRIO AGUDELO BOBADILLA
SUPERVISOR

Yesid Rincon V

Firma:
Nombre:MUNICIPIO DE EL CALVARIO
HECTOR YESID RINCON VELASQUEZ
ALCALDE EL CALVARIO

Firma:
Nombre: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
LUZ NELLY MONZON DIAZ
SUPERVISORA-AIM

Firma:
Nombre: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERON
APOYO A LA SUPERVISORA-AIM

SECRETARIA DE GOBIENRNO PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

EL CALVARIO - META

DEPARTAMENTO DEL META

MEMORIAS DE CALCULO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMINETO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL CALVARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	**ACTA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS PERIODO 5 Y 6**			
CONTRATISTA DE	MUNICIPIO DE EL CALVARIO - 892.099.001-1	**DESCRIPCIÓN**	CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE(INCLUYE ESCARIFICAR PERFILAER		
SUPERVISOR ALCALDIA	ROSBEY ALIRIO AGUDELO BOBADILLA	**ÍTEM**	1	**VALOR UNITARIO**	**$ 185.308.728,82**
SUPERVISOR AIM	LUZ NELLY MONZON DIAZ- A-27500-52133	**UNIDAD**	KM		

ESQUEMA

conformacion limpieza de cunetas, estendido de material y compactacion en el tramo El Calvario- Santa Maria K8+000 hasta el k10+000






conformacion de via se realiza adicion de maerial de prestamo para estabilizar diferentes puntos de tramo comprendido entre el San Francisco y el Alto del Cristo desde el k0+00 hasta k8+750





TRAMO	KILOMETRO INICIAL	KILOMETRO FINAL	LONGITU	MEDIDA TOTAL
El Calvario- Santa Maria	K8,0	K10,0	2,00	2,00
San Francisco- Alto de El Cristo	K,0	K8,75	8,75	8,75
SUB TOTAL				10,75
VIENEN PERIODO 1, 2, 3 Y 4				27,85
TOTAL				38,60





Nombre:MUNICIPIO DE EL CALVARIO
ROSBEY ALIRIO AGUDELO BOBADILLA
SUPERVISOR

Nombre: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
LUZ NELLY MONZON DIAZ
SUPERVISORA-AIM

	MUNICIPIO DE EL CALVARIO - META NIT 892-099-001-1 SECRETARIA DE GOBIERNO, PLANEACION E INFRAESTRUCTURA CONTRATACIÓN			
	CODIGO	VERSIÓN	FECHA	PÁGINA
	101	01	21/11/2013	Página 1 de 1

20. ACTA DE RECIBO	
CONTRATO DE SUMINISTRO 101.40.13.02.04 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL CALVARIO-META Y ESTACION DE SERVICIO QUETAME LAS PALMAS , R/L GENARO CRUZ VELASQUEZ	
CONTRATANTE	NOMBRE MUNICIPIO DE EL CALVARIO NIT 892-099-001-1
CONTRATISTA	CONTRATISTA y ESTACION DE SERVICIO QUETAME LAS PALMAS NIT 3140137 R/L GENARO CRUZ VELASQUEZ CC 3140137 DE QUETAME-CUNDINAMARCA DIR. MZ 1 B LT 1 BARRIO VILLA JOSEFA QUETAME CUNDINAMARCA CELULAR 3123080699 EMAIL cruzvelasquezg@gmail.com
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE KIT DE MAQUINARIA AMARILLA Y DOS (2) VOLQUETAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL UTILIZADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 112 DE 2024.
PLAZO	SESENTA(60) DIAS
VALOR	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($36.372.210,00) M/CTE.
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	***CDP 107 de 24 de JULIO de 2024***, *con los* ***Rubros*** 24.02.0600.096-2024502450016-01-1.3.1.1.07, Proyecto: Mejoramiento De La Infraestructural Vial En El Municipio De El Calvario Meta - -Convenio Interadministrativo No.112-2024 - Aunar Esfuerzos Para El Mantenimiento De Las Vías - 1.3.1.1.07 Transferencias De Capital De Otras Entidades Del Gobierno General. valor :. **TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS** ($ 36.374.741,00) **M/CTE** expedido por la secretaria administrativa y financiera del Municipio de El Calvario Meta
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIO	12 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	11 DE OCTUBRE DE 2024

	MUNICIPIO DE EL CALVARIO - META NIT 892-099-001-1 SECRETARIA DE GOBIERNO, PLANEACION E INFRAESTRUCTURA CONTRATACIÓN			
	CODIGO	**VERSIÓN**	**FECHA**	**PÁGINA**
	101	01	21/11/2013	Página 1 de 1

En el Municipio de El Calvario-Meta, a los once (11) días de OCTUBRE de 2024, se reunieron **ROSBEY ALIRIO AGUDELO BOBADILLA**, Secretario de Gobierno, Planeación e Infraestructura del Municipio de El Calvario - Meta y **ESTACION DE SERVICIO QUETAME LAS PALMAS, R/L GENARO CRUZ VELASQUEZ CC. 3.140.137 expedida en Quetame,** como Contratista del Contrato de suministro **101.40.13.02.04 de 2024** Con el propósito de recibir el objeto del citado contrato :

A la fecha se ha suministrado y entregado al municipio el **100 %** del presupuesto total.

A continuación, se discrimina la cantidad recibida a satisfacción por el municipio de El Calvario Meta y su correspondiente valor.

FECHA	GALONES ENTREGADOS	VALOR
13/08/2024	890	9.899.470
30/08/2024	840	9.343.320
15/09/2024	835	9.287.705
30/09/2024	705	7.841.715
	3270	36.372.210

El valor a pagar se realiza de acuerdo a la entrega del combustible del **100 %** del total del contrato por un valor de **TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOSM/CTE(36.372.210)**

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**	**36.372.210**
VALOR ADICIONES	**$**	**0,00**
VALOR ANTICIPO	**$**	**0,00**
VALOR ACTA	**$**	**36.372.210**
VALOR ACTA PARCIAL No. 2	**$**	**00**
VALOR POR EJECUTAR	**$**	**00**

Valor a pagar al contratista con la presente acta es de **TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOSM/CTE(36.372.210)**

	MUNICIPIO DE EL CALVARIO - META NIT 892-099-001-1 SECRETARIA DE GOBIERNO, PLANEACION E INFRAESTRUCTURA CONTRATACIÓN			
	CODIGO	**VERSIÓN**	**FECHA**	**PÁGINA**
	101	01	21/11/2013	Página 1 de 1

En constancia se firma por los que en ella intervinieron:

ROSBEY ALIRIO AGUDELO BOBADILLA
Supervisor

GENARO CRUZ VELASQUEZ
Contratista.

Proyecto Luz Nidia Novoa
Reviso: Rosbey Agudelo
Aprobó: Rosbey Agudelo

	MUNICIPIO DE EL CALVARIO META NIT 892-099-001-1 SECRETARIA DE GOBIERNO, PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA			
	CODIGO	VERSIÓN	FECHA	PÁGINA
	101	01	21/11/2013	1 de 5

20 ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO NO. 101.40.13.03.28 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL CALVARIO - MV SERVICIOS S.A.S. NIT: 901.525.219-8, R/L MARIO ANDRÉS VÉLEZ COLORADO	
CONTRATANTE	**NOMBRE** *MUNICIPIO DE EL CALVARIO* **NIT** *892 099 001 - 1*
CONTRATISTA	**MV SERVICIOS S.A.S.** **NIT: 901.525.219-8** **R/L MARIO ANDRÉS VÉLEZ COLORADO** **86086388 de Villavicencio**
OBJETO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA MAQUINARIA AMARILLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE EL CALVARIO EL CUAL ESTA DESTINADO A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 112 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL CALVARIO Y LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META (AIM)**
VALOR INICIAL CONTRATO	**CIENTO CATORCE MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 00/100 ($114,126,593.00) M/CTE**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	CDP No. 151 del 21 de octubre de 2024, proyecto mejoramiento de la infraestructura vial en el m,unicipio de El Clavario Meta, rubro; 24.02.0600.096-2024502450016-01-1.3.1.1.07, Fuente 1.3.1.1.07 : 1.3.1.1.07 Trasferencia de capital de otras entidades del gobierno general.
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (01) MES
FECHA DE INICIO	CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA MODIFICATORIA	18 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CIENTO CATORCE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($ 114.118.593,00) M/CTE.
FECHA DE TERMINACIÓN	DIEZ (10) DE DICIEMBRE DEL 2024
En el Municipio de El Calvario-Meta, a los **DIEZ (10) DE DICIEMBRE DEL 2024**, se reunieron **ROSBEY ALIRIO AGUDELO BOBADILLA** Secretario de Gobierno, Planeación e Infraestructura del Municipio de El Calvario – Meta, en calidad de supervisor y **MV SERVICIOS S.A.S. NIT: 901.525.219-8, R/L MARIO ANDRÉS VÉLEZ COLORADO,** como Contratista del	

contrato C 101.40.13.03.28 DE 2024, con el propósito de dejar constancia por medio de la presente acta que se realizaron las actividades correspondientes al contrato en mención y se realizó entrega por parte del contratista la información correspondiente y el recibo por parte del municipio, del CONTRATO C 101.40.13.03.28 DE 2024.

Se verifico la realización de las actividades por parte de la supervisión, comprobando que las mismas cumplen con las condiciones del CONTRATO en referencia. Suscrito para el efecto; el contratista responsable hace entrega real y efectiva al representante del municipio de El Calvario- Meta, recibiendo a satisfacción las actividades ejecutadas en un 100% del CONTRATO.

El recibo a satisfacción por parte del municipio de El Calvario no releva al contratista y al supervisor de las acciones civiles o penales por sus hechos u omisiones en la actuación contractual en los términos de la constitución política y de la ley 80 de 1993 en los artículos 51,52 y 53.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONDICIONES CONTRATADAS		CANTIDADES RECIBIDAS	
No	DESCRIPCIÓN	CANT.	V.TOTAL
1	REPUESTOS		
	VOLQUETA INTERNACIONAL MD 2019		
	FILTRO COMBUSTIBLE FS19551	3,00	$ 690.525,00
	FILTRO COMBUSTIBLE FF5632	3,00	$ 434.775,00
	FILTRO AIRE 2602212C1	2,00	$ 1.424.350,00
	FILTRO HIDRAULICO 921999	3,00	$ 163.680,00
	FILTRO UREA AS2474	2,00	$ 136.400,00
	FILTRO AGUA AW2010SP	1,00	$ 59.675,00
	FILTRO ACEITE MOTOR LF3970	3,00	$ 230.175,00
	ACEITE MOTOR CANECA 55 GL	-	$ -
	UREA LITROS	120,00	$ 1.140.000,00
	ACEITE HIDRAULICO CANECA 55 GL	-	$ -
	LLANTA 12R22.5 TRAC	2,00	$ 5.115.000,00
	LLANTA 12R22.5 DIR	2,00	$ 5.456.000,00
INP-01	RIN 22.5 EN HIERRO	-	$ -
	TOTAL REPUETOS VOLQUETA INTERNACIONAL MD 2019		**$ 14.850.580,00**
	VOLQUETA INTERNACIONAL MD 1995		
	FILTRO COMBUSTIBLE 1822588C1	3,00	$ 627.750,00

	FILTRO AIRE SFA1596	2,00	$	1.395.000,00
	FILTRO AGUA AW2010SP	2,00	$	108.500,00
	FILTRO ACEITE MOTOR	3,00	$	209.250,00
	LLANTA 12R22.5 TRAC	-	$	-
	LLANTA 12R22.5 DIR	-	$	-
	TOTAL REPUETOS VOLQUETA INTERNACIONAL MD 1995	-	**$**	**2.340.500,00**
	RETROEXCAVADORA CASE 590 SUPER N			
	FILTRO COMBUSTIBLE BF7954-D	3,00	$	696.721,20
	FILTRO COMBUSTIBLE RACOR 500 F	3,00	$	363.989,34
	FILTRO AIRE 84217229	2,00	$	392.319,66
	FILTRO COMBUSTIBLE BF7922	2,00	$	1.216.180,00
	FILTRO HIDRAULICO 84475948	2,00	$	1.222.844,00
	FILTRO HIDRAULICO 47833556	2,00	$	419.414,00
	FILTRO ACEITE MOTOR 84228488	3,00	$	416.078,49
	LLANTAS TRACERAS	2,00	$	14.366.950,00
	LLANTAS DELANTERAS	2,00	$	8.740.000,00
	INYECTORES DE RETROEXCAVAODRA 590SN	4,00	$	9.996.480,00
	TOTAL REPUETOS RETROEXCAVADORA CASE 590 SUPER N		**$**	**37.830.976,69**
	BULLDOZER CASE 1150M			
	FILTRO COMBUSTIBLE 84412164	3,00	$	482.856,00
	FILTRO AIRE 87682990	2,00	$	1.425.498,36
	FILTRO COMBUSTIBLE 84273566	3,00	$	429.362,76
	FILTRO HIDRAULICO 47833564	2,00	$	1.613.859,30
	FILTRO ACEITE MOTOR 84228488	3,00	$	548.504,43
	TURBOCARGADOR PARA CASE BULLDOZER SERIE MJLC105722	1,00	$	10.587.264,00
	SELENOIDES DE SISTEMA HIDRRAULICO	2,00	$	9.968.000,00
	TOTAL REPUETOS CASE 1150M		**$**	**25.055.344,85**
	VIBRO CASE SV208			
	FILTRO COMBUSTIBLE FS19805	2,00	$	327.865,30
	FILTRO AIRE P777638	2,00	$	241.087,00
	FILTRO COMBUSTIBLE RACOR 500FG	2,00		139.450,40
	FILTRO COMBUSTIBLE FF5638	2,00	$	165.900,92
	FILTRO HIDRAULICO P165332	2,00	$	278.900,80
	FILTRO ACEITE MOTOR 84475542	2,00	$	282.037,00
	TOTAL REPUETOS VIBRO CASE SV208		**$**	**1.435.241,42**
2	**GRASAS Y LUBRICANTES**			
	ACEITE MOTOR CANECA 55 GL	1,00	$	6.001.600,00

	ACEITE HIDRAULICO CANECA 55 GL	1,00	$	5.234.350,00
ITEM NO PREVISTO	GRASA PARA RODAMIENTOS CANEC 55 GL	1,00	$	4.500.000,00
	TOTAL GRASAS Y LUBRICANTES		**$**	**15.735.950,00**
	1. TOTAL Y REPUESTOS Y LUBRICANTES		**$**	**97.248.593,00**
	2. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y MECANICA			
	VOLQUETA INTERNACIONAL MD 2019			
	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1,00	$	180.000,00
	DESMOTAJE E INTALACION DE MUELLES DELANTEROS	-	$	-
	ADAPTACION DE MUELLES DE BALLESTAS DELANTEROS	2,00	$	8.380.000,00
	TOTAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MECANICA VOLQUETA INTERNACIONAL MD 2019		**$**	**8.560.000,00**
	VOLQUETA INTERNACIONAL MD 1995			
	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1,00	$	180.000,00
	DESMONTE Y MONTAJE DE LLANTAS	-	$	-
	VOTOTAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MECANICA LQUETA INTERNACIONAL MD 1995		**$**	**180.000,00**
	RETROEXCAVADORA CASE 590 SUPER N			
	CAMBIO DE INYECTORIES (INSTALACION Y PUESTA A PUNTO)	1,00	$	2.800.000,00
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR	1,00	$	1.400.000,00
	DESMONTE Y MONTAJE DE LLANTAS	4,00	$	800.000,00
	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1,00	$	250.000,00
	TOTAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MECANICA RETROEXCAVADORA CASE 590 SUPER N		**$**	**5.250.000,00**
	BULLDOZER CASE 1150M			
	CAMBIO Y PUESTA A PUNTO DE TURBO CARGADOR	1,00	$	2.100.000,00
	CAMBIO Y PUESTA A PUNTO DE SELENOIDES	1,00	$	600.000,00
	TOTAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MECANICA BULLDOZER CASE 1150M		**$**	**2.700.000,00**
	VIBRO CASE SV208			
	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1,00	$	180.000,00
	TOTAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MECANICA VIBRO CASE SV208		**$**	**180.000,00**
	2. TOTAL SERVICIO DE MANTENIMINTO Y MECANICA			$16.870.000,00
	TOTAL REPUESTOS Y LYBRICANTES +SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MECANICA (1+2)			$114.118.593,00

ESTADO FINANCIERO

DATOS AVANCE FINANCIERO			
Valor Inicial Contrato		$114.126.592.97	
Valor Adición		$0	
Pago Anticipado		$ 49.619.898,96	
Valor Presente Informe		$ 64.498.694,04	
Valor No Ejecutado		$8.000,00	
VALOR EJECUTADO		**VALOR NO EJECUTADO**	
Valor	%	Valor	%
$ 114.118.593,00	99,993	$ 8.000	0,007

El pago autorizado en la presente acta de recibo final del Contrato C101.40.13.03.28 DE 2024 es de **SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CUATRO CENTAVOS ($ 64.498.694,04)**

En constancia de lo anterior se firma a los diez (10) días de diciembre de 2024 quien en ella intervinieron.

ROSBEY ALIRIO AGUDELO BOBADILLA
Supervisor
Secretario de Gobierno, Planeación e Infraestructura

MARIO ANDRÉS VÉLEZ COLORADO
R/L MV SERVICIOS S.A.S.
Contratista

	MUNICIPIO DE EL CALVARIO META NIT 892-099-001-1 SECRETARIA DE GOBIERNO, PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA			
	CODIGO	VERSIÓN	FECHA	PÁGINA
	101	01	21/11/2013	1 de 3

20 ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO NO. C101.40.13.10.06 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL CALVARIO - LUIS ALEJANDRO CALDERÓN LAVERDE, CC: 80016148	
CONTRATANTE	**NOMBRE** *MUNICIPIO DE EL CALVARIO* **NIT** *892 099 001 - 1*
CONTRATISTA	**GRUPO CALDERÓN SAS EN REORGANIZACIÓN** **Nit 900327307** **R/L LUIS ALEJANDRO CALDERÓN LAVERDE** **CC: 80016148**
OBJETO	**COMPRAVENTA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE KIT DE MAQUINARIA AMARILLA Y DOS (2) VOLQUETAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL UTILIZADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 112 DE 2024.**
VALOR CONTRATO	**TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($34.807.394,00) M/CTE**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	**CDP . 174** de 22 de NOVIEMBRE de 2024, con los Rubros 24.02.0600.096-2024502450016-01-1.3.1.1.07, , Proyecto: Mejoramiento de la Infraestructural vial en el Municipio de El Calvario Meta - -convenio interadministrativo No.112-2024 - Aunar Esfuerzos Para El Mantenimiento De Las Vias - 1.3.1.1.07 Transferencias de capital de otras entidades del gobierno general. 1.3.1.1.07 : 1.3.1.1.07 Transferencias de capital de otras entidades del gobierno general.
PLAZO DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIO	TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	DIEZ (10) DE DICIEMBRE DEL 2024

En el Municipio de El Calvario-Meta, a los **DIEZ (10) DIAS DE DICIEMBRE DE 2024**, se reunieron **ROSBEY ALIRIO AGUDELO BOBADILLA**, secretario de gobierno, planeación e infraestructura de El Calvario – Meta, en calidad de supervisor y **LUIS ALEJANDRO CALDERÓN LAVERDE,** CC: 80016148, R/L **GRUPO CALDERÓN SAS EN REORGANIZACIÓN** como contratista del contrato C 101.40.13.10.06 DE 2024, con el propósito de dejar constancia por medio de la presente acta que se realizaron las actividades correspondientes al contrato en mención y se realizó entrega por parte del contratista la información correspondiente y el recibo por parte del municipio, del CONTRATO C 101.40.13.10.06 DE 2024.

Se verifico la realización de las actividades por parte de la supervisión, comprobando que las mismas cumplen con las condiciones del CONTRATO en referencia. Suscrito para el efecto; el contratista responsable hace entrega real y efectiva al representante del municipio de El Calvario- Meta, recibiendo a satisfacción las actividades ejecutadas en un 100% del CONTRATO.

El recibo a satisfacción por parte del municipio de El Calvario no releva al contratista y al supervisor de las acciones civiles o penales por sus hechos u omisiones en la actuación contractual en los términos de la constitución política y de la ley 80 de 1993 en los artículos 51,52 y 53.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEL OBJETO CONTRACTUAL	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE COMBUSTIBLE PARA MOTORES (ACPM)	GALÓN	2300	$15.133,6495	$ 34.807.394,00
TOTAL APROXIMADO AL PESO					$ 34.807.394,00

ESTADO FINANCIERO

VALORES INICIALES (VALOR DEL CONTRATO)	$ 34.807.394,00
+ ADICIONES	0
VALORES TOTALES	$ 34.807.394,00
TOTAL, PAGOS Y/O AMORTIZACIONES	0
VALOR ACTUAL A PAGAR	$ 34.807.394,00
SALDO POR EJECUTAR	0

El pago autorizado en la presente acta de recibo final del Contrato C101.40.13.10.06 DE 2024 es de **TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($34.807.394,00) M/CTE**

En constancia de lo anterior se firma a los DIEZ (10) días de DICIEMBRE de 2024 quien en ella intervinieron.

ROSBEY ALIRIO AGUDELO BOBADILLA
Supervisor
Secretario de gobierno, planeación e infraestructura

LUIS ALEJANDRO CALDERÓN LAVERDE
R/L GRUPO CALDERON SAS EN REORGANIZACION
Contratista

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

112-ECP-FR-092-V1
09/09/2024

INFORME PARCIAL N° 2

CONTRATO N°	112 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500047

Periodo de 27/08/2024 a 10/12/2024
Fecha de Presentación: 10/12/2024

INFORMACIÓN BÁSICA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	
OBJETO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL CALVARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:	$ 185.308.728,82
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	N/A
ENTIDAD O INSTITUCIÓN:	MUNICIPIO DE EL CALVARIO
NIT:	892.099.001-1
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR YESID RINCON VELASQUEZ
CORREO ELECTRÓNICO:	alcaldia@elcalvario-meta.gov.co
SUPERVISOR ENTIDAD:	ROSBEY ALIRIO AGUDELO BOBADILLA
CORREO ELECTRÓNICO:	secretariadegobiernoyplaneacion@elcalvario-meta.gov.co

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO				
FECHA DE INICIACIÓN:				12/07/2024
PRÓRROGA:				N/A
SUSPENSIÓN:				N/A
TIEMPO:				N/A
REINICIO:				N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:				11/12/2024
TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO:	**5**	**Meses**		**Días**

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE SUPERVISOR:	LUZ NELLY MONZÓN DIAZ
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	159 DE 2024 380 DE 2024
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN	BRYAM STIBEN VALDERRAMA REYES (04/07/2024 – 15/11/2024) NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERON (23/10/2024 – 26/12/2024)

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARCIAL N° 2

CONTRATO N°	112 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500047

AVANCE OBRA

N ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADO	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	CONFORMACIÓN DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACIÓN)	KM	$ 4.800.744,27	38,60 KM	38,60 KM	$ 185.308.728,82	$ 185.308.728,82
					COSTO TOTAL	$ 185.308.728,82	$ 185.308.728,82
					PORCENTAJE EJECUTADO	100,00 %	

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARCIAL N° 2

CONTRATO N°	112 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500047

A. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO DE OBRA

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°

ADICIÓN			
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
Acta modificatoria No. 1 del 23/08/2024	$ 185.308.728,82	La entidad municipal solicita el cambio del tramo 2, en el tramo final correspondiente a El Calvario – Alto De Sobretana con coordenadas de INICIO 4°21'7.80"N 73°42'49.90"O FINAL 4°18'10.16"N 73°46'42.34"O el cual contaba con una totalidad de 20,00 km, quedando el siguiente tramo el cual conduce de El Calvario – San Bernardo con coordenadas INICIO 4°21'7.80"N 73°42'49.90"O FINAL 4°20'19.05"N 73° 45' 50.14" O el cual queda con un total de 11,25 km. Por ende, la entidad solicita incluir un tramo No. 5 correspondiente a San Francisco – Alto De El Cristo con coordenadas de INICIO 4°22'43.71"N 73°45'32.55"O FINAL 73° 47' 41.82" O con un total de 8,75 km, con el fin de dar cumplimiento a la totalidad de Km establecidos en los estudios previos y considerando que los factores climáticos	105-108

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARCIAL N° 2

CONTRATO N°	112 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500047

		han ocasionado perdida de la banca y se hace difícil el acceso a los tramos establecidos en el estudio previo y posterior visita previa el día 12 de julio de 2024. De acuerdo con esto, se solicita a la agencia de la infraestructura del Meta considere realizar los cambios mencionados anteriormente. La arquitecta, LUZ NELLY MONZÓN DIAZ, en calidad de Supervisor del convenio interadministrativo por parte de la AIM atiende la solicitud mencionada por la entidad y de acuerdo con las complicaciones mencionadas en los tramos para la ejecución de las actividades contractuales, se aprueba el cambio en el tramo No. 2 correspondiente a El Calvario – Alto De Sobretana con coordenadas de INICIO 4°21'7.80"N 73°42'49.90"O FINAL 4°18'10.16"N 73°46'42.34"O, el cual tenía una longitud total de 20,00 Km, quedando como nuevo tramo No. 2 el siguiente El Calvario – San Bernardo con coordenadas de INICIO 4°21'7.80"N 73°42'49.90"O FINAL 4°20'19.05"N 73° 45' 50.14" O el cual queda con un total de 11,25 km. Como el tramo No. 2 es su inicio contaba con una longitud total de 20,00 km y en aras de cumplir con la totalidad de Km correspondientes a los estudios previos y presupuesto del convenio se aprueba la solicitud de la entidad municipal de agregar un tramo No. 5 el cual conduce de San Francisco – Alto De El Cristo con coordenadas INICIO 4°22'43.71"N 73°45'32.55"O FINAL 73° 47' 41.82" O con un total de 8,75 km.	

<Inserte los módulos que considere necesarios, según la cantidad de actos administrativos celebrados>

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARCIAL N° 2

CONTRATO N°	112 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500047

2. CONTRATOS DERIVADOS: <Describa las pólizas actualizadas de acuerdo con el último acto administrativo celebrado para el contrato de obra>

INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATOS DERIVADOS	
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO
ESTADO DEL PROCESO:	TERMINADO
CONTRATO No.:	101.40.13.02.04
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE KIT DE MAQUINARIA AMARILLA Y DOS (2) VOLQUETAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL UTILIZADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 112 DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 36.372.210,00
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	N/A
CONTRATISTA:	ESTACIÓN DE SERVICIO QUETAME LAS PALMAS
NIT DEL CONTRATISTA:	C.C.3.140.137 DE QUETAME-CUNDINAMARCA
REPRESENTANTE LEGAL:	GENARO CRUZ VELASQUEZ
FECHA DE ACTA DE INICIO:	12/08/2024
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	60 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 DE OCTUBRE DE 2024
OBSERVACIONES: EL CONTRATO SE ENCUENTRA TERMINADO	

INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATOS DERIVADOS	
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ESTADO DEL PROCESO:	TERMINADO
CONTRATO No.:	101.40.13.03.28
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA MAQUINARIA AMARILLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE EL CALVARIO EL CUAL ESTA DESTINADO A LA EJECUCIÓN DE EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 112 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL CALVARIO Y LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EL META (AIM)
VALOR DEL CONTRATO:	$ 114.118.593,00
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	N/A
CONTRATISTA:	MV SERVICIOS S.A.S
NIT DEL CONTRATISTA:	901525219-8

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARCIAL N° 2

CONTRATO N°	112 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500047

REPRESENTANTE LEGAL:	MARIO ANDRES VELEZ COLORADO C.C 86086388 DE VILLAVICENCIO
FECHA DE ACTA DE INICIO:	14/11/2024
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	1 MES
FECHA DE TERMINACIÓN:	10/12/2024
OBSERVACIONES: EL CONTRATO SE ENCUENTRA TERMINADO	

INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATOS DERIVADOS	
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA
ESTADO DEL PROCESO:	EN EJECUCIÓN
CONTRATO No.:	101.40.13.10.06
OBJETO DEL CONTRATO:	COMPRAVENTA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE KIT DE MAQUINARIA AMARILLA Y DOS (2) VOLQUETAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL UTILIZADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 112 DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 34.807.394,00
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	N/A
CONTRATISTA:	GRUPO CALDERÓN SAS EN REORGANIZACIÓN
NIT DEL CONTRATISTA:	900327307
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS ALEJANDRO CALDERÓN LAVERDE C.C 80016148
FECHA DE ACTA DE INICIO:	30/11/2024
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	15 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN:	10/12/2024
OBSERVACIONES: EL CONTRATO SE ENCUENTRA TERMINADO	

B. INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCIÓN	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
1	1321	11/09/2024	50,00 %	$ 92.654.364,41	$ 0,00	$0,00	$ 92.654.364,41
TOTALES			50,00 %	$ 92.654.364,41	$ 0,00	$0,00	$ 92.654.364,41

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARCIAL N° 2

CONTRATO N°	112 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500047

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: 27/08/2024 a 10/12/2024

Avance financiero programado 100,00% y avance financiero ejecutado 50,00%


C. AVANCE CONVENIO SOLIDARIO

1. AVANCE FÍSICO

MES	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
JULIO	12,67%	$23.478.615,95	12,67%	$23.478.615,95	0,00%	$0,00	0,00%	$0,00
AGOSTO	20,00%	$37.061.745,76	32,67%	$60.540.361,71	43,01%	$79.692.354,88	43,01%	$79.692.354,88
SEPTIEMBRE	20,00%	$37.061.745,76	52,67%	$97.602.107,47	29,15%	$54.008.373,04	72,16%	$133.700.727,92
OCTUBRE	20,00%	$37.061.745,76	72,67%	$134.663.853,23	0,00%	$ 0,00	72,16%	$133.700.727,92
NOVIEMBRE	20,00%	$37.061.745,76	92,67%	$171.725.598,99	22,27%	$ 41.286.400,72	94,43%	$174.987.128,64
DICIEMBRE	7,33%	$13.583.129,83	100,00%	$185.308.728,82	5,57%	$10.321.600,18	100,00%	$185.308.728,82

Avance físico programado 100,00% y avance físico ejecutado 100.00%

GRAFICA:

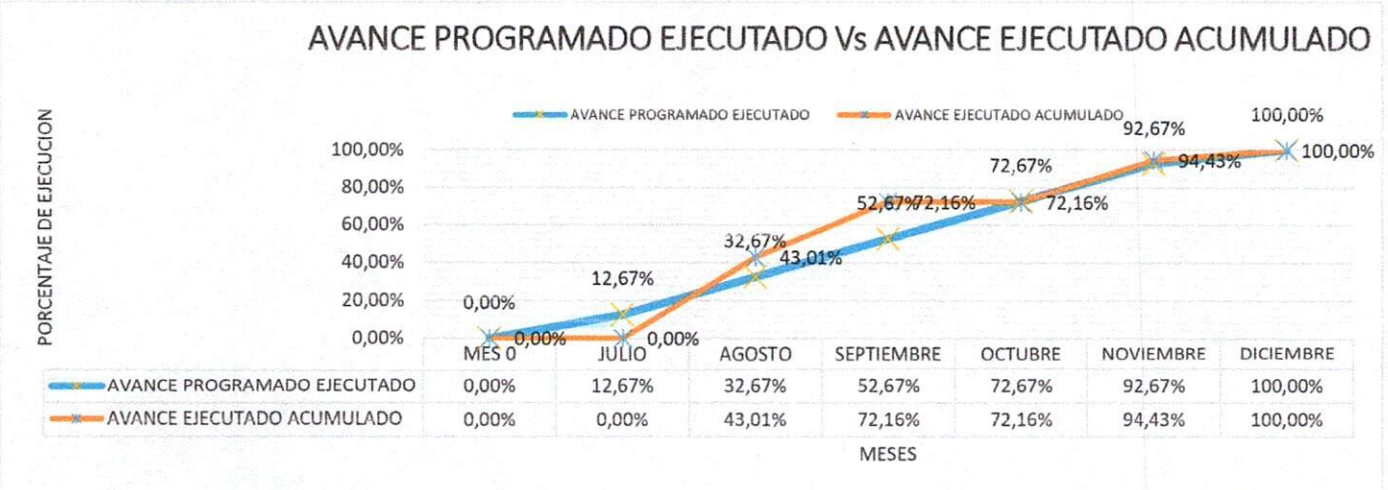

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARCIAL N° 2

CONTRATO N°	112 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500047


F. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	SEGUIMIENTO DE OBRA	EJECUTADO	%
1,1	CONFORMACIÓN DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACIÓN).	38,60 km	100,00%





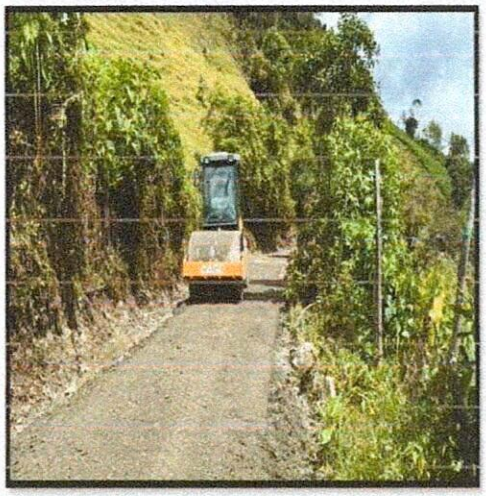




GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co


INFORME PARCIAL N° 2


CONTRATO N°	112 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500047

TRAMO No 3 CORRESPONDIENTE SAN BERNARDO - SAN FRANCISCO CON COORDENADAS INICIO 4°20'19.05" N 73°45'49.87"N FINAL 4°22'43.71"N 73°45'32.55"O, CANTIDAD EJECUTADA 6,60 KM DE 6,60 KM, EJECUTADA EN UN 100,00%

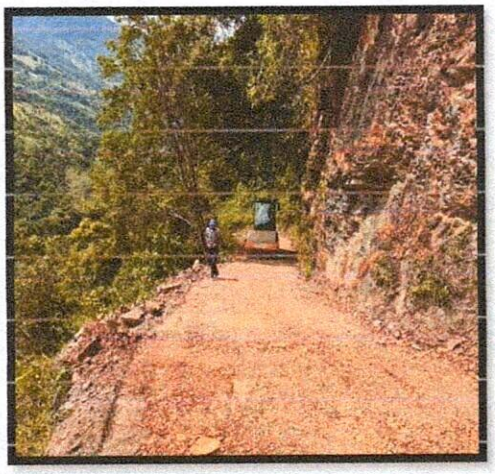



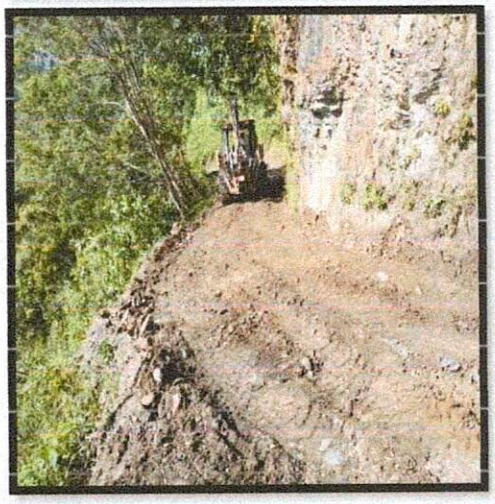

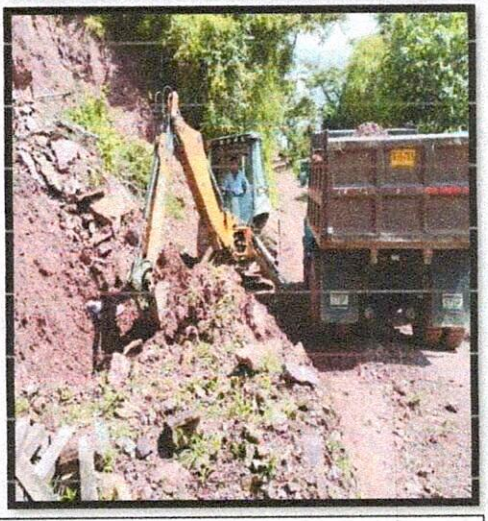



TRAMO No 1 CORRESPONDIENTE A EL CALVARIO – SANTA MARÍA CON COORDENADAS INICIO 4°21'28.68"N 73°43'1.29"O FINAL 4°23'47.96"N 73°42'12.06"O,
CANTIDAD EJECUTADA 10,00 KM DE 10,00 KM CONTRATADA LA CUAL ESTA EJECUTADA AL 100,00%.


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARCIAL N° 2

CONTRATO N°	112 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500047

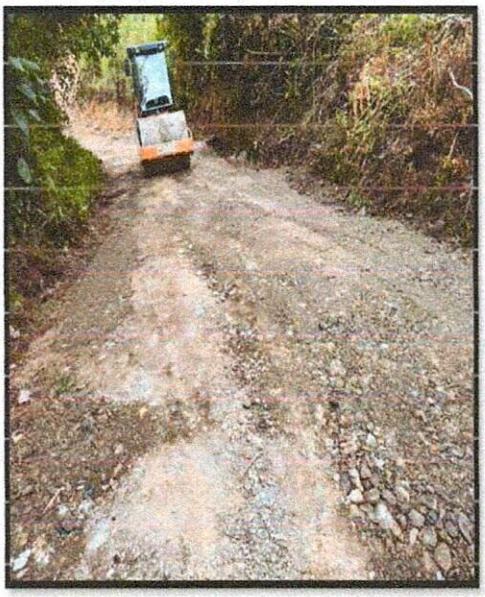

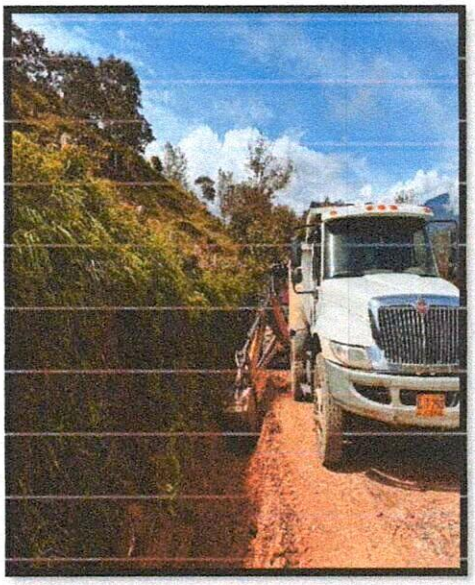

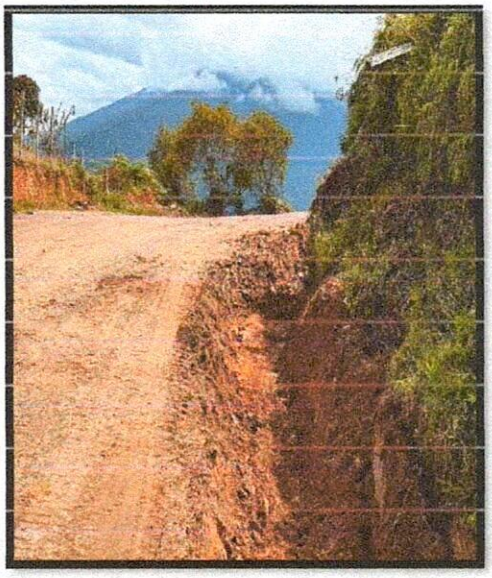





TRAMO No 4 CORRESPONDIENTE A EL CALVARIO – LOURDES CON COORDENADAS INICIO 4°21'7.80"N 73°42'49.90"O FINAL 4°21'33.24"N 73°42'19.98"O,
CANTIDAD EJECUTADA 2,00 KM DE 2,00 KM CONTRATADA LA CUAL ESTA EJECUTADA AL 100,00%.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARCIAL N° 2

CONTRATO N°	112 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500047

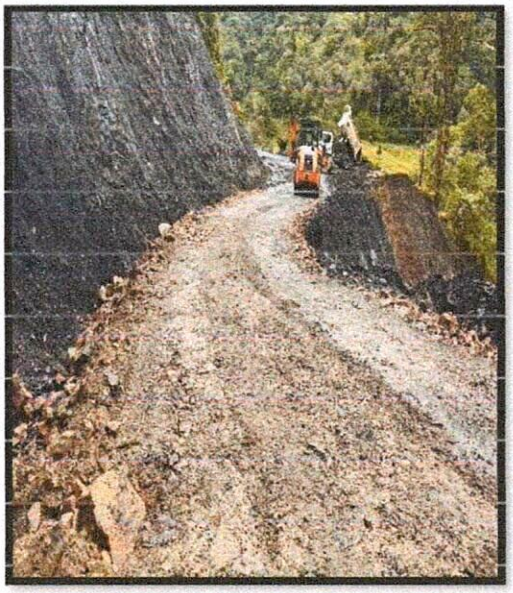

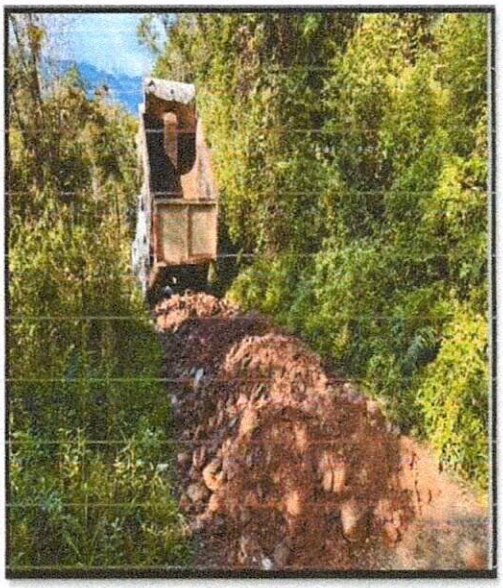





TRAMO No 2 CORRESPONDIENTE A EL CALVARIO – SAN BERNARDO CON COORDENADAS INICIO 4°21'7.80"N 73°42'49.90"O FINAL 4°20'19.05"N 73°45'50.14"O,
CANTIDAD EJECUTADA 11,25 KM DE 11,25 KM CONTRATADA LA CUAL ESTA EJECUTADA AL 100,00%.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARCIAL N° 2

CONTRATO N°	112 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500047









TRAMO No 5 CORRESPONDIENTE A SAN FRANCISCO – ALTO DEL CRISTO CON
COORDENADAS INICIO 4°22'43.71"N 73°45'32.55"O FINAL 4°22'51.55"N 73°47'41.82"O,
CANTIDAD EJECUTADA 8,75 KM DE 8,75 KM CONTRATADA LA CUAL ESTA EJECUTADA AL 100,00%.

OBSERVACIONES: Se realizo la actividad de CONFORMACIÓN DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACIÓN) al 100,00%, en los tramos relacionados anteriormente en el registro fotográfico y los cuales fueron relacionados en los estudios previos y posteriormente en el acta de modificatoria No 1 con fecha del 23/08/2024.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARCIAL N° 2

CONTRATO N°	112 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500047

G. COMENTARIOS, NOVEDADES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La entidad municipal realizo el proceso de contratación de mínima cuantía con número de proceso en la plataforma Secop IP 101.40.13.02.06, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE KIT DE MAQUINARIA AMARILLA Y DOS (2) VOLQUETAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL UTILIZADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 112 DE 2024" por valor de $ $ 36.374.741,00, la cual tiene suscripción de acta de inicio el día 12/08/2024, el cual finalizo el día 11/10/2024.

De igual forma la entidad realizo el proceso de prestación de servicios con numero de proceso en la plataforma secop IP 101.40.13.03.28, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA MAQUINARIA AMARILLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE EL CALVARIO EL CUAL ESTA DESTINADO A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 112 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL CALVARIO Y LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META (AIM)" por valor de $ 114.126.593.00), la cual tiene suscripción de acta de inicio el día 14/11/2024, el cual finalizo el día 10/12/2024.

Y por último se realizó el proceso derivado de compraventa con numero de proceso en la plataforma secop IP 101.40.13.10.06, cuyo objeto es "COMPRAVENTA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE KIT DE MAQUINARIA AMARILLA Y DOS (2) VOLQUETAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL UTILIZADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 112 DE 2024" por valor de $ 34.807.394,00), la cual tiene suscripción de acta de inicio el día 30/11/2024, el cual finalizo el día 10/12/2024.

Estos procesos se realizaron con el fin de realizar la actividad de CONFORMACIÓN DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACIÓN) la cual se realizó en un 100,00% de manera satisfactoria, dando como tal un valor total de los tres contratos derivados de $ 185.306.197,00 dando una diferencia de 2.531,82 con relación a el valor total de el convenio de $ 185.308.728,82, el cual se deberá entregar a la agencia para la infraestructura de el Meta con valor no ejecutado en la cuenta bancaria con numero de proyecto 2024005500047.

Los tramos ejecutados y relacionados anteriormente en el registro fotográfico según estudios previos y posteriormente en el acta de modificatoria No 1 con fecha del 23/08/2024, son los siguientes:

- TRAMO No 1 CORRESPONDIENTE A EL CALVARIO – SANTA MARÍA CON COORDENADAS INICIO 4°21'28.68"N 73°43'1.29"O FINAL 4°23'47.96"N 73°42'12.06"O, CANTIDAD EJECUTADA 10,00 KM DE 10,00 KM CONTRATADA.
- TRAMO No 2 CORRESPONDIENTE A EL CALVARIO – SAN BERNARDO CON COORDENADAS INICIO 4°21'7.80"N 73°42'49.90"O FINAL 4°20'19.05"N 73°45'50.14"O, CANTIDAD EJECUTADA 11,25 KM DE 11,25 KM CONTRATADA.
- TRAMO No 3 CORRESPONDIENTE SAN BERNARDO - SAN FRANCISCO CON COORDENADAS INICIO 4°20'19.05" N 73°45'49.87"N FINAL 4°22'43.71"N 73°45'32.55"O, CANTIDAD EJECUTADA 6,60 KM DE 6,60 KM, CONTRATADA.

INFORME PARCIAL N° 2

CONTRATO N°	112 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500047

- TRAMO No 4 CORRESPONDIENTE A EL CALVARIO – LOURDES CON COORDENADAS INICIO 4°21'7.80"N 73°42'49.90"O FINAL 4°21'33.24"N 73°42'19.98"O, CANTIDAD EJECUTADA 2,00 KM DE 2,00 KM CONTRATADA.
- TRAMO No 5 CORRESPONDIENTE A SAN FRANCISCO – ALTO DEL CRISTO CON COORDENADAS INICIO 4°22'43.71"N 73°45'32.55"O FINAL 4°22'51.55"N 73°47'41.82"O, CANTIDAD EJECUTADA 8,75 KM DE 8,75 KM CONTRATADA.

De este modo y cumpliendo con la actividad contractual por parte de la entidad se inicia los tramites para segundo desembolso y la liquidación de el convenio interadministrativo 112 de 2024 suscrito entre el municipio de El Calvario y la agencia para la infraestructura de el Meta.

H. ANEXOS

Anexos:

N/A

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 10 días del mes diciembre del 2024.

Firma

Nombre: Luz Nelly Monzón Díaz
SUPERVISOR
N° Matrícula Profesional: A 25700 - 52133

Firma V°B°

Nombre: Nicolas Alberto Daza Calderón
APOYO A LA SUPERVISIÓN
N° Matrícula Profesional: 25202 - 356838 CND

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matrícula profesional deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota: El informe y sus anexos, deben ser cargados a la plataforma para la gestión de archivos SIGA, una vez sea presentado a la entidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co
