ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION

CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.6988327	**PROYECTO N°**	1
ACTA DE PAGO N°	1	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	7/11/2024 a 17/12/2024
OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 100.751.270,77		
CONTRATISTA:	CAPITEL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATANTE:**	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - CIMI GIRON
NIT:	900.375.922-1	**NIT:**	8999990341
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	gerencia@capitelconstrucciones.com	**CORREO ELECTRONICO CONTRATANTE:**	cimiib@sena.edu.co
SUPERVISOR:	MANUEL ENRIQUE VALENCIA MORENO	**TELEFONO:**	607-6468038
CORREO ELECTRONICO SUPERVISION:	mevalencia@sena.edu.co	**FECHA PRESENTE ACTA: 17/12/2024**	FECHA TERMINACION
FECHA DE INICIACIÓN:	7/11/2024		

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					MAYORES Y MENORES CANTIDADES Acta de Modificación No. _01_de fecha _16/11/2024		CANTIDADES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. _01_de fecha _16/11/2024		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES	MENORES	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	% EJEC
1	PRELIMINARES													
1.01	Desmonte de cielo raso	M2	220.66	$ 10.100.00	$ 2.228.666	4.00		224.66	$ 2.269.066	224.66	$ 2.269.066	224.66	$ 2.269.066	100%
1.02	Desmonte de Luminarias	UND	18.00	$ 18.000.00	$ 324.000			18.00	$ 324.000	18.00	$ 324.000	18.00	$ 324.000	100%
1.03	Desmonte de puntos electricos	UND	66.00	$ 13.570.59	$ 895.659			66.00	$ 895.659	66.00	$ 895.659	66.00	$ 895.659	100%
1.04	Desmonte de aire acondicionado	UND	3.00	$ 220.040.00	$ 660.120			3.00	$ 660.120	3.00	$ 660.120	3.00	$ 660.120	100%
1.05	Desmonte de tablero electrico de tacos	UND	2.00	$ 23.562.00	$ 47.124			2.00	$ 47.124	2.00	$ 47.124	2.00	$ 47.124	100%
1.06	Desmonte de ventanas con perfileria en aluminio	M2	18.50	$ 14.247.00	$ 263.570			18.50	$ 263.570	18.50	$ 263.570	18.50	$ 263.570	100%
1.07	Desmonte de bajante aguas lluvias	ML	12.80	$ 12.528.00	$ 160.358			12.80	$ 160.358	12.80	$ 160.358	12.80	$ 160.358	100%
1.08	Desmonte de canaleta electrica existente	ML	42.60	$ 9.550.00	$ 406.830			42.60	$ 406.830	42.60	$ 406.830	42.60	$ 406.830	100%
1.09	Retiro y cargue de materiales de desmonte y demolicion	VJ	4.00	$ 383.130.00	$ 1.532.520			4.00	$ 1.532.520	4.00	$ 1.532.520	4.00	$ 1.532.520	100%
2	FRISOS													
2.01	Rasqueteo de Muros	M2	8.00	$ 22.312.00	$ 178.496	3.00		11.00	$ 245.432	11.00	$ 245.432	11.00	$ 245.432	100%
2.02	Resane en muro mortero 1:4	M2	30.00	$ 10.665.90	$ 319.977			30.00	$ 319.977	30.00	$ 319.977	30.00	$ 319.977	100%
2.03	Frisos liso impermeabilizado sobre muro	ML	18.00	$ 14.600.00	$ 262.800			18.00	$ 262.800	18.00	$ 262.800	18.00	$ 262.800	100%
2.04	Frisos liso impermeabilizado sobre muro	M2	30.00	$ 23.178.00	$ 695.340			30.00	$ 695.340	30.00	$ 695.340	30.00	$ 695.340	100%
3	INSTALACIONES ELÉCTRICAS													
3.01	Reposición punto eléctrico (Toma corriente doble)	UND	29.0	$ 74.154.00	$ 2.150.466			29.00	$ 2.150.466	29.00	$ 2.150.466	29.00	$ 2.150.466	100%
3.02	Reposición punto eléctrico (Toma corriente simple)	UND	9.0	$ 74.060.92	$ 666.548			9.00	$ 666.548	9.00	$ 666.548	9.00	$ 666.548	100%
3.03	Reposición punto eléctrico (Voz y datos)	UND	26.0	$ 77.980.00	$ 2.027.480			26.00	$ 2.027.480	26.00	$ 2.027.480	26.00	$ 2.027.480	100%
3.04	Reposición punto eléctrico (Interruptor)	UND	2.0	$ 68.200.00	$ 136.400			2.00	$ 136.400	2.00	$ 136.400	2.00	$ 136.400	100%
3.05	Suministro e instalación de tablero trifásico 12 circuitos	UND	1.0	$ 379.500.00	$ 379.500			1.00	$ 379.500	1.00	$ 379.500	1.00	$ 379.500	100%
3.06	Suministro e instalación de Panel led 40W rectangular de (30x120)cm	UND	18	$ 185.022.00	$ 3.330.396	10.00		23.00	$ 4.255.506	28.00	$ 5.180.616	28.00	$ 5.180.616	122%
3.07	Suministro e instalación de Canaleta 100x45mm	ML	42.60	$ 61.090.00	$ 2.602.434		4.20	38.40	$ 2.345.856	38.40	$ 2.345.856	38.40	$ 2.345.856	100%
4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS													
4.01	Suministro e instalación de Canal de aguas lluvias	ML	24.00	$ 112.300.00	$ 2.695.200		24.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0%
4.02	Suministro e instalación de bajante de aguas lluvias 4"	ML	12.80	$ 47.485.00	$ 607.808	4.20		17.00	$ 807.245	17.00	$ 807.245	17.00	$ 807.245	100%
4.03	Suministro e instalación de Tuberia PVC 1"para desague	ML	8.00	$ 30.598.00	$ 244.784	6.50		14.50	$ 443.671	14.50	$ 443.671	14.50	$ 443.671	100%
4.04	Mantenimiento cajas aguas lluvias	UND	2.00	$ 334.400.00	$ 668.800		2.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0%
5	ACABADO ESTUCO Y PINTURA													
5.01	Estuco plástico	M2	112.20	$ 13.717.00	$ 1.539.047	6.00		118.20	$ 1.621.349	118.20	$ 1.621.349	118.20	$ 1.621.349	100%
5.02	Estuco plástico	ML	113.20	$ 9.835.00	$ 1.113.322	12.00		125.20	$ 1.231.342	125.20	$ 1.231.342	125.20	$ 1.231.342	100%
5.03	Pintura Vinilo color blanco para interiores	M2	112.20	$ 17.845.00	$ 2.002.209	6.00		118.20	$ 2.109.279	118.20	$ 2.109.279	118.20	$ 2.109.279	100%
5.04	Pintura Vinilo color blanco para interiores	ML	113.20	$ 12.207.00	$ 1.381.832	12.00		125.20	$ 1.528.316	125.20	$ 1.528.316	125.20	$ 1.528.316	100%
5.05	Suministro e instalación de revestimiento tipo WALLPANEL para zócalo	ML	79.10	$ 117.004.00	$ 9.255.016			79.10	$ 9.255.016	79.10	$ 9.255.016	79.10	$ 9.255.016	100%
5.06	Suministro e instalación de revestimiento tipo WALLPANEL para muro	M2	12.40	$ 302.400.00	$ 3.749.760	4.00		16.40	$ 4.959.360	16.40	$ 4.959.360	16.40	$ 4.959.360	100%
6	CARPINTERIA METÁLICA				$ -									
6.01	Mantenimiento de marcos en aluminio de ventanas existentes	M2	44.00	$ 103.960.00	$ 4.574.240		16.00	28.00	$ 2.910.923	28.00	$ 2.910.880	28.00	$ 2.910.880	100%
6.02	Polarización de vidrios Exteriores	M2	44.40	$ 67.950.00	$ 3.016.980			44.40	$ 3.016.980	44.40	$ 3.016.980	44.40	$ 3.016.980	100%
7	CUBIERTA Y CIELO RASO													
7.01	Suministro e instalación de cielo Raso en PVC	M2	230.16	$ 85.740.00	$ 19.733.918		14.00	216.16	$ 19.219.478	216.16	$ 18.533.558	216.16	$ 18.533.558	100%
7.02	Suministro e instalación de canal metálico de aguas lluvias	ML	24.00	$ 112.300.00	$ 2.695.200		9.00	15.00	$ 1.684.500	15.00	$ 1.684.500	15.00	$ 1.684.500	100%
8	URBANISMO												$ -	
8.01	Adecuación de Jardineras e Impermeabilización de Jardineras	M2	22.91	$ 54.178.00	$ 1.241.261		22.91	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
9	OTROS												$ -	
9.01	Aseo General	GLB	1.00	$ 321.000.00	$ 321.000			1.00	$ 321.000	1.00	$ 321.000	1.00	$ 321.000	100%
	SUBTOTAL				$ 74.109.062,72				$ 69.153.012		$ 69.392.160		$ 69.392.160	
NP	ITEMS NO PREVISTOS	UND	CANT	VLR UNITARIO										
NP 01	Desmonte de Lámina Fibrocemento de Fachada en Mal estado h>3.0 m	M2	58,80	$ 15.653				58,80	$ 920.396	58,80	$ 920.396	58,80	$ 920.396	100%
NP 02	Desmonte de Tendido eléctrico	ML	78,00	$ 5.400				78,00	$ 421.200	78,00	$ 421.200	78,00	$ 421.200	100%
NP 03	Excavacion Manual para Zanja Evacuación aguas lluvias	ML	4,00	$ 16.992				4,00	$ 67.968	4,00	$ 67.968	4,00	$ 67.968	100%
NP 04	Relleno compactado para Zanja (Incluye material seleccionado)	M3	0,80	$ 133.964				0,80	$ 107.171	0,80	$ 107.171	0,80	$ 107.171	100%
NP 05	Caja de inspección 60x60 cm Incluye tapa en concreto	UND	1,00	$ 597.585				1,00	$ 597.585	1,00	$ 597.585	1,00	$ 597.585	100%
NP 06	Suministro e instalación de Fachada Flotante en Lámina Fibrocemento (Incluye pintura y acabado)	M2	49,80	$ 157.622				49,80	$ 7.849.576	49,80	$ 7.849.576	49,80	$ 7.849.576	100%
NP 07	Suministro e Instalación de Flanche fachada flotante Ancho 25 cm	ML	32,00	$ 52.860			4,52	32,00	$ 1.691.520	27,48	$ 1.452.373	27,48	$ 1.452.373	86%
NP 08	Suministro e Instalación tendido eléctrico para iluminación (Incluye 3 lineas cable # 12 libre de halogeno)	ML	96,00	$ 23.766				96,00	$ 2.281.536	96,00	$ 2.281.536	96,00	$ 2.281.536	100%
NP 09	Suministro e Instalación de puerta en vidrio láminado (incluye accesorios e incrustaciones)	M2	3,45	$ 835.174				3,45	$ 2.881.350	3,45	$ 2.881.350	3,45	$ 2.881.350	100%
NP 10	Muro en Eterboard doble cara 8mm base 6	M2	6,90	$ 132.008				6,90	$ 910.855	6,90	$ 910.855	6,90	$ 910.855	100%
NP 11	Division en vidrio laminado 9mm 3.0mx3.0m(incluye accesorios e incrustaciones)	M2	9,00	$ 835.174				9,00	$ 7.516.566	9,00	$ 7.516.566	9,00	$ 7.516.566	100%
NP 12	Cargue y retiro de escombros	VJ	2,00	$ 321.000				2,00	$ 642.000	2,00	$ 642.000	2,00	$ 642.000	100%
	SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS								$ 25.887.724		$ 25.648.576		$ 25.648.576	
	VALOR COSTOS DIRECTOS				$ 74.109.062,7				$ 95.040.736,13		$ 95.040.736,13		$ 95.040.736,13	
	ADMINISTRACIÓN (29%)				$ 21.491.628,2				$ 27.561.813,48		$ 27.561.813,48		$ 27.561.813,48	
	IMPREVISTOS (1%)				$ 741.090,6				$ 950.407,36		$ 950.407,36		$ 950.407,36	
	UTILIDAD (5%)				$ 3.705.453,1				$ 4.752.036,81		$ 4.752.036,81		$ 4.752.036,81	
	IVA/UTILIDAD (19%)				$ 704.036,1				$ 902.886,99		$ 902.886,99		$ 902.886,99	
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				$ 26.642.208,0				$ 34.167.144,64		$ 34.167.144,64		$ 34.167.144,64	
	VALOR TOTAL OBRA				$ 100.751.270,77				$ 129.207.880,77		$ 129.207.880,77		$ 129.207.880,77	

CONDICIONES GENERALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS				
			RELACIÓN DE ACTAS		AMORTIZACIONES	NETO PARCIAL
VALOR CONDICIONES ORIGINALES	$ 100.751.271	ACTA 1	$ 129.207.880,77			$ 129.207.880,77
VALOR ADICIONAL	$ 28.456.610	ACTA 2				$ -
VALOR TOTAL	$ 129.207.880,77	ACTA 3				$ -
CONDICIONES ACTUALIZADAS	$ 129.207.880,77	PRESENTE ACTA	$ 129.207.880,77			$ 129.207.880,77
ANTICIPO 0%		TOTALES	$ 129.207.880,77			$ 129.207.880,77
PRESENTE ACTA	$ 129.207.880,77					
ACUMULADO	$ 129.207.880,77					

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA (VALOR EN LETRAS) CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON SETENTA Y SISTE CENTAVOS MCTE

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día **Martes 17 de Diciembre de 2024**

Firma

Nombre ANDRES FUENTES PARRA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA


Firma

Nombre MANUEL ENRIQUE VALENCIA MORENO
REPRESENTANTE SUPERVISION DE OBRA

Copia Controlada CAPITEL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

CAPITEL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S



CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024

Memoria de Cantidades

PRELIMINARES

1.01

Desmonte de cielo raso			**M2**
Descripción	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**TOTAL**
Biblioteca Zona 1	11,92	11,95	142,44
Biblioteca Zona 2	11,92	6,90	82,22
			224,66








CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades

PRELIMINARES

1.02

Desmonte de Luminarias **UND**

Descripción	UNIDAD	TOTAL
Biblioteca Zona 1	12,00	12,00
Biblioteca Zona 2	6,00	6,00
		18,00







CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades

PRELIMINARES

1.03

Desmonte de puntos electricos **UND**

Descripción	UNIDAD	TOTAL
Biblioteca Zona 1	42,00	42,00
Biblioteca Zona 2	24,00	24,00
		66,00

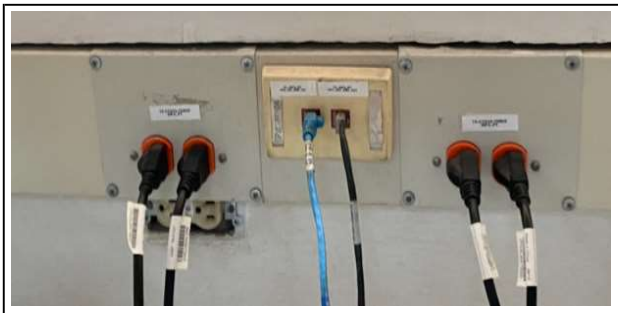





CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades

PRELIMINARES

1.04

Desmonte de aire acondicionado **UND**

Descripción	UND	TOTAL
Biblioteca Zona 1	2,00	2,00
Biblioteca Zona 2	1,00	1,00
		3,00



CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades

PRELIMINARES

1.05

Desmonte de tablero electrico de tacos **UND**

Descripción	UND	TOTAL
Biblioteca zona 2	2,00	2,00
		2,00



CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades

PRELIMINARES

1.06

Desmonte de ventanas con perfileria en aluminio **M2**

Descripción	LARGO (m)	ALTO (m)	TOTAL
Biblioteca Zona 1	3,40	2,00	6,80
Biblioteca Zona 2	3,80	3,08	11,70
			18,50







CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades

PRELIMINARES

1.07

Desmonte de bajante aguas lluvias **ML**

Descripción		LARGO	TOTAL
Biblioteca		12,80	12,80
			12,80










CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades

PRELIMINARES

1.08

Desmonte de canaleta electrica existente **ML**

Descripción	LARGO (m)	TOTAL
Biblioteca	42,60	42,60
		42,60

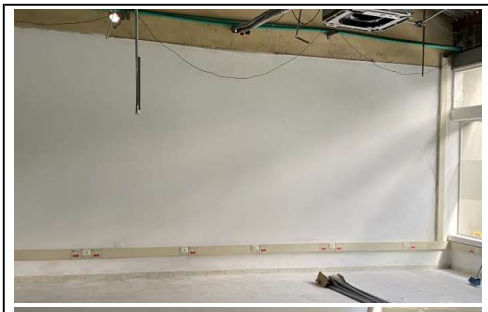





CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades


PRELIMINARES

1.09

Retiro y cargue de materiales de desmonte y demolicion **VJ**


Descripción	VIAJE	TOTAL
Biblioteca	4,00	4,00
		4,00

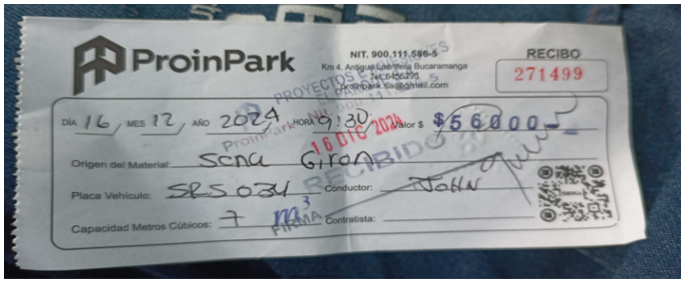

CAPITEL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S




CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades

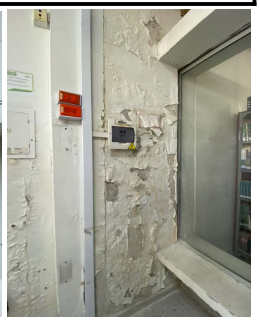FRISOS

2.01

Rasqueteo de Muros			M2
Descripción	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**TOTAL**
Biblioteca	3,55	3,10	11,00
			11,0



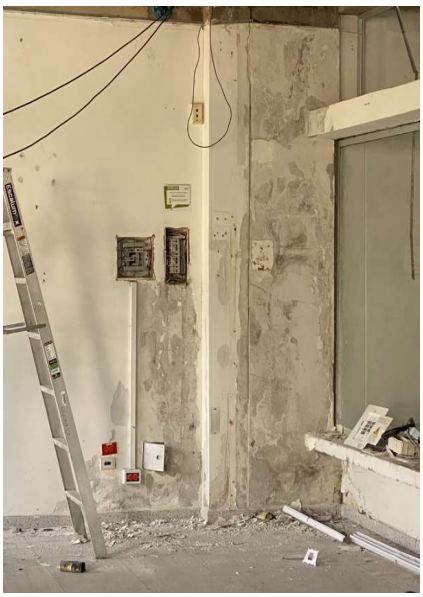

CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades

FRISOS

2.02

Resane en muro mortero 1:4			M2
Descripción	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**TOTAL**
Biblioteca	9,68	3,10	30,00
			30,0





CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades

FRISOS

2.03

Frisos liso impermeabilizado sobre muro		ML
Descripción	**LARGO (m)**	**TOTAL**
Biblioteca	18,00	18,00
		18,00





CONTRATAR LA ADECUACION Y REMODELACION DE LA CAFETERÍA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades

FRISOS

2.04

Frisos liso impermeabilizado sobre muro			**M2**
Descripción	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**TOTAL**
Biblioteca	9,68	3,10	30,00
			30,00








CAPITEL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

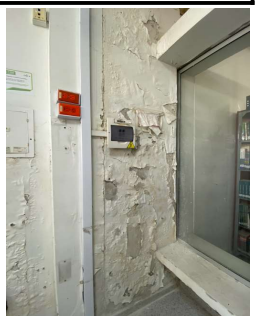

CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

3.01

Reposición punto eléctrico (Toma corriente doble)		UND
Descripción	**UND**	**TOTAL**
Biblioteca Zona 1	18,00	18,00
Biblioteca Zona 2	11,00	11,00
		29,0













CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

3.02

Reposición punto eléctrico (Toma corriente simple)		UND
Descripción	**UND**	**TOTAL**
Biblioteca	9,00	9,00
		9,0



CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

3.03

Reposición punto eléctrico (Voz y datos)		UND
Descripción	**UND**	**TOTAL**
Biblioteca	26,00	26,00
		26,0



CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades


INSTALACIONES ELÉCTRICAS

3.04

Reposición punto eléctrico (Interruptor)		UND
Descripción	**UND**	**TOTAL**
Biblioteca Zona 1	0,00	0,00
Biblioteca Zona 2	2,00	2,00
		2,0





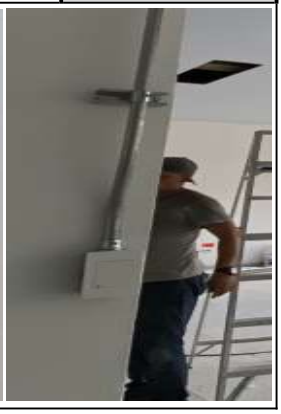


CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

3.05

Suministro e instalación de tablero trifásico 12 circuitos		UND
Descripción	**UNIDAD**	**TOTAL**
Biblioteca zona 2	1,00	1,00
		1,0

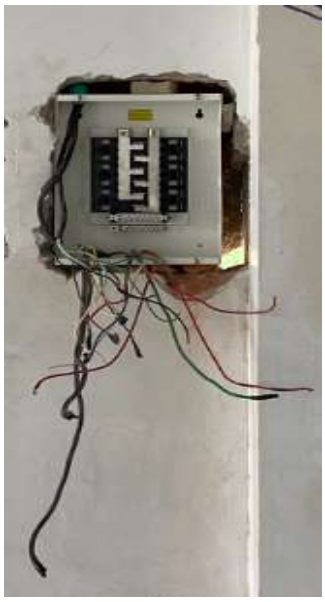



CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

3.06

Suministro e instalación de Panel led 40W rectangular de (30x120)cm		UND
Descripción	**UNIDAD**	**TOTAL**
Biblioteca Zona 1	20,00	20,00
Biblioteca Zona 2	8,00	8,00
		28,0







CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades

INSTALACIONES ELÉCTRICAS


3.07


Suministro e instalación de Canaleta 100x45mm		ML
Descripción	**LARGO (m)**	**TOTAL**
Biblioteca	38,40	38,40
		38,4

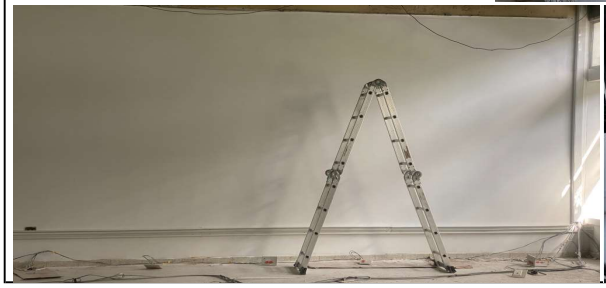


CAPITEL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CAPITEL CONSTRUCCIONES S.A.S.

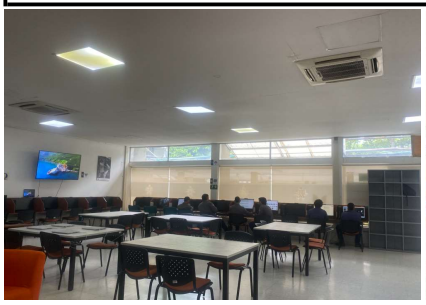

CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

4.02

Suministro e instalación de bajante de aguas lluvias 4"		ML
Descripción	**LONGITUD (m)**	**TOTAL**
Biblioteca	17,00	17,00
		17,0








CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

4.03


Suministro e instalación de Tuberia PVC 1"para desague		ML
Descripción	**LONGITUD (m)**	**TOTAL**
Biblioteca	14,50	14,50
		14,5

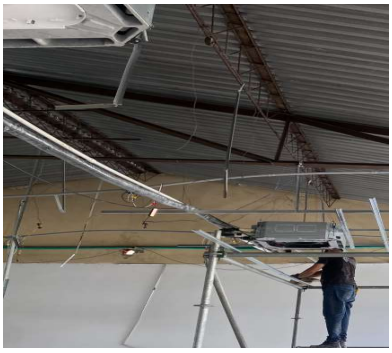



CAPITEL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CAPITEL CONSTRUCCIONES S.A.S.




CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades




ACABADO ESTUCO Y PINTURA

5.01

Estuco plástico			M2
Descripción	LARGO (m)	ALTO (m)	TOTAL
Biblioteca Zona 1	23,50	3,04	71,52
Biblioteca Zona 2	15,56	3,00	46,68
			118,2

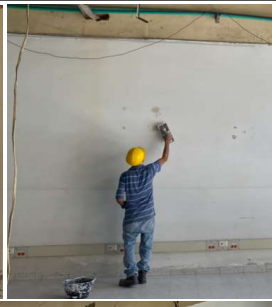

CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades

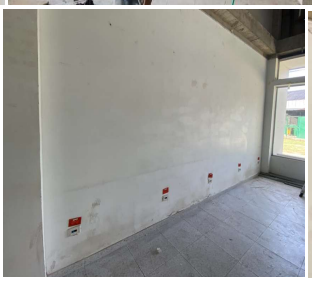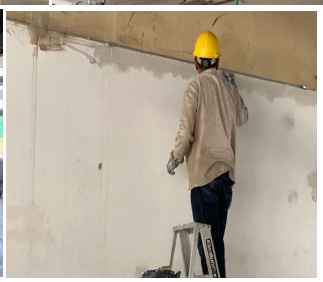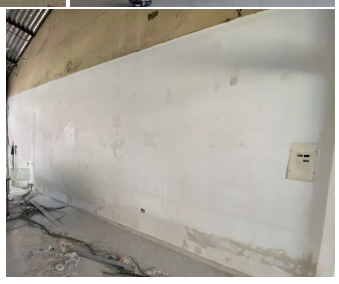ACABADO ESTUCO Y PINTURA

5.02

Estuco plástico		ML
Descripción	**LARGO (m)**	**TOTAL**
Biblioteca Zona 1	59,48	59,48
Biblioteca Zona 2	65,72	65,72
		125,2










CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades


ACABADO ESTUCO Y PINTURA

5.03

Pintura Vinilo color blanco para interiores			M2
Descripción	**LARGO (m)**	**ALTO (m)**	**TOTAL**
Biblioteca Zona 1	23,50	3,04	71,52
Biblioteca Zona 2	15,56	3,00	46,68
			118,2



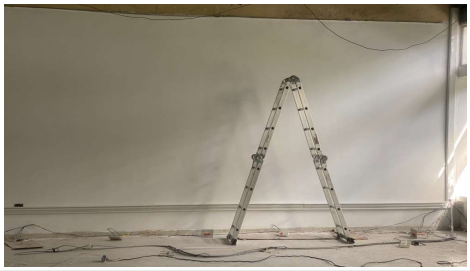

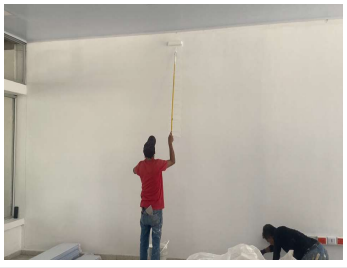

CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades

ACABADO ESTUCO Y PINTURA

5.04

Pintura Vinilo color blanco para interiores		ML
Descripción	**LARGO (m)**	**TOTAL**
Biblioteca Zona 1	59,48	59,48
Biblioteca Zona 2	65,72	65,72
		125,2







CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades

ACABADO ESTUCO Y PINTURA

5.05

Suministro e instalación de revestimiento tipo WALLPANEL para zócalo		ML
Descripción	**LARGO (m)**	**TOTAL**
Biblioteca Zona 2	79,10	79,10
		79,1






CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades

ACABADO ESTUCO Y PINTURA

5.06


Suministro e instalación de revestimiento tipo WALLPANEL para muro			M2
Descripción	**LARGO (m)**	**ALTO (m)**	**TOTAL**
Biblioteca Zona 2	5,38	3,05	16,40
			16,4








CAPITEL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CAPITEL CONSTRUCCIONES S.A.S.

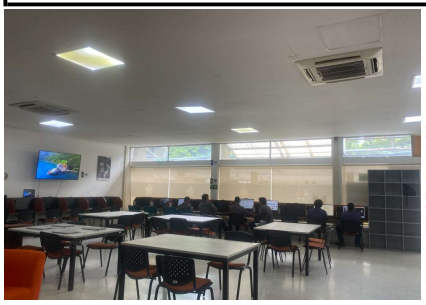

CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades

CARPINTERIA METÁLICA

6.01

Mantenimiento de marcos en aluminio de ventanas existentes			M2
Descripción	**LARGO (m)**	**ALTO (m)**	**TOTAL**
Biblioteca	11,67	2,40	28,00
			28,00







CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades

CARPINTERIA METÁLICA

6.02


Polarización de vidrios Exteriores			M2
Descripción	**LARGO (m)**	**ALTO (m)**	**TOTAL**
Biblioteca Zona 1	9,10	2,35	21,39
Biblioteca Zona 2	9,79	2,35	23,02
			44,4








CAPITEL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

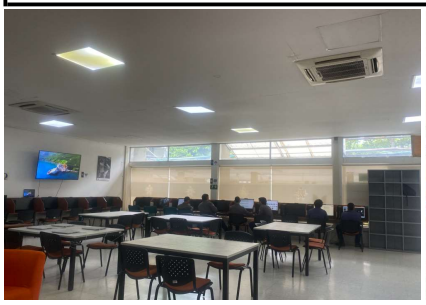


CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades

CUBIERTA Y CIELO RASO

7.01

Suministro e instalación de cielo Raso en PVC			M2
Descripción	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**TOTAL**
Bibloteca Zona 1	11,77	11,39	134,01
Biblioteca Zona 2	11,77	6,98	82,15
			216,16



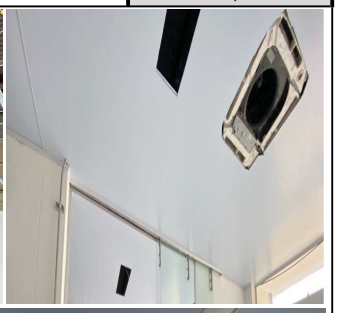




CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades



CUBIERTA Y CIELO RASO

7.02


Suministro e instalación de canal metálico de aguas lluvias		ML
Descripción	**LARGO (m)**	**TOTAL**
Biblioteca	15,00	15,00
		15,0




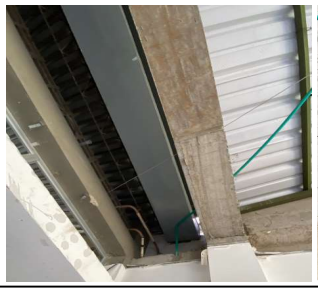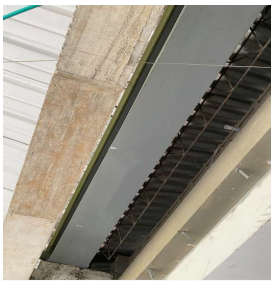

CAPITEL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CAPITEL CONSTRUCCIONES S.A.S.

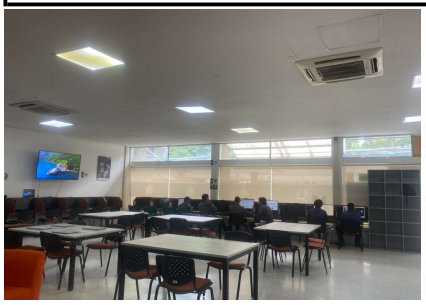

CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades


CUBIERTA Y CIELO RASO


9.01

OTROS		GLB
Descripción	**CANTIDAD**	**TOTAL**
Aseo General	1,00	1,00
		1,0




CAPITEL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

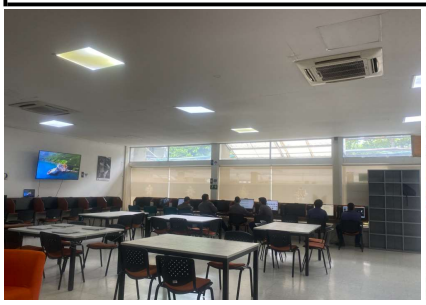


CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades

ITEMS NO PREVISTOS

NP 01

Desmonte de Lámina Fibrocemento de Fachada en Mal estado h>3.0 m			M2
Descripción	**LARGO (m)**	**ALTO (m)**	**TOTAL**
Cielo razo fachada exterior	12,00	1,94	23,30
Fachada exterior	14,20	2,50	35,50
			58,8



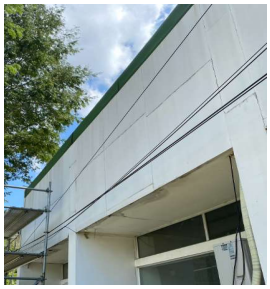







CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades


ITEMS NO PREVISTOS

NP 02

Desmonte de Tendido eléctrico		ML
Descripción	**LARGO (m)**	**TOTAL**
Biblioteca	78,00	78,00
		78,0

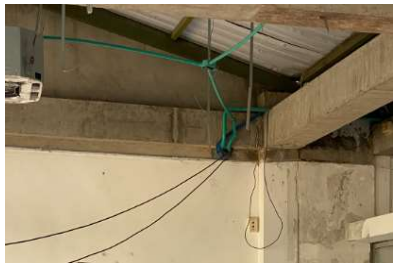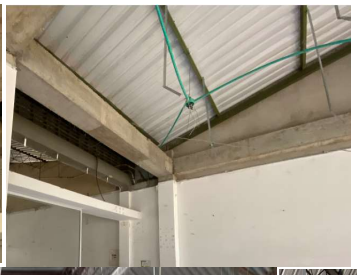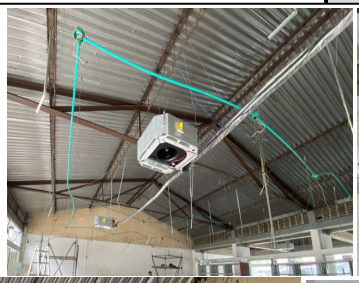

CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades

ITEMS NO PREVISTOS

NP 03

Excavacion Manual para Zanja Evacuación aguas lluvias		ML
Descripción	**LARGO (m)**	**TOTAL**
Bilbioteca	4,00	4,00
		4,0






CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades

ITEMS NO PREVISTOS

NP 04

Relleno compactado para Zanja (Incluye material seleccionado)				M3
Descripción	**LARGO (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**TOTAL**
Bilbioteca	4,00	0,35	0,57	0,80
				0,8






CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades

ITEMS NO PREVISTOS

NP 05

Caja de inspección 60x60 cm Incluye tapa en concreto				UND
Descripción			**UNIDAD**	**TOTAL**
			1,00	1,00
				1,0







CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades

ITEMS NO PREVISTOS

NP 06

Suministro e instalación de Fachada Flotante en Lámina Fibrocemento (Incluye pintura y acabado)			-
Descripción	**LARGO(m)**	**ALTO (m)**	**TOTAL**
Bilbioteca Fachada exterior	13,39	3,72	49,80
			49,8









CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades

ITEMS NO PREVISTOS

NP 07

Suministro e instalación de Fachada Flotante en Lámina Fibrocemento (Incluye pintura y acabado)		NP 07
Descripción	**LARGO(m)**	**TOTAL**
Bilbioteca Fachada exterior	27,48	27,48
		27,48

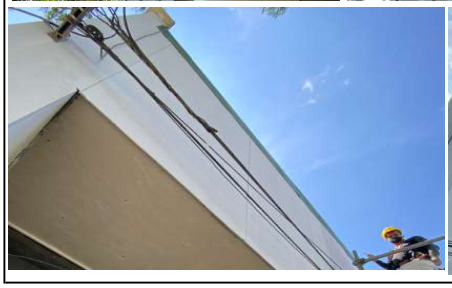


CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades

ITEMS NO PREVISTOS

NP 08

Suministro e Instalación tendido eléctrico para iluminación (Incluye 3 lineas cable # 12 libre de halogeno)		ML
Descripción	**LARGO(m)**	**TOTAL**
Bilbioteca	96,00	96,00
		96,0











CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades

ITEMS NO PREVISTOS

NP 09

Suministro e Instalación de puerta en vidrio láminado (incluye accesorios e incrustaciones)			M2
Descripción	**LARGO (m)**	**ALTO (m)**	**TOTAL**
Bilbioteca	1,50	2,30	3,45
			3,45



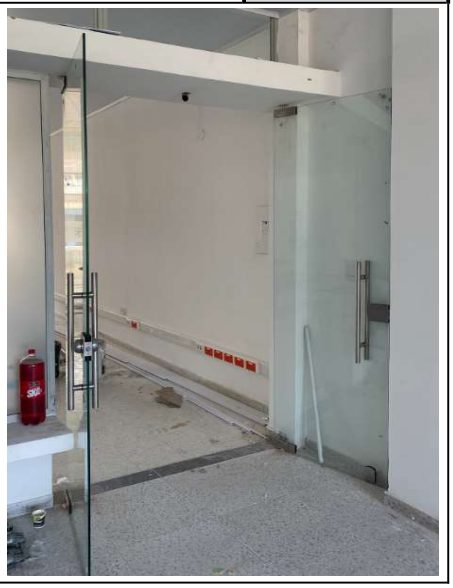


CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades

ITEMS NO PREVISTOS

NP 10

Muro en Eterboard doble cara 8mm base 6			M2
Descripción	**LARGO (m)**	**ALTO (m)**	**TOTAL**
Bilbioteca	2,30	3,00	6,90
			6,9

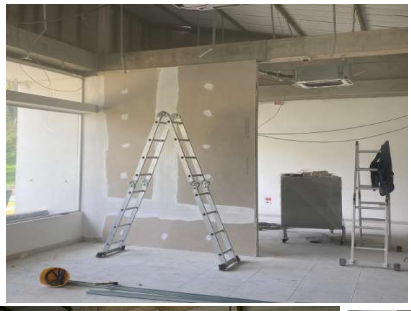




CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades

ITEMS NO PREVISTOS

NP 11

Division en vidrio laminado 9mm 3.0mx3.0m(incluye accesorios e incrustaciones)			M2
Descripción	**LARGO (m)**	**ALTO (m)**	**TOTAL**
Bilbioteca	3,00	3,00	9,00
			9,0



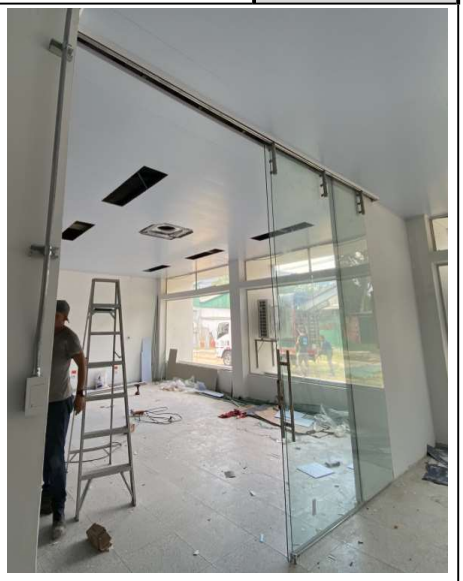

CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024	Memoria de Cantidades

ITEMS NO PREVISTOS

NP 12

Muro en Eterboard doble cara 8mm base 6		VJ
Descripción	**VIAJE**	**TOTAL**
Bilbioteca	2,00	2,00
		2,0









aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900375922	1	CAPITEL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA PRINCIPAL	Calle 22 # 28-05 Torre 6 apt 302	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6391386	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1131031063	9478961316	E	2024/12/06	2024/12/16	BANCOLOMBIA	10	$3,495,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OFICINA PRINCIPAL (12 Afiliados)																							$11,708,670	$1,873,800			$12,488,670	$499,900			$12,488,670	$499,900			$12,488,670		$598,500		$0	$0		$3,472,100
Centro de Trabajo: CONSULTORIA (2 Afiliados)																							$4,212,000	$674,000			$4,212,000	$168,500			$4,212,000	$168,500			$4,212,000		$22,100		$0	$0		$1,033,100
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																							$4,212,000	$674,000			$4,212,000	$168,500			$4,212,000	$168,500			$4,212,000		$22,100		$0	$0		$1,033,100
1	CC	1094276269	CAÑAS ELKIN																		23030 1	30	$2,912,000	$466,000	EPS002	30	$2,912,000	$116,500	CCF39	30	$2,912,000	$116,500	14-11	30	$2,912,000	0.522%	$15,300	30	$0	$0	Si	$714,300
2	CC	91531228	FUENTES YARITH																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL SANTANDER (7 Afiliados)																							$4,463,336	$714,400			$5,243,336	$210,000			$5,243,336	$210,000			$5,243,336		$365,200		$0	$0		$1,499,600
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (7 Afiliados)																							$4,463,336	$714,400			$5,243,336	$210,000			$5,243,336	$210,000			$5,243,336		$365,200		$0	$0		$1,499,600
3	CC	5638015	BERMUDEZ JAIME	X																		0	$0	$0	EPS037	18	$780,000	$31,200	CCF39	18	$780,000	$31,200	14-11	18	$780,000	6.960%	$54,300	18	$0	$0	Si	$116,700
4	CC	91348866	CARRILLO ROBERTO	X																	23030 1	22	$953,334	$152,600	EPS005	22	$953,334	$38,200	CCF39	22	$953,334	$38,200	14-11	22	$953,334	6.960%	$66,400	22	$0	$0	Si	$295,400
5	CC	91423845	GONZALEZ REINALDO	X																	25-14	18	$780,000	$124,800	ESSC24	18	$780,000	$31,200	CCF39	18	$780,000	$31,200	14-11	18	$780,000	6.960%	$54,300	18	$0	$0	Si	$241,500
6	CC	98666846	LEGARDA JOHN	X																	23020 1	22	$953,334	$152,600	EPS046	22	$953,334	$38,200	CCF39	22	$953,334	$38,200	14-11	22	$953,334	6.960%	$66,400	22	$0	$0	Si	$295,400
7	CC	1102359604	MARTINEZ WILBER	X																	23030 1	22	$953,334	$152,600	EPS002	22	$953,334	$38,200	CCF39	22	$953,334	$38,200	14-11	22	$953,334	6.960%	$66,400	22	$0	$0	Si	$295,400
8	CC	1098707787	ORDUZ WALTHER	X																	23030 1	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF39	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
9	CC	1005154310	REATIGA OSCAR	X	X																23030 1	18	$780,000	$124,800	ESSC24	18	$780,000	$31,200	CCF39	18	$780,000	$31,200	14-11	18	$780,000	6.960%	$54,300	18	$0	$0	Si	$241,500
Centro de Trabajo: RCI (3 Afiliados)																							$3,033,334	$485,400			$3,033,334	$121,400			$3,033,334	$121,400			$3,033,334		$211,200		$0	$0		$939,400
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																							$3,033,334	$485,400			$3,033,334	$121,400			$3,033,334	$121,400			$3,033,334		$211,200		$0	$0		$939,400
10	CC	1020222233	LOPEZ MATIAS		X																23020 1	12	$520,000	$83,200	EPS010	12	$520,000	$20,800	CCF39	12	$520,000	$20,800	14-11	12	$520,000	6.960%	$36,200	12	$0	$0	Si	$161,000
11	CC	88251516	MORENO EDILSON																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
12	CC	1099368031	SANCHEZ JONATAN	X	X																23030 1	28	$1,213,334	$194,200	EPS037	28	$1,213,334	$48,600	CCF39	28	$1,213,334	$48,600	14-11	28	$1,213,334	6.960%	$84,500	28	$0	$0	Si	$375,900
Total			**Afiliados(12)**																				$11,708,670	$1,873,800			$12,488,670	$499,900			$12,488,670	$499,900			$12,488,670		$598,500		$0	$0		$3,472,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900375922	1	CAPITEL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA PRINCIPAL	Calle 22 # 28-05 Torre 6 apt 302	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6391386	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1131031063	9478961316	E	2024/12/06	2024/12/16	BANCOLOMBIA	10	$3,495,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$1,873,800	$12,600	$0	$1,886,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$124,800	$900	$0	$125,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,305,200	$8,700	$0	$1,313,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$443,800	$3,000	$0	$446,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$598,500	$4,000	$0	$602,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$598,500	$4,000	$0	$602,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$499,900	$3,400	$0	$503,300
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	12	$499,900	$3,400	$0	$503,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				12	$499,900	$3,600	$0	$503,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$62,400	$500	$0	$62,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$72,800	$500	$0	$73,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$79,800	$600	$0	$80,400
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$38,200	$300	$0	$38,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$208,500	$1,400	$0	$209,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$38,200	$300	$0	$38,500
TOTAL				**12**	**$3,472,100**	**$23,600**	**$0**	**$3,495,700**

Certificación Bancaria

Bancolombia

FLORIDABLANCA, 23 de Octubre de 2024.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CAPITEL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT No. 900375922 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

	Nombre Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	02017469099	2013/12/23	A ACTIVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. - Establecimiento Bancario

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.
