INFORME DE SUPERVISIÓN - CONTRATO DE CONSULTORÍA
No. MC-034-2024
ACTA FINAL
NOVIEMBRE - 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 034-2024
DEL 12 DE JULIO DEL 2024 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2024
"CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y OBRAS DE CONTENCIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN IGNACIO DE LOYOLA SECCIÓN PABLO SEXTO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, BOYACÁ".

CONTRATISTA
Ing. DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON
C.C. 1.054.682.068 EXPEDIDA EN MONIQUIRÁ BOYACÁ

CONTRATANTE
MUNICIPIO DE OTANCHE - BOYACA
NIT 891.801.362-1

ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE CONSULTORIA No. MC-034-2024

CONVENIO	**CONTRATO**	**X**	**TIPO**	**CONTRATO DE CONSULTORIA**		
No. Contrato	**MC-034-2024**	Fecha de suscripción del contrato		**DÍA**	**MES**	**AÑO**
				06	06	2024
Objeto del Contrato:	**"CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y OBRAS DE CONTENCIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN IGNACIO DE LOYOLA SECCIÓN PABLO SEXTO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, BOYACÁ".**					
Interventor y/o Supervisor:	**ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ.**					
Contratista:	**Ing. DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON CC**: 1.054.682.068 expedida en Moniquirá Boyacá					

FECHA ACTA DE INICIACIÓN:			**FECHA DE TERMINACIÓN:**		
AÑO	**MES**	**DÍA**	**AÑO**	**MES**	**DIA**
2024	07	12	2024	10	04

Fecha Acta de Suspensión		(Si a ello hay lugar)
Fecha Acta de Reinicio		(Si a ello hay lugar)
Valor del contrato:	**$ 25.480.000,00**	**Valor Adicional: $10.920.000,00**
Valor Ejecutado:	**$ 36.400.000,00**	
Plazo del contrato:	Setenta y cinco (75) días	**Prorroga: Según otro si No. 001**: Diecisiete (17) días
Duración del contrato:	Noventa y dos (92) días	

No. Registro Presupuestal:	2024060600002 2024090900001	**Código Presupuestal:**	**Denominación Presupuestal:**
		2.3.2.01.01.001.02.07.07 2.3.2.01.01.001.02.07.07	Infraestructura educativa mantenida Infraestructura educativa mantenida

GARANTÍAS OTORGADAS			
TIPO DE AMPARO	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 3.640.000	12/07/2024	05/03/2025
PRESTACIONES SOCIALES	$ 7.280.000	12/07/2024	05/11/2029
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 1.820.000	12/07/2024	05/11/2027


Tabla No. 1. PRODUCTOS ENTREGADOS.

ITEM	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT
1	**GENERAL**		
1,01	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	UND	1
1,02	PRESUPUESTO DE OBRA (APU'S Y MEMORIAS DE CANTIDADES, FACTOR MULTIPLICADEOR, DESGLOSE DE INTERVENTORIA)	UND	1
1,03	PROGRAMACION DE OBRA Y FLUJO DE CAJA	UND	1
1,04	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	UND	1
1,05	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESO CONSTRUCTIVO	UND	1
1,06	ESTUDIO DE SUELOS (SONDEOS CON RECUPERACION DE MUESTRA Y ENSAYOS DE LABORATORIO)	UND	1
1,07	ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGOS Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	UND	1
2	**AULAS EDUCATIVAS**		
2,01	DISEÑADOR ARQUITECTÓNICO - RENDERS	UND	1
2,02	PLANOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES	UND	1
2,03	PLANOS Y DISEÑOS HIDROSANITARIOS, HIDROLOGICO, CON SUS RESPECTIVOS CÁLCULOS	UND	1
2,04	DISEÑO ELÉCTRICO Y SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	UND	1
3	**OBRAS DE CONTENCION**		
3,01	ANALISIS DE ESTABILIDAD DE CONTENCION	UND	1
3,02	PLANOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES OBRAS DE CONTENCION	UND	1


Se realiza la entrega de la información en medio magnético y físico en "2 tomos" como se describe en la tabla No. 1.

Se allegan las planillas de seguridad social de los profesionales que se contemplaron en los estudios y diseños con sus respectivos memoriales de responsabilidad.

Para finalizar, se anexa registro fotográfico de los tomos y pantallazo de la información en medio magnético de todas las carpetas con un peso de 2,24 GB (2.412.199.936 bytes), 137 archivos, 29 carpetas.

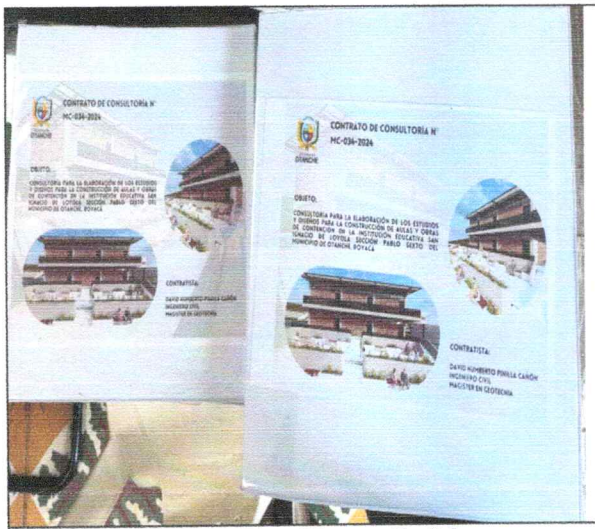

1.Registro fotográfico medio físico.

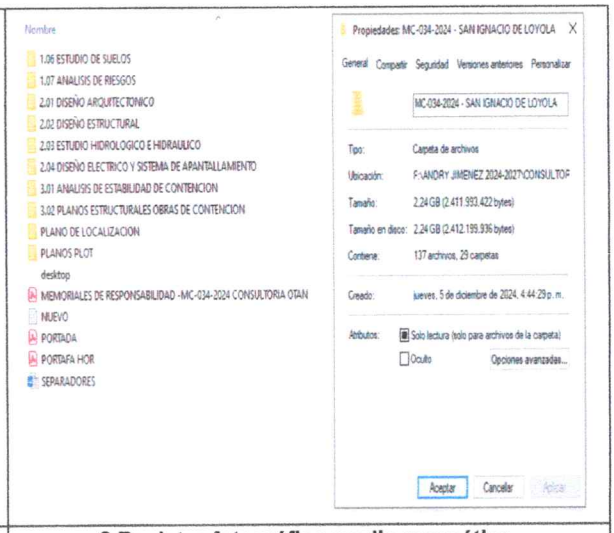

2.Registro fotográfico medio magnético.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 25.480.000,00	$00
(+) Valor adiciones	$ 10.920.000,00	$00
(+) Valor total reajuste	$00	$00
VALOR TOTAL CONTRATADO	**$ 36.400.000,00**	**$00**
(-) Valor total No ejecutado	$00	$00
(-) Anticipo	$00	$00
(-) Valor acta parcial	$00	**36.400.000**
(-) Valor saldo a pagar al contratista	$00	$00
SUMAS IGUALES	**$ 36.400.000**	**$ 36.400.000**

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: "TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS ($36.400.000) MTCE".

Tabla No. 2 TOMO - FOLIOS

TOMOS	FOLIOS
TOMO 1 DE 2	Pg. 1 a 426
TOMO 2 DE 2	Pg. 1 a 699

REGISTRO FOTOGRAFICO

Ortofoto de la institución Educativa San Ignacio de Loyola



Levantamiento Topográfico



Plan de Manejo Ambiental en 58 folios.

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y OBRAS DE CONTENCIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN IGNACIO DE LOYOLA SECCIÓN PABLO SEXTO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, BOYACÁ".

MUNICIPIO DE OTANCHE

P.M.A. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

OTANCHE – BOYACÁ 2024

Cordialmente;

05/12/2024

ANDRY FABIAN JIMÉNEZ MÉNDEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura

Proyecto: Ing. Adrián Garzón.
Revisó: Fabián Jiménez.
