INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
No 4 DEL CONTRATO 5032 – 2023

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATISTA:
CONVENIOS CON JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

INTERVENTOR:
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S

SUPERVISOR:
ING. ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA

JULIO 2024

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.
2.1.1 Localización del Corredor a intervenir
2.1.2 Localización del campamento y fuentes de materiales

2.2 MUNICIPIOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL SITIO DE LAS OBRAS

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

2.5 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.5.1 Descripción / Alcance y meta física Inicial
2.5.2 Descripción / Alcance y meta física actualizada

3. CONVENIO SOLIDARIO

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO
3.1.1 Datos del Convenio

3.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO Y ACUMULADAS
3.2.1 Etapa de Revision de Estudios y Diseños
3.2.2 Obras de Mejoramiento – Placa Huella
3.2.3 Valores ejecutados

3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR LA INTERVENTORÍA

4 REPORTES DE EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS

4.1 INFORME SEMANAL

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIOS

4.3 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONVENIOS

4.3.1 Control del Personal de convenios

4.3.2 Control de aportes legales y seguridad social convenios

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL ONTRATO DE OBRA

4.4.1 Informe financiero y presupuestal

4.4.2 Forma de pago de los conevenios

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

4.7 SEGUIMIENTO A GARANTÍAS CONTRATO DE OBRA

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

4.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

4.9.1 Seguimiento al Programa de Obra y de Inversiones

4.9.2 Actas de comité de obra o actas de reunión

4.9.3 Resumen Mensual Estado General del Proyecto

4.10 FUENTE DE MATERIALES

5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

5.1.1 Datos del Contrato de Interventoría

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

5.2.1 Actividades específicas realizadas por la interventoría

5.2.2 Control de correspondencia.

5.2.3 Registro fotográfico

5.3 INFORMES TÉCNICOS, PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

5.4.1 Plan Anual de Caja Contrato de Obra

5.4.2 Plan Anual de Caja Contrato de Interventoría.

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

5.6 INFORME OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

6 REPORTES DE EJECUCIÓN MENSUAL INTERVENTORÍA

6.1 EQUIPO, VEHÍCULOS Y SEDE DE LA INTERVENTORÍA

6.2 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.2.1 Control Personal de Interventoría

6.2.2 Control de aportes legales y seguridad social contrato de interventoría.

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.3.1 Informe financiero y presupuestal

6.3.2 Forma de pago del contrato

6.3.3 Actas de Costos de Interventoría

6.4 SEGUIMIENTO A GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo de interventoría.

6.6.2 Plan de Cargas o Reprogramación al Plan de Cargas aprobado

6.6.3 Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES.

7.2 RECOMENDACIONES A LA ENTIDAD

8 ANEXOS

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe mensual No 4 del Contrato de Interventoría No 5032 de 2023 que tiene por objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", comprendido en el periodo del 1 al 31 de Julio de 2024.

El día veintisiete (27) de Diciembre de 2023, por parte del el INVIAS se da orden de inicio al Contrato de Interventoría No 5032 de 2023 teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos, para realizar el seguimiento a los Convenios solidarios No 2986, 4622, 2954 y 3411 de 2023.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- ha estructurado el programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total" a través del cual se pretende mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidarios.

Por tal razón el Instituto Nacional de Vías suscribió los Convenios Solidarios No 2986, 4622, 2954 y 3411 de 2023, con los Organismos de Acción Comunal, cuyo propósito se orientará necesariamente hacia la intervención de vías regionales en su jurisdicción. Los Objetos de cada proyecto se describen a continuación:

Convenio Solidario No 2986-2023.
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Convenio Solidario No 4622-2023.
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ETNIA WAYUU, MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTA

Convenio Solidario No 2954-2023.
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION

COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE JONJONCITO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Convenio Solidario No 3411-2023.
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SHIRURIA, MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

2.1.1 Localización del Corredor a intervenir

Los proyectos se encuentran localizados en los Municipios de Uribia y Manaure, en el Departamento de La Guajira.


El Municipio de Uribia ocupa una estratégica posición marítima y fronteriza; abarca toda la región de la Alta Guajira y una parte de la Media Guajira. En él se encuentra el Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira de la comunidad wayúu. Sus límites son:

- **Norte y Oriente**: con el mar Caribe.
- **Sur**: con Venezuela (Alta Guajira, Municipio Guajira, Estado Zulia).
- **Suroccidente**: con el municipio de Maicao.
- **Occidente**: con el municipio de Manaure.

El Municipio de Manaure es reconocido principalmente por encontrarse en este las salinas marítimas más importantes del país. El mar Caribe que bordea la costa, es la fuente más abundante de agua convirtiéndose no solo en generador de alimentos sino como elementos primarios para la industria de la sal, base de la economía de esta región. Sus

límites son:

- **Norte**: Con el mar Caribe.
- **Nororiente**: Con el municipio de Uribia.
- **Sur**: Con el municipio de Maicao.
- **Occidente**: Con el municipio de Riohacha.

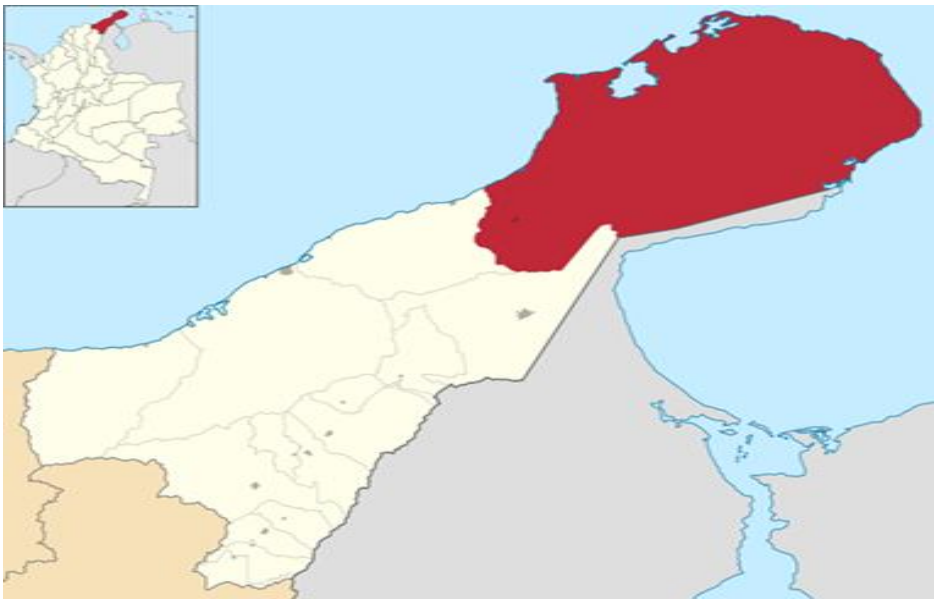

Localización Municipio de Uribia



Localización Municipio de Manaure

Figura 1. Localización del proyecto

- **Localización del Convenio Solidario No 2986 de 2023.**

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

El tramo vial a intervenir es la vía a Cardón, que conduce de Mareiwamana a casicho, entre las siguientes coordenadas:

- **Latitud inicial:** 11.90197
- **Longitud Inicial:** -72.185163
- **Latitud final:** 11.90936
- **Longitud final:** -72.197695

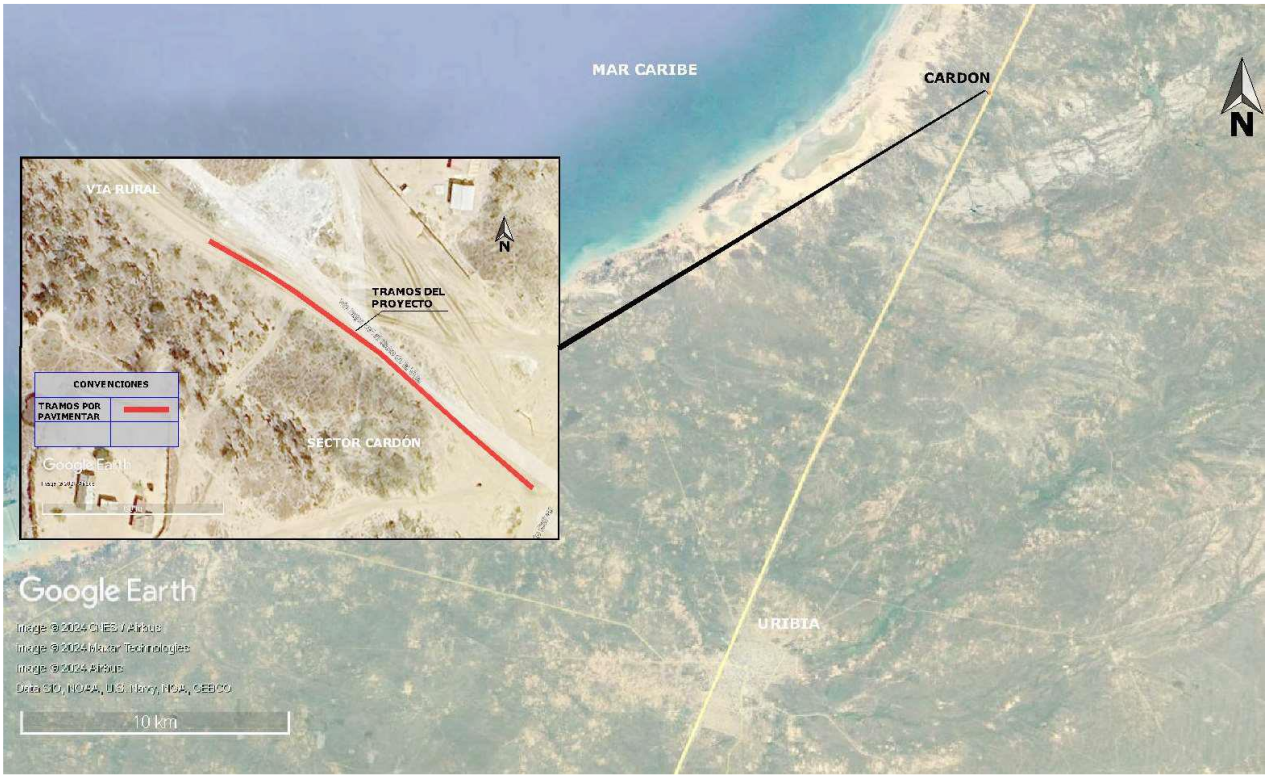


Figura 2. Localización del tramo a intervenir vía a Cardón

- **Localización del Convenio Solidario No 4622 de 2023.**

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ETNIA WAYUU, DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

El tramo vial a intervenir en el barrio Etnia Wayuu, es la vía que conduce al arroyo de Chemerrain, entre las siguientes coordenadas:

- **Latitud inicial:** 11.721666
- **Longitud Inicial:** - 72.254166
- **Latitud final:** 11.7258333
- **Longitud final:** 72.246668

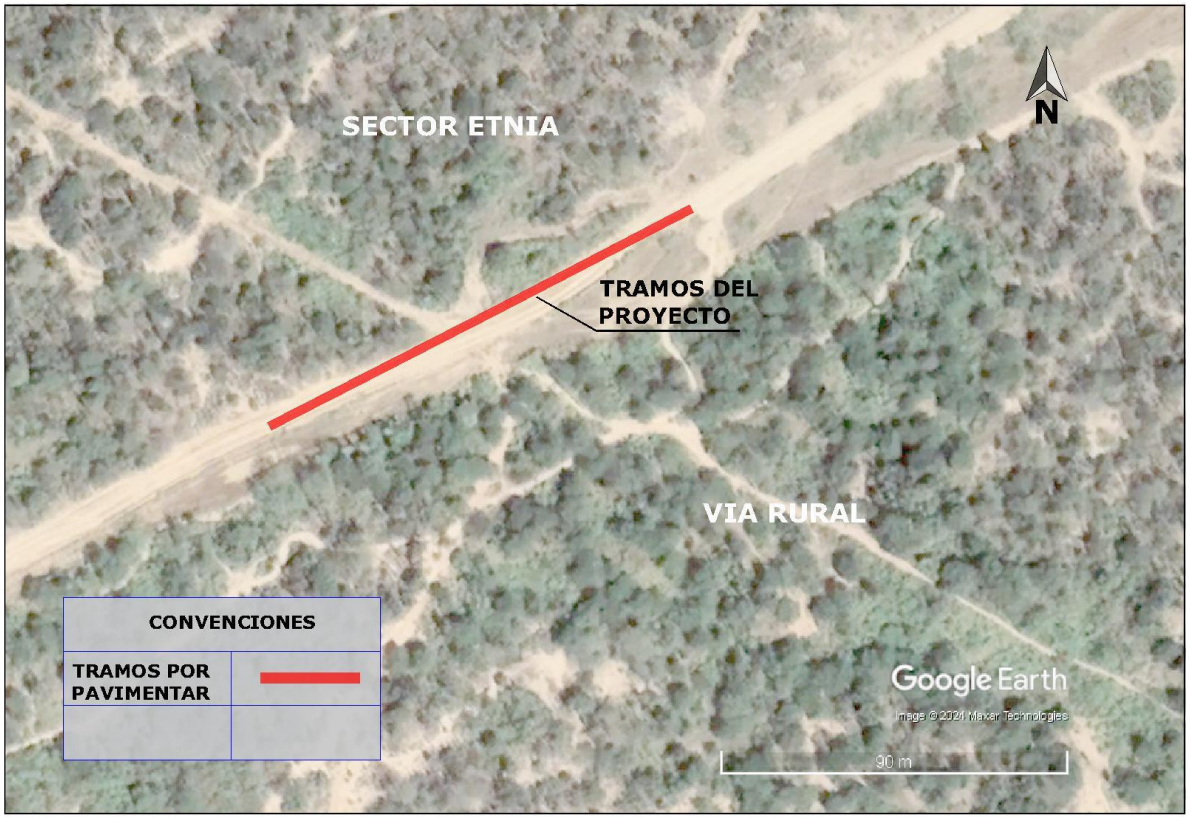


Figura 3. Localización del tramo a intervenir vía arroyo Chemarrain

- **Localización del Convenio Solidario No 2954 de 2023.**

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE JONJONCITO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

El tramo vial a intervenir es la vía que conduce hacia el Corregimiento de Jonjoncito en el sector de Jomarraali hasta Villa Sapa, entre las siguientes coordenadas:

- **Latitud inicial:** 11.777106
- **Longitud Inicial**: -72.135629
- **Latitud final:** 11.770224
- **Longitud final:** -72.151733




Figura 4. Localización del tramo a intervenir vía a Jonjoncito

- **Localización del Convenio Solidario No 3411 de 2023.**

Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SHIRURIA, MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

El tramo vial a intervenir corresponde a la vía que va desde Casa azul en la vía que comunica al Municipio de Manaure con Uribia, hasta el Corregimiento de Shiruria, entre las siguientes coordenadas:

- **Latitud inicial:** 11.766705
- **Longitud Inicial:** -72.335733
- **Latitud final:** 11.434242
- **Longitud final:** - 72.214166

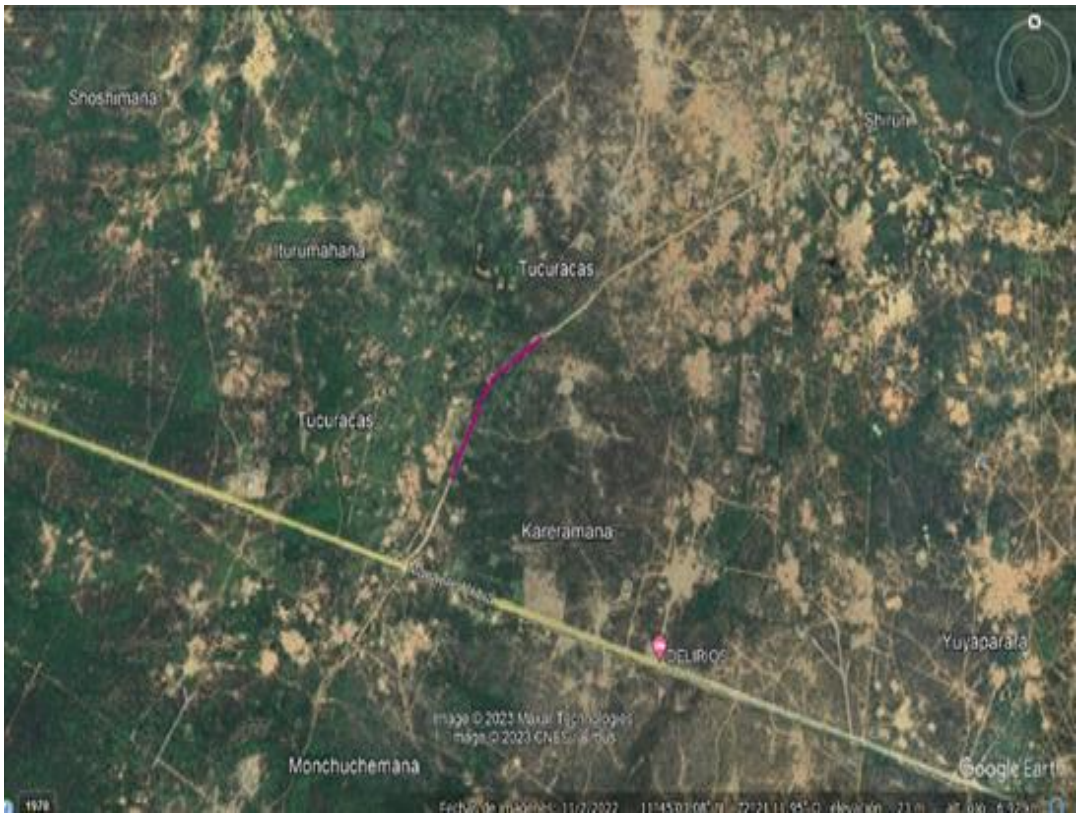

. Figura 5. Localización del tramo a intervenir vía a Shiruria

2.1.2 Localización del campamento y fuentes de materiales

A continuación, se indica la localización del campamento para cada uno de los Convenios Solidarios objeto de la Interventoría:

Convenio Solidario No 2986-2023.
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
El campamento estará ubicado en la comunidad de Cardón, Municipio de Uribia.

Convenio Solidario No 4622-2023.
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ETNIA WAYUU, MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
El campamento estará ubicado en el Barrio Etnia Wayuu, por el sector del Puente sobre el arroyo Chemarrain, Municipio de Uribia.

Convenio Solidario No 2954-2023.
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE JONJONCITO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
El campamento estará ubicado en el sector de Villa Sapa, Corregimiento de Jonjoncito, Municipio de Uribia.

Convenio Solidario No 3411-2023.
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SHIRURIA, MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
El campamento estará ubicado en la comunidad de Shiruria, Municipio de Manaure.

La Fuente de materiales, se encuentra ubicada en el corregimiento de Cuestecitas, en el Municipio de Albania, Departamento de la Guajira.



Figura 6. Localización del Municipio de Albania

2.2 MUNICIPIOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

El desarrollo de los proyectos beneficia directamente a los usuarios de las vías terciarias de las zonas rurales de los municipios de URIBIA y MANAURE, en el Departamento de la Guajira

Los principales beneficios del proyecto se encuentran en mejorar las condiciones de las vías de comunicación priorizadas las cuales son utilizadas de manera permanente para trasporte de productos comerciales, productos de ganadería y agricultura en cada región, impactando de esta manera el desarrollo de la región.

Los proyectos se encuentran enfocados en resolver las deficientes condiciones de movilidad en las áreas rurales de los municipios y en los problemas de acceso a estas comunidades de los habitantes de estos sectores, debido a que no existe una infraestructura óptima.

Teniendo en cuenta que se pretende promover la competitividad de los Municipios, se requiere de una oferta de transporte y malla vial adecuada que genere mecanismos facilitadores en el traslado, comunicación e interacción de la oferta de productos como la comercialización, con el fin de acceder de manera efectiva a los mercados interno y externo.

Así mismo, el mejoramiento de la infraestructura de la malla vial para el transporte promueve el desarrollo al interior de los municipios permitiendo mayor valorización y mejor calidad de vida de los habitantes del sector.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL SITIO DE LAS OBRAS

En la actualidad el Departamento de La Guajira no cuenta con una red vial rural en buenas condiciones, originando dificultad en la intercomunicación terrestre de la población rural con el resto del departamento, así pues por su estado precario, se ha priorizado los siguientes tramos de vía con lo que se pretende mejorar las condiciones de las mismas, ya que son utilizadas para trasporte de las comunidades indígenas, transporte de productos comerciales, productos de ganadería caprina, pesca y agricultura de las regiones. Dicha problemática tiene como efecto el bajo desarrollo socio- económico de las regiones.

Así mismo, el aumento de tiempos de viaje afecta el acceso oportuno a servicios médicos, la asistencia de estudiantes a los centros de enseñanza y ocasiona el aumento de costos de transporte de carga y pasajeros debido a que estos tramos son casi intransitables. Las vías para intervenir presentan similares características, corresponden a corredores rurales en condiciones regulares de transitabilidad, todas las vías carecen de estructura y tanto la calzada como las obras de drenaje son insuficientes para su conservación a través del tiempo, deterioradas rápidamente por el soporte del tránsito vehicular.

- Estado inicial de la Vía del Convenio Solidario No 2986 de 2023, que tiene por objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"



Figura 8. Estado inicial de la vía a Cardón



Sector Inicial



Sector Final

Figura 9. Sector Inicial y final de la vía a Cardón

- Estado inicial de la vía del Convenio Solidario No 2954 de 2023, que tiene por objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE JONJONCITO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"



Figura 10. Estado inicial de la vía a Jonjoncito



Sector Inicial



Sector Final

Figura 11. Sector Inicial y final de la vía a Jonjoncito

- Estado inicial de la vía del Convenio Solidario No 3411 de 2023, que tiene por objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SHIRURIA, MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."



Figura 12. Estado inicial de la vía a Shiruria

- Estado inicial de la vía del Convenio Solidario No 4622 de 2023, que tiene por objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ETNIA WAYUU, MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"



Sector Inicial



Sector Final

Figura 14. Sector Inicial y final de la vía Etnia Wayuu

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

- **Convenio Solidario No 2986 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Las obras se realizarán en la Zona Rural del Municipio de Uribia. El tramo vial a intervenir es la vía a Cardón, que conduce de Mareiwamana a Casicho
Las principales actividades y/u obras a ejecutar para el presente proceso son las siguientes:

✓ CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA
- Excavaciones varias sin Clasificar
- Subbase Granular Clase C
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

✓ CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS
- Excavaciones Varias sin Clasificar
- Excavaciones en roca en seco
- Demolición de Estructuras
- Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ
- Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ
- Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa
- Relleno para Estructuras con Suelo
- Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior
- Relleno para Estructuras con material producto de la excavación

- **Convenio Solidario No 4622 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ETNIA WAYUU, MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Las obras se realizarán en la Zona Rural del Municipio de Uribia. El tramo vial a intervenir es la vía que conduce al arroyo de Chemerrain,
Las principales actividades y/u obras a ejecutar para el presente proceso son las siguientes:

✓ CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA
- Excavaciones varias sin Clasificar
- Subbase Granular Clase C
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ
- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

- ✓ CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS
  - Excavaciones Varias sin Clasificar
  - Excavaciones en roca en seco
  - Demolición de Estructuras
  - Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ
  - Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ
  - Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa
  - Relleno para Estructuras con Suelo
  - Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior
  - Relleno para Estructuras con material producto de la excavación

➢ **Convenio Solidario No 2954 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE JONJONCITO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Las obras se realizarán en la Zona Rural del Municipio de Uribia. El tramo vial a intervenir es la vía que conduce hacia el Corregimiento de Jonjoncito en el sector de Jomarraali hasta Villa Sapa. Las principales actividades y/u obras a ejecutar para el presente proceso son las siguientes:

- ✓ CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA
  - Excavaciones varias sin Clasificar
  - Subbase Granular Clase C
  - Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ
  - Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)
  - Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

➢ **Convenio Solidario No 3411 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SHIRURIA, MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.". Las obras se realizarán en la Zona Rural del Municipio de Manaure. El tramo vial a intervenir es la vía que va desde Casa azul en la vía que comunica al Municipio de Manaure con Uribia, hasta el Corregimiento de Shiruria Las principales actividades y/u obras a ejecutar para el presente proceso son las siguientes:

- ✓ CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA
  - Excavaciones varias sin Clasificar
  - Subbase Granular Clase C
  - Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ
  - Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)
  - Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

- ✓ CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS

- Excavaciones Varias sin Clasificar
- Excavaciones en roca en seco
- Demolición de Estructuras
- Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ
- Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ
- Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa
- Relleno para Estructuras con Suelo
- Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior
- Relleno para Estructuras con material producto de la excavación

2.5 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.5.1 Descripción / Alcance y meta física Inicial

➢ **Convenio Solidario No 2986 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

- 110 ML PLACA HUELLA
- 1 ALCANTARILLA TIPO 2 6ML

➢ **Convenio Solidario No 4622 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ETNIA WAYUU, MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

- 113 ML PLACA HUELLA
- 1 ALCANTARILLA TIPO 2 6ML

➢ **Convenio Solidario No 2954 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE JONJONCITO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

- 126 ML PLACA HUELLA

➢ **Convenio Solidario No 3411 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SHIRURIA, MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

- 113 ML PLACA HUELLA
- 1 ALCANTARILLA TIPO 2 6ML

2.5.2 Descripción / Alcance y meta física actualizada

A la fecha, los Convenios solidarios se encuentran en la etapa de revisión y ajustes de los diseños. Una vez se tengan los resultados de los mismos, se entregará la meta física actualizada.

3. CONVENIO SOLIDARIO

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

3.1.1 Datos del Convenio

- **Información Convenio Solidario No 2986 de 2023.**

CONVENIO SOLIDARIO No 2986 DE 2023	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA:	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE URIBÍA
NIT	901.656.273-8.
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ORLANDO KORZO SOCARRAS
N° IDENTIFICACIÓN:	5.184.696 DE URIBIA - LA GUAJIRA
VALOR:	CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ($191.227.860) MONEDA CORRIENTE.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO:	31 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE INICIO	27 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	29 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO No. 01	17 DE ENERO DE 2024
PRÓRROGA No 1	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No 2	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No 3	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024
PRÓRROGA No 4	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

- **Información Convenio Solidario No 4622 de 2023.**

CONVENIO SOLIDARIO NO 4622 DE 2023	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ETNIA WAYUU, MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ETNIA WAYUU
NIT	901.656.261-1.
REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIO RUBEN GOMEZ RUZ,
N° IDENTIFICACIÓN:	17.868.328 DE URIBIA - LA GUAJIRA
VALOR:	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 189.034.380). MONEDA CORRIENTE.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 01	29 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO No. 01	17 DE ENERO DE 2024
PRÓRROGA No 1	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No 2	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No 3	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024
PRÓRROGA No 4	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

- **Información Convenio Solidario No 2954 de 2023.**

CONVENIO SOLIDARIO NO 2954 DE 2023	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE JONJONCITO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE JONJONCITO
NIT	901.656.168-2.
REPRESENTANTE LEGAL:	LINDEY ALMAZO ROSADO,
N° IDENTIFICACIÓN:	27.034.690 DE URIBIA - LA GUAJIRA
VALOR:	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($189.974.442) MONEDA CORRIENTE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO:	25 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE INICIO	27 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 01	29 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO No. 01	17 DE ENERO DE 2024
PRÓRROGA No 1	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No 2	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No 4	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

- **Información Convenio Solidario No 3411 de 2023.**

CONVENIO SOLIDARIO No 3411 DE 2023	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SHIRURIA, MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SHIRURIA
NIT	825.001.809-9
REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIO RAFAEL EPIEYU HENRIQUEZ
N° IDENTIFICACIÓN:	17.859.722 DE MANAURE - LA GUAJIRA
VALOR:	CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($191.716.260,00) MONEDA CORRIENTE.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 01	29 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO No. 01	17 DE ENERO DE 2024
PRÓRROGA No 1	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No 2	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No 3	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024
PRÓRROGA No 4	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

3.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO Y ACUMULADAS

3.2.1 Etapa de Revision de Estudios y Diseños

- **Convenio Solidario No 2986 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Durante el mes de Julio se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Se realizó la Socialización del proyecto.

- ✓ Se realizó el acta de comité mensual de Seguimiento Contractual. Se solicitó a la junta de acción comunal dar cumplimiento a los plazos establecidos para la entrega del presupuesto ajustado y el plan de compras, para poder dar inicio a las obras. También se solicitó el reintegro al Tesoro Nacional, de los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por el Instituto Nacional de Vías.

- ✓ Se realizaron reuniones con los integrantes de las juntas de acción comunal, informando los requisitos y cotizaciones que se deben aprobar para el inicio de las obras.

- ✓ Se realizó reunión en la Dirección Territorial Guajira del Invias, entre La Interventoría, el Supervisor por parte del Invias Ingeniero Elvin Gonzáles y El Ingeniero de Apoyo a la Supervisión Ing. Isaac Zuleta, se dieron las instrucciones para la correcta ejecución de las actividades contractuales, el seguimiento que debe realizar la Interventoría de acuerdo al Manual de Interventoría del Invías y la importancia de dar cumplimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- ✓ La junta de acción comunal informa que dará inicio a las obras, con la ejecución de la Alcantarilla, para lo cual solicita el desembolso inicial, de acuerdo al plan de compras.

- ✓ Se dieron las instrucciones y se solicitó la implementación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), de manera que la Junta cumpla con los requerimientos sociales y ambientales establecidos por las autoridades competentes respectivas y las contempladas en la legislación vigente para el proyecto.

- ✓ Se realizó asistencia a las capacitaciones del Instituto Nacional de Vías en el área contable, financiera, administrativo, ambiental y técnico para el adecuado desarrollo del convenio y los procesos que se deben llevar a cabo durante su ejecución.

- **Convenio Solidario No 4622 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ETNIA WAYUU, MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Durante el mes de Julio se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Se realizó el acta de comité mensual de Seguimiento Contractual. se solicitó a la junta de acción comunal dar cumplimiento a los plazos establecidos para la entrega del presupuesto ajustado y el plan de compras, para poder dar inicio a las obras. También se solicitó el reintegro al Tesoro Nacional, de los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por el Instituto Nacional de Vías.

- ✓ Se realizaron reuniones con los integrantes de las juntas de acción comunal, informando los requisitos y cotizaciones que se deben aprobar para el inicio de las obras.

- ✓ Se realizó reunión en la Dirección Territorial Guajira del Invias, entre La Interventoría, el Supervisor por parte del Invias Ingeniero Elvin Gonzáles y El Ingeniero de Apoyo a la Supervisión Ing. Isaac Zuleta, se dieron las instrucciones para la correcta ejecución de las actividades contractuales, el seguimiento que debe realizar la Interventoría de acuerdo al Manual de Interventoría del Invías y la importancia de dar cumplimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- ✓ La junta de acción comunal informa que dará inicio a las obras, con la ejecución de la placa huella. Se realizó el desembolso inicial, de acuerdo al plan de compras. Se realizó el transporte de la subbase al sitio de ejecución de las obras.

- ✓ Se realizó la instalación de la valla publicitaria y se realizaron las charlas técnicas, de seguridad a los empleados para el adecuado desarrollo de las actividades.

- ✓ Se dieron las instrucciones y se solicitó la implementación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), de manera que la Junta cumpla con los requerimientos sociales y ambientales establecidos por las autoridades competentes respectivas y las contempladas en la legislación vigente para el proyecto.

- ✓ Se realizó asistencia a las capacitaciones del Instituto Nacional de Vías en el área contable, financiera, administrativo, ambiental y técnico para el adecuado desarrollo del convenio y los procesos que se deben llevar a cabo durante su ejecución.

- **Convenio Solidario No 2954 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE JONJONCITO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Durante el mes de Julio se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Se realizó el acta de comité mensual de Seguimiento Contractual. se solicitó a la junta de acción comunal dar cumplimiento a los plazos establecidos para la entrega del presupuesto ajustado y el plan de compras, para poder dar inicio a las obras. También se solicitó el reintegro al Tesoro Nacional, de los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por el Instituto Nacional de Vías.

- ✓ Se realizaron reuniones con los integrantes de las juntas de acción comunal, informando los requisitos y cotizaciones que se deben aprobar para el inicio de las obras.

- ✓ Se realizó reunión en la Dirección Territorial Guajira del Invias, entre La Interventoría, el Supervisor por parte del Invias Ingeniero Elvin Gonzáles y El Ingeniero de Apoyo a la Supervisión Ing. Isaac Zuleta, se dieron las instrucciones para la correcta ejecución de las actividades contractuales, el seguimiento que debe realizar la Interventoría de acuerdo al Manual de Interventoría del Invías y la importancia de dar cumplimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- ✓ La junta de acción comunal informa que dará inicio a las obras, con la ejecución de la placa huella. Se realizó el desembolso inicial, de acuerdo al plan de compras. Se realizó el transporte de la subbase al sitio de ejecución de las obras.

- ✓ Se dieron las instrucciones y se solicitó la implementación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), de manera que la Junta cumpla con los requerimientos sociales y ambientales establecidos por las autoridades competentes respectivas y las contempladas en la legislación vigente para el proyecto.

- ✓ Se realizó asistencia a las capacitaciones del Instituto Nacional de Vías en el área contable, financiera, administrativo, ambiental y técnico para el adecuado desarrollo del convenio y los procesos que se deben llevar a cabo durante su ejecución.

- **Convenio Solidario No 3411 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SHIRURIA, MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

Durante el mes de Julio se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Se realizó la Socialización del proyecto.

- ✓ Se realizó el acta de comité mensual de Seguimiento Contractual. Se solicitó a la junta de acción comunal dar cumplimiento a los plazos establecidos para la entrega del presupuesto ajustado y el plan de compras, para poder dar inicio a las obras. También se solicitó el reintegro al Tesoro Nacional, de los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por el Instituto Nacional de Vías.

- ✓ Se realizaron reuniones con los integrantes de las juntas de acción comunal, informando los requisitos y cotizaciones que se deben aprobar para el inicio de las obras.

- ✓ Se realizó reunión en la Dirección Territorial Guajira del Invias, entre La Interventoría, el Supervisor por parte del Invias Ingeniero Elvin Gonzáles y El Ingeniero de Apoyo a la Supervisión Ing. Isaac Zuleta, se dieron las instrucciones para la correcta ejecución de las actividades contractuales, el seguimiento que debe realizar la Interventoría de acuerdo al Manual de Interventoría del Invías y la importancia de dar cumplimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- ✓ La junta de acción comunal informa que dará inicio a las obras, con la ejecución del movimiento de tierra para la construcción de pavimento rígido, para lo cual solicita el desembolso inicial, de acuerdo al plan de compras.

- ✓ Se dieron las instrucciones y se solicitó la implementación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), de manera que la Junta cumpla con los requerimientos sociales y ambientales establecidos por las autoridades competentes respectivas y las contempladas en la legislación vigente para el proyecto.

- ✓ Se realizó asistencia a las capacitaciones del Instituto Nacional de Vías en el área contable, financiera, administrativo, ambiental y técnico para el adecuado desarrollo del convenio y los procesos que se deben llevar a cabo durante su ejecución.

3.2.2 Obras de Mejoramiento – Placa Huella

- **Convenio Solidario No 2986 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

Las principales actividades y/u obras a ejecutar para el presente proceso son las siguientes:

- CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA
- CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS

La Junta de Acción Comunal informa que dará inició a las actividades con la construcción de la Alcantarilla, para lo cual realizó la entrega del plan de compras para el transporte de materiales, personal profesional y técnico, alquiler de equipos y maquinarias, para proceder al desarrollo de las siguientes actividades:

- Excavaciones Varias sin Clasificar
- Demolición de Estructuras
- Concreto reforzadoresistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ
- Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ
- Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa
- Relleno para Estructuras
- Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior
- Relleno para Estructuras con material producto de la excavación

A la fecha, La Interventoría se encuentra realizando las revisiones del plan de compras y gestiones administrativas para efectuar el desembolso al contratista e iniciar el desarrollo de las actividades.

- **Convenio Solidario No 4622 de 2023.**

  Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ETNIA WAYUU, MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

  Las principales actividades y/u obras a ejecutar para el presente proceso son las siguientes:
  - CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

  La Junta de Acción Comunal realizó la entrega del plan de compras para el transporte de materiales, personal profesional y técnico, alquiler de equipos y maquinarias, para proceder al desarrollo de las siguientes actividades:

  - Excavaciones varias sin Clasificar
  - Subbase Granular Clase C
  - Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ
  - Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)
  - Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

  La Interventoría realizó el desembolso solicitado por la Junta. Se realizó el inicio de las actividades con la instalación de la valla publicitaria, transporte de herramientas y equipos y el transporte del material de subbase.

- **Convenio Solidario No 2954 de 2023.**
  Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE JONJONCITO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

  Las principales actividades y/u obras a ejecutar para el presente proceso son las siguientes:
  - CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

  La Junta de Acción Comunal realizó la entrega del plan de compras para el transporte de materiales, personal profesional y técnico, alquiler de equipos y maquinarias, para proceder al desarrollo de las siguientes actividades:

- Excavaciones varias sin Clasificar
- Subbase Granular Clase C
- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ

- Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)
- Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)

La Interventoría realizó el desembolso solicitado por la Junta. Se realizó el inicio de las actividades con la instalación de la valla publicitaria, transporte de herramientas y equipos y el transporte del material de subbase.

- **Convenio Solidario No 3411 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SHIRURIA, MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

Las principales actividades y/u obras a ejecutar para el presente proceso son las siguientes:

- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO

La Junta de Acción Comunal realizó la entrega del plan de compras para el transporte de materiales, personal profesional y técnico, alquiler de equipos y maquinarias, para proceder al desarrollo de las siguientes actividades:

- Excavación de la explanación, canales y préstamos
- Subbase Granular Clase C
- Pavimento Concreto Hidràulico
- Bordillo de Concreto

A la fecha, La Interventoría se encuentra realizando las revisiones del plan de compras y gestiones administrativas para efectuar el desembolso al contratista e iniciar el desarrollo de las actividades

3.2.3 Valores ejecutados

A continuación, se indican los valores desembolsados a las juntas:

- **Convenio Solidario No 2986 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

DESEMBOLSOS REALIZAODS			
DESCRIPCIÓN	**PROVEEDOR**	**IDENTIFICACIÓN**	**VALOR**
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	ÁLVARO KORZO SOCARRAS	5.184.696	$ 1.410.986,00
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD	ÁLVARO KORZO SOCARRAS	5.104.696	$ 279.105,00
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	YUL FRONTADO SUAREZ	84.031.083	$ 400.000,00
CAJA MENOR INICIO DE PROYECTO GASTOS DMINISTRATIVOS	ÁLVARO KORZO SOCARRAS	5.184.696	$ 300.000,00
SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTADOR	WYLLKYNS WALLID AVILA DE LA ROSA	17.904.778	$ 700.000,00
SERVICIOS PRESTADOS COMO INGENIERO RESIDENTE	YESMAR JOSÉ OCHOA	1.192.810.117	$ 1.750.000,00
ESTUDIO DE SUELOS	LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO JG	18.965.820	$ 1.700.000,00
SERVICIO DE COMISIÓN TOPOGRAFÍCA	ARLEY OSPINA MARÍN	1.118.835	$ 1.209.500,00
VALLA INFORMATIVA	J&G PUBLICIDAD	901.469.225	$ 80.000,00
EXAMEN DE INGRESO	MARIO OSORIO LÓPEZ	10.113.177	$ 350.000,00
REVISIÓN Y/O AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	MIGUEL GARCÍA ROMANI	8.779.465	$ 5.500.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL	KATHY YULIETT SOSSA CABARCAS	1.081.832.778	$ 2.800.000,00
DOTACIÓN Y SEGURIDAD	GRUPO GRAN COLOMBIA S.A.S	NIT 901485647	$ 2.009.000,00
VALOR TOTAL			**$ 18.488.591,00**
VALOR TOTAL DEL CONVENIO			**$ 191.227.860,00**
VALOR PENDIENTE POR DESEMBOLSAR			**$ 172.739.269,00**

- **Convenio Solidario No 4622 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ETNIA WAYUU, MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

DESEMBOLOSOS AUTORIZADOS			
DESCRIPCIÓN	**PROVEEDOR**	**IDENTIFICACIÓN**	**VALOR**
REINTEGRO GASTOS DE POLIZAS	CLAUDIO RUBEN GOMEZ RUIZ	17.868.328	$ 1.319.789,08
TRANSPORTE	JORGE ALDEMAR BELTRAN SANTAMARIA	79.415.520	$ 300.000,00
TOPOGRAFIA	ARLEY OSPINA MARIN	1.118.837.779	$ 1.140.000,00
ESTUDIO DE SUELO	OSCAR IVAN GUERRA CHINCHIA	1.032.375.674	$ 1.700.000,00
CALA MENOR - PAPELERIA	CLAUDIO RUBEN GOMEZ RUIZ	17.868.328	$ 300.000,00
CONTADOR	HERMES AUGUSTO FORERO GUERRERO	5.184.237	$ 700.000,00
PAGO REVISION Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	JOSE ALBERTO RONDON	27.034.690	$ 5.300.000,00
PAGO PRÓRROGA POLIZA CUMPLIMIENTO NB-100295468 Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL NB-100072954	CLAUDIO RUBEN GOMEZ RUZ	17.868.328	$ 267.911,00
TRANSPORTE	JORGE ALDEMAR BELTRAN SANTAMARÍA	79.415.520	$ 200.000,00
SERVICIOS PRESTADOS ING AMBIENTAL PAGA	YERSSON MANUEL DIAZ AGUIRRE	1.065.648.119	$ 1.500.000,00
CAJA MENOR INCIO DE PROYECTO SEGÚN COSTOS ADMINSITRATIVOS APROBADOS MES 2	CLAUDIO RUBEN GOMEZ RUZ	17.868.328	$ 300.000,00
REEMBOLSO GASTOS DE SOCIALIZACIÓN INICIAL	CLAUDIO RUBEN GOMEZ RUZ	17.868.328	$ 350.000,00
PAGO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	LEIDY ANDREA GONZALEZ YEPES	1.140.817.584	$ 660.000,00
SERVICIOS PRESTADOS INGENIERO RESIDENTE	FREDY ENRIQUE MAGDANIEL TORRES	1.118.863.222	$ 1.750.000,00
IMPRESIÓN DE VALLA	JUAN GONZALES	NIT: 901469225-2	$ 340.000,00
´DOTACIÓN Y SEGURIDAD	EDILMA ROSA AGAMEZ FURNIELES	NIT 26211014 -3	$ 1.937.000,00

MEDIDAS AMBIENTALES	FERRETERÍA JS	NIT 1.037.369.206-0	$ 1.285.000,00
PAGO DE MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR	JIMMY GONZALES BRITO	17.869.182	$ 4.000.000,00
PAGO DE TRANSPORTE DE SUBBASE GRANULAR	JIMMY GONZALES BRITO	17.869.182	$ 12.000.000,00
ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA RETROCARGADOR	ADALBERTO JOSE VILLALOBO HENRIQUEZ	1.124.498.912	$ 6.420.000,00
TRANSPORTE DE MAQUINARIA AMARILLA	JOSE GONZALEZ BRITO	17.866.766	$ 2.000.000,00
TRANSPORTE PRESIDENTE JUNTA	CLAUDIO RUBEN GOMEZ RUZ	17.868.328	$ 400.000,00
CONTADOR PUBLICO (CPS)	HERMES AUGUSTO FORERO GUERRERO	5.184.237	$ 1.400.000,00
INGENIERO RESIDENTE (CPS)	FREDY ENRIQUE MAGDANIEL TORRES	1.118.863.222	$ 3.500.000,00
VALOR TOTAL			**$ 49.069.700,08**
VALOR TOTAL DEL CONVENIO			**$ 189.034.380,00**
VALOR PENDIENTE POR DESEMBOLSAR			**$ 139.964.679,92**

- **Convenio Solidario No 2954 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE JONJONCITO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

DESEMBOLSOS REALIZAODS			
DESCRIPCIÓN	**PROVEEDOR**	**IDENTIFICACIÓN**	**VALOR**
REINTEGRO GASTOS DE POLIZAS	LINDEY ALMAZO ROSADO	27.034.690	$ 1.764.269,00
TRANSPORTE	JORGE ALDEMAR BELTRAN SANTAMARIA	79.415.520	$ 1.200.000,00
TOPOGRAFIA	ARLEY OSPINA MARIN	1.118.837.779	$ 1.140.000,00
ESTUDIO DE SUELO	OSCAR IVAN GUERRA CHINCHIA	1.032.375.674	$ 1.700.000,00
CALA MENOR - PAPELERIA	LINDEY ALMAZO ROSADO	27.034.690	$ 300.000,00

CONTADOR	HERMES AUGUSTO FORERO GUERRERO	5.184.237	$ 700.000,00
INGENIERO RESIDENTE	DIEGO FERNANDO MUÑOS ORTIZ	13.540.921	$ 1.750.000,00
PAGO REVISION Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	JOSE ALBERTO RONDON	27.034.690	$ 5.300.000,00
PAGO PRÓRROGA POLIZA CUMPLIMIENTO NB-100295468 Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL NB-100072954	LINDEY ALMAZO ROSADO	27.034.690	$ 103.415,89
TRANSPORTE	JORGE ALDEMAR BELTRAN SANTAMARÍA	79.415.520	$ 800.000,00
SERVICIOS PRESTADOS ING AMBIENTAL PAGA	YERSSON MANUEL DIAZ AGUIRRE	1.065.648.119	$ 1.500.000,00
CAJA MENOR INCIO DE PROYECTO SEGÚN COSTOS ADMINSITRATIVOS APROBADOS MES 2	LINDEY ALMAZO ROSADO	27.034.690	$ 300.000,00
REEMBOLSO GASTOS DE SOCIALIZACIÓN INICIAL	LINDEY ALMAZO ROSADO	27.034.690	$ 350.000,00
PAGO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	LEIDY ANDREA GONZALEZ YEPES	1.140.817.584	$ 660.000,00
IMPRESIÓN DE VALLA	JUAN GONZALES	NIT: 901469225-2	$ 340.000,00
´DOTACIÓN Y SEGURIDAD	EDILMA ROSA AGAMEZ FURNIELES	NIT 26211014 -3	$ 1.937.000,00
MEDIDAS AMBIENTALES	FERRETERÍA JS	NIT 1.037.369.206-0	$ 1.285.000,00
SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES.Subbase Granular Clase C para relleno.	JIMMY GONZALES BRITO	17.869.182	$ 3.600.000,00
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIIALES. Desde Cantera hasta Jonjoncito - Mun. de Uribia	JIMMY GONZALES BRITO	17.869.182	$ 16.200.000,00
SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA. 15 horas Retrocargador Tipo Pajarita y 24 horas Vibrocompactador 3 Ton.	ADALBERTO JOSE VILLALOBO HENRIQUEZ	1.124.498.912	$ 7.050.000,00

TRASLADO DE MAQUINARIA AMARILLA. Transporte de Retrocargador Pajarita y Vibrocompactador 3 Ton desde Uribia a Corregimiento Jonjoncito.	JOSE GONZALEZ BRITO	17.866.766	$ 3.000.000,00
PAGO DE VIAJES MUNICIPIO URIBIA - CORREGIMIENTO DE JONJONCITO Transporte de proveedores de maquinaria y Subbase identificacion del sitio de obra en Jonjoncito.	JORGE ALDEMAR BELTRAN SANTAMARÍA	79.415.520	$ 400.000,00
CONTADOR PUBLICO (CPS)	HERMES AUGUSTO FORERO GUERRERO	5.184.237	$ 1.400.000,00
INGENIERO RESIDENTE (CPS)	DIEGO FERNANDO MUÑOZ ORTIZ	13.540.921	$ 3.500.000,00
PAGO ALQUILER DE ALMACEN. Corregimiento Jononcito Sector Villasapa. Almacen y Vivienda.	ALTAGRACIAS EPINAYU EPINAYU	56.069.096	$ 800.000,00
VALOR TOTAL			**$ 57.079.684,89**
VALOR TOTAL DEL CONVENIO			**$ 189.974.442,00**
VALOR PENDIENTE POR DESEMBOLSAR			**$ 132.894.757,11**

- **Convenio Solidario No 3411 de 2023.**
  Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SHIRURIA, MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

  A la fecha, no se han realizado desembolsos.

3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

Al cierre del presente informe, no se presentaron Ítems No previstos en los Convenios Solidarios a los que se les realiza la Interventoría.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR LA INTERVENTORÍA

- **Convenio Solidario No 2986 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

A la fecha no se han realizado actividades en obra. La junta de acción comunal informa que dará inicio a las obras, con la ejecución de la Alcantarilla, para lo cual solicita el desembolso inicial, de acuerdo al plan de compras.

Para el siguiente periodo, se tiene programado realizar las siguientes actividades:

- ✓ Inicio de las actividades en Obra con la construcción de Alcantarilla.
- ✓ Inicio de la construcción de la placa huella
- ✓ Realizar seguimiento al programa de obra, el programa de inversiones, plan de calidad y demás documentos contractuales exigidos en el convenio.
- ✓ Realizar seguimiento y control de las actividades ejecutadas en la obra, verificando que se cumplan las especificaciones técnicas y procesos constructivos del proyecto.
- ✓ Realizar el seguimiento y control para que las actividades se ejecuten dando cumplimiento a los lineamientos y contenido de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del Instituto Nacional de Vías.

- **Convenio Solidario No 4622 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ETNIA WAYUU, MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

La junta de acción comunal informa que dará inicio a las obras, con la ejecución de la placa huella. Se realizó el desembolso inicial, de acuerdo al plan de compras. Se realizó el transporte de la subbase al sitio de ejecución de las obras.

Para el siguiente periodo, se tiene programado realizar las siguientes actividades:

- ✓ Realizar la extendido, conformación y compactación de la subbase
- ✓ Iniciar la Construcción de la Placa Huella

- ✓ Realizar seguimiento al programa de obra, el programa de inversiones, plan de calidad y demás documentos contractuales exigidos en el convenio.

- ✓ Realizar seguimiento y control de las actividades ejecutadas en la obra, verificando que se cumplan las especificaciones técnicas y procesos constructivos del proyecto.

- ✓ Realizar el seguimiento y control para que las actividades se ejecuten dando cumplimiento a los lineamientos y contenido de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del Instituto Nacional de Vías.

- ➢ **Convenio Solidario No 2954 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE JONJONCITO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

La junta de acción comunal informa que dará inicio a las obras con la ejecución de la placa huella. Se realizó el desembolso inicial, de acuerdo al plan de compras. Se realizó el transporte de la subbase al sitio de ejecución de las obras.

Para el siguiente periodo, se tiene programado realizar las siguientes actividades:

- ✓ Realizar la extendido, conformación y compactación de la subbase

- ✓ Iniciar la Construcción de la Placa Huella

- ✓ Realizar seguimiento al programa de obra, el programa de inversiones, plan de calidad y demás documentos contractuales exigidos en el convenio.

- ✓ Realizar seguimiento y control de las actividades ejecutadas en la obra, verificando que se cumplan las especificaciones técnicas y procesos constructivos del proyecto.

- ✓ Realizar el seguimiento y control para que las actividades se ejecuten dando cumplimiento a los lineamientos y contenido de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del Instituto Nacional de Vías.

- **Convenio Solidario No 3411 de 2023.**

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SHIRURIA, MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

A la fecha no se han realizado actividades en obra. La junta de acción comunal informa que dará inicio a las obras, con la ejecución de las actividades del movimiento de tierra para luego proceder con la construcción de pavimento rígido, para lo cual solicita el desembolso inicial, de acuerdo al plan de compras.

Para el siguiente periodo, se tiene programado realizar las siguientes actividades:

- ✓ Inicio de las actividades en Obra con las actividades de movimiento de tierra
- ✓ Inicio de la construcción de pavimento rígido.
- ✓ Realizar seguimiento al programa de obra, el programa de inversiones, plan de calidad y demás documentos contractuales exigidos en el convenio.
- ✓ Realizar seguimiento y control de las actividades ejecutadas en la obra, verificando que se cumplan las especificaciones técnicas y procesos constructivos del proyecto.
- ✓ Realizar el seguimiento y control para que las actividades se ejecuten dando cumplimiento a los lineamientos y contenido de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del Instituto Nacional de Vías.

4 REPORTES DE EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIOS

4.1 INFORME SEMANAL

El Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 correspondiente a INFORME SEMANAL, se anexa al presente informe para cada uno de los Convenios Solidarios.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIOS

El Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 corresponde a Maquinaria y Equipo Contrato de Obra, en el cual la Interventoría lleva el registro diario de maquinaria y equipo dispuesto en el sitio de las obras y verifica el cumplimiento y estado del equipo mínimo exigido en el pliego de condiciones (A=Activo, R= En reparación, I= Inactivo).

Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el

estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.

Debido a que no se han iniciado actividades en obra, para el presente periodo no se presenta el diligenciamiento del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4, ya que no existen maquinarias ni equipos dispuestos en la obra.

4.3 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONVENIOS

4.3.1 Control del Personal de convenios

4.3.2 Control de aportes legales y seguridad social convenios

Para este ítem, se utiliza el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6. En este Formato, la Interventoría verifica el personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones y deja constancia de todas las aclaraciones y evidencias de la utilización del personal, de tal forma que se mantenga indemne al Instituto frente a cualquier posible reclamación.

Igualmente, el Interventor verifica el pago de los aportes legales y de seguridad social efectuados por el Contratista en desarrollo del contrato, según la normatividad vigente los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica de acuerdo con la normatividad vigente, cuando aplique.

Adjunto al presente informe, se presenta el diligenciamiento del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

4.4.1 Informe financiero y presupuestal

Para este ítem, se utiliza el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8, en el cual la Interventoría debe llevar el control financiero y presupuestal e indicar las acciones que conlleven de forma proactiva a la ejecución del proyecto, con el fin de que se ejecuten los recursos asignados para cada vigencia.

Debido a que no se han iniciado actividades en obra, para el presente periodo no se presenta el diligenciamiento del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8.

4.4.2 Forma de pago de los convenios

De acuerdo a la minuta de los Convenios Solidarios se tiene:

CLÁUSULA SÉPTIMA: GIROS DE LOS RECURSOS: EL INSTITUTO girará al **OAC** el valor

a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023, cuando el **OAC** cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente convenio. Dicho giro estará sujetos a la disponibilidad del PAC.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el giro de los recursos el **OAC** deberá presentar al **INSTITUTO** certificación bancaria con indicación expresa de ser cuenta de manejo conjunto a nombre del convenio, que genera rendimientos financieros, y sin posibilidad de sobregiro, en la que se podrá disponer de los recursos de manera electrónica y/o cheque y que requiere para el pago la autorización del representante legal del **OAC**, del interventor contratado por **EL INSTITUTO.**

PARÁGRAFO SEGUNDO: Mientras **El INSTITUTO** cumple con los requisitos de selección de la Interventoría, el Director Territorial Guajira tendrá la obligación de abrir la cuenta de manejo conjunto a nombre del convenio, más no la facultad de autorización de giros. Una vez seleccionado el interventor, la cuenta será manejada por el representante legal del **OAC**, de la Interventoría contratado por **EL INSTITUTO** y por el Supervisor del Contrato de Interventoría.

CLÁUSULA OCTAVA: MANEJO DE LOS RECURSOS Para la ejecución y manejo de los recursos del presente Convenio, se tendrá en cuenta lo siguiente:

I. El manejo de los recursos del Convenio se hará mediante la apertura de una cuenta que genere rendimientos financieros de manejo y firmas conjuntas, a nombre del objeto contratado y las transferencias electrónicas y los cheques que se giren con cargo a ella requerirán para ser pagados, la firma del representante legal del **OAC**, y del interventor y/o supervisor del **INSTITUTO**, y debe tener los respectivos soportes que justifiquen el desembolso. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el giro o desembolso podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará por que todo débito de la cuenta corresponda a gastos del convenio y que estén de acuerdo con el plan de inversión aprobado por el Interventor y/o supervisor.

II. El OAC mantendrá los recursos de manera separada e independiente de cualquiera otra clase de dinero que maneje o administre.

III. Los recursos del presente Convenio **NO** podrán ser destinados para ningún fin diferente al establecido en este Convenio y por lo tanto deberán ser estrictamente ejecutados por el **OAC** en la forma acordada en el mismo, so pena de dar inicio de las acciones legales a que haya lugar.

IV. De conformidad con lo previsto en el parágrafo del Artículo 60 de la Ley 2166 del 2021 el **OAC** deberá llevar registro contable en rubro especial del manejo de los recursos**.**

V. EL INSTITUTO en cualquier momento podrá solicitar al **OAC** los estados de cuenta, así como la información sobre la destinación de los recursos entregados y podrá pedir al **OAC** su restitución inmediata, si su manejo no se ajusta a lo acordado en el presente Convenio ni al objeto de este.

VI. Los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por **EL INSTITUTO** serán manejados y reintegrados al Tesoro Nacional conforme al inciso segundo del Artículo 33 del Decreto No. 4730 del 28 de diciembre del 2005 y el Decreto No. 1853 del 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique **El INSTITUTO**; la copia de la consignación debe ser remitida al **INSTITUTO** indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del recurso girado al **OAC**, el número, año

del convenio y el nombre del **OAC.** Es responsabilidad del Interventor y/o Supervisor del convenio verificar el cumplimiento de esta obligación.

VII. De la respectiva cuenta conjunta no se podrá hacer retiros en efectivo o transferencias electrónicas de fondos.

VIII. Los pagos a proveedores, contratistas y mano de obra no calificada no bancarizada deberán realizarse con pago en cheque o por ventanilla.

IX. Permitir la conciliación de los movimientos realizados en la cuenta bancaria con periodicidad mensual.

X. Si al momento de liquidarse el convenio se presentan excedentes de recursos en la cuenta, el **OAC**, consignará el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto disponga **EL INSTITUTO**, informando el número y año del convenio, el nombre del **OAC** y el concepto de la consignación, especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital**.** Es responsabilidad del Interventor y/o Supervisor del convenio verificar el cumplimiento de esta obligación.

XI. En los casos de caducidad del convenio o terminación unilateral o anticipada del mismo, el **OAC** reintegrara al **INSTITUTO** el saldo existente en la cuenta y sus rendimientos, de aquellos aportes en dinero realizados por **El INSTITUTO**, si a ellos hubo lugar, en la forma indicada por **EL INSTITUTO**, una vez esté el acto administrativo que así lo declare, debidamente ejecutoriado.

XII. El **OAC** debe remitir mensualmente al Interventor, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del desembolso, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del convenio, el nombre del **OAC**, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos si a ellos hubo lugar con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

PARÁGRAFO: Para la buena administración del giro o desembolso se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:

I. La cuenta debe ser abierta en una Entidad financiera autorizada por la Superintendencia Financiera.

II. La cuenta deberá mantenerse activa y debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título de giro o desembolso.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Para este ítem, se utiliza el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10, en el cual la Interventoría lleva el registro diario del estado general del tiempo; indicando el número de horas por día señalando la clase de tiempo: Seco, lluvias moderadas, lluvias intensas.

Debido a que no se han iniciado actividades en obra, para el presente periodo no se presenta el diligenciamiento del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Para este ítem, se utiliza el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11, en el cual la Interventoría

registra los resultados de los ensayos de laboratorio requeridos para verificar que las obras ejecutadas cumplan con las especificaciones de construcción y las normas de ensayo correspondientes.

Debido a que no se han iniciado actividades en obra, para el presente periodo no se presenta el diligenciamiento del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

4.7 SEGUIMIENTO A GARANTÍAS CONTRATO DE OBRA

Para este ítem, se utiliza el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12, en el cual la Interventoría realiza el seguimiento a las garantías y seguros del contrato de obra y verifica la aprobación de las mismas por parte de la Entidad en la plataforma del SECOP. Anexo al presente informe se presentan las garantías de los convenios solidarios.

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Para este ítem, se utiliza el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14, en el cual la Interventoría realiza el seguimiento y verifica el cumplimiento mensual del Plan de Calidad del Contrato de Obra y toma las acciones correctivas en el caso contrario.

Debido a que no se han iniciado actividades en obra, para el presente periodo no se presenta el diligenciamiento del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14. Se solicitó a las Juntas de acción comunal la entrega del plan de calidad. A la fecha, este documento se encuentra pendiente de entrega.

4.9 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

4.9.1 Seguimiento al Programa de Obra y de Inversiones

En este ítem, la Interventoría presenta el Programa de Obra y de Inversiones con el corte de avance correspondiente a la fecha de corte del informe mensual.

Adjunto al presente informe, se presenta el programa de obra para cada uno de los convenios Solidarios.

4.9.2 Actas de comité de obra o actas de reunión

Para este ítem, se utiliza el Formato MEPI-MN-IN-14-FR-1 en el cual la Interventoría registra la reunión semanal con el propósito de efectuar seguimiento al avance físico, financiero, presupuestal, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros durante la ejecución del contrato de obra.

No se han realizado las reuniones semanales, debido a que no han iniciado las actividades en obra.

cuando la reunión no corresponda a un comité de obra, se utiliza el Formato MEPI-MN-IN-14-FR-2. Durante el presente periodo, se realizaron reuniones con los integrantes de cada junta, con el objetivo de revisar cotizaciones y realizar la aprobación en los comités operativos.

Anexo al presente informe se presentan el acta de comité de seguimiento contractual y los comités operativos aprobados durante el presente periodo.

4.10 FUENTE DE MATERIALES

La Fuente de materiales, se encuentra ubicada en el corregimiento de Cuestecitas, en el Municipio de Albania, Departamento de la Guajira.

4.9.3 Resumen Mensual Estado General del Proyecto

CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	
JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°4**
CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 5032-2023	**MES: JULIO - 2024**

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **PERIODO MES:** MES No 4. JULIO 2024

CONTRATO DE OBRA No.: 2986-2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE URIBÍA (ASOJUNTAS)

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DICIEMBRE 2023
FECHA DE INICIO: 27/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 17/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2024
PLAZO ACUMULADO: 200 DÍAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 191.227.860,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 191.227.860,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5032 - 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Placa huella	ml	110
	Alcantarilla tipo 2	Und	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Placa huella	ml		
	Alcantarilla tipo 2	Und		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
APORTE OAC	$ 1.000.000,00		$ 1.000.000,00
OBRAS	$ 137.591.288,00		$ 137.591.288,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 3.446.047,00		$ 3.446.047,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.190.525,00		$ 49.190.525,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 191.227.860,00		$ 191.227.860,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
APORTE OAC				
OBRAS				
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 18.488.591,00			$ 18.488.591,00
VALOR EJECUTADO				

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 18.488.591,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES


MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO









PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 2522237430 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	
JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°4**
CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 5032-2023	**MES: JULIO - 2024**

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **PERIODO MES:** MES No 4. JULIO 2024

CONTRATO DE OBRA No.: 4622-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ETNIA WAYUU, MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ETNIA WAYUU, MUNICIPIO DE URIBIA

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DICIEMBRE 2023
FECHA DE INICIO: 21/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 17/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2024
PLAZO ACUMULADO: 206 DÍAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 189.034.380,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 189.034.380,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5032 - 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Placa huella	ml	113
	Alcantarilla tipo 2	Und	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Placa huella	ml		
	Alcantarilla tipo 2	Und		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
APORTE OAC	$ 1.000.000,00		$ 1.000.000,00
OBRAS	$ 134.810.657,00		$ 134.810.657,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.044.320,00		$ 4.044.320,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.179.403,00		$ 49.179.403,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 188.034.380,00		$ 188.034.380,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
APORTE OAC				
OBRAS				$ 19.349.700,08
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 29.720.000,00		$ 29.720.000,00	$ 49.069.700,08
VALOR EJECUTADO				

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 49.069.700,08
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO







PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 2522237430 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	
JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°4**
CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 5032-2023	**MES: JULIO - 2024**

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **PERIODO MES:** MES No 3. JUNIO 2024

CONTRATO DE OBRA No.: 2954-2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE JONJONCITO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE JONJONCITO, MUNICIPIO DE URIBIA

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DICIEMBRE 2023
FECHA DE INICIO: 27/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 17/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2024
PLAZO ACUMULADO: 200 DÍAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 189.974.442,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 189.974.442,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5032 - 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Placa huella	ml	126

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Placa huella	ml		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
APORTE OAC	$ 1.000.000,00		$ 1.000.000,00
OBRAS	$ 135.719.809,00		$ 135.719.809,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.071.594,00		$ 4.071.594,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.183.039,00		$ 49.183.039,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 188.974.442,00		$ 188.974.442,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
APORTE OAC				
OBRAS				
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 35.950.000,00		$ 35.950.000,00	$ 57.079.684,89
VALOR EJECUTADO				


INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 57.079.684,89
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO






PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 2522237430 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	
JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°4**
CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 5032-2023	**MES: JULIO - 2024**

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	30/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **PERIODO MES:** MES No.4, JULIO 2024

CONTRATO DE OBRA No.: 3411-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SHIRURIA, MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SHIRURIA, MUNICIPIO DE MANAURE

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DICIEMBRE 2023
FECHA DE INICIO: 28/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 17/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2024
PLAZO ACUMULADO: 198 DÍAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 191.716.260,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 191.716.260,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5032 - 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Placa huella	ml	113
	Alcantarilla tipo 2	Und	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Placa huella	ml		
	Alcantarilla tipo 2	Und		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
APORTE OAC	$ 1.000.000,00		$ 1.000.000,00
OBRAS	$ 137.404.352,00		$ 137.404.352,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.122.131,00		$ 4.122.131,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.189.777,00		$ 49.189.777,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 190.716.260,00		$ 190.716.260,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
APORTE OAC				
OBRAS				
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	NO SE HAN GIRADO RECURSOS			
VALOR EJECUTADO				

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO









PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 2522237430 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

5.1.1 Datos del Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 5032 DE 2023	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S
NIT	900.768.923-4
REPRESENTANTE LEGAL:	LEYDI MABEL PEREZ CHUD,
N° IDENTIFICACIÓN:	No 31.577.305 expedida en Cali (Valle del Cauca),
VALOR:	OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TREINTA Y UN PESOS ($82.340.031,00)
FECHA DE INICIO	27 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 de diciembre de 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	29 de diciembre de 2023
ACTA DE REINICIO No. 01	17 de enero de 2024
PRÓRROGA No 1	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No 2	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No 3	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024
PRÓRROGA No 4	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

5.2.1 Actividades específicas realizadas por la interventoría

- ✓ Se realizó el acta de comité mensual de Seguimiento Contractual. Se solicitó a las juntas de acción comunal dar cumplimiento a los plazos establecidos para la construcción de las obras. También se solicitó el reintegro al Tesoro Nacional, de los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por el Instituto Nacional de Vías.

- ✓ Se realizaron reuniones con los integrantes de las juntas de acción comunal, informando los requisitos y cotizaciones que se deben aprobar para el inicio de las obras.

- ✓ Se realizó reunión en la Dirección Territorial Guajira del Invias, entre La Interventoría, el Supervisor por parte del Invias Ingeniero Elvin Gonzáles y El Ingeniero de Apoyo a la Supervisión Ing. Isaac Zuleta, se dieron las instrucciones para la correcta ejecución de las actividades contractuales, el seguimiento que debe realizar la Interventoría de acuerdo al Manual de Interventoría del Invías y la importancia de dar cumplimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- ✓ Se realizó revisión del Informe de Ajustes de Estudios y Diseños, presentados por las Juntas de Acción Comunal.

- ✓ Se recibieron y revisaron las hojas de vida del personal.

- ✓ Se dieron las instrucciones y se solicitó la implementación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), de manera que la Junta cumpla con los requerimientos sociales y ambientales establecidos por las autoridades competentes respectivas y las contempladas en la legislación vigente para el proyecto.

- ✓ Se realizó asistencia a las capacitaciones del Instituto Nacional de Vías en el área contable, financiera, administrativo, ambiental y técnico para el adecuado desarrollo del convenio y los procesos que se deben llevar a cabo durante su ejecución.

- ✓ Se realizó el apoyo y coordinación desde el punto de vista técnico, administrativo, financiero y ambiental a las juntas de acción comunal, para el adecuado desarrollo de las actividades contratadas.

- ✓ Se realizó acompañamiento a las juntas de acción comunal durante la Socialización de los proyectos.

5.2.2 Control de correspondencia.

Adjunto al presente informe se presentan las correspondencias recibidas y enviadas.

5.2.3 Registro fotográfico

- **Convenio Solidario No 2986 de 2023.**

  Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"






















19 jun 2024 10:18:34 a. m.
11°42'48.60511"N -72°15'43.01539"W
68° E
Dg. 1 #9a-2 a, Tv. 9 A #174, Uribia, La Guajira, Colombia
Altitud:10.9m
Velocidad:0.0km/h
comité con la gestora del proyecto



- **Convenio Solidario No 4622 de 2023.**
  Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ETNIA WAYUU, MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"












29/05/2024, 4:54:13 p. m.
N 11° 43' 26", W 72° 15' 47"
Socialización
JAC ETNIA WAYUU
Uribia


29/05/2024, 4:56:41 p. m.
N 11° 43' 26", W 72° 15' 4"
Socialización
JAC ETNIA WAYUU
Uribia


19 jun 2024 10:18:34 a. m.
11°42'48.60511"N -72°15'43.01539"W
68° E
Dg. 1 #9a-2 a, Tv. 9 A #174, Uribia, La Guajira, Colombia
Altitud:10.9m
Velocidad:0.0km/h
comité con la gestora del proyecto


19 jun 2024 10:18:10 a. m
11°42'48.53988"N -72°15'42.94051"W
45° NE
Dg. 1 #9a-2 a, Tv. 9 A #174, Uribia, La Guajira, Colombia
Altitud:11.2m
Velocidad:0.0km/h
comité con la gestora del proyecto

- **Convenio Solidario No 2954 de 2023.**

  Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE JONJONCITO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"






















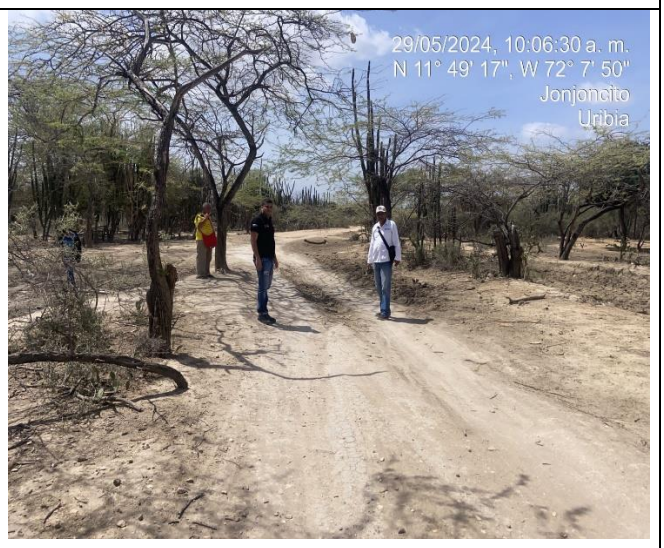


29/05/2024, 10:06:30 a. m.
N 11° 49' 17", W 72° 7' 50"
Jonjoncito
Uribia


29 may. 2024 10:25:00 a. m
11.821100383333333N 72.13090473333334W
Altitud:41.2m
Velocidad:0.9km/h
OAC BARRIO ETNIA WAYUU- URIBIA
Número de índice: 10


29 may. 2024 11:43:48 a. m.
11.821165N 72.13088591666666W
Altitud:36.4m
Velocidad:0.0km/h
OAC JONJONCITO - URIBIA
Número de índice: 110


19 jun 2024 10:18:10 a. m.
11°42'48.53988"N -72°15'42.94051"W
45° NE
Dg. 1 #9a-2 a, Tv. 9 A #174, Uribia, La Guajira, Colombia
Altitud:11.2m
Velocidad:0.0km/h
comité con la gestora del proyecto


19 jun 2024 10:18:34 a. m
11°42'48.60511"N -72°15'43.01539"W
68°
Dg. 1 #9a-2 a, Tv. 9 A #174, Uribia, La Guajira, Colombia
Altitud:10.9m
Velocidad:0.0km/h
comité con la gestora del proyecto

- **Convenio Solidario No 3411 de 2023.**

  Objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SHIRURIA, MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."










13/07/2024, 12:24:01 p. m.
N 11° 46' 0", W 72° 20' 11"
JAC
SHIRURIA MANAURE


13/07/2024, 12:21:53 p. m.
N 11° 46' 0", W 72° 20' 12"
JAC
SHIRURIA MANAURE


JAC
SHIRURIA MANAURE


JAC
SHIRURIA MANAURE


Junta De Accion Comunal De Shiruria






19 jun 2024 10:18:34 a. m.
11°42'48.60511"N -72°15'43.01539"W
68° E
Dg. 1 #9a-2 a, Tv. 9 A #174, Uribia, La Guajira, Colombia
Altitud:10.9m
Velocidad:0.0km/h
comité con la gestora del proyecto


INVIAS
29 may. 2024 2:45:29 p. m.
11.71354545N 72.26193103333334W
174 Transversal 9 A
Uribia
La Guajira
Altitud:26.0m
Velocidad:0.0km/h
Comité seg Contractual OAC Asojuntas Uribia - Shiruria Manaure
Número de índice: 135

5.3 INFORMES TÉCNICOS, PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS

Anexo al presente informe, se presentan los informes de revisión al Ajustes de estudios y diseños, por parte de los profesionales de la Interventoría.

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

5.4.1 Plan Anual de Caja Contrato de Obra

5.4.2 Plan Anual de Caja Contrato de Interventoría.

Debido a que no se han iniciado actividades en obra, para el presente periodo no se presenta informe del programa Anual de Caja – PAC.

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

Debido a que no se han iniciado actividades en obra, para el presente periodo no se presenta informe de matriz de riesgos.

5.6 INFORME OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

Debido a que no se han iniciado actividades en obra, para el presente periodo no se presenta información referente a otros programas y aplicativos.

6 REPORTES DE EJECUCIÓN MENSUAL INTERVENTORÍA

6.1 EQUIPO, VEHÍCULOS Y SEDE DE LA INTERVENTORÍA

Anexo al presente informe se presenta la información correspondiente a equipo y vehículos del Contrato de Interventoría con sus soportes.

6.2 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.2.1 Control Personal de Interventoría

6.2.2 Control de aportes legales y seguridad social contrato de interventoría.

Anexo al presente informe se presenta la información correspondiente a Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría.

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.3.1 Informe financiero y presupuestal

Anexo al presente informe se presenta el informe financiero y presupuestal del Contrato de Interventoría**.**

6.3.2 Forma de pago del contrato

De acuerdo a la minuta del contrato de Interventoría, se tiene:

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. – El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el valor del contrato, mensualmente mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos de personal aprobado por el INSTITUTO y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el Supervisor de Contrato de Interventoría, previa presentación y aprobación del informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor designado para el efecto, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar.

6.3.3 Actas de Costos de Interventoría

Anexo al presente informe, se presenta el acta de costos, correspondiente al mes de Julio de 2024.

6.4 SEGUIMIENTO A GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo al presente informe se presenta la información correspondiente a las Garantías del Contrato de Interventoría.

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA

Para este ítem, se utiliza el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15. En el cual el Interventor realiza el seguimiento y verifica el cumplimiento mensual del plan de calidad del contrato de interventoría a través del área de calidad definido para el contrato. Teniendo en cuenta que a la fecha no se han iniciado actividades en obra, para el presente mes no se presenta este formato.

6.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo de interventoría.

Para el Contrato de Interventoría, no se realizó giro de Anticipo.

6.6.2 Plan de Cargas o Reprogramación al Plan de Cargas aprobado

Anexo al presente informe, se presenta el Plan de Cargas

6.6.3 Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría

CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	
JAC: ASOJUNTAS URIBIA, ETNIA WAYUU URIBIA, JONJONCITO URIBIA Y SHIRURIA MANAURE	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°4**
CONVENIOS SOLIDARIOS: No. 2986-2023, 4622-2023, 2954-2023 Y 3411-2023	**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 5032-2023	**MES: JULIO - 2024**

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA Y MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 2986 -2023
4622 - 2023
2954 - 2023
3411 -2023

Contratista: JAC ASOJUNTAS MUNICIPIO DE URIBIA
JAC ETNÍA WAYUU MUNICIPIO DE URIBIA
JAC JONJONCITO MUNICIPIO DE URIBIA
JAC SHIRURIA MUNICIPIO DE MANAURE

Contrato de Interventoría No. 5032-2023

Interventoría: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

Objeto Contrato de Obra:
Convenio Solidario No 2986-2023.
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Convenio Solidario No 4622-2023.
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ETNIA WAYUU, MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Convenio Solidario No 2954-2023.
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE JONJONCITO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Convenio Solidario No 3411-2023.
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SHIRURIA, MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 4 **MES O PERIODO:** JUNIO 2024.

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	70
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	47
1	**INTRODUCCIÓN**		5
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		5
2.1	Localización		6
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		14
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		14
2.4	Características técnicas del proyecto		21
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		24
3.1	Información general del contrato		24
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		28
3.3	Seguimiento Items no previstos		39
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		40
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		42
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	42
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	42
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	43
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	43
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	45
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	45
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	45
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	45
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	45
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	45
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	45
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	46
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	46
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	46
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		52
5.1	Información general del contrato		52
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		53
5.3	Informes especialistas y profesionales		68
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		68
5.5	Informe matriz de riesgos.		68
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		68
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	68
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	68
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	68
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	69
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	69
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	69
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	69
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	69
7	**Conclusiones y recomendaciones**		71
8	**Anexos**		73
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____
Nombre: ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 0022 de fecha 30 de Enero de 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realizó la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental a los Convenios Solidarios No 2986 de 2023, 4622 de 2023, 2954 de 2023 y 3411 de 2023, de tal manera que se cumplan con los requerimientos estipulados por el Instituto Nacional de Vías.

- Para el Convenio Solidario No 2986 de 2023, que tiene por objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOJUNTAS, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL". Durante la etapa de revisión, se han realizado los estudios de suelos, topografía y el Informe de Ajustes de Estudios y Diseños. La junta de acción comunal informa que dará inicio a las obras, con la ejecución de la Alcantarilla, para lo cual solicita el desembolso inicial, de acuerdo al plan de compras. Para el siguiente periodo, se tiene programado realizar la revisión y aprobación del plan de inversión para la compra de materiales, alquiler de equipos, herramientas y gastos administrativos, para el inicio de las actividades de construcción de la Alcantarilla y posteriormente la construcción de la Placa Huella.

- Para el Convenio Solidario No 4622 de 2023, que tiene por objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ETNIA WAYUU, MUNICIPIO DE URIBIA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL". Durante la etapa de revisión, se han realizado los estudios de suelos, topografía y el Informe de Ajustes de Estudios y Diseños. La junta de acción comunal informa que dará inicio a las obras, con el transporte del material de subbase. La Interventoría realizó la aprobación del desembolso para la compra de materiales, alquiler de equipos, herramientas y gastos administrativos, para el inicio de las actividades con el movimiento de tierras y posteriormente la construcción de la Placa Huella.

- Para el Convenio Solidario No 2954 de 2023, que tiene por objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE JONJONCITO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL". Durante la etapa de revisión, se han realizado los estudios de suelos, topografía y el Informe de Ajustes de Estudios y Diseños. La junta de acción comunal informa que dio inicio a la ejecución de las obras, con el transporte del material de subbase. La Interventoría realizó la aprobación del desembolso para la compra de materiales, alquiler de equipos, herramientas y gastos administrativos, para el inicio de las actividades con el movimiento de tierras y posteriormente la construcción de la Placa Huella.

- Para el Convenio Solidario No 3411 de 2023, que tiene por objeto: "AUNAR ESFUERZOS

ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SHIRURIA, MUNICIPIO DE MANAURE DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", Durante la etapa de revisión, se han realizado los estudios de suelos, topografía y el Informe de Ajustes de Estudios y Diseños. La junta de acción comunal informa que dará inicio a las obras, con las actividades del movimiento de tierra. La Interventoría realizó la aprobación del desembolso para la compra de materiales, alquiler de equipos, herramientas y gastos administrativos, para el inicio de las actividades del movimiento de tierras y posteriormente la construcción de Pavimento rígido.

- Se realizaron comités con los integrantes de las juntas de acción comunal, informando los requisitos que se deben cumplir para el inicio de las obras.

- Se dieron las instrucciones y se solicitó la implementación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), de manera que la Junta cumpla con los requerimientos sociales y ambientales establecidos por las autoridades competentes respectivas y las contempladas en la legislación vigente para el proyecto.

- Se realizó asistencia a las capacitaciones del Instituto Nacional de Vías en el área contable, financiera, administrativo, ambiental y técnico para el adecuado desarrollo del convenio y los procesos que se deben llevar a cabo durante su ejecución.

- Se realizó el apoyo y coordinación desde el punto de vista técnico, administrativo, financiero y ambiental a las juntas de acción comunal, para el adecuado desarrollo de las actividades contratadas.

- Se realizó el acta de comité mensual de Seguimiento Contractual. Se solicitó a las juntas de acción comunal dar cumplimiento a los plazos establecidos para la construcción de las obras. También se solicitó el reintegro al Tesoro Nacional, de los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por el Instituto Nacional de Vías.

- Durante el presente mes, se presentaron lluvias moderadas e intensas en la zona de influencia de la obra, debido a la presencia del Huracán Beryl. Producto de las lluvias, durante gran parte del mes de julio de 2024, el terreno se encontraba saturado y no se podían adelantar actividades puesto que se podría colocar en riesgo la calidad de las obras. Así mismo, las vías de acceso a la zona del proyecto se encontraban en condiciones adversas lo que generó inconvenientes para el ingreso de materiales e insumos para la ejecución de las actividades en los Convenios á los cuales se les realiza la Interventoría.

- Los efectos generados por las lluvias, no sólo se presentaron en el Municipio de Uribia, sino que también a nivel Departamental, lo que ocasionó que se generaran inconvenientes en la empresa en donde se subcontrató el suministro de materiales pétreos para la obra tales como la arena, triturado, rellenos y subbase granular, debido a que las actividades de

extracción y producción de estos materiales se afectaron por los efectos de las lluvias. Por ello, la empresa proveedora del suministro, manifestó que los tiempos de entrega de los materiales han aumentado, que se necesitaría de un tiempo mayor al habitual, debido a la gran demanda de pedidos que se tienen acumulados y que no pudieron ser despachados, situación que afecta directamente la ejecución de las actividades programadas en la obra.

- Se presentaron demoras en la entrega por parte del diseñador seleccionado del ajuste de los estudios y/o diseños y consecuentemente el ajuste del presupuesto, debido a que fue necesario realizar la verificación de información topográfica en laS obras, situación que también se retrasó por las lluvias en la zona.

8 ANEXOS

RESUMEN FINANCIERO INTERVENTORIA CONTRATO 5032-2023		
Contrato N°	5032-2023	
Valor contrato	**$ 82.340.031,00**	
FACTURA ELECTRÓNICA #1	No. CPE 21	26-jun-24
ACTA	5	**$ 6.775.622,00**
FACTURA ELECTRÓNICA #2	No. CPE 26	22-jul-24
ACTA	6	**$ 10.255.182,00**
FACTURA ELECTRÓNICA #3	No. CPE 28	31-jul-24
ACTA	7	**$ 10.969.182,00**
SALDO CONTRATO:		**$ 54.340.045,00**
