INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 1

OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22/08/2024 al 22/09/2024

OCTUBRE DE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN....2
2. DESCRIPCION Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO....3
2.1. DESCRIPCION:....3
2.2. LOCALIZACION:....4
2.3. ACTVIDIDADES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO:....4
2.4. PROCESO CONSTRUCTIVO....6
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO....7
3.1. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS....7
3.2. PRESUPUESTO DE OBRA....7
3.3. CRONOGRAMA DEL PROYECTO....7
3.4. PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA:....8
3.5. PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA.....9
3.6. PERSONAL DE LA INTERVENTORIA....10
4. SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL PROYECTO.....10
4.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA....10
4.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA....10
5. CONCLUSIONES....11

INDICE DE FIGURAS

Imagen No. 1: Plano de planta del primer piso.....3
Imagen No. 2: Plano de planta del segundo piso.....3
Imagen No. 3: localización del proyecto.....4
Imagen No. 4: Proceso constructivo de la obra.....6
Imagen No. 5: formato oficial de propuesta económica.....9

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Información General de los contratos de obra e Interventoria.....7
Tabla 2: Cronograma inicial de obra.....8
Tabla 3: Personal Mínimo del contratista.....8
Tabla 4: Resumen Avance Físico De La Obra.....11
Tabla 5: Resumen Avance Financiero De La Obra (Pagos Realizados).....11

1. INTRODUCCIÓN

El Municipio de Galapa como entidad del orden territorial, de conformidad con lo previsto en el artículo 311 de la Constitución Política, tiene por finalidad servir a la comunidad, promover la prosperidad general en procura del desarrollo integral de sus habitantes, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo del territorio, promover la participación comunitaria la preservación de sus valores morales, culturales y patrimoniales, el desarrollo de su territorio, el rescate y fortalecimientos de los bienes del Municipio y todo lo que tenga que ver con la satisfacción de sus necesidades como conglomerado social y el mejoramiento de su calidad de vida.

El Municipio de Galapa, es un ente territorial de tipo público, que maneja recursos propios y del estado, y tiene como principal cometido estatal la atención de la población que en dicho territorio habita y satisfacer todas sus necesidades básicas en los diferentes sectores que lo integran; es por esto, que en el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2024, se priorizaron proyectos de AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE GALAPA.

Actualmente existe una problemática en la antigua sede de la alcaldía del municipio de Galapa, la cual presenta gran deterioro de su infraestructura, con suciedad, olores desagradables y un aspecto tenebroso, afectando paisajísticamente el sector céntrico donde está ubicada, generando contaminación ambiental y convirtiéndose en nido de palomas y murciélagos.

En este orden, luego de encontrarse viabilizado el mencionado proyecto y realizadas las gestiones presupuestales pertinentes, contando con disponibilidad para adelantar el presente proceso, se requiere adelantar las gestiones tendientes a contratar su ejecución, a través del cual se intervendrá

con obras de adecuaciones las instalaciones de la antigua alcaldía del municipio de Galapa.

Mediante la LP-002-2024 se inició un proceso licitatorio para lograr la contratación de OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - MUNICIPIO DEL ATLÁNTICO.

El proceso fue adjudicado a la firma CONTRUCTORA PF - LTDA. Ltda mediante RESOLUCION No 645 del 10 JULIO 2024 y el contrato fue perfeccionado el dia 19/07/2024.

2. DESCRIPCION Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION:

El proyecto consiste en la adecuación del edificio de la antigua alcaldía, localizada en la plaza principal del municipio de Galapa, ya que, al momento de iniciar las intervenciones, e encontraba en pésimas condiciones arquitectónica y estructurales.



Imagen No. 1: Plano de planta del primer piso.



Imagen No. 2: Plano de planta del segundo piso.

2.2. LOCALIZACION:

El proyecto se encuentra localizado en el Municipio de Galapa, en la ANTIGUA ALCALDIA UBICADA EN LA PLAZA MUNICIPAL.





Imagen No. 3: localización del proyecto.

2.3. ACTVIDIDADES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO:

Durante el desarrollo del proyecto, se desarrollarán los siguientes capítulos de construcción.

- Preliminares piso 1
- Demoliciones piso 1
- Cimentaciones y estructura piso 1
- Excavaciones y rellenos piso 1
- Mampostería piso 1
- Acabados piso 1
- Pisos piso 1

- Cubierta piso 1
- Carpintería piso 1
- Instalaciones sanitarias piso 1
- Instalaciones eléctricas piso 1
- Preliminares piso 2
- Demoliciones piso 2
- Cimentaciones y estructura piso 2
- Excavaciones y rellenos piso 2
- Mampostería piso 2
- Acabados piso 2
- Pisos piso 2
- Cubierta piso 2
- Carpintería piso 2
- Instalaciones sanitarias piso 2
- Instalaciones eléctricas piso 2

Dirección: calle 10 # 21 – 20 Galapa – Atlántico.
Ing.javier.sandoval@gmail.com
Tel: 3979818 – 3013386677

2.4. PROCESO CONSTRUCTIVO



Imagen No. 4: Proceso constructivo de la obra

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

3.1. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

Tabla 1: Información General de los contratos de obra e Interventoria

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					
INFORME No.	1	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	22 de agosto de 2024	Y EL	22 de septiembre de 2024
OBJETO	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA -				
LOCALIZACIÓN	ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	MC-011-2024	CONTRATO No.:	LP-002-2024
CONTRATISTA:	JAVIER SANDOVAL PAEZ	CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PF LTDA.
PLAZO INICIAL	3 MESES	PLAZO INICIAL	3 MESES
FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	22 de agosto de 2024	FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	22 de agosto de 2024
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	22//2024	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	22//2024
PLAZO ACTUALIZADO:	3 MESES	PLAZO ACTUALIZADO:	3 MESES
VALOR INICIAL :	$ 29,075,354.88	VALOR INICIAL :	$ 529,128,650.63
VALOR ADICION(ES):	$ 0.00	VALOR ADICION(ES):	$ 0.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 29,075,354.88	VALOR ACTUALIZADO:	$ 529,128,650.63
VALOR PAGADO:	$ 0.00	VALOR PAGADO:	$ 0.00
VALOR POR PAGAR:	$ 29,075,354.88	VALOR POR PAGAR:	$ 529,128,650.63

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	26/07/2024	30/04/2025	$ 2,907,535.49	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	19/07/2024	19/04/2025	$ 158,738,595.19
PAGOS SALARIOS Y PRESTACIONES	26/07/2024	31/10/2027	$ 1,453,767.74	CUMPLIMIENTO CONTRATO	19/07/2024	19/04/2025	$ 158,738,595.19
CALIDAD DE SERVICIO	26/07/2024	31/10/2028	$ 2,907,535.49	PAGOS SALARIOS Y PRESTACIONES	19/07/2024	19/10/2027	$ 52,912,865.06
				ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	5 años		$ 26,456,433
				CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE	5 años		$ 26,456,433

En la tabla anterior se observa toda la información general de carácter contractual, en el anexo 1 se encuentra el contrato de obra, en el anexo 2 se encuentra el acta de inicio de obra, en el anexo 3 se encuentran las polizas del contrato de obra, en el anexo 4 se encuentra el contrato de interventoría, en el anexo 5 se encuentra el acta de inicio de interventoria, en el anexo 6 se encuentran las polizas de interventoria.


3.2. PRESUPUESTO DE OBRA

El presupuesto de la obra será el aprobado por la entidad contratante mediante proceso licitatorio, en el anexo 7 se encuentra el presupuesto oficial de la obra.

3.3. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

El cronograma inicial del proyecto es el suministrado por el municipio en la etapa de revisión y aprobación de diseños, a continuación, se detalla el cronograma.

Tabla 2: Cronograma inicial de obra

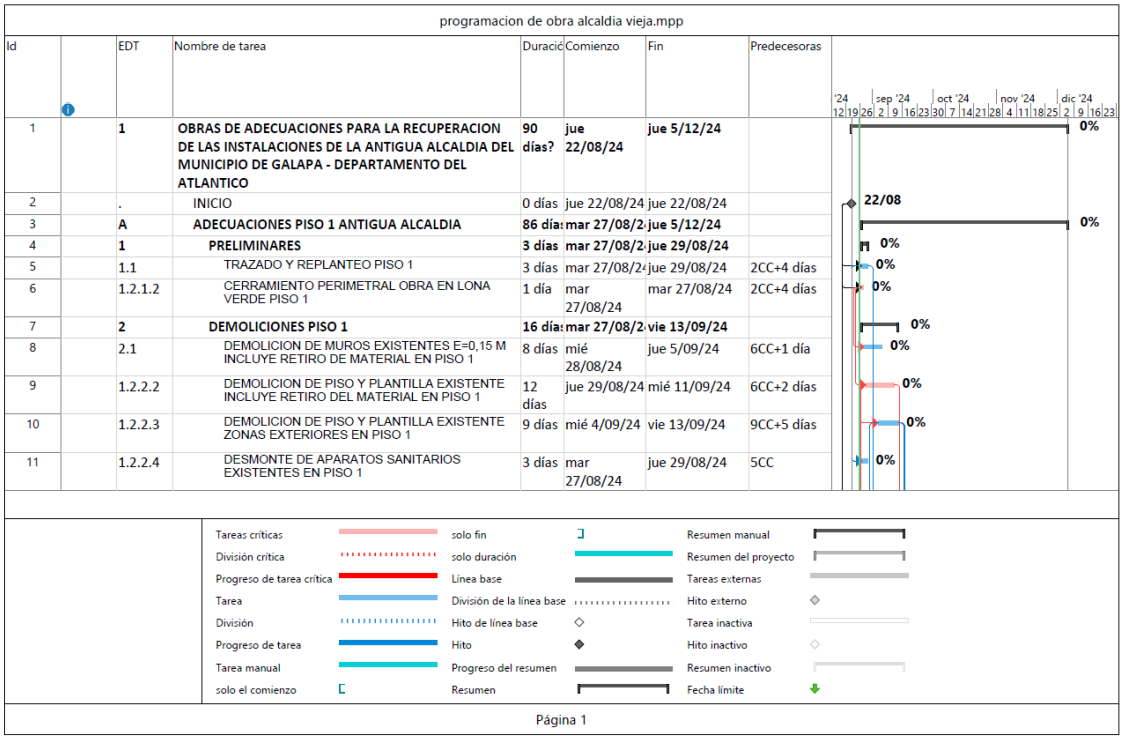

programacion de obra alcaldia vieja.mpp

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	1	**OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO**	**90 días?**	**jue 22/08/24**	**jue 5/12/24**	
2	.	INICIO	0 días	jue 22/08/24	jue 22/08/24	
3	A	**ADECUACIONES PISO 1 ANTIGUA ALCALDIA**	**86 días**	**mar 27/08/2**	**jue 5/12/24**	
4	1	**PRELIMINARES**	**3 días**	**mar 27/08/2**	**jue 29/08/24**	
5	1.1	TRAZADO Y REPLANTEO PISO 1	3 días	mar 27/08/2	jue 29/08/24	2CC+4 días
6	1.2.1.2	CERRAMIENTO PERIMETRAL OBRA EN LONA VERDE PISO 1	1 día	mar 27/08/24	mar 27/08/24	2CC+4 días
7	2	**DEMOLICIONES PISO 1**	**16 días**	**mar 27/08/2**	**vie 13/09/24**	
8	2.1	DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES E=0,15 M INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN PISO 1	8 días	mié 28/08/24	jue 5/09/24	6CC+1 día
9	1.2.2.2	DEMOLICION DE PISO Y PLANTILLA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL EN PISO 1	12 días	jue 29/08/24	mié 11/09/24	6CC+2 días
10	1.2.2.3	DEMOLICION DE PISO Y PLANTILLA EXISTENTE ZONAS EXTERIORES EN PISO 1	9 días	mié 4/09/24	vie 13/09/24	9CC+5 días
11	1.2.2.4	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES EN PISO 1	3 días	mar 27/08/24	jue 29/08/24	5CC

Página 1

En el anexo No. 8 se detalla el cronograma inicial del proyecto, cabe resaltar que este cronograma es el inicial y este sujeto a modificaciones previamente aprobadas por esta interventoria.

3.4. PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA:

Tabla 3: Personal Mínimo del contratista.

CARGO	PROFESIÓN
DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL
RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL

En el anexo 9 se encuentran las hojas de vida del personal del contratista, asi como los parafiscales correspondientes al periodo en consideración.

CANTIDAD	CARGO	PROFESIÓN
1	DIRECTOR	ING. CIVIL
1	RESIDENTE	ING. CIVIL

3.5. PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA.

FORMULARIO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL					
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
PERSONAL PROFESIONAL					
No.	Cargo	Sueldo	% de dedicación	Duracion (meses)	Valor parcial
1	Director de Interventoria	$ 2,700,000.00	40%	3.00	$ 3,240,000.00
2	Residente de interventoria	$ 1,750,000.00	100%	3.00	$ 5,250,000.00
PERSONAL TÉCNICO					
PERSONAL ADMINISTRATIVO					
1	secretaria	$ 1,300,000.00	50%	3.00	$ 1,950,000.00
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO					
OTROS COSTOS DE PERSONAL					
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)					$ 10,440,000.00
FACTOR MULTIPLICADOR (7)					1.95
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)					$ 20,358,000.00
ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO ($)	VALOR PARCIAL ($)
			(8)	(9)	(8)*(9)=10
OTROS COSTOS DIRECTOS					
VIÁTICOS					
Item	Concepto	Und	Cantidad	V. unitario	V. parcial
1	Viaticos	mes	3.00	$ 175,000.00	$ 525,000.00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA					
Item	Concepto	Und	Cantidad	V. unitario	V. parcial
1	Alquiler oficina	mes	3.00	$ 883,357.11	$ 2,650,071.33
2	Alquiler equipos de computo	mes	3.00	$ 110,000.00	$ 330,000.00
OTROS COSTOS					
Item	Concepto	Und	Cantidad	V. unitario	V. parcial
1	Reproducci n documentos (fotocopias, heliogr.)	mes	3.00	$ 95,000.00	$ 285,000.00
1	Edici n de informes (incluye fotografías)	mes	3.00	$ 95,000.00	$ 285,000.00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)					$ 4,075,071.33
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)					$ 24,433,071.33
PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)					$ -
VALOR TOTAL BASICO					$ 24,433,071.33
IVA = 19% * (E) = (F)					$ 4,642,283.55
COSTO TOTAL = (E) + (F)					$ 29,075,354.88

Imagen No. 5: formato oficial de propuesta económica.

3.6. PERSONAL DE LA INTERVENTORIA

En el anexo 10 se presenta la hoja de vida del director y residente, asi como sus parafiscales.

4. SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL PROYECTO.

4.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

- REUNIÓN DE INICIO DE OBRA
  El día 22 de agosto se firm el acta de inicio y se reali una visita sitio para dar inicio formal al desarrollo del contrato.
- ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y REVISIÓN
  El día 22 de agosto se hizo entrega formal al contratista y a la interventoría de los estudios y diseños finales del proyecto.

- ACTIVIDADES DE ETAPA CONSTRUCTIVA

  -Preliminares.
  -Demoliciones piso 1
  -Cimenta y estructura piso 1
  -Excavaciones y relleno piso 1
  -Mampostería piso 1

4.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas por el Interventor

- Visita de campo al sitio previo inicio de actividades.
- de la documenta n suministrada por el Municipio (Especiaciones técnicas, Proceso constructivo, Diagnostico del proyecto, Planos, Diseños.
- de la documenta suministrada por el contratista (Hojas de vida del personal, Plan de inver del anticipo, cronograma y flujo de fondos proyectado).
- del replanteo realizado por el contratista.
- Acompañamiento, revisi n y aproba de toda la etapa constructiva y de ejecuci n en el contrato.

Tabla 4: Resumen Avance Físico De La Obra

AVANCE FISICO	25%
AVANCE FISICO PROGRAMADO	33%

Tabla 5: Resumen Avance Financiero De La Obra (Pagos Realizados)

AVANCE FINANCIERO	0%
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO	33%

El contratista presenta un retraso del 8% debido a que las actividades no se desarrollan con total normalidad por las constantes lluvias presentadas por tratarse de época invernal, además de el vendaval que se registró el día 16 de septiembre que ocasiono afectaciones en el sector, y genero retrasos en el abastecimiento de materiales

5. CONCLUSIONES

Durante el desarrollo del primer mes del proyecto, el contratista presenta un avance del 25% vs un programado del 33%, teniendo un retraso del 8% atribuible a que los trabajos se han visto afectados por las constantes lluvias pro época invernal, se espera que se mitigue este retraso de si mejoran las condiciones climáticas, de lo contrario se deberá solicitar una prorroga para compensar los días de retraso generados por las lluvias.

Se remite en el presente informe el acta modificativa propuesta para revisión del contratante, con el fin de balancear el contrato teniendo en cuenta las actividades no previstas que son necesarias para el desarrollo del proyecto ya que se encontraron muros a demoler no contemplados.

ING. JAVIER SANDOVAL
INTERVENTORIA

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 1: CONTRATO DE OBRA
ANEXO 2: ACTA DE INICIO DE OBRA
ANEXO 3: POLIZAS CONTRATO DE OBRA
ANEXO 4: PRESUPUESTO OFICIAL
ANEXO 5: PLANOS INICIALES
ANEXO 6: CRONOGRAMA, FLUJO DE FONDOS Y CUADRO DE SEGUIMIENTO
ANEXO 7: CONTRATO DE INTERVENTORIA
ANEXO 8: ACTA DE INICIO DE INTERVENTORIA
ANEXO 9: POLIZAS INTERVENTORIA
ANEXO 10: PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA
ANEXO 11: OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS
ANEXO 12: PARAFISCALES OBRA
ANEXO 13: PARAFISCALES INTERVENTORIA
ANEXO 14: INFORME DE OBRA Y REGISTRO FOTOGRAFICO
ANEXO 15: BITACORA

ANEXO 1: CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES CONTRACTUALES

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
No. DEL CONTRATO	LP-002-2024
OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE GALAPA**
PLAZO	Noventa (90) días contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y aprobación del inicio a través de la plataforma de SECOP II
VALOR	QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($529.128.650,63) M/CTE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GALAPA
IDENTIFICACIÓN	NIT. 890.102.472-0
CONTRATISTA	**CONSTRUCTORA PF LTDA**
IDENTIFICACIÓN	900.210.235 - 1
SUPERVISOR	SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
No. DE CDP	**2024.CEN.01.000407.**

Entre los suscritos a saber, el MUNICIPIO DE GALAPA, con NIT. 890.102.472-0 representado por FABIÁN ALBERTO BONETT BERDUGO, identificado con la cédula de ciudadanía 8.797.164, quien se denominará, EL MUNICIPIO, por una parte y por la otra, YOSETH PULGAR IBARRA, identificado con el C.C. No. 72.289.269 de Barranquilla, quien declara hallarse sin inhabilidades e incompatibilidades conforme al artículo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido integrar al contrato electrónico que se encuentra en el SECOP II, las siguientes cláusulas que conforman el contrato **LP-002-2024,** previas las siguientes CONSIDERACIONES: **PRIMERA**: Que la Constitución Política de Colombia entendida como norma suprema fundamental de la que se desprende toda normatividad jurídica aplicable en todo el territorio nacional ha establecido como fin esencial del Estado "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios de derechos y deberes". **SEGUNDA:** Que la carta política consagra en su artículo 2º indica que "Son fines esenciales del Estado el servir a la Comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa, y cultural de la nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,

Dirección: Calle 13 No. 17-117 Galapa, Atlántico
Correo institucional: contactenos@galapa-atlantico.gov.co
Línea de servicio a la ciudadanía: (+57) 3160272493
www.galapa-atlantico.gov.co
NIT: 890.102.472-0
AlcaldiaGalapa

creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales, del Estado y de los particulares". **TERCERA:** Que así mismo la Carta Política consagra en el artículo 209 que la función administrativa desarrollada por los distintos órganos del Estado deben garantizar la consecución de los fines esenciales del Estado y deberán estar al servicio del interés general función desplegada con sujeción a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad imparcialidad y publicidad. **CUARTA:** Que el Municipio de Galapa, es un ente territorial de orden público, que maneja recursos propios y del Estado, y tiene como principal cometido estatal la atención de la población que en dicho territorio habita y satisfacer todas sus necesidades básicas en los diferentes sectores que lo integran; es por esto, que en el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2024, se priorizaron proyectos de AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE GALAPA. **QUINTA:** Que teniendo en cuenta el objeto a contratar y la cuantía, se adelantó la selección del oferente por el Proceso de selección de LICITACIÓN PÚBLICA, conforme lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el Decreto 1082 de 2015. **SEXTA:** Que una vez publicado el Proyecto de Pliegos de Condiciones correspondiente al proceso de selección LP-002-2024, conforme el cronograma del proceso, se dio traslado para presentación de observaciones. **SÉPTIMA:** Que, dentro del término mencionado anteriormente, se presentaron observaciones siendo atendidas en su oportunidad como se puede evidenciar en la plataforma de Secop II. **OCTAVA:** Que el presente proceso no cumplió con las condiciones para limitación a Mipymes, según lo que indica en el Decreto 1082 de 2015. **NOVENA:** Que una vez agotado el proceso de publicidad y publicación del proyecto de pliego en el Portal Único De Contratación, la Administración Municipal mediante Resolución 604 del 18 de junio de 2024, se ordenó la apertura del proceso de licitación pública N° LP-002-2024, cuyo objeto es: OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - MUNICIPIO DEL ATLÁNTICO. Adicionalmente, en la misma fecha se realizó la publicación del pliego de condiciones definitivo y demás documentos del proceso, sin que se presentaran observaciones o solicitudes de aclaración frente a los mismos dentro del término establecido en el cronograma para el efecto. **DECIMA:** Que las condiciones para participar en el proceso de selección y las reglas del futuro contrato, se encuentran establecidas en el pliego de condiciones definitivo que se publica en el portal SECOP II. **DECIMO PRIMERA:** Que según el cronograma del proceso el cierre para presentación de propuestas fue el 11 de junio del 2024 a las 8:00 am término dentro del cual se presentaron tres propuestas. **DECIMO SEGUNDA:** Que de acuerdo con lo señalado en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, el proceso de Licitación pública N° LP-002-2024, la oferta más favorable a la entidad será aquella que cumpla con todos los criterios y exigencias señaladas en el pliego de condiciones. **DECIMA TERCERA:** Que el comité Evaluador, designado mediante resolución No.605 del 19 de Junio de 2024, analizó las propuestas presentadas, teniendo en cuenta los criterios de selección objetiva y acatando íntegramente lo estipulado en los pliegos de condiciones del proceso de selección del proceso de licitación pública No LP-

Dirección: Calle 13 No. 17-117 Galapa, Atlántico
Correo institucional: contactenos@galapa-atlantico.gov.co
Línea de servicio a la ciudadanía: (+57) 3160272493
www.galapa-atlantico.gov.co
NIT: 890.102.472-0
AlcaldiaGalapa

002-2024. **DECIMO CUARTA:** Que una vez realizado el análisis técnico, jurídico y financiero de las propuestas presentadas, se obtuvo el primer informe de Evaluación, el cual fue publicado el día 02 de julio del 2024, de conformidad con lo establecido en el cronograma del proceso. Dentro del traslado otorgado dentro de los 5 días hábiles establecidos, los proponentes allegaron subsanaciones y observaciones al informe de evaluación. **DECIMO QUINTA:** Que de la revisión realizada por el comité evaluador a las subsanaciones allegadas y teniendo en cuenta las observaciones presentadas en la audiencia de adjudicación, se emitió informe de proponentes habilitados. **DECIMO SEXTA:** Que en el trámite del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-002-2024, cuyo objeto es: la **OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - MUNICIPIO DEL ATLÁNTICO**, se cumplieron todos los pasos y requisitos concomitantes a dicho proceso, agotándose el procedimiento establecido en el Decreto 1082 de 2015, incluido lo determinado para la apertura de sobre económico y ponderación de la totalidad de requisitos establecidos de conformidad con lo estipulado en el documento base, los cuales se encuentran inmersos en los documentos correspondientes que fue publicada. **DECIMO SÉPTIMA:** Que en la audiencia de adjudicación se concedió el uso de la palabra por máximo cinco (5) minutos, con el fin de que se pronunciaran única y exclusivamente sobre la oferta económica. Al respecto, los proponentes manifestaron no tener observaciones. **DECIMO OCTAVA:** Que el comité evaluador una vez realizado el proceso de evaluación y ponderación de las propuestas, establece el orden de elegibilidad, conforme al mayor puntaje obtenido, por lo cual, recomendó Adjudicar – El PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-002-2024 - OBJETO: **OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - MUNICIPIO DEL ATLÁNTICO**, al Proponente CONSTRUCTORA PF LTDA, identificado con NIT No 900.210.235 – 1. **DECIMO NOVENA:** Que dicho Proponente cumplió con los Requisitos Habilitantes y obtuvo un puntaje de 100, la mayor puntuación posible, motivo por el cual se recomienda adjudicar el proceso por el valor de su oferta económica, esto es, **QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($529.128.650,63) M/CTE. VIGÉSIMA:** Que, cumplidos los requisitos legales, reglamentarios y los señalados en los pliegos de condiciones, el Municipio de Galapa (Atlántico) adjudicó el Proceso de Licitación Publica No. LP-002-2024 mediante Resolución 645 del 10 de julio de 2024. En virtud de las anteriores consideraciones, se procede a suscribir el presente contrato, teniendo en cuenta las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO: OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE GALAPA. CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DE LAS PARTES: a) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA**: **1.** Estar al día en el sistema de seguridad social y parafiscales Acreditar cuando corresponda, y cumplir con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007. **2.** Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo sus

Dirección: Calle 13 No. 17-117 Galapa, Atlántico
Correo institucional: contactenos@galapa-atlantico.gov.co
Línea de servicio a la ciudadanía: (+57) 3160272493
www.galapa-atlantico.gov.co
NIT: 890.102.472-0
AlcaldiaGalapa

especificaciones Técnicas y sus Pliegos de Condiciones. **3.** Entregar el Cronograma estimado de obra, y dar cumplimiento a su programación. **4.** Colaborar con el MUNICIPIO en cualquier requerimiento que ella haga. **5.** Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones Técnicas, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada. **6.** Dar a conocer al MUNICIPIO cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. **7.** Comunicarle al MUNICIPIO cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. **8.** Elaborar, suscribir y presentar al MUNICIPIO las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el Interventor y/o Supervisor del Contrato, según corresponda. **9.** Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras. **10.** Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio exigidos por ley y los que sean requeridos por la entidad y el Interventor y demás pruebas que se soliciten para verificar la calidad de los materiales y demás elementos que se instalen en la obra. **11.** Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con MUNICIPIO. **12.** Incluir el número de cuadrillas de trabajo necesarias para cumplir con el objeto del contrato en el plazo establecido. **13.** Presentar para aprobación del Interventor y del Supervisor, actas parciales y final de obra. **14.** Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas. **15.** Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. **16.** Otorgar las pólizas dentro de los términos establecidos por la ENTIDAD. **17.** Allegar los documentos requeridos para la legalización e iniciación del contrato, dentro del término establecido por la entidad. **18.** Presentar la documentación requerida para acreditar el personal exigido en el pliego de condiciones, para la revisión y aprobación de la interventoría y de la supervisión de la ENTIDAD como requisito de ejecución del contrato. **19.** Atender en forma permanente la dirección de la obra, o mantener al frente de la misma un profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser aceptado por el MUNICIPIO. **20.** Realizar, por cuenta y riesgo del contratista, la Revisión, comprobación y confirmación de los diseños en aspectos legales, ambientales y técnicos de ingeniería entre los cuales se encuentran, licencias, permisos, planos, cálculo de cantidades, especificaciones técnicas, presupuesto, fuentes de materiales, materiales de construcción y demás aspectos que se requieran para la construcción del proyecto según el grado de complejidad del mismo. Una vez efectuada por parte del contratista, la revisión, comprobación y confirmación de los diseños requeridos para la ejecución de la obra, presentará el respectivo informe. En el evento en que como resultado de la revisión, confirmación y comprobación de los diseños se requiera realizar cambios o ajustes a los diseños inicialmente suministrados por la entidad, estos deben ser revisados y aprobados por el Interventor y Supervisor del MUNICIPIO, debiendo el jefe de la oficina gestora, decidir sobre su aceptación o no, es decir, en ningún

Dirección: Calle 13 No. 17-117 Galapa, Atlántico
Correo institucional: contactenos@galapa-atlantico.gov.co
Línea de servicio a la ciudadanía: (+57) 3160272493
www.galapa-atlantico.gov.co
NIT: 890.102.472-0
AlcaldiaGalapa

caso el hecho de realizar la revisión, comprobación y confirmación de los diseños le impone a la entidad la obligación de aceptar lo recomendado. **21.** Como consecuencia de la Revisión, comprobación y confirmación de los diseños, el contratista adquiere plena responsabilidad por la calidad de las obligaciones ejecutadas y recibidas a satisfacción por el Interventor. **22.** Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programación de obra y/o cronograma de actividades, revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del MUNICIPIO. **23.** Reparar los lugares de obra concernientes al contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras; y retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. **24.** Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato, siempre que los mismos sean imputables al contratista. **25.** Realizar la señalización de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos de las normas adoptadas. **26.** Realizar la entrega de las obras georreferenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicación del sitio de la obra (GPS). **27.** Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato. **28.** Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas, industriales, de seguridad y de señalización preventiva, necesarias para no poner en peligro las personas ni los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión. **29.** Aceptar el control y acatar las órdenes e instrucciones del Interventor y del Supervisor del contrato. **30.** El Contratista proveerá las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra, para que el Interventor, el MUNICIPIO y los entes de control puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecución del contrato, sin costo adicional para El Contratante. **31.** Instalar la valla informativa del contrato, según modelo del MUNICIPIO, el cual suministrará el Supervisor. **32.** Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. **33.** Ejecutar el objeto contractual observando el plan de calidad, con el fin de desarrollar acciones planificadas para la ejecución en debida forma del proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato es el documento que refleja la aplicación de criterios de calidad al proyecto específico. **34.** Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposición del MUNICIPIO y de los entes de control. **35.** Asistir a los comités técnicos realizados por el MUNICIPIO. **36.** Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de Interventoría, los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la Interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados del MUNICIPIO. **37.** Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la Interventoría y contener, para cada uno de los frentes de trabajo: a) Avance de cada una de las actividades programadas. B) Cantidades de obra ejecutadas. C) Registros fotográficos. D) Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas

Dirección: Calle 13 No. 17-117 Galapa, Atlántico
Correo institucional: contactenos@galapa-atlantico.gov.co
Línea de servicio a la ciudadanía: (+57) 3160272493
www.galapa-atlantico.gov.co
NIT: 890.102.472-0
AlcaldiaGalapa

realizadas. E) Fotocopia de la bitácora o libro de obra. F) Resumen de las actividades realizadas en el mes. G) Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. H) Informe de seguridad industrial. I) Informe de manejo ambiental. J) Actualización del programa de ejecución de obra. **48.** Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. **49.** Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la Interventoría y contener como mínimo: a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra. B. Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra, Planos récord de obra, aprobados por la Interventoría, Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento, Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran, Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas, Actualización final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones, Registro fotográfico definitivo, Realizar semanalmente el registro fotográfico del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance, Las demás inherentes al contrato para su ejecución en debida forma, así como las contenidas en el Pliego de Condiciones y que no hayan sido incluidas en los numerales anteriores. **b) OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 1.** Entregar al contratista, el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas. **2.** Ejercer la supervisión general del contrato. **3.** Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del contratista de obra. **4.** Solicitar al contratista informes sobre el desarrollo del contrato. **5.** Recibir las obras en la fecha de entrega, siempre que cumplan con las cantidades, calidades y especificaciones contratadas y aprobadas por el Interventor. **6.** Suministrar los diseños y especificaciones técnicas para ejecutar el objeto del contrato, que estén a su cargo, de conformidad con los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la obligación señalada en los estudios previos (Revisión, comprobación y confirmación de los diseños). **7.** Atender oportunamente las dudas e inquietudes de contratista en relación con el objeto del presente contrato. **8.** Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto del contrato. **CLÁUSULA TERCERA – ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL:** Las Especificaciones Técnicas del Objeto Contractual contenidas en los documentos previos, hacen parte integral del Contrato Electrónico y de su anexo de Condiciones Contractuales. En virtud de lo descrito, si se llegare a producir un cambio en la integralidad del Estudio Previo o en las Especificaciones Técnicas descritas en el numeral de la referencia, deberá generarse a solicitud de parte de la Secretaría solicitante la expedición de un OTROSI (que se entiende como una enmienda o modificación de un contrato) tanto para el Contrato Electrónico como para su Anexo de Condiciones Contractuales. **CLAUSULA CUARTA - VALOR DEL CONTRATO:** El valor corresponde al establecido en el Contrato Electrónico de:

Dirección: Calle 13 No. 17-117 Galapa, Atlántico
Correo institucional: contactenos@galapa-atlantico.gov.co
Línea de servicio a la ciudadanía: (+57) 3160272493
www.galapa-atlantico.gov.co
NIT: 890.102.472-0
AlcaldiaGalapa

QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($529.128.650,63) M/CTE incluidos todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. **PARÁGRAFO:** EL CONTRATISTA es responsable del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – I.V.A., de acuerdo a la información tributaria consignada en el Registro Único Tributario - RUT. **CLÁUSULA QUINTA – IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** Los pagos que se efectúen en virtud del presente contrato, se realizarán con cargo al certificado de disponibilidad presupuesta No. 2024.CEN.01.000407. **CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE PAGO:** La ENTIDAD pagará al CONTRATISTA el valor total del contrato, en pesos colombianos, de la siguiente manera: Un ANTICIPO equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, el otro 70% serán pagaderos mediante actas parciales en el cual se evidencie el cumplimiento del objeto contractual, ejecutadas y entregadas las obras a entera satisfacción por el Interventor y Supervisor del Contrato. **Parágrafo 1:** En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato. **Parágrafo 2:** El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. **Parágrafo 3**: Los pagos a los cuales está obligado el MUNICIPIO, se realizarán previa radicación, de la orden de pago, en la Tesorería General, una vez agotados los requisitos a que haya lugar. Los pagos están sujetos a la disponibilidad de los recursos del MUNICIPIO. **Parágrafo 4:** En concordancia con el Artículo 91, de la Ley 1474 de 2011, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. Los intereses que genere el anticipo serán de propiedad del MUNICIPIO DE GALAPA y deberán ser consignados en la Tesorería Municipal. El anticipo se deberá invertir en los rubros globales que se indiquen en el Plan de Manejo del Anticipo, el cual deberá ser aprobado por el interventor. El plan de manejo del anticipo podrá ser modificado a solicitud del contratista con la aprobación del interventor. Los rubros en los cuales se puede invertir el anticipo serán cualquiera de los costos directos y de los indirectos de la obra excepto utilidades e imprevistos. Los gastos administrativos en los cuales se puede invertir el anticipo no podrán exceder el diez por ciento (10%) del anticipo. El anticipo será amortizado mediante deducciones de las Actas mensuales de Obra, hasta su completa amortización, situación que debe ser controlada por la Interventoría. No deberá quedar ningún porcentaje para amortizar en el acta de liquidación. El Contratista presentará al Municipio una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el Patrimonio Autónomo o fiducia para el giro del anticipo. La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditados en ningún caso a la entrega del Anticipo. La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a

Dirección: Calle 13 No. 17-117 Galapa, Atlántico
Correo institucional: contactenos@galapa-atlantico.gov.co
Línea de servicio a la ciudadanía: (+57) 3160272493
www.galapa-atlantico.gov.co
NIT: 890.102.472-0
AlcaldiaGalapa

satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado.**CLÁUSULA SÉPTIMA - PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo para la ejecución del Contrato será de NOVENTA (90) días contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y aprobación del inicio a través de la plataforma de SECOP II. **CLÁUSULA OCTAVA - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:** Sólo en eventos de fuerza mayor, caso fortuito y/o por mutuo acuerdo, las partes podrán suspender la ejecución del contrato. Este hecho, previo concepto del supervisor, se hará constar en acta que suscribirán EL CONTRATISTA y el supervisor con el visto bueno del ordenador del gasto. **CLÁUSULA NOVENA - CESIÓN:** EL CONTRATISTA sólo podrá ceder el presente contrato mediante contrato de cesión celebrado con el cesionario, previa autorización expresa y escrita del MUNICIPIO, la cual requerirá concepto previo del supervisor, mediante acto administrativo motivado que se comunicará a la compañía de seguros garante del contrato. **CLÁUSULA DECIMA - MULTAS:** En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, las partes pactan, mediante el presente documento efectuará la liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del contrato, sin que estas sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustará al procedimiento legal establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento. De las multas y demás sanciones impuestas por el municipio se informará a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la Nación. **PARÁGRAFO 1: 1.** Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula dieciocho, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al (1%) del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedora otras sanciones más gravosas. 3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al (0.2%) del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satis- facción del interventor. 4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al (0,3%) del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al (1%) del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente

Dirección: Calle 13 No. 17-117 Galapa, Atlántico
Correo institucional: contactenos@galapa-atlantico.gov.co
Línea de servicio a la ciudadanía: (+57) 3160272493
www.galapa-atlantico.gov.co
NIT: 890.102.472-0
AlcaldiaGalapa

al (0,3%) del valor del contrato, por cada orden incumplida. 7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al (0,5) del valor del contrato, por cada día calendario de retraso en el cumplimiento de dicha obligación. 8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al (0,5%) del valor del contrato. 9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a (10) salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. **Parágrafo 2.** Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. **Parágrafo 3**. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. **Parágrafo 4.** El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. **Parágrafo 5.** En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. **Parágrafo 6.** Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. **Parágrafo 7**: La exigibilidad de las multas no exonerará a EL CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación del contrato. **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA – PENAL PECUNIARIA:** Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios. Opción 1: En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. **Parágrafo 1**. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las

Dirección: Calle 13 No. 17-117 Galapa, Atlántico
Correo institucional: contactenos@galapa-atlantico.gov.co
Línea de servicio a la ciudadanía: (+57) 3160272493
www.galapa-atlantico.gov.co
NIT: 890.102.472-0
AlcaldiaGalapa

obligaciones a cargo del Contratista. **Parágrafo 2.** El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. **Parágrafo 3.** Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. **CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL:** Son aplicables las disposiciones consignadas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DECIMA TERCERA – CADUCIDAD:** El MUNICIPIO podrá declarar la caducidad cuando se presente hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización. **PARÁGRAFO:** El MUNICIPIO podrá abstenerse de declarar la caducidad siempre y cuando se adopten las medidas de control e intervención necesarias que garanticen la ejecución del objeto del contrato. **CLÁUSULA DECIMA CUARTA - EFECTOS DE LA CADUCIDAD:** En caso de producirse la declaratoria de caducidad por parte del MUNICIPIO mediante acto administrativo debidamente motivado se dará por terminado el contrato y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. **CLÁUSULA DECIMA QUINTA - MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:** Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación previstos en la Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adiciones. **CLÁUSULA DECIMA SEXTA - SUPERVISIÓN:** La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la ejecución y cumplimiento del presente contrato será ejercida por el SECRETARIO DE DESARROLLO TERRITORIAL o quien haga sus veces, de acuerdo con las normas técnicas y con las disposiciones que regulan el ejercicio de la SUPERVISIÓN. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Además de las facultades y deberes consagrados en el artículo 84 y s.s. de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, el Supervisor: **a)** Tendrá las funciones que por la índole y la naturaleza del contrato le sean propias, las establecidas en el Estatuto General de la Contratación Pública y responderá conforme a lo normado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, artículo 82 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y demás normas pertinentes. **b)** Sugerir, en caso de ser necesario, la suspensión temporal del contrato. Para estos efectos, el supervisor debe verificar que el contrato se encuentre legalizado, perfeccionado y listo para su ejecución. **c)** Suscribir acta de inicio del contrato. **d)** Verificar el cumplimiento de los términos de ejecución del contrato y las fechas de cumplimiento contractual. **e)** Verificar el pleno cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA del objeto y las obligaciones contenidas en el contrato. **f)** Impartir los cumplidos a satisfacción o cumplimiento de las reciprocidades del contrato. **g)** Informar por escrito a la oficina jurídica, de todos los actos y hechos constitutivos de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, y en general, dar parte a ella de todas las actuaciones del mismo constitutivas de sanción o multa. **h)** Entregar por escrito sus observaciones, recomendaciones o sugerencias, enmarcadas dentro de los términos del contrato

Dirección: Calle 13 No. 17-117 Galapa, Atlántico
Correo institucional: contactenos@galapa-atlantico.gov.co
Línea de servicio a la ciudadanía: (+57) 3160272493
www.galapa-atlantico.gov.co
NIT: 890.102.472-0
AlcaldiaGalapa

y siempre que sean pertinentes con relación a la correcta ejecución del mismo. **i)** Solicitar las modificaciones al contrato cuando las condiciones del servicio lo requieran. **j)** Certificar respecto al cumplimiento de EL CONTRATISTA, documento que se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos y suscribir las actas de suspensión y reinicio respectivas, remitiéndolas a la oficina jurídica, junto con el correspondiente certificado de modificación de las garantías presentadas por EL CONTRATISTA, para su debida aprobación. **k)** Hacer seguimiento a los informes que deba rendir EL CONTRATISTA. **l)** Enviar a la oficina jurídica, los informes de supervisión que se emitan con ocasión del contrato, con la debida documentación soporte y en los plazos y oportunidades que la periodicidad del contrato amerite, indicando en ellos el porcentaje de ejecución del contrato. **m)** Verificar el pleno cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de la obligación de pagar oportunamente y en los montos legales, sus aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y EL CONTRATISTA o su representante serán dirimidas por el MUNICIPIO, cuya decisión será definitiva. **CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA - AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL:** El presente contrato no genera relación laboral alguna entre EL MUNICIPIO y EL CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula tercera. **CLÁUSULA DECIMA OCTAVA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la suscripción del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la Constitución Política, articulo 8 de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones aplicables y que si llegaren a sobrevenir durante la ejecución del contrato se dará aplicación a lo dispuesto por el artículo 9 de la misma ley. **CLÁUSULA DECIMA NOVENA – GARANTÍAS:** EL CONTRATISTA se obliga para con el municipio a allegar póliza única de cumplimiento expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en el país que ampare los siguientes riesgos:

GARANTÍA	PORCENTAJE	PLAZO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	30%	Esta garantía debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	10%	Esta garantía debe estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) años más.
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO	100%	Hasta la liquidación del contrato
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	5%	Esta garantía debe estar vigente por un término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha en la cual el MUNICIPIO de Galapa recibe a satisfacción la obra

Dirección: Calle 13 No. 17-117 Galapa, Atlántico
Correo institucional: contactenos@galapa-atlantico.gov.co
Línea de servicio a la ciudadanía: (+57) 3160272493
www.galapa-atlantico.gov.co
NIT: 890.102.472-0
AlcaldiaGalapa

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.	30%	por el término de ejecución del contrato y seis (06) meses más.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.	Doscientos (200) smmlv	La vigencia de esta garantía deberá ser igual al período de ejecución del contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – INDEMNIDAD: Será obligación exclusiva de EL CONTRATISTA mantener al Municipio de Galapa Indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones de EL CONTRATISTA. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA – DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Forman parte integrante de este contrato los siguientes documentos: **1.** Los documentos que soportan el proceso pre-contractual. **2.** Todas las modificaciones, adiciones o aclaraciones que se expidan con posterioridad. **3.** Los documentos necesarios para la legalización que se elaboren. **4.** Los documentos que soporten la ejecución del mismo. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - REQUISITOS PARA LA CELEBRACIÓN:** Para celebrar el presente contrato, EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Así mismo, deberá acreditar la inexistencia de antecedentes de responsabilidad fiscal. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA – PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** El presente contrato se perfecciona con la suscripción de las partes, y para su ejecución se requiere: **a)** Registro Presupuestal. **b)** Constitución de garantía y posterior aprobación por parte del MUNICIPIO. **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA – LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** LAS PARTES y el supervisor, suscribirán acta de liquidación del contrato dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del contrato por cualquier causa. En caso de no lograrse la liquidación bilateral en el plazo establecido, EL MUNICIPIO, podrá liquidar unilateralmente el contrato. **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - COPIA:** Del presente contrato solo se expedirá en original que reposará en la oficina jurídica el cual se publicará en el Portal Único de Contratación para los fines pertinentes. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DOMICILIO CONTRACTUAL:** EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA acuerdan que para todos los efectos legales que se deriven del presente contrato como domicilio contractual, el municipio de GALAPA - ATLÁNTICO.

El presente contrato se perfecciona con la aprobación y firma electrónica de las partes a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II.

NOTA: La presente minuta se encuentra sujeta a modificaciones.

Dirección: Calle 13 No. 17-117 Galapa, Atlántico
Correo institucional: contactenos@galapa-atlantico.gov.co
Línea de servicio a la ciudadanía: (+57) 3160272493
www.galapa-atlantico.gov.co
NIT: 890.102.472-0
AlcaldiaGalapa

ANEXO 2: ACTA DE INICIO DE OBRA

ACTA DE INICIO LP-002-2024

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GALAPA
NIT	890.102.472-0
SUPERVISOR	GUILLERMO JOSÉ GONZÁLEZ NAVARRO - C.C. 1.143.240.896
SUSCRIPCIÓN	19 DE JULIO DE 2024
DURACIÓN	NOVENTA (90) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DISPUESTOS EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 80 DE 1993 Y APROBACIÓN DEL INICIO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SECOP II
VALOR	QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($529.128.650,63) M/CTE
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PF LTDA – NIT- 900.210.235 - 1
OBJETO	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE GALAPA
CERTIFICACIÓN DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°	**2024.CEN.01.001120**

En las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Galapa-Atlántico, estando presente el Ingeniero **GUILLERMO JOSE GONZÁLEZ NAVARRO,** en su condición de Supervisor, y **YOSETH PULGAR IBARRA,** identificado con el Cedula de Ciudadanía **No. 72.289.269**, en su calidad de representante legal de **CONSTRUCTORA PF LTDA** CONTRATISTA, con el fin de dar INICIO a la ejecución del contrato cuyo objeto es **OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE GALAPA,** celebrado mediante **CONTRATO DE OBRA DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA No LP-002-2024,** suscrita el día 19 de julio de 2024.

Las partes intervinientes a través del presente documento dejan constancia del INICIO de la Ejecución del contrato.

Dado en Galapa- Atlántico, a los (22) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024).

POR EL MUNICIPIO

ING.GUILLERMO JOSE GONZALEZ NAVARRO
Secretario de desarrollo Territorial

POR EL CONTRATISTA

YOSETH PULGAR IBARRA
CONSTRUCTORA PF LTDA

POR EL INTERVENTOR

JAVIER ALEXANDER SANDOVAL PAEZ

ANEXO 3: POLIZAS CONTRATO DE OBRA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	**BARRANQUILLA**	**85**	**85-44-101130668**	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	**07**	**2024**	**19**	**07**	**2024**	**00:00**	**19**	**10**	**2029**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSTRUCTORA P F LTDA	**NIT: 900.210.235-1**	CL 45 NRO. 70 - 147	BARRANQUILLA, ATLANTICO	6053854759

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
MUNICIPIO DE GALAPA	**NIT: 890.102.472-0**	CL 13 NRO. 17 - 117	GALAPA, ATLANTICO	6053086529

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. LP-002-2024 CUYO OBJETO ES: OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	19/07/2024	19/04/2025	$158,738,595.19
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/07/2024	19/04/2025	$158,738,595.19
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/07/2024	19/10/2027	$52,912,865.06
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$26,456,432.53
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 0 AÑOS, 9 MESES Y 1 DÍAS *		$26,456,432.53

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,687,847.00	$ ******20,000.00	$ *****324,491.00	$ *********2,032,339.00	$ ******423,302,920.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ENRIQUE LOPEZ MUNARRIZ LTDA	174394	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

85-44-101130668

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	**BARRANQUILLA**	**85**	**85-44-101130668**	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	**08**	**2024**	**19**	**07**	**2024**	**00:00**	**19**	**10**	**2029**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSTRUCTORA P F LTDA	**NIT: 900.210.235-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 45 NRO. 70 - 147	BARRANQUILLA, ATLANTICO	6053854759

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE GALAPA	**NIT: 890.102.472-0**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 13 NRO. 17 - 117	GALAPA, ATLANTICO	6053086529

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. LP-002-2024 CUYO OBJETO ES: OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	19/07/2024	19/04/2025	$158,738,595.19	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/07/2024	19/04/2025	$158,738,595.19	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/07/2024	19/10/2027	$52,912,865.06	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		$26,456,432.53	$26,456,432.53
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	**SI AMPARA 0 AÑOS, 9 MESES Y 1 DÍAS ***		$158,738,595.19	$26,456,432.53

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE CORRIGE VALOR ASEGURADO DEL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.

.

DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANCEN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****267,463.00	$ **********0.00	$ ******50,818.00	$ **********318,281.00	$ ******555,585,083.16	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ENRIQUE LOPEZ MUNARRIZ LTDA	174394	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

85-44-101130668

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	**BARRANQUILLA**	**85**	**85-40-101059881**	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	**07**	**2024**	**19**	**07**	**2024**	**00:00**	**19**	**10**	**2024**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSTRUCTORA P F LTDA	**NIT: 900.210.235-1**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 45 NRO. 70 - 147	BARRANQUILLA, ATLANTICO	6053854759

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
CONSTRUCTORA P F LTDA	**NIT: 900.210.235-1**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 45 NRO. 70 - 147	BARRANQUILLA, ATLANTICO	6053854759

BENEFICIARIO: 900210235 - CONSTRUCTORA P F LTDA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. LP-002-2024 CUYO OBJETO ES: OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**19/07/2024**	**19/10/2024**	**$260,000,000.00**
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**19/07/2024**	**19/10/2024**	**$260,000,000.00**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**19/07/2024**	**19/10/2024**	**$260,000,000.00**

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****196,602.00	$ *******3,000.00	$ ******37,924.00	$ **********237,527.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ENRIQUE LOPEZ MUNARRIZ LTDA	174394	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

85-40-101059881

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	85	85-40-101059881	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	19	07	2024	00:00	19	10	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA P F LTDA — IDENTIFICACIÓN **NIT: 900.210.235-1**

DIRECCIÓN: CL 45 NRO. 70 - 147 — **CIUDAD:** BARRANQUILLA, ATLANTICO — **TELÉFONO:** 6053854759

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: CONSTRUCTORA P F LTDA — IDENTIFICACIÓN **NIT: 900.210.235-1**

DIRECCIÓN: CL 45 NRO. 70 - 147 — **CIUDAD:** BARRANQUILLA, ATLANTICO — **TELÉFONO:** 6053854759

BENEFICIARIO: 900210235 - CONSTRUCTORA P F LTDA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/07/2024	19/10/2024	$260,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/07/2024	19/10/2024	$260,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/07/2024	19/10/2024	$260,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

85-40-101059881

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 4: PRESUPUESTO OFICIAL

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

PRESUPUESTO ADECUACIONES PRIMER PISO

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		GENERAL	PARTICULAR					
	1.00			**PRELIMINARES PISO 1**				
1	1.01			TRAZADO Y REPLANTEO PISO 1	M2	80.00	$ 6,014.25	$ 481,140.00
2	1.02			CERRAMIENTO PERIMETRAL OBRA EN LONA VERDE PISO 1	ML	43.00	$ 16,038.00	$ 689,634.00
SUBTOTAL								**$ 1,170,774.00**
	2.00			**DEMOLICIONES PISO 1**				
3	2.01			DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES E=0,15 M INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN PISO 1	M2	35.00	$ 42,059.66	$ 1,472,087.93
4	2.02			DEMOLICION DE PISO Y PLANTILLA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL EN PISO 1	M2	112.00	$ 28,066.50	$ 3,143,448.00
5	2.03			DEMOLICION DE PISO Y PLANTILLA EXISTENTE ZONAS EXTERIORES EN PISO 1	M2	136.00	$ 28,066.50	$ 3,817,044.00
6	2.04			DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES EN PISO 1	UND	4.00	$ 44,505.45	$ 178,021.80
7	2.05			DESMONTE DE VENTANAS INCLUIDO VIDRIOS EN PISO 1	UND	10.00	$ 34,615.35	$ 346,153.50
8	2.06			DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL EN PISO 1	UND	173.00	$ 79,966.14	$ 13,834,141.57
9	2.07			DEMOLICION DE MUROS DE JARDINERAS EXISTENTES EN PISO 1	M2	46.00	$ 24,057.00	$ 1,106,622.00
	Subtotal							**$ 23,897,518.80**
	3.00			**CIMENTACION Y ESTRUCTURA PISO 1**				
10	3.01			VIGA DE CIMENTACION DE 0,30X0,30 EN CONCRETO DE 3000PSI REFORZADO CON 4 DE 1/2" Y ESTRIBO DE 3/8" @ 20CM EN PISO 1	ML	6.70	$ 166,809.90	$ 1,117,626.34
11	3.02			PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,07M INCLUYE REFUERZO EN VARILLA DE 1/4" CADA 40CM PARA ZONAS PEATONALES EN PISO 1	M2	136.00	$ 100,040.40	$ 13,605,494.35
12	3.03			PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,07M INCLUYE REFUERZO EN VARILLA DE 1/4" CADA 40CM ZONAS OFICINAS PISO 1	M2	112.00	$ 100,040.40	$ 11,204,524.76
13	3.04			DINTELES DE 0,15X 0,2 M EN PISO 1	ML	32.00	$ 76,091.49	$ 2,434,927.65
14	3.05			PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=10CM REFORZADO CON VARILLAS DE 3/8" @ 30CM AMBOS SENTIDOS ZONA DE PARQUEADEROS EN PISO 1	M2	60.00	$ 120,484.35	$ 7,229,060.86
15	3.06			VIGA DE CIMIENTO DE 0,2 X 0,20 M EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI 4VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20CM EN PISO 1	ML	36.70	$ 74,761.24	$ 2,743,737.69
	SUBTOTAL							**$ 38,335,371.66**
	4.00			**EXCAVACIONES Y RELLENOS PISO 1**				
16	4.01			EXCAVACION MANUAL Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE EN PISO 1	M3	40.00	$ 45,441.00	$ 1,817,640.00
17	4.02			RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PM EN PISO 1	M3	30.00	$ 114,939.00	$ 3,448,170.00
18	4.03			BASE EN SUELO CEMENTO E=15CM RELACION 1:10 EN PISO 1	M3	9.45	$ 168,399.00	$ 1,591,370.55
19	4.04			SUMINISTRO DE ARENA NEGRA EN PISO 1	M3	4.00	$ 37,422.00	$ 149,688.00
	SUBTOTAL							**$ 7,006,868.55**
	5.00			**MAMPOSTERIA PISO 1**				
20	5.01			LEVANTE EN BLOCK SAMO N° 4 EN PISO 1	M2	40.76	$ 70,100.76	$ 2,857,307.04
21	5.02			PAÑETE EN MORTERO RELACION 1:4 E: 0.02 EN PISO 1	M2	121.72	$ 29,544.07	$ 3,596,104.64
	SUBTOTAL							**$ 6,453,411.68**
	6.00			**ACABADOS PISO 1**				
22	6.01			ESCARIFICACION DE PARED Y LOSA EN PISO 1	M2	506.00	$ 13,926.98	$ 7,047,051.06
23	6.02			ESTUCO EN PULYPLAS PARA MURO Y CIELO A TRES MANOS EN PISO 1	M2	506.00	$ 46,643.85	$ 23,601,788.10
24	6.03			PINTURA EN VINILO TIPO 1 A TRES MANOS EN PISO 1	M2	506.00	$ 27,923.58	$ 14,129,331.53
25	6.04			SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DRYWAL, INCLUYE ACABADO PINTADO A 3 MANOS EN PISO 1	M2	75.00	$ 112,693.52	$ 8,452,014.21
	SUBTOTAL							**$ 53,230,184.90**
	7.00			**PISOS PISO 1**				
26	7.01			PISO EN BALDOSA EN PORCELANATO 0.6 X 0.6 EN PISO 1	M2	112.00	$ 160,380.00	$ 17,962,560.00
27	7.02			PISO EN CERAMICA TRAFICO PESADO ANTIDESLIZANTE BAÑO EN PISO 1	M2	12.18	$ 123,519.33	$ 1,504,465.44
28	7.03			ZOCALOS EN PISO 1	ML	250.00	$ 26,437.34	$ 6,609,333.81
29	7.04			ENCHAPE PARED BAÑO EN PISO 1	M2	68.00	$ 126,967.50	$ 8,633,790.00
30	7.05			PISO EN TABLETA GRES DE 0,3X0,3 PARA ZONAS EXTERIORES EN PISO 1	M2	136.00	$ 111,385.13	$ 15,148,377.00
	SUBTOTAL							**$ 49,858,526.25**
	8.00			**CUBIERTA PISO 1**				
31	8.01			SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA PERFIL 7, INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA ABARCO EN PISO 1	M2	75.00	$ 171,494.67	$ 12,862,100.11
	SUBTOTAL							**$ 12,862,100.11**
	9.00			**CARPINTERIA PISO 1**				
32	9.01			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA DE 1.0 X 2 EN PISO 1	UND	1.00	$ 1,278,255.33	$ 1,278,255.33
33	9.02			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PARA BAÑO 0.85 X 2.0 EN PISO 1	UND	3.00	$ 1,251,525.33	$ 3,754,575.99
34	9.03			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PRINCIPALES 1.2 X 2.0 EN PISO 1	UND	3.00	$ 1,640,553.75	$ 4,921,661.25
35	9.04			SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA METALICA EN ALUMINIO 70-44 EN PISO 1	M2	14.00	$ 465,457.15	$ 6,516,400.16
36	9.05			SUMINISTRO EN INSTALACION DE PROTECTOR EM VARILLA CUADRADA DE 1/2" EN PISO 1	M2	14.00	$ 399,724.48	$ 5,596,142.73
37	9.06			SUMINISTRO DE BARANDA EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" Y 1 1/2" Y VIDRIO DE SEGURIDAD PARA PASAMANO ESCALERA EN PISO 1	M2	3.30	$ 1,043,866.64	$ 3,444,759.92
	SUBTOTAL							**$ 25,511,795.39**
	10.00			**INSTALACIONES SANITARIAS PISO 1**				
38	10.01			SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS EN PISO 1	UND	3.00	$ 351,900.45	$ 1,055,701.35
39	10.02			SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS EN PISO 1	UND	2.00	$ 886,487.09	$ 1,772,974.17
40	10.03			SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES EN PISO 1	UND	1.00	$ 698,702.15	$ 698,702.15
41	10.04			PUNTO SANITARIO PVC 3" EN PISO 1	UND	3.00	$ 111,725.39	$ 335,176.16
42	10.05			PUNTO SANITARIO PVC 2" EN PISO 1	UND	9.00	$ 89,411.63	$ 804,704.70
43	10.06			REDES DE TUBERIA SANITARIA PVC 3" (INCLUYE ACCESORIO) EN PISO 1	ML	45.00	$ 70,106.76	$ 3,154,804.26
44	10.07			REDES DE TUBERIA SANITARIA PVC 2"(INCLUYE ACCESORIO) EN PISO 1	ML	40.00	$ 54,877.37	$ 2,195,094.98
45	10.08			REGISTRO SANITARIO DE INSPECCION EN LADRILLO COMUN (0,45X0,45) EN PISO 1	UND	5.00	$ 475,640.30	$ 2,378,201.51
46	10.09			PUNTO DE AGUA POTABLE PVC 1/2" EN PISO 1	UND	9.00	$ 54,404.91	$ 489,644.15
47	10.1			REDES DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" (INLCUYE ACCESORIOS) EN PISO 1	ML	50.00	$ 21,869.15	$ 1,093,457.48
	SUBTOTAL							**$ 13,978,460.90**
	11.00			**INSTALACIONES ELECTRICAS PISO 1**				
48	11.01			SALIDA TOMACORRIENTE 110 VOLTIOS PISO 1	UND	24.00	$ 163,978.69	$ 3,935,488.48
49	11.02			SALIDA TOMACORRIENTE 220 VOLTIOS (AIRE ACONDICIONADO) PISO 1	UND	8.00	$ 235,365.16	$ 1,882,921.29
50	11.03			SALIDA PARA SWITCHE SENCILLO PISO 1	UND	3.00	$ 52,097.60	$ 156,292.80
51	11.04			SALIDA PARA SWITCHE DOBLE PISO 1	UND	6.00	$ 64,397.41	$ 386,384.45

52	11.05			ACOMETIDA PARCIAL EN TUBERIA PVC DE 3/4" ALAMBRE AISLADO (TRES LINEAS N° 8) AWG THHN. N° 12 AWG. (THHN) PISO 1	ML	80.00	$ 51,612.88	$ 4,129,030.14
53	11.06			INTERRUPTOR DOBLE PISO 1	UND	6.00	$ 60,075.68	$ 360,454.05
54	11.07			INTERRUPTOR SENCILLO PISO 1	UND	3.00	$ 50,720.18	$ 152,160.53
55	11.08			SALIDA PARA LAMPARA LED 60 W PISO 1	UND	20.00	$ 172,113.13	$ 3,442,262.67
56	11.09			TABLERO ELECTRICO DE 12 CIRCUITOS PISO 1	UND	3.00	$ 448,556.13	$ 1,345,668.39
57	11.1			TOTALIZADOR CON CAJA PISO 1	UND	1.00	$ 468,603.63	$ 468,603.63
58	11.11			MALLA A TIERRA CON 3 VARILLAS COPER WELL DE 1,8 M X 5/8" PISO 1	UND	1.00	$ 1,345,320.90	$ 1,345,320.90
	SUBTOTAL							**$ 17,604,587.32**
SUBTOTAL OBRAS PRIMER PISO								**$ 249,909,599.56**

OBRAS ADICIONALES PRIMER PISO


PRESUPUESTO ADECUACIONES SEGUNDO PISO

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
	12.00			**PRELIMINARES PISO 2**				
59	12.01			TRAZADO Y REPLANTEO EN PISO 2	M2	113.43	$ 6,014.25	$ 682,196.38
SUBTOTAL								**$ 682,196.38**
	13.00			**DEMOLICIONES PISO 2**				
60	13.01			DEMOLICION DE PISO Y PLANTILLA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL EN PISO 2	M2	113.43	$ 28,066.50	$ 3,183,583.10
	Subtotal							**$ 3,183,583.10**
	14.00			**CIMENTACION Y ESTRUCTURA PISO 2**				
61	14.01			PLANTILLA DE NIVELACION EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,05M INCLUYE REFUERZO EN VARILLA DE 1/4" CADA 40CM EN PISO 2	M2	112.00	$ 82,554.97	$ 9,246,156.66
62	14.02			DINTELES DE 0,15X 0,2 M EN PISO 2	ML	15.00	$ 76,091.49	$ 1,141,372.34
63	14.03			VIGA DE AMARRE PARA REALCE Y CONFINAMIENTO DE MUROS DE 0,15 X 0,25 M REFORZADA CON DOS VARILLAS DE 3/8 Y GANCHOS DE 1/4 @ 20CM EN PISO 2	ML	196.50	$ 104,660.15	$ 20,565,718.60
	SUBTOTAL							**$ 30,953,247.60**
	15.00			**MAMPOSTERIA PISO 2**				
64	15.01			LEVANTE EN BLOCK SAMO N° 4 EN PISO 2	M2	15.00	$ 70,100.76	$ 1,051,511.42
65	15.02			PAÑETE EN MORTERO RELACION 1:4 E: 0.02 EN PISO 2	M2	30.00	$ 29,544.07	$ 886,322.21
	SUBTOTAL							**$ 1,937,833.63**
	16.00			**ACABADOS PISO 2**				
66	16.01			ESCARIFICACION DE PARED Y LOSA EN PISO 2	M2	950.00	$ 13,926.98	$ 13,230,629.45
67	16.02			ESTUCO EN PULYPLAS PARA MURO Y CIELO A TRES MANOS EN PISO 2	M2	950.00	$ 46,643.85	$ 44,311,657.50
68	16.03			PINTURA EN VINILO TIPO 1 A TRES MANOS EN PISO 2	M2	950.00	$ 27,923.58	$ 26,527,401.10
69	16.04			SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DRYWAL, INCLUYE ACABADO PINTADO A 3 MANOS EN PISO 2	M2	143.43	$ 112,693.52	$ 16,163,631.97
	SUBTOTAL							**$ 100,233,320.02**
	17.00			**PISOS PISO 2**				
70	17.01			PISO EN BALDOSA EN PORCELANATO 0.6 X 0.6 EN PISO 2	M2	127.87	$ 160,380.00	$ 20,507,790.60
71	17.02			PISO EN CERAMICA TRAFICO PESADO ANTIDESLIZANTE BAÑO EN PISO 2	M2	5.00	$ 123,519.33	$ 617,596.65
72	17.03			ZOCALOS EN PISO 2	ML	150.00	$ 26,437.34	$ 3,965,600.29
73	17.04			ENCHAPE PARED BAÑO EN PISO 2	M2	28.60	$ 126,967.50	$ 3,631,270.50
	SUBTOTAL							**$ 28,722,258.04**
	18.00			**CUBIERTA PISO 2**				
74	18.01			SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA PERFIL 7, INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA ABARCO EN PISO 2	M2	173.00	$ 171,494.67	$ 29,668,577.59
75	18.02			IMPERMEABILIZACION EN MANTO EDIL DE 4MM PARA LOSA TANQUE, LOSA LIBRE Y ZABALETAS EN PISO 2	M2	40.00	$ 84,199.50	$ 3,367,980.00
76	18.03			ZABALETA EN BLOQUE VIBROPRENSADO No.4 EN PISO 2	ML	24.00	$ 29,738.46	$ 713,723.08
	SUBTOTAL							**$ 33,750,280.66**
	19.00			**CARPINTERIA PISO 2**				
77	19.01			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA DE 1.0 X 2.0 PISO 2	UND	6.00	$ 1,278,255.33	$ 7,669,531.98
78	19.02			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PARA BAÑO 0.85 X 2.0 PISO 2	UND	2.00	$ 1,251,525.33	$ 2,503,050.66
79	19.03			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA CORREDIZAS PRINCIPALES 1.6 X 2.0 PISO 2	UND	1.00	$ 1,745,862.17	$ 1,745,862.17
80	19.04			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PARA BAÑO 0.76 X 1,8 M PISO 2	UND	1.00	$ 1,057,732.83	$ 1,057,732.83
81	19.05			SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA METALICA EN ALUMINIO 70-44 PISO 2	M2	20.58	$ 465,457.15	$ 9,579,108.24
82	19.06			SUMINISTRO EN INSTALACION DE PROTECTOR EM VARILLA CUADRADA DE 1/2" PISO 2	M2	21.00	$ 399,724.48	$ 8,394,214.10
83	19.07			SUMINISTRO DE BARANDA EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" Y 1 1/2" Y VIDRIO DE SEGURIDAD No. 10 PARA PASAMANO FACHADA PISO 2	M2	16.05	$ 1,043,866.64	$ 16,754,059.61
	SUBTOTAL							**$ 47,703,559.59**
	20.00			**INSTALACIONES SANITARIAS PISO 2**				
84	20.01			SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS EN PISO 2	UND	2.00	$ 351,900.45	$ 703,800.90
85	20.02			SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS EN PISO 2	UND	2.00	$ 886,487.09	$ 1,772,974.17
86	20.03			SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES EN PISO 2	UND	2.00	$ 698,702.15	$ 1,397,404.31
87	20.04			PUNTO SANITARIO PVC 3" EN PISO 2	UND	2.00	$ 111,725.39	$ 223,450.77
88	20.05			PUNTO SANITARIO PVC 2" EN PISO 2	UND	6.00	$ 89,411.63	$ 536,469.80
89	20.06			REDES DE TUBERIA SANITARIA PVC 3" (INCLUYE ACCESORIO) EN PISO 2	ML	5.00	$ 70,106.76	$ 350,533.81
90	20.07			REDES DE TUBERIA SANITARIA PVC 2"(INCLUYE ACCESORIO) EN PISO 2	ML	25.00	$ 54,877.37	$ 1,371,934.36
91	20.08			PUNTO DE AGUA POTABLE PVC 1/2" EN PISO 2	UND	6.00	$ 54,404.91	$ 326,429.43
92	20.09			REDES DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" (INLCUYE ACCESORIOS) EN PISO 2	ML	23.00	$ 21,869.15	$ 502,990.44
	SUBTOTAL							**$ 7,185,987.98**
	21.00			**INSTALACIONES ELECTRICAS PISO 2**				
93	21.01			SALIDA TOMACORRIENTE 110 VOLTIOS EN PISO 2	UND	38.00	$ 163,978.69	$ 6,231,190.09
94	21.02			SALIDA TOMACORRIENTE 220 VOLTIOS (AIRE ACONDICIONADO) EN PISO 2	UND	11.00	$ 235,365.16	$ 2,589,016.77
95	21.03			SALIDA PARA SWITCHE SENCILLO EN PISO 2	UND	3.00	$ 52,097.60	$ 156,292.80
96	21.04			SALIDA PARA SWITCHE DOBLE EN PISO 2	UND	10.00	$ 64,397.41	$ 643,974.08
97	21.05			ACOMETIDA PARCIAL EN TUBERIA PVC DE 3/4" ALAMBRE AISLADO (DOS LINEAS N° 12) AWG THHN. N° 12 AWG. (THHN) EN PISO 2	ML	190.00	$ 42,217.28	$ 8,021,283.54
98	21.06			INTERRUPTOR DOBLE EN PISO 2	UND	6.00	$ 60,075.68	$ 360,454.05
99	21.07			INTERRUPTOR SENCILLO EN PISO 2	UND	3.00	$ 50,720.18	$ 152,160.53
100	21.08			SALIDA PARA LAMPARA LED 60 W EN PISO 2	UND	39.00	$ 172,113.13	$ 6,712,412.21
	SUBTOTAL							**$ 24,866,784.07**
SUBTOTAL OBRAS SEGUNDO PISO								**$ 279,219,051.07**


OBRAS ADICIONALES SEGUNDO PISO

			VALOR TOTAL CONTRATO INCLUYE AIU DEL 35%	**CONDICIONES ORIGINAL DEL CONTRATO**	**$**	**529,128,650.63**

ANEXO 5: PLANOS INICIALES

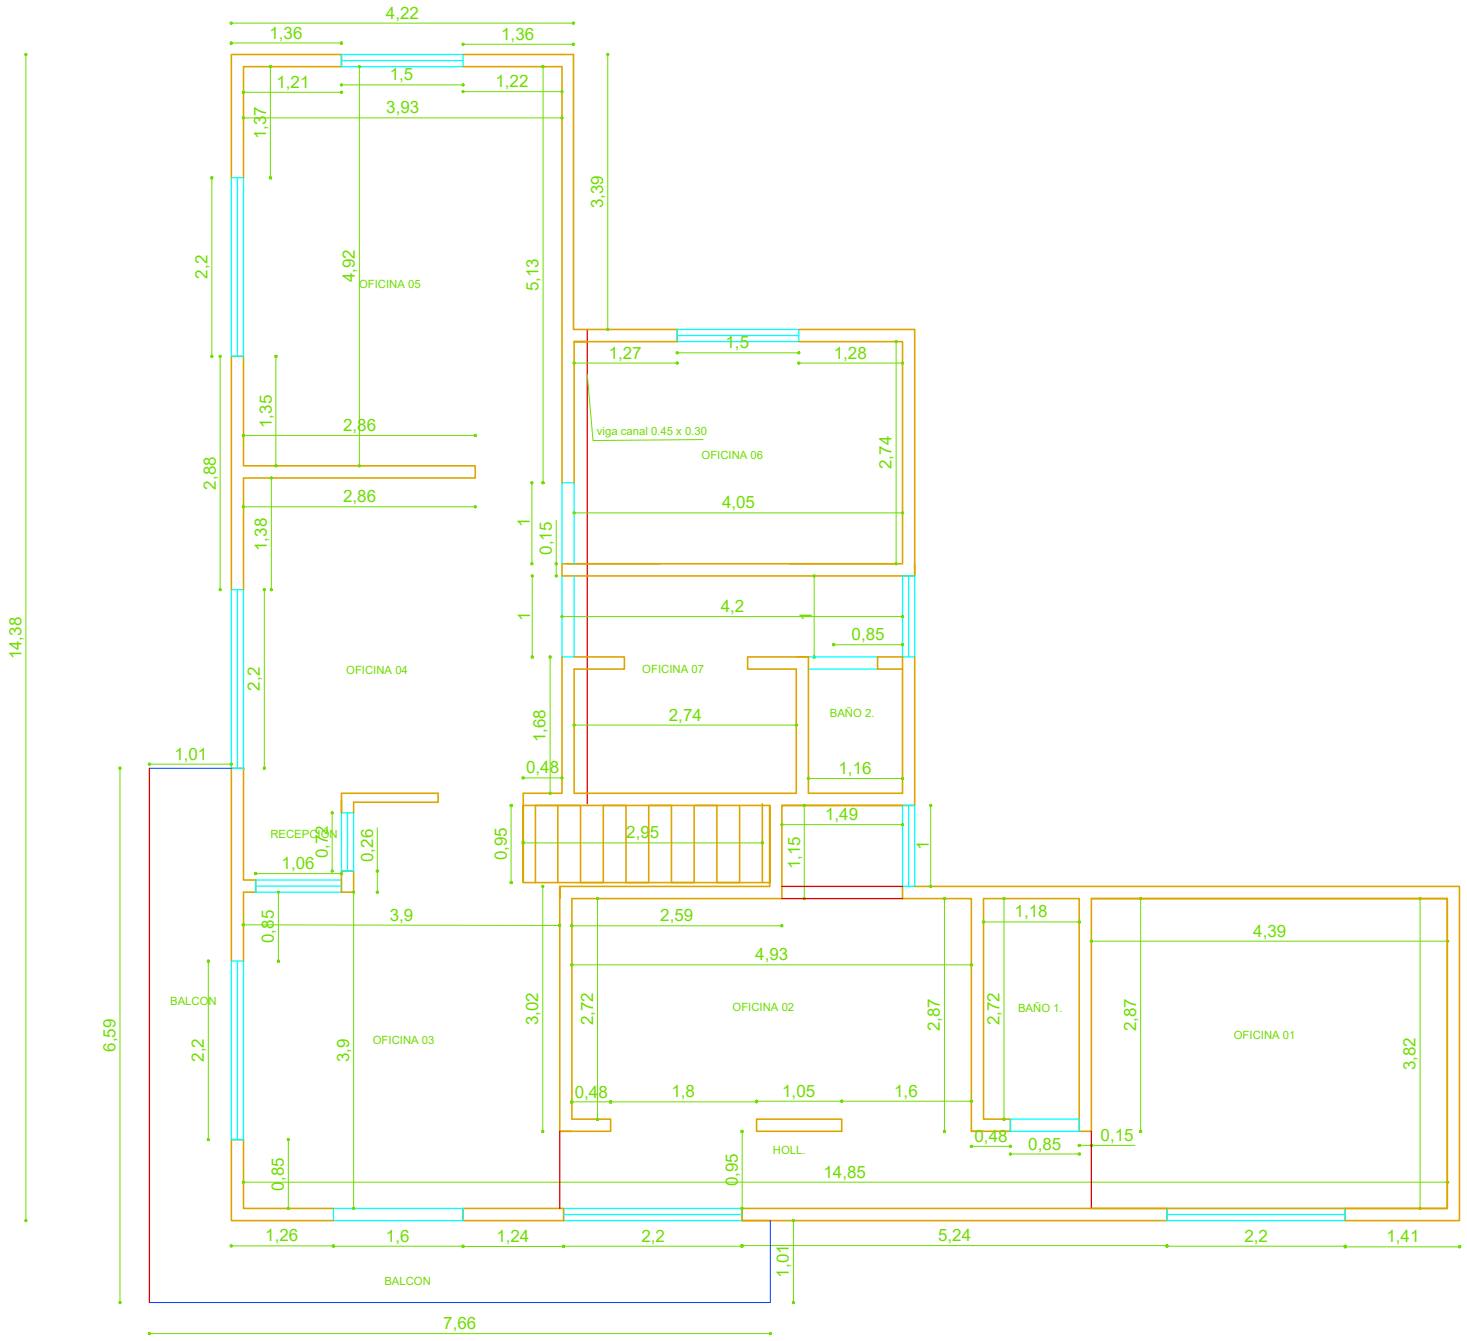

PLANO PLANTA SEGUNDO PISO
PEOPUESTA FINAL

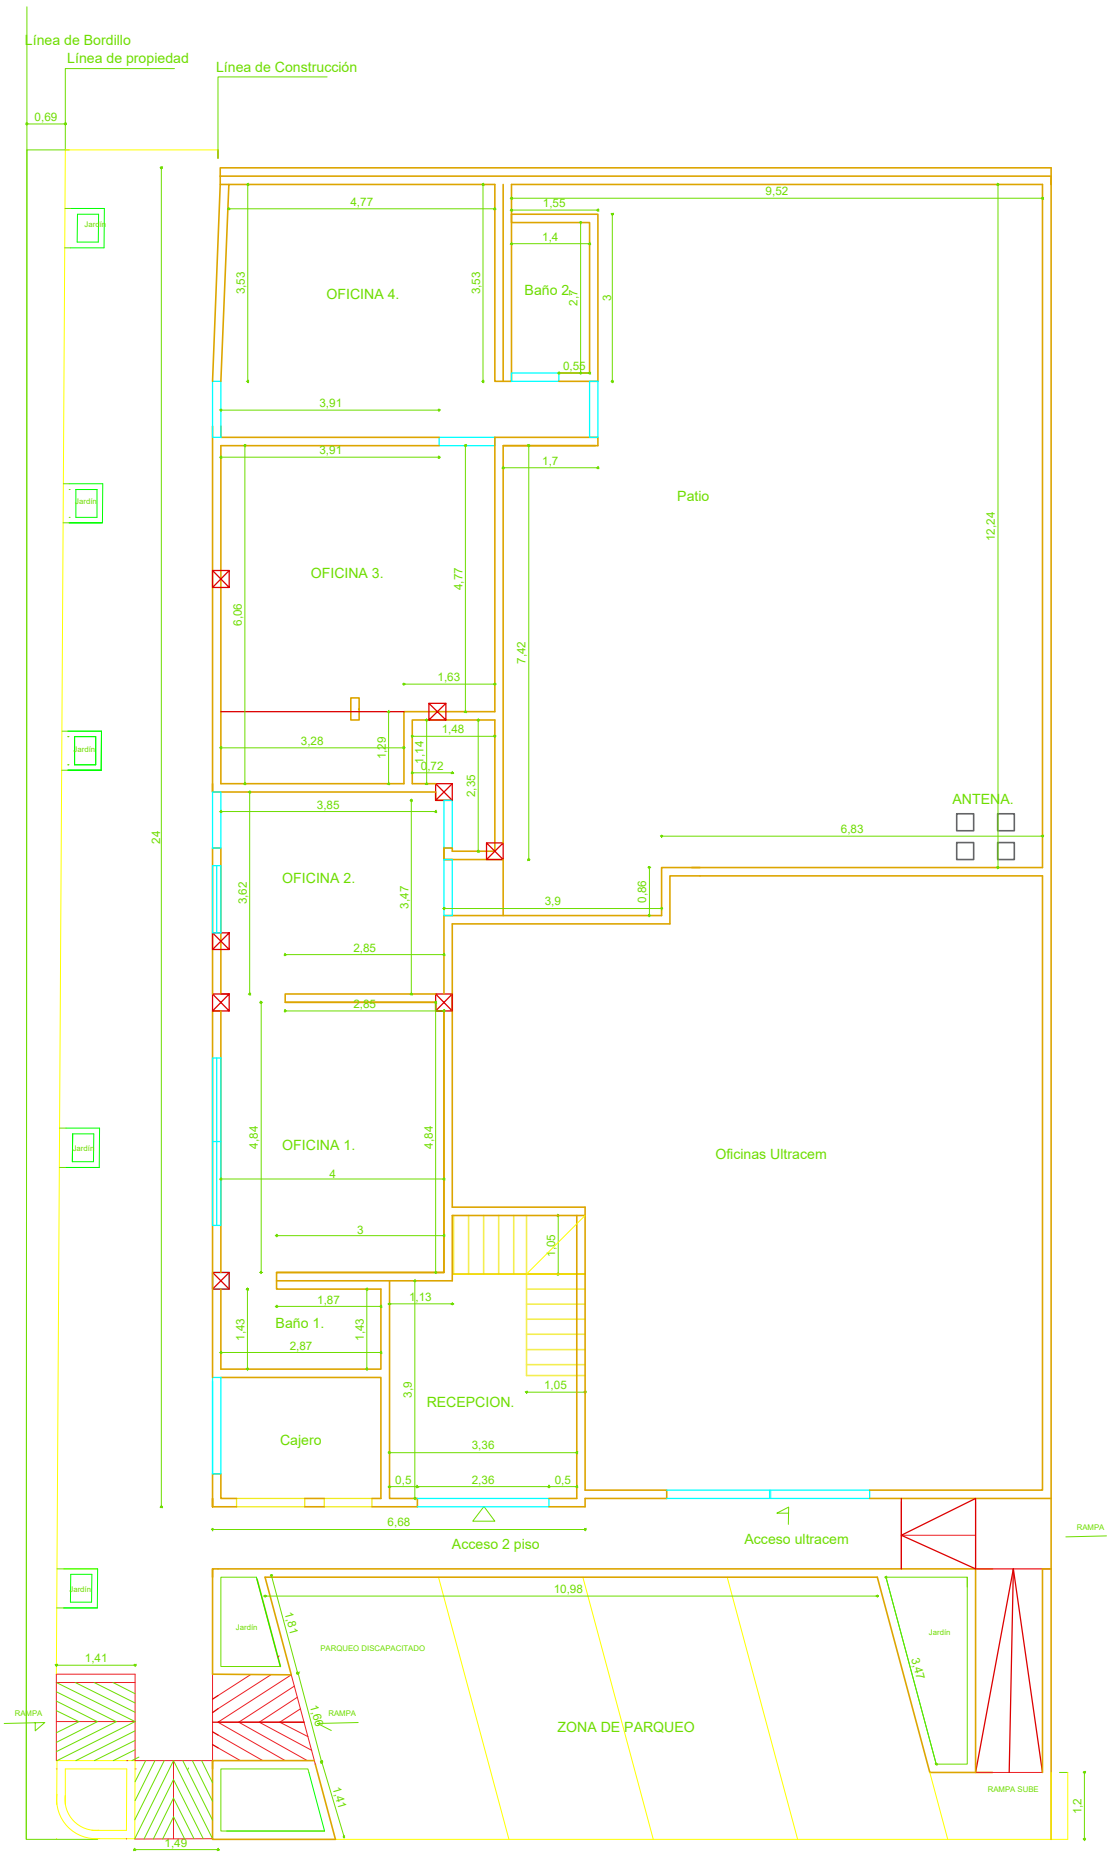

PLANO PLANTA NIVEL 1


ANTIGUA ALCALDÍA DE GALAPA

PROPUESTA PLANTA 1 FINAL

ANEXO 6: CRONOGRAMA, FLUJO DE FONDOS Y CUADRO DE SEGUIMIENTO


programacion de obra alcaldia vieja.mpp

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**1**	**OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO**	**90 días?**	**jue 22/08/24**	**jue 5/12/24**	
2	.	INICIO	0 días	jue 22/08/24	jue 22/08/24	
3	**A**	**ADECUACIONES PISO 1 ANTIGUA ALCALDIA**	**86 días**	**mar 27/08/2**	**jue 5/12/24**	
4	**1**	**PRELIMINARES**	**3 días**	**mar 27/08/2**	**jue 29/08/24**	
5	1.1	TRAZADO Y REPLANTEO PISO 1	3 días	mar 27/08/24	jue 29/08/24	2CC+4 días
6	1.2.1.2	CERRAMIENTO PERIMETRAL OBRA EN LONA VERDE PISO 1	1 día	mar 27/08/24	mar 27/08/24	2CC+4 días
7	**2**	**DEMOLICIONES PISO 1**	**16 días**	**mar 27/08/2**	**vie 13/09/24**	
8	2.1	DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES E=0,15 M INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN PISO 1	8 días	mié 28/08/24	jue 5/09/24	6CC+1 día
9	1.2.2.2	DEMOLICION DE PISO Y PLANTILLA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL EN PISO 1	12 días	jue 29/08/24	mié 11/09/24	6CC+2 días
10	1.2.2.3	DEMOLICION DE PISO Y PLANTILLA EXISTENTE ZONAS EXTERIORES EN PISO 1	9 días	mié 4/09/24	vie 13/09/24	9CC+5 días
11	1.2.2.4	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES EN PISO 1	3 días	mar 27/08/24	jue 29/08/24	5CC

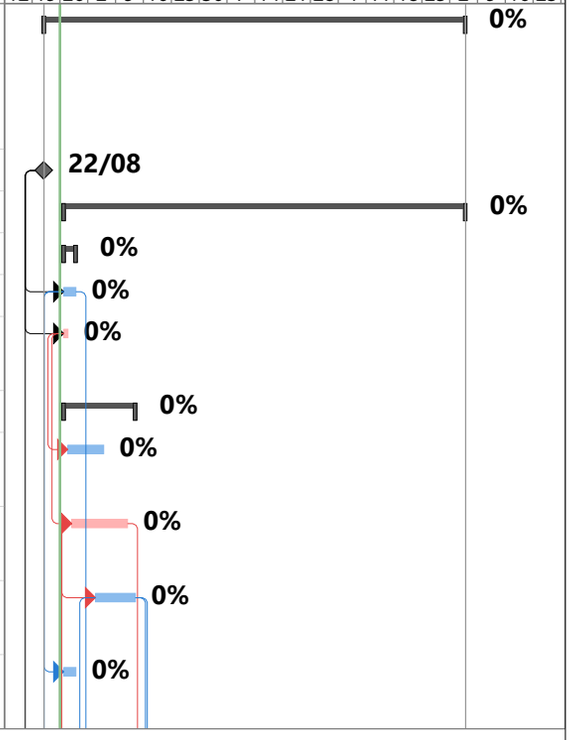


Tareas críticas	solo fin	Resumen manual
División crítica	solo duración	Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica	Línea base	Tareas externas
Tarea	División de la línea base	Hito externo
División	Hito de línea base	Tarea inactiva
Progreso de tarea	Hito	Hito inactivo
Tarea manual	Progreso del resumen	Resumen inactivo
solo el comienzo	Resumen	Fecha límite


Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predecesoras
12	1.2.2.5	DESMONTE DE VENTANAS INCLUIDO VIDRIOS EN PISO 1	5 días	mar 27/08/24	sáb 31/08/24	2CC+4 días
13	1.2.2.6	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL EN PISO 1	3 días	mar 10/09/24	jue 12/09/24	9CC+10 días
14	2.2	DEMOLICION DE MUROS DE JARDINERAS EXISTENTES EN PISO 1	2 días	jue 5/09/24	vie 6/09/24	10CC+1 día
15	**3**	**CIMENTACION Y ESTRUCTURA PISO 1**	**33 días**	**sáb 14/09/24**	**mié 23/10/24**	
16	3.1	VIGA DE CIMENTACION DE 0,30X0,30 EN CONCRETO DE 3000PSI REFORZADO CON 4 DE 1/2" Y ESTRIBO DE 3/8" @ 20CM EN PISO 1	8 días	sáb 14/09/24	lun 23/09/24	9FC+2 días
17	3.2	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,07M INCLUYE REFUERZO EN VARILLA DE 1/4" CADA 40CM PARA ZONAS PEATONALES EN PISO 1	10 días	vie 27/09/24	mar 8/10/24	16FC+3 días
18	3.3	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,07M INCLUYE REFUERZO EN VARILLA DE 1/4" CADA 40CM ZONAS OFICINAS PISO 1	20 días	jue 26/09/24	sáb 19/10/24	16FC+2 días
19	1.2.3.4	DINTELES DE 0,15X 0,2 M EN PISO 1	3 días	lun 21/10/24	mié 23/10/24	18
20	1.2.3.5	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=10CM REFORZADO CON VARILLAS DE 3/8" @ 30CM AMBOS SENTIDOS ZONA DE PARQUEADEROS EN PISO 1	9 días	mié 18/09/24	vie 27/09/24	25

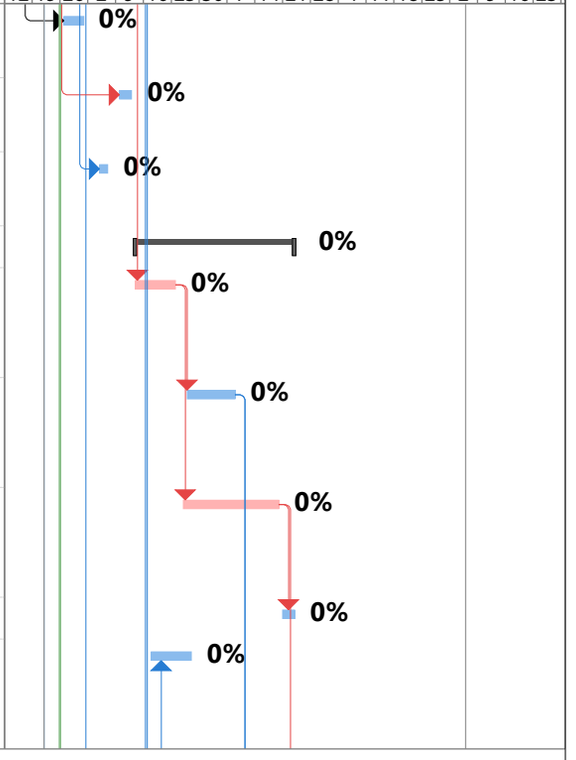


Tareas críticas	solo fin	Resumen manual
División crítica	solo duración	Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica	Línea base	Tareas externas
Tarea	División de la línea base	Hito externo
División	Hito de línea base	Tarea inactiva
Progreso de tarea	Hito	Hito inactivo
Tarea manual	Progreso del resumen	Resumen inactivo
solo el comienzo	Resumen	Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predecesoras
21	1.2.3.6	VIGA DE CIMIENTO DE 0,2 X 0,20 M EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI 4VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20CM EN PISO 1	5 días	mar 17/09/24	sáb 21/09/24	10FC+2 días
22	**4**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS PISO 1**	**60 días**	**sáb 31/08/24**	**sáb 9/11/24**	
23	4.1	EXCAVACION MANUAL Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE EN PISO 1	10 días	sáb 31/08/24	mié 11/09/24	9CC+2 días
24	4.2	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PM EN PISO 1	15 días	mar 3/09/24	jue 19/09/24	23CC+2 días
25	4.3	BASE EN SUELO CEMENTO E=15CM RELACION 1:10 EN PISO 1	3 días	sáb 14/09/24	mar 17/09/24	10
26	4.4	SUMINISTRO DE ARENA NEGRA EN PISO 1	15 días	jue 24/10/24	sáb 9/11/24	29
27	**5**	**MAMPOSTERIA PISO 1**	**12 días**	**mié 9/10/24**	**mié 23/10/24**	
28	5.1	LEVANTE EN BLOCK SAMO N° 4 EN PISO 1	10 días	mié 9/10/24	lun 21/10/24	17
29	5.2	PAÑETE EN MORTERO RELACION 1:4 E: 0.02 EN PISO 1	10 días	vie 11/10/24	mié 23/10/24	28CC+2 días
30	**1.2.6**	**ACABADOS PISO 1**	**61 días**	**vie 30/08/24**	**sáb 9/11/24**	
31	1.2.6.1	ESCARIFICACION DE PARED Y LOSA EN PISO 1	25 días	vie 30/08/24	vie 27/09/24	5
32	1.2.6.2	ESTUCO EN PULYPLAS PARA MURO Y CIELO A TRES MANOS EN PISO 1	25 días	jue 5/09/24	jue 3/10/24	31CC+5 días

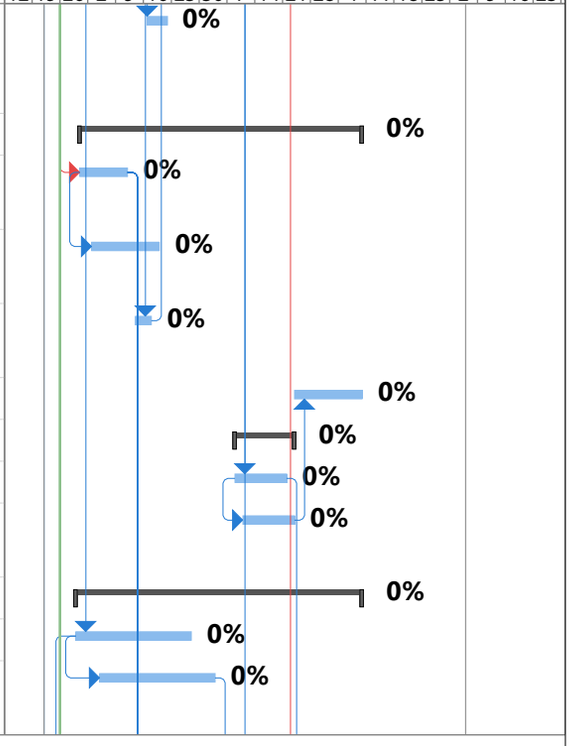





Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predecesoras
33	1.2.6.3	PINTURA EN VINILO TIPO 1 A TRES MANOS EN PISO 1	15 días	vie 4/10/24	mar 22/10/24	32
34	1.2.6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DRYWAL, INCLUYE ACABADO PINTADO A 3 MANOS EN PISO 1	10 días	mié 30/10/24	sáb 9/11/24	42
35	**1.2.7**	**PISOS PISO 1**	**41 días**	**vie 11/10/24**	**jue 28/11/24**	
36	1.2.7.1	PISO EN BALDOSA EN PORCELANATO 0.6 X 0.6 EN PISO 1	20 días	mié 23/10/24	jue 14/11/24	18FC+2 días
37	1.2.7.2	PISO EN CERAMICA TRAFICO PESADO ANTIDESLIZANTE BAÑO EN PISO 1	10 días	lun 18/11/24	jue 28/11/24	36FC+2 días
38	1.2.7.3	ZOCALOS EN PISO 1	7 días	mié 20/11/24	mié 27/11/24	36FC+4 días
39	1.2.7.4	ENCHAPE PARED BAÑO EN PISO 1	1 día?	mié 20/11/24	mié 20/11/24	36FC+4 días
40	1.2.7.5	PISO EN TABLETA GRES DE 0,3X0,3 PARA ZONAS EXTERIORES EN PISO 1	8 días	vie 11/10/24	lun 21/10/24	17FC+2 días
41	**1.2.8**	**CUBIERTA PISO 1**	**7 días**	**mar 22/10/2**	**mar 29/10/24**	
42	1.2.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA PERFIL 7, INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA ABARCO EN PISO 1	7 días	mar 22/10/24	mar 29/10/24	28
43	**1.2.9**	**CARPINTERIA PISO 1**	**6 días**	**vie 29/11/24**	**jue 5/12/24**	

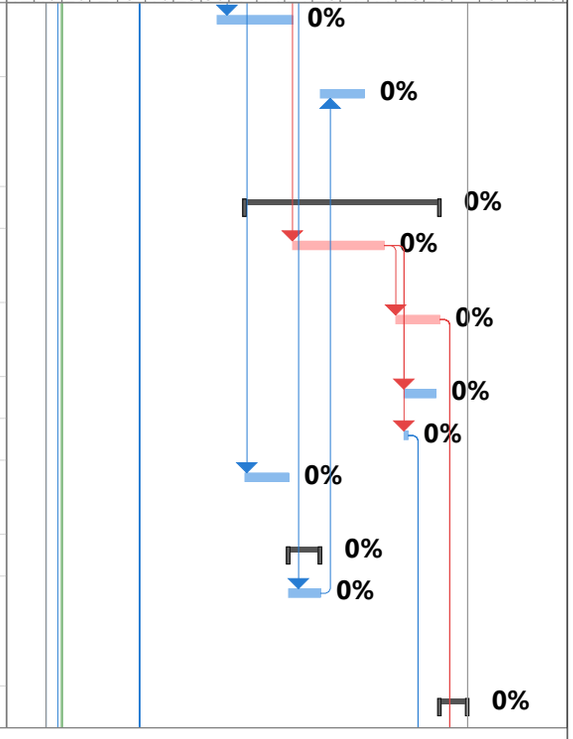


Tareas críticas	solo fin	Resumen manual
División crítica	solo duración	Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica	Línea base	Tareas externas
Tarea	División de la línea base	Hito externo
División	Hito de línea base	Tarea inactiva
Progreso de tarea	Hito	Hito inactivo
Tarea manual	Progreso del resumen	Resumen inactivo
solo el comienzo	Resumen	Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predecesoras
44	1.2.9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA DE 1.0 X 2 EN PISO 1	5 días	vie 29/11/24	mié 4/12/24	37
45	1.2.9.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PARA BAÑO 0.85 X 2.0 EN PISO 1	5 días	vie 29/11/24	mié 4/12/24	37
46	1.2.9.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PRINCIPALES 1.2 X 2.0 EN PISO 1	5 días	vie 29/11/24	mié 4/12/24	37
47	1.2.9.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA METALICA EN ALUMINIO 70-44 EN PISO 1	5 días	vie 29/11/24	mié 4/12/24	37
48	1.2.9.5	SUMINISTRO EN INSTALACION DE PROTECTOR EM VARILLA CUADRADA DE 1/2" EN PISO 1	5 días	vie 29/11/24	mié 4/12/24	37
49	1.2.9.6	SUMINISTRO DE BARANDA EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" Y 1 1/2" Y VIDRIO DE SEGURIDAD PARA PASAMANO ESCALERA EN PISO 1	6 días	vie 29/11/24	jue 5/12/24	37
50	**1.2.10**	**INSTALACIONES SANITARIAS PISO 1**	**61 días**	**jue 12/09/24**	**vie 22/11/24**	
51	1.2.10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS EN	2 días	jue 21/11/24	vie 22/11/24	39
52	1.2.10.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS EN PISO 1	2 días	jue 21/11/24	vie 22/11/24	39
53	1.2.10.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES EN PISO 1	2 días	jue 21/11/24	vie 22/11/24	39
54	1.2.10.4	PUNTO SANITARIO PVC 3" EN PISO 1	4 días	jue 12/09/24	lun 16/09/24	23

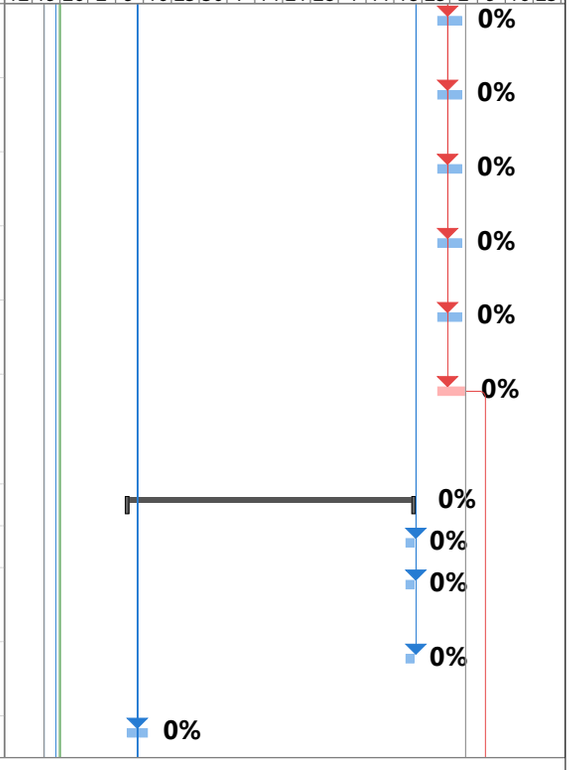





Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predecesoras
55	1.2.10.5	PUNTO SANITARIO PVC 2" EN PISO 1	4 días	jue 12/09/24	lun 16/09/24	23
56	1.2.10.6	REDES DE TUBERIA SANITARIA PVC 3" (INCLUYE ACCESORIO) EN PISO 1	4 días	jue 12/09/24	lun 16/09/24	23
57	1.2.10.7	REDES DE TUBERIA SANITARIA PVC 2"(INCLUYE ACCESORIO) EN PISO 1	5 días	jue 12/09/24	mar 17/09/24	23
58	1.2.10.8	REGISTRO SANITARIO DE INSPECCION EN LADRILLO COMUN (0,45X0,45) EN PISO 1	4 días	jue 12/09/24	lun 16/09/24	23
59	1.2.10.9	PUNTO DE AGUA POTABLE PVC 1/2" EN PISO 1	4 días	jue 12/09/24	lun 16/09/24	23
60	1.2.10.10	REDES DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" (INLCUYE ACCESORIOS) EN PISO 1	5 días	jue 12/09/24	mar 17/09/24	23
61	**1.2.11**	**INSTALACIONES ELECTRICAS PISO 1**	**20 días**	**vie 30/08/24**	**sáb 21/09/24**	
62	1.2.11.1	SALIDA TOMACORRIENTE 110 VOLTIOS PISO 1	10 días	lun 9/09/24	jue 19/09/24	70
63	1.2.11.2	SALIDA TOMACORRIENTE 220 VOLTIOS (AIRE ACONDICIONADO) PISO 1	10 días	lun 9/09/24	jue 19/09/24	70
64	1.2.11.3	SALIDA PARA SWITCHE SENCILLO PISO 1	10 días	lun 9/09/24	jue 19/09/24	70
65	1.2.11.4	SALIDA PARA SWITCHE DOBLE PISO 1	10 días	lun 9/09/24	jue 19/09/24	70
66	1.2.11.5	ACOMETIDA PARCIAL EN TUBERIA PVC DE 3/4" ALAMBRE AISLADO (TRES LINEAS N° 8) AWG THHN. N° 12 AWG. (THHN) PISO 1	4 días	vie 30/08/24	mar 3/09/24	31CC
67	1.2.11.6	INTERRUPTOR DOBLE PISO 1	5 días	mar 17/09/24	sáb 21/09/24	68

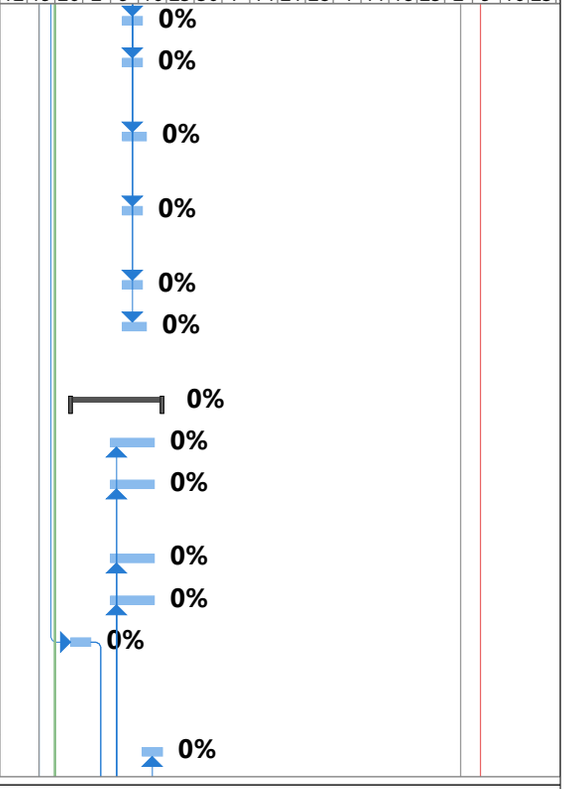


Tareas críticas	solo fin	Resumen manual
División crítica	solo duración	Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica	Línea base	Tareas externas
Tarea	División de la línea base	Hito externo
División	Hito de línea base	Tarea inactiva
Progreso de tarea	Hito	Hito inactivo
Tarea manual	Progreso del resumen	Resumen inactivo
solo el comienzo	Resumen	Fecha límite


Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predecesoras
68	1.2.11.7	INTERRUPTOR SENCILLO PISO 1	5 días	mié 11/09/24	lun 16/09/24	70FC+2 días
69	1.2.11.8	SALIDA PARA LAMPARA LED 60 W PISO 1	10 días	mié 11/09/24	sáb 21/09/24	70FC+2 días
70	1.2.11.9	TABLERO ELECTRICO DE 12 CIRCUITOS PISO 1	4 días	mié 4/09/24	sáb 7/09/24	66
71	1.2.11.10	TOTALIZADOR CON CAJA PISO 1	4 días	mié 4/09/24	sáb 7/09/24	70CC
72	1.2.11.11	MALLA A TIERRA CON 3 VARILLAS COPER WELL DE 1,8 M X 5/8" PISO 1	2 días	mié 4/09/24	jue 5/09/24	66
73	**B**	**ADECUACIONES PISO 2 ANTIGUA ALCALDIA**	**86 días**	**mar 27/08/24**	**jue 5/12/24**	
74	**6**	**PRELIMINARES PISO 2**	**3 días**	**mar 27/08/24**	**jue 29/08/24**	
75	6.1	TRAZADO Y REPLANTEO EN PISO 2	3 días	mar 27/08/24	jue 29/08/24	5CC
76	**7**	**DEMOLICIONES PISO 2**	**12 días**	**vie 30/08/24**	**jue 12/09/24**	
77	7.1	DEMOLICION DE PISO Y PLANTILLA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL EN PISO 2	12 días	vie 30/08/24	jue 12/09/24	75
78	**8**	**CIMENTACION Y ESTRUCTURA PISO 2**	**51 días**	**lun 2/09/24**	**jue 31/10/24**	
79	8.1	PLANTILLA DE NIVELACION EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,05M INCLUYE REFUERZO EN VARILLA DE 1/4" CADA 40CM EN PISO 2	12 días	mié 4/09/24	mar 17/09/24	77CC+4 días
80	8.2	DINTELES DE 0,15X 0,2 M EN PISO 2	8 días	lun 2/09/24	mar 10/09/24	77CC+2 días

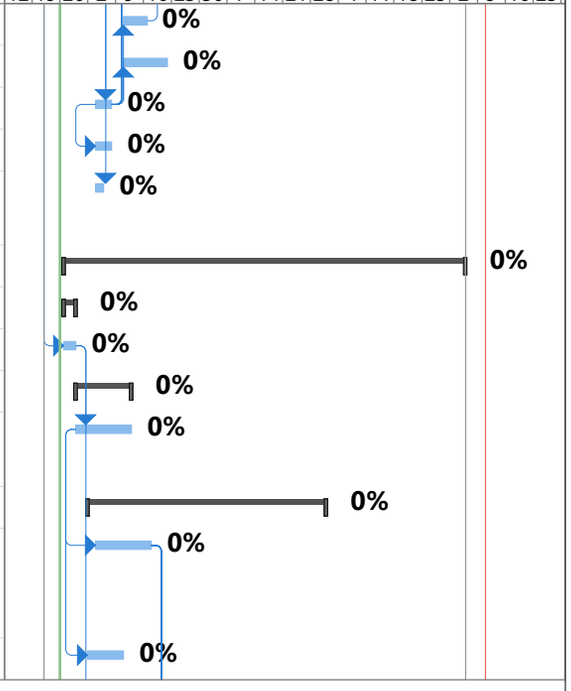

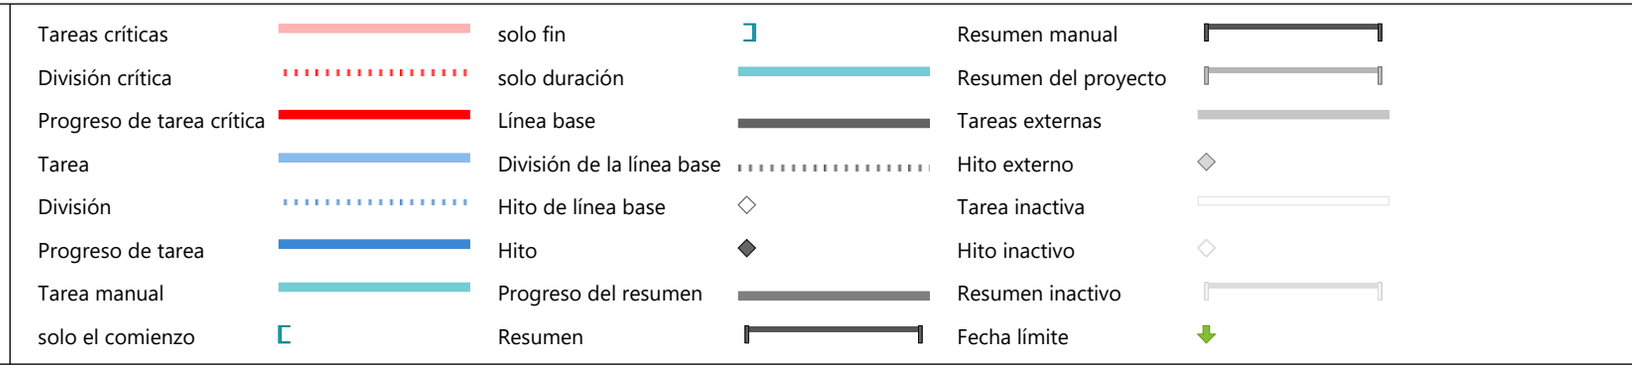


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
81	8.3	VIGA DE AMARRE PARA REALCE Y CONFINAMIENTO DE MUROS DE 0,15 X 0,25 M REFORZADA CON DOS VARILLAS DE 3/8 Y GANCHOS DE 1/4 @ 20CM EN PISO 2	15 días	mar 15/10/24	jue 31/10/24	96
82	**9**	**MAMPOSTERIA PISO 2**	**12 días**	**mié 18/09/24**	**mar 1/10/24**	
83	9.1	LEVANTE EN BLOCK SAMO N° 4 EN PISO 2	8 días	mié 18/09/24	jue 26/09/24	79
84	9.2	PAÑETE EN MORTERO RELACION 1:4 E: 0.02 EN PISO 2	10 días	vie 20/09/24	mar 1/10/24	83CC+2 días
85	**10**	**ACABADOS PISO 2**	**81 días**	**vie 30/08/24**	**mar 3/12/24**	
86	10.1	ESCARIFICACION DE PARED Y LOSA EN PISO 2	25 días	vie 30/08/24	vie 27/09/24	75
87	10.2	ESTUCO EN PULYPLAS PARA MURO Y CIELO A TRES MANOS EN PISO 2	25 días	jue 5/09/24	jue 3/10/24	86CC+5 días
88	1.3.5.3	PINTURA EN VINILO TIPO 1 A TRES MANOS EN PISO 2	25 días	mar 5/11/24	mar 3/12/24	89
89	1.3.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DRYWAL, INCLUYE ACABADO PINTADO A 3 MANOS EN PISO 2	18 días	mar 15/10/24	lun 4/11/24	96
90	**1.3.6**	**PISOS PISO 2**	**31 días**	**vie 25/10/24**	**vie 29/11/24**	
91	1.3.6.1	PISO EN BALDOSA EN PORCELANATO 0.6 X 0.6 EN PISO 2	25 días	vie 25/10/24	vie 22/11/24	89CC+9 días

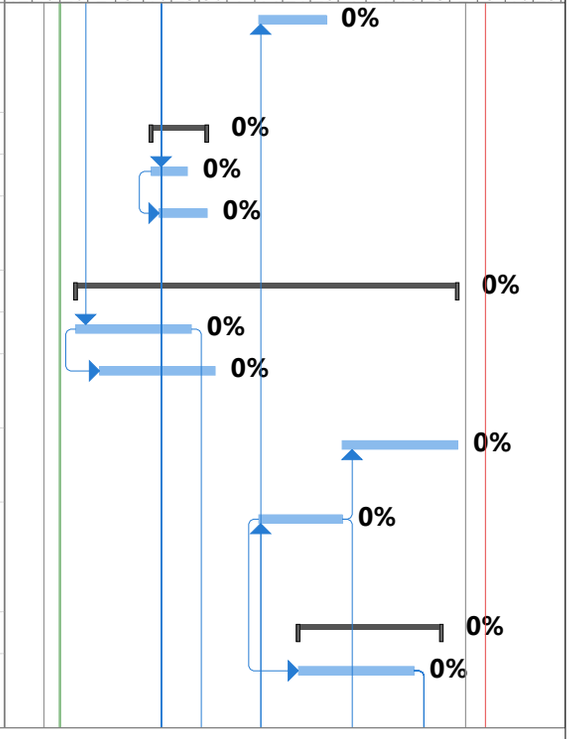





Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predecesoras
92	1.3.6.2	PISO EN CERAMICA TRAFICO PESADO ANTIDESLIZANTE BAÑO EN PISO 2	10 días	mar 5/11/24	vie 15/11/24	89
93	1.3.6.3	ZOCALOS EN PISO 2	6 días	sáb 23/11/24	vie 29/11/24	91
94	1.3.6.4	ENCHAPE PARED BAÑO EN PISO 2	7 días	mar 19/11/2	mar 26/11/24	92FC+2 días
95	**1.3.7**	**CUBIERTA PISO 2**	**30 días**	**mié 18/09/2**	**mié 23/10/24**	
96	1.3.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA PERFIL 7, INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA ABARCO EN PISO 2	22 días	mié 18/09/24	sáb 12/10/24	79
97	1.3.7.2	IMPERMEABILIZACION EN MANTO EDIL DE 4MM PARA LOSA TANQUE, LOSA LIBRE Y ZABALETAS EN PISO 2	8 días	mar 15/10/24	mié 23/10/24	96
98	1.3.7.3	ZABALETA EN BLOQUE VIBROPRENSADO No.4 EN PISO 2	8 días	mar 15/10/24	mié 23/10/24	96
99	**1.3.8**	**CARPINTERIA PISO 2**	**6 días**	**sáb 23/11/24**	**vie 29/11/24**	
100	1.3.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA DE 1.0 X 2.0 PISO 2	6 días	sáb 23/11/24	vie 29/11/24	91
101	1.3.8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PARA BAÑO 0.85 X 2.0 PISO 2	6 días	sáb 23/11/24	vie 29/11/24	91
102	1.3.8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA CORREDIZAS PRINCIPALES 1.6 X 2.0 PISO 2	6 días	sáb 23/11/24	vie 29/11/24	91

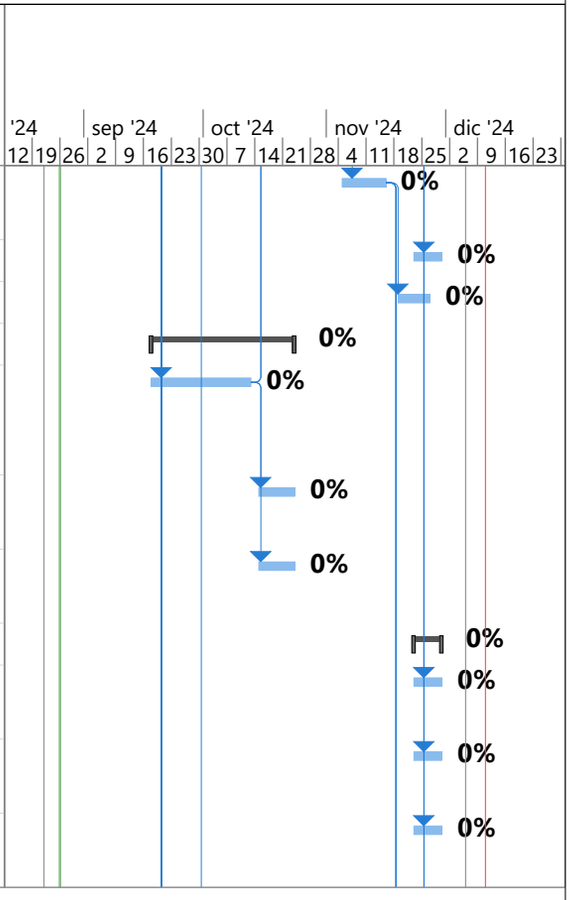


Tareas críticas	solo fin	Resumen manual
División crítica	solo duración	Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica	Línea base	Tareas externas
Tarea	División de la línea base	Hito externo
División	Hito de línea base	Tarea inactiva
Progreso de tarea	Hito	Hito inactivo
Tarea manual	Progreso del resumen	Resumen inactivo
solo el comienzo	Resumen	Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predecesoras
103	1.3.8.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PARA BAÑO 0.76 X 1,8 M PISO 2	6 días	sáb 23/11/24	vie 29/11/24	91
104	1.3.8.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA METALICA EN ALUMINIO 70-44 PISO 2	6 días	sáb 23/11/24	vie 29/11/24	91
105	1.3.8.6	SUMINISTRO EN INSTALACION DE PROTECTOR EM VARILLA CUADRADA DE 1/2" PISO 2	6 días	sáb 23/11/24	vie 29/11/24	91
106	1.3.8.7	SUMINISTRO DE BARANDA EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" Y 1 1/2" Y VIDRIO DE SEGURIDAD No. 10 PARA PASAMANO FACHADA PISO 2	6 días	sáb 23/11/24	vie 29/11/24	91
107	**1.3.9**	**INSTALACIONES SANITARIAS PISO 2**	**52 días**	**mié 18/09/24**	**lun 18/11/24**	
108	1.3.9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS EN PISO 2	2 días	sáb 16/11/24	lun 18/11/24	92
109	1.3.9.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS EN PISO 2	2 días	sáb 16/11/24	lun 18/11/24	92
110	1.3.9.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES EN PISO 2	2 días	sáb 16/11/24	lun 18/11/24	92
111	1.3.9.4	PUNTO SANITARIO PVC 3" EN PISO 2	3 días	mié 18/09/24	vie 20/09/24	79
112	1.3.9.5	PUNTO SANITARIO PVC 2" EN PISO 2	3 días	mié 18/09/24	vie 20/09/24	79
113	1.3.9.6	REDES DE TUBERIA SANITARIA PVC 3" (INCLUYE ACCESORIO) EN PISO 2	3 días	mié 18/09/24	vie 20/09/24	79

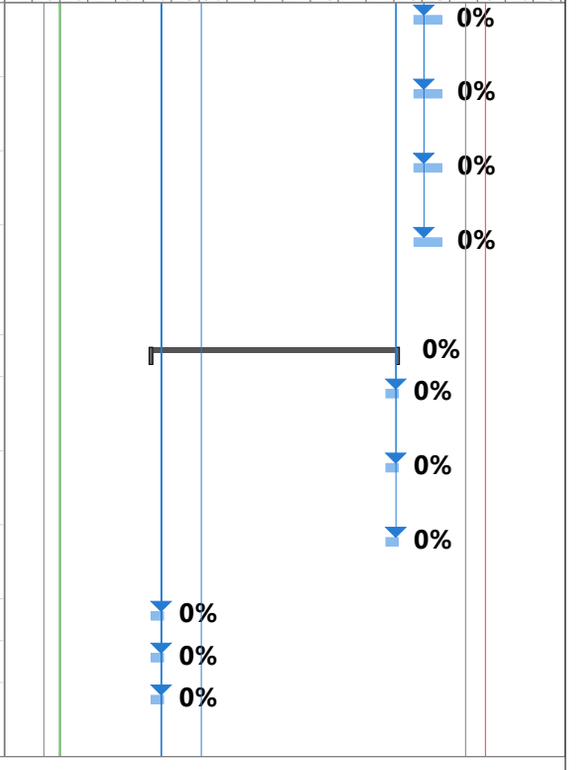



Id	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Predecesoras
114	1.3.9.7	REDES DE TUBERIA SANITARIA PVC 2"(INCLUYE ACCESORIO) EN PISO 2	3 días	mié 18/09/24	vie 20/09/24	79
115	1.3.9.8	PUNTO DE AGUA POTABLE PVC 1/2" EN PISO 2	3 días	mié 18/09/24	vie 20/09/24	79
116	1.3.9.9	REDES DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" (INLCUYE ACCESORIOS) EN PISO 2	3 días	mié 18/09/24	vie 20/09/24	79
117	**1.3.10**	**INSTALACIONES ELECTRICAS PISO 2**	**58 días**	**sáb 28/09/24**	**jue 5/12/24**	
118	1.3.10.1	SALIDA TOMACORRIENTE 110 VOLTIOS EN PISO 2	12 días	mié 2/10/24	mié 16/10/24	122
119	1.3.10.2	SALIDA TOMACORRIENTE 220 VOLTIOS (AIRE ACONDICIONADO) EN PISO 2	12 días	mié 2/10/24	mié 16/10/24	122
120	1.3.10.3	SALIDA PARA SWITCHE SENCILLO EN PISO 2	12 días	mié 2/10/24	mié 16/10/24	122
121	1.3.10.4	SALIDA PARA SWITCHE DOBLE EN PISO 2	12 días	mié 2/10/24	mié 16/10/24	122
122	1.3.10.5	ACOMETIDA PARCIAL EN TUBERIA PVC DE 3/4" ALAMBRE AISLADO (DOS LINEAS N° 12) AWG THHN. N° 12 AWG. (THHN) EN PISO 2	3 días	sáb 28/09/24	mar 1/10/24	86
123	1.3.10.6	INTERRUPTOR DOBLE EN PISO 2	8 días	jue 17/10/24	vie 25/10/24	118
124	1.3.10.7	INTERRUPTOR SENCILLO EN PISO 2	8 días	jue 17/10/24	vie 25/10/24	118
125	1.3.10.8	SALIDA PARA LAMPARA LED 60 W EN PISO 2	10 días	jue 17/10/24	lun 28/10/24	118
126	1.3.10.9	FIN	0 días	jue 5/12/24	jue 5/12/24	49FF

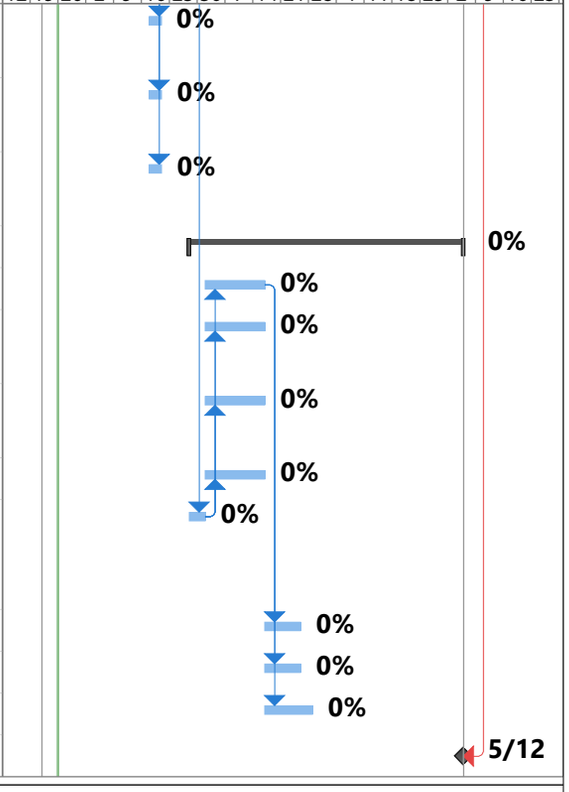

Tareas críticas	solo fin	Resumen manual
División crítica	solo duración	Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica	Línea base	Tareas externas
Tarea	División de la línea base	Hito externo
División	Hito de línea base	Tarea inactiva
Progreso de tarea	Hito	Hito inactivo
Tarea manual	Progreso del resumen	Resumen inactivo
solo el comienzo	Resumen	Fecha límite


Año 2024 | Trimestre | Semana

FLUJO DE COSTO	mes 1				mes 2				mes 3			
	Semana 35	Semana 36	Semana 37	Semana 38	Semana 39	Semana 40	Semana 41	Semana 42	Semana 43	Semana 44	Semana 45	Semana 46
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADECUACIONES PISO 1 ANTIGUA ALCALDIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRELIMINARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRAZADO Y REPLANTEO PISO 1	$ 481,140.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CERRAMIENTO PERIMETRAL OBRA EN LONA VERDE PISO 1	$ 689,634.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES PISO 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES E=0,15 M INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN PISO 1	$ 920,054.96	$ 552,032.97	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICION DE PISO Y PLANTILLA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL EN PISO 1	$ 1,047,816.00	$ 1,571,724.00	$ 523,908.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICION DE PISO Y PLANTILLA EXISTENTE ZONAS EXTERIORES EN PISO 1	$ -	$ 2,120,580.00	$ 1,696,464.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES EN PISO 1	$ 178,021.80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE DE VENTANAS INCLUIDO VIDRIOS EN PISO 1	$ 276,922.80	$ 69,230.70	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL EN PISO 1	$ -	$ -	$ 13,834,141.57	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICION DE MUROS DE JARDINERAS EXISTENTES EN PISO 1	$ -	$ 1,106,622.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CIMENTACION Y ESTRUCTURA PISO 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VIGA DE CIMENTACION DE 0,30X0,30 EN CONCRETO DE 3000PSI REFORZADO CON 4 DE 1/2" Y ESTRIBO DE 3/8" @ 20CM EN PISO 1	$ -	$ -	$ 279,406.59	$ 838,219.76	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,07M INCLUYE REFUERZO EN VARILLA DE 1/4" CADA 40CM PARA ZONAS PEATONALES EN PISO 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,081,648.31	$ 8,163,296.61	$ 1,360,549.44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,07M INCLUYE REFUERZO EN VARILLA DE 1/4" CADA 40CM ZONAS OFICINAS PISO 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,240,904.95	$ 3,361,357.43	$ 3,361,357.43	$ 2,240,904.95	$ -	$ -	$ -	$ -
DINTELES DE 0,15X 0,2 M EN PISO 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 811,642.55	$ 1,623,285.10	$ -	$ -	$ -
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=10CM REFORZADO CON VARILLAS DE 3/8" @ 30CM AMBOS SENTIDOS ZONA DE PARQUEADEROS EN PISO 1	$ -	$ -	$ -	$ 4,016,144.92	$ 3,212,915.94	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VIGA DE CIMIENTO DE 0,2 X 0,20 M EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI 4VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20CM EN PISO 1	$ -	$ -	$ -	$ 2,743,737.69	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIONES Y RELLENOS PISO 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACION MANUAL Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE EN PISO 1	$ 363,528.00	$ 1,090,584.00	$ 363,528.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PM EN PISO 1	$ -	$ 1,379,268.00	$ 1,379,268.00	$ 689,634.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
BASE EN SUELO CEMENTO E=15CM RELACION 1:10 EN PISO 1	$ -	$ -	$ -	$ 1,060,913.70	$ 530,456.85	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO DE ARENA NEGRA EN PISO 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 39,916.80	$ 59,875.20	$ 49,896.00	$ -
MAMPOSTERIA PISO 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
LEVANTE EN BLOCK 5AMO N° 4 EN PISO 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,428,653.52	$ 1,428,653.52	$ -	$ -	$ -	$ -
PAÑETE EN MORTERO RELACION 1:4 E: 0.02 EN PISO 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,078,831.39	$ 1,798,052.32	$ 719,220.93	$ -	$ -	$ -
ACABADOS PISO 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ESCARIFICACION DE PARED Y LOSA EN PISO 1	$ 845,646.13	$ 1,691,292.25	$ 1,691,292.25	$ 1,691,292.25	$ 1,127,528.17	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTUCO EN PULYPLAS PARA MURO Y CIELO A TRES MANOS EN PISO 1	$ -	$ 3,776,286.10	$ 5,664,429.14	$ 5,664,429.14	$ 5,664,429.14	$ 2,832,214.57	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PINTURA EN VINILO TIPO 1 A TRES MANOS EN PISO 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,825,866.31	$ 5,651,732.61	$ 4,709,777.18	$ 941,955.44	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DRYWAL, INCLUYE ACABADO PINTADO A 3 MANOS EN PISO 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,226,007.11	$ 4,226,007.11	$ -
PISOS PISO 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PISO EN BALDOSA EN PORCELANATO 0.6 X 0.6 EN PISO 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,490,640.00	$ 5,388,768.00	$ 5,388,768.00	$ 2,694,384.00
PISO EN CERAMICA TRAFICO PESADO ANTIDESLIZANTE BAÑO EN PISO 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,504,465.43
ZOCALOS EN PISO 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,609,333.81
ENCHAPE PARED BAÑO EN PISO 1	$ 8,633,790.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PISO EN TABLETA GRES DE 0,30X0,3 PARA ZONAS EXTERIORES EN PISO 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,680,641.38	$ 9,467,735.63	$ -	$ -	$ -	$ -
CUBIERTA PISO 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA PERFIL 7, INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA ABARCO EN PISO 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,024,657.24	$ 1,837,442.87	$ -	$ -
CARPINTERIA PISO 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA DE 1.0 X 2 EN PISO 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,278,255.33
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PARA BAÑO 0.85 X 2.0 EN PISO 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,754,575.99
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PRINCIPALES 1.2 X 2.0 EN PISO 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,921,661.25
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA METALICA EN ALUMINIO 70-44 EN PISO 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,516,400.16
SUMINISTRO EN INSTALACION DE PROTECTOR EM VARILLA CUADRADA DE 1/2" EN PISO 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,596,142.73
SUMINISTRO DE BARANDA EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" Y 1 1/2" Y VIDRIO DE SEGURIDAD PARA PASAMANO ESCALERA EN PISO 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,444,759.92
INSTALACIONES SANITARIAS PISO 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS EN PISO 1	$ 1,055,701.35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS EN PISO 1	$ 1,772,974.17	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES EN PISO 1	$ 698,702.15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PUNTO SANITARIO PVC 3" EN PISO 1	$ -	$ -	$ -	$ 335,176.16	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PUNTO SANITARIO PVC 2" EN PISO 1	$ -	$ -	$ -	$ 804,704.70	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REDES DE TUBERIA SANITARIA PVC 3" (INCLUYE ACCESORIO) EN PISO 1	$ -	$ -	$ 3,154,804.26	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REDES DE TUBERIA SANITARIA PVC 2"(INCLUYE ACCESORIO) EN PISO 1	$ -	$ -	$ 1,756,075.98	$ 439,019.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REGISTRO SANITARIO DE INSPECCION EN LADRILLO COMUN (0,45X0,45) EN PISO 1	$ -	$ -	$ 2,378,201.51	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PUNTO DE AGUA POTABLE PVC 1/2" EN PISO 1	$ -	$ -	$ 489,644.15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REDES DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" (INLCUYE ACCESORIOS) EN PISO 1	$ -	$ -	$ -	$ 874,765.98	$ 218,691.50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES ELECTRICAS PISO 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SALIDA TOMACORRIENTE 110 VOLTIOS PISO 1	$ -	$ 393,548.85	$ 2,361,293.09	$ 1,180,646.54	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SALIDA TOMACORRIENTE 220 VOLTIOS (AIRE ACONDICIONADO) PISO 1	$ -	$ 188,292.13	$ 1,129,752.77	$ 564,876.39	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SALIDA PARA SWITCHE SENCILLO PISO 1	$ -	$ 15,629.28	$ 93,775.68	$ 46,887.84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SALIDA PARA SWITCHE DOBLE PISO 1	$ -	$ 38,638.45	$ 231,830.67	$ 115,915.34	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ACOMETIDA PARCIAL EN TUBERIA PVC DE 3/4" ALAMBRE AISLADO (TRES LINEAS N° 8) AWG THWN, N° 12 AWG, (THWN) PISO 1	$ 3,096,772.61	$ 1,032,257.54	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERRUPTOR DOBLE PISO 1	$ -	$ -	$ -	$ 360,454.05	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERRUPTOR SENCILLO PISO 1	$ -	$ -	$ 152,160.53	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SALIDA PARA LAMPARA LED 60 W PISO 1	$ -	$ -	$ 1,721,131.34	$ 1,721,131.34	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TABLERO ELECTRICO DE 12 CIRCUITOS PISO 1	$ -	$ 1,345,668.39	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALIZADOR CON CAJA PISO 1	$ -	$ 468,603.63	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MALLA A TIERRA CON 3 VARILLAS COPER WELL DE 1,8 M X 5/8" PISO 1	$ -	$ 1,345,320.90	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ADECUACIONES PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PRELIMINARES PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRAZADO Y REPLANTEO EN PISO 2	$ 682,196.38	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICIONES PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEMOLICION DE PISO Y PLANTILLA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL EN PISO 2	$ 795,895.78	$ 1,591,791.55	$ 795,895.78	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CIMENTACION Y ESTRUCTURA PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PLANTILLA DE NIVELACION EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,05M INCLUYE REFUERZO EN VARILLA DE 1/4" CADA 40CM EN PISO 2	$ -	$ 3,852,565.28	$ 4,623,078.33	$ 770,513.06	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DINTELES DE 0,15X 0,2 M EN PISO 2	$ 142,671.54	$ 856,029.26	$ 142,671.54	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VIGA DE PERFIL PTR METALICO												
CONFINAMIENTO DE MUROS DE 0,15 X 0,25 M REFORZADA CON DOS VARILLAS DE 3/8 Y GANCHOS DE 1/4 @ 20DS DE EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,371,047.91	$ 6,855,239.53	$ 8,226,287.44	$ 4,113,143.72	$ -	$ -
MAMPOSTERIA PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
LEVANTE EN BLOCK 5AMO N° 4 EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 657,194.64	$ 394,316.78	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PAÑETE EN MORTERO RELACION 1:4 E: 0.02 EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 265,896.66	$ 531,793.33	$ 88,632.22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ACABADOS PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ESCARIFICACION DE PARED Y LOSA EN PISO 2	$ 1,587,675.53	$ 3,175,351.07	$ 3,175,351.07	$ 3,175,351.07	$ 2,116,900.71	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTUCO EN PULYPLAS PARA MURO Y CIELO A TRES MANOS EN PISO 2	$ -	$ 7,089,865.20	$ 10,634,797.80	$ 10,634,797.80	$ 10,634,797.80	$ 10,634,797.80	$ 5,317,398.90	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PINTURA EN VINILO TIPO 1 A TRES MANOS EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,366,576.26	$ 20,160,824.82
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DRYWAL, INCLUYE ACABADO PINTADO A 3 MANOS EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 897,979.55	$ 4,489,897.77	$ 5,387,877.32	$ 5,387,877.32	$ -	$ -
PISOS PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PISO EN BALDOSA EN PORCELANATO 0.6 X 0.6 EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,460,934.87	$ 4,921,869.74	$ 4,921,869.74	$ 8,203,116.24
PISO EN CERAMICA TRAFICO PESADO ANTIDESLIZANTE BAÑO EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 370,557.99	$ 247,038.66
ZOCALOS EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,965,600.29
ENCHAPE PARED BAÑO EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,631,270.50
CUBIERTA PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA PERFIL 7, INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA ABARCO EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ 6,742,858.54	$ 8,091,430.25	$ 8,091,430.25	$ 6,742,858.54	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
IMPERMEABILIZACION EN MANTO EDIL DE 4MM PARA LOSA TANQUE, LOSA LIBRE Y ZABALETAS EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 420,997.50	$ 2,104,987.50	$ 841,995.00	$ -	$ -	$ -
ZABALETA EN BLOQUE VIBROPRENSADO No.4 EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 89,215.39	$ 446,076.93	$ 178,430.77	$ -	$ -	$ -
CARPINTERIA PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA DE 1.0 X 2.0 PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,669,531.98
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PARA BAÑO 0.85 X 2.0 PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,503,050.66
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA CORREDIZAS PRINCIPALES 1.6 X 2.0 PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,745,862.17
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PARA BAÑO 0.76 X 1.8 M PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,057,732.83
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA METALICA EN ALUMINIO 70-44 PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,579,108.24
SUMINISTRO EN INSTALACION DE PROTECTOR EM VARILLA CUADRADA DE 1/2" PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,394,214.10
SUMINISTRO DE BARANDA EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" Y 1 1/2" Y VIDRIO DE SEGURIDAD No. 10 PARA PASAMANO FACHADA PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,754,059.61
INSTALACIONES SANITARIAS PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 703,800.90
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,772,974.17
SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,397,404.31
PUNTO SANITARIO PVC 3" EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ 223,450.77	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PUNTO SANITARIO PVC 2" EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ 536,469.80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REDES DE TUBERIA SANITARIA PVC 3" (INCLUYE ACCESORIO) EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ 350,533.81	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REDES DE TUBERIA SANITARIA PVC 2"(INCLUYE ACCESORIO) EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ 1,371,934.36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PUNTO DE AGUA POTABLE PVC 1/2" EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ 326,429.43	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REDES DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" (INLCUYE ACCESORIOS) EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ 502,990.44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES ELECTRICAS PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SALIDA TOMACORRIENTE 110 VOLTIOS EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,596,329.20	$ 3,115,595.05	$ 519,265.84	$ -	$ -	$ -	$ -
SALIDA TOMACORRIENTE 220 VOLTIOS (AIRE ACONDICIONADO) EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,078,756.99	$ 1,294,508.39	$ 215,751.40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SALIDA PARA SWITCHE SENCILLO EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 65,122.00	$ 78,146.40	$ 13,024.40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SALIDA PARA SWITCHE DOBLE EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 268,322.53	$ 321,987.04	$ 53,664.51	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ACOMETIDA PARCIAL EN TUBERIA PVC DE 3/4" ALAMBRE AISLADO (DOS LINEAS N° 12) AWG THHN. N° 12 AWG. (THHN) EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,347,522.36	$ 2,673,761.18	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERRUPTOR DOBLE EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 180,227.03	$ 180,227.03	$ -	$ -	$ -
INTERRUPTOR SENCILLO EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 76,080.27	$ 76,080.27	$ -	$ -	$ -
SALIDA PARA LAMPARA LED 60 W EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,684,964.88	$ 4,027,447.33	$ -	$ -	$ -
FIN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total general	$ 23,269,143.20	$ 34,751,181.55	$ 61,348,462.59	$ 46,379,956.99	$ 43,444,187.74	$ 37,362,488.19	$ 32,894,101.54	$ 38,095,946.21	$ 40,218,955.54	$ 25,934,983.96	$ 21,323,675.10	$ 124,105,568.10

SEGUIMIENTO MENSUAL PROGRAMADA			
MES	ROGRAMADO MENSUA	PROGRAMADO ACUMULADO	PROGRAMADO PORCENTUAL
mes 0	0	0	0.00%
mes 1	$ 165,748,744.33	$ 165,748,744.33	31.32%
mes 2	$ 151,796,723.68	$ 317,545,468.01	60.01%
mes 3	$ 211,583,182.70	$ 529,128,650.71	100.00%

SEGUIMIENTO MENSUAL EJECUCION			
MES	EJECUCION MENSUAL	EJECUCION ACUMULADA	EJECUCION ACUMULADA
mes 0	0	0	0.00%
mes 1	$ 134,000,000.00	$ 134,000,000.00	25.32%
mes 2			
mes 3			

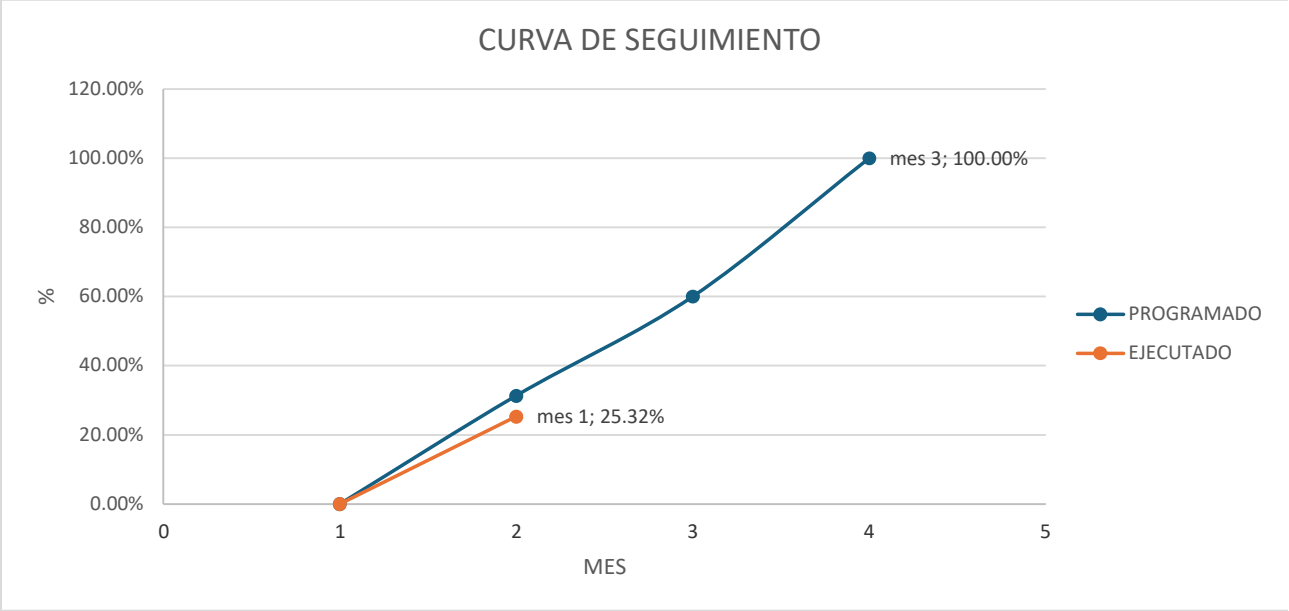

-

ANEXO 7: CONTRATO DE INTERVENTORIA

CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-011-2024.

Señor:
JAVIER ALEXANDER SANDOVAL PAEZ
C.C. 1.047.226.940
Dirección: Calle 10 No 21-20
Galapa- Atlántico
Correo electrónico: ing.javier.sandoval@gmail.com
Teléfono: 3013386677

ASUNTO: Aceptación de la oferta presentada por JAVIER ALEXANDER SANDOVAL PAEZ, C.C. 1.047.226.940 con ocasión del proceso de Mínima Cuantía No. MC-011-2024

Respetado señor:

En relación con el tema del asunto, le informo que de conformidad con el informe final de verificación y evaluación de su propuesta allegada al proceso de MÍNIMA CUANTÍA No. MC-011-2024, y publicado en el SECOP II, el MUNICIPIO DE GALAPA, ha decidido aceptar su oferta de fecha veintiséis (26) de julio de 2024, la cual, en atención a lo previsto en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, junto con la presente comunicación constituirá para todos los efectos el contrato estatal que se celebre, que se regirá por las siguientes estipulaciones:

FABIAN ALBERTO BONETT BERDUGO, mayor de edad, identificado con la CC No 8.797.164, obrando en calidad de Alcalde Municipal, de conformidad las leyes 80 de 1993, 9 de 1989, 136 de 1994 y 1150 de 2007 y posesionado mediante Acta de la Notaría Única del Circuito de Galapa, debidamente facultado para celebrar contratos y convenios y quien para los efectos del presente anexo de condiciones del contrato se denominará EL MUNICIPIO, informa a JAVIER ALEXANDER SANDOVAL PAEZ mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.047.226.940 expedida en Galapa-Atlántico, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, que ha sido adjudicatario del contrato producto del Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. MC-011-2024, cuyas condiciones se señalan a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES

1. **OBJETO: "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".

PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será de 90 días calendario, o hasta agotarse el presupuesto destinado para esta contratación, este plazo empezara a contarse desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 41 de la ley 80 de 1993, esto es, suscripción del contrato por las

partes en la Plataforma SECOP II y expedición del registro presupuestal, aprobación de la garantía única de cumplimiento y suscripción del acta de inicio.

2. VALOR DEL CONTRATO: El valor total del contrato corresponde a la suma de VEINTINUEVE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS PESOS M/L ($29.075.354,88) incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar suma que se pagará con cargo en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2024.CEN.01.000406 con fecha de Dos (02) de mayo de 2024.

3. FORMA DE PAGO: El valor del contrato se realizará en un solo pago, finalizado el total de las actividades establecidas en las obligaciones para el contratista, previa presentación del acta de recibo a satisfacción del Supervisor del contrato, con el lleno de los requisitos y documentos legales conducentes para el pago. El CONTRATISTA deberá acompañar la respectiva factura, el acta de certificación del servicio prestado suscrita por el supervisor del contrato, certificado de paz y salvo del cumplimiento de las obligaciones parafiscales (salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) cuando corresponda, para lo cual debe tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el informe mensual del servicio prestado, de acuerdo a lo requerido en el contrato.

   Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña con la totalidad de los documentos requeridos para el pago, el termino de los treinta (30) días a que se hace referencia, solo empezará a contarse a partir de la fecha en que el contratista haya aportado la documentación correcta.

   Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña con la totalidad de los documentos requeridos para el pago, el termino de los treinta (30) días a que se hace referencia, solo empezará a contarse a partir de la fecha en que el contratista haya aportado la documentación correcta.

4. ACEPTACIÓN DEL CONTRATO: El CONTRATISTA aceptó, con la presentación de su oferta, los términos y condiciones expresados en la Invitación Pública No. MC-011-2024, estudios previos y los demás documentos anexos, razón por la cual, la relación contractual se regulará con base en lo expresado en el referido documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA y de conformidad con lo dispuesto en las normas legales vigentes.

5. GARANTÍA: EL CONTRATISTA se obliga para con el municipio a allegar póliza única de cumplimiento expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en el país que ampare los siguientes riesgos:

GARANTÍA	PORCENTAJE	PLAZO

Cumplimiento del Contrato	10%	Vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	5%	Vigencia igual al plazo del contrato y tres (03) años más.
CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	10%	Por el termino de duración del mismo y cuatro (04) años más a partir de la suscripción del acta de recibo final.

6. SUPERVISIÓN: Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, El Municipio mediante la Secretaria de desarrollo territorial, vigilará permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado. El Municipio de Galapa podrá en cualquier momento cambiar el funcionario que ejerza la supervisión, sin que sea necesario modificar el contrato y bastará la comunicación al nuevo supervisor y al CONTRATISTA en dicho sentido.

7. EJECUCIÓN. Para la ejecución del contrato se requerirá de la expedición del Registro Presupuestal, y la suscripción del acta de inicio.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO
FABIAN ALBERTO BONETT BERDUGO
ALCALDE MUNICIPAL DE GALAPA

ANEXO 8: ACTA DE INICIO DE INTERVENTORIA

ACTA DE INICIO MC-011-2024

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GALAPA
NIT	890.102.472-0
SUPERVISOR	GUILLERMO JOSÉ GONZÁLEZ NAVARRO - C.C. 1.143.240.896
SUSCRIPCIÓN	14 DE AGOSTO DE 2014
DURACIÓN	NOVENTA (90) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DISPUESTOS EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 80 DE 1993 Y APROBACIÓN DEL INICIO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SECOP II
VALOR	VEINTINUEVE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS PESOS M/L ($29.075.354,88)
CONTRATISTA	JAVIER ALEXANDER SANDOVAL PAEZ – C.C- 1.047.226.940
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
CERTIFICACIÓN DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°	**2024.CEN.01.001270**

En las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Galapa-Atlántico, estando presente el Ingeniero **GUILLERMO JOSÉ GONZÁLEZ NAVARRO,** en su condición de Supervisor, y **JAVIER ALEXANDER SANDOVAL PÁEZ,** *identificado con cedula de ciudadanía No 1.047.226.940,* en su calidad de CONTRATISTA, con el fin de dar INICIO a la ejecución del contrato cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO,** celebrado mediante **CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No MC-011-2024,** suscrita el día 14 de agosto de 2024.

Las partes intervinientes a través del presente documento dejan constancia del INICIO de la Ejecución del contrato.

Dado en Galapa- Atlántico, a los (22) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024).

POR EL MUNICIPIO

ING.GUILLERMO JOSE GONZALEZ NAVARRO
Secretario de desarrollo Territorial
Supervisor

POR EL INTERVENTOR

JAVIER ALEXANDER SANDOVAL PAEZ

ANEXO 9: POLIZAS INTERVENTORIA

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 9kd2okyu9vqNO40abPAb1w==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BQ-100089282	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	28381007	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	06/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/07/2024	24:00 Horas Del	31/10/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	SANDOVAL PAEZ, JAVIER ALEXANDER	**No. DOC. IDENTIDAD**	1.047.226.940
DIRECCIÓN	CALLE 10 # 21-20	**TELÉFONO**	3603573
ASEGURADO	MUNICIPIO DE GALAPA	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.102.472-0
DIRECCIÓN	CL 13 17 117	**TELÉFONO**	8786529
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE GALAPA	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.102.472-0
DIRECCIÓN	CL 13 17 117	**TELÉFONO**	8786529

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.MC-011-2024 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LAS BRAS DEL CONTRATO : OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 26/07/2024	24:00 Horas Del 30/04/2025	2.907.535,49	13.287,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 26/07/2024	24:00 Horas Del 31/10/2027	1.453.767,74	28.486,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 26/07/2024	24:00 Horas Del 31/10/2028	2.907.535,49	49.643,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 7.268.838,72	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
M Y S ASESORES ASOCIADOS Y COMPAÑIA LIMITA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	91.416,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	91.416,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	18.319,00
TOTAL A PAGAR	$	114.735,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 06/08/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935** O LÍNEA EN BOGOTÁ **327 47 12 / 13.**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BQ-100089282	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	28381007	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	06/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/07/2024	24:00 Horas Del	31/10/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)

1. RIESGOS AMPAROS

LA ASEGURADORA OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA NO PODRÁ RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SI, SEGÚN LAS DEFINICIONES Y ALCANCE QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRE LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CON OCASIÓN DE:
(I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO;
(II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO; Y
(III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN CALIDAD DE ANTICIPO.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.

1.5 AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

ESTE AMPARO DEBE CUBRIR A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO.

LA ENTIDAD ESTATAL NO DEBE EXIGIR UNA GARANTÍA PARA CUBRIR ESTE RIESGO EN LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL CON PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL COLOMBIANO.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCIÓN.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO

1.8 AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

ESTE AMPARO CUBRE LA CALIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL EN CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO.

1.9 RESPONSABILIDAD FISCAL

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, O DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

seguros mundial® tu compañía siempre

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARAN EN LOS CASOS SIGUIENTES:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA).
2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS AL CONTRATO.
2.3 USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL QUE ESTE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL.
2.4 EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA

LA SUMA ASEGURADA DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARATULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

4. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ CONSTAR EN LA CARATULA O EN SUS ANEXOS. EN LOS CONTRATOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015, EL GARANTE TIENE LA FACULTAD LEGAL DE DECIDIR NO GARANTIZAR LA ETAPA SIGUIENTE, CASO EN EL CUAL DEBE INFORMAR SU DECISIÓN POR ESCRITO A LA ENTIDAD ESTATAL GARANTIZADA SEIS (6) MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA GARANTÍA. ESTE AVISO NO AFECTA LA GARANTÍA DE LA ETAPA CONTRACTUAL O PERÍODO CONTRACTUAL EN EJECUCIÓN. SI EL GARANTE NO DA EL AVISO CON LA ANTICIPACIÓN MENCIONADA Y EL CONTRATISTA NO OBTIENE UNA NUEVA GARANTÍA, QUEDA OBLIGADO A GARANTIZAR LA ETAPA DEL CONTRATO O EL PERÍODO CONTRACTUAL SUBSIGUIENTE.

seguros mundial® tu compañía siempre

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1077 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PERDIDA PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA Y DEL GARANTE, DE LA SIGUIENTE FORMA:

5.1 EN CASO DE CADUCIDAD, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO Y ORDENE EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE, BIEN SEA DE LA CLÁUSULA PENAL O DE LOS PERJUICIOS QUE HA CUANTIFICADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDAD CONSTITUYE EL SINIESTRO.

5.2 EN CASO DE APLICACIÓN DE MULTAS, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL IMPONE MULTAS, DEBE ORDENAR EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE CONSTITUYE EL SINIESTRO.

5.3 EN LOS DEMÁS CASOS DE INCUMPLIMIENTO, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE EL INCUMPLIMIENTO, PUEDE HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, SI ESTÁ PACTADA EN EL CONTRATO, Y ORDENAR SU PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGUROS.

6. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO.

LAS ENTIDADES SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PODRÁN DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO, CUANTIFICANDO LOS PERJUICIOS DEL MISMO, IMPONER LAS MULTAS Y SANCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, Y HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL. PARA TAL EFECTO OBSERVARAN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A) EVIDENCIADO UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, LA ENTIDAD PÚBLICA LO CITARA A AUDIENCIA PARA DEBATIR LO OCURRIDO. EN LA CITACIÓN, HARÁ MENCIÓN EXPRESA Y DETALLADA DE LOS HECHOS QUE LA SOPORTAN, ACOMPAÑANDO EL INFORME DE INTERVENTORÍA O DE SUPERVISIÓN EN EL QUE SE SUSTENTE LA ACTUACIÓN Y ENUNCIARA LAS NORMAS O CLAUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. EN LA MISMA SE ESTABLECERÁ EL LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA, LA QUE PODRÁ TENER LUGAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, ATENDIDA LA NATURALEZA DEL CONTRATO Y LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. EN EL EVENTO EN QUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONSISTA EN PÓLIZA DE SEGUROS, EL GARANTE SERÁ CITADO DE LA MISMA MANERA;

B) EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PRESENTARÁ LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE MOTIVAN LA ACTUACIÓN, ENUNCIARÁ LAS POSIBLES NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. ACTO SEGUIDO SE CONCEDERÁ EL USO DE LA PALABRA AL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA O A QUIEN LO REPRESENTE, Y AL GARANTE, PARA QUE PRESENTEN SUS DESCARGOS, EN DESARROLLO DE LO CUAL PODRÁ RENDIR LAS EXPLICACIONES DEL CASO, APORTAR PRUEBAS Y CONTROVERTIR LAS PRESENTADAS POR LA ENTIDAD;

C) HECHO LO PRECEDENTE, MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA EN LA QUE SE CONSIGNE LO OCURRIDO EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA Y LA CUAL SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN DICHO

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

ACTO PÚBLICO, LA ENTIDAD PROCEDERÁ A DECIDIR SOBRE LA IMPOSICIÓN O NO DE LA MULTA, SANCIÓN O DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO. CONTRA LA DECISIÓN ASÍ PROFERIDA SÓLO PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN QUE SE INTERPONDRÁ, SUSTENTARÁ Y DECIDIRÁ EN LA MISMA AUDIENCIA. LA DECISIÓN SOBRE EL RECURSO SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN LA MISMA AUDIENCIA;

D) EN CUALQUIER MOMENTO DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PODRÁ SUSPENDER LA AUDIENCIA CUANDO DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE, ELLO RESULTE EN SU CRITERIO NECESARIO PARA ALLEGAR O PRACTICAR PRUEBAS QUE ESTIME CONDUCENTES Y PERTINENTES, O CUANDO POR CUALQUIER OTRA RAZÓN DEBIDAMENTE SUSTENTADA, ELLO RESULTE NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. EN TODO CASO, AL ADOPTAR LA DECISIÓN, SE SEÑALARÁ FECHA Y HORA PARA REANUDAR LA AUDIENCIA. LA ENTIDAD PODRÁ DAR POR TERMINADO EL PROCEDIMIENTO EN CUALQUIER MOMENTO, SI POR ALGÚN MEDIO TIENE CONOCIMIENTO DE LA CESACIÓN DE SITUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO.

7. COMPENSACIÓN

SI LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA AL MOMENTO DE TENER CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO, O CON POSTERIORIDAD A ESTE O DEL RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN, FUERE DEUDORA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO POR CUALQUIER CONCEPTO, SE APLICARA LA COMPENSACIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE LAS ACREENCIAS, SEGÚN LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 1417 Y SS. DEL CÓDIGO CIVIL. IGUALMENTE DISMINUIRÁ EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN, EL CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HAYA OBTENIDO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, EN EJERCICIO DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CUYO CUMPLIMIENTO SE GARANTIZA POR LA PRESENTE PÓLIZA.

8. PAGO DEL SINIESTRO.

LA ASEGURADORA PAGARA EL VALOR DEL SINIESTRO, ASÍ:

8.1 PARA EL CASO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.1, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD CONTRATANTE PARA RECLAMAR EL PAGO, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO Y DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O DE LA RESOLUCIÓN EJECUTORIADA QUE ACOJA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL.

8.2 PARA EL CASO DEL NUMERAL 5.2, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE LA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO, O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

8.3 PARA EL CASO PRESENTADO EN EL NUMERAL 5.3, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE CONSTITUYA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS AL FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

PARÁGRAFO. – DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1110 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ASEGURADORA PODRÁ OPTAR POR CUMPLIR SU PRESTACIÓN MEDIANTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, O CONTINUANDO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, PARA ESTE ÚLTIMO EVENTO SE REQUIERE LA ACEPTACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD NO IMPEDIRÁ QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA TOME POSESIÓN DE LA OBRA O CONTINÚE INMEDIATAMENTE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO, BIEN SEA A TRAVÉS DEL GARANTE O DE OTRO CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO LA ASEGURADORA RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO O A FAVOR DE QUIEN DETERMINE ESTA, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA ASEGURADORA. EN TAL EVENTO LA ASEGURADORA PRESENTARÁ GARANTÍAS.

9. CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA SEA AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL SEAN MODIFICADAS, LA ASEGURADORA A SOLICITUD DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DEL SEGURO, EN DONDE EXPRESE SU CONOCIMIENTO AL RESPECTO DE LAS MODIFICACIONES ACORDADAS ENTRE EL CONTRATISTA GARANTIZADO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

10. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1096 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 203 DEL DECRETO 663 DE 1993 ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO, LA ASEGURADORA SE SUBROGA HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE TENGA CONTRA EL CONTRATISTA GARANTIZADO.

11. NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI POR REVOCACIÓN UNILATERAL.

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

12. NATURALEZA DEL SEGURO

LA GARANTÍA OTORGADA POR ESTA PÓLIZA O SUS CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN, NO ES SOLIDARIA, NI INCONDICIONAL Y SU EXIGENCIA ESTÁ SUPEDITADA A LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y SU CUANTIFICACIÓN.

13. NOTIFICACIONES Y RECURSOS

LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBERÁ NOTIFICAR A LA ASEGURADORA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ATINENTES A LA EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y EL GARANTE.

14. COEXISTENCIA DE SEGUROS

EN CASO DE EXISTIR, AL MOMENTO DE SINIESTRO, OTRO SEGURO DE CUMPLIMIENTO CON RELACIÓN AL MISMO CONTRATO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAY LUGAR, SE DISTRIBUIRÁ ENTRO LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS

15. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

16. PRESCRIPCIÓN

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

17. DOMICILIO

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA EN FE DE LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS _____DÍAS DEL MES DE_____ DE 20____

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	**EL TOMADOR/ASEGURADO**

seguros mundial® tu compañía siempre

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	28381007

Fecha de Facturación	06/08/2024
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	BQ–100089282
Periodo Facturado	26/07/2024 — 31/10/2028

Fecha Límite de Pago	05/09/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	96.416,00
IVA	18.319,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	114.735,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	SANDOVAL PAEZ, JAVIER ALEXANDER
CALLE 10 # 21–20	1047226940
Intermediario	M Y S ASESORES ASOCIADOS Y COMPAÑIA LIMITA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **05/09/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	28381007

Fecha de Facturación	06/08/2024
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	BQ–100089282
Periodo Facturado	26/07/2024 — 31/10/2028

Fecha Límite de Pago	05/09/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	96.416,00
IVA	18.319,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	114.735,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	SANDOVAL PAEZ, JAVIER ALEXANDER
CALLE 10 # 21–20	1047226940
Intermediario	M Y S ASESORES ASOCIADOS Y COMPAÑIA LIMITA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000000028381007(3900)000000114735(96)20240905

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)77099980399333(8020)031594(8020)229900283810007(3900)000000114735(96)20240905

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago · Mercar · 472

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

ANEXO 10: PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA

1 Sobre único

1.1 Lista de artículos — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
29.075.354,88

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	73181104	INTERVENTORIA	1,00	UN	36.344.190,14	29.075.354,88	29.075.354,88

ANEXO 11: OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS

FORMATO INTERNO ACTA DE COMITE			
CODIGO	**SEGUIMIENTO A** EJECUCION DE OBRAS	**VERSIÓN**	**1.00**

COMITE INTERNO CONTRATISTA - INTERVENTORIA

CONTRATO No LP-002 (Número de Contrato) **DE** 2024 **ACTA No** 1.00 Página 1.00 de 2.00

OBJETO DEL CONTRATO

OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE GALAPA

I. PARTICIPANTES	AREA / ENTIDAD	CARGO	FIRMA
ING. JAVIER SANDOVAL PAEZ	INTERVENTORIA	REP. LEGAL INTERVENTORIA	
YOSETH PULGAR IBARRA	CONTRATISTA	REP. LEGAL CONTRATISTA	

II. AGENDA O TEMARIO

INICIO DE OBRA

III. LUGAR Y HORA

LUGAR OFICINA DEL CONTRATISTA DE OBRA **FECHA** 22/08/2024

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

FORMATO INTERNO ACTA DE COMITE			
CODIGO	**SEGUIMIENTO A** EJECUCION DE OBRAS	**VERSIÓN**	**1.00**

COMITE INTERNO CONTRATISTA - INTERVENTORIA

CONTRATO No LP-002 (Número de Contrato) **DE** 2024 **ACTA No** 1.00 Página 1.00 de 2.00

Página 2.00 de 2.00

V. TEMAS TRATADOS

INICIO DE LAS OBRAS:
La interventoria requiere la siguiente documentacion para realizar correcto seguimiento a las obras:
1.Cronograma, 2. flujo de fondos, 3. relacion de personal profesional 4. listado de herramienta y equipos.
2.La interventoria requiere al contratista la actualizacion de las polizas conforme al acta de inicio
3.La interventoria requiere al contratista la instalacion de la valla informativa
4. El contratista solicita la realizacion de una revision conjunta para comparar las cantidades contractuales con lo presente y lo requerido en sitio.
DIFICULTADES PRESENTADAS:

VI. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA ENTREGA	RESPONSABLES
ENTREGA DE CRONOGRAMA, FLUJO DE FONDOS, LISTADO DE PERSONAL Y LISTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	**26/08/2024**	**CONTRATISTA**
ACTUALIZACION DE POLIZAS	**26/08/2024**	**CONTRATISTA E INTERVENTORIA**
INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA	**26/08/2024**	**CONTRATISTA**
REVISION CONJUNTA DE CANTIDADES	**5/09/2024**	**CONTRATISTA E INTERVENTORIA**

VII. PRÓXIMA REUNIÓN:

FECHA **5/09/2024**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

en Galapa, Atlántico a los 22.00 (Día en letras) veintidos (Día en números) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2024 (Año de firma del acta)

Se aprueba el acta en el comite por todos los asistentes.

FORMATO INTERNO ACTA DE COMITE			
CODIGO	SEGUIMIENTO A EJECUCION DE OBRAS	VERSIÓN	1.00

COMITE INTERNO CONTRATISTA - INTERVENTORIA

CONTRATO No LP-002 (Número de Contrato) **DE** 2024 **ACTA No** 2.00 Página 1.00 de 2.00

OBJETO DEL CONTRATO

OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE GALAPA

I. PARTICIPANTES	AREA / ENTIDAD	CARGO	FIRMA
ING. JAVIER SANDOVAL PAEZ	INTERVENTORIA	REP. LEGAL INTERVENTORIA	
YOSETH PULGAR IBARRA	CONTRATISTA	REP. LEGAL CONTRATISTA	

II. AGENDA O TEMARIO

AVANCE DE OBRA
REVISION GENERAL DEL PROYECTO
BALANCE DEL CONTRATO

III. LUGAR Y HORA

LUGAR SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA **FECHA** 5/09/2024

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

COMPROMISOS PACTADOS COMITÉ ANTERIOR	RESPONSABLES	CUMPLIDO / NO CUMPLIDO
ENTREGA DE CRONOGRAMA, FLUJO DE FONDOS, LISTADO DE PERSONAL Y LISTADO	CONTRATISTA	CUMPLIDO
ACTUALIZACION DE POLIZAS	CONTRATISTA E INTERVENTORIA	CUMPLIDO
INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA	CONTRATISTA	CUMPLIDO
REVISION CONJUNTA DE CANTIDADES	CONTRATISTA E INTERVENTORIA	CUMPLIDO

FORMATO INTERNO ACTA DE COMITE			
CODIGO	**SEGUIMIENTO A** EJECUCION DE OBRAS	**VERSIÓN**	**1.00**

COMITE INTERNO CONTRATISTA - INTERVENTORIA

CONTRATO No LP-002 (Número de Contrato) **DE** 2024 **ACTA No** 2.00 Página 1.00 de 2.00

Página 2.00 de 2.00

V. TEMAS TRATADOS

INICIO DE LAS OBRAS:

Se realiza seguimiento a las obras y se observa un rendimiento acepetable, con un avance del 9.5% vs un programado del 11%, teniendo un retraso del 2%, el cual el contratista atribuye a que se han presentado actividades no contempladas, las cuales deben realizarse para el corecto desarrollo de la obra, como lo son demolicion de muros no contractuales y tratamiento de grietas con abertura promedio entre 3 y 5mm, ya que al momento de verificar su estado, estas presentan inestabilidad, por lo que el contratista solicito por oficio a la interventoria la aprobacion de la ejecucion de estas actividades y dicha interventoria emitio su aprobacion.

Toma la palabra la interventoria y manifiesta que debe realizarse un balance contractual producto de la revision conjunta realizada anteriormente.

El contratista manifiesta que se encuentra trabajando en dicho balance y que realizara su entrega en el transcurso de la siguiente semana.

Otro problema presentado son los distintos niveles encontrados en primer piso, por lo cual el contratista recomienda la implementacion de un solo nivel con el fin de aminorar cantidades a ejecutar.

DIFICULTADES PRESENTADAS:

Actividades ejecutadas y por ejecutar no contempladas y que son necesarias para una correcta secuencia del proceso constructivo, lluvias constantes por la temporada invernal.

VI. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA ENTREGA	RESPONSABLES
Entrega de un balance general de mayores, menores cantidades e intems nuevos	**9/09/2024**	**CONTRATISTA**

VII. PRÓXIMA REUNIÓN:

FECHA **2/10/2024**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

en Galapa, Atlántico a los 5.00 (Día en letras) cinco (Día en números) días del mes de septiembre (Mes en que se firma el acta) de 2024 (Año de firma del acta)

Se aprueba el acta en el comite por todos los asistentes.

Galapa 22 de Agosto de 2024.

Señores:

INTERVENTORIA EXTERNA.

JAVIER ALEXANDER SANDOVAL PAEZ.

REF: CONTRATO DE OBRA No. LP-002-2024, cuyo objeto es OBRA DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

ASUNTO: SOLICITUD DE CAMBIO DE HOJA DE VIDA ING. RESIDENTE Y DIRECTOR DE OBRA.

La presente es con el fin de solicitarle el cambio de las hojas de vidas del ingeniero residente y director de obra del contrato en la referencia por los siguientes profesionales: Director Ing. YOSETH PULGAR IBARRA, Residente Ing ADALBERTO FLOREZ SALGADO.

Anexo hojas de vida para su respectiva revisión y aprobación.

Agradeciendo su colaboración, me suscribo cordialmente.

Atentamente,

ING. YOSETH DAVID PULGAR IBARRA
CC. No. 72.289.269 de Barranquilla.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 72289269

PULGAR IBARRA
APELLIDOS

YOSETH DAVID
NOMBRES

Yoseth Pulgar
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-NOV-1983
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

14-ENE-2002 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-0300100-22101343-M-0072289269-20020221 03594 02051H 01 127318715

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

y en su nombre, la

Corporación Universitaria de la Costa,
CUC

Con Personería Jurídica Nº 352 - Abril 1971

Por cuanto

Yoseth David Pulgar Ibarra

C.C. Nº 72.289.269 de Barranquilla T.M. 72289269

Cursó todas las materias que los Estatutos Universitarios exigen, le confiere el título de

Ingeniero Civil

Registro ICFES No. 2810462400008001111100 del 4 de Marzo de 1992
Emanado del Ministerio de Educación Nacional

Con Registro Calificado según Resolución No. 3622, del 19 de Octubre de 2004 Emanado del Ministerio de Educación Nacional

En fe de lo cual se expide el presente Diploma en Barranquilla, Atlántico
El día 29 de Septiembre de 2006

Presidente Consejo Directivo

Decano DECANO

Rector

Director de Programa

Secretario General

Anotado al folio Nº 226 del Libro de Registro de Diplomas Nº 05 - 009508
Refrendado en Barranquilla el 29 de Septiembre de 2006

00539

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA " UMECIT "

Decreto Ejecutivo No. 575 de 2004

En virtud de la autorización que le confiere la Ley y su propio reglamento
Hace constar que:

Yoseth David Pulgar Ibarra

Ha cursado y aprobado el plan de estudios de la Especialización en ***Project Management,*** *a nivel de Postgrado cuya resolución es la* ***ECTF-07-2015*** *y cumplido con los requisitos académicos legales por lo tanto le confiere el título de:*

Especialista en Project Management

En fe de lo cual se le concede tal grado con los honores, derechos y privilegios respectivos y se expide este diploma que lo acredita como tal en la ciudad de Panamá a los 15 días del mes de septiembre del año 2020 .

JOSÉ ALBERTO NIETO
Rector Umecit

CLAUDIA MARCELA RUEDA OSSA
Vicerrectora General

BRITANIA MONTENEGRO
Secretaría General

Identificación Personal: ***CC72289269***

No. de Diploma Serie: ***15881***

Tomo No. ***4***

REPÚBLICA DE PANAMÁ

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. En Panamá el presente documento público
2. ha sido firmado por **Britania Montenegro Bonilla**
3. quien actúa en calidad de **Secretaria General**
4. lleva el sello/timbre de **Universidad Metropolitana de Educación Ciencia y Tecnología**

Certificado

5. en **Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá**
6. el día **4 de febrero de 2021**
7. por **Departamento de Autenticación y Legalización**
8. Número **2021-273522-540020**
9. Sello / Timbre
10. Firma del funcionario

Mariela Rodríguez Mendoza

CERTIFICADOR

No. 499353

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DEPARTAMENTO DE AUTENTICACIÓN Y LEGALIZACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

RESOLUCIÓN No.

013264 01 AGO 2023

Por medio de la cual se resuelve una solicitud de convalidación

LA SUBDIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere el artículo 29 del Decreto 5012 de 2009 y la Resolución No. 000007 del 02 de enero de 2023

CONSIDERANDO

Que YOSETH DAVID PULGAR IBARRA, ciudadano colombiano, identificado con cédula de ciudadanía No.72289269, presentó para su convalidación el título de ESPECIALISTA EN PROJECT MANAGEMENT, otorgado el 15 de septiembre de 2020, por la institución de educación superior UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA UMECIT, PANAMÁ, mediante solicitud radicada en el Ministerio de Educación Nacional con el No.2023-EE-096606.

Que el convalidante adjunta copia del título de INGENIERO CIVIL otorgado el 29 de septiembre de 2006, por la institución de educación superior CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC, COLOMBIA.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 5012 de 2009, corresponde al Ministerio de Educación Nacional convalidar los títulos de educación superior otorgados por instituciones de educación superior extranjeras de acuerdo con las normas vigentes.

Que en virtud del artículo 13 de la Resolución 10687 del 09 de octubre de 2019, uno de los criterios aplicables para efectos de la convalidación de títulos otorgados por instituciones de educación superior extranjeras, es el de "***acreditación o reconocimiento en alta calidad.*** *Criterio aplicable al proceso de convalidación, cuando la institución o el programa cursado del título a convalidar, cuenten con acreditación o reconocimiento en alta calidad por parte de una entidad gubernamental o estatal competente u organización privada autorizada oficialmente para ello en el país de origen.".*

Que el artículo 14 establece que*, "(…) para la aplicación del criterio de convalidación por programas o instituciones acreditadas o reconocidas en alta calidad, se debe cumplir una de las siguientes condiciones: a) Que la institución o el programa que confiere el título cuente con acreditación de calidad por una entidad gubernamental competente u organización privada autorizada oficialmente por la autoridad competente para ello en el país de origen del título. b) Que la institución o el programa que confiere el título, cuenten con un reconocimiento oficial de altos estándares de calidad avalados por una entidad gubernamental competente u organización privada autorizada oficialmente por la autoridad competente en el país de origen del título (…) Parágrafo. La fecha de obtención del título debe estar comprendida dentro del término de vigencia de la acreditación o del reconocimiento de la institución o del programa académico."*

Que el 04 de junio de 2023, se consultó la página web del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá CONEAUPA, organismo evaluador y acreditador avalado por el Ministerio de Educación MEDUCA, que vigila el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria y, se

pudo establecer que la Universidad del Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT), se encuentra acreditada conforme lo estipulado en la Resolución Resolución N° 15 de 31 de octubre de 2012 y Resolución 01 del 17 de enero de 2018 que extiende la vigencia de acreditación del año 2012 a las universidades oficiales y particulares de Panamá.

Que con fundamento en las anteriores consideraciones y después de haber estudiado la documentación presentada, se concluye que es procedente la convalidación solicitada.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - Convalidar y reconocer para todos los efectos académicos y legales en Colombia, el título de ESPECIALISTA EN PROJECT MANAGEMENT, otorgado el 15 de septiembre de 2020, por la institución de educación superior UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA UMECIT, PANAMÁ, a YOSETH DAVID PULGAR IBARRA, ciudadano colombiano, identificado con cédula de ciudadanía No.72289269, como ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE PROYECTOS.

PARÁGRAFO. - La convalidación que se hace por el presente acto administrativo no exime al profesional beneficiario del cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas que regulan el ejercicio de la respectiva profesión.

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación y contra la misma proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales deberán ser interpuestos en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella o a la notificación por aviso al tenor de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C.

LA SUBDIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR



ALINA GÓMEZ MEJÍA

Proyectó: Lusimar Asprilla Morales
Revisó: Felipe Alberto Lizarazo
Aprobó: ALINA GOMEZ MEJIA



REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA

MATRICULA PROFESIONAL No.

082021369 12ATL

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 16/11/2006

YOSETH DAVID

PULGAR IBARRA

C.C. 72289269

CORPORACION UNIVERSITARIA

DE LA COSTA - CUC.

PRESIDENTE DEL CONSEJO

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN CERTIFICA QUE:

El contratista CONSORCIO COLEGIO EL CARMEN, identificado con NIT No. 900.487.565-4, realizo el contrato de obra No. LP-002-2011, cuyo objeto es: **"OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMPO DE LA CRUZ SEDE No 5 EL CARMEN, MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**

1. DETALLES DEL CONTRATO.

DEPENDENCIA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPO DE LA CRUZ
CONTRATO No.	LP-002 DE 2011.
OBJETO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMPO DE LA CRUZ SEDE No 5 EL CARMEN, MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIO EL CARMEN
INTERVENTOR	RIGOBERTO RUGELES BERNAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO	LEWIS RAFAEL VALENCIA VILLEGAS
VALOR	$ 784.430.937
PLAZO	3 MESES
FECHA DE CONTRATO	30 DE DICIEMBRE DE 2011
FECHA DE INICIO	28 DE SEPTIEMBRE DE 2012
FECHA DE SUSPENSION No. 1	10 DE OCTUBRE DE 2012
FECHA DE REINICIO No. 1	19 DE OCTUBRE DE 2012
FECHA DE FINALIZACION	5 DE ENERO DE 2013
INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	YOSETH PULGAR IBARRA
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	ADALBERTO FLOREZ SALGADO

2. PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS.

TOTAL, ÁREA CONSTRUIDA.		
ÁREA CONSTRUIDA	A.	7 AULAS: 468 M2
	B.	COMEDOR Y OFICINAS: 197 M2
	C.	BIBLIOTECA: 170 M2
	D.	BATERÍAS SANITARIAS: 68 M2
ACTIVIDADES PRINCIPALES.		
EXCAVACIONES		
ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO		
INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
REDES SANITARIAS E HIDRÁULICAS		
CUBIERTA		

3. CONSTANCIAS.

Una vez realizada la inspección total de la obra, se constató que los trabajos se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra como consta en el acta de recibo final de obra firmada por las partes el día 5 de enero del año 2013.

Además, certificamos que ni durante la ejecución de la obra ni posterior a la entrega de esta, la ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPO DE LA CRUZ impuso sanciones y/o multas y/o penas contractuales al contratista CONSORCIO COLEGIO EL CARMEN por motivos de incumplimiento y/o abandono y/o mala calidad del objeto contractual.

Se firma en el municipio de CAMPO DE LA CRUZ a los cinco (05) días del mes de agosto del 2013.

LEWIS VALENCIA VILLEGAS
Supervisor de Contrato - Alcaldía Municipal

CL-15-2022

Barranquilla, 03 de noviembre de 2023.

A QUIEN INTERESE:

El suscrito representante legal de CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S. certifica que el ingeniero Yoseth Pulgar Ibarra, identificado con la cedula de ciudadana No. 72.289.269 de Barranquilla, laboró en la empresa bajo el cargo de INGENIERO DIRECTOR DE OBRA, en el proyecto N° 4600015629, cuyo Objeto: "MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE CONSULTORIOS EN PISO 2, SALAS DE CONDUCTORES Y PATIO INTERIOR EN SÓTANO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA", en el periodo comprendido entre el 09 de junio de 2023 hasta el 23 de octubre de 2023.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Barranquilla el 03 de noviembre de 2023.

Atte.

EDGARDO RUIZ GUERRERO
REP. LEGAL CONSTRUCTORA BAYITH SAS

CL-15-2022

Barranquilla,19 de enero de 2021.

A QUIEN INTERESE:

El suscrito representante legal de CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S. certifica que el ingeniero Yoseth Pulgar Ibarra, identificado con la cedula de ciudadana No. 72.289.269 de Barranquilla, laboró en la empresa bajo el cargo de INGENIERO DIRECTOR DE OBRA, en el proyecto N° CONTRATO-FGN-RP-0035-2020, cuyo Objeto: "Contratar obra civil por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste para adecuaciones locativas de las sedes de la Regional Pacifico", en el periodo comprendido entre el 26 de octubre hasta el 18 de diciembre de 2020.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Barranquilla el 19 de enero de 2021.

Atte.

EDGARDO RUIZ GUERRERO
REP. LEGAL CONSTRUCTORA BAYITH SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10778771

FLOREZ SALGADO
APELLIDOS

ADALBERTO LUIS
NOMBRES

Adalberto Flórez
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-SEP-1983

MONTERIA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

18-ENE-2002 MONTERIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1300100-38104074-M-0010778771-20020628 01904 02178A 02 126901062

125

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

CUC

y en su nombre, la

Corporación Universitaria de la Costa,
CUC

Con Personería Jurídica N° 352 - Abril 1971

Por cuanto

Adalberto Luis Flórez Salgado

C.C. N° 10.778.771 de Montería L.M. 10778771

Cursó todas las materias que los Estatutos Universitarios exigen, le confiere el título de

Ingeniero Civil

Registro ICFES No. 2810462400008000111100 del 4 de Marzo de 1992
Emanado del Ministerio de Educación Nacional

Con Registro Calificado según Resolución No. 3822, del 19 de Octubre de 2004 Emanado del Ministerio de Educación Nacional

En fe de lo cual se expide el presente Diploma en Barranquilla, Atlántico
El día 16 de Noviembre de 2006

CUC
Presidente Consejo Directivo
PRESIDENTE

CUC
Decano
DECANO


Rector
CUC
RECTOR

CUC
Director de Programa
DIRECTOR DE PROGRAMA

Secretario General

Anotado al folio N° 263 del Libro de Registro de Diplomas N° 05 - 000680


REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA
MATRICULA PROFESIONAL No.
08202138800ATL
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 25/01/2007
ADALBERTO LUIS
FLOREZ SALGADO
C.C. 10778771
CORPORACION UNIVERSITARIA
DE LA COSTA - CUC
PRESIDENTE DEL CONSEJO

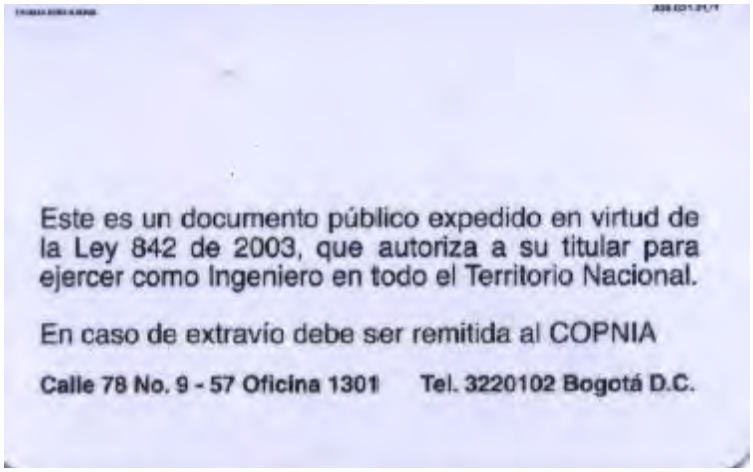
Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.
En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA
Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel. 3220102 Bogotá D.C.

CL-15-2022

Barranquilla, 03 de noviembre de 2023.

A QUIEN INTERESE:

El suscrito representante legal de CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S. certifica que el ingeniero Adalberto florez salgado, identificado con la cedula de ciudadana No. 10.778.771 de Montería, laboró en la empresa bajo el cargo de INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, en el proyecto N° 4600015629, cuyo Objeto: "MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE CONSULTORIOS EN PISO 2, SALAS DE CONDUCTORES Y PATIO INTERIOR EN SÓTANO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA", en el periodo comprendido entre el 09 de junio de 2023 hasta el 23 de octubre de 2023.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Barranquilla el 03 de noviembre de 2023.

Atte.

EDGARDO RUIZ GUERRERO
REP. LEGAL CONSTRUCTORA BAYITH SAS

CL-15-2022

Barranquilla,19 de enero de 2021.

A QUIEN INTERESE:

El suscrito representante legal de CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S. certifica que el ingeniero Adalberto florez salgado, identificado con la cedula de ciudadana No. 10.778.771 de Montería, laboró en la empresa bajo el cargo de INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, en el proyecto N° CONTRATO-FGN-RP-0035-2020, cuyo Objeto: "Contratar obra civil por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste para adecuaciones locativas de las sedes de la Regional Pacifico", en el periodo comprendido entre el 26 de octubre hasta el 18 de diciembre de 2020.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Barranquilla el 19 de enero de 2021.

Atte.

EDGARDO RUIZ GUERRERO
REP. LEGAL CONSTRUCTORA BAYITH SAS

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN CERTIFICA QUE:

El contratista CONSORCIO COLEGIO EL CARMEN, identificado con NIT No. 900.487.565-4, realizo el contrato de obra No. LP-002-2011, cuyo objeto es: **"OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMPO DE LA CRUZ SEDE No 5 EL CARMEN, MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**

1. DETALLES DEL CONTRATO.

DEPENDENCIA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPO DE LA CRUZ
CONTRATO No.	LP-002 DE 2011.
OBJETO	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMPO DE LA CRUZ SEDE No 5 EL CARMEN, MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIO EL CARMEN
INTERVENTOR	RIGOBERTO RUGELES BERNAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO	LEWIS RAFAEL VALENCIA VILLEGAS
VALOR	$ 784.430.937
PLAZO	3 MESES
FECHA DE CONTRATO	30 DE DICIEMBRE DE 2011
FECHA DE INICIO	28 DE SEPTIEMBRE DE 2012
FECHA DE SUSPENSION No. 1	10 DE OCTUBRE DE 2012
FECHA DE REINICIO No. 1	19 DE OCTUBRE DE 2012
FECHA DE FINALIZACION	5 DE ENERO DE 2013
INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	YOSETH PULGAR IBARRA
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	ADALBERTO FLOREZ SALGADO

2. PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS.

TOTAL, ÁREA CONSTRUIDA.		
ÁREA CONSTRUIDA	A.	7 AULAS: 468 M2
	B.	COMEDOR Y OFICINAS: 197 M2
	C.	BIBLIOTECA: 170 M2
	D.	BATERÍAS SANITARIAS: 68 M2
ACTIVIDADES PRINCIPALES.		
EXCAVACIONES		
ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO		
INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
REDES SANITARIAS E HIDRÁULICAS		
CUBIERTA		

3. CONSTANCIAS.

Una vez realizada la inspección total de la obra, se constató que los trabajos se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra como consta en el acta de recibo final de obra firmada por las partes el día 5 de enero del año 2013.

Además, certificamos que ni durante la ejecución de la obra ni posterior a la entrega de esta, la ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPO DE LA CRUZ impuso sanciones y/o multas y/o penas contractuales al contratista CONSORCIO COLEGIO EL CARMEN por motivos de incumplimiento y/o abandono y/o mala calidad del objeto contractual.

Se firma en el municipio de CAMPO DE LA CRUZ a los cinco (05) días del mes de agosto del 2013.

LEWIS VALENCIA VILLEGAS
Supervisor de Contrato - Alcaldía Municipal

Galapa 26 de Agosto de 2024.

Señores:

INTERVENTORIA EXTERNA.

JAVIER ALEXANDER SANDOVAL PAEZ.

REF: CONTRATO DE OBRA No. LP-002-2024, cuyo objeto es OBRA DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

ASUNTO: ENTREGA DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO EN LA REFERENCIA.

La presente es con el fin de hacerle llegar los siguientes documentos para su respectiva revisión y aprobación:


- Cronograma de obra.
- Flujo de fondo.
- Valla informativa.
- Listado de herramientas y equipos.

Agradeciendo su colaboración, me suscribo cordialmente.

Atentamente,


ING. YOSETH DAVID PULGAR IBARRA
CC. No. 72.289.269 de Barranquilla.

Id	Mo de tar	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin
1		**1**	**OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO**	**90 días?**	**jue 22/08/24**	**jue 5/12/24**
2		.	INICIO	0 días	jue 22/08/24	jue 22/08/24
3		**A**	**ADECUACIONES PISO 1 ANTIGUA ALCALDIA**	**86 días**	**mar 27/08/2**	**jue 5/12/24**
4		**1**	**PRELIMINARES**	**3 días**	**mar 27/08/2**	**jue 29/08/24**
5		1.1	TRAZADO Y REPLANTEO PISO 1	3 días	mar 27/08/24	jue 29/08/24
6		1.2.1.2	CERRAMIENTO PERIMETRAL OBRA EN LONA VERDE PISO 1	1 día	mar 27/08/24	mar 27/08/24
7		**2**	**DEMOLICIONES PISO 1**	**16 días**	**mar 27/08/2**	**vie 13/09/24**
8		2.1	DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES E=0,15 M INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN PISO 1	8 días	mié 28/08/24	jue 5/09/24
9		1.2.2.2	DEMOLICION DE PISO Y PLANTILLA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL EN PISO 1	12 días	jue 29/08/24	mié 11/09/24
10		1.2.2.3	DEMOLICION DE PISO Y PLANTILLA EXISTENTE ZONAS EXTERIORES EN PISO 1	9 días	mié 4/09/24	vie 13/09/24
11		1.2.2.4	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES EN PISO 1	3 días	mar 27/08/24	jue 29/08/24

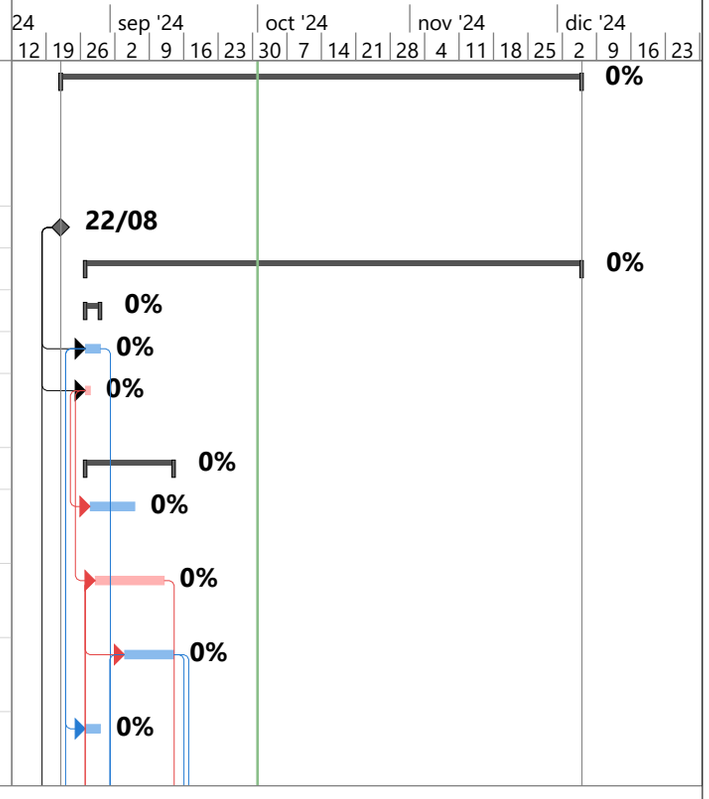


Tareas críticas	solo fin	Resumen manual
División crítica	solo duración	Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica	Línea base	Tareas externas
Tarea	División de la línea base	Hito externo
División	Hito de línea base	Tarea inactiva
Progreso de tarea	Hito	Hito inactivo
Tarea manual	Progreso del resumen	Resumen inactivo
solo el comienzo	Resumen	Fecha límite


Id	Mo de tar	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin
12		1.2.2.5	DESMONTE DE VENTANAS INCLUIDO VIDRIOS EN PISO 1	5 días	mar 27/08/24	sáb 31/08/24
13		1.2.2.6	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL EN PISO 1	3 días	mar 10/09/24	jue 12/09/24
14		2.2	DEMOLICION DE MUROS DE JARDINERAS EXISTENTES EN PISO 1	2 días	jue 5/09/24	vie 6/09/24
15		**3**	**CIMENTACION Y ESTRUCTURA PISO 1**	**33 días**	**sáb 14/09/24**	**mié 23/10/24**
16		3.1	VIGA DE CIMENTACION DE 0,30X0,30 EN CONCRETO DE 3000PSI REFORZADO CON 4 DE 1/2" Y ESTRIBO DE 3/8" @ 20CM EN PISO 1	8 días	sáb 14/09/24	lun 23/09/24
17		3.2	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,07M INCLUYE REFUERZO EN VARILLA DE 1/4" CADA 40CM PARA ZONAS PEATONALES EN PISO 1	10 días	vie 27/09/24	mar 8/10/24
18		3.3	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,07M INCLUYE REFUERZO EN VARILLA DE 1/4" CADA 40CM ZONAS OFICINAS PISO 1	20 días	jue 26/09/24	sáb 19/10/24
19		1.2.3.4	DINTELES DE 0,15X 0,2 M EN PISO 1	3 días	lun 21/10/24	mié 23/10/24
20		1.2.3.5	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=10CM REFORZADO CON VARILLAS DE 3/8" @ 30CM AMBOS SENTIDOS ZONA DE PARQUEADEROS EN PISO 1	9 días	mié 18/09/24	vie 27/09/24

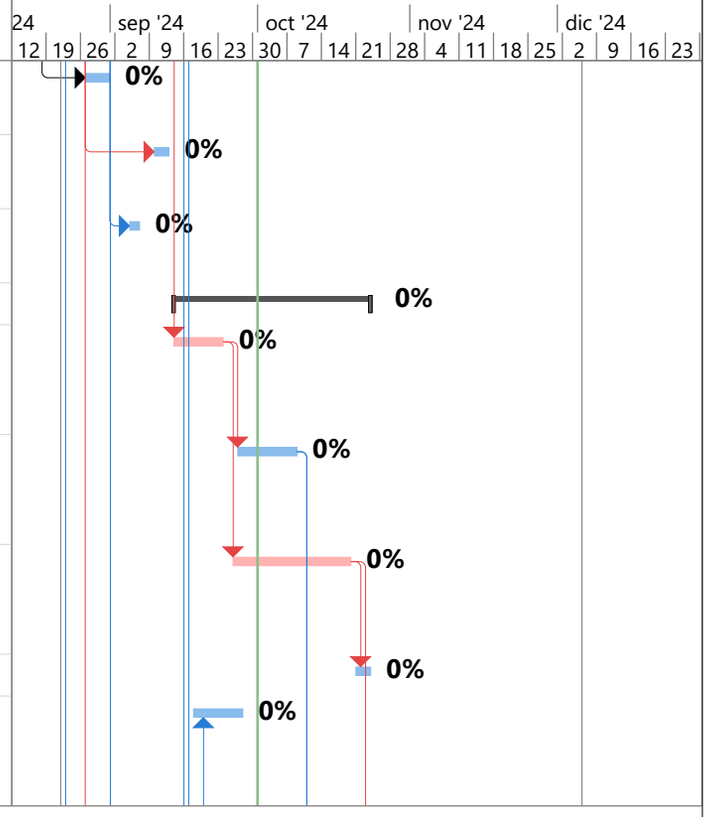


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Id	Mo de tar	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin
21		1.2.3.6	VIGA DE CIMIENTO DE 0,2 X 0,20 M EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI 4VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20CM EN PISO 1	5 días	mar 17/09/24	sáb 21/09/24
22		**4**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS PISO 1**	**60 días**	**sáb 31/08/24**	**sáb 9/11/24**
23		4.1	EXCAVACION MANUAL Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE EN PISO 1	10 días	sáb 31/08/24	mié 11/09/24
24		4.2	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PM EN PISO 1	15 días	mar 3/09/24	jue 19/09/24
25		4.3	BASE EN SUELO CEMENTO E=15CM RELACION 1:10 EN PISO 1	3 días	sáb 14/09/24	mar 17/09/24
26		4.4	SUMINISTRO DE ARENA NEGRA EN PISO 1	15 días	jue 24/10/24	sáb 9/11/24
27		**5**	**MAMPOSTERIA PISO 1**	**12 días**	**mié 9/10/24**	**mié 23/10/24**
28		5.1	LEVANTE EN BLOCK SAMO N° 4 EN PISO 1	10 días	mié 9/10/24	lun 21/10/24
29		5.2	PAÑETE EN MORTERO RELACION 1:4 E: 0.02 EN PISO 1	10 días	vie 11/10/24	mié 23/10/24
30		**1.2.6**	**ACABADOS PISO 1**	**61 días**	**vie 30/08/24**	**sáb 9/11/24**
31		1.2.6.1	ESCARIFICACION DE PARED Y LOSA EN PISO 1	25 días	vie 30/08/24	vie 27/09/24
32		1.2.6.2	ESTUCO EN PULYPLAS PARA MURO Y CIELO A TRES MANOS EN PISO 1	25 días	jue 5/09/24	jue 3/10/24

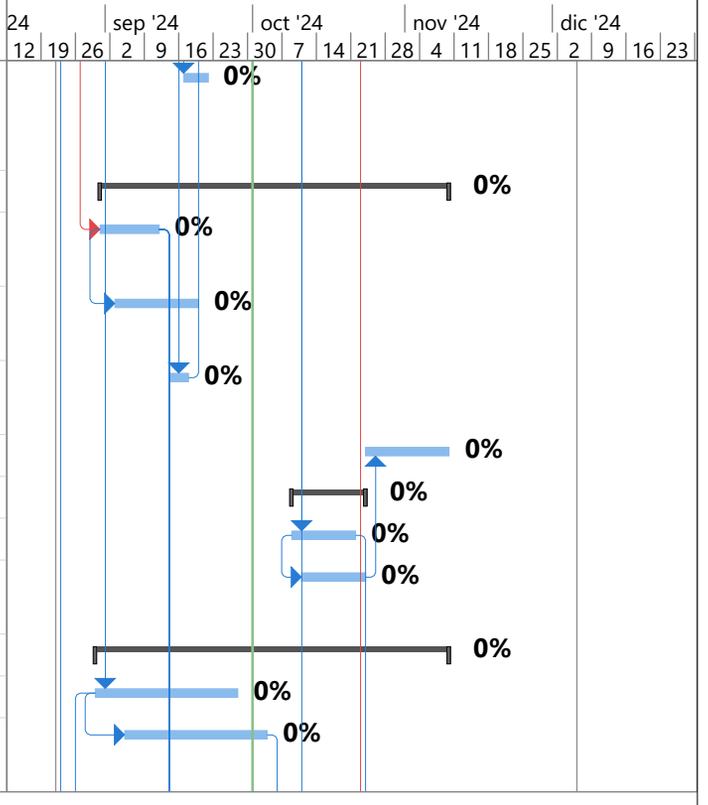





Id	Mc de tar	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin
33		1.2.6.3	PINTURA EN VINILO TIPO 1 A TRES MANOS EN PISO 1	15 días	vie 4/10/24	mar 22/10/24
34		1.2.6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DRYWAL, INCLUYE ACABADO PINTADO A 3 MANOS EN PISO 1	10 días	mié 30/10/24	sáb 9/11/24
35		**1.2.7**	**PISOS PISO 1**	**41 días**	**vie 11/10/24**	**jue 28/11/24**
36		1.2.7.1	PISO EN BALDOSA EN PORCELANATO 0.6 X 0.6 EN PISO 1	20 días	mié 23/10/24	jue 14/11/24
37		1.2.7.2	PISO EN CERAMICA TRAFICO PESADO ANTIDESLIZANTE BAÑO EN PISO 1	10 días	lun 18/11/24	jue 28/11/24
38		1.2.7.3	ZOCALOS EN PISO 1	7 días	mié 20/11/24	mié 27/11/24
39		1.2.7.4	ENCHAPE PARED BAÑO EN PISO 1	1 día?	mié 20/11/24	mié 20/11/24
40		1.2.7.5	PISO EN TABLETA GRES DE 0,3X0,3 PARA ZONAS EXTERIORES EN PISO 1	8 días	vie 11/10/24	lun 21/10/24
41		**1.2.8**	**CUBIERTA PISO 1**	**7 días**	**mar 22/10/2**	**mar 29/10/24**
42		1.2.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA PERFIL 7, INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA ABARCO EN PISO 1	7 días	mar 22/10/24	mar 29/10/24
43		**1.2.9**	**CARPINTERIA PISO 1**	**6 días**	**vie 29/11/24**	**jue 5/12/24**

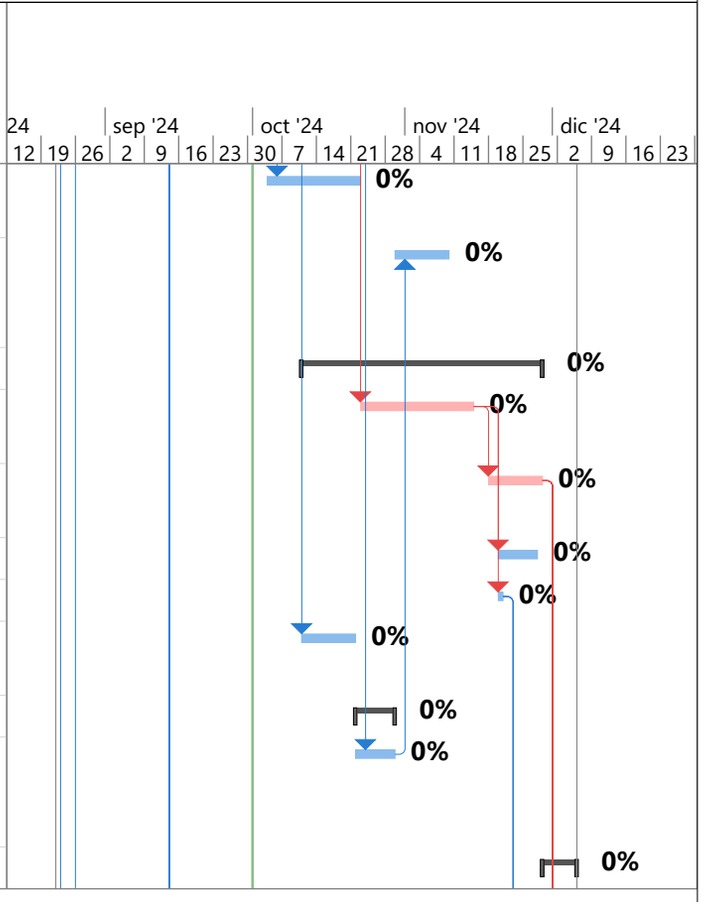


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	


Id	Mc de tar	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin
44		1.2.9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA DE 1.0 X 2 EN PISO 1	5 días	vie 29/11/24	mié 4/12/24
45		1.2.9.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PARA BAÑO 0.85 X 2.0 EN PISO 1	5 días	vie 29/11/24	mié 4/12/24
46		1.2.9.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PRINCIPALES 1.2 X 2.0 EN PISO 1	5 días	vie 29/11/24	mié 4/12/24
47		1.2.9.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA METALICA EN ALUMINIO 70-44 EN PISO 1	5 días	vie 29/11/24	mié 4/12/24
48		1.2.9.5	SUMINISTRO EN INSTALACION DE PROTECTOR EM VARILLA CUADRADA DE 1/2" EN PISO 1	5 días	vie 29/11/24	mié 4/12/24
49		1.2.9.6	SUMINISTRO DE BARANDA EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" Y 1 1/2" Y VIDRIO DE SEGURIDAD PARA PASAMANO ESCALERA EN PISO 1	6 días	vie 29/11/24	jue 5/12/24
50		**1.2.10**	**INSTALACIONES SANITARIAS PISO 1**	**61 días**	**jue 12/09/24**	**vie 22/11/24**
51		1.2.10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS EN	2 días	jue 21/11/24	vie 22/11/24
52		1.2.10.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS EN PISO 1	2 días	jue 21/11/24	vie 22/11/24
53		1.2.10.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES EN PISO 1	2 días	jue 21/11/24	vie 22/11/24
54		1.2.10.4	PUNTO SANITARIO PVC 3" EN PISO 1	4 días	jue 12/09/24	lun 16/09/24

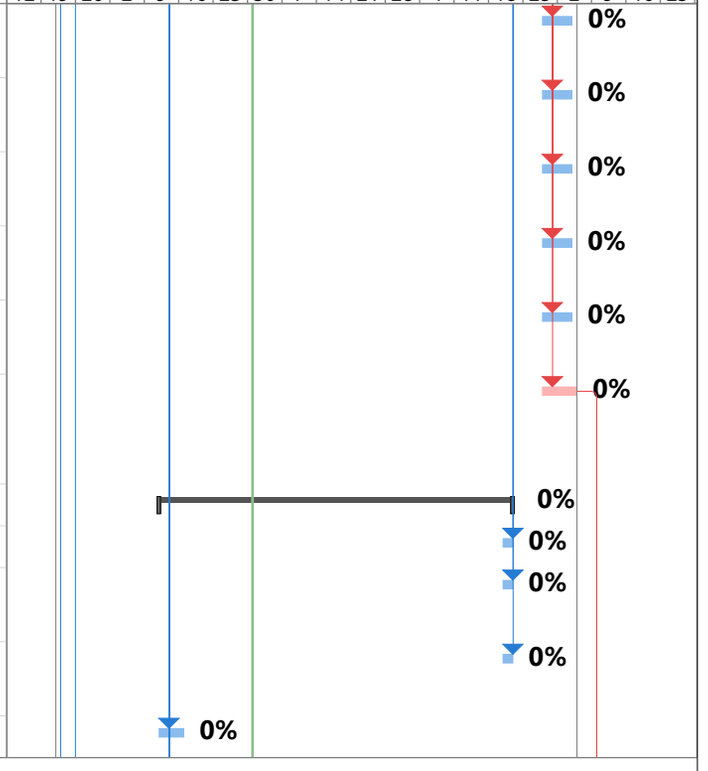





Id	Mo de tar	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin
55		1.2.10.5	PUNTO SANITARIO PVC 2" EN PISO 1	4 días	jue 12/09/24	lun 16/09/24
56		1.2.10.6	REDES DE TUBERIA SANITARIA PVC 3" (INCLUYE ACCESORIO) EN PISO 1	4 días	jue 12/09/24	lun 16/09/24
57		1.2.10.7	REDES DE TUBERIA SANITARIA PVC 2"(INCLUYE ACCESORIO) EN PISO 1	5 días	jue 12/09/24	mar 17/09/24
58		1.2.10.8	REGISTRO SANITARIO DE INSPECCION EN LADRILLO COMUN (0,45X0,45) EN PISO 1	4 días	jue 12/09/24	lun 16/09/24
59		1.2.10.9	PUNTO DE AGUA POTABLE PVC 1/2" EN PISO 1	4 días	jue 12/09/24	lun 16/09/24
60		1.2.10.10	REDES DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" (INLCUYE ACCESORIOS) EN PISO 1	5 días	jue 12/09/24	mar 17/09/24
61		**1.2.11**	**INSTALACIONES ELECTRICAS PISO 1**	**20 días**	**vie 30/08/24**	**sáb 21/09/24**
62		1.2.11.1	SALIDA TOMACORRIENTE 110 VOLTIOS PISO 1	10 días	lun 9/09/24	jue 19/09/24
63		1.2.11.2	SALIDA TOMACORRIENTE 220 VOLTIOS (AIRE ACONDICIONADO) PISO 1	10 días	lun 9/09/24	jue 19/09/24
64		1.2.11.3	SALIDA PARA SWITCHE SENCILLO PISO 1	10 días	lun 9/09/24	jue 19/09/24
65		1.2.11.4	SALIDA PARA SWITCHE DOBLE PISO 1	10 días	lun 9/09/24	jue 19/09/24
66		1.2.11.5	ACOMETIDA PARCIAL EN TUBERIA PVC DE 3/4" ALAMBRE AISLADO (TRES LINEAS N° 8) AWG THHN. N° 12 AWG. (THHN) PISO 1	4 días	vie 30/08/24	mar 3/09/24
67		1.2.11.6	INTERRUPTOR DOBLE PISO 1	5 días	mar 17/09/24	sáb 21/09/24

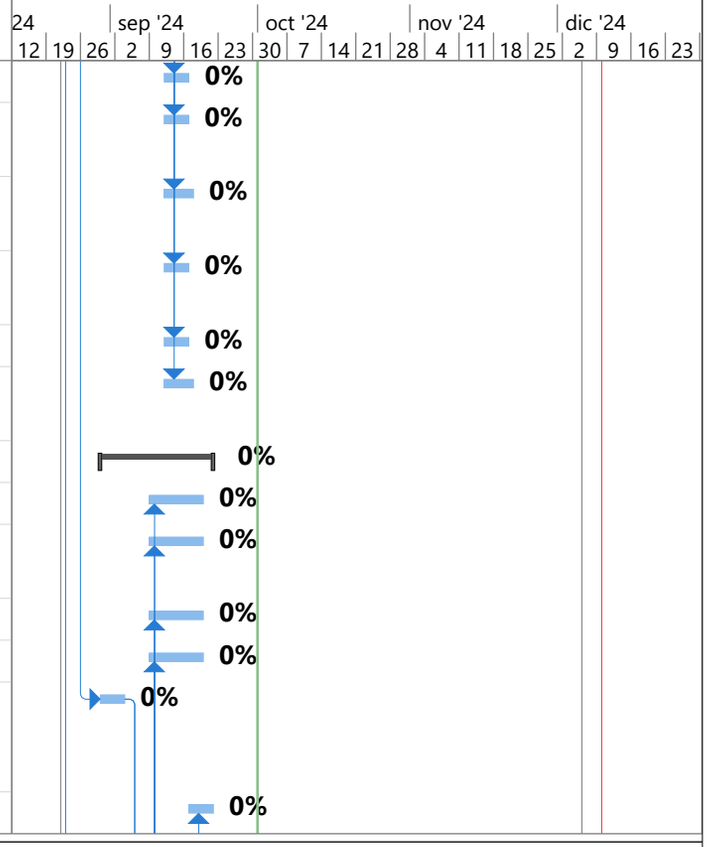




Id	Mo de tar	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin
68		1.2.11.7	INTERRUPTOR SENCILLO PISO 1	5 días	mié 11/09/24	lun 16/09/24
69		1.2.11.8	SALIDA PARA LAMPARA LED 60 W PISO 1	10 días	mié 11/09/24	sáb 21/09/24
70		1.2.11.9	TABLERO ELECTRICO DE 12 CIRCUITOS PISO 1	4 días	mié 4/09/24	sáb 7/09/24
71		1.2.11.10	TOTALIZADOR CON CAJA PISO 1	4 días	mié 4/09/24	sáb 7/09/24
72		1.2.11.11	MALLA A TIERRA CON 3 VARILLAS COPER WELL DE 1,8 M X 5/8" PISO 1	2 días	mié 4/09/24	jue 5/09/24
73		**B**	**ADECUACIONES PISO 2 ANTIGUA ALCALDIA**	**86 días**	**mar 27/08/24**	**jue 5/12/24**
74		**6**	**PRELIMINARES PISO 2**	**3 días**	**mar 27/08/24**	**jue 29/08/24**
75		6.1	TRAZADO Y REPLANTEO EN PISO 2	3 días	mar 27/08/24	jue 29/08/24
76		**7**	**DEMOLICIONES PISO 2**	**12 días**	**vie 30/08/24**	**jue 12/09/24**
77		7.1	DEMOLICION DE PISO Y PLANTILLA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL EN PISO 2	12 días	vie 30/08/24	jue 12/09/24
78		**8**	**CIMENTACION Y ESTRUCTURA PISO 2**	**51 días**	**lun 2/09/24**	**jue 31/10/24**
79		8.1	PLANTILLA DE NIVELACION EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,05M INCLUYE REFUERZO EN VARILLA DE 1/4" CADA 40CM EN PISO 2	12 días	mié 4/09/24	mar 17/09/24
80		8.2	DINTELES DE 0,15X 0,2 M EN PISO 2	8 días	lun 2/09/24	mar 10/09/24

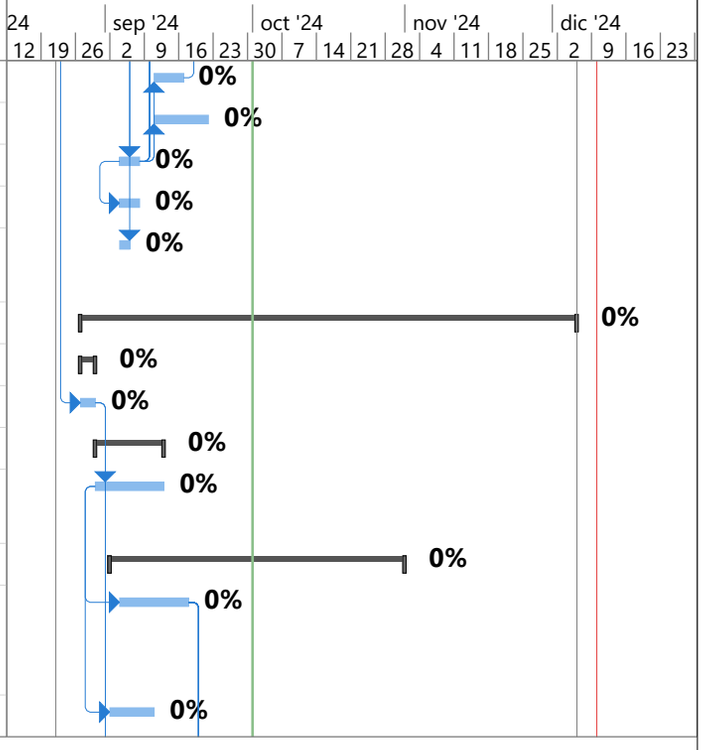




Id	Mc de tar	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin
81		8.3	VIGA DE AMARRE PARA REALCE Y CONFINAMIENTO DE MUROS DE 0,15 X 0,25 M REFORZADA CON DOS VARILLAS DE 3/8 Y GANCHOS DE 1/4 @ 20CM EN PISO 2	15 días	mar 15/10/24	jue 31/10/24
82		**9**	**MAMPOSTERIA PISO 2**	**12 días**	**mié 18/09/24**	**mar 1/10/24**
83		9.1	LEVANTE EN BLOCK SAMO N° 4 EN PISO 2	8 días	mié 18/09/24	jue 26/09/24
84		9.2	PAÑETE EN MORTERO RELACION 1:4 E: 0.02 EN PISO 2	10 días	vie 20/09/24	mar 1/10/24
85		**10**	**ACABADOS PISO 2**	**81 días**	**vie 30/08/24**	**mar 3/12/24**
86		10.1	ESCARIFICACION DE PARED Y LOSA EN PISO 2	25 días	vie 30/08/24	vie 27/09/24
87		10.2	ESTUCO EN PULYPLAS PARA MURO Y CIELO A TRES MANOS EN PISO 2	25 días	jue 5/09/24	jue 3/10/24
88		1.3.5.3	PINTURA EN VINILO TIPO 1 A TRES MANOS EN PISO 2	25 días	mar 5/11/24	mar 3/12/24
89		1.3.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DRYWAL, INCLUYE ACABADO PINTADO A 3 MANOS EN PISO 2	18 días	mar 15/10/24	lun 4/11/24
90		**1.3.6**	**PISOS PISO 2**	**31 días**	**vie 25/10/24**	**vie 29/11/24**
91		1.3.6.1	PISO EN BALDOSA EN PORCELANATO 0.6 X 0.6 EN PISO 2	25 días	vie 25/10/24	vie 22/11/24

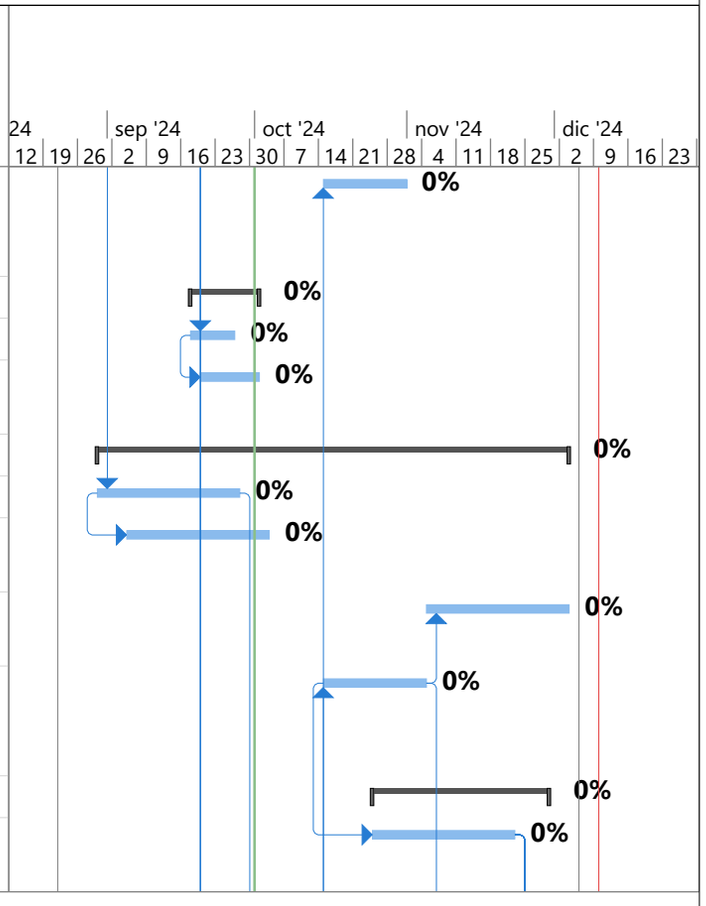


Tareas críticas	solo fin	Resumen manual
División crítica	solo duración	Resumen del proyecto
Progreso de tarea crítica	Línea base	Tareas externas
Tarea	División de la línea base	Hito externo
División	Hito de línea base	Tarea inactiva
Progreso de tarea	Hito	Hito inactivo
Tarea manual	Progreso del resumen	Resumen inactivo
solo el comienzo	Resumen	Fecha límite


Id	Mo de tar	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin
92		1.3.6.2	PISO EN CERAMICA TRAFICO PESADO ANTIDESLIZANTE BAÑO EN PISO 2	10 días	mar 5/11/24	vie 15/11/24
93		1.3.6.3	ZOCALOS EN PISO 2	6 días	sáb 23/11/24	vie 29/11/24
94		1.3.6.4	ENCHAPE PARED BAÑO EN PISO 2	7 días	mar 19/11/24	mar 26/11/24
95		**1.3.7**	**CUBIERTA PISO 2**	**30 días**	**mié 18/09/24**	**mié 23/10/24**
96		1.3.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA PERFIL 7, INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA ABARCO EN PISO 2	22 días	mié 18/09/24	sáb 12/10/24
97		1.3.7.2	IMPERMEABILIZACION EN MANTO EDIL DE 4MM PARA LOSA TANQUE, LOSA LIBRE Y ZABALETAS EN PISO 2	8 días	mar 15/10/24	mié 23/10/24
98		1.3.7.3	ZABALETA EN BLOQUE VIBROPRENSADO No.4 EN PISO 2	8 días	mar 15/10/24	mié 23/10/24
99		**1.3.8**	**CARPINTERIA PISO 2**	**6 días**	**sáb 23/11/24**	**vie 29/11/24**
100		1.3.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA DE 1.0 X 2.0 PISO 2	6 días	sáb 23/11/24	vie 29/11/24
101		1.3.8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PARA BAÑO 0.85 X 2.0 PISO 2	6 días	sáb 23/11/24	vie 29/11/24
102		1.3.8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA CORREDIZAS PRINCIPALES 1.6 X 2.0 PISO 2	6 días	sáb 23/11/24	vie 29/11/24

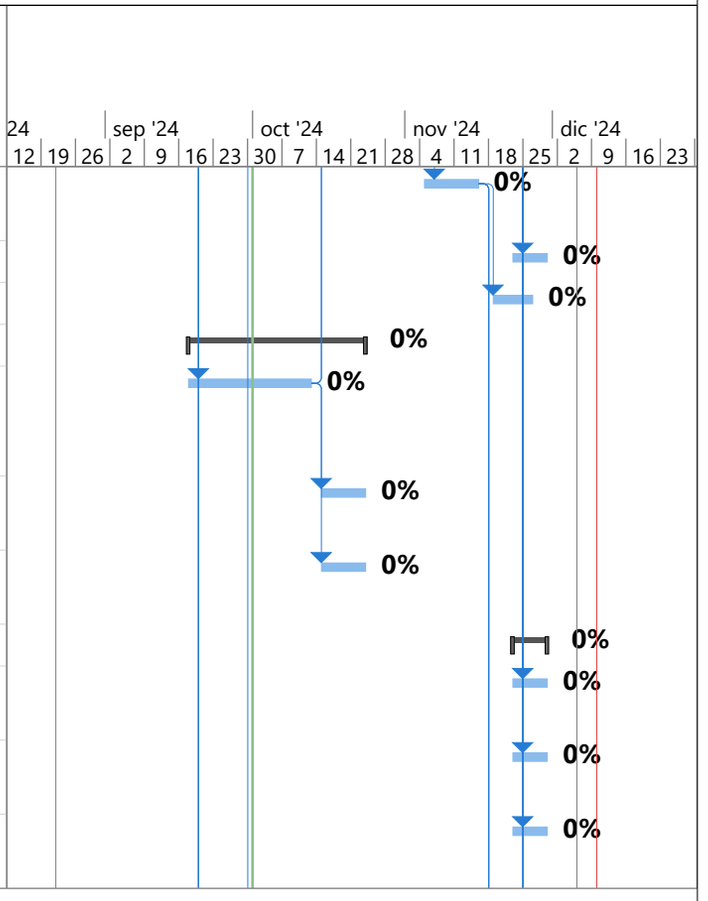


Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

Id	Mo de tar	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin
103		1.3.8.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PARA BAÑO 0.76 X 1,8 M PISO 2	6 días	sáb 23/11/24	vie 29/11/24
104		1.3.8.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA METALICA EN ALUMINIO 70-44 PISO 2	6 días	sáb 23/11/24	vie 29/11/24
105		1.3.8.6	SUMINISTRO EN INSTALACION DE PROTECTOR EM VARILLA CUADRADA DE 1/2" PISO 2	6 días	sáb 23/11/24	vie 29/11/24
106		1.3.8.7	SUMINISTRO DE BARANDA EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" Y 1 1/2" Y VIDRIO DE SEGURIDAD No. 10 PARA PASAMANO FACHADA PISO 2	6 días	sáb 23/11/24	vie 29/11/24
107		**1.3.9**	**INSTALACIONES SANITARIAS PISO 2**	**52 días**	**mié 18/09/24**	**lun 18/11/24**
108		1.3.9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS EN PISO 2	2 días	sáb 16/11/24	lun 18/11/24
109		1.3.9.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS EN PISO 2	2 días	sáb 16/11/24	lun 18/11/24
110		1.3.9.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES EN PISO 2	2 días	sáb 16/11/24	lun 18/11/24
111		1.3.9.4	PUNTO SANITARIO PVC 3" EN PISO 2	3 días	mié 18/09/24	vie 20/09/24
112		1.3.9.5	PUNTO SANITARIO PVC 2" EN PISO 2	3 días	mié 18/09/24	vie 20/09/24
113		1.3.9.6	REDES DE TUBERIA SANITARIA PVC 3" (INCLUYE ACCESORIO) EN PISO 2	3 días	mié 18/09/24	vie 20/09/24

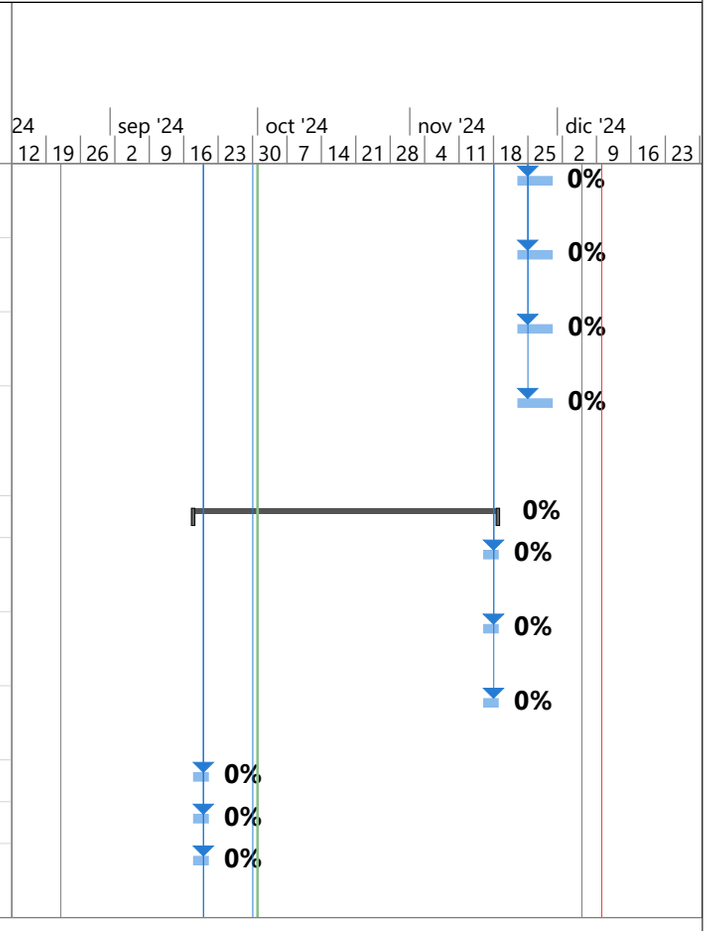



Id	Mo de tar	EDT	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin
114		1.3.9.7	REDES DE TUBERIA SANITARIA PVC 2"(INCLUYE ACCESORIO) EN PISO 2	3 días	mié 18/09/24	vie 20/09/24
115		1.3.9.8	PUNTO DE AGUA POTABLE PVC 1/2" EN PISO 2	3 días	mié 18/09/24	vie 20/09/24
116		1.3.9.9	REDES DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" (INLCUYE ACCESORIOS) EN PISO 2	3 días	mié 18/09/24	vie 20/09/24
117		**1.3.10**	**INSTALACIONES ELECTRICAS PISO 2**	**58 días**	**sáb 28/09/24**	**jue 5/12/24**
118		1.3.10.1	SALIDA TOMACORRIENTE 110 VOLTIOS EN PISO 2	12 días	mié 2/10/24	mié 16/10/24
119		1.3.10.2	SALIDA TOMACORRIENTE 220 VOLTIOS (AIRE ACONDICIONADO) EN PISO 2	12 días	mié 2/10/24	mié 16/10/24
120		1.3.10.3	SALIDA PARA SWITCHE SENCILLO EN PISO 2	12 días	mié 2/10/24	mié 16/10/24
121		1.3.10.4	SALIDA PARA SWITCHE DOBLE EN PISO 2	12 días	mié 2/10/24	mié 16/10/24
122		1.3.10.5	ACOMETIDA PARCIAL EN TUBERIA PVC DE 3/4" ALAMBRE AISLADO (DOS LINEAS N° 12) AWG THHN. N° 12 AWG. (THHN) EN PISO 2	3 días	sáb 28/09/24	mar 1/10/24
123		1.3.10.6	INTERRUPTOR DOBLE EN PISO 2	8 días	jue 17/10/24	vie 25/10/24
124		1.3.10.7	INTERRUPTOR SENCILLO EN PISO 2	8 días	jue 17/10/24	vie 25/10/24
125		1.3.10.8	SALIDA PARA LAMPARA LED 60 W EN PISO 2	10 días	jue 17/10/24	lun 28/10/24
126		1.3.10.9	FIN	0 días	jue 5/12/24	jue 5/12/24

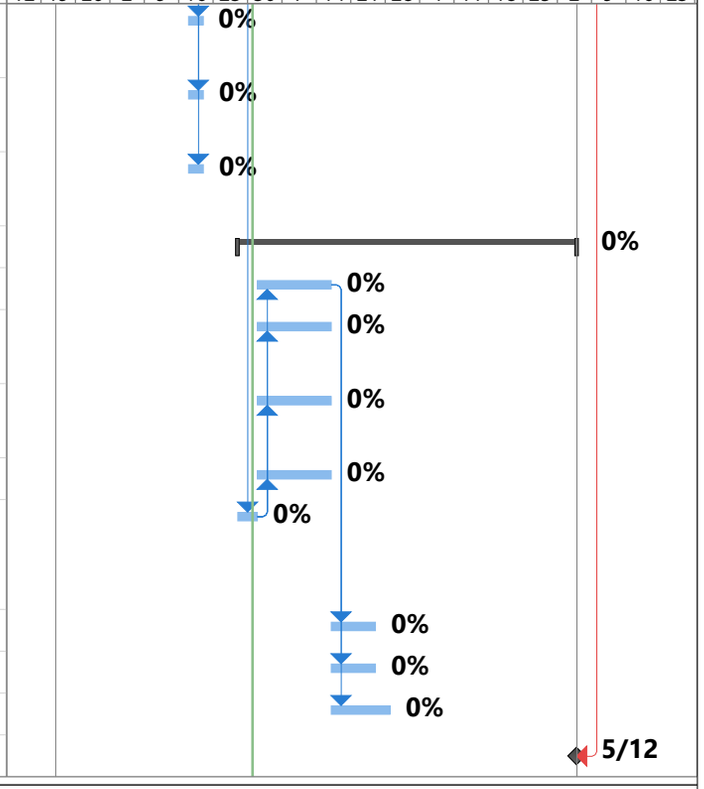

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

| | Año | | Trimestre | | Semana | | |

SUMINISTRO DE BARANDA EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" Y 1 1/2" Y VIDRIO DE SEGURIDAD PARA PASAMANO ESCALERA EN PISO 1	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	2,066,855.95	$	1,377,903.97	$	3,444,759.92
INSTALACIONES SANITARIAS PISO 1	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS EN PISO 1	$	1,055,701.35	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	1,055,701.35
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS EN PISO 1	$	1,772,974.17	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	1,772,974.17
SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES EN PISO 1	$	698,702.15	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	698,702.15
PUNTO SANITARIO PVC 3" EN PISO 1	$	-	$	-	$	335,176.16	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	335,176.16
PUNTO SANITARIO PVC 2" EN PISO 1	$	-	$	-	$	804,704.70	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	804,704.70
REDES DE TUBERIA SANITARIA PVC 3" (INCLUYE ACCESORIO) EN PISO 1	$	-	$	-	$	3,154,804.26	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	3,154,804.26
REDES DE TUBERIA SANITARIA PVC 2"(INCLUYE ACCESORIO) EN PISO 1	$	-	$	-	$	1,756,075.98	$	439,019.00	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	2,195,094.98
REGISTRO SANITARIO DE INSPECCION EN LADRILLO COMUN (0,45X0,45) EN PISO 1	$	-	$	-	$	2,378,201.51	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	2,378,201.51
PUNTO DE AGUA POTABLE PVC 1/2" EN PISO 1	$	-	$	-	$	489,644.15	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	489,644.15
REDES DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" (INLCUYE ACCESORIOS) EN PISO 1	$	-	$	-	$	874,765.98	$	218,691.50	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	1,093,457.48
INSTALACIONES ELECTRICAS PISO 1	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-
SALIDA TOMACORRIENTE 110 VOLTIOS PISO 1	$	-	$	393,548.85	$	2,361,293.09	$	1,180,646.54	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	3,935,488.48
SALIDA TOMACORRIENTE 220 VOLTIOS (AIRE ACONDICIONADO) PISO 1	$	-	$	188,292.13	$	1,129,752.77	$	564,876.39	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	1,882,921.29
SALIDA PARA SWITCHE SENCILLO PISO 1	$	-	$	15,629.28	$	93,775.68	$	46,887.84	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	156,292.80
SALIDA PARA SWITCHE DOBLE PISO 1	$	-	$	38,638.45	$	231,830.67	$	115,915.34	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	386,384.46
ACOMETIDA PARCIAL EN TUBERIA PVC DE 3/4"																															
ALAMBRE AISLADO (TRES LINEAS Nº 8) AWG THHN. Nº 12 AWG. (THHN) PISO 1	$	3,096,772.61	$	1,032,257.54	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	4,129,030.15
INTERRUPTOR DOBLE PISO 1	$	-	$	-	$	-	$	360,454.05	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	360,454.05
INTERRUPTOR SENCILLO PISO 1	$	-	$	-	$	152,160.53	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	152,160.53
SALIDA PARA LAMPARA LED 60 W PISO 1	$	-	$	-	$	1,721,131.34	$	1,721,131.34	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	3,442,262.68
TABLERO ELECTRICO DE 12 CIRCUITOS PISO 1	$	-	$	1,345,668.39	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	1,345,668.39
TOTALIZADOR CON CAJA PISO 1	$	-	$	468,603.63	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	468,603.63
MALLA A TIERRA CON 3 VARILLAS COPER WELL DE 1,8 M X 5/8" PISO 1	$	-	$	1,345,320.90	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	1,345,320.90
ADECUACIONES PISO 2	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-
PRELIMINARES PISO 2	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-
TRAZADO Y REPLANTEO EN PISO 2	$	682,196.38	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	682,196.38
DEMOLICIONES PISO 2	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-
DEMOLICION DE PISO Y PLANTILLA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL EN PISO 2	$	795,895.78	$	1,591,791.55	$	795,895.78	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	3,183,583.11
CIMENTACION Y ESTRUCTURA PISO 2	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-
PLANTILLA DE NIVELACION EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,05M INCLUYE REFUERZO EN VARILLA DE 1/4" CADA 40CM EN PISO 2	$	-	$	3,852,565.28	$	4,623,078.33	$	770,513.06	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	9,246,156.67
DINTELES DE 0,15X 0,2 M EN PISO 2	$	142,671.54	$	856,029.26	$	142,671.54	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	1,141,372.34
VIGA DE AMARRE PARA REALCE Y CONFINAMIENTO DE MUROS DE 0,15 X 0,25 M REFORZADA CON DOS VARILLAS DE 3/8 Y GANCHOS DE 1/4 @ 20CM EN PISO 2	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	1,371,047.91	$	6,855,239.53	$	8,226,287.44	$	4,113,143.72	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	20,565,718.60
MAMPOSTERIA PISO 2	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-
LEVANTE EN BLOCK SAMO Nº 4 EN PISO 2	$	-	$	-	$	-	$	657,194.64	$	394,316.78	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	1,051,511.42
PAÑETE EN MORTERO RELACION 1:4 E: 0.02 EN PISO 2	$	-	$	-	$	-	$	265,896.66	$	531,793.33	$	88,632.22	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	886,322.21
ACABADOS PISO 2	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-
ESCARIFICACION DE PARED Y LOSA EN PISO 2	$	1,587,675.53	$	3,175,351.07	$	3,175,351.07	$	3,175,351.07	$	2,116,900.71	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	13,230,629.45
ESTUCO EN PULYPLAS PARA MURO Y CIELO A TRES MANOS EN PISO 2	$	-	$	7,089,865.20	$	10,634,797.80	$	10,634,797.80	$	10,634,797.80	$	5,317,398.90	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	44,311,657.50
PINTURA EN VINILO TIPO 1 A TRES MANOS EN PISO 2	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	6,366,576.26	$	6,366,576.26	$	6,366,576.26	$	6,366,576.26	$	1,061,096.04	$	26,527,401.08
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DRYWAL, INCLUYE ACABADO PINTADO A 3 MANOS EN PISO 2	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	897,979.55	$	4,489,897.77	$	5,387,877.32	$	5,387,877.32	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	16,163,631.96
PISOS PISO 2	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-
PISO EN BALDOSA EN PORCELANATO 0.6 X 0.6 EN PISO 2	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	2,460,934.87	$	4,921,869.74	$	4,921,869.74	$	4,921,869.74	$	4,921,869.74	$	3,281,246.50	$	-	$	-	$	-	$	20,507,790.59
PISO EN CERAMICA TRAFICO PESADO ANTIDESLIZANTE BAÑO EN PISO 2	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	370,557.99	$	247,038.66	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	617,596.65
ZOCALOS EN PISO 2	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	1,321,866.76	$	2,643,733.53	$	-	$	3,965,600.29
ENCHAPE PARED BAÑO EN PISO 2	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	3,112,517.57	$	518,752.93	$	-	$	3,631,270.50
CUBIERTA PISO 2	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA PERFIL 7, INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA ABARCO EN PISO 2	$	-	$	-	$	-	$	6,742,858.54	$	8,091,430.25	$	8,091,430.25	$	6,742,858.54	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	$	29,668,577.58

IMPERMEABILIZACION EN MANTO EDIL DE 4MM PARA LOSA TANQUE, LOSA LIBRE Y ZABALETAS EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 420,997.50	$ 2,104,987.50	$ 841,995.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,367,980.00
ZABALETA EN BLOQUE VIBROPRENSADO No.4 EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 89,215.39	$ 446,076.93	$ 178,430.77	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 713,723.09
CARPINTERIA PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA DE 1.0 X 2.0 PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,556,510.66	$ 5,113,021.32	$ -	$ 7,669,531.98
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PARA BAÑO 0.85 X 2.0 PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 834,350.22	$ 1,668,700.44	$ -	$ 2,503,050.66
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA CORREDIZAS PRINCIPALES 1.6 X 2.0 PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 581,954.06	$ 1,163,908.11	$ -	$ 1,745,862.17
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PARA BAÑO 0.76 X 1,8 M PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 352,577.61	$ 705,155.22	$ -	$ 1,057,732.83
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA METALICA EN ALUMINIO 70-44 PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,193,036.08	$ 6,386,072.16	$ -	$ 9,579,108.24
SUMINISTRO EN INSTALACION DE PROTECTOR EM VARILLA CUADRADA DE 1/2" PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,798,071.37	$ 5,596,142.73	$ -	$ 8,394,214.10
SUMINISTRO DE BARANDA EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" Y 1 1/2" Y VIDRIO DE SEGURIDAD No. 10 PARA PASAMANO FACHADA PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,584,686.54	$ 11,169,373.07	$ -	$ 16,754,059.61
INSTALACIONES SANITARIAS PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 703,800.90	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 703,800.90
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,772,974.17	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,772,974.17
SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,397,404.31	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,397,404.31
PUNTO SANITARIO PVC 3" EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 223,450.77	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 223,450.77
PUNTO SANITARIO PVC 2" EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 536,469.80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 536,469.80
REDES DE TUBERIA SANITARIA PVC 3" (INCLUYE ACCESORIO) EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 350,533.81	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 350,533.81
REDES DE TUBERIA SANITARIA PVC 2"(INCLUYE ACCESORIO) EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,371,934.36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,371,934.36
PUNTO DE AGUA POTABLE PVC 1/2" EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 326,429.43	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 326,429.43
REDES DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" (INLCUYE ACCESORIOS) EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 502,990.44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 502,990.44
INSTALACIONES ELECTRICAS PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SALIDA TOMACORRIENTE 110 VOLTIOS EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,596,329.20	$ 3,115,595.05	$ 519,265.84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,231,190.09
SALIDA TOMACORRIENTE 220 VOLTIOS (AIRE ACONDICIONADO) EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,078,756.99	$ 1,294,508.39	$ 215,751.40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,589,016.78
SALIDA PARA SWITCHE SENCILLO EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 65,122.00	$ 78,146.40	$ 13,024.40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 156,292.80
SALIDA PARA SWITCHE DOBLE EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 268,322.53	$ 321,987.04	$ 53,664.51	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 643,974.08
ACOMETIDA PARCIAL EN TUBERIA PVC DE 3/4" ALAMBRE AISLADO (DOS LINEAS Nº 12) AWG THHN. Nº 12 AWG. (THHN) EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,347,522.36	$ 2,673,761.18	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,021,283.54
INTERRUPTOR DOBLE EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 180,227.03	$ 180,227.03	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 360,454.06
INTERRUPTOR SENCILLO EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 76,080.27	$ 76,080.27	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 152,160.54
SALIDA PARA LAMPARA LED 60 W EN PISO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,684,964.88	$ 4,027,447.33	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,712,412.21
FIN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total general	$ 23,269,143.20	$ 34,751,181.55	$ 61,348,462.59	$ 46,379,956.99	$ 43,444,187.74	$ 37,362,488.19	$ 32,894,101.54	$ 38,095,946.21	$ 40,218,955.54	$ 25,934,983.96	$ 21,323,675.10	$ 18,254,494.58	$ 35,607,025.61	$ 58,978,233.72	$ 11,265,814.19	$ 529,128,650.71

VALLA INFORMATIVA



	LISTA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	
		26/08/2024

Objetivo:Identificar las caracteristicas de las herramientas y equipos a usar en el proyecto.

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO _____ DEPENDENCIA, DT o AP _____
DILIGENCIADO POR _____ CARGO _____

INSPECCION DE HERRAMIENTAS					
TIPO DE HERRAMIENTA	ESTADO				OBSERVACIONES
	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	CANT	
Herramientas Fijas					
Taladro	x			2	
Compresor	x			1	
Maquina de soldar	x			1	
Herramientas Manuales					
Taladro percutor doble manija	X			2	
Pulidora pequeña (A)	X			2	
Pulidora grande (B)	X			2	
Segueta pequeña	X			5	
Martillos grandes (Monas)	X			6	
Escalera de extensión	X			2	
Escalera fija.	X			1	
Brocas	X			6	

EQUIPOS	ESTADO				OBSERVACIONES
	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	CANT	
MEZCLADORA DE 2 BULTOS	X			2	

FIRMA _____
NOMBRE _____
CEDULA _____

Galapa 19 de septiembre de 2024.

Señores:

INTERVENTORIA EXTERNA.

JAVIER ALEXANDER SANDOVAL PAEZ.

REF: CONTRATO DE OBRA No. LP-002-2024, cuyo objeto es OBRA DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

ASUNTO: SOLICITUD DE REVISION Y APROBACION DE ACTA MODIFICATIVA 1.

La presente es con el fin de hacerle entrega del acta modificativa No.1, acompañada de los análisis de precios unitarios y memoria de cantidades, para su respectiva revisión y aprobación.

Agradeciendo su colaboración, me suscribo cordialmente.

Atentamente,

ING. YOSETH DAVID PULGAR IBARRA
CC. No. 72.289.269 de Barranquilla.

ACTA MODIFICATIVA DE OBRA No. 1

CONTRATO:	LP-002-2024	**FECHA DE INICIO :**	22 DE AGOSTO DE 2024	PLAZO :90 DIAS LABORALES
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA P-F LTDA	**FECHA DE TERMINACION :**	5 DE DICIEMBRE DE 2024	
OBJETO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	MC-011-2024	
VALOR CONTRATO DE OBRA :	$ 529,128,650.63	**INTERVENTOR :**	ING. JAVIER SANDOVAL PAEZ	

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

PRESUPUESTO ADECUACIONES PRIMER PISO

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	ACTA MODIFICATIVA No.1		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		GENERAL	PARTICULAR						CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
	1.00			**PRELIMINARES PISO 1**								
1	1.01			TRAZADO Y REPLANTEO PISO 1	M2	80.00	$ 6,014.25	$ 481,140.00			80.00	$ 481,140.00
2	1.02			CERRAMIENTO PERIMETRAL OBRA EN LONA VERDE PISO 1	ML	43.00	$ 16,038.00	$ 689,634.00	4.00	$ 64,152.00	47.00	$ 753,786.00
SUBTOTAL								**$ 1,170,774.00**		**$ 64,152.00**	0.00	**$ 1,234,926.00**
	2.00			**DEMOLICIONES PISO 1**								
3	2.01			DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES E=0,15 M INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN PISO 1	M2	35.00	$ 42,059.66	$ 1,472,087.93	14.00	$ 588,835.17	49.00	$ 2,060,923.10
4	2.02			DEMOLICION DE PISO Y PLANTILLA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL EN PISO 1	M2	112.00	$ 28,066.50	$ 3,143,448.00	-2.17	-$ 60,904.31	109.83	$ 3,082,543.70
5	2.03			DEMOLICION DE PISO Y PLANTILLA EXISTENTE ZONAS EXTERIORES EN PISO 1	M2	136.00	$ 28,066.50	$ 3,817,044.00	-12.90	-$ 362,057.85	123.10	$ 3,454,986.15
6	2.04			DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES EN PISO 1	UND	4.00	$ 44,505.45	$ 178,021.80	-2.00	-$ 89,010.90	2.00	$ 89,010.90
7	2.05			DESMONTE DE VENTANAS INCLUIDO VIDRIOS EN PISO 1	UND	10.00	$ 34,615.35	$ 346,153.50	-3.00	-$ 103,846.05	7.00	$ 242,307.45
8	2.06			DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL EN PISO 1	UND	173.00	$ 79,966.14	$ 13,834,141.57	-110.62	-$ 8,845,853.99	62.38	$ 4,988,287.58
9	2.07			DEMOLICION DE MUROS DE JARDINERAS EXISTENTES EN PISO 1	M2	46.00	$ 24,057.00	$ 1,106,622.00		$ 0.00	46.00	$ 1,106,622.00
	Subtotal							**$ 23,897,518.80**		**-$ 8,872,837.93**		**$ 15,024,680.87**
	3.00			**CIMENTACION Y ESTRUCTURA PISO 1**								
10	3.01			VIGA DE CIMENTACION DE 0,30X0,30 EN CONCRETO DE 3000PSI REFORZADO CON 4 DE 1/2" Y ESTRIBO DE 3/8" @ 20CM EN PISO 1	ML	6.70	$ 166,809.90	$ 1,117,626.34	0.50	$ 83,404.95	7.20	$ 1,201,031.29
11	3.02			PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,07M INCLUYE REFUERZO EN VARILLA DE 1/4" CADA 40CM PARA ZONAS PEATONALES EN PISO 1	M2	136.00	$ 100,040.40	$ 13,605,494.35	-12.90	-$ 1,290,521.16	123.10	$ 12,314,973.20
12	3.03			PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,07M INCLUYE REFUERZO EN VARILLA DE 1/4" CADA 40CM ZONAS OFICINAS PISO 1	M2	112.00	$ 100,040.40	$ 11,204,524.76	-2.17	-$ 217,087.67	109.83	$ 10,987,437.09
13	3.04			DINTELES DE 0,15X 0,2 M EN PISO 1	ML	32.00	$ 76,091.49	$ 2,434,927.65	-22.40	-$ 1,704,449.36	9.60	$ 730,478.30
14	3.05			PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=10CM REFORZADO CON VARILLAS DE 3/8" @ 30CM AMBOS SENTIDOS ZONA DE PARQUEADEROS EN PISO 1	M2	60.00	$ 120,484.35	$ 7,229,060.86	-60.00	-$ 7,229,060.86	0.00	$ 0.00
15	3.06			VIGA DE CIMIENTO DE 0,2 X 0,20 M EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI 4VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20CM EN PISO 1	ML	36.70	$ 74,761.24	$ 2,743,737.69	-36.70	-$ 2,743,737.69	0.00	$ 0.00
	SUBTOTAL							**$ 38,335,371.66**		**-$ 13,101,451.78**		**$ 25,233,919.88**
	4.00			**EXCAVACIONES Y RELLENOS PISO 1**								
16	4.01			EXCAVACION MANUAL Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE EN PISO 1	M3	40.00	$ 45,441.00	$ 1,817,640.00		$ 0.00	40.00	$ 1,817,640.00
17	4.02			RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PM EN PISO 1	M3	30.00	$ 114,939.00	$ 3,448,170.00	26.13	$ 3,003,356.07	56.13	$ 6,451,526.07
18	4.03			BASE EN SUELO CEMENTO E=15CM RELACION 1:10 EN PISO 1	M3	9.45	$ 168,399.00	$ 1,591,370.55	-9.45	-$ 1,591,370.55	0.00	$ 0.00
19	4.04			SUMINISTRO DE ARENA NEGRA EN PISO 1	M3	4.00	$ 37,422.00	$ 149,688.00	-2.00	-$ 74,844.00	2.00	$ 74,844.00
	SUBTOTAL							**$ 7,006,868.55**		**$ 1,337,141.52**	0.00	**$ 8,344,010.07**
	5.00			**MAMPOSTERIA PISO 1**								
20	5.01			LEVANTE EN BLOCK SAMO N° 4 EN PISO 1	M2	40.76	$ 70,100.76	$ 2,857,307.04	8.55	$ 599,361.51	49.31	$ 3,456,668.55
21	5.02			PAÑETE EN MORTERO RELACION 1:4 E: 0.02 EN PISO 1	M2	121.72	$ 29,544.07	$ 3,596,104.64	-17.72	-$ 523,520.99	104.00	$ 3,072,583.66
	SUBTOTAL							**$ 6,453,411.68**		**$ 75,840.53**	0.00	**$ 6,529,252.21**
	6.00			**ACABADOS PISO 1**								
22	6.01			ESCARIFICACION DE PARED Y LOSA EN PISO 1	M2	506.00	$ 13,926.98	$ 7,047,051.06		$ 0.00	506.00	$ 7,047,051.06
23	6.02			ESTUCO EN PULYPLAS PARA MURO Y CIELO A TRES MANOS EN PISO 1	M2	506.00	$ 46,643.85	$ 23,601,788.10		$ 0.00	506.00	$ 23,601,788.10
24	6.03			PINTURA EN VINILO TIPO 1 A TRES MANOS EN PISO 1	M2	506.00	$ 27,923.58	$ 14,129,331.53		$ 0.00	506.00	$ 14,129,331.53
25	6.04			SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DRYWAL, INCLUYE ACABADO PINTADO A 3 MANOS EN PISO 1	M2	75.00	$ 112,693.52	$ 8,452,014.21	-14.69	-$ 1,655,467.85	60.31	$ 6,796,546.36
	SUBTOTAL							**$ 53,230,184.90**		**-$ 1,655,467.85**		**$ 51,574,717.05**

	7.00			**PISOS PISO 1**								
26	7.01			PISO EN BALDOSA EN PORCELANATO 0.6 X 0.6 EN PISO 1	M2	112.00	$ 160,380.00	$ 17,962,560.00	-10.05	-$ 1,611,819.00	101.95	$ 16,350,741.00
27	7.02			PISO EN CERAMICA TRAFICO PESADO ANTIDESLIZANTE BAÑO EN PISO 1	M2	12.18	$ 123,519.33	$ 1,504,465.44		$ 0.00	12.18	$ 1,504,465.44
28	7.03			ZOCALOS EN PISO 1	ML	250.00	$ 26,437.34	$ 6,609,333.81	-165.18	-$ 4,366,919.04	84.82	$ 2,242,414.78
29	7.04			ENCHAPE PARED BAÑO EN PISO 1	M2	68.00	$ 126,967.50	$ 8,633,790.00	-13.50	-$ 1,714,061.25	54.50	$ 6,919,728.75
30	7.05			PISO EN TABLETA GRES DE 0,3X0,3 PARA ZONAS EXTERIORES EN PISO 1	M2	136.00	$ 111,385.13	$ 15,148,377.00	-136.00	-$ 15,148,377.00	0.00	$ 0.00
	SUBTOTAL							**$ 49,858,526.25**		**-$ 22,841,176.29**		**$ 27,017,349.96**
	8.00			**CUBIERTA PISO 1**								
31	8.01			SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA PERFIL 7, INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA ABARCO EN PISO 1	M2	75.00	$ 171,494.67	$ 12,862,100.11		$ 0.00	75.00	$ 12,862,100.11
	SUBTOTAL							**$ 12,862,100.11**		**$ 0.00**		**$ 12,862,100.11**
	9.00			**CARPINTERIA PISO 1**								
32	9.01			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA DE 1.0 X 2 EN PISO 1	UND	1.00	$ 1,278,255.33	$ 1,278,255.33	-1.00	-$ 1,278,255.33	0.00	$ 0.00
33	9.02			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PARA BAÑO 0.85 X 2.0 EN PISO 1	UND	3.00	$ 1,251,525.33	$ 3,754,575.99	-3.00	-$ 3,754,575.99	0.00	$ 0.00
34	9.03			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PRINCIPALES 1.2 X 2.0 EN PISO 1	UND	3.00	$ 1,640,553.75	$ 4,921,661.25	-3.00	-$ 4,921,661.25	0.00	$ 0.00
35	9.04			SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA METALICA EN ALUMINIO 70-44 EN PISO 1	M2	14.00	$ 465,457.15	$ 6,516,400.16	-7.68	-$ 3,574,710.95	6.32	$ 2,941,689.22
36	9.05			SUMINISTRO EN INSTALACION DE PROTECTOR EM VARILLA CUADRADA DE 1/2" EN PISO 1	M2	14.00	$ 399,724.48	$ 5,596,142.73	-14.00	-$ 5,596,142.73	0.00	$ 0.00
37	9.06			SUMINISTRO DE BARANDA EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" Y 1 1/2" Y VIDRIO DE SEGURIDAD PARA PASAMANO ESCALERA EN PISO 1	M2	3.30	$ 1,043,866.64	$ 3,444,759.92	1.00	$ 1,043,866.64	4.30	$ 4,488,626.56
	SUBTOTAL							**$ 25,511,795.39**		**-$ 18,081,479.61**		**$ 7,430,315.78**
	10.00			**INSTALACIONES SANITARIAS PISO 1**								
38	10.01			SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS EN PISO 1	UND	3.00	$ 351,900.45	$ 1,055,701.35		$ 0.00	3.00	$ 1,055,701.35
39	10.02			SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS EN PISO 1	UND	2.00	$ 886,487.09	$ 1,772,974.17	1.00	$ 886,487.09	3.00	$ 2,659,461.26
40	10.03			SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES EN PISO 1	UND	1.00	$ 698,702.15	$ 698,702.15	2.00	$ 1,397,404.31	3.00	$ 2,096,106.46
41	10.04			PUNTO SANITARIO PVC 3" EN PISO 1	UND	3.00	$ 111,725.39	$ 335,176.16		$ 0.00	3.00	$ 335,176.16
42	10.05			PUNTO SANITARIO PVC 2" EN PISO 1	UND	9.00	$ 89,411.63	$ 804,704.70		$ 0.00	9.00	$ 804,704.70
43	10.06			REDES DE TUBERIA SANITARIA PVC 3" (INCLUYE ACCESORIO) EN PISO 1	ML	45.00	$ 70,106.76	$ 3,154,804.26	-12.30	-$ 862,313.16	32.70	$ 2,292,491.09
44	10.07			REDES DE TUBERIA SANITARIA PVC 2"(INCLUYE ACCESORIO) EN PISO 1	ML	40.00	$ 54,877.37	$ 2,195,094.98	-30.00	-$ 1,646,321.23	10.00	$ 548,773.74
45	10.08			REGISTRO SANITARIO DE INSPECCION EN LADRILLO COMUN (0,45X0,45) EN PISO 1	UND	5.00	$ 475,640.30	$ 2,378,201.51		$ 0.00	5.00	$ 2,378,201.51
46	10.09			PUNTO DE AGUA POTABLE PVC 1/2" EN PISO 1	UND	9.00	$ 54,404.91	$ 489,644.15	3.00	$ 163,214.72	12.00	$ 652,858.87
47	10.1			REDES DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" (INLCUYE ACCESORIOS) EN PISO 1	ML	50.00	$ 21,869.15	$ 1,093,457.48	8.30	$ 181,513.94	58.30	$ 1,274,971.42
	SUBTOTAL							**$ 13,978,460.90**		**$ 119,985.65**		**$ 14,098,446.55**
	11.00			**INSTALACIONES ELECTRICAS PISO 1**								
48	11.01			SALIDA TOMACORRIENTE 110 VOLTIOS PISO 1	UND	24.00	$ 163,978.69	$ 3,935,488.48		$ 0.00	24.00	$ 3,935,488.48
49	11.02			SALIDA TOMACORRIENTE 220 VOLTIOS (AIRE ACONDICIONADO) PISO 1	UND	8.00	$ 235,365.16	$ 1,882,921.29	-4.00	-$ 941,460.64	4.00	$ 941,460.64
50	11.03			SALIDA PARA SWITCHE SENCILLO PISO 1	UND	3.00	$ 52,097.60	$ 156,292.80	2.00	$ 104,195.20	5.00	$ 260,487.99
51	11.04			SALIDA PARA SWITCHE DOBLE PISO 1	UND	6.00	$ 64,397.41	$ 386,384.45	-3.00	-$ 193,192.22	3.00	$ 193,192.22
52	11.05			ACOMETIDA PARCIAL EN TUBERIA PVC DE 3/4" ALAMBRE AISLADO (TRES LINEAS N° 8) AWG THHN. N° 12 AWG. (THHN) PISO 1	ML	80.00	$ 51,612.88	$ 4,129,030.14	-80.00	-$ 4,129,030.14	0.00	$ 0.00
53	11.06			INTERRUPTOR DOBLE PISO 1	UND	6.00	$ 60,075.68	$ 360,454.05	-3.00	-$ 180,227.03	3.00	$ 180,227.03
54	11.07			INTERRUPTOR SENCILLO PISO 1	UND	3.00	$ 50,720.18	$ 152,160.53	2.00	$ 101,440.35	5.00	$ 253,600.88
55	11.08			SALIDA PARA LAMPARA LED 60 W PISO 1	UND	20.00	$ 172,113.13	$ 3,442,262.67		$ 0.00	20.00	$ 3,442,262.67
56	11.09			TABLERO ELECTRICO DE 12 CIRCUITOS PISO 1	UND	3.00	$ 448,556.13	$ 1,345,668.39	-2.00	-$ 897,112.26	1.00	$ 448,556.13
57	11.1			TOTALIZADOR CON CAJA PISO 1	UND	1.00	$ 468,603.63	$ 468,603.63		$ 0.00	1.00	$ 468,603.63
58	11.11			MALLA A TIERRA CON 3 VARILLAS COPER WELL DE 1,8 M X 5/8" PISO 1	UND	1.00	$ 1,345,320.90	$ 1,345,320.90	-1.00	-$ 1,345,320.90	0.00	$ 0.00
	SUBTOTAL							**$ 17,604,587.32**		**-$ 7,480,707.65**		**$ 10,123,879.67**
SUBTOTAL OBRAS PRIMER PISO								**$ 249,909,599.56**		**-$ 70,436,001.41**		**$ 179,473,598.15**

				OBRAS ADICIONALES PRIMER PISO								
	INP			ITEMS NUEVOS PRIMER PISO								
	INP1			DESMONTE DE PUERTAS PISO 1	UND		$ 75,000.00		9.00	$ 675,000.00	9.00	$ 675,000.00
	INP2			DEMOLICION DE ENCHAPE BAÑOS EXISTENTES	M2		$ 33,750.00		37.00	$ 1,248,750.00	37.00	$ 1,248,750.00
	INP3			DESMONTE Y RETIRO DE CLOSED EN MADERA EXISATENTE	UND		$ 250,000.00		1.00	$ 250,000.00	1.00	$ 250,000.00
	INP4			DEMOLICION Y RELLENEO DE POZA SEPTICA EXISTENTE INCLUYE RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	UND		$ 472,500.00		1.00	$ 472,500.00	1.00	$ 472,500.00
	INP5			DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE INCLUE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M2		$ 33,750.00		52.43	$ 1,769,512.50	52.43	$ 1,769,512.50
	INP6			VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000PSI REFORZADO CON DOS VARILLAS DE 3/8 Y GANCHO DE 1/4" 10CM X 20CM	ML		$ 89,360.00		37.80	$ 3,377,808.00	37.80	$ 3,377,808.00
	INP7			REPARACION LOSA DETERIORADA INCLUYE SIKA 32 Y Y PINTURA EPOXICA PARA EL ACERO	M2		$ 135,000.00		4.00	$ 540,000.00	4.00	$ 540,000.00
	INP8			DEMOLICION LOSA EN CONCRETO REFORZADO BAÑOS E=12CM	M2		$ 47,250.00		7.15	$ 337,837.50	7.15	$ 337,837.50
	INP9			BAJANTE SANITARIO 3"	ML		$ 70,106.76		10.00	$ 701,067.61	10.00	$ 701,067.61
	INP10			CONSTRUCCION DE FILETES	ML		$ 33,750.00		80.25	$ 2,708,437.50	80.25	$ 2,708,437.50
	INP11			DEMOLICION DE COLUMNA EXITENTE EN LADRILLO DE 2,5 M	UND		$ 128,250.00		1.00	$ 128,250.00	1.00	$ 128,250.00
	INP12			SUMINISTRO, INSTALACION Y ARMADO DE TABLERO ELECTRICO DE 18 CIRCUITOS BIFASICO PISO 1	UND		$ 742,500.00		1.00	$ 742,500.00	1.00	$ 742,500.00
	INP13			SUMINISTRO DE TACOS DE 20AMP	UND		$ 47,250.00		18.00	$ 850,500.00	18.00	$ 850,500.00
	INP14			SUMINISTRO DE TACOS DE 30AMP	UND		$ 51,300.00		8.00	$ 410,400.00	8.00	$ 410,400.00
	INP15			TOMA CORRIENTE DE 220V	UND		$ 118,800.00		4.00	$ 475,200.00	4.00	$ 475,200.00
	INP16			TOMA CORRIENTE DE 110 V	UND		$ 47,250.00		24.00	$ 1,134,000.00	24.00	$ 1,134,000.00
	INP17			IMPERMIABILIZACION DE ZABALETA EN MANTO EDIL FRIO	ML		$ 121,500.00		23.48	$ 2,852,820.00	23.48	$ 2,852,820.00
	INP18			REDES DE TUBERIA SANITARIA PARA DESAGUE PVC 4" DOBLE (INCLUYE ACCESORIO) EN PISO 1	ML		$ 152,000.00		11.00	$ 1,672,000.00	11.00	$ 1,672,000.00
	INP19			VIGA DE CIMIENTO ZONA EXTERIOR DE 0,2 X 0,25 M EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI REFORZADO CON DOS VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20CM EN PISO 1	ML		$ 134,800.00		42.20	$ 5,688,560.00	42.20	$ 5,688,560.00
	INP20			SUMINISTRO E INTALACION DE MANIJA SANITARIA EN 6 " PARA CONEXIÓN A MAN HOLLE CERCANO INCLUYE CUATRO REGISTRO SANITARIO EN LADRILLO COMUN DE 60X60CM Y TAPAS EN CONCRETO REFORZADO	UND		$ 4,560,000.00		1.00	$ 4,560,000.00	1.00	$ 4,560,000.00
	INP21			CONSTRUCCION DE REGISTO CAPTADOR DE AGUAS LLUVIAS (PATIO) DE 1X0,4 M INCLUYE REGILLA EN VARILLA DE 1/2 " EN LADRILLO COMOUN REPELLADO AMBAS CARAS.	UND		$ 525,150.00		1.00	$ 525,150.00	1.00	$ 525,150.00
	INP22			LEVANTE EN BLOCK DE 15CM VIBROPRENZADO PARA DEFINIR CONTORNO ZONA EXTERIOR H PROMEDIO DE 0,3 M A 0,5 M, INCLUYE REPELLO CARA EXTERIOR	ML		$ 113,400.00		42.20	$ 4,785,480.00	42.20	$ 4,785,480.00
	INP23			POLO A TIERRA CON 1 VARILLAS COPER WELL DE 1,5 M X 1/2" PISO 1	UND		$ 1,044,135.90		2.00	$ 2,088,271.80	2.00	$ 2,088,271.80
	INP24			SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO DE PUERTA DE 1X2M EN MADERA CEDRO Y HOJA EN LAMINA RH , INCLUYE CERRADURA, BIASAGRAS Y JAMBA EN AMBOS LADOS.	UND		$ 1,320,000.00		5.00	$ 6,600,000.00	5.00	$ 6,600,000.00
	INP25			SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO DE PUERTA DE 0.85 X2M EN MADERA CEDRO Y HOJA EN LAMINA RH , INCLUYE CERRADURA, BIASAGRAS Y JAMBA EN AMBOS LADOS.	UND		$ 1,240,000.00		2.00	$ 2,480,000.00	2.00	$ 2,480,000.00
	INP26			JUNTA DE DILATACION EN PERFIL Z DE 11MM INCLUYE ACCESORIO	ML		$ 51,300.00		84.00	$ 4,309,200.00	84.00	$ 4,309,200.00
				SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ FRIA	UND		$ 81,000.00		20.00	$ 1,620,000.00	20.00	$ 1,620,000.00
										SUB TOTAL ITEMS NUEVOS PISO 1		$ 53,003,244.91
				CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO		SUBTOTAL PISO 1		$ 249,909,599.56		TOTAL OBRAS PRIMER PISO		$ 232,476,843.07

PRESUPUESTO ADECUACIONES SEGUNDO PISO												
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA MODIFICATIVA No.1		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		GENERAL	PARTICULAR						CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	12.00			PRELIMINARES PISO 2								
59	12.01			TRAZADO Y REPLANTEO EN PISO 2	M2	113.43	$ 6,014.25	$ 682,196.38			113.43	$ 682,196.38
SUBTOTAL								$ 682,196.38		$ 0.00		$ 682,196.38
	13.00			DEMOLICIONES PISO 2								
60	13.01			DEMOLICION DE PISO Y PLANTILLA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL EN PISO 2	M2	113.43	$ 28,066.50	$ 3,183,583.10	17.91	$ 502,671.02	131.34	$ 3,686,254.11
	Subtotal							$ 3,183,583.10		$ 502,671.02		$ 3,686,254.11
	14.00			CIMENTACION Y ESTRUCTURA PISO 2								
61	14.01			PLANTILLA DE NIVELACION EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,05M INCLUYE REFUERZO EN VARILLA DE 1/4" CADA 40CM EN PISO 2	M2	112.00	$ 82,554.97	$ 9,246,156.66	19.34	$ 1,596,613.12	131.34	$ 10,842,769.78
62	14.02			DINTELES DE 0,15X 0,2 M EN PISO 2	ML	15.00	$ 76,091.49	$ 1,141,372.34	0.70	$ 53,264.04	15.70	$ 1,194,636.38
63	14.03			VIGA DE AMARRE PARA REALCE Y CONFINAMIENTO DE MUROS DE 0,15 X 0,25 M REFORZADA CON DOS VARILLAS DE 3/8 Y GANCHOS DE 1/4 @ 20CM EN PISO 2	ML	196.50	$ 104,660.15	$ 20,565,718.60	-97.74	-$ 10,229,482.63	98.76	$ 10,336,235.98
	SUBTOTAL							$ 30,953,247.60		-$ 8,579,605.46		$ 22,373,642.14
	15.00			MAMPOSTERIA PISO 2								
64	15.01			LEVANTE EN BLOCK SAMO N° 4 EN PISO 2	M2	15.00	$ 70,100.76	$ 1,051,511.42	62.82	$ 4,403,729.84	77.82	$ 5,455,241.26
65	15.02			PAÑETE EN MORTERO RELACION 1:4 E: 0.02 EN PISO 2	M2	30.00	$ 29,544.07	$ 886,322.21	165.02	$ 4,875,363.03	195.02	$ 5,761,685.24
	SUBTOTAL							$ 1,937,833.63		$ 9,279,092.87		$ 11,216,926.50

	16.00			**ACABADOS PISO 2**								
66	16.01			ESCARIFICACION DE PARED Y LOSA EN PISO 2	M2	950.00	$ 13,926.98	$ 13,230,629.45	-350.00	-$ 4,874,442.43	600.00	$ 8,356,187.02
67	16.02			ESTUCO EN PULYPLAS PARA MURO Y CIELO A TRES MANOS EN PISO 2	M2	950.00	$ 46,643.85	$ 44,311,657.50	-359.91	-$ 16,787,468.18	590.09	$ 27,524,189.32
68	16.03			PINTURA EN VINILO TIPO 1 A TRES MANOS EN PISO 2	M2	950.00	$ 27,923.58	$ 26,527,401.10	-350.00	-$ 9,773,253.04	600.00	$ 16,754,148.06
69	16.04			SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DRYWAL, INCLUYE ACABADO PINTADO A 3 MANOS EN PISO 2	M2	143.43	$ 112,693.52	$ 16,163,631.97	-12.09	-$ 1,362,464.69	131.34	$ 14,801,167.28
	SUBTOTAL							**$ 100,233,320.02**		**-$ 32,797,628.34**		**$ 67,435,691.69**

	17.00			**PISOS PISO 2**								
70	17.01			PISO EN BALDOSA EN PORCELANATO 0.6 X 0.6 EN PISO 2	M2	127.87	$ 160,380.00	$ 20,507,790.60	-1.80	-$ 288,684.00	126.07	$ 20,219,106.60
71	17.02			PISO EN CERAMICA TRAFICO PESADO ANTIDESLIZANTE BAÑO EN PISO 2	M2	5.00	$ 123,519.33	$ 617,596.65	0.27	$ 33,350.22	5.27	$ 650,946.87
72	17.03			ZOCALOS EN PISO 2	ML	150.00	$ 26,437.34	$ 3,965,600.29	-28.11	-$ 743,153.49	121.89	$ 3,222,446.79
73	17.04			ENCHAPE PARED BAÑO EN PISO 2	M2	28.60	$ 126,967.50	$ 3,631,270.50	-1.27	-$ 161,248.73	27.33	$ 3,470,021.78
	SUBTOTAL							**$ 28,722,258.04**		**-$ 1,159,736.00**		**$ 27,562,522.04**
	18.00			**CUBIERTA PISO 2**								
74	18.01			SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA PERFIL 7, INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA ABARCO EN PISO 2	M2	173.00	$ 171,494.67	$ 29,668,577.59		$ 0.00	173.00	$ 29,668,577.59
75	18.02			IMPERMEABILIZACION EN MANTO EDIL DE 4MM PARA LOSA TANQUE, LOSA LIBRE Y ZABALETAS EN PISO 2	M2	40.00	$ 84,199.50	$ 3,367,980.00		$ 0.00	40.00	$ 3,367,980.00
76	18.03			ZABALETA EN BLOQUE VIBROPRENSADO No.4 EN PISO 2	ML	24.00	$ 29,738.46	$ 713,723.08		$ 0.00	24.00	$ 713,723.08
	SUBTOTAL							**$ 33,750,280.66**		**$ 0.00**		**$ 33,750,280.66**
	19.00			**CARPINTERIA PISO 2**								
77	19.01			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA DE 1.0 X 2.0 PISO 2	UND	6.00	$ 1,278,255.33	$ 7,669,531.98	-6.00	-$ 7,669,531.98	0.00	$ 0.00
78	19.02			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PARA BAÑO 0.85 X 2.0 PISO 2	UND	2.00	$ 1,251,525.33	$ 2,503,050.66	-2.00	-$ 2,503,050.66	0.00	$ 0.00
79	19.03			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA CORREDIZAS PRINCIPALES 1.6 X 2.0 PISO 2	UND	1.00	$ 1,745,862.17	$ 1,745,862.17	-1.00	-$ 1,745,862.17	0.00	$ 0.00
80	19.04			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PARA BAÑO 0.76 X 1,8 M PISO 2	UND	1.00	$ 1,057,732.83	$ 1,057,732.83	-1.00	-$ 1,057,732.83	0.00	$ 0.00
81	19.05			SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA METALICA EN ALUMINIO 70-44 PISO 2	M2	20.58	$ 465,457.15	$ 9,579,108.24	2.23	$ 1,037,969.45	22.81	$ 10,617,077.69
82	19.06			SUMINISTRO EN INSTALACION DE PROTECTOR EM VARILLA CUADRADA DE 1/2" PISO 2	M2	21.00	$ 399,724.48	$ 8,394,214.10	-21.00	-$ 8,394,214.10	0.00	$ 0.00
83	19.07			SUMINISTRO DE BARANDA EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" Y 1 1/2" Y VIDRIO DE SEGURIDAD No. 10 PARA PASAMANO FACHADA PISO 2	M2	16.05	$ 1,043,866.64	$ 16,754,059.61	-0.28	-$ 292,282.66	15.77	$ 16,461,776.95
	SUBTOTAL							**$ 47,703,559.59**		**-$ 20,624,704.94**		**$ 27,078,854.65**
	20.00			**INSTALACIONES SANITARIAS PISO 2**								
84	20.01			SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS EN PISO 2	UND	2.00	$ 351,900.45	$ 703,800.90		$ 0.00	2.00	$ 703,800.90
85	20.02			SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS EN PISO 2	UND	2.00	$ 886,487.09	$ 1,772,974.17		$ 0.00	2.00	$ 1,772,974.17
86	20.03			SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES EN PISO 2	UND	2.00	$ 698,702.15	$ 1,397,404.31		$ 0.00	2.00	$ 1,397,404.31
87	20.04			PUNTO SANITARIO PVC 3" EN PISO 2	UND	2.00	$ 111,725.39	$ 223,450.77		$ 0.00	2.00	$ 223,450.77
88	20.05			PUNTO SANITARIO PVC 2" EN PISO 2	UND	6.00	$ 89,411.63	$ 536,469.80		$ 0.00	6.00	$ 536,469.80
89	20.06			REDES DE TUBERIA SANITARIA PVC 3" (INCLUYE ACCESORIO) EN PISO 2	ML	5.00	$ 70,106.76	$ 350,533.81		$ 0.00	5.00	$ 350,533.81
90	20.07			REDES DE TUBERIA SANITARIA PVC 2"(INCLUYE ACCESORIO) EN PISO 2	ML	25.00	$ 54,877.37	$ 1,371,934.36		$ 0.00	25.00	$ 1,371,934.36
91	20.08			PUNTO DE AGUA POTABLE PVC 1/2" EN PISO 2	UND	6.00	$ 54,404.91	$ 326,429.43		$ 0.00	6.00	$ 326,429.43
92	20.09			REDES DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" (INLCUYE ACCESORIOS) EN PISO 2	ML	23.00	$ 21,869.15	$ 502,990.44		$ 0.00	23.00	$ 502,990.44
	SUBTOTAL							**$ 7,185,987.98**		**$ 0.00**		**$ 7,185,987.98**
	21.00			**INSTALACIONES ELECTRICAS PISO 2**								
93	21.01			SALIDA TOMACORRIENTE 110 VOLTIOS EN PISO 2	UND	38.00	$ 163,978.69	$ 6,231,190.09		$ 0.00	38.00	$ 6,231,190.09
94	21.02			SALIDA TOMACORRIENTE 220 VOLTIOS (AIRE ACONDICIONADO) EN PISO 2	UND	11.00	$ 235,365.16	$ 2,589,016.77	-4.00	-$ 941,460.64	7.00	$ 1,647,556.13
95	21.03			SALIDA PARA SWITCHE SENCILLO EN PISO 2	UND	3.00	$ 52,097.60	$ 156,292.80	7.00	$ 364,683.19	10.00	$ 520,975.99
96	21.04			SALIDA PARA SWITCHE DOBLE EN PISO 2	UND	10.00	$ 64,397.41	$ 643,974.08	-10.00	-$ 643,974.08	0.00	$ 0.00
97	21.05			ACOMETIDA PARCIAL EN TUBERIA PVC DE 3/4" ALAMBRE AISLADO (DOS LINEAS N° 12) AWG THHN. N° 12 AWG. (THHN) EN PISO 2	ML	190.00	$ 42,217.28	$ 8,021,283.54	-190.00	-$ 8,021,283.54	0.00	$ 0.00
98	21.06			INTERRUPTOR DOBLE EN PISO 2	UND	6.00	$ 60,075.68	$ 360,454.05	-6.00	-$ 360,454.05	0.00	$ 0.00
99	21.07			INTERRUPTOR SENCILLO EN PISO 2	UND	3.00	$ 50,720.18	$ 152,160.53	7.00	$ 355,041.23	10.00	$ 507,201.75
100	21.08			SALIDA PARA LAMPARA LED 60 W EN PISO 2	UND	39.00	$ 172,113.13	$ 6,712,412.21		$ 0.00	39.00	$ 6,712,412.21
	SUBTOTAL							**$ 24,866,784.07**		**-$ 9,247,447.90**		**$ 15,619,336.16**

SUBTOTAL OBRAS SEGUNDO PISO								**$ 279,219,051.07**		**-$ 62,627,358.76**		**$ 216,591,692.31**
						OBRAS ADICIONALES SEGUNDO PISO								
	INP			ITEMS NUEVOS SEGUNDO PISO										
	INP23			DEMOLICION DE ENCHAPE BAÑOS	M2		$ 33,750.00		18.21	$ 614,587.50	18.21	$ 614,587.50
	24			DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES E=0,15 M INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN PISO 2	M2		$ 42,059.66		28.39	$ 1,194,073.61	28.39	$ 1,194,073.61
	INP25			DEMOLICION DE VIGA EN CONCRETO DE 0,25*0,25 M	ML		$ 33,750.00		3.90	$ 131,625.00	3.90	$ 131,625.00
	26			DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES EN PISO 2	UND		$ 44,505.45		2.00	$ 89,010.90	2.00	$ 89,010.90
	27			DESMONTE DE VENTANAS INCLUIDO VIDRIOS EN PISO 2	UND		$ 34,615.35		12.00	$ 415,384.20	12.00	$ 415,384.20
	28			DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL EN PISO 2	M2		$ 79,966.14		236.77	$ 18,933,582.08	236.77	$ 18,933,582.08
	INP29			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO 70-44 CORREDIZAS PRINCIPALES E INTERNAS 1.6 X 2.0 M PISO 2	M2		$ 742,500.00		9.60	$ 7,128,000.00	9.60	$ 7,128,000.00
	INP30			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTRADA PRINCIPAL SEGUNDO PISO EN ALUMINIO DIM : 2,6 X 2,36 M, EN PERFILERIA DE 3"X 1 1/2.	UND		$ 4,050,000.00		1.00	$ 4,050,000.00	1.00	$ 4,050,000.00
	INP31			SUMINISTRO, INSTALACION Y ARMADO DE TABLERO ELECTRICO DE 18 CIRCUITOS BIFASICO PISO 1	UND		$ 742,500.00		2.00	$ 1,485,000.00	2.00	$ 1,485,000.00
	INP32			SUMINISTRO E INSTALACION DE TACOS DE 20AMP	UND		$ 47,250.00		18.00	$ 850,500.00	18.00	$ 850,500.00
	INP33			SUMINISTRO E INSTALACIO DE TACOS DE 30AMP	UND		$ 51,300.00		18.00	$ 923,400.00	18.00	$ 923,400.00
	INP34			TOMA CORRIENTE DE 220V	UND		$ 118,800.00		7.00	$ 831,600.00	7.00	$ 831,600.00
	INP35			TOMA CORRIENTE DE 110 V	UND		$ 47,250.00		38.00	$ 1,795,500.00	38.00	$ 1,795,500.00
	INP36			IMPERMIABILIZACION DE ZABALETA EN MANTO EDIL FRIO	ML		$ 121,500.00		25.07	$ 3,046,005.00	25.07	$ 3,046,005.00
	INP37			POLO A TIERRA CON 1 VARILLAS COPER WELL DE 1,5 M X 1/2" PISO 2	UND		$ 1,044,135.90		2.00	$ 2,088,271.80	2.00	$ 2,088,271.80
	INP38			RECONSTRUCCION DE ESCALERA, INCLUYE DEMOLICION DEL ACABADO EN GRANITO EXISTENTE, E INSTALACION DEL NUEVO ACABADO EN GRANITO FUNDIDO PULIDO EN SITIO	UND		$ 4,968,078.18		1.00	$ 4,968,078.18	1.00	$ 4,968,078.18
	INP39			DEMOLICION DE VIGA CANAL EXISTENTE EN CONCRETO REFORZADO	ML		$ 103,950.00		6.00	$ 623,700.00	6.00	$ 623,700.00
	INP40			PINTURA ROJO COLONIAL TIPO 1 EXTERIOR PARA CUBIERTE ETERNIT	M2		$ 27,923.58		173.00	$ 4,830,779.36	173.00	$ 4,830,779.36
	INP41			CONSTRUCCION DE FILETES	ML		$ 33,750.00		79.10	$ 2,669,625.00	79.10	$ 2,669,625.00
	INP42			RESANE DE GRIETAS (INCLUYE GANCHO DE AMARRE)	ML		$ 74,250.00		41.30	$ 3,066,525.00	41.30	$ 3,066,525.00
	43			TOTALIZADOR CON CAJA PISO 2	UND		$ 468,603.63		1.00	$ 468,603.63	1.00	$ 468,603.63
	INP44			SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO DE PUERTA DE 1X2M EN MADERA CEDRO Y HOJA EN LAMINA RH , INCLUYE CERRADURA, BIASAGRAS Y JAMBA EN AMBOS LADOS.	UND		$ 1,320,000.00		6.00	$ 7,920,000.00	6.00	$ 7,920,000.00
	INP45			SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO DE PUERTA DE 0.85 X2M EN MADERA CEDRO Y HOJA EN LAMINA RH , INCLUYE CERRADURA, BIASAGRAS Y JAMBA EN AMBOS LADOS.	UND		$ 1,240,000.00		2.00	$ 2,480,000.00	2.00	$ 2,480,000.00
	INP46			JUNTA DE DILATACION EN Z DE 11MM INCLUYE ACCESORIO	ML		$ 51,300.00		121.00	$ 6,207,300.00	121.00	$ 6,207,300.00
	INP 47			DEMOLICION DE PLACA LOSA E=12CM DE CONCRETO REFORZADO	M2		$ 47,250.00		1.90	$ 89,964.00	1.90	$ 89,964.00
				SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ FRIA	UND		$ 81,000.00		39.00	$ 3,159,000.00	39.00	$ 3,159,000.00
										$ 76,901,115.25		**$ 80,060,115.25**
								$ 279,219,051.07		**$ 14,273,756.49**		**$ 296,651,807.56**
									VALOR TOTAL OBRAS SEGUNDO PISO ACTUALIZADA			**$ 296,651,807.56**
				VALOR TOTAL CONTRATO INCLUYE AIU DEL 35%		**CONDICIONES ORIGINAL DEL CONTRATO**		**$ 529,128,650.63**	**VALOR TOTAL OBRAS PRIMER Y SEGUNDO PISO ACTUALIZADA**			**$ 529,128,650.62**

ING. YOSETH PULGAR IBARRA
R.L. CONSTRCUTORA P-F LTDA
CONTRATISTA DE OBRA

ING. JAVIER SANDOVAL PAEZ
INTERVENTOR EXTERNO

GUILLERMO GONZALEZ NAVARRO
SECRETARIO DE DESARROLLO TERRITORIAL
SUPERVISOR CONTRATO


ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	LEVANTE EN RAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	1.0	**PRELIMINARES PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	1.01	TRAZADO Y REPLANTEO PISO 1	**Unidad** M2	**Cantidad:**	80.00

UBICACIÓN	**CANT**		**AREA TOTAL DEL PROYECTO**				**TOTAL**
			LONGITUD (M)	**ANCHO PROM (M)**			
CARRERA 17B CON CALLE 11 ESQUINA	1.00						0.00
TOTAL							**-**

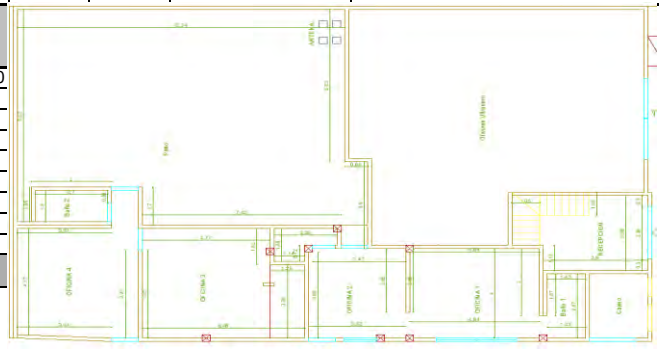

Observaciones:

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	1.0	**PRELIMINARES PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	1.02	CERRAMIENTO PERIMETRAL OBRA EN LONA VERDE PISO 1	**Unidad** ML	**Cantidad:**	47.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)			
CARRERA 17B	1.00		17.00				17.00
CALLE 11	1.00		30.00				30.00
TOTAL							**47.00**



OBSERVACIONES: LA CANTIDAD SUBIO 4 ML DEL VALOR CONTRACTUAL.


ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	2.0	**DEMOLICIONES PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	2.01	DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES E=0,15 M INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	**Unidad** M2	**Cantidad:**	49.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	CANT		
PISO 1							
PUERTA NUEVA ENTRE OF 1 Y 2	1.00		2.40	1.00			2.40
RECEP OF 2	1.00		2.40	1.20			2.88
PUERTA NUEVA OF 2	1.00		2.10	1.00			2.10
MARCO DE PUERTA OF 2	1.00		2.15	0.20			0.43
DEMOL CUCHILLAS ENTRE OF 3 Y 4	1.00		15.00	0.60			9.00
DEMOL CUCHILLAS ENTRE OF 3 Y 4	1.00		14.60	0.25			3.65
DEMOL CUCHILLAS ENTRE OF 3 Y 4	2.00		2.30	1.27			5.83
VENTANAS NUEVAS OFIC 1	1.00		3.00	1.20			3.6
OFIC 3	1.00		3.70	2.50			9.25
DEMOL CUCHILLA ENTRE OF 4	1.00		4.00	2.00			8.00
DEMOLICION MURO PARA PUERTA	1.00		1.38	1.00			1.38
0FIC 2	2.00		0.80	0.30			0.48
TOTAL							**49.00**

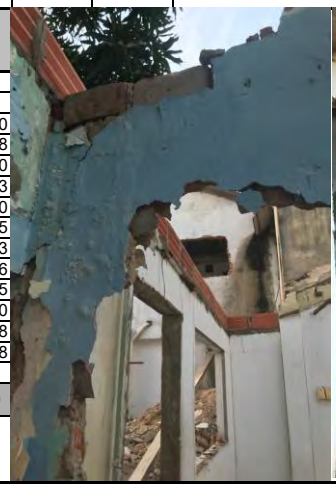



OBSERVACIONES: LA CANTIDAD SUBIO 14,0 M2 DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**2.0**	**DEMOLICIONES PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**2.02**	#¡REF!	**Unidad** M2	**Cantidad:**	109.83

UBICACIÓN	**CANT**		**AREA TOTAL DEL PROYECTO**				**TOTAL**
			LONGITUD (M)	**ANCHO PROM (M)**	**AREA**		
PISO 1							
OFICINA 1					19.24		19.24
OFICINA 2					15.51		15.51
OFICINA 3					27.65		27.65
OFICINA 4					23.84		23.84
RECEP					15.71		15.71
BAÑO 1					4.10		4.10
BAÑO 2					3.78		3.78
TOTAL							**109.83**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD BAJO 2,17 M2 DEL VALOR CONTRACTUAL.





ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION		
CAPITULO:	**2.0**	**DEMOLICIONES PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO		
ITEM:	**2.03**	#¡REF!	**Unidad**	M2	**Cantidad:**	123.10

UBICACIÓN	**CANT**		**AREA TOTAL DEL PROYECTO**				**TOTAL**
			LONGITUD (M)	**ANCHO PROM (M)**	**CANT**		
PISO 1							
CALLE 11			24.10	2.70			65.07
CARRERA 17B			10.00	5.80			58.03
TOTAL							**123.10**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD BAJO 12,90 M2 DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**2.0**	**DEMOLICIONES PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**2.04**	#¡REF!	**Unidad** UND	**Cantidad:**	2.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	CANT		
BAÑOS PISO 1	2.00				1.00		2.00
TOTAL							**2.00**



OBSERVACIONES: LA CANTIDAD BAJO 2 UND DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**2.0**	**DEMOLICIONES PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**2.05**	#¡REF!	**Unidad** UND	**Cantidad:**	7.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	ESPESOR (M)	CANT	
OFIC 1	1.00						1.00
OFIC 2	1.00						1.00
BAÑO OFIC 2	1.00						1.00
OFIC 3	2.00						2.00
OFIC 4	1.00						1.00
BAÑO OFIC 2	1.00						1.00
TOTAL							**7.00**



OBSERVACIONES: LA CANTIDAD BAJO 3 UND DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**2.0**	**DEMOLICIONES PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**2.06**	#¡REF!	**Unidad** UND	**Cantidad:**	62.38

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	ESPESOR (M)		
OFICINA 3 Y 4	1.00		9.38	5.90			55.34
BAÑO OFIC 4	1.00		3.20	2.20			7.04
TOTAL							**62.38**



OBSERVACIONES: LA CANTIDAD BAJO 110,62 M2 DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**2.0**	**DEMOLICIONES PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**2.07**	#¡REF!	**Unidad** M2	**Cantidad:**	46.00

UBICACIÓN	**CANT**		**AREA TOTAL DEL PROYECTO**				**TOTAL**
			LONGITUD (M)	**ANCHO PROM (M)**	**ESPESOR (M)**		
TOTAL							**-**

Nota: ver cartera topografica

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**3.0**	**#¡REF!**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**3.01**	#¡REF!	**Unidad** ML	**Cantidad:**	7.20

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ALTURA (M)	ESPESOR (M)	CANT	
OFICINA 3 PISO 1	1.00		7.20				7.20
TOTAL							**7.20**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD SUBIO 0,50 M2 DEL VALOR CONTRACTUAL.





ALCALDÍA DE GALAPA


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**3.0**	**#¡REF!**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**3.02**	#¡REF!	**Unidad** M2	**Cantidad:**	123.10

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ALTURA (M)	ESPESOR (M)	AREA	
CALLE 11			24.10	2.70			65.07
CARRERA 17B			10.00	5.80			58.03
TOTAL							**123.10**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD BAJO 12,90 M2 DEL VALOR CONTRACTUAL.

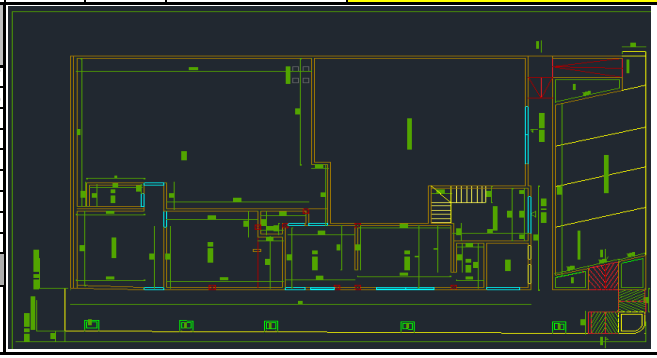

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**3.0**	**#¡REF!**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO
ITEM:	**3.03**	#¡REF!	**Unidad** M2	**Cantidad:** 109.83

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ESPESOR (M)	CANT	
PISO 1							
OFICINA 1	1.00					19.24	19.24
OFICINA 2	1.00					15.51	15.51
OFICINA 3	1.00					27.65	27.65
OFICINA 4	1.00					23.84	23.84
BAÑO 1	1.00					4.10	4.10
BAÑO 2	1.00					3.78	3.78
RECEPCION	1.00					15.71	15.71
TOTAL							**109.83**





OBSERVACIONES: LA CANTIDAD BAJO 2,17 M2 DEL VALOR CONTRACTUAL.


ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**3.0**	**#¡REF!**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**3.04**	#¡REF!	**Unidad** ML	**Cantidad:**	9.60

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ESPESOR (M)	CANT	
OFICINA 2	1.00		2.40				2.40
BAÑO OFIC 1	1.00		1.20				1.20
OFICINA 1	1.00		2.40				2.40
OFICINA 4	1.00		3.60				3.60
TOTAL							**9.60**

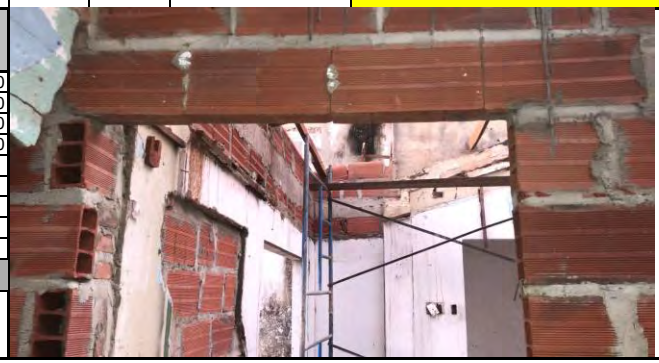

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD BAJO 22,40 ML DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**3.0**	**#¡REF!**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**3.05**	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=10CM REFORZADO CON VARILLAS DE 3/8" @ 30CM AMBOS SENTIDOS ZONA DE PARQUEADEROS EN PISO 1	**Unidad** M2	**Cantidad:**	60.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ESPESOR (M)	CANT	
CRA 17B	1.00		10.98	5.46			60.00
TOTAL							**60.00**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD ES LLEVADA A CERO.

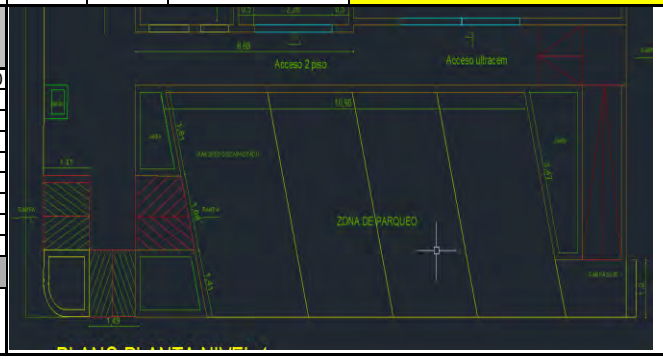

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**3.0**	**#¡REF!**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**3.06**	VIGA DE CIMIENTO DE 0,2 X 0,20 M EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI 4VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20CM EN PISO 1	**Unidad** ML	**Cantidad:**	0.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	ML	
PISO 1						36.70	36.70
TOTAL							**36.70**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD CONTRACTUAL ES LLEVADA A CERO.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**4.0**	**#¡REF!**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**4.01**	EXCAVACION MANUAL Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE EN PISO 1	**Unidad** M3	**Cantidad:**	40.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	CANT	
TOTAL							**-**


ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**4.0**	**#¡REF!**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**4.02**	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PM EN PISO 1	**Unidad** M3	**Cantidad:**	56.13

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	AREA	
OFICINA 1					0.25	19.24	4.81
OFICINA 2					0.25	15.51	3.88
OFICINA 3					0.25	27.65	6.91
OFICINA 4					0.25	23.84	5.96
RECEP					0.25	15.71	3.93
BAÑO 1					0.25	4.10	1.03
BAÑO 2					0.25	3.78	0.95
PATIO					0.25	114.13	28.67
TOTAL							**56.13**

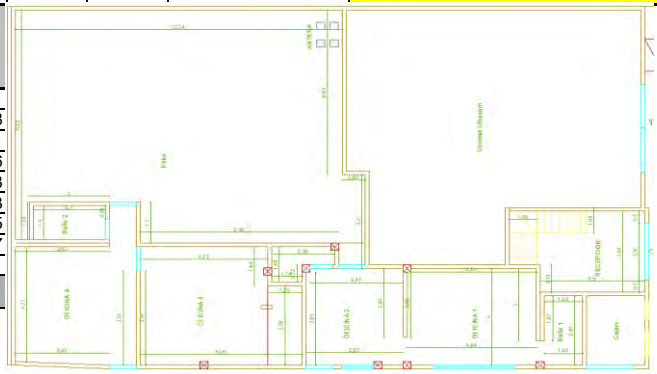

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD SUBIO A 26,13 M3 DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**4.0**	**#¡REF!**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**4.03**	BASE EN SUELO CEMENTO E=15CM RELACION 1:10 EN PISO 1	**Unidad** M3	**Cantidad:**	0.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	CANT	
PISO 1							9.45
TOTAL							**9.45**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD CONTRACTUAL ES LLEVADA A CERO.


ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	**ETAPA**	EN EJECUCION
CAPITULO:	**4.0** **#¡REF!**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO
ITEM:	**4.04** SUMINISTRO DE ARENA NEGRA EN PISO 1	**Unidad** M3	**Cantidad:** 2.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	AREA	
JARDINERAS EXTERIORES					0.40	5.00	2.00
TOTAL							**2.00**

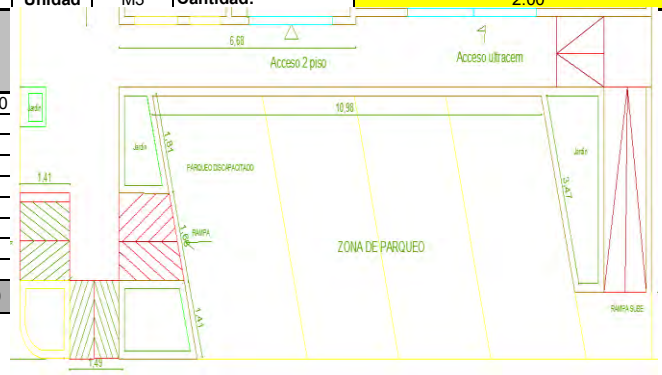

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD BAJO A 2,00 M3 DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**5.0**	**MAMPOSTERIA PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**5.01**	LEVANTE EN BLOCK SAMO N° 4 EN PISO 1	**Unidad**	M2	**Cantidad:** 49.31

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	ESPESOR (M)	CANT	
PISO 1							
OFICINA 1 - LEVANTE MURO VENTANA EXISTENTE	1.00		3.00	2.28			6.84
OFICINA 2 - LEVANTE MURO PURTA EXISTENTE	1.00		2.10	1.00			2.10
OFIC 3 Y 4 - LEVANTE MURO PARA CUCHILLAS	1.00		18.80	0.60			11.28
OFIC 4	1.00		4.00	2.00			8.00
OFIC 4	1.00		3.00	2.30			6.91
OFIC 4 - LEVANTE MURO PARA CUCHILLAS	1.00		13.80	0.60			8.28
OFICINA 3 - LEVANTE MURO PUERTA EXISTENTE	1.00		2.10	1.00			2.10
OFIC 4 - LEVANTE MURO PARA CUCHILLAS	1.00		3.00	1.27			3.80
TOTAL							**49.31**



OBSERVACIONES: LA CANTIDAD SUBIO 8,55 M2 DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**5.0**	**MAMPOSTERIA PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**5.02**	PAÑETE EN MORTERO RELACION 1:4 E: 0.02 EN PISO 1	**Unidad** M2	**Cantidad:**	104.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	ESPESOR (M)	CANT	
OFIC 4 - LEVANTE MURO PARA CUCHILLAS	1.00		13.80	1.00			13.80
OFICINA 3 - LEVANTE MURO PUERTA EXISTENTE	1.00		2.10	1.00			2.10
OFIC 4 - LEVANTE MURO PARA CUCHILLAS	1.00		3.00	1.27			3.80
OFICINA 1 - LEVANTE MURO VENTANA EXISTENTE	1.00		3.00	2.28			6.84
OFICINA 2 - LEVANTE MURO PURTA EXISTENTE	1.00		2.10	1.00			2.10
OFIC 3 Y 4 - LEVANTE MURO PARA CUCHILLAS	1.00		18.80	1.00			18.80
OFIC 1 - SELLO PUERTA BAÑO	1.00		2.10	0.85			1.79
OFIC 4 - PROLONGACION MURO	1.00		4.60	3.00			13.80
OFIC 4 - LEVANTE MURO PARA CUCHILLAS	1.00		4.53	1.20			5.44
OFIC 3 - LEVANTE MURO PARA CUCHILLAS	1.00		6.06	1.20			7.27
BAÑO 1	1.00		8.12	2.20			17.86
BAÑO 2	1.00		4.73	2.20			10.41
TOTAL							**104.00**



OBSERVACIONES: LA CANTIDAD BAJO 17,72 M2 DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**6.0**	**ACABADOS PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**6.01**	ESCARIFICACION DE PARED Y LOSA EN PISO 1	**Unidad** M2	**Cantidad:**	506.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	CANT	
TOTAL							**-**

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**6.0**	**ACABADOS PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**6.02**	ESTUCO EN PULYPLAS PARA MURO Y CIELO A TRES MANOS EN PISO 1	**Unidad** M2	**Cantidad:**	506.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	CANT	
TOTAL							**-**

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**6.0**	**ACABADOS PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**6.03**	PINTURA EN VINILO TIPO 1 A TRES MANOS EN PISO 1	**Unidad** M2	**Cantidad:**	506.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	CANT	
TOTAL							**-**

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**6.0**	**ACABADOS PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**6.04**	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DRYWAL, INCLUYE ACABADO PINTADO A 3 MANOS EN PISO 1	**Unidad** M2	**Cantidad:**	60.31

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	AREA	
OFICINA 3	1.00					26.00	26.00
OFICINA 4	1.00					23.83	23.83
BAÑO OFICINA 4	1.00					3.78	3.78
BAÑO OFICINA 1	1.00					4.10	4.10
BAÑO OFICINA 2	1.00					2.60	2.60
TOTAL							**60.31**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD BAJO 14,69 M2 DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**7.0**	**PISOS - PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**7.01**	PISO EN BALDOSA EN PORCELANATO 0.6 X 0.6 EN PISO 1	**Unidad** M2	**Cantidad:**	101.95

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	AREA	
OFICINA 1	1.00					19.24	19.24
OFICINA 2	1.00					15.51	15.51
OFICINA 3	1.00					27.65	27.65
OFICINA 4	1.00					23.84	23.84
RECEPCION	1.00					15.71	15.71
TOTAL							**101.95**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD BAJO 10,05 M2 DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**7.0**	**PISOS - PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**7.02**	PISO EN CERAMICA TRAFICO PESADO ANTIDESLIZANTE BAÑO EN PISO 1	**Unidad** M2	**Cantidad:**	12.18

UBICACIÓN	**CANT**		**AREA TOTAL DEL PROYECTO**				**TOTAL**
			LONGITUD (M)	**ANCHO PROM (M)**	**ESPESOR (M)**	**CANT**	
TOTAL							**-**


ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**7.0**	**PISOS - PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**7.03**	ZOCALOS EN PISO 1	**Unidad** ML	**Cantidad:**	84.82

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	CANT	
OFICINA 1	1.00		15.68				15.68
OFICINA 2	1.00		13.81				13.81
OFICINA 3	1.00		21.24				21.24
OFICINA 4	1.00		19.59				19.59
RECEPCION	1.00		14.50				14.50
TOTAL							**84.82**

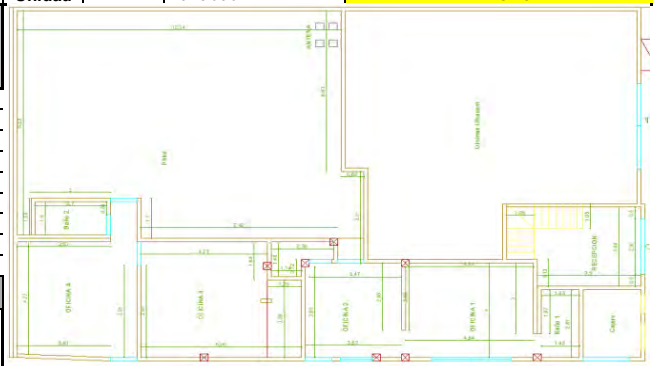

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD BAJO 165,18 ML DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**7.0**	**PISOS - PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**7.04**	ENCHAPE PARED BAÑO EN PISO 1	**Unidad** M2	**Cantidad:**	54.50

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	ESPESOR (M)	CANT	
BAÑO 1			7.75	2.35			18.21
BAÑO 2			7.85	2.35			18.45
BAÑO 3			7.59	2.35			17.84
TOTAL							**54.50**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD BAJO 13,50 ML DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**		EN EJECUCION	
CAPITULO:	**7.0**	**PISOS - PISO 1**	**MUNICIPIO**		GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**7.05**	PISO EN TABLETA GRES DE 0,3X0,3 PARA ZONAS EXTERIORES EN PISO 1	**Unidad**	M2	**Cantidad:**	0.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	ESPESOR (M)	CANT	
CALLE 11			24.10	2.70			65.07
CARRERA 17B			12.22	5.80			70.93
TOTAL							**136.00**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD CONTRACTUAL ES LLEVADA A CERO.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**8.0**	**CUBIERTA - PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**8.01**	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA PERFIL 7, INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA ABARCO EN PISO 1	**Unidad** M2	**Cantidad:**	75.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	CANT	
TOTAL							**-**

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**9.0**	**CARPINTERIA - PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**9.01**	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA DE 1.0 X 2 EN PISO 1	**Unidad** UND	**Cantidad:**	0.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	CANT	
OFICINA 4	2.00						2.00
OFICINA 3	2.00						2.00
OFICINA 2	1.00						1.00
OFICINA 1	1.00						1.00
TOTAL							**6.00**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD SUBIO 5 UND DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**9.0**	**CARPINTERIA - PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**9.02**	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PARA BAÑO 0.85 X 2.0 EN PISO 1	**Unidad** UND	**Cantidad:**	3.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	CANT	
PISO 1	3.00						3.00
TOTAL							**3.00**

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**9.0**	**CARPINTERIA - PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**9.03**	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PRINCIPALES 1.2 X 2.0 EN PISO 1	**Unidad** UND	**Cantidad:**	0.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	CANT	
PISO 1	3.00						3.00
TOTAL							**3.00**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD CONTRACTUAL ES LLEVADA A CERO.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**9.0**	**CARPINTERIA - PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**9.04**	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA METALICA EN ALUMINIO 70-44 EN PISO 1	**Unidad** M2	**Cantidad:**	6.32

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	CANT	
PISO 1	3.00		2.11	1.00			6.32
6.32							
TOTAL							**6.32**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD BAJO 7,68 M2 DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**9.0**	**CARPINTERIA - PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**9.05**	SUMINISTRO EN INSTALACION DE PROTECTOR EM VARILLA CUADRADA DE 1/2" EN PISO 1	**Unidad** M2	**Cantidad:**	0.00

UBICACIÓN	**CANT**		**AREA TOTAL DEL PROYECTO**				**TOTAL**
			LONGITUD (M)	**CANTIDAD POR ML (KG)**	**ESPESOR (M)**	**CANT**	
PISO 1	14.00						14.00
TOTAL							**14.00**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD CONTRACTUAL ES LLEVADA A CERO.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**9.0**	**CARPINTERIA - PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**9.06**	SUMINISTRO DE BARANDA EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" Y 1 1/2" Y VIDRIO DE SEGURIDAD PARA PASAMANO ESCALERA EN PISO 1	**Unidad** M2	**Cantidad:**	4.30

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	ESPESOR (M)	CANT	
PISO 1 REECEPCION			2.00	2.15			4.30
4.3							
TOTAL							**4.30**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD SUBE 1,0 M2 DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**10.0**	**INSTALACIONES SANITARIAS - PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**10.01**	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS EN PISO 1	**Unidad** UND	**Cantidad:**	3.00

UBICACIÓN	**CANT**		**AREA TOTAL DEL PROYECTO**				**TOTAL**
			LONGITUD (M)	**CANTIDAD POR ML (KG)**	**ESPESOR (M)**	**CANT**	
TOTAL							**-**

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**10.0**	**INSTALACIONES SANITARIAS - PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**10.02**	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS EN PISO 1	**Unidad** UND	**Cantidad:**	3.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	CANT	
BAÑO 1	1.00						1.00
BAÑO 2	1.00						1.00
BAÑO 3	1.00						1.00
TOTAL							**3.00**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD SUBE 1,0 UND DEL VALOR CONTRACTUAL.


ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION
CAPITULO:	**10.0**	**INSTALACIONES SANITARIAS - PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO
ITEM:	**10.03**	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS EN PISO 1	**Unidad** UND	**Cantidad:** 3.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	CANT	
BAÑO 1	1.00						1.00
BAÑO 2	1.00						1.00
BAÑO 3	1.00						1.00
TOTAL							**3.00**

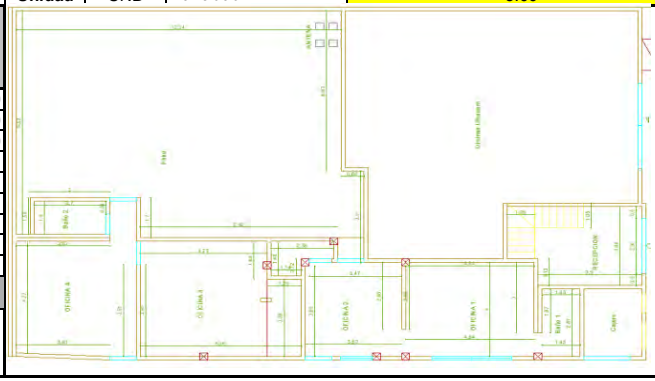

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD SUBE 2,0 UND DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**10.0**	**INSTALACIONES SANITARIAS - PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**10.04**	PUNTO SANITARIO PVC 3" EN PISO 1	**Unidad** UND	**Cantidad:**	3.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	CANT	
TOTAL							**-**

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**10.0**	**INSTALACIONES SANITARIAS - PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**10.05**	PUNTO SANITARIO PVC 2" EN PISO 1	**Unidad** UND	**Cantidad:**	9.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	CANT	
TOTAL							**-**

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**10.0**	**INSTALACIONES SANITARIAS - PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**10.06**	REDES DE TUBERIA SANITARIA PVC 3" (INCLUYE ACCESORIO) EN PISO 1	**Unidad** ML	**Cantidad:**	32.70

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	CANT	
BAÑO 1	10.80						10.80
BAÑO 2	11.50						11.50
BAÑO 3	10.40						10.40
32.7							
TOTAL							**32.70**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD BAJO 12,30 ML DEL VALOR CONTRACTUAL.



ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**10.0**	**INSTALACIONES SANITARIAS - PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**10.07**	REDES DE TUBERIA SANITARIA PVC 2"(INCLUYE ACCESORIO) EN PISO 1	**Unidad** ML	**Cantidad:**	10.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	CANT	
BAÑO 1	3.33						3.33
BAÑO 2	3.33						3.33
BAÑO 3	3.33						3.33
TOTAL							**10.00**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD BAJO 30 ML DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**10.0**	**INSTALACIONES SANITARIAS - PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**10.08**	REGISTRO SANITARIO DE INSPECCION EN LADRILLO COMUN (0,45X0,45) EN PISO 1	**Unidad** UND	**Cantidad:**	5.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	CANT	
TOTAL							**5.00**

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**10.0**	**INSTALACIONES SANITARIAS - PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**10.09**	PUNTO DE AGUA POTABLE PVC 1/2" EN PISO 1	**Unidad** UND	**Cantidad:**	12.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	CANT	
BAÑO 1	3.00						3.00
BAÑO 2	3.00						3.00
BAÑO 3	3.00						3.00
PATIO	3.00						3.00
TOTAL							**12.00**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD SUBIO 3 UND DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**10.0**	**INSTALACIONES SANITARIAS - PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**10.10**	REDES DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" (INLCUYE ACCESORIOS) EN PISO 1	**Unidad** ML	**Cantidad:**	58.30

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	CANT	
OFICINAS 1			12.00				12.00
OFICINAS 2			8.00				8.00
OFICINAS 3			11.00				11.00
OFICINAS 4			14.00				14.00
PATIO			13.30				13.30
TOTAL							**58.30**



OBSERVACIONES: LA CANTIDAD SUBIO 8,30 ML DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**11.0**	**INSTALACIONES ELECTRICAS - PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**11.01**	SALIDA TOMACORRIENTE 110 VOLTIOS PISO 1	**Unidad** UND	**Cantidad:**	24.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	CANT	
TOTAL							**-**

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**11.0**	**INSTALACIONES ELECTRICAS - PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**11.02**	SALIDA TOMACORRIENTE 220 VOLTIOS (AIRE ACONDICIONADO) PISO 1	**Unidad** UND	**Cantidad:**	4.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	CANT	
OFICINA 1	1.00						1.00
OFICINA 2	1.00						1.00
OFICINA 3	1.00						1.00
OFICINA 4	1.00						1.00
TOTAL							**4.00**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD BAJO 4,0 UND DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**11.0**	**INSTALACIONES ELECTRICAS - PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**11.03**	SALIDA PARA SWITCHE SENCILLO PISO 1	**Unidad** UND	**Cantidad:**	5.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	CANT	
OFICINA 1	1.00						1.00
OFICINA 2	1.00						1.00
OFICINA 3	1.00						1.00
OFICINA 4	1.00						1.00
RECEPCION	1.00						1.00
TOTAL							**5.00**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD SUBIO 2,0 UND DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**11.0**	**INSTALACIONES ELECTRICAS - PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**11.04**	SALIDA PARA SWITCHE DOBLE PISO 1	**Unidad** UND	**Cantidad:**	3.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	CANT	
OFICINA 1	1.00						1.00
OFICINA 2	1.00						1.00
OFICINA 3	1.00						1.00
TOTAL							**3.00**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD BAJO 3,0 UND DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**11.0**	**INSTALACIONES ELECTRICAS - PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**11.05**	ACOMETIDA PARCIAL EN TUBERIA PVC DE 3/4" ALAMBRE AISLADO (TRES LINEAS N° 8) AWG THHN. N° 12 AWG. (THHN) PISO 1	**Unidad** ML	**Cantidad:**	0.00

UBICACIÓN	**CANT**		**AREA TOTAL DEL PROYECTO**				**TOTAL**
			LONGITUD (M)	**CANTIDAD POR ML (KG)**	**ESPESOR (M)**	**CANT**	
PISO 1			80.00				80.00
TOTAL							**80.00**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD CONTRACTUAL ES LLEVADA A CERO.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**11.0**	**INSTALACIONES ELECTRICAS - PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**11.06**	INTERRUPTOR DOBLE PISO 1	**Unidad** UND	**Cantidad:**	3.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	CANT	
OFICINA 2	1.00						1.00
OFICINA 3	1.00						1.00
OFICINA 4	1.00						1.00
TOTAL							**3.00**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD BAJO 3,0 UND DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**11.0**	**INSTALACIONES ELECTRICAS - PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**11.07**	INTERRUPTOR SENCILLO PISO 1	**Unidad** UND	**Cantidad:**	5.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	CANT	
OFICINA 1	1.00						1.00
OFICINA 2	1.00						1.00
OFICINA 3	1.00						1.00
OFICINA 4	1.00						1.00
RECEPCION	1.00						1.00
TOTAL							**5.00**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD SUBIO 2,0 UND DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**11.0**	**INSTALACIONES ELECTRICAS - PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**11.08**	SALIDA PARA LAMPARA LED 60 W PISO 1	**Unidad** UND	**Cantidad:**	20.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	CANT	
TOTAL							**-**

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**11.0**	**INSTALACIONES ELECTRICAS - PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**11.09**	TABLERO ELECTRICO DE 12 CIRCUITOS PISO 1	**Unidad** UND	**Cantidad:**	1.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	CANT	
OFICINA 2	1.00						1.00
TOTAL							**1.00**



OBSERVACIONES: LA CANTIDAD SUBIO 2,0 UND DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**11.0**	**INSTALACIONES ELECTRICAS - PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**11.10**	TOTALIZADOR CON CAJA PISO 1	**Unidad** UND	**Cantidad:**	1.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	CANT	
TOTAL							**-**

#¡DESCONOCIDO!		**REPUBLICA DE COLOMBIA** **DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO** **MUNICIPIO DE GALAPA**							
		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA							
NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.						**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**11.0**	**INSTALACIONES ELECTRICAS - PISO 1**					**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**11.11**	MALLA A TIERRA CON 3 VARILLAS COPER WELL DE 1,8 M X 5/8" PISO 1					**Unidad** UND	**Cantidad:**	0.00

UBICACIÓN	**CANT**		**AREA TOTAL DEL PROYECTO**				**TOTAL**
			LONGITUD (M)	**CANTIDAD POR ML (KG)**	**ESPESOR (M)**	**CANT**	
PISO 1	1.00						1.00
TOTAL							**1.00**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD CONTRACTUAL ES LLEVADA A CERO.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.			**ETAPA**		EN EJECUCION	
CAPITULO:	12.0	**PRELIMINARES PISO 2**		**MUNICIPIO**		GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	12.01	Trazado y Replanteo En Piso 2		**Unidad**	M2	**Cantidad:**	113.43

UBICACIÓN	**CANT**		**AREA TOTAL DEL PROYECTO**				**TOTAL**
			LONGITUD (M)	**ANCHO PROM (M)**			
							0.00
TOTAL							**-**

Observaciones: Todas las cantidades fueron aproximadas a la unidad. Lo consolidado en el presente cuadro de cantidades se obtuvo de los planos anexos de los componentes topograficos e hidraulicos

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	13.0	**DEMOLICIONES PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	13.01	DEMOLICION DE PISO Y PLANTILLA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL EN PISO 2	**Unidad** M2	**Cantidad:**	131.34

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA		
OFICINAS 1					16.76		16.76
OFICINAS 2					15.62		15.62
OFICINAS 3					17.91		17.91
OFICINAS 4					16.70		16.70
OFICINAS 5					19.44		19.44
OFICINAS 6					11.24		11.24
OFICINAS 7					8.80		8.80
BAÑO 1					3.33		3.33
BAÑO 2					1.94		1.94
HOLL					6.23		6.23
BALCON					13.37		13.37
TOTAL							**131.34**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD SUBIO 17,91 M2 DEL VALOR CONTRACTUAL.



ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	14.0	**CIMENTACION Y ESTRUCTURA PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	14.01	PLANTILLA DE NIVELACION EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,05M INCLUYE REFUERZO EN VARILLA DE 1/4" CADA 40CM EN PISO 2	**Unidad** M2	**Cantidad:**	131.34

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA		
OFICINAS 1					16.76		16.76
OFICINAS 2					15.62		15.62
OFICINAS 3					17.91		17.91
OFICINAS 4					16.70		16.70
OFICINAS 5					19.44		19.44
OFICINAS 6					11.24		11.24
OFICINAS 7					8.80		8.80
BAÑO 1					3.33		3.33
BAÑO 2					1.94		1.94
HOLL					6.23		6.23
BALCON					13.37		13.37
TOTAL							**131.34**



OBSERVACIONES: LA CANTIDAD SUBIO 19,34 M2 DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	14.0	**CIMENTACION Y ESTRUCTURA PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	14.02	DINTELES DE 0,15X 0,2 M EN PISO 2	**Unidad** ML	**Cantidad:**	15.00

UBICACIÓN	**CANT**		**AREA TOTAL DEL PROYECTO**				**TOTAL**
			LONGITUD (M)	**ANCHO PROM (M)**	**CANT**		
OFICINA 1			1.20				1.20
OFICINA 2			1.50				1.50
OFICINA 3 - VENTANA VUEVA			3.00				3.00
OFICINA 4 - VENTANA			3.00				3.00
OFICINA 5 - PUERTA Y VENTANAS			3.00				3.00
OFICINA 6			1.20				1.20
OFICINA 7 - PUERTA NUEVA + VENTANA			2.10				2.10
							0.00
TOTAL							**15.00**

#¡DESCONOCIDO!

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD SUBIO 0,70 M2 DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.			**ETAPA**		EN EJECUCION	
CAPITULO:	14.0	**CIMENTACION Y ESTRUCTURA PISO 2**		**MUNICIPIO**		GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	14.03	VIGA DE AMARRE PARA REALCE Y CONFINAMIENTO DE MUROS DE 0,15 X 0,25 M REFORZADA CON DOS VARILLAS DE 3/8 Y GANCHOS DE 1/4 @ 20CM EN PISO 2		**Unidad**	ML	**Cantidad:**	97.76

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	CANT		
OFICINA 1			17.00				17.00
OFICINA 2			11.59				11.59
OFICINA 3			12.50				12.50
OFICINA 4			13.85				13.85
OFICINA 5			11.66				11.66
OFICINA 6			9.60				9.60
OFICINA 7			12.00				12.00
HOLL			9.56				9.56
TOTAL							**97.76**

#¡DESCONOCIDO!

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD BAJO 97,74 ML DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	15.0	**MAMPOSTERIA PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	15.01	LEVANTE EN BLOCK SAMO N° 4 EN PISO 2	**Unidad** M2	**Cantidad:**	77.82

UBICACIÓN	CANT	AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	CANT	
OFICINA 1 - MURO NUEVO	1.00		1.50	1.00		1.50
OFICINA 1 - REDUCIR ANCHO EN PUERTA	1.00		2.10	0.40		0.84
OFICINA 2 - BAÑO NUEVO	1.00		4.18	2.70		11.29
OFICINA 2 - CIERRE DE VENTANA	1.00		1.80	1.20		2.16
OFICINA 2 - LEVANTE EN BUITRON	1.00		1.30	1.00		1.30
OFICINA 2 - NUEVA DISTRIBUCION	1.00		2.70	1.04		2.81
OFICINA 2 - LEVANTE EN L	1.00		2.70	0.60		1.62
OFICINA 3 - CIERRE DE VENTANA	1.00		1.20	1.00		1.20
OFICINA 3 - CIERRE DE PUERTA	1.00		2.10	1.00		2.10
OFICINA 5 - CIERRE DE VENTANA	1.00		1.85	1.20		2.22
OFICINA 5 - CIERRE AIRE ACONDICIONADO	1.00		0.90	0.60		0.54
OFICINA 5 - CIERRE DE PUERTA	1.00		2.10	1.20		2.52
OFICINA 6 - CIERRE VENTANA	1.00		1.60	1.03		1.65
CIERRE PUERTA ENTRE OF 6 Y 7.	1.00		2.10	0.80		1.68
OFICINA 7 - PARA MARCO DE PUERTA BAÑO	1.00		2.70	0.30		0.81
CONSTRUCCION DE CUCHILLAS	3.00		4.20	1.40		17.64
CONSTRUCCION DE CUCHILLAS	3.00		4.36	1.20		15.75
CONSTRUCCION DE CUCHILLAS	2.00		4.25	1.20		10.20
TOTAL						**77.82**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD SUBIO 62,82 M2 DEL VALOR CONTRACTUAL.





ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	15.0	**MAMPOSTERIA PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	15.02	PAÑETE EN MORTERO RELACION 1:4 E: 0.02 EN PISO 2	**Unidad** M2	**Cantidad:**	195.02

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	CANT		
OFICINA 1 - MURO NUEVO	1.00		1.50	1.00			1.50
OFICINA 1 - REDUCIR ANCHO EN PUERTA	1.00		2.10	0.40			0.84
OFICINA 2 - BAÑO NUEVO	1.00		4.18	2.70			11.29
OFICINA 2 - CIERRE DE VENTANA	1.00		1.80	1.20			2.16
OFICINA 2 - LEVANTE EN BUITRON	1.00		1.30	1.00			1.30
OFICINA 2 - NUEVA DISTRIBUCION	1.00		2.70	1.50			4.05
OFICINA 2 - LEVANTE EN L	1.00		2.70	0.60			1.62
OFICINA 3 - CIERRE DE VENTANA	1.00		1.20	1.00			1.20
OFICINA 3 - CIERRE DE PUERTA	3.00		2.10	1.00			6.30
OFICINA 5 - CIERRE DE VENTANA	2.00		1.85	1.20			4.44
OFICINA 5 - CIERRE AIRE ACONDICIONADO	1.00		0.90	0.60			0.54
OFICINA 5 - CIERRE DE PUERTA	1.00		2.10	1.20			2.52
OFICINA 6 - CIERRE VENTANA	1.00		1.60	1.03			1.65
CIERRE PUERTA ENTRE OF 6 Y 7.	1.00		2.10	0.80			1.68
OFICINA 7 - PARA MARCO DE PUERTA BAÑO	1.00		2.70	0.30			0.81
CONSTRUCCION DE CUCHILLAS	3.00		4.20	1.40			17.64
CONSTRUCCION DE CUCHILLAS	3.00		4.36	1.40			18.31
CONSTRUCCION DE CUCHILLAS	3.00		4.25	1.40			17.85
OFICINA 2 - BAÑO MUROS INTERNOS	1.00		6.95	2.35			16.33
MUROS EXTERIORES OFICINAS 1-2	1.00		12.40	2.50			31.00
MUROS EXTERIORES OFICINAS 6-7	1.00		15.00	2.50			37.50
VENTANA OFICINA 2	1.00		1.50	1.00			1.50
BAÑO OFICINA 7	1.00		5.53	2.35			13.00
TOTAL							**195.02**



OBSERVACIONES: LA CANTIDAD SUBIO 165,02 M2 DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	16.0	**ACABADOS PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	16.01	ESCARIFICACION DE PARED Y LOSA EN PISO 2	**Unidad** M2	**Cantidad:**	600.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA		
OFICINA 1 - LOSA	1.00				16.76		16.76
OFICINA 2 - LOSA	1.00				15.62		15.62
OFICINA 3 - LOSA	1.00				17.91		17.91
OFICINA 4 - LOSA	1.00				16.70		16.70
OFICINA 5 - LOSA	1.00				19.44		19.44
OFICINA 6 - LOSA	1.00				11.24		11.24
OFICINA 7 - LOSA	1.00				8.80		8.80
BAÑO 1	1.00				3.33		3.33
BAÑO2	1.00				1.94		1.94
HOLL	1.00				6.23		6.23
BALCON	1.00				13.37		13.37
OFICINA 1 PARED	1.00		15.47	2.35			36.35
OFICINA 2 PARED	1.00		9.36	2.35			22.00
OFICINA 3 PARED	1.00		8.50	2.35			19.98
OFICINA 4 PARED	1.00		13.00	2.35			30.55
OFICINA 5 PARED	1.00		18.00	2.35			42.30
OFICINA 6 PARED	1.00		24.00	2.35			56.40
OFICINA 7 PARED	1.00		23.50	2.35			55.23
MUROS EXTERIORES OF 1 Y 2	1.00		18.00	3.44			61.92
MUROS EXTERIORES OF 6 Y 7	1.00		23.00	3.20			73.60
OFICINA 1 EXTERIORES	1.00		20.00	2.20			43.98
OFICINA 2 EXTERIORES	1.00		8.00	3.30			26.36
TOTAL							**600.00**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD BAJO 350,00 M2 DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	16.0	**ACABADOS PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	16.02	ESTUCO EN PULYPLAS PARA MURO Y CIELO A TRES MANOS EN PISO 2	**Unidad** M2	**Cantidad:**	590.09

UBICACIÓN	**CANT**		**AREA TOTAL DEL PROYECTO**				**TOTAL**
			LONGITUD (M)	**ANCHO PROM (M)**	**AREA**		
OFICINA 1	1.00				70.00		70.00
OFICINA 2	1.00				82.00		82.00
OFICINA 3	1.00				75.00		75.00
OFICINA 4	1.00				89.00		89.00
OFICINA 5	1.00				78.00		78.00
OFICINA 6	1.00				88.00		88.00
OFICINA 7	1.00				87.59		87.59
EXTERIOR CARRERA 17B	1.00				15.00		15.00
EXTERIOR CALLE 11	1.00				5.50		5.50
612.84							
TOTAL							**590.09**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD BAJO 359,91 M2 DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	16.0	**ACABADOS PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	16.03	PINTURA EN VINILO TIPO 1 A TRES MANOS EN PISO 2	**Unidad** M2	**Cantidad:**	600.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	CANT		
OFICINA 1 PARED	1.00		15.47	2.35			36.35
OFICINA 2 PARED	1.00		10.15	2.35			23.85
OFICINA 3 PARED	1.00		12.00	2.35			28.20
OFICINA 4 PARED	1.00		13.00	2.35			30.55
OFICINA 5 PARED	1.00		14.00	2.35			32.90
OFICINA 6 PARED	1.00		15.00	2.35			35.25
OFICINA 7 PARED	1.00		18.00	2.35			42.30
MUROS EXTERIORES OF 1 Y 2	1.00		16.00	3.50			56.00
MUROS EXTERIORES OF 6 Y 7	1.00		19.00	3.50			66.50
OFICINA 1 EXTERIORES	1.00		18.00	2.20			39.58
OFICINA 2 EXTERIORES	1.00		12.00	3.30			39.60
OFICINA 3 EXTERIORES	1.00		12.00	3.15			37.80
OFICINA 4 EXTERIORES	1.00		14.00	2.35			32.89
FACHADA CARRERA 17B	1.00		17.00	2.35			39.93
FACHADA CALLE 11	1.00		25.00	2.33			58.29
TOTAL							**600.00**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD BAJO 350,00 M2 DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	16.0	**ACABADOS PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	16.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DRYWAL, INCLUYE ACABADO PINTADO A 3 MANOS EN PISO 2	**Unidad** M2	**Cantidad:**	131.34

UBICACIÓN	**CANT**		**AREA TOTAL DEL PROYECTO**				**TOTAL**
			LONGITUD (M)	**ANCHO PROM (M)**	**AREA**		
OFICINAS 1					16.76		16.76
OFICINAS 2					15.62		15.62
OFICINAS 3					17.91		17.91
OFICINAS 4					16.70		16.70
OFICINAS 5					19.44		19.44
OFICINAS 6					11.24		11.24
OFICINAS 7					8.80		8.80
BAÑO 1					3.33		3.33
BAÑO 2					1.94		1.94
HOLL					6.23		6.23
BALCON					13.37		13.37
TOTAL							**131.34**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD BAJO 12,09 M2 DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	17.0	**PISOS - PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	17.01	PISO EN BALDOSA EN PORCELANATO 0.6 X 0.6 EN PISO 2	**Unidad** M2	**Cantidad:**	127.87

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA		
OFICINAS 1					16.76		16.76
OFICINAS 2					15.62		15.62
OFICINAS 3					17.91		17.91
OFICINAS 4					16.70		16.70
OFICINAS 5					19.44		19.44
OFICINAS 6					11.24		11.24
OFICINAS 7					8.80		8.80
HOLL					6.23		6.23
BALCON					13.37		13.37
TOTAL							**126.07**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD BAJO 1,80 M2 DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	17.0	**PISOS - PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	17.02	PISO EN CERAMICA TRAFICO PESADO ANTIDESLIZANTE BAÑO EN PISO 2	**Unidad** M2	**Cantidad:**	5.27

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA		
BAÑO 1	1.00				3.33		3.33
BAÑO 2	1.00				1.94		1.94
TOTAL							**5.27**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD BAJO 1,80 M2 DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	17.0	**PISOS - PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	17.03	ZOCALOS EN PISO 2	**Unidad** ML	**Cantidad:**	121.89

UBICACIÓN	**CANT**		**AREA TOTAL DEL PROYECTO**				**TOTAL**
			LONGITUD (M)	**ANCHO PROM (M)**	**CANT**		
OFICINAS 1			15.47				15.47
OFICINAS 2			14.80				14.80
OFICINAS 3			15.29				15.29
OFICINAS 4			13.66				13.66
OFICINAS 5			16.99				16.99
OFICINAS 6			12.73				12.73
OFICINAS 7			11.45				11.45
HOLL			8.87				8.87
BALCON			12.63				12.63
TOTAL							**121.89**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD BAJO 28,11 ML DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	17.0	**CUBIERTA - PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	17.04	ENCHAPE PARED BAÑO EN PISO 2	**Unidad** M2	**Cantidad:**	27.33

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA		
BAÑO 1					16.69		16.69
BAÑO 2					10.65		10.65
TOTAL							**27.33**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD BAJO 1,27 M2 DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.			**ETAPA**		EN EJECUCION	
CAPITULO:	18.0	**CUBIERTA - PISO 2**		**MUNICIPIO**		GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	18.02	IMPERMEABILIZACION EN MANTO EDIL DE 4MM PARA LOSA TANQUE, LOSA LIBRE Y ZABALETAS EN PISO 2		**Unidad**	M2	**Cantidad:**	40.00

UBICACIÓN	**CANT**		**AREA TOTAL DEL PROYECTO**				**TOTAL**
			LONGITUD (M)	**ANCHO PROM (M)**	**CANT**		
							0.00
TOTAL							**-**

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	18.0	**CUBIERTA - PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	18.03	ZABALETA EN BLOQUE VIBROPRENSADO No.4 EN PISO 2	**Unidad** ML	**Cantidad:**	24.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	CANT		
TOTAL							**-**

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	19.0	**CARPINTERIA - PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	19.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA DE 1.0 X 2.0 PISO 2	**Unidad** UND	**Cantidad:**	0.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	CANT		
OFICINAS PISO 2	6.00						6.00
TOTAL							**6.00**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD CONTRACTUAL ES LLEVADA A CERO.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	19.0	**CARPINTERIA - PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	19.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PARA BAÑO 0.85 X 2.0 PISO 2	**Unidad** UND	**Cantidad:**	0.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	CANT		
BAÑO 1	1.00						1.00
BAÑO 2	1.00						1.00
TOTAL							**2.00**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD CONTRACTUAL ES LLEVADA A CERO.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	19.0	**CARPINTERIA - PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	19.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA CORREDIZAS PRINCIPALES 1.6 X 2.0 PISO 2	**Unidad** UND	**Cantidad:**	0.00

UBICACIÓN	**CANT**		**AREA TOTAL DEL PROYECTO**				**TOTAL**
			LONGITUD (M)	**ANCHO PROM (M)**	**CANT**		
OFICINA 2 - PISO 2	1.00						1.00
TOTAL							**1.00**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD CONTRACTUAL ES LLEVADA A CERO.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	19.0	**CARPINTERIA - PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	19.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PARA BAÑO 0.76 X 1,8 M PISO 2	**Unidad** UND	**Cantidad:**	0.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	CANT		
VENTANA PARA BAÑO	1.00						1.00
TOTAL							**1.00**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD CONTRACTUAL ES LLEVADA A CERO.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**		EN EJECUCION	
CAPITULO:	19.0	**CARPINTERIA - PISO 2**	**MUNICIPIO**		GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	19.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA METALICA EN ALUMINIO 70-44 PISO 2	**Unidad**	M2	**Cantidad:**	22.81

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA		
VENTANERIA OFICINAS 1 A LA 7	1.00				22.81		22.81
TOTAL							**22.81**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD SUBIO 2,23 M2 DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	19.0	**CARPINTERIA - PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	19.06	SUMINISTRO EN INSTALACION DE PROTECTOR EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" PISO 2	**Unidad** M2	**Cantidad:**	0.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA		
REJAS PARA VENTANERIA OFICINAS 1 A 7					21.00		21.00
TOTAL							**21.00**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD CONTRACTUAL ES LLEVADA A CERO.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	19.0	**CARPINTERIA - PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	19.07	SUMINISTRO DE BARANDA EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" Y 1 1/2" Y VIDRIO DE SEGURIDAD No. 10 PARA PASAMANO FACHADA PISO 2	**Unidad** M2	**Cantidad:**	16.05

UBICACIÓN	**CANT**		**AREA TOTAL DEL PROYECTO**				**TOTAL**
			LONGITUD (M)	**ANCHO PROM (M)**	**CANT**		
BALCON - BARANDA EN VIDRIO Y TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE			15.77				15.77
TOTAL							**15.77**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD BAJO 0,28 M2 DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	20.0	**INSTALACIONES SANITARIAS - PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	20.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS EN PISO 2	**Unidad** UND	**Cantidad:**	2.00

UBICACIÓN	**CANT**		**AREA TOTAL DEL PROYECTO**				**TOTAL**
			LONGITUD (M)	**ANCHO PROM (M)**	**CANT**		
TOTAL							**-**

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	20.0	**INSTALACIONES SANITARIAS - PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	20.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS EN PISO 2	**Unidad** UND	**Cantidad:**	2.00

UBICACIÓN	**CANT**		**AREA TOTAL DEL PROYECTO**				**TOTAL**
			LONGITUD (M)	**ANCHO PROM (M)**	**CANT**		
TOTAL							**-**

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	20.0	**INSTALACIONES SANITARIAS - PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	20.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES EN PISO 2	**Unidad** UND	**Cantidad:**	2.00

UBICACIÓN	**CANT**		**AREA TOTAL DEL PROYECTO**				**TOTAL**
			LONGITUD (M)	**ANCHO PROM (M)**	**CANT**		
TOTAL							**-**

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	20.0	**INSTALACIONES SANITARIAS - PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	20.04	PUNTO SANITARIO PVC 3" EN PISO 2	**Unidad** UND	**Cantidad:**	2.00

UBICACIÓN	**CANT**		**AREA TOTAL DEL PROYECTO**				**TOTAL**
			LONGITUD (M)	**ANCHO PROM (M)**	**CANT**		
TOTAL							**-**

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	20.0	**INSTALACIONES SANITARIAS - PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	20.05	PUNTO SANITARIO PVC 2" EN PISO 2	**Unidad** UND	**Cantidad:**	6.00

UBICACIÓN	**CANT**		**AREA TOTAL DEL PROYECTO**				**TOTAL**
			LONGITUD (M)	**ANCHO PROM (M)**	**CANT**		
TOTAL							**-**

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	20.0	**INSTALACIONES SANITARIAS - PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	20.06	REDES DE TUBERIA SANITARIA PVC 3" (INCLUYE ACCESORIO) EN PISO 2	**Unidad** ML	**Cantidad:**	5.00

UBICACIÓN	**CANT**		**AREA TOTAL DEL PROYECTO**				**TOTAL**
			LONGITUD (M)	**ANCHO PROM (M)**	**CANT**		
TOTAL							**-**

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	20.0	**INSTALACIONES SANITARIAS - PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	20.07	REDES DE TUBERIA SANITARIA PVC 2"(INCLUYE ACCESORIO) EN PISO 2	**Unidad** ML	**Cantidad:**	25.00

UBICACIÓN	**CANT**		**AREA TOTAL DEL PROYECTO**				**TOTAL**
			LONGITUD (M)	**ANCHO PROM (M)**	**CANT**		
TOTAL							**-**

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	20.0	**INSTALACIONES SANITARIAS - PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	20.08	PUNTO DE AGUA POTABLE PVC 1/2" EN PISO 2	**Unidad** UND	**Cantidad:**	6.00

UBICACIÓN	**CANT**		**AREA TOTAL DEL PROYECTO**				**TOTAL**
			LONGITUD (M)	**ANCHO PROM (M)**	**CANT**		
TOTAL							**-**

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	20.0	**INSTALACIONES SANITARIAS - PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	20.09	REDES DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" (INLCUYE ACCESORIOS) EN PISO 2	**Unidad** ML	**Cantidad:**	23.00

UBICACIÓN	**CANT**		**AREA TOTAL DEL PROYECTO**				**TOTAL**
			LONGITUD (M)	**ANCHO PROM (M)**	**CANT**		
TOTAL							**-**

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	21.0	**INSTALACIONES ELECTRICAS - PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	21.01	SALIDA TOMACORRIENTE 110 VOLTIOS EN PISO 2	**Unidad** UND	**Cantidad:**	38.00

UBICACIÓN	**CANT**		**AREA TOTAL DEL PROYECTO**				**TOTAL**
			LONGITUD (M)	**ANCHO PROM (M)**	**CANT**		
TOTAL							**-**

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.			**ETAPA**		EN EJECUCION	
CAPITULO:	21.0	**INSTALACIONES ELECTRICAS - PISO 2**		**MUNICIPIO**		GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	21.02	SALIDA TOMACORRIENTE 220 VOLTIOS (AIRE ACONDICIONADO) EN PISO 2		**Unidad**	UND	**Cantidad:**	7.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	CANT		
OFICINA 1	1.00						1.00
OFICINA 2	1.00						1.00
OFICINA 3	1.00						1.00
OFICINA 4	1.00						1.00
OFICINA 5	1.00						1.00
OFICINA 6	1.00						1.00
OFICINA 7	1.00						1.00
TOTAL							**7.00**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD BAJO 4,0 UND DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	21.0	**INSTALACIONES ELECTRICAS - PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	21.03	SALIDA PARA SWITCHE SENCILLO EN PISO 2	**Unidad** UND	**Cantidad:**	10.00

UBICACIÓN	**CANT**		**AREA TOTAL DEL PROYECTO**				**TOTAL**
			LONGITUD (M)	**ANCHO PROM (M)**	**CANT**		
OFICINA 1					1.00		1.00
OFICINA 2					1.00		1.00
OFICINA 3					2.00		2.00
OFICINA 4					1.00		1.00
OFICINA 5					1.00		1.00
OFICINA 6					1.00		1.00
OFICINA 7					1.00		1.00
RECEPCION					2.00		2.00
TOTAL							**10.00**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD SUBIO 7,0 UND DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	21.0	**INSTALACIONES ELECTRICAS - PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	21.04	SALIDA PARA SWITCHE DOBLE EN PISO 2	**Unidad** UND	**Cantidad:**	0.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	CANT		
OFICINA 1					1.00		1.00
OFICINA 2					1.00		1.00
OFICINA 3					2.00		2.00
OFICINA 4					1.00		1.00
OFICINA 5					1.00		1.00
OFICINA 6					1.00		1.00
OFICINA 7					1.00		1.00
RECEPCION					2.00		2.00
TOTAL							**10.00**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD CONTRACTUAL ES LLEVADA A CERO.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION		
CAPITULO:	21.0	**INSTALACIONES ELECTRICAS - PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO		
ITEM:	21.05	ACOMETIDA PARCIAL EN TUBERIA PVC DE 3/4" ALAMBRE AISLADO (DOS LINEAS N° 12) AWG THHN. N° 12 AWG. (THHN) EN PISO 2	**Unidad**	ML	**Cantidad:**	0.00

UBICACIÓN	**CANT**		**AREA TOTAL DEL PROYECTO**				**TOTAL**
			LONGITUD (M)	**ANCHO PROM (M)**	**CANT**		
OFICINA 1			25.00				25.00
OFICINA 2			40.00				40.00
OFICINA 3			35.00				35.00
OFICINA 4			25.00				25.00
OFICINA 5			17.00				17.00
OFICINA 6			28.00				28.00
OFICINA 7			15.00				15.00
RECEPCION			5.00				5.00
TOTAL							**190.00**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD CONTRACTUAL ES LLEVADA A CERO.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	21.0	**INSTALACIONES ELECTRICAS - PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	21.06	INTERRUPTOR DOBLE EN PISO 2	**Unidad** UND	**Cantidad:**	0.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	CANT		
RECEPCION	2.00						2.00
OFICINA 2	2.00						2.00
OFICINA 3	2.00						2.00
TOTAL							**6.00**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD CONTRACTUAL ES LLEVADA A CERO.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	21.0	**INSTALACIONES ELECTRICAS - PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	21.07	INTERRUPTOR SENCILLO EN PISO 2	**Unidad** UND	**Cantidad:**	10.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	CANT		
RECEPCION	1.00						1.00
OFICINA 1	1.00						1.00
OFICINA 2	1.00						1.00
OFICINA 3	1.00						1.00
OFICINA 4	1.00						1.00
OFICINA 5	1.00						1.00
OFICINA 6	1.00						1.00
OFICINA 7	1.00						1.00
BAÑO 1	1.00						1.00
BAÑO 2	1.00						1.00
TOTAL							**10.00**

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD SUBIO 7,0 UND DEL VALOR CONTRACTUAL.

ALCALDÍA DE GALAPA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	21.0	**INSTALACIONES ELECTRICAS - PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	21.08	SALIDA PARA LAMPARA LED 60 W EN PISO 2	**Unidad** UND	**Cantidad:**	39.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	CANT		
TOTAL							**-**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	**ETAPA**	EN EJECUCION		
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 1**	DESMONTE DE PUERTAS PISO 1	**Unidad** UND	**Cantidad:**	9.00

UBICACIÓN	CANT	AREA TOTAL DEL PROYECTO					TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	CANT	
OFICINA 1	2.00						2.00
OFICINA 2	3.00						3.00
OFICINA 3	1.00						1.00
OFICINA 4	3.00						3.00
TOTAL							**9.00**



OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	**ETAPA**	EN EJECUCION		
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 2**	DEMOLICION DE ENCHAPE BAÑOS EXISTENTES	**Unidad** M2	**Cantidad:**	37.00

UBICACIÓN	CANT	AREA TOTAL DEL PROYECTO					TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	CANT	
BAÑO 1			7.85	2.35			18.44
BAÑO 2			7.90	2.35			18.57
TOTAL							**37.00**




OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	**ETAPA**	EN EJECUCION		
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 3**	DESMONTE Y RETIRO DE CLOSED EN MADERA EXISATENTE	**Unidad** UND	**Cantidad:**	1.00

UBICACIÓN	CANT	AREA TOTAL DEL PROYECTO					TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	CANT	
OFICINA 2 - PISO 1	1.00						1.00
TOTAL							**1.00**

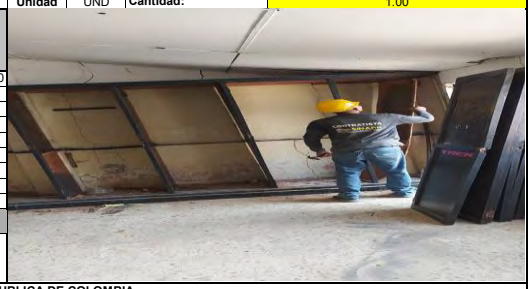

OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	**ETAPA**	EN EJECUCION		
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 4**	DEMOLICION Y RELLENEO DE POZA SEPTICA EXISTENTE INCLUYE RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	**Unidad** UND	**Cantidad:**	1.00

UBICACIÓN	CANT	AREA TOTAL DEL PROYECTO					TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	CANT	
PATIO PRINCIPAL - OFICINA 4	1.00						1.00
TOTAL							**1.00**



OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	**ETAPA**	EN EJECUCION		
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 5**	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE INCLUE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	**Unidad**	M2	**Cantidad:** 52.43

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	AREA	CANT	
OFICINA 3					24.70		24.70
OFICINA 4					23.90		23.90
BAÑO 3 - OFICINA 2					3.83		3.83
TOTAL							**52.43**



OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	**ETAPA**	EN EJECUCION		
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 6**	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000PSI REFORZADO CON DOS VARILLAS DE 3/8 Y GANCHO DE 1/4" 10CM X 20CM	**Unidad**	ML	**Cantidad:** 37.80

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	AREA	CANT	
OFICINA 3			14.00				14.00
OFICINA 4			16.00				16.00
BAÑO 2 OFICINA 4			7.80				7.80
TOTAL							**37.80**



OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	**ETAPA**	EN EJECUCION		
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 7**	REPARACION LOSA DETERIORADA INCLUYE SIKA 32 Y Y PINTURA EPOXICA PARA EL ACERO	**Unidad**	M2	**Cantidad:** 4.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	
OFICINA 2 - PISO 1			2.00	2.00			4.00
TOTAL							**4.00**



OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	**ETAPA**	EN EJECUCION		
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 8**	DEMOLICION LOSA EN CONCRETO REFORZADO BAÑOS E=12CM	**Unidad**	M2	**Cantidad:** 7.15

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	
BAÑO 2 OFICINA 4			3.00	2.38			7.15
TOTAL							**7.15**

OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 9**	BAJANTE SANITARIO 3"	**Unidad**	ML	**Cantidad:** 10.00

UBICACIÓN	CANT	AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	
BAÑO 1 OFICINA 2 DESDE 2DA PLANTA			10.00				10.00
TOTAL							**10.00**



OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 10**	CONSTRUCCION DE FILETES	**Unidad**	ML	**Cantidad:** 80.25

UBICACIÓN	CANT	AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	
OFICINA 1 PUERTAS Y VENTANAS			17.00				17.00
OFICINA 2 PUERTAS Y VENTANAS			15.00				15.00
OFICINA 3 PUERTAS Y VENTANAS			18.00				18.00
OFICINA 4 PUERTAS Y VENTANAS			15.00				15.00
BAÑOS 1 PUERTAS Y VENTANAS			5.25				5.25
BAÑOS 2 PUERTAS Y VENTANAS			5.00				5.00
BAÑOS 3 PUERTAS Y VENTANAS			5.00				5.00
TOTAL							**80.25**



OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 11**	DEMOLICION DE COLUMNA EXITENTE EN LADRILLO DE 2,5 M	**Unidad**	ML	**Cantidad:** 1.00

UBICACIÓN	CANT	AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	
ENTRE OFICINAS 3 Y 4	1.00						1.00
TOTAL							**1.00**

OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 12**	SUMINISTRO, INSTALACION Y ARMADO DE TABLERO ELECTRICO DE 18 CIRCUITOS BIFASICO PISO 1	**Unidad**	UND	**Cantidad:** 1.00

UBICACIÓN	CANT	AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	
OFICINA 3 - PISO 1	1.00						1.00
TOTAL							**1.00**



OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 13**	SUMINISTRO DE TACOS DE 20AMP	**Unidad** UND	**Cantidad:**	18.00

UBICACIÓN	CANT	AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	
OFICINA 3	18.00						18.00
TOTAL							**18.00**

OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 14**	SUMINISTRO DE TACOS DE 30AMP	**Unidad** UND	**Cantidad:**	8.00

UBICACIÓN	CANT	AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	
OFICINA 3	8.00						8.00
TOTAL							**8.00**

OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 15**	TOMA CORRIENTE DE 220V	**Unidad** UND	**Cantidad:**	4.00

UBICACIÓN	CANT	AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	
OFICINA 1	1.00						1.00
OFICINA 2	1.00						1.00
OFICINA 3	1.00						1.00
OFICINA 4	1.00						1.00
TOTAL							**4.00**

OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 16**	TOMA CORRIENTE DE 110V	**Unidad** UND	**Cantidad:**	24.00

UBICACIÓN	CANT	AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	
OFICINA 1	6.00						6.00
OFICINA 2	3.00						3.00
OFICINA 3	10.00						10.00
OFICINA 4	5.00						5.00
TOTAL							**24.00**



OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	**ETAPA**	EN EJECUCION		
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 17**	IMPERMIABILIZACION DE ZABALETA EN MANTO EDIL FRIO	**Unidad**	ML	**Cantidad:** 23.48

UBICACIÓN	CANT	AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
		LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	
OFICINAS 3		9.00				9.00
OFICINAS 4		11.00				11.00
BAÑO 2 - OFICINA 4		3.48				3.48
TOTAL						**23.48**


OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	**ETAPA**	EN EJECUCION		
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 18**	REDES DE TUBERIA SANITARIA PARA DESAGUE PVC 4" DOBLE (INCLUYE ACCESORIO) EN PISO 1	**Unidad**	ML	**Cantidad:** 11.00

UBICACIÓN	CANT	AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
		LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	
OFICINA 1		2.00				2.00
OFICINA 3		4.00				4.00
OFICINA 4		5.00				5.00
11						
TOTAL						**11.00**



OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	**ETAPA**	EN EJECUCION		
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 19**	VIGA DE CIMIENTO ZONA EXTERIOR DE 0,2 X 0,25 M EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI REFORZADO CON DOS VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20CM EN PISO 1	**Unidad**	ML	**Cantidad:** 42.20

UBICACIÓN	CANT	AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
		LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	
CARRERA 17B		18.00				18.00
CALLE 11		24.20				24.20
TOTAL						**42.20**

OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	**ETAPA**	EN EJECUCION		
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 20**	SUMINISTRO E INTALACION DE MANIJA SANITARIA EN 6" PARA CONEXIÓN A MAN HOLLE CERCANO INCLUYE CUATRO REGISTRO SANITARIO EN LADRILLO COMUN DE 60X60CM Y TAPAS EN CONCRETO REFORZADO	**Unidad**	UND	**Cantidad:** 1.00

UBICACIÓN	CANT	AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
		LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	
CALLE 11 - OFICINA 4	1.00					1.00
TOTAL						**1.00**


OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	**ETAPA**	EN EJECUCION		
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 21**	CONSTRUCCION DE REGISTO CAPTADOR DE AGUAS LLUVIAS (PATIO) DE 1X0,4 M INCLUYE REGILLA EN VARILLA DE 1/2 " EN LADRILLO COMOUN REPELLADO AMBAS CARAS.	**Unidad** ML	**Cantidad:**	1.00

UBICACIÓN	CANT	AREA TOTAL DEL PROYECTO					TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	
PATIO PRINCIPAL	1.00						1.00
TOTAL							**1.00**

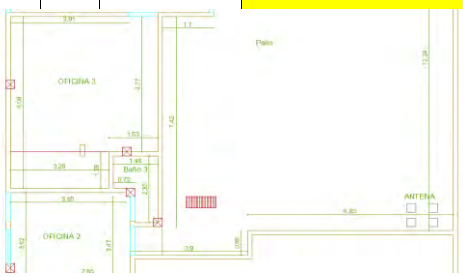


OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	**ETAPA**	EN EJECUCION		
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 22**	LEVANTE EN BLOCK DE 15CM VIBROPRENZADO PARA DEFINIR CONTORNO ZONA EXTERIOR H PROMEDIO DE 0,3 M A 0,5 M, INCLUYE REPELLO CARA EXTERIOR	**Unidad** ML	**Cantidad:**	42.20

UBICACIÓN	CANT	AREA TOTAL DEL PROYECTO					TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	
CARRERA 17B			22.10				22.10
CALLE 11			20.10				20.10
TOTAL							**42.20**

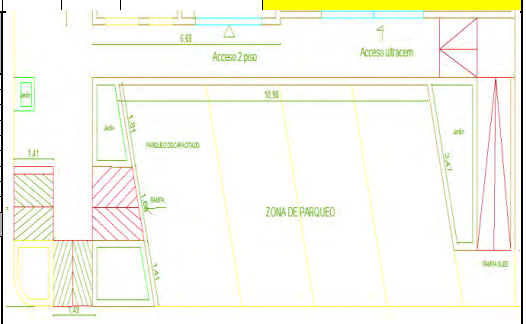

OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	**ETAPA**	EN EJECUCION		
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 23**	POLO A TIERRA CON 1 VARILLAS COPER WELL DE 1,5 M X 1/2" PISO 1	**Unidad** UND	**Cantidad:**	2.00

UBICACIÓN	CANT	AREA TOTAL DEL PROYECTO					TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	
OFICINA 3	1.00		1.50				1.00
PATIO PRINCIPAL	1.00		1.50				1.00
TOTAL							**2.00**



OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	**ETAPA**	EN EJECUCION		
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 24**	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO DE PUERTA DE 1X2M EN MADERA CEDRO Y HOJA EN LAMINA RH , INCLUYE CERRADURA, BIASAGRAS Y JAMBA EN AMBOS LADOS.	**Unidad** UND	**Cantidad:**	5.00

UBICACIÓN	CANT	AREA TOTAL DEL PROYECTO					TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	
OFICINA 1	1.00						1.00
OFICINA 2	1.00						1.00
OFICINA 3	1.00						1.00
OFICINA 4	2.00						2.00
TOTAL							**5.00**

OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 25**	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO DE PUERTA DE 1X2M EN	**Unidad** UND	**Cantidad:**	2.00

UBICACIÓN	CANT	AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	
BAÑO 1 OFICINA 1	1.00						1.00
BAÑO 2 OFICINA 4	1.00						1.00
TOTAL							**2.00**

OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 26**	JUNTA DE DILATACION EN Z DE 11MM INCLUYE ACCESORIO	**Unidad** UND	**Cantidad:**	84.00

UBICACIÓN	CANT	AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	
OFICINA 2			32.00				32.00
OFICINA 3			25.00				25.00
OFICINA 4			27.00				27.00
TOTAL							**84.00**

OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 1**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 26**	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ FRIA	**Unidad** UND	**Cantidad:**	20.00

UBICACIÓN	CANT	AREA TOTAL DEL PROYECTO				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	
OFICINA 1	4.00						4.00
BAÑO OFICINA 1	1.00						1.00
OFICINA 2	2.00						2.00
BAÑO OFICINA 2	1.00						1.00
OFICINA 3	6.00						6.00
OFICINA 4	5.00						5.00
BAÑO OFICINA 4	1.00						1.00
TOTAL							**20.00**

OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 27**	DEMOLICION DE ENCHAPE BAÑOS EXISTENTES	**Unidad**	M2	**Cantidad:** 18.21

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	ESPESOR (M)	CANT	TOTAL
BAÑO 1			5.00	2.00			10.00
BAÑO 2			4.00	2.05			8.21
TOTAL							**18.21**



OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 28**	DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES E=0,15 M INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN PISO 2	**Unidad**	M2	**Cantidad:** 28.39

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	ESPESOR (M)	CANT	TOTAL
OFICINA 1 - OJETE	1.00		2.10	0.25			0.53
OFICINA 2	1.00		2.60	2.20			5.72
OFICINA 2 - MURO EXIST	1.00		3.65	1.20			4.38
OFICINA 2 - VENTANA NUEVA	1.00		1.04	1.00			1.04
OFICINA 6 - VENTANA NUEVA	1.00		1.50	0.95			1.43
OFICINA 5 - VENTANA NUEVA	1.00		1.50	1.28			1.92
BALCON	1.00		16.73	0.80			13.38
28.39							
TOTAL							**28.39**



OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 29**	DEMOLICION DE VIGA EN CONCRETO DE 0,25*0,25 M	**Unidad**	ML	**Cantidad:** 3.90

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	ESPESOR (M)	CANT	TOTAL
PISO 2 - OFICINA 2	1.00		3.90				3.90
TOTAL							**3.90**

OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 30**	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES EN PISO 2	**Unidad**	UND	**Cantidad:** 2.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	AREA	CANT	TOTAL
BAÑO 1	1.00						1.00
BAÑO 2	1.00						1.00
TOTAL							**2.00**


OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 31**	DESMONTE DE VENTANAS INCLUIDO VIDRIOS EN PISO 2	**Unidad** UND	**Cantidad:**	12.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL LONGITUD (M)	CANTIDAD POR ML (KG)	AREA	CANT	TOTAL
OFICINA 1	2.00						2.00
OFICINA 2	2.00						2.00
OFICINA 3	2.00						2.00
OFICINA 4	2.00						2.00
OFICINA 5	2.00						2.00
OFICINA 6	1.00						1.00
OFICINA 7	1.00						1.00
TOTAL							**12.00**

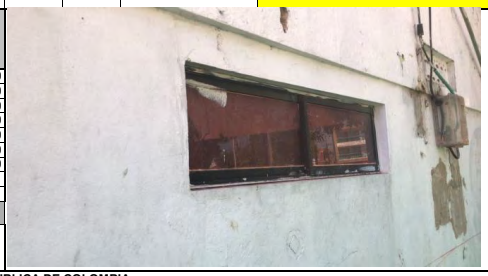

OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 32**	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL EN PISO 2	**Unidad** M2	**Cantidad:**	236.77

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	TOTAL
OFICINA 1 - 2 - 3			16.75	3.30			55.28
			16.75	4.40			73.70
OFICINA 4 - 5			10.20	4.00			40.80
			10.20	3.00			30.60
OFICINA 6 -7			7.00	2.10			14.70
			7.00	3.10			21.70
TOTAL							**236.77**

OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 33**	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO 70-44 CORREDIZAS PRINCIPALES E INTERNAS 1.6 X 2.0 M PISO 2	**Unidad** M2	**Cantidad:**	9.60

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	TOTAL
OFICINA 3 - 4 - 5	3.00		1.60	2.00			9.60
TOTAL							**9.60**

OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 34**	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTRADA PRINCIPAL SEGUNDO PISO EN ALUMINIO DIM : 2,6 X 2,36 M, EN PERFILERIA DE 3"X 1 1/2	**Unidad** UND	**Cantidad:**	1.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	TOTAL
OFICINA 3	1.00		2.60	2.36			1.00
TOTAL							**1.00**

OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 35**	SUMINISTRO, INSTALACION Y ARMADO DE TABLERO ELECTRICO DE 18 CIRCUITOS BIFASICO PISO 2	**Unidad** UND	**Cantidad:**	2.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	
HOLL PISO 2	2.00						2.00
TOTAL							**2.00**

OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 36**	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACOS DE 20AMP	**Unidad** UND	**Cantidad:**	18.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	
HOLL - OFICINA 2	18.00						18.00
TOTAL							**18.00**

OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 37**	SUMINISTRO DE TACOS DE 30AMP	**Unidad** UND	**Cantidad:**	18.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	
OFICINA 3 - PISO 2	18.00						18.00
TOTAL							**18.00**

OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 38**	TOMA CORRIENTE DE 220V	**Unidad** UND	**Cantidad:**	7.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	
OFICINA 1	1.00						1.00
OFICINA 2	1.00						1.00
OFICINA 3	1.00						1.00
OFICINA 4	1.00						1.00
OFICINA 5	1.00						1.00
OFICINA 6	1.00						1.00
OFICINA 7	1.00						1.00
TOTAL							**7.00**

OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 39**	TOMA CORRIENTE DE 110V	**Unidad**	UND	**Cantidad:** 38.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	TOTAL
OFICINA 1	6.00						6.00
OFICINA 2	5.00						5.00
OFICINA 3	5.00						5.00
OFICINA 4	6.00						6.00
OFICINA 5	6.00						6.00
OFICINA 6	4.00						4.00
OFICINA 7	3.00						3.00
RECEPCION	3.00						3.00
TOTAL							**38.00**

OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 40**	IMPERMIABILIZACION DE ZABALETA EN MANTO EDIL FRIO	**Unidad**	ML	**Cantidad:** 25.07

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	TOTAL
OFICINAS 1			9.00				9.00
OFICINAS 2			11.00				11.00
OFICINAS 3			5.07				5.07
TOTAL							**25.07**


OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 41**	POLO A TIERRA CON 1 VARILLAS COPER WELL DE 1,5 M X 1/2" PISO	**Unidad**	UND	**Cantidad:** 2.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	TOTAL
PATIO PRINCIPAL	2.00		1.50				2.00
TOTAL							**2.00**




OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 42**	RECONSTRUCCION DE ESCALERA, INCLUYE DEMOLICION DEL ACABADO EN GRANITO EXISTENTE, E INSTALACION DEL NUEVO ACABADO EN GRANITO FUNDIDO PULIDO EN SITIO	**Unidad**	UND	**Cantidad:** 1.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	TOTAL
RECEPCION PISO 1 HACIA PISO2	1.00						1.00
TOTAL							**1.00**



OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 43**	DEMOLICION DE VIGA CANAL EXISTENTE EN CONCRETO	**Unidad** ML	**Cantidad:**	6.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	
OFICINAS 4 Y 5			6.00				6.00
TOTAL							**6.00**

OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 44**	PINTURA ROJO COLONIAL TIPO 1 EXTERIOR PARA CUBIERTE	**Unidad** M2	**Cantidad:**	173.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	
OFICINA 1					16.76		16.76
OFICINA 2					19.62		19.62
OFICINA 3					40.91		40.91
OFICINA 4					20.23		20.23
OFICINA 5					19.44		19.44
OFICINA 6					15.24		15.24
OFICINA 7					20.30		20.30
BALCON					20.50		20.50
TOTAL							**173.00**

OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 45**	CONSTRUCCION DE FILETES	**Unidad** ML	**Cantidad:**	79.10

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	
OFICINA 1 PUERTAS Y VENTANAS			16.00				16.00
OFICINA 2 PUERTAS Y VENTANAS			14.90				14.90
OFICINA 3 PUERTAS Y VENTANAS			18.00				18.00
OFICINA 4 PUERTAS Y VENTANAS			15.00				15.00
OFICINA 5 PUERTAS Y VENTANAS			5.20				5.20
OFICINA 6 PUERTAS Y VENTANAS			5.00				5.00
OFICINA 7 PUERTAS Y VENTANAS			5.00				5.00
TOTAL							**79.10**

OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 46**	RESANE DE GRIETAS (INCLUYE GANCHO DE AMARRE)	**Unidad** ML	**Cantidad:**	41.30

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	
OFICINA 1			12.00				12.00
OFICINA 2			4.00				4.00
OFICINA 3			3.00				3.00
OFICINA 4			8.00				8.00
OFICINA 5			4.00				4.00
OFICINA 6			7.00				7.00
OFICINA 7			3.30				3.30
TOTAL							**41.30**

OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.			**ETAPA**	EN EJECUCION		
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 2**		**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO		
ITEM:	**INP 47**	TOTALIZADOR CON CAJA PISO 2		**Unidad**	ML	**Cantidad:**	1.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	
OFICINA 2	1.00						1.00
TOTAL							**1.00**

OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.			**ETAPA**	EN EJECUCION		
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 2**		**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO		
ITEM:	**INP 48**	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO DE PUERTA DE 1X2M EN MADERA CEDRO Y HOJA EN LAMINA RH , INCLUYE CERRADURA, BIASAGRAS Y JAMBA EN AMBOS LADOS.		**Unidad**	UND	**Cantidad:**	6.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	
OFICINA 2	1.00						1.00
OFICINA 3	1.00						1.00
OFICINA 4	2.00						2.00
OFICINA 5	1.00						1.00
OFICINA 6	1.00						1.00
							0.00
TOTAL							**6.00**

OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.			**ETAPA**	EN EJECUCION		
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 2**		**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO		
ITEM:	**INP 49**	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO DE PUERTA DE 0.85 X2M EN MADERA CEDRO Y HOJA EN LAMINA RH , INCLUYE CERRADURA, BIASAGRAS Y JAMBA EN AMBOS LADOS.		**Unidad**	UND	**Cantidad:**	2.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	
BAÑO 1 OFICINA 2	1.00						1.00
BAÑO 2 OFICINA 7	1.00						1.00
TOTAL							**2.00**

OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.			**ETAPA**	EN EJECUCION		
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 2**		**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO		
ITEM:	**INP 50**	JUNTA DE DILATACION EN Z DE 11MM INCLUYE ACCESORIO		**Unidad**	UND	**Cantidad:**	121.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	
OFICINA 2			32.00				32.00
OFICINA 3			26.00				26.00
OFICINA 4			27.00				27.00
OFICINA 5			36.00				36.00
TOTAL							**121.00**

OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 51**	DEMOLICION DE PLACA LOSA E=12CM DE CONCRETO REFORZADO	**Unidad** M2	**Cantidad:**	1.90

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	
OFICINA 4 - LOSA ENTRE PISO			1.60	1.19			1.90
TOTAL							**1.90**

OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
MUNICIPIO DE GALAPA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		**ETAPA**	EN EJECUCION	
CAPITULO:	**ITEM NO PREVISTOS**	**PISO 2**	**MUNICIPIO**	GALAPA - ATLANTICO	
ITEM:	**INP 26**	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO DE	**Unidad** UND	**Cantidad:**	39.00

UBICACIÓN	CANT		AREA TOTAL DEL				TOTAL
			LONGITUD (M)	ANCHO PROM (M)	AREA	CANT	
RECEPCION	2.00						2.00
OFICINA 1	4.00						4.00
OFICINA 2	2.00						2.00
BAÑO OFICINA 2	1.00						1.00
HOLL	2.00						2.00
OFICINA 3	4.00						4.00
BALCON	10.00						10.00
ESCALERA	1.00						1.00
OFICINA 4	4.00						4.00
OFICINA 5	4.00						4.00
OFI 6	2.00						2.00
OFICINA 7	1.00						1.00
PASILLO OF 7	1.00						1.00
BAÑO OF 7	1.00						1.00
TOTAL							**39.00**

OBSERVACIONES: ITEM NO PREVISTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 1	DESMONTE DE PUERTAS PISO 1	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	57,047.50	0.05	2,852.38
VOLQUETA	25,000.00	0.50	12,500.00
		SUBTOTAL $	15,352.38

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
DOTACION	UND	0.046	57,047.50	2,599.75
				-
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	2,599.75

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL 1	HORA	1	$ 15,319.0	2.50	38,297.50
AYUDNATE	HOTA	1	$ 7,500.0	2.50	18,750.00
					-
				SUBTOTAL $	57,047.50
				TOTAL COSTO DIRECTO $	75,000

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 2	DEMOLICION DE VIGA EN CONCRETO DE 0,25*0,25 M	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	25,000.00	0.05	1,250.00
VOLQUETA	25,000.00	0.15	3,750.00
ANDAMIOS	33,400.00	0.1	3,340.00
			-
		SUBTOTAL $	8,340.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	Hor	1	$ 22,819.0	1.11	25,410.00
					-
				SUBTOTAL $	25,410.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	33,750

33750
- 0.00
$ 1.1
1.11354573

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 3	DESMONTE DE CLOSED EN MADERA EXISATENTE	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	205,000.00	0.05	10,250.00
ANDAMIOS	33,400.00	0.4	13,360.00
VOLQUETA	25000	0.841	21,019.00
		SUBTOTAL $	44,629.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL 1	HORA	1	$ 15,319.0	9.00	137,871.00
AYUDNATE	HOTA	1	$ 7,500.0	9.00	67,500.00
					-
				SUBTOTAL $	205,371.00

TOTAL COSTO DIRECTO $	**250,000**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 4	DEMOLICION Y RELLENO DE POZA SEPTICA EXISTENTE INCLUYE RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	190,000.00	0.05	9,500.00
ALQUILER MARTILLO DEMOLEDOR DE MURO DE 110 VLTS	125,000.00	0.45	56,250.00
MINICARGADOR	120,000.00	0.1	12,000.00
VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA	85,000.00	1	85,000.00
VOLQUETA	118000	1	118,000.00
		SUBTOTAL $	280,750.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 3 (1 OF+ 3 AYU)	HORA	1	$ 37,819.0	5.07	191,750.00
					-
					-
				SUBTOTAL $	191,750.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	472,500

472000

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 5	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE INCLUE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	7,000.00	0.05	350.00
ANDAMIOS	33,400.00	0.5	16,700.00
VOLQUETA	25,000.00	0.4	10,000.00
			-
		SUBTOTAL $	27,050.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL 1	HORA	1	$ 7,500.0	0.89	6,700.00
					-
				SUBTOTAL $	6,700.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	33,750

33750

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 6	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000PSI REFORZADO CON DOS VARILLAS DE 3/8 Y GANCHO DE 1/4" DE 10X20	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	19,000.00	0.05	950.00
FORMALETA PARA VIGA	33,400.00	0.1	3,340.00
			-
		0.3	-
		SUBTOTAL $	4,290.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0.095	492,660.00	46,556.37
ACERO DE REFUERZO	KG	3.00	7,100.00	21,300.00
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	67,856.37

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	Hor	1	$ 22,819.0	0.75	17,213.20
					-
				SUBTOTAL $	17,213.20
				TOTAL COSTO DIRECTO $	89,360

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 7	REPARACION LOSA DETERIORADA INCLUYE SIKA 32 Y Y PINTURA EPOXICA PARA EL ACERO	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	45,638.00	0.05	2,281.90
ANDAMIOS	33,400.00	0.2	6,680.00
		SUBTOTAL $	8,961.90

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SIKADUR 32	KG	0.300	170,000.00	51,000.00
PINTURA EPOXICA	GAL	0.10	328,000.00	32,800.00
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	83,800.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	Hor	1	$ 22,819.0	1.85	42,238.10
					-
				SUBTOTAL $	42,238.10
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**135,000**


OK

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 8	DEMOLICION LOSA EN CONCRETO REFORZADO BAÑOS E=12CM	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	22,000.00	0.05	1,100.00
ANDAMIOS	33,400.00	0.2	6,680.00
VOLQUETA	25,000.00	0.15	3,750.00
			-
		SUBTOTAL $	11,530.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	Hor	1	$ 22,819.0	1.57	35,720.00
					-
				SUBTOTAL $	35,720.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**47,250**

47250

OK

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 9	BAJANTE SANITARIO 3"	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	23,470.00	0.05	1,173.50
ANDAMIOS	33,400.00	0.20	6,680.00
			-
			-
		SUBTOTAL $	7,853.50

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TUBERIA SANIARIA DE 3"	ML	1.050	14,000.00	14,700.00
ACCESORIOS DE 3"	UND	0.60	25,000.00	15,000.00
PEGANTE PVC EN HUMEDO 1/8 GALON	UND	0.12	50,900.00	6,108.00
ELEMENTOS DE FIJACION	UND	0.20	10,500.00	2,100.00
				-
			SUBTOTAL $	37,908.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	Hor	1	$ 22,819.0	1.07	24,345.26
					-
				SUBTOTAL $	24,345.26
				TOTAL COSTO DIRECTO $	70,106.76

70106.76

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 10	CONSTRUCCION DE FILETES	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	13,691.40	0.05	684.57
ANDAMIOS	33,400.00	0.10	3,340.00
			-
			-
		SUBTOTAL $	4,024.57

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
MORTERO 1:4	M3	0.050	365,000.00	18,250.00
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	18,250.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	Hor	1	$ 22,819.0	0.50	11,475.43
					-
				SUBTOTAL $	11,475.43
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**33,750**

33750

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 11	DEMOLICION DE COLUMNA EXISTENTE EN LADRILLO DE 2,5 M	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	65,000.00	0.05	3,250.00
ANDAMIOS	33,400.00	0.50	16,700.00
VOLQUETA	25,000.00	1.5	37,500.00
			-
		SUBTOTAL $	57,450.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 2 (OFICIAL + 2 AYUDANTE)	Hor	1	$ 30,319.0	2.34	70,800.00
					-
				SUBTOTAL $	70,800.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	128,250

128250

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 12	SUMINISTRO, INSTALACION Y ARMADO DE TABLERO ELECTRICO DE 18 CIRCUITOS BIFASICO PISO 1	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	265,000.00	0.05	13,250.00
ANDAMIOS	33,400.00	0.50	16,700.00
			-
			-
		SUBTOTAL $	29,950.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TABLERO ELECTRICO DE 18 CIRCUITOS 220v	UND	1.000	450,000.00	450,000.00
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	450,000.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA ELECTRICA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	HOR	1	$ 22,819.0	11.51	262,550.00
					-
				SUBTOTAL $	262,550.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**742,500.00**

742500

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACOS DE 20AMP	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	25,000.00	0.05	1,250.00
ANDAMIOS	33,400.00	0.10	3,340.00
			-
			-
		SUBTOTAL $	4,590.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TACOS DE 20 AMPERIOS	UND	1.000	19,011.00	19,011.00
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	19,011.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA ELECTRIUCA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	HOR	1	$ 22,819.0	1.04	23,649.00
					-
				SUBTOTAL $	23,649.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	47,250

47250

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 14	SUMINISTRO DE TACOS DE 30AMP	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	25,000.00	0.05	1,250.00
ANDAMIOS	33,400.00	0.10	3,340.00
			-
			-
		SUBTOTAL $	4,590.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TACOS DE 30 AMPERIOS	UND	1.000	22,300.00	22,300.00
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	22,300.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA ELECTRICA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	HOR	1	$ 22,819.0	1.07	24,410.00
					-
				SUBTOTAL $	24,410.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	51,300

51300

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 35	SUMINISTRO E INSTALACION TOMA CORRIENTE DE 220V	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	34,228.50	0.05	1,711.43
ANDAMIOS	33,400.00	0.10	3,340.00
			-
			-
		SUBTOTAL $	5,051.43

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA GFCI BLANCO	UND	1.000	66,900.00	66,900.00
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	66,900.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA ELECTRICA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	HOR	1	$ 22,819.0	2.05	46,848.57
					-
				SUBTOTAL $	46,848.57
				TOTAL COSTO DIRECTO $	118,800

118800

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 16	SUMINISTRO E INSTALACION TOMA CORRIENTE DE 110V	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	16,000.00	0.05	800.00
			-
			-
			-
		SUBTOTAL $	800.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TOMA DOBLE P/T BLANCA CLICKME O SIMILAR	UND	1.000	29,900.00	29,900.00
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	29,900.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	HOR	1	$ 22,819.0	0.73	16,550.00
					-
				SUBTOTAL $	16,550.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	47,250

47250

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 17	IMPERMIABILIZACION DE ZABALETA EN MANTO EDIL FRIO	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	27,000.00	0.05	1,350.00
ANDAMIOS	33,400.00	0.10	3,340.00
			-
			-
		SUBTOTAL $	4,690.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE ALUMANTO AUTOADHESIVO	M2	1.100	85,000.00	93,500.00
PRIMER SUPER EDIL	GL	0.10	20,685.00	2,068.50
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	95,568.50

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	HOR	1	$ 22,819.0	0.93	21,241.50
					-
				SUBTOTAL $	21,241.50
				TOTAL COSTO DIRECTO $	121,500

121500

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 18	REDES DE TUBERIA SANITARIA PARA DESAGUE PVC 4" DOBLE (INCLUYE ACCESORIO) EN PISO 1	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	60,000.00	0.05	3,000.00
			-
			-
			-
		SUBTOTAL $	3,000.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TUBERIA SANITARIA DE 4"	ML	2.050	22,015.00	45,130.75
ACCESORIO PVC 4"	UND	1.00	35,000.00	35,000.00
PEGANTE PVC EN HUMEDO 1/8 GALON	GL	0.120	50,900.00	6,108.00
				-
				-
			SUBTOTAL $	86,238.75

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	HOR	1	$ 22,819.0	2.75	62,761.25
					-
				SUBTOTAL $	62,761.25
				TOTAL COSTO DIRECTO $	152,000

152000

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 19	VIGA DE CIMIENTO ZONA EXTERIOR DE 0,2 X 0,25 M EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI REFORZADO CON DOS VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20CM EN PISO 1	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	57,047.50	0.05	2,852.38
FORMALETA DE VIGA	33,400.00	0.70	23,380.00
			-
			-
		SUBTOTAL $	26,232.38

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0.053	492,660.00	25,864.65
ACERO DE REFUERZO	KG	3.50	7,100.00	24,850.00
				-
				-
			SUBTOTAL $	50,714.65

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	HOR	1	$ 22,819.0	2.54	57,852.97
					-
				SUBTOTAL $	57,852.97
				TOTAL COSTO DIRECTO $	134,800

134800

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 20	SUMINISTRO E INTALACION DE MANIJA SANITARIA EN 6 " PARA CONEXIÓN A MAN HOLLE CERCANO INCLUYE CUATRO REGISTRO SANITARIO EN LADRILLO COMUN DE 60X60CM Y TAPAS EN CONCRETO REFORZADO	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	456,380.00	0.05	22,819.00
			-
			-
			-
		SUBTOTAL $	22,819.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
MANIJA SANITARIA EN 6" PARA CONECCION A MANHOLL	ML	35.000	45,000.00	1,575,000.00
REGISTRO SANITARIO DE 60X60 EN LADRILLO COMUN CON TAPAS EN CONCRETO REFORZADO	UND	4.00	600,000.00	2,400,000.00
				-
				-
			SUBTOTAL $	3,975,000.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + 2 AYUDANTE)	HOR	1	$ 29,069.0	19.34	562,181.00
					-
				SUBTOTAL $	562,181.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**4,560,000**

4560000

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 21	CONSTRUCCION DE REGISTO CAPTADOR DE AGUAS LLUVIAS (PATIO) DE 1X0,4 M INCLUYE REGILLA EN VARILLA DE 1/2 " EN LADRILLO COMOUN REPELLADO AMBAS CARAS.	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	251,009.00	0.05	12,550.45
			-
			-
			-
		SUBTOTAL $	12,550.45

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
LADRILLO COMUN	UND	85.000	550.00	46,750.00
MORTERO 1:4	M3	0.18	365,000.00	65,700.00
ACERO DE REFUERZO	KG	9.000	7,100.00	63,900.00
				-
				-
			SUBTOTAL $	176,350.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	HOR	1	$ 22,819.0	14.74	336,249.55
					-
				SUBTOTAL $	336,249.55
				TOTAL COSTO DIRECTO $	525,150

525150

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 22	LEVANTE EN BLOCK DE 15CM VIBROPRENZADO PARA DEFINIR CONTORNO ZONA EXTERIOR H PROMEDIO DE 0,3 M A 0,45 M, INCLUYE REPELLO CARA EXTERIOR	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	27,382.80	0.05	1,369.14
			-
			-
			-
		SUBTOTAL $	1,369.14

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
BLOCK VIBROPRENSADO	UND	7.500	4,200.00	31,500.00
MORTERO 1:4	M3	0.08	365,000.00	29,200.00
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	60,700.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	HOR	1	$ 22,819.0	2.25	51,330.86
					-
				SUBTOTAL $	51,330.86
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**113,400**

113400

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 23	POLO A TIERRA CON 1 VARILLAS COPER WELL DE 1,5 M X 1/2" PISO 2	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	400,000.00	0.05	20,000.00
MOLDE PARA SOLDADURA EXOTERMIC	39,100.00	0.20	7,820.00
			-
			-
		SUBTOTAL $	27,820.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VARILLAS COPER WELL DE 1,5 M X 1/2"	UND	1.00	235,000.00	235,000.00
CABLE DE COBRE DESNUDO NO. 2	ML	15.000	11,880.00	178,200.00
HIDROSOLTA	UND	1.000	156,600.00	156,600.00
SOLDADURA EXOTERMICA	KG	5.00	11,300.00	56,500.00
			SUBTOTAL $	626,300.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	HOR	1	$ 22,819.0	17.09	390,015.90
					-
				SUBTOTAL $	390,015.90
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**1,044,135.90**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 24	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS DE PUERTAS DE 1X2 MTS. EN MADERA CEDRO Y HOJA EN LAMINA RH,INCLUYE CERRADURAS BISAGRAS Y JAMBAS EN AMBOS LADOS	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	ARIFA/HOR	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	19,200.00	0.05	960.00
		SUBTOTAL $	960.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
HOJA DE PUERTA EN RH	UND	1.000	450,000.00	450,000.00
MARCO PARA PUERTA EN CEDRO	UND	1.000	198,000.00	198,000.00
JAMBA	UND	1.000	132,000.00	132,000.00
ELEMENTOS DE FIJACION (CHAZOS + TORNILLOS+BISAGRA	UND	1.000	88,000.00	88,000.00
CERRADURA	UND	1.00	120,000.00	120,000.00
				-
			SUBTOTAL $	988,000.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Kr	TARIFA	Vr. UNITARIO
MARCO Y PUERTA		11.00		$ 12,000.00	$ 132,000.00
				SUBTOTAL $	$ 132,000.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	Hor	1	$ 22,819.0	8.72	199,040.00
					-
				SUBTOTAL $	199,040.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**1,320,000**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS DE PUERTAS DE 0,85X2 MTS. EN MADERA CEDRO Y HOJA EN LAMINA RH,INCLUYE CERRADURAS BISAGRAS Y JAMBAS EN AMBOS LADOS	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HOR	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	19,200.00	0.05	960.00
		SUBTOTAL $	960.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
HOJA DE PUERTA EN RH	UND	1.000	400,000.00	400,000.00
MARCO PARA PUERTA EN CEDRO	UND	1.000	186,000.00	186,000.00
JAMBA	UND	1.000	124,000.00	124,000.00
ELEMENTOS DE FIJACION (CHAZOS + TORNILLOS+BISAGRA	UND	1.000	88,000.00	88,000.00
CERRADURA	UND	1.00	120,000.00	120,000.00
				-
			SUBTOTAL $	918,000.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Kr	TARIFA	Vr. UNITARIO
MARCO Y PUERTA		11.00		$ 12,000.00	$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	Hor	1	$ 22,819.0	14.07	321,040.00
					-
				SUBTOTAL $	321,040.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	1,240,000

1240000

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 26	JUNTA DE DILATACION EN PERFIL Z DE 11 MM INCLUYE ACCESORIOS	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	19,200.00	0.05	960.00
PULIDORA DE 9"	6500	0.50	3,250.00
ANDAMIO	33,400.00	0.10	3,340.00
		SUBTOTAL $	7,550.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PERFIL Z PARA JUNTA DE DILATACION CIELO RASO	ML	1.100	8,000.00	8,800.00
TORNILLERIA	KG	1.000	2,300.00	2,300.00
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	11,100.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	Hor	1	$ 22,819.0	1.43	32,650.00
					-
				SUBTOTAL $	32,650.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**51,300**

51300

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ FRIA	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	85,000.00	0.05	4,250.00
ANDAMIOS	33,400.00	0.20	6,680.00
			-
			-
		SUBTOTAL $	10,930.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ FRIA	UND	1.000	34,500.00	34,500.00
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	34,500.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	HORA	1	$ 22,819.0	1.56	35,570.00
					-
				SUBTOTAL $	35,570.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**81,000.00**

81000

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 27	DEMOLICION DE ENCHAPE BAÑOS EXISTENTES	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	19,200.00	0.05	960.00
ANDAMIOS	33,400.00	0.30	10,020.00
VOLQUETA	25,000.00	0.15	3,750.00
		SUBTOTAL $	14,730.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	Hor	1	$ 22,819.0	0.83	19,020.20
					-
				SUBTOTAL $	19,020.20

TOTAL COSTO DIRECTO $	33,750

33750

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 28	DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES E=0,15 M INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN PISO 2	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	25,100.90	0.05	1,255.05
VOLQUETA	25,000.00	0.32	8,000.00
ANDAMIOS	33,400.00	0.2	6,680.00
			-
		SUBTOTAL $	15,935.05

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	Hor	1	$ 22,819.0	1.14	26,124.62
					-
				SUBTOTAL $	26,124.62

TOTAL COSTO DIRECTO $	42,059.66

42059.66

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 29	DEMOLICION DE VIGA EN CONCRETO DE 0,25*0,25 M	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	25,000.00	0.05	1,250.00
VOLQUETA	25,000.00	0.15	3,750.00
ANDAMIOS	33,400.00	0.1	3,340.00
			-
		SUBTOTAL $	8,340.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	Hor	1	$ 22,819.0	1.11	25,410.00
					-
				SUBTOTAL $	25,410.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	33,750

33750

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 30	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES EN PISO 2	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	28,000.00	0.05	1,400.00
VOLQUETA	25,000.00	0.60	15,000.00
			-
			-
		SUBTOTAL $	16,400.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	HORA	1	$ 22,819.0	1.23	28,105.45
					-
				SUBTOTAL $	28,105.45

TOTAL COSTO DIRECTO $	44,505.45

44505.45

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 31	DESMONTE DE VENTANAS INCLUIDO VIDRIOS EN PISO 2	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	29,000.00	0.05	1,450.00
ANDAMIOS	33,400.00	0.08	2,672.00
			-
			-
		SUBTOTAL $	4,122.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	HORA	1	$ 22,819.0	1.34	30,493.35
					-
				SUBTOTAL $	30,493.35

TOTAL COSTO DIRECTO $	34,615.35

34615.35

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 32	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL EN PISO 2	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	66,000.00	0.05	3,300.00
ANDAMIOS	33,400.00	0.50	16,700.00
VOLQUETA	25,000.00	0.2	5,000.00
			-
		SUBTOTAL $	25,000.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	HORA	1	$ 22,819.0	2.41	54,966.14
					-
				SUBTOTAL $	54,966.14
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**79,966.14**

79966.14

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 33	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO 70-44 CORREDIZAS PRINCIPALES E INTERNAS 1.6 X 2.0 M PISO 2	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	53,000.00	0.05	2,650.00
			-
			-
			-
		SUBTOTAL $	2,650.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PUERTA EN ALUMINIO 70-44 CORREDIZAS PRINCIPALES E INTERNAS 1.6 X 2.0 M	M2	1.000	528,000.00	528,000.00
ELEMENTOS DE FIJACION	GL	1.00	158,000.00	158,000.00
				-
				-
			SUBTOTAL $	686,000.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	HORA	1	$ 22,819.0	2.36	53,850.00
					-
				SUBTOTAL $	53,850.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	742,500.00

742500

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 34	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTRADA PRINCIPAL SEGUNDO PISO EN ALUMINIO DIM : 2,6 X 2,36 M	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	320,000.00	0.05	16,000.00
			-
			-
			-
		SUBTOTAL $	16,000.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PUERTA ENTRADA PRINCIPAL EN ALUMINIO DIM : 2,6 X 2,36 M	UND	1.000	3,292,544.00	3,292,544.00
ELEMENTOS DE FIJACION	GL	1.00	416,000.00	416,000.00
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	3,708,544.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	HORA	1	$ 22,819.0	14.26	325,456.00
					-
				SUBTOTAL $	325,456.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	4,050,000.00

4050000

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 35	SUMINISTRO, INSTALACION Y ARMADO DE TABLERO ELECTRICO DE 18 CIRCUITOS BIFASICO PISO 1	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	265,000.00	0.05	13,250.00
ANDAMIOS	33,400.00	0.50	16,700.00
			-
			-
		SUBTOTAL $	29,950.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TABLERO ELECTRICO DE 18 CIRCUITOS 220v	UND	1.000	450,000.00	450,000.00
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	450,000.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	HOR	1	$ 22,819.0	11.51	262,550.00
					-
				SUBTOTAL $	262,550.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**742,500.00**

742500

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 36	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACOS DE 20AMP	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	25,000.00	0.05	1,250.00
ANDAMIOS	33,400.00	0.10	3,340.00
			-
			-
		SUBTOTAL $	4,590.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TACOS DE 20 AMPERIOS	UND	1.000	19,011.00	19,011.00
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	19,011.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	HOR	1	$ 22,819.0	1.04	23,649.00
					-
				SUBTOTAL $	23,649.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**47,250**

47250

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 37	SUMINISTRO DE TACOS DE 30AMP	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	25,000.00	0.05	1,250.00
ANDAMIOS	33,400.00	0.10	3,340.00
			-
			-
		SUBTOTAL $	4,590.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TACOS DE 30 AMPERIOS	UND	1.000	22,300.00	22,300.00
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	22,300.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	HOR	1	$ 22,819.0	1.07	24,410.00
					-
				SUBTOTAL $	24,410.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	51,300

51300

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 38	SUMINISTRO E INSTALACION TOMA CORRIENTE DE 220V	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	34,228.50	0.05	1,711.43
ANDAMIOS	33,400.00	0.10	3,340.00
			-
			-
		SUBTOTAL $	5,051.43

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA GFCI BLANCO	UND	1.000	66,900.00	66,900.00
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	66,900.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	HOR	1	$ 22,819.0	2.05	46,848.57
					-
				SUBTOTAL $	46,848.57
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**118,800**

118800

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 39	SUMINISTRO E INSTALACION TOMA CORRIENTE DE 110V	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	16,000.00	0.05	800.00
			-
			-
			-
		SUBTOTAL $	800.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TOMA DOBLE P/T BLANCA CLICKME O SIMILAR	UND	1.000	29,900.00	29,900.00
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	29,900.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	HOR	1	$ 22,819.0	0.73	16,550.00
					-
				SUBTOTAL $	16,550.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	47,250

47250

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 40	IMPERMIABILIZACION DE ZABALETA EN MANTO EDIL FRIO	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	27,000.00	0.05	1,350.00
ANDAMIOS	33,400.00	0.10	3,340.00
			-
			-
		SUBTOTAL $	4,690.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE ALUMANTO AUTOADHESIVO	M2	1.100	85,000.00	93,500.00
PRIMER SUPER EDIL	GL	0.10	20,685.00	2,068.50
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	95,568.50

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	HOR	1	$ 22,819.0	0.93	21,241.50
					-
				SUBTOTAL $	21,241.50
				TOTAL COSTO DIRECTO $	121,500

121500

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 41	POLO A TIERRA CON 1 VARILLAS COPER WELL DE 1,5 M X 1/2" PISO 2	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	400,000.00	0.05	20,000.00
MOLDE PARA SOLDADURA EXOTERMIC	39,100.00	0.20	7,820.00
			-
			-
		SUBTOTAL $	27,820.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VARILLA COPPERWELD DE 1/8 X 5/8	UND	1.00	235,000.00	235,000.00
CABLE DE COBRE DESNUDO NO. 2	ML	15.000	11,880.00	178,200.00
HIDROSOLTA	UND	1.000	156,600.00	156,600.00
SOLDADURA EXOTERMICA	KG	5.00	11,300.00	56,500.00
			SUBTOTAL $	626,300.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	HOR	1	$ 22,819.0	17.09	390,015.90
					-
				SUBTOTAL $	390,015.90
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**1,044,135.90**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 42	RECONSTRUCCION DE ESCALERA, INCLUYE DEMOLICION DEL ACABADO EN GRANITO, E INSTALACION DEL NUEO ACABADO EN GRANITO FUNDIDO	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	1,800,000.00	0.05	90,000.00
PULIDORA	3,414.00	1	3,414.00
			-
			-
		SUBTOTAL $	93,414.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PIRLAN	ML	13.000	35,000.00	455,000.00
CEMENTO BLANCO	KG	190.00	1,800.00	342,000.00
AGUA	LTS	48.165	120.00	5,779.80
Disco t 27 9*1/8 abrasivo corte refrac 1/8 x 9t27	UND	9.000	35,000.00	315,000.00
GRANO BLANCO # 2	BUL	13.00	18,250.00	237,250.00
MARMOLINA CORRIENTE	BUL	5	12,500.00	62,500.00
			SUBTOTAL $	1,417,529.80

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + 2 AYUDANTE)	HOR	1	$ 29,069.0	118.93	3,457,134.38
					-
				SUBTOTAL $	3,457,134.38
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**4,968,078.18**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 43	DEMOLICION DE VIGA CANAL EXISTENTE EN CONCRETO REFORZADO	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	45,000.00	0.05	2,250.00
VOLQUETA	118,000.00	0.20	23,600.00
ANDAMIOS	33,400.00	0.10	3,340.00
ALQUILER MARTILLO DEMOLEDOR DE MURO A 110 VOLTS	125,000.00	0.18	22,500.00
			-
		SUBTOTAL $	51,690.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	HOR	1	$ 22,819.0	2.29	52,260.00
					-
				SUBTOTAL $	52,260.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**103,950**

103950

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 44	PINTURA ROJO COLONIAL TIPO 1 EXTERIOR PARA CUBIERTA ETERNIT	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	6,500.00	0.05	325.00
ANDAMIOS	33,400.00	0.10	3,340.00
			-
			-
		SUBTOTAL $	3,665.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PINTURA ROJO COLONIAL PARA CUBIERTA	GL	0.150	88,000.00	13,200.00
RODILLO	UND	0.250	14,500.00	3,625.00
				-
				-
			SUBTOTAL $	16,825.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	HOR	1	$ 22,819.0	0.33	7,433.58
					-
				SUBTOTAL $	7,433.58
				TOTAL COSTO DIRECTO $	27,923.58

27923.58

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 45	CONSTRUCCION DE FILETES	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	13,691.40	0.05	684.57
ANDAMIOS	33,400.00	0.10	3,340.00
			-
			-
		SUBTOTAL $	4,024.57

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
MORTERO 1:4	M3	0.050	365,000.00	18,250.00
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	18,250.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	Hor	1	$ 22,819.0	0.50	11,475.43
					-
				SUBTOTAL $	11,475.43
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**33,750**

33750

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 46	RESANE DE GRIETAS (INCLUYE GANCHO DE AMARRE)	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	13,000.00	0.05	650.00
ANDAMIOS	33,400.00	0.10	3,340.00
			-
			-
		SUBTOTAL $	3,990.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
MORTERO 1:4	M3	0.020	365,000.00	7,300.00
ACERO	KG	1.20	7,100.00	8,520.00
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	15,820.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	Hor	1	$ 22,819.0	2.39	54,440.00
					-
				SUBTOTAL $	54,440.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	74,250

74250

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 47	TOTALIZADOR CON CAJA PISO 2	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	85,000.00	0.05	4,250.00
ANDAMIOS	33,400.00	0.02	668.00
			-
			-
		SUBTOTAL $	4,918.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
INDUSTRIAL TOTALIZADOR	UND	1.000	350,000.00	350,000.00
ELEMENTOS DE FIJACION	UND	1.00	27,500.00	27,500.00
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	377,500.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	HORA	1	$ 22,819.0	3.78	86,185.63
					-
				SUBTOTAL $	86,185.63
				TOTAL COSTO DIRECTO $	468,603.63

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 48	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS DE PUERTAS DE 1X2 MTS. EN MADERA CEDRO Y HOJA EN LAMINA RH,INCLUYE CERRADURAS BISAGRAS Y JAMBAS EN AMBOS LADOS PISO 2	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	ARIFA/HOR	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	19,200.00	0.05	960.00
		SUBTOTAL $	960.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
HOJA DE PUERTA EN RH	UND	1.000	450,000.00	450,000.00
MARCO PARA PUERTA EN CEDRO	UND	1.000	198,000.00	198,000.00
JAMBA	UND	1.000	132,000.00	132,000.00
ELEMENTOS DE FIJACION (CHAZOS + TORNILLOS+BISAGRA	UND	1.000	88,000.00	88,000.00
CERRADURA	UND	1.00	120,000.00	120,000.00
				-
			SUBTOTAL $	988,000.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Kr	TARIFA	Vr. UNITARIO
MARCO Y PUERTA		11.00		$ 12,000.00	$ 132,000.00
				SUBTOTAL $	$ 132,000.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	Hor	1	$ 22,819.0	8.72	199,040.00
					-
				SUBTOTAL $	199,040.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**1,320,000**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS DE PUERTAS DE 0,85X2 MTS. EN MADERA CEDRO Y HOJA EN LAMINA RH,INCLUYE CERRADURAS BISAGRAS Y JAMBAS EN AMBOS LADOS PISO 2	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HOR	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	19,200.00	0.05	960.00
		SUBTOTAL $	960.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
HOJA DE PUERTA EN RH	UND	1.000	400,000.00	400,000.00
MARCO PARA PUERTA EN CEDRO	UND	1.000	186,000.00	186,000.00
JAMBA	UND	1.000	124,000.00	124,000.00
ELEMENTOS DE FIJACION (CHAZOS + TORNILLOS+BISAGRA	UND	1.000	88,000.00	88,000.00
CERRADURA	UND	1.00	120,000.00	120,000.00
				-
			SUBTOTAL $	918,000.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Kr	TARIFA	Vr. UNITARIO
MARCO Y PUERTA		11.00		$ 12,000.00	$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	Hor	1	$ 22,819.0	14.07	321,040.00
					-
				SUBTOTAL $	321,040.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	1,240,000

1240000

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 50	JUNTA DE DILATACION EN PERFIL Z DE 11 MM INCLUYE ACCESORIOS PISO 2	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	19,200.00	0.05	960.00
PULIDORA DE 9"	6500	0.50	3,250.00
ANDAMIO	33,400.00	0.10	3,340.00
		SUBTOTAL $	7,550.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PERFIL Z PARA JUNTA DE DILATACION CIELO RASO	ML	1.100	8,000.00	8,800.00
TORNILLERIA	KG	1.000	2,300.00	2,300.00
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	11,100.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	Hor	1	$ 22,819.0	1.43	32,650.00
					-
				SUBTOTAL $	32,650.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**51,300**

51300

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 51	DEMOLICION DE PLACA LOSA E=12CM DE CONCRETO REFORZADO	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	22,000.00	0.05	1,100.00
ANDAMIOS	33,400.00	0.2	6,680.00
VOLQUETA	25,000.00	0.15	3,750.00
			-
		SUBTOTAL $	11,530.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	Hor	1	$ 22,819.0	1.57	35,720.00
					-
				SUBTOTAL $	35,720.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**47,250**

47250

OK

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
INP 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ FRIA	UND	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%)	85,000.00	0.05	4,250.00
ANDAMIOS	33,400.00	0.20	6,680.00
			-
			-
		SUBTOTAL $	10,930.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ FRIA	UND	1.000	34,500.00	34,500.00
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL $	34,500.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA No 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	HORA	1	$ 22,819.0	1.56	35,570.00
					-
				SUBTOTAL $	35,570.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**81,000.00**

81000

ANEXO 12: PARAFISCALES OBRA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900210235	1	CONSTRUCTORA P - F LTDA.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PRINCIPAL	CRA 45 NO 70-147	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3854759	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	987148087	9475546842	E	2024/10/08	2024/10/17	NEQUI		$1,367,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Tarifa	Aporte	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1045713285	CAMACHO JULIETH																		230301	30	$208,000	EPS010	30	$52,000	CCF07	30	$52,000	14-11	30	0.522	$6,800	30	$0	Si	$318,800
2	CC	10778771	FLOREZ ADALBERTO																		231001	30	$208,000	EPS010	30	$52,000	CCF07	30	$52,000	14-11	30	6.96	$90,500	30	$0	Si	$402,500
3	CC	72289269	PULGAR YOSETH																		231001	30	$208,000	EPS010	30	$52,000	CCF07	30	$52,000	14-11	30	0.522	$6,800	30	$0	Si	$318,800
4	CC	1045669677	SANDOVAL EDER																		230301	30	$208,000	EPS010	30	$52,000	CCF07	30	$52,000	14-11	30	0.522	$6,800	30	$0	Si	$318,800
Total	**Afiliados(4)**																						$832,000			$208,000			$208,000				$110,900		$0		$1,358,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900210235	1	CONSTRUCTORA P - F LTDA.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PRINCIPAL	CRA 45 NO 70-147	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3854759	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	987148087	9475546842	E	2024/10/08	2024/10/17	NEQUI		$1,367,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$832,000	$0	$837,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$416,000	$0	$418,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$0	$418,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$110,900	$0	$111,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$110,900	$0	$111,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$208,000	$0	$209,400
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	4	$208,000	$0	$209,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$208,000	$0	$209,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$208,000	$0	$209,400
TOTAL				4	$1,358,900	$0	$1,367,900

Medellín, 02 de october de 2024

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que CALIXTO PRENT ZUÑIGA identificado(a) con cédula de ciudadanía 72070721 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 03/10/2024 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

CONSTRUCTORA P F LTDA N900210235

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
1711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA CONSULTORÍA RELATIVAS A: MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA SIN PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (SIN INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS)

CLASE DE RIESGO: 1 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 0.522%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000002 - OPERATIVO

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411101

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:


1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 02/10/2024 9.59 AM

Medellín, 02 de october de 2024

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que EUCLIDES RAFAEL GOMEZ VALENCIA identificado(a) con cédula de ciudadanía 72073269 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 03/10/2024 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

CONSTRUCTORA P F LTDA N900210235

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
1711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA CONSULTORÍA RELATIVAS A: MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA SIN PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (SIN INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS)

CLASE DE RIESGO: 1 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 0.522%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000002 - OPERATIVO

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411101

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:


1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 02/10/2024 10.02 AM

Medellín, 02 de october de 2024

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que FEDERICO GONZALEZ CANTILLO identificado(a) con cédula de ciudadanía 8794446 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 03/10/2024 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

CONSTRUCTORA P F LTDA N900210235

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
1711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA CONSULTORÍA RELATIVAS A: MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA SIN PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (SIN INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS)

CLASE DE RIESGO: 1 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 0.522%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000002 - OPERATIVO

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411101

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:


1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 02/10/2024 10.19 AM

Medellín, 02 de october de 2024

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que ADALI DE JESUS OROZCO MANOTAS identificado(a) con cédula de ciudadanía 8803236 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 03/10/2024 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

CONSTRUCTORA P F LTDA N900210235

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
1711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA CONSULTORÍA RELATIVAS A: MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA SIN PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (SIN INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS)

CLASE DE RIESGO: 1 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 0.522%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000002 - OPERATIVO

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411101

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:


1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 02/10/2024 10.07 AM

Medellín, 02 de october de 2024

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que DARIO NATAEL BEGAMBRE CONDE identificado(a) con cédula de ciudadanía 15671731 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 03/10/2024 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

CONSTRUCTORA P F LTDA N900210235

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
1711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA CONSULTORÍA RELATIVAS A: MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA SIN PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (SIN INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS)

CLASE DE RIESGO: 1 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 0.522%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000002 - OPERATIVO

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411101

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:


1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 02/10/2024 10.11 AM

Medellín, 02 de october de 2024

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que VICTOR GONZALEZ GARCIA identificado(a) con cédula de ciudadanía 72015152 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 03/10/2024 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

CONSTRUCTORA P F LTDA N900210235

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
1711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA CONSULTORÍA RELATIVAS A: MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA SIN PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (SIN INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS)

CLASE DE RIESGO: 1 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 0.522%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000002 - OPERATIVO

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411101

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 02/10/2024 10.15 AM

ANEXO 13: PARAFISCALES INTERVENTORIA

Javier Sandoval Páez
Ingeniero Civil, Diseño, Construcción,
Asesorías e Interventoría
T.P No. 08202-249241ATL

Galapa, 17/10/2024

Señores **Municipio de Galapa**
Galapa-Atlántico

Asunto: Certificación

Yo, JAVIER ALEXANDER SANDOVAL PAEZ, Identificado con c.c 1.047.226.940 de Galapa – Atlántico, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Cordialmente,

JAVIER ALEXANDER SANDOVAL PAEZ
CC: 1.047.226.940 de Galapa.

Dirección: calle 10 # 21 – 20 Galapa – Atlántico.
Ing.javier.sandoval@gmail.com
Tel: 3979818 – 3013386677

ANEXO 14: INFORME DE OBRA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO DE OBRA LP-002-2024: "OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.



CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PF LTDA.

INFORME AVANCE DE OBRA No. 1.

2024.

INTRODUCCION.

El presente informe tiene por objeto registrar el avance de las diferentes actividades preliminares y administrativas para el proyecto: “OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”.

Esta antigua edificación se encuentra ubicada en el municipio de Galapa Atlántico, la cual era utilizada para el funcionamiento de las oficinas de la alcaldía de Galapa, cuyas instalaciones van a ser adecuadas nuevamente para prestar servicios como oficinas adicionales a la actual alcaldía del municipio.

1. TIPO DE CONTRATO: LP-002-2024.
1.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

PROCESO	LP-002-2024
OBJETO	OBRAS DE ADECUACIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA. DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PF LTDA.
R.L	YOSET PULGAR IBARRA
FECHA INICIO	22/08/2024.
PLAZO EJECUCION	3 MESES.
FECHA TERMINACION	22/11/2024.
VALOR DEL CONTRATO	$ 529.128.650,63
VALOR ADICIONAL 1.	$ 0
VALOR ACTUALIZADO	$ 529.128.650,63

1.2 RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA.

ACTAS DE OBRA				
ACTA	**FECHA**	**AVANCE FINANCIERO**	**AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%)**	**VALOR**
ACTA PARCIAL No 1	30/09/2024	22,04	22,04	$ 116.595.775,62

ACTAS MODIFICATIVAS		
ACTA	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
ACTA MODIFICATIVA 1.	29/09/2024	

ACTAS DE ACUERDO DE PRECIOS		
ACTA	**FECHA**	**OBSERVACIONES**

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA.

Durante el transcurso del mes de agosto a partir de 22 del presente año, se llevaron a cabo una serie de actividades de suma relevancia para el desarrollo del proyecto. Entre estas destacan:

- ✓ TRAZADO Y REPLANTEO.
- ✓ CERRAMIENTO PERIMETRAL DE OBRA.
- ✓ DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES.
- ✓ DEMOLICION DE PLANTILLAS EXISTENTES.
- ✓ DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS.
- ✓ DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS PISO 1 Y PISO 2.
- ✓ DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE.
- ✓ EXCAVACION MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL.
- ✓ LEVANTE DE MUROS PISO 2.

Estas acciones fueron fundamentales para el progreso general de la obra, las cuales se ejecutaron con la atención y cuidado necesario con el fin de salvaguardar la seguridad de los predios aledaños.

3. ACTIVIDADES CONTRACTUALES.

3.1 ASPECTOS CLIMATICOS.

Durante los días faltantes del mes de agosto del 2024 y el transcurso del mes de septiembre del 2024 el clima ha sido bastante lluvioso, retrasando el ingreso de materiales y algunas de las actividades que allí de desarrollan como excavaciones, retiro de escombros, desmonte de cubierta etc.

3.2 ASPECTOS TECNICOS CONSTRUCTIVOS.

CERRAMIENTO PERIMETRAL DE OBRA: Estos espacios son delimitados con el fin de acondicionar los espacios y el área de incidencia del proyecto para impedir el paso de personal ajenos a la obra.




DESMONTE DE CIELO RASO: Se procede al desmonte del cielo raso existente en piso 2, el cual se encontraba en mal estado y ha punto de colapsar, estas estructuras serán remplazadas por estructuras nuevas y se procederá a la instalación del cielo raso nuevo en material de drywall, incluye acabado y pintura a 3 manos.





DEMOLICION DE PISOS Y PLANTILLAS EXISTENTES: Estos pisos existentes se encontraban construidos en mosaico baldosín, los cuales fueron de molidos y la plantilla escarificada para nuevamente fundir plantillas nuevas en concreto de 3000 psi E=0,07 con su acero de refuerzo en varillas de ¼" y posteriormente el acabado final en porcelanato de 60x60 con su respectivo sócalo.

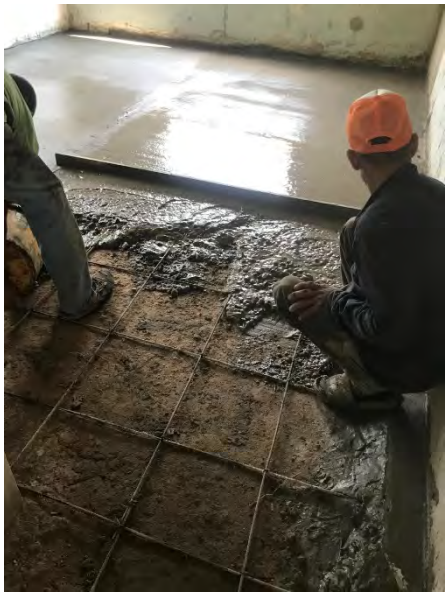



DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS: Las puertas y ventanas existentes se encontraban en mal estado, se procede al desmonte de las mismas al igual que las rejas de protección de ventanas, para nuevamente realizar la construcción y mejoramiento de filetes como también el cerramiento en muros de puertas y ventanas según el diseño del proyecto.





DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES Y LEVANTE: Se realiza la demolición de muros existentes y levante de tal manera que todo coincida con el nuevo diseño, en esta actividad se realiza cierre de ventanas y puertas en block samo, como también la construcción de muros divisorios para la nueva distribución de oficinas en la 2da planta de la estructura.





RESANE DE MUROS: Se realiza pañete de muros donde se realizó construcción de muros nuevos en modificación de puertas y ventanas como levante de muros divisorios para nuevas oficinas en piso 2.





EXCAVACIONES PARA REDES SANITARIAS PISO 1: Se realiza excavación manual y retiro de material sobrante para la instalación de las nuevas redes sanitarias en piso 1 y redes de agua potable.





RESANE DE FISURAS: Se realiza la reparación de fisuras existentes rellenadas en mortero con su respectivo acero de refuerzo en piso 2.





4. AVANCE DE OBRA.

Hasta la fecha del presente informe, correspondiente al periodo de 22 de agosto del 2024 hasta el 22 de septiembre del 2024, se ha alcanzado un avance físico acumulado en la obra del 22,04 %.

No.	PERIODO	AVANCE	AVANCE ACUMULADO (%)	AVANCE MENSUAL PROGRAMADO (%).
1	Del 22 agosto del 2024 al 22 septiembre del 2024.	22,04%	22,04%	20%

CONDICIONES CONTRACTUALES.

PRESUPUESTO ADECUACIONES PRIMER PISO

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1,00			**PRELIMINARES PISO 1**				
1	1,01			TRAZADO Y REPLANTEO PISO 1	M2	80,00	$ 6.014,25	$ 481.140,00
2	1,02			CERRAMIENTO PERIMETRAL OBRA EN LONA VERDE PISO 1	ML	43,00	$ 16.038,00	$ 689.634,00
SUBTOTAL								**$ 1.170.774,00**
	2,00			**DEMOLICIONES PISO 1**				
3	2,01			DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES E=0,15 M INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN PISO 1	M2	35,00	$ 42.059,66	$ 1.472.087,93
4	2,02			DEMOLICION DE PISO Y PLANTILLA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL EN PISO 1	M2	112,00	$ 28.066,50	$ 3.143.448,00
5	2,03			DEMOLICION DE PISO Y PLANTILLA EXISTENTE ZONAS EXTERIORES EN PISO 1	M2	136,00	$ 28.066,50	$ 3.817.044,00
6	2,04			DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES EN PISO 1	UND	4,00	$ 44.505,45	$ 178.021,80
7	2,05			DESMONTE DE VENTANAS INCLUIDO VIDRIOS EN PISO 1	UND	10,00	$ 34.615,35	$ 346.153,50
8	2,06			DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL EN PISO 1	UND	173,00	$ 79.966,14	$ 13.834.141,57
9	2,07			DEMOLICION DE MUROS DE JARDINERAS EXISTENTES EN PISO 1	M2	46,00	$ 24.057,00	$ 1.106.622,00
Subtotal								**$ 23.897.518,80**
	3,00			**CIMENTACION Y ESTRUCTURA PISO 1**				
10	3,01			VIGA DE CIMENTACION DE 0,30X0,30 EN CONCRETO DE 3000PSI REFORZADO CON 4 DE 1/2" Y ESTRIBO DE 3/8" @ 20CM EN PISO 1	ML	6,70	$ 166.809,90	$ 1.117.626,34
11	3,02			PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,07M INCLUYE REFUERZO EN VARILLA DE 1/4" CADA 40CM PARA ZONAS PEATONALES EN PISO 1	M2	136,00	$ 100.040,40	$ 13.605.494,35
12	3,03			PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,07M INCLUYE REFUERZO EN VARILLA DE 1/4" CADA 40CM ZONAS OFICINAS PISO 1	M2	112,00	$ 100.040,40	$ 11.204.524,76
13	3,04			DINTELES DE 0,15X 0,2 M EN PISO 1	ML	32,00	$ 76.091,49	$ 2.434.927,65
14	3,05			PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=10CM REFORZADO CON VARILLAS DE 3/8" @ 30CM AMBOS SENTIDOS ZONA DE PARQUEADEROS	M2	60,00	$ 120.484,35	$ 7.229.060,86
15	3,06			VIGA DE CIMIENTO DE 0,2 X 0,20 M EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI 4VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20CM EN PISO 1	ML	36,70	$ 74.761,24	$ 2.743.737,69
SUBTOTAL								**$ 38.335.371,66**
	4,00			**EXCAVACIONES Y RELLENOS PISO 1**				
16	4,01			EXCAVACION MANUAL Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE EN PISO 1	M3	40,00	$ 45.441,00	$ 1.817.640,00
17	4,02			RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PM E	M3	30,00	$ 114.939,00	$ 3.448.170,00
18	4,03			BASE EN SUELO CEMENTO E=15CM RELACION 1:10 EN PISO 1	M3	9,45	$ 168.399,00	$ 1.591.370,55
19	4,04			SUMINISTRO DE ARENA NEGRA EN PISO 1	M3	4,00	$ 37.422,00	$ 149.688,00
SUBTOTAL								**$ 7.006.868,55**
	5,00			**MAMPOSTERIA PISO 1**				
20	5,01			LEVANTE EN BLOCK SAMO N° 4 EN PISO 1	M2	40,76	$ 70.100,76	$ 2.857.307,04
21	5,02			PAÑETE EN MORTERO RELACION 1:4 E: 0.02 EN PISO 1	M2	121,72	$ 29.544,07	$ 3.596.104,64
SUBTOTAL								**$ 6.453.411,68**
	6,00			**ACABADOS PISO 1**				
22	6,01			ESCARIFICACION DE PARED Y LOSA EN PISO 1	M2	506,00	$ 13.926,98	$ 7.047.051,06
23	6,02			ESTUCO EN PULYPLAS PARA MURO Y CIELO A TRES MANOS EN PISO 1	M2	506,00	$ 46.643,85	$ 23.601.788,10
24	6,03			PINTURA EN VINILO TIPO 1 A TRES MANOS EN PISO 1	M2	506,00	$ 27.923,58	$ 14.129.331,53
25	6,04			SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DRYWAL, INCLUYE ACABADO PINTADO A 3 MANOS EN PISO 1	M2	75,00	$ 112.693,52	$ 8.452.014,21
SUBTOTAL								**$ 53.230.184,90**
	7,00			**PISOS PISO 1**				
26	7,01			PISO EN BALDOSA EN PORCELANATO 0.6 X 0.6 EN PISO 1	M2	112,00	$ 160.380,00	$ 17.962.560,00
27	7,02			PISO EN CERAMICA TRAFICO PESADO ANTIDESLIZANTE BAÑO EN PISO 1	M2	12,18	$ 123.519,33	$ 1.504.465,44
28	7,03			ZOCALOS EN PISO 1	ML	250,00	$ 26.437,34	$ 6.609.333,81
29	7,04			ENCHAPE PARED BAÑO EN PISO 1	M2	68,00	$ 126.967,50	$ 8.633.790,00
30	7,05			PISO EN TABLETA GRES DE 0,3X0,3 PARA ZONAS EXTERIORES EN PISO 1	M2	136,00	$ 111.385,13	$ 15.148.377,00
SUBTOTAL								**$ 49.858.526,25**
	8,00			**CUBIERTA PISO 1**				
31	8,01			SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA PERFIL 7, INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA ABARCO EN PISO 1	M2	75,00	$ 171.494,67	$ 12.862.100,11
SUBTOTAL								**$ 12.862.100,11**

Página 1

	9,00			**CARPINTERIA PISO 1**				
32	9,01			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA DE 1.0 X 2 EN PISO 1	UND	1,00	$ 1.278.255,33	$ 1.278.255,33
33	9,02			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PARA BAÑO 0.85 X 2.0 EN PISO 1	UND	3,00	$ 1.251.525,33	$ 3.754.575,99
34	9,03			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PRINCIPALES 1.2 X 2.0 EN PISO 1	UND	3,00	$ 1.640.553,75	$ 4.921.661,25
35	9,04			SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA METALICA EN ALUMINIO 70-44 EN PISO 1	M2	14,00	$ 465.457,15	$ 6.516.400,16
36	9,05			SUMINISTRO EN INSTALACION DE PROTECTOR EM VARILLA CUADRADA DE 1'2" EN PISO 1	M2	14,00	$ 399.724,48	$ 5.596.142,73
37	9,06			SUMINISTRO DE BARANDA EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" Y 1 1'2" Y VIDRIO DE SEGURIDAD PARA PASAMANO ESCALERA EN PISO 1	M2	3,30	$ 1.043.866,64	$ 3.444.759,92
SUBTOTAL								**$ 25.511.795,39**
	10,00			**INSTALACIONES SANITARIAS PISO 1**				
38	10,01			SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS EN PISO 1	UND	3,00	$ 351.900,45	$ 1.055.701,35
39	10,02			SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS EN PISO 1	UND	2,00	$ 886.487,09	$ 1.772.974,17
40	10,03			SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES EN PISO 1	UND	1,00	$ 698.702,15	$ 698.702,15
41	10,04			PUNTO SANITARIO PVC 3" EN PISO 1	UND	3,00	$ 111.725,39	$ 335.176,16
42	10,05			PUNTO SANITARIO PVC 2" EN PISO 1	UND	9,00	$ 89.411,63	$ 804.704,70
43	10,06			REDES DE TUBERIA SANITARIA PVC 3" (INCLUYE ACCESORIO) EN PISO 1	ML	45,00	$ 70.106,76	$ 3.154.804,26
44	10,07			REDES DE TUBERIA SANITARIA PVC 2"(INCLUYE ACCESORIO) EN PISO 1	ML	40,00	$ 54.877,37	$ 2.195.094,98
45	10,08			REGISTRO SANITARIO DE INSPECCION EN LADRILLO COMUN (0,45X0,45) EN PISO 1	UND	5,00	$ 475.640,30	$ 2.378.201,51
46	10,09			PUNTO DE AGUA POTABLE PVC 1'2" EN PISO 1	UND	9,00	$ 54.404,91	$ 489.644,15
47	10,1			REDES DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 1'2" (INLCUYE ACCESORIOS) EN PISO 1	ML	50,00	$ 21.869,15	$ 1.093.457,48
SUBTOTAL								**$ 13.978.460,90**

Página 2

	11,00			**INSTALACIONES ELECTRICAS PISO 1**				
48	11,01			SALIDA TOMACORRIENTE 110 VOLTIOS PISO 1	UND	24,00	$ 163.978,69	$ 3.935.488,48
49	11,02			SALIDA TOMACORRIENTE 220 VOLTIOS (AIRE ACONDICIONADO) PISO 1	UND	8,00	$ 235.365,16	$ 1.882.921,29
50	11,03			SALIDA PARA SWITCHE SENCILLO PISO 1	UND	3,00	$ 52.097,60	$ 156.292,80
51	11,04			SALIDA PARA SWITCHE DOBLE PISO 1	UND	6,00	$ 64.397,41	$ 386.384,45
52	11,05			ACOMETIDA PARCIAL EN TUBERIA PVC DE 3/4" ALAMBRE AISLADO (TRES LINEAS N° 8) AWG THHN. N° 12 AWG. (THHN) PISO 1	ML	80,00	$ 51.612,88	$ 4.129.030,14
53	11,06			INTERRUPTOR DOBLE PISO 1	UND	6,00	$ 60.075,68	$ 360.454,05
54	11,07			INTERRUPTOR SENCILLO PISO 1	UND	3,00	$ 50.720,18	$ 152.160,53
55	11,08			SALIDA PARA LAMPARA LED 60 W PISO 1	UND	20,00	$ 172.113,13	$ 3.442.262,67
56	11,09			TABLERO ELECTRICO DE 12 CIRCUITOS PISO 1	UND	3,00	$ 448.556,13	$ 1.345.668,39
57	11,1			TOTALIZADOR CON CAJA PISO 1	UND	1,00	$ 468.603,63	$ 468.603,63
58	11,11			MALLA A TIERRA CON 3 VARILLAS COPER WELL DE 1,8 M X 5/8" PISO 1	UND	1,00	$ 1.345.320,90	$ 1.345.320,90
SUBTOTAL								**$ 17.604.587,32**
SUBTOTAL OBRAS PRIMER PISO								**$ 249.909.599,56**

PRESUPUESTO ADECUACIONES SEGUNDO PISO

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	12,00			**PRELIMINARES PISO 2**				
59	12,01			TRAZADO Y REPLANTEO EN PISO 2	M2	113,43	$ 6.014,25	$ 682.196,38
SUBTOTAL								**$ 682.196,38**
	13,00			**DEMOLICIONES PISO 2**				
60	13,01			DEMOLICION DE PISO Y PLANTILLA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL EN PISO 2	M2	113,43	$ 28.066,50	$ 3.183.583,10
Subtotal								**$ 3.183.583,10**
	14,00			**CIMENTACION Y ESTRUCTURA PISO 2**				
61	14,01			PLANTILLA DE NIVELACION EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,05M INCLUYE REFUERZO EN VARILLA DE 1'4" CADA 40CM EN PISO 2	M2	112,00	$ 82.554,97	$ 9.246.156,66
62	14,02			DINTELES DE 0,15X 0,2 M EN PISO 2	ML	15,00	$ 76.091,49	$ 1.141.372,34
63	14,03			VIGA DE AMARRE PARA REALCE Y CONFINAMIENTO DE MUROS DE 0,15 X 0,25 M REFORZADA CON DOS VARILLAS DE 3/8 Y GANCHOS DE 1'4 @ 20CM EN PISO 2	ML	196,50	$ 104.660,15	$ 20.565.718,60
SUBTOTAL								**$ 30.953.247,60**
	15,00			**MAMPOSTERIA PISO 2**				
64	15,01			LEVANTE EN BLOCK SAMO N° 4 EN PISO 2	M2	15,00	$ 70.100,76	$ 1.051.511,42
65	15,02			PAÑETE EN MORTERO RELACION 1:4 E: 0.02 EN PISO 2	M2	30,00	$ 29.544,07	$ 886.322,21
SUBTOTAL								**$ 1.937.833,63**

	16,00			**ACABADOS PISO 2**				
66	16,01			ESCARIFICACION DE PARED Y LOSA EN PISO 2	M2	950,00	$ 13.926,98	$ 13.230.629,45
67	16,02			ESTUCO EN PULYPLAS PARA MURO Y CIELO A TRES MANOS EN PISO 2	M2	950,00	$ 46.643,85	$ 44.311.657,50
68	16,03			PINTURA EN VINILO TIPO 1 A TRES MANOS EN PISO 2	M2	950,00	$ 27.923,58	$ 26.527.401,10
69	16,04			SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO DRYWAL, INCLUYE ACABADO PINTADO A 3 MANOS EN PISO 2	M2	143,43	$ 112.693,52	$ 16.163.631,97
	SUBTOTAL							**$ 100.233.320,02**
	17,00			**PISOS PISO 2**				
70	17,01			PISO EN BALDOSA EN PORCELANATO 0.6 X 0.6 EN PISO 2	M2	127,87	$ 160.380,00	$ 20.507.790,60
71	17,02			PISO EN CERAMICA TRAFICO PESADO ANTIDESLIZANTE BAÑO EN PISO	M2	5,00	$ 123.519,33	$ 617.596,65
72	17,03			ZOCALOS EN PISO 2	ML	150,00	$ 26.437,34	$ 3.965.600,29
73	17,04			ENCHAPE PARED BAÑO EN PISO 2	M2	28,60	$ 126.967,50	$ 3.631.270,50
	SUBTOTAL							**$ 28.722.258,04**
	18,00			**CUBIERTA PISO 2**				
74	18,01			SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA PERFIL 7, INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA ABARCO EN PISO 2	M2	173,00	$ 171.494,67	$ 29.668.577,59
75	18,02			IMPERMEABILIZACION EN MANTO EDIL DE 4MM PARA LOSA TANQUE, LOSA LIBRE Y ZABALETAS EN PISO 2	M2	40,00	$ 84.199,50	$ 3.367.980,00
76	18,03			ZABALETA EN BLOQUE VIBROPRENSADO No.4 EN PISO 2	ML	24,00	$ 29.738,46	$ 713.723,08
	SUBTOTAL							**$ 33.750.280,66**
	19,00			**CARPINTERIA PISO 2**				
77	19,01			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA DE 1.0 X 2.0 PISO	UND	6,00	$ 1.278.255,33	$ 7.669.531,98
78	19,02			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PARA BAÑO 0.85 X 2.0 PISO 2	UND	2,00	$ 1.251.525,33	$ 2.503.050,66
79	19,03			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA CORREDIZAS PRINCIPALES 1.6 X 2.0 PISO 2	UND	1,00	$ 1.745.862,17	$ 1.745.862,17
80	19,04			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA PARA BAÑO 0.76 X 1.8 M PISO 2	UND	1,00	$ 1.057.732,83	$ 1.057.732,83
81	19,05			SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA METALICA EN ALUMINIO 70-44 PISO 2	M2	20,58	$ 465.457,15	$ 9.579.108,24
82	19,06			SUMINISTRO EN INSTALACION DE PROTECTOR EM VARILLA CUADRADA DE 1\2" PISO 2	M2	21,00	$ 399.724,48	$ 8.394.214,10
83	19,07			SUMINISTRO DE BARANDA EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" Y 1 1\2" Y VIDRIO DE SEGURIDAD No. 10 PARA PASAMANO FACHADA PISO 2	M2	16,05	$ 1.043.866,64	$ 16.754.059,61
	SUBTOTAL							**$ 47.703.559,59**
	20,00			**INSTALACIONES SANITARIAS PISO 2**				
84	20,01			SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS EN PISO 2	UND	2,00	$ 351.900,45	$ 703.800,90
85	20,02			SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS EN PISO 2	UND	2,00	$ 886.487,09	$ 1.772.974,17
86	20,03			SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES EN PISO 2	UND	2,00	$ 698.702,15	$ 1.397.404,31
87	20,04			PUNTO SANITARIO PVC 3" EN PISO 2	UND	2,00	$ 111.725,39	$ 223.450,77
88	20,05			PUNTO SANITARIO PVC 2" EN PISO 2	UND	6,00	$ 89.411,63	$ 536.469,80
89	20,06			REDES DE TUBERIA SANITARIA PVC 3" (INCLUYE ACCESORIO) EN PISO 2	ML	5,00	$ 70.106,76	$ 350.533,81
90	20,07			REDES DE TUBERIA SANITARIA PVC 2"(INCLUYE ACCESORIO) EN PISO 2	ML	25,00	$ 54.877,37	$ 1.371.934,36
91	20,08			PUNTO DE AGUA POTABLE PVC 1\2" EN PISO 2	UND	6,00	$ 54.404,91	$ 326.429,43
92	20,09			REDES DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 1\2" (INLCUYE ACCESORIOS) EN PISO 2	ML	23,00	$ 21.869,15	$ 502.990,44
	SUBTOTAL							**$ 7.185.987,98**

	21,00			INSTALACIONES ELECTRICAS PISO 2				
93	21,01			SALIDA TOMACORRIENTE 110 VOLTIOS EN PISO 2	UND	38,00	$ 163.978,69	$ 6.231.190,09
94	21,02			SALIDA TOMACORRIENTE 220 VOLTIOS (AIRE ACONDICIONADO) EN PISO	UND	11,00	$ 235.365,16	$ 2.589.016,77
95	21,03			SALIDA PARA SWITCHE SENCILLO EN PISO 2	UND	3,00	$ 52.097,60	$ 156.292,80
96	21,04			SALIDA PARA SWITCHE DOBLE EN PISO 2	UND	10,00	$ 64.397,41	$ 643.974,08
97	21,05			ACOMETIDA PARCIAL EN TUBERIA PVC DE 3/4" ALAMBRE AISLADO (DOS LINEAS N° 12) AWG THHN. N°12 AWG. (THHN) EN PISO 2	ML	190,00	$ 42.217,28	$ 8.021.283,54
98	21,06			INTERRUPTOR DOBLE EN PISO 2	UND	6,00	$ 60.075,68	$ 360.454,05
99	21,07			INTERRUPTOR SENCILLO EN PISO 2	UND	3,00	$ 50.720,18	$ 152.160,53
100	21,08			SALIDA PARA LAMPARA LED 60 W EN PISO 2	UND	39,00	$ 172.113,13	$ 6.712.412,21
SUBTOTAL								$ 24.866.784,07
SUBTOTAL OBRAS SEGUNDO PISO								$ 279.219.051,07

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 529.128.650,63
VALOR TOTAL	$ 529.128.650,63

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A=	25%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	5%
	UTILIDAD	U=	5%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	35%

5. RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO (parafiscales).

ANEXO 15: BITACORA

22-08-2024: En el día de hoy se realiza firma del documento acta de inicio, se realiza un recorrido de obra entre contratista, interventoría y secretario de desarrollo territorial e infraestructura. Se realiza instalación de valla informativa del proyecto.

23-08-2024: En el día de hoy se realizan las excavaciones para instalar listones de madera que conforman la estructura de soporte que va sobre todo el perímetro de la obra tanto del lado de la calle como del lado de la carrera y todo lo que tiene que ver con el cerramiento de la obra. Este cerramiento se realiza en lona verde.

24-08-2024: se inician actividades en la 2da planta de la estructura, se comienza a desmontar el cielo raso existente, el cual estaba construido en laminas de steel y se encontraba en mal estado al igual que la estructura de soporte en madera.

26-08-2024: se continua con el desmonte de cielo en piso 2, se realiza acopio de este material en el patio de la primera planta.

27-08-2024: se realiza retiro de material sobrante de la estructura en madera de soporte del cielo raso, se continúa con el desmonte de cielo raso en las demás oficinas que conforman la 2da planta. Se presentaron lluvias en horas de la tarde de 3:00 - 4:00 p.m.

Interventoría

28-08-2024: En el día de hoy se inician actividades para desmonte de puertas y ventanas existentes en la 2da planta de la estructura, las cuales se encontraban en mal estado, también se continua con el retiro de madera y cielo raso.

Interventoría

29-08-2024: En el día de hoy se continúan actividades de desmonte de puertas y ventanas en piso 2, también se realiza demolición de muros existentes según nuevo diseño. Se presentaron lluvias en horas de la tarde de 3:00 - 4:30 pm.

Interventoría

30-08-2024: se continúa con la demolición de muros existentes y retiro de escombros en la 2da planta y desmonte de puertas y ventanas en el resto de oficinas.

Interventoría

31-08-2024: Se continúa con el retiro de escombros en la 2da planta, producto de las demoliciones de muros existente, también se realizo desmonte de puertos y ventanos en Baños de la 2da planta.

Interventoría

2-09-2024: Se inician la demolición de pisos existentes en la 2da planta, el cual se encontraba construido en baldosín, también se continúo con el retiro de escombros producto de las demoliciones de muros internos en pisos.

Interventoría

3-09-2024: Se realiza retiro de escombros producto de la demolición de pisos existentes en la 2da planta, también se realiza demolición de muros internos existentes, con nuevo diseño.

Interventoría

4-09-2024: se continuan actividades de demolición de pisos existentes en 2da planta y retiro de escombros, se presentan lluvias en horas de la mañana de 9:00 - 11:00 am.

Interventoría

5-09-2024: En el dia de hoy se realiza escarificación de plantilla y demolición de pisos existentes en la 2da planta se realiza retiro de escombros de muros existentes.

Interventora

6-09-2024: En el dia de hoy se realiza demolición de pisos existentes en la 1ra planta y tambien se realiza escarificación de muros para baños, se realiza retiro de enchape existente. En la 2da planta también se realiza demolición de plantillos y retiro de escombros.

Interventora

7-09-2024: se continua con la demolición de pisos existentes en la 1ra planta y retiro de material de escombros en la 2da planta se realiza escarificion de plantillo y tambien se comienza a realizar construcción de los primeros filetes donde se realiza retiro de puertos y ventanas exstentes.

Interventora

9-09-2024: En la 2da planta en el dia de hoy se continua con la construcción de filetes en marcos de puertos y ventanos. En la 1ra planta se realiza demolición de plantillos. se presentan lluvias en horas de la tarde de 2:00 - 4:00 pm.

Interventora

10-09-2024: En el dia de hoy se realiza demolición y retiro de material para plantillos en la 1ra planta, en la 2da planta se realiza levante de muros en bloque semi para los puertos y ventanas que se van a modificar segun el nuevo diseño.

Interventoria

11-09-2024: Se realiza levante de muros en la 2da planta para division de nuevos oficinas, en la 1ra planta se realiza excavaciones para instalación de redes sanitarios y aguas lluvias. Tambien se realiza retiro de escombro. En el dia de hoy ingresa a la obra material de cuarilla y arena para fundir los primeros plantillos en 2da planta.

Interventoria

12-09-2024: En la 2da planta en el dia de hoy se realiza resane de muros en mortero 1:4 E=0,02 mts, este paiete se viene realizando en muros para division de nuevos oficinas segun nuevo diseño. En la 1ra planta se continúa con las excavaciones para la instalación de redes sanitarios.

Interventoria

13-09-2024: En el dia de hoy en la 1ra planta se realiza instalación de redes sanitarios y construcción de registros sanitarios de (0,45 x 0,45) mts. En la 2da planta se continua escarificando plantillos para su nivelación.

Interventoria

14-09-2024: En el dia de hoy se continuo con la construccion de registros sanitarios en ladrillo comun (0.45x0.45) mts en la 1ra planta, en la 2da planta se continuo acondicionando plantillos para su posterior fundida, estos plantillos seran en concreto 3000 PSI E=0,07 mts y refuerzo en varillas de 3/4". cada 0,4 mts.

Interventoria

16-09-2024: En instalaciones de la 2da planta se realiza construccion de filetes para ventanas tambien se realiza Escarificacion de plantillos para su nivelacion. En la 1ra planta se realiza demolicion de muros para puertas nuevas y ventanas. En el dia de hoy se presento Fuerte vendaval en el municipio de Galapa.

Interventoria

17-09-2024: En la 2da planta se realiza levante de muros en block comun #4 para construccion de baño nuevo segun diseños, tambien se realiza retiro de material de escombros producto de la demolicion de una viga existente. En la 1ra planta se realiza mejoramiento de terreno para plantillos en material seleccionado.

Interventoria

18-09-2024: En la 2da planta se realiza la primera fundida de plantillos en concreto de 3000 PSI con su respectivo acero de refuerzo en varillas de 1/4" cada 0,40 mts. En la 1ra planta se realiza mejoramiento de terreno con material seleccionado para fundir plantillos.

Interventoria

19-09-2024: En el día de hoy se continúa fundiendo plantillas en piso 2, también se realiza pared de muros para baño nuevo. En la 1ra planta se realiza levante de muros para cuchillos. Se presentan lluvias en horas de la tarde de 2:00 - 4:00 pm.

Inspectora

20-09-2024: En la 1ra planta se continua levante de muros para construcción de cuchillos y también se realiza mejoramiento de terreno para fundir plantillas, se realiza retiro de escombros producto de las demoliciones

Inspectora

21-09-2024: En la 2da planta se continúa fundiendo plantillas de nivelación, para posteriormente fundir piso en acabado en porcelanato de 60x60. En la 1ra planta se continúa con la construcción de cuchillos en block Zampo #4.

Inspectora
