REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: F4-JA-PC5-1010 VERSIÓN: 6 FECHA: 09-10-2024

1. DATOS DEL INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [X]

ACTA PARCIAL [ ] NÚMERO 1 PERIODO: 19 de diciembre -26 de diciembre de 2024

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO/CONVENIO Y SU EJECUCIÓN

Contrato / Convenio No.	705-2024	*Fecha (dd/mm/aaaa):*	17 de diciembre 2024
Nombre completo del contratista:		ALFA METALMECANICA SAS	
Documento de identificación:		901472475	
Nombre del supervisor:		JORGE ARMANDO VALERO HERNANDEZ	
Unidad Administrativa:		Secretaría de Infraestructura y Equipamiento Municipal	

Objeto del contrato: PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA, COMO LA RETROEXCAVADORA ORUGA CASE 135, MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G, VOLQUETA INTERNATIONAL OVR 085, RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B9OB Y VIBROCOMPACTADOR LEBRERO, ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO.

3. INFORME JURÍDICO

	Fecha de Inicio						Fecha terminación					
	Día	19	Mes	12	Año	2024	Día	30	Mes	12	Año	2024
Modificación(es) al contrato: *Elegir (X / NA)*												
Suspensión: *Elegir (X / NA)*							Día		Mes		Año	
Reanudación: *Elegir (X / NA)*							Día		Mes		Año	
Terminación anticipada: *Elegir (X / NA)*							Día		Mes		Año	
Prórroga o Adición: *Elegir (X / NA)*							Día		Mes		Año	

4 INFORME PRESUPUESTAL, CONTABLE Y FINANCIERO

4.1 Informe Presupuestal

Número de CDP: 2024001940	Fecha de CDP: 02/12/2024	Valor: $ 36.270.800	
Número de RP: 2024002126	Fecha de RP: 19/12/2024	Valor: $ 36.150.800	
Diligenciar en caso de Adición en el contrato (solo si aplica)			
Número de CDP Adición:	Fecha de CDP Adición:	Valor:	

Número de RP Adición:	Fecha de RP Adición:		Valor:

4.2 Informe Contable

Valor inicial del contrato: TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS	$ 36.150.800
Adición:	$
Valor Total del contrato	$ 36.150.800

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos: (*marcar con X la selección correspondiente*)	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		

4.3 Información financiera:

• Ejecución

N°	Valor Total del Contrato / Convenio (A)	Valor Cuota /acta parcial para pago	Valor Acumulado de ejecución (B)	Saldo por Ejecutar (C=A-B)
1	$ 36.150.800	$ 36.150.800	$ 36.150.800	$ 0
2				

• Pagos

N°	Valor Cuota pagada	N° Comprobante de Egreso	Fecha de pago (dd/mm/aaaa)	Valor Acumulado de pagos (B)	Saldo por pagar (C=A-B)

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N° PIN	Referencia	Autorización
	7951713151		
	Operador	Pago	N° Planilla
	Aportes en línea	$377.300	7951713151
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	04/12/2024	noviembre	

Observaciones al informe financiero y contable: se pondría este texto: El contratista acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de (noviembre) de (2024), último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la cuota del contrato, de conformidad con lo dispuesto en Ley 1995 de 2019. No obstante, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 que establece que: "Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas", y teniendo en cuenta que a la luz del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no es obligatoria, el contratista deberá acreditar ante el Supervisor el pago de los aportes su seguridad social del mes de (noviembre)de (2024). En caso de que el contratista no cumpla con la obligación del pago de los aportes a la seguridad social, el Supervisor deberá reportar el eventual incumplimiento en el pago de aportes a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin que esta entidad adelante las acciones pertinentes a que haya lugar

5. INFORME TÉCNICO

Informe Consolidado de Mantenimiento de Maquinaria

Se realizó el mantenimiento correctivo de diversos equipos, detallado de la siguiente manera:

1. Retro Orugas Case 135

- Desmonte, limpieza y evaluación de potencia de la bomba secundaria (1 unidad).
- Suministro e instalación de empaquetadura para el montaje de la bomba secundaria (1 unidad).
- Desmonte, limpieza y evaluación de potencia de la bomba principal (1 unidad).
- Suministro e instalación de platos de válvula izquierdo y derecho de la bomba principal (2 unidades).
- Suministro e instalación de empaquetadura para el montaje de la bomba principal (1 unidad).
- Suministro e instalación de sensor de cuerpo de válvulas (1 unidad).
- Reparación de eje de bomba en torno, incluyendo metalización (1 unidad).

2. Motoniveladora John Deere 670 G

- Desmonte, revisión y reparación del comando de mandos principales (1 unidad).
- Prueba de eficiencia del sistema hidráulico (1 unidad).
- Suministro e instalación de deslizadores superiores (4 unidades).

- Suministro e instalación de deslizadores principales o inferiores (2 unidades).
- Suministro e instalación de cuchillas de hoja principal (13 huecos ancha), incluyendo tornillos (2 unidades).
- Suministro e instalación de mangueras de presión R12 de 2.5 a 3.0 m (2 unidades).
- Reparación de gatos principales de soporte y movimiento vertical de cuchilla (2 unidades).

3. Volqueta International OVR 085


- Suministro e instalación de ventilador de radiador (1 unidad).
- Suministro e instalación de coraza y enfoque de radiador (1 unidad).
- Revisión y reparación del alzado del volco, incluyendo reposición de bujes (2 unidades).
- Revisión y reparación del sistema de alzado del volco, sistema de toma fuerza y válvula de compuerta (1 unidad).


4. Retro New Holland B90B

- Desmonte, limpieza y evaluación de la servotransmisión (1 unidad).
- Reparación e instalación de convertidor de servotransmisión (1 unidad).
- Suministro e instalación de bomba hidráulica (1 unidad).
- Reparación de gatos gemelos traseros, incluyendo desmonte, sellos y empaquetadura (1 unidad).


5. Vibrocompactador Lebrero


- Suministro e instalación de soportes de cilindro (cauchos principales) (6 unidades).

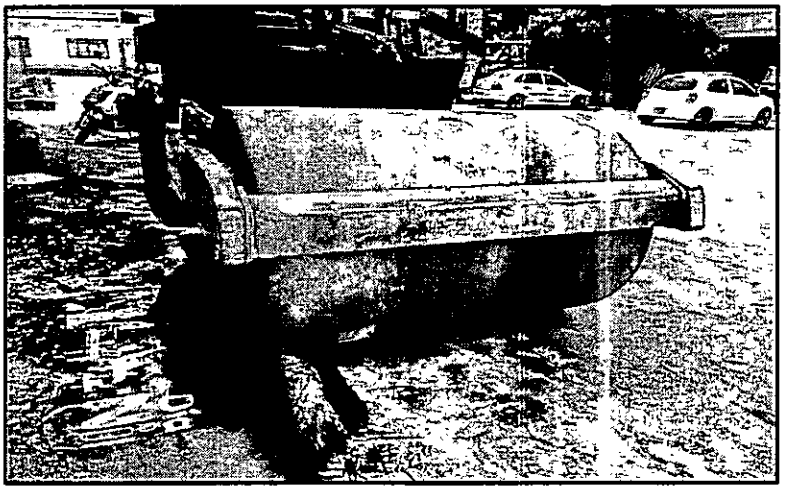


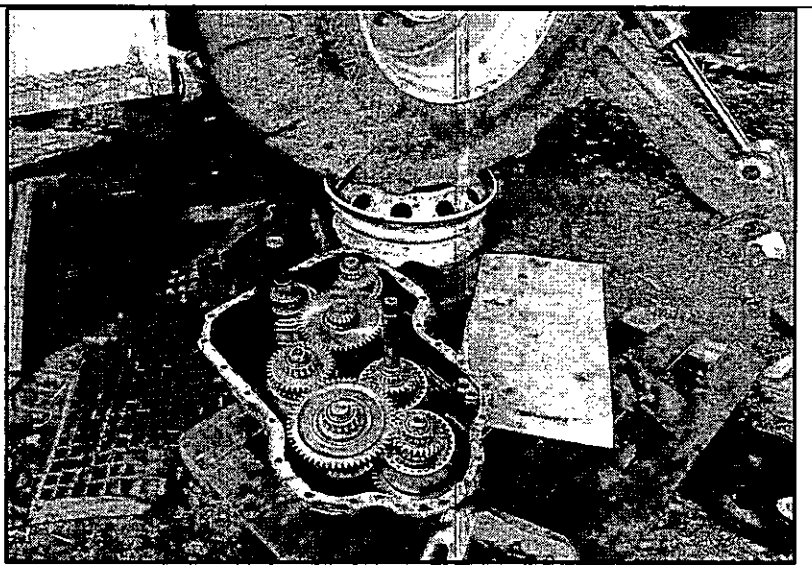




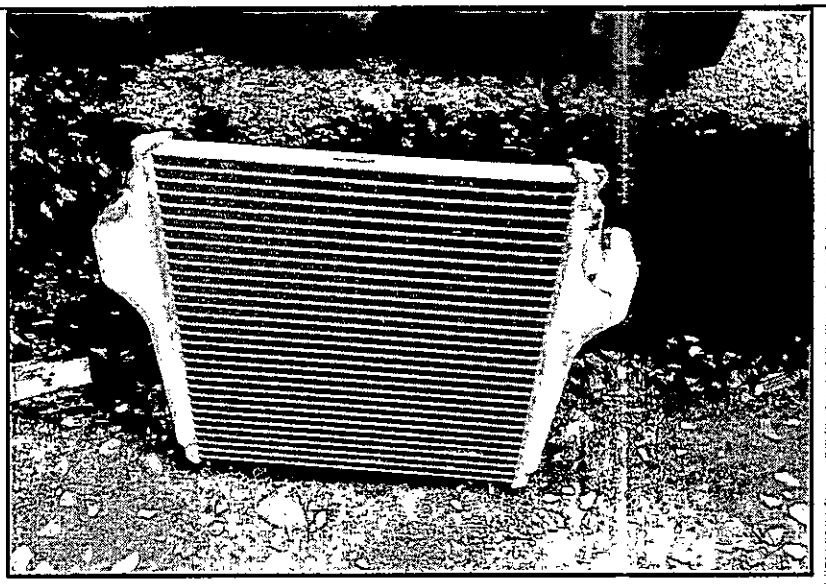

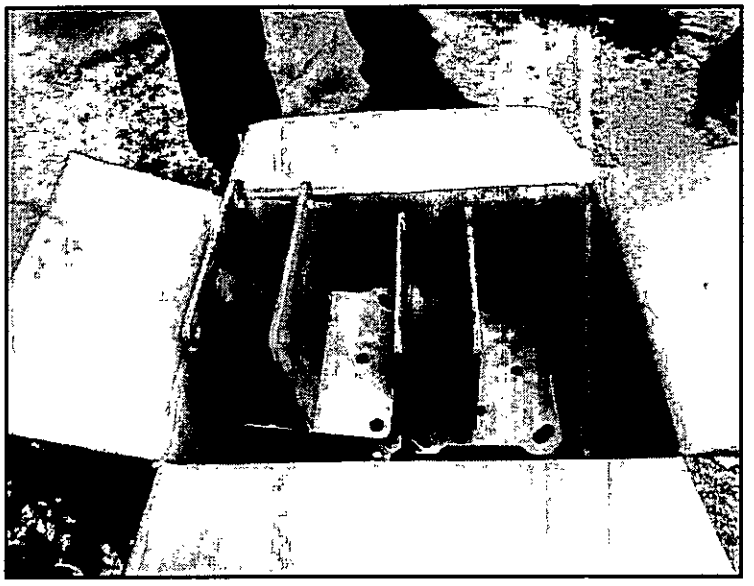

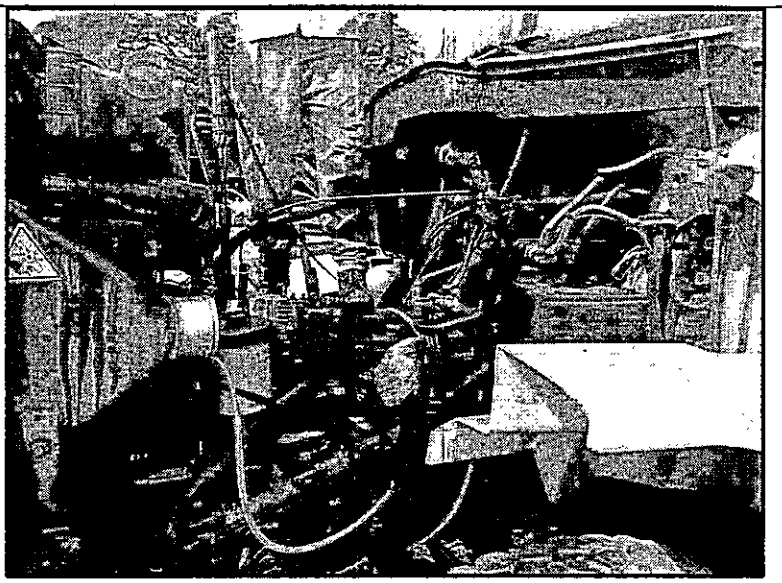

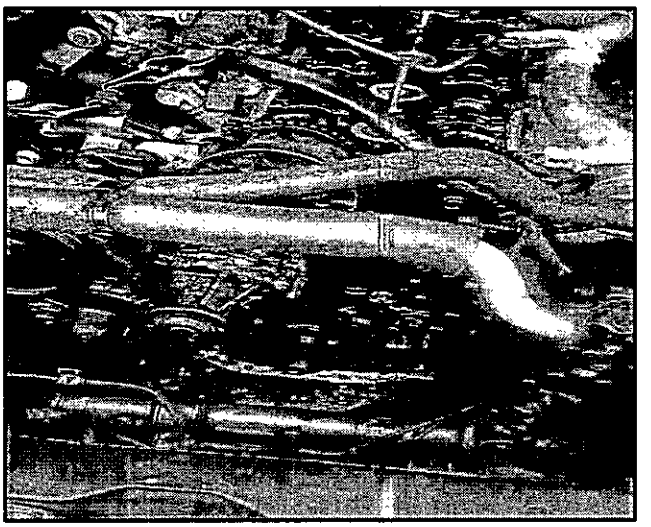



CONTRATO N° 705 del 2024

Recibo a Satisfacción de Servicios: *(aplica solo para el último informe a la finalización del contrato)* Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA, de los servicios prestados pactados en el contrato N° 705 del 2024.

Constancia de Paz y Salvo: *(aplica solo para el último informe a la finalización del contrato)* El Contratista la fecha del presente informe no posee a cargo elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a paz y salvo con el archivo de gestión documental y el sistema de Gestión documental como consta en el formato F2-DL-PC4-1050 Formato de Paz y Salvo Documental

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

7. FIRMAS RESPONSABLES

JORGE ARMANDO VALERO HERNANDEZ
Supervisor del contrato

Fecha de suscripción del informe de supervisión. Santander de Quilichao, Cauca, Diciembre 26 de 2024

Redactor/transcriptor: Ing. Sandra Carolina Capote. ___
Sub serie documental: Expediente del contrato
