INFORME DE OBRA

CONTRATO No MC 095 DE 2024



OBJETO: **"MEJORAMIENTO DEL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO OROZCO, COMUNIDAD INDÍGENA DE TAURETES, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."**

SOLSIC RC SAS

R/L JESUS MARIA ROJAS PARADA

DICIEMBRE DE 2024

CONTENIDO

1. INTRODUCCION....4
2. UBICACIÓN DEL PROYECTO....5
2.1 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO....5
2.2 LOCALIZACIÓN GRAFICA DEL SITIO DE LA OBRA....5
3. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO....7
4. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO....7
4.1 INFORMACION GENERAL CONTRATO DE OBRA No MC 095 DE 2024....7
4.2. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA....8
4.3. POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA - ASPECTO ADMINISTRATIVO – LEGAL....8
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO:....8
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL....9
5. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA....9
6. ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO....9
7. ANTECEDENTES Y ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO.....10
7.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA....10
7.2. COMITÉS DE OBRA....11
8. ACTIVIDADES EJECUTADAS.....11
1 CONSERVACION DE CAMINOS....11
RELACION DEL PERSONAL DE OBRA....13
FOTOCOPIA DE LAS NOMINAS ELECTRONICAS Y SOPORTE DE PAGO....14
ACTIVIDADES FINANCIERAS....14
CONCLUSIONES....15
LISTADO DE ANEXOS....16

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Ubicación de orden departamental de Boyacá 5

Ilustración 2. Ubicación de orden municipal de Cubara 6

Ilustración 3. Localización específica del desarrollo de la obra 6

Ilustración 4. aserramiento de Madera. 11

Ilustración 5,-. lijado y preparacion de las tablas 12

Ilustración 6. desmonte de la tabla existente 12

Ilustración 7. transporte y organización de las tablas 12

Ilustración 8. instalacion de tablas nuevas 13

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Información General del Contrato 8

Tabla 2. Relación de actas del contratista 8

Tabla 3. Póliza de seguro de responsabilidad civil 9

Tabla 4. Poliza de seguro de cumplimiento 9

Tabla 5. cantidades iniciales del contrato 9

Tabla 6. Presupuesto general del contrato 10

Tabla 7. Personal profesional y administrativo 13

Tabla 8. Personal no calificado 14

Tabla 9. actividades financieras 14

1. INTRODUCCION

La alcaldía del Municipio de Cubará, mediante el proceso de Mínima Cuantía, proceso **MC-095 DEL 2024** concluyo contratar los servicios de la empresa **SOLSIC RC SAS** identificada con Nit **901.773.344-3 R/L JESUS MARIA ROJAS PARADA**, mediante contrato de obra MC-095 del 2024 cuyo objeto es "**MEJORAMIENTO DEL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO OROZCO, COMUNIDAD INDÍGENA DE TAURETES, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**" para desarrollar el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso, los cuales contienen los parámetros y lineamientos técnicos administrativos que brindaran el correcto desarrollo de la obra.

El presente Informe, resume las actividades ejecutadas y actos administrativos acumulados durante el periodo de ejecución de la obra, y el tiempo transcurrido desde el acta de inicio del contrato de obra pública N.º MC-095 DEL 2024 hasta la fecha del presente informe, que de acuerdo con el desarrollo de las actividades de obra bajo la supervisión, seguimiento y acompañamiento de la Secretaria de Planeación y Obras Públicas y de la interventoría, cabe resaltar que durante este periodo no se suscribieron actas de suspensión por lo que se le ha dado ejecución continua al proyecto.

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Cubará es un municipio colombiano ubicado en el extremo nororiental del departamento de Boyacá. Se encuentra en la región del Sarare y forma parte de la subregión del Piedemonte Llanero de la Orinoquía colombiana. Limita con los departamentos de Norte de Santander al noroeste, Santander al oeste y norte, y Arauca al este, compartiendo frontera con Venezuela y se encuentra a una altitud de 357 metros sobre el nivel del mar y limita con el río Arauca.

2.2 LOCALIZACIÓN GRAFICA DEL SITIO DE LA OBRA

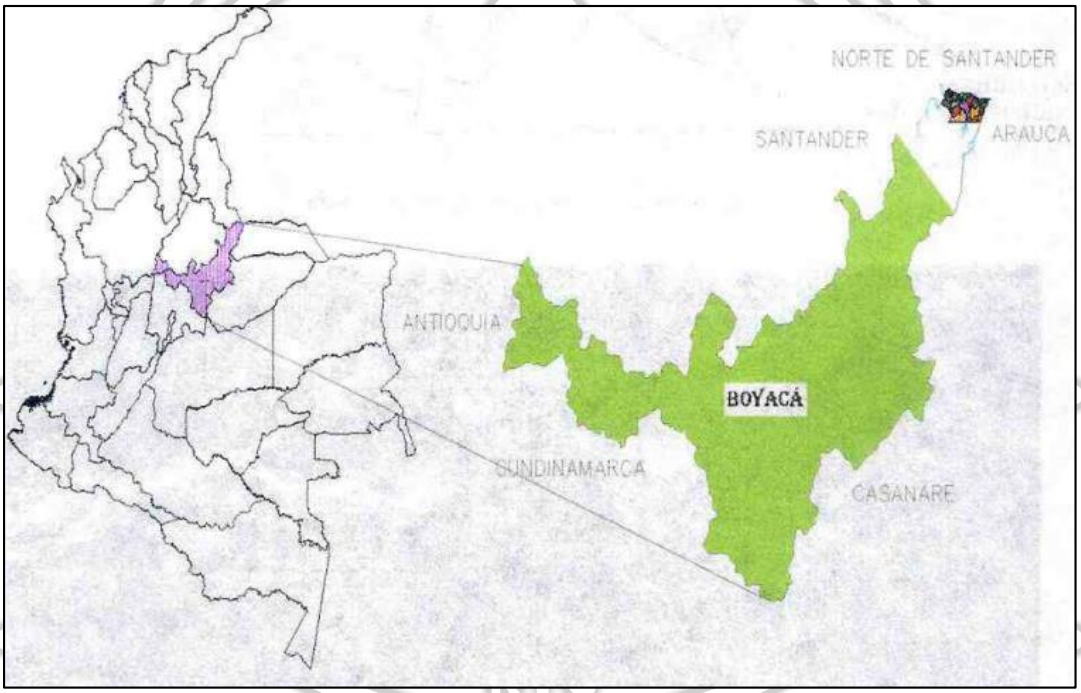


Ilustración 1. Ubicación de orden departamental de Boyacá

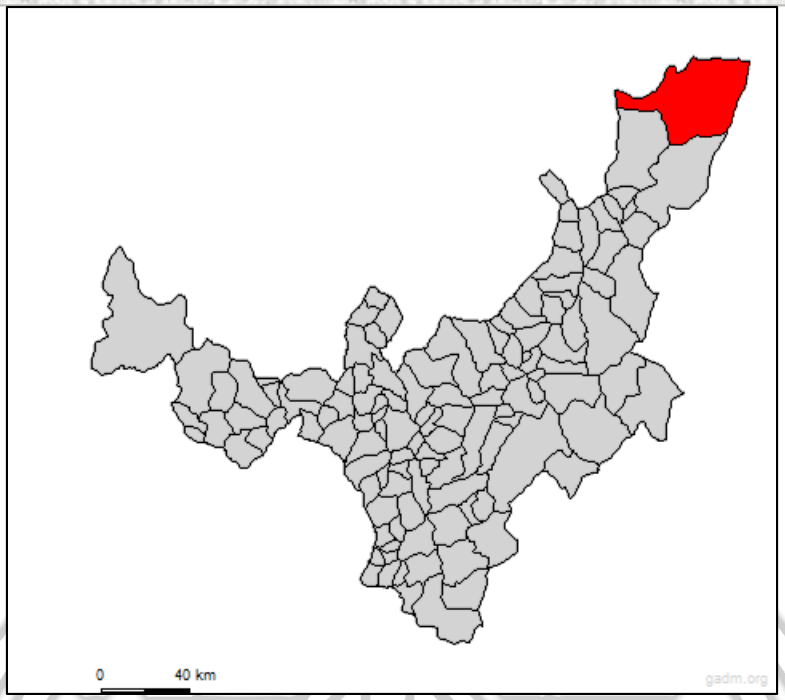


Ilustración 2. Ubicación de orden municipal de Cubara



Ilustración 3. Localización específica del desarrollo de la obra

El puente colgante sobre la quebrada Orozco, comunidad de Tauretes, resguardo Indígena Unido U'WA, municipio de Cubara, departamento de Boyacá, con con coordenadas, 7.01156167°N, 72.27249799°O.

3. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto denominado: **" MEJORAMIENTO DEL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO OROZCO, COMUNIDAD INDÍGENA DE TAURETES, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ",** prioriza la conexión del resguardo indígena unido U´WA, en la comunidad de Tauretes, mediante el mantenimiento de la tabla del Puente, la cual se encuentra en un significativo estado de deterioro. El proceso tendrá una duración de quince (15) días calendario.

4. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N° MC 095 DE 2024.

4.1 INFORMACION GENERAL CONTRATO DE OBRA No MC 095 DE 2024

CONTRATO DE OBRA NO:	**MC-095-2024**
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA MUNICIPAL DEL CUBARA**
CONTRATISTA:	**SOLSIC RC SAS** **R/L JESUS MARIA ROJAS PARADA**
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	**C.C. NO. 96.185.685 EXPEDIDA EN SARAVENA**
NIT:	**901.773.344-3**
OBJETO:	**MEJORAMIENTO DEL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO OROZCO, COMUNIDAD INDÍGENA DE TAURETES, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**

VALOR CONTRATO:	**DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL TREINTA Y OCHO PESOS ($10.750.038) M/CTE**
FECHA DE INICIO:	**04 DE DICIEMBRE DE 2024**
PLAZO INICIAL:	**QUINCE (15) DIAS APARTIR DE LA FECHA DE ACTA DE INICIO**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	**15 DE DICIEMBRE DE 2024**
SUPERVISOR:	**JOSE LEONARDO ARAQUE CONTRERAS**
MUNICIPIO:	**CUBARA – BOYACA**

Tabla 1. Información General del Contrato

4.2. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA

ACTA	FECHA	OBSERVACION
ACTA DE INICIO	04 DE DICIEMBRE 2024	Sin observaciones

Tabla 2. Relación de actas del contratista

4.3. POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA - ASPECTO ADMINISTRATIVO – LEGAL

De acuerdo con las garantías exigidas por el Municipio de Cubara en el Contrato de Obra pública MC-095-2024, se suscribe con la compañía de seguros ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la minuta contractual en la CLÁUSULA 18 GARANTIAS del Contrato así:

Pólizas iniciales, etapa legalización.

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO:

AMPARO	Nº DE PÓLIZA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	COMPAÑÍA ASEGURADORA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	49-40-101011174	Desde 29/11/2024 hasta 15/12/2024	$260,000,000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	49-40-101011174	Desde 29/11/2024 hasta 15/12/2024	$260,000,000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	49-40-101011174	Desde 29/11/2024 hasta 15/12/2024	$260,000,000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Tabla 3. Póliza de seguro de responsabilidad civil

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

AMPARO	Nº DE PÓLIZA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	COMPAÑÍA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	49-44-101034997	**Desde** 29/11/2024 **hasta** 15/04/2025	$1,075,000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	49-44-101034997	Desde 29/11/2024 hasta 15/12/2027	$537,500.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	49-44-101034997	Desde 29/11/2024 hasta 15/04/2025	$1,075,000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	49-44-101034997	Desde 29/11/2024 hasta 15/04/2026	$2,150,000.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Tabla 4. Poliza de seguro de cumplimiento

5. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD
1	**CONSERVACION DE CAMINOS**		
1.1	REPOSICION DE ESTRUCTURA DE PISO EN MADERA (TABLA DE 0,25* 2 mts; E = 0,04 mts)	UNID	78,00

Tabla 5. cantidades iniciales del contrato

6. ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO

A la fecha del informe se tiene un avance de obra del 100%, dentro del periodo de ejecución del proyecto, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ -TOTAL
1	**CONSERVACION DE CAMINOS**				
1.1	REPOSICION DE ESTRUCTURA DE PISO EN MADERA (TABLA DE 0,25* 2 mts; E = 0,04 mts)	UNID	78,00	$ 137.821,00	$ 10.750.038,00
				SUBTOTAL OBRA	**$ 10.750.038,00**
VALOR TOTAL					**$ 10.750.038,00**

Tabla 6. Presupuesto general del contrato

7. ANTECEDENTES Y ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO.

- El 2c 9 de noviembre de 2024 se suscribe carta de aceptación de la oferta del proceso de contratación Mínima Cuantía No. MC-095 DE 2024, donde fue adjudicado al proponente: SOLSIC RC SAS R/L JESUS MARIA ROJAS PARADA por valor de DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL TREINTA Y OCHO PESOS ($10.750.038) M/CTE

- El 04 de diciembre de 2024 se firma el Acta de Inicio del Contrato de Obra, una vez las garantías presentadas fueron aprobadas por el Municipio de Cubará.

7.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Durante el periodo de ejecución del proyecto No. MC-095 de 2024., no se envió, ni se recibió correspondencia.

7.2. COMITÉS DE OBRA

Durante el periodo de ejecución del proyecto, no han surgido eventos que motiven el desarrollo de comités técnicos de obra, modificación de cantidades, o cambios en aspectos técnicos del contrato de Obra No. MC-095 de 2024.

8. ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Durante el periodo de ejecución para el contrato No. MC-095 DE 2023, se ejecutaron las siguientes actividades, cumpliendo con la programación de obra presupuestada:

1 CONSERVACION DE CAMINOS

1.1 REPOSICION DE ESTRUCTURA DE PISO EN MADERA (TABLA DE 0,25* 2 mts; E = 0,04 mts): se realizó una inspección detallada de las estructura del piso, para determinar la cantidad de tablas que se encontraban en estado de deterioro. Posteriormente se procede a quitar el revestimiento parcial del piso (tablas de madera), este procedimiento se realiza con mucho cuidado, teniendo en cuenta que algunos elementos pueden requerir soportes. Seguido de esto se instala las nuevas tablas de madera, las cuales fueron previamente aserradas y lijadas con cuidado, teniendo en cuenta las medidas especificadas. **Cantidad: 78 und.**

Ilustración 4. aserramiento de Madera.





Ilustración 5,-. lijado y preparación de las tablas





Ilustración 6. desmonte de la tabla existente





Ilustración 7. transporte y organización de las tablas





Ilustración 8. instalación de tablas nuevas





- Se anexa registro fotográfico (**ver anexo 1. Registro fotográfico**)

RELACION DEL PERSONAL DE OBRA

Todo el personal utilizado en la construcción de las obras previstas y el personal administrativo, se encuentra afiliado al sistema de seguridad social y pago de parafiscales, según lo acordado y estipulado en la ley teniendo en cuenta los parámetros de seguridad asociados a la generación de espacios íntegros y protegidos para la ejecución de estas.

- **Personal Profesional y Administrativo Utilizado**

NOMBRE	CARGO	F. INGRESO	EPS	PENSIÓN	ARL
Luis Eduardo Ostos Marchena	Residente	04/12/24	Sanitas	Porvenir	Sura

Tabla 7. Personal profesional y administrativo

- **Mano de Obra no Calificada**

NOMBRE	CARGO	F. INGRESO	EPS	PENSIÓN	ARL
Jhon Mario Ariza Aguilar	Oficial	04/12/24	Nueva EPS	Protección	Sura

Edward Contreras Runia	Obrero	04/12/24	Nueva EPS	Colpensiones	Sura
Kuana Aguablanca Aguablanca	Obrero	04/12/24	Nueva EPS	Colpensiones	Sura

Tabla 8. Personal no calificado

- Se anexan planillas de pago de seguridad social y parafiscales del personal relacionado. (**ver anexo 2. seguridad social y parafiscales**)

FOTOCOPIA DE LAS NOMINAS ELECTRONICAS Y SOPORTE DE PAGO

Se aportan la nómina del personal con el soporte de pago individual del mes de diciembre de 2024 (**Ver Anexo No.3. Nóminas y paz y salvos del personal**).

ACTIVIDADES FINANCIERAS

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALORES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 10.750.038,00**
VALOR EJECUTADO	**$ 10.750.038,00**
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 10.750.038,00**

Tabla 9. actividades financieras

CONCLUSIONES

Conforme con la ejecución del Contrato de mínima cuantía No. MC-095-2024 cuyo objetivo es la "**MEJORAMIENTO DEL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO OROZCO, COMUNIDAD INDÍGENA DE TAURETES, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**" DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE CUBARÁ – BOYACÁ.", se puede resaltar lo siguiente:

- Se garantizó la ejecución de las actividades del contrato No. MC-095-2024 que tiene como objeto: "**MEJORAMIENTO DEL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO OROZCO, COMUNIDAD INDÍGENA DE TAURETES, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**", las cuales se ejecutaron dentro de los parámetros técnicos requeridos, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas generales del Contrato, garantizando así, la calidad de las obras ejecutadas.

- De acuerdo al seguimiento realizado a la ejecución del Contrato No. MC-095-2024, a la fecha del presente informe, se presentan los siguientes rendimientos: Avance en tiempo 100.00%, avance físico general (100,00%) y Avance Financiero de 100,00% correspondiente a **DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL TREINTA Y OCHO PESOS ($10.750.038) M/CTE**.

Cordialmente,

_____

SOLSIC RC SAS
R/L JESUS MARIA ROJAS PARADA

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 1. Registro fotográfico

ANEXO 2. Planilla seguridad social

ANEXO 3. Nominas Paz y salvos personal

ANEXO 4. certificación cabildo mayor comunidad Tauretes

ANEXO 5. Memorias de cantidades

ANEXO 6. Bitácora de Obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO
CONTRATO No MC 095 DE 2024
OBJETO: "MEJORAMIENTO DEL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO OROZCO, COMUNIDAD INDÍGENA DE TAURETES, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."





Estado inicial del puente Orozco





Aserramiento de madera





Transporte y organización de tablas





Lijado y preparacion de tablas





desmonte de la tabla existente





instalación de tablas nuevas




instalación de tablas nuevas




instalación de tablas nuevas




instalación de tablas nuevas

	
Estado actual del puente Orozco	
	
Estado actual de puente orozco	

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 31970038
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-12-18

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	SOLSIC RC SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901773344	D.V.	3	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 28 20 A 33	DEPARTAMENTO	ARAUCA	MUNICIPIO	SARAVENA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4210	CORREO ELECTRÓNICO	SOLSICRCSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3144576579
FAX	0	SUCURSAL	002	NOMBRE SUCURSAL	empleados
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	96185685	PRIMER APELLIDO	ROJAS	SEGUNDO APELLIDO	PARADA
PRIMER NOMBRE	JESUS	SEGUNDO NOMBRE	MARIA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 12	Año: 2025	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		$3.446.964		31970038

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1005302858	1	No	No	No	15	223	5711001	Fijo	AGUABLANCA AGUABLANCA KUANA	$1.300.000
CC-91542565	1	No	No	No	15	223	5711001	Fijo	ARIZA AGUILAR JHON MARIO	$1.300.000
CC-1134844027	1	No	No	No	15	223	5711001	Fijo	CONTRERAS RUNIA EDWARD	$1.300.000
CC-17583585	1	No	No	No	15	223	5711001	Fijo	OSTOS MARCHENA LUIS EDUARDO	$1.300.000

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1005302858	X	2024-12-04	X	2024-12-15							C																		0		
CC - 91542565	X	2024-12-04	X	2024-12-15							C																		0		
CC - 1134844027	X	2024-12-04	X	2024-12-15							C																		0		
CC - 17583585	X	2024-12-04	X	2024-12-15							C																		0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1005302858	COLPENSIONES	12	$713.580	0.1600000	$114.200	$0	$0	$114.200	$0	$0	$0
CC - 91542565	COLPENSIONES	12	$958.296	0.1600000	$153.400	$0	$0	$153.400	$0	$0	$0
CC - 1134844027	PROTECCION	12	$713.580	0.1600000	$114.200	$0	$0	$114.200	$0	$0	$0
CC - 17583585	PORVENIR	12	$958.296	0.1600000	$153.400	$0	$0	$153.400	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1005302858	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	12	$713.580	0.0400000	$28.600	$0		$0		$0	12	$713.580	90177334	0.0696000	$49.700

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 91542565	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	12	$958.296	0.0400000	$38.400	$0		$0		$0	12	$958.296	90177334	0.0696000	$66.700
CC - 1134844027	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	12	$713.580	0.0400000	$28.600	$0		$0		$0	12	$713.580	90177334	0.0696000	$49.700
CC - 17583585	SANITAS	12	$958.296	0.0400000	$38.400	$0		$0		$0	12	$958.296	90177334	0.0696000	$66.700

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1005302858	COMFABOY	12	$734.285	0.0400000	$29.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-91542565	COMFABOY	12	$989.197	0.0400000	$39.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1134844027	COMFABOY	12	$734.285	0.0400000	$29.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-17583585	COMFABOY	12	$989.197	0.0400000	$39.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$31.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$31.000
COLPENSIONES	2	$101.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$101.200
PORVENIR	1	$70.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$70.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	$33.200	$0	0	$0	0	$0	$33.200	0	$0	$0	$33.200	$0	0	$0	$0	$33.200	$0	$0	$33.200
SANITAS	1	$17.600	$0	0	$0	0	$0	$17.600	0	$0	$0	$17.600	$0	0	$0	$0	$17.600	$0	$0	$17.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	4	$88.000	0	$0	$0	$88.000	0	$0	$88.000	0	$0	$0	$88.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFABOY	4	$53.200	0	$0	$53.200
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$50.800
PENSIONES	3	$202.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$88.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$53.200
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$394.400

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JESUS MARIA ROJAS PARADA
IDENTIFICACIÓN:	CC-96185685
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	001
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	CONT
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-12-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-22
FECHA DE PAGO:	2024-12-18
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	31970160
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31970160
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 6.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 377.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/02/2025

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SOLSIC RC SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901773344
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	002
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	empleados
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-12-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-14
FECHA DE PAGO:	2024-12-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2025-01
NÚMERO PLANILLA:	31943388
TOTAL COTIZANTES:	4
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31943388
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.800	$ 20.800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.400	$ 62.400
Subtotal Salud		2	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.200	$ 83.200
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.200	$ 83.200
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.200	$ 83.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166.400	$ 166.400
Subtotal Pensión		3	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 332.800	$ 332.800
14-11	890903790	ARL SURA	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.800	$ 144.800
Subtotal ARL		1	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.800	$ 144.800
CF10	891800213	COMFABOY	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.800	$ 84.800
Subtotal CCF		1	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.800	$ 84.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 645.600	$ 645.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/02/2025

NÓMINAS, Y PAZ Y SALVOS

SOLSIC RC SAS

NIT. 901773344-3

CALLE 5 No 5-14 BARRIO EL COMERCIO CUBARA -BOYACA

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO OROZCO, COMUNIDAD INDIGENA DE TAURETES, RESGUARDO UNIDO U'WA, MUNICIPIOS DE CUBARA, DEPARTAMENTO DE BOYACA

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS **PERIODO DE PAGO: 04 AL 15 DICIEMBRE DE 2024**

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOC. IDENTIDAD	CARGO	SUELDO BÁSICO	DIAS LAB.	DEVENGADO				DEDUCCIONES				NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
						BÁSICO	EXTR	AUX. TRANSP	TOTAL DEVEN.	SALUD	PENSIÓN	OTROS	TOTAL DEDUCIDO		
1	JHON MARIO ARIZA AGUILAR	91.542.565	OFICIAL CONSTRUCCION	$ 2.395.740	12	$ 958.296		$ 64.800	$ 1.023.096	$ 38.332	$ 38.332		$ 76.664	$ 946.432	
2	EDWARD CONTRERAS RUNIA	1.134.844.027	OBRERO	$ 1.783.950	12	$ 713.580		$ 64.800	$ 778.380	$ 28.543	$ 28.543		$ 57.086	$ 721.294	
3	KUANA AGUABLANCA AGUABLANCA	1.005.302.858	OBRERO	$ 1.783.950	12	$ 713.580		$ 64.800	$ 778.380	$ 28.543	$ 28.543		$ 57.086	$ 721.294	KUANA AGUABLANCA
4	LUIS EDUARDO OSTOS MARCHENA	17.583.585	INGENIERO	$ 2.395.740	12	$ 958.296		$ 64.800	$ 1.023.096	$ 38.332	$ 38.332		$ 76.664	$ 946.432	
	TOTALES			$ 8.359.380	48	$ 3.343.752		$ 259.200	$ 3.602.952	$ 133.750	$ 133.750		$ 267.500	$ 3.335.452	

OBSERVACIONES:		APORTES PARAFISCALES	%	VALOR	PROVISIONES	%	VALOR
		SALUD	4,00%	133.750	CESANTÍAS	8,33%	278.535
		RIESGOS PROFESIONALES	6,96%	232.725	INTE. CESANTÍAS	1,00%	33.424
		FONDO DE PENSIONES	16%	535.000	PRIMA SERVICIOS	8,33%	278.535
		I.C.B.F.		0	VACACIONES	4,17%	139.434
		SENA		0			
ELABORADO POR:	APROBADO POR:	CAJA DE COMP. FAMILIAR	4%	133.750		21,83%	
	JESUS MARIA ROJAS	SUBTOTAL		1.035.228	SUBTOTAL		729.928

SOLUCIONES - SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL - SOLSIC RC SAS
(CONSTRUCCIONES - CONSULTORIAS - SUMINISTROS)
NIT. 901773344-3

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL QUE LABORO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA DE MINIMA CUANTIA No MC 095 DE 2024

CUYO OBJETO ES:

MEJORAMIENTO DEL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO OROZCO, COMUNIDAD INDÍGENA DE TAURETES, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Yo, **LUIS EDUARDO OSTOS MARCHENA**, identificada con Cedula de ciudadanía No 17.583.585 de Arauca, **CERTIFICO**, bajo la gravedad de juramento, que la empresa **SOLSIC RC SAS** con NIT. N° 901773344-3, con representación legal del ingeniero **JESUS MARIA ROJAS PARADA** identificado con cedula de ciudadanía N° 96.185.685 expedida en Saravena, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto de pagos de salarios y demás obligaciones contempladas en el código sustantivo del trabajo.

Para constancia de lo anterior, se firma en Cubara a los 17 días del mes de diciembre de 2024

LUIS EDUARDO OSTOS MARCHENA
C.C. No 17.583.585 de Arauca

SOLUCIONES - SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL - SOLSIC RC SAS
(CONSTRUCCIONES - CONSULTORIAS - SUMINISTROS)
NIT. 901773344-3

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL QUE LABORO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA DE MINIMA CUANTIA No MC 095 DE 2024

CUYO OBJETO ES:

MEJORAMIENTO DEL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO OROZCO, COMUNIDAD INDÍGENA DE TAURETES, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Yo, **JHON MARIO ARIZA AGUILAR**, identificada con Cedula de ciudadanía No 91.542.565 de Bucaramanga, **CERTIFICO**, bajo la gravedad de juramento, que la empresa **SOLSIC RC SAS** con NIT. N° 901773344-3, con representación legal del ingeniero **JESUS MARIA ROJAS PARADA** identificado con cedula de ciudadanía N° 96.185.685 expedida en Saravena, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto de pagos de salarios y demás obligaciones contempladas en el código sustantivo del trabajo.

Para constancia de lo anterior, se firma en Cubara a los 16 días del mes de diciembre de 2024

91542565
JHON MARIO ARIZA AGUILAR
C.C. No 91.542.565 de Bucaramanga

SOLUCIONES - SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL - SOLSIC RC SAS
(CONSTRUCCIONES - CONSULTORIAS - SUMINISTROS)
NIT. 901773344-3

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL QUE LABORO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA DE MINIMA CUANTIA No MC 095 DE 2024

CUYO OBJETO ES:

MEJORAMIENTO DEL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO OROZCO, COMUNIDAD INDÍGENA DE TAURETES, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Yo, **KUANA AGUABLANCA AGUABLANCA**, identificada con Cedula de ciudadanía No 1.005.302.858 de Cubará, **CERTIFICO**, bajo la gravedad de juramento, que la empresa **SOLSIC RC SAS** con NIT. N° 901773344-3, con representación legal del ingeniero **JESUS MARIA ROJAS PARADA** identificado con cedula de ciudadanía N° 96.185.685 expedida en Saravena, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto de pagos de salarios y demás obligaciones contempladas en el código sustantivo del trabajo.

Para constancia de lo anterior, se firma en Cubara a los 17 días del mes de diciembre de 2024

KUANA AGUABLANCA
KUANA AGUABLANCA AGUABLANCA
C.C. No 1.005.302.858 de Cubará

SOLUCIONES - SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL - SOLSIC RC SAS
(CONSTRUCCIONES - CONSULTORIAS - SUMINISTROS)
NIT. 901773344-3

PAZ Y SALVO DEL PERSONAL QUE LABORO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA DE MINIMA CUANTIA No MC 095 DE 2024

CUYO OBJETO ES:

MEJORAMIENTO DEL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO OROZCO, COMUNIDAD INDÍGENA DE TAURETES, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Yo, **EDWARD CONTRERAS RUNIA**, identificada con Cedula de ciudadanía No 1.134.844.027 de Chitagá, **CERTIFICO**, bajo la gravedad de juramento, que la empresa **SOLSIC RC SAS** con NIT. N° 901773344-3, con representación legal del ingeniero **JESUS MARIA ROJAS PARADA** identificado con cedula de ciudadanía N° 96.185.685 expedida en Saravena, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto de pagos de salarios y demás obligaciones contempladas en el código sustantivo del trabajo.

Para constancia de lo anterior, se firma en Cubara a los 16 días del mes de diciembre de 2024

EDWARD CONTRERAS RUNIA
C.C. No 1.134.844.027 de Chitagá

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
17.583.585

APELLIDOS
OSTOS MARCHENA

NOMBRES
LUIS EDUARDO



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-FEB-1963
HATO COROZAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

07-ABR-1981 ARAUCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4000100-00659992-M-0017583585-20150123 0042429802A 1 8123176391



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.542.565
ARIZA AGUILAR

APELLIDOS
JHON MARIO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 20-AGO-1984
FORTUL
(ARAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.72 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

16-SEP-2003 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-4002500-00452168-M-0091542565-20130723 0034093845A 1 1752287961

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.134.844.027**

CONTRERAS RUNIA

APELLIDOS

EDWARD

NOMBRES



NO FIRMA

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-AGO-1985**

CHITAGA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

19-JUL-2007 CHITAGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-0705900-01180484-M-1134844027-20201119 0072514288A 1 52757531



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.005.302.858

AGUABLANCA AGUABLANCA

APELLIDOS

KUANA

NOMBRES

NO FIRMA

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 09-AGO-2002

CERRITO
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

12-ENE-2021 CUBARA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

INDICE DERECHO

P-0705900-01217810-M-1148686324-20210224 0073541123A 1 553596886

CERTIFICACIÓN CABILDO

DIRECCION: CLL 28 N° 20A-35 BARRIO JARDIN - SARAVENA-ARAUCA
CEL: 3144576579 E-MAIL: SOLSICRCSAS@GMAIL.COM

AUTORIDAD TRADICIONAL Y CABILDOS MENORES D E L AS COMUNIDADES INDIGENAS U'WAS
JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CERRITO Y CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Ley 69 de 1890. ley 21 de 1991, decreto 1088 de 1993, convenio 169 de la OIT, articulo2;
El articulo7 de CPC. *En uso de las facultades legales y constitucionales amparados en la ley 89 de* 1890, *de ley 21 de 1991, en Constitución politica de 1991, convenio 1ro de la OIT; decreto 2184 de* 1995, articulo 7 de C.P. C y/as *demás normas concordantes.*



Tauretes – Diciembre 17 de 2024

CERTIFICACION

Por medio de la presente, Yo, **JOSE HUMBERTO CELIS**, identificado con cédula de ciudadanía N° 5.615.039 de Cerrito, actuando como cabildo menor de la comunidad indígena de Tauretes, CERTIFICO, que la obra que tiene por objeto el: **"MEJORAMIENTO DEL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO OROZCO, COMUNIDAD INDÍGENA DE TAURETES, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ",** se desarrollaron en su totalidad todas las actividades de mejoramiento de dicho puente, para lo cual he recibido a satisfacción estos trabajos realizados por la firma contratista **SOLSIC RC SAS,** que tiene que ver con el mejoramiento de este importante puente del sector Orozco, beneficiando a toda la comunidad indígena de Tamara y Tauretes los cuales transitamos a diario por este importante camino ancestral.

Atentamente,

JOSE HUMBERTO CELIS
Cabildo Menor Comunidad Tauretes

MEMORIAS DE CANTIDADES

DIRECCION: CLL 28 N° 20A-35 BARRIO JARDIN - SARAVENA-ARAUCA
CEL: 3144576579 E-MAIL: SOLSICRCSAS@GMAIL.COM

SOLUCIONES - SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL - SOLSIC RC SAS
(CONSTRUCCIONES - CONSULTORIAS - SUMINISTROS)
NIT. 901773344-3

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	15	MM	12	AA	2024	ELABORÓ:	Luis Eduardo Ostos Marchena

OBJETO	"MEJORAMIENTO DEL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO OROZCO, COMUNIDAD INDÍGENA DE TAURETES, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."				
CONTRATISTA	SOLSIC RC SAS	NIT o C.C.	901773344-3	CONTRATO No.	MC 095 2024

CAPITULO	CONSERVACION DE CAMINOS	ITEM	1.1	REPOSICION DE ESTRUCTURA DE PISO EN MADERA (TABLA DE 0,25* 2 mts; E = 0,04 mts)	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	MUNICIPIO DE CUBARA BOYACA COMUNIDAD DE TAURETES





Localización	Dimensiones (m)			No. Elemento	Medida Total
	Largo	Ancho	Profundidad		
PUENTE				78,00	78,00

Observaciones:

			Subtotal	78,00
			Vienen	
LUIS EDUARDO OSTOS MARCHENA Ing. Residente de Obra	JESUS MARIA ROJAS PARADA CONTRATISTA		TOTAL	78,00

DIRECCION: CLL 28 N° 20A-35 BARRIO JARDIN - SARAVENA-ARAUCA

CEL: 3144576579 E-MAIL: SOLSICRCSAS@GMAIL.COM

BITACORA DE OBRA

DIRECCION: CLL 28 N° 20A-35 BARRIO JARDIN - SARAVENA-ARAUCA
CEL: 3144576579 E-MAIL: SOLSICRCSAS@GMAIL.COM

CONTROL DE OBRA
BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 04 de diciembre de 2024	Localización: Tauretes, Cubara Boyacá	Hoja No. 01
Entidad Contratante: ALCALDIA DE CUBARA	Contratista: SOLSIC RC SAS	
Contrato de Obra No. MC 095 de 2024	Objeto: MEJORAMIENTO DEL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO OROZCO, COMUNIDAD INDÍGENA DE TAURETES, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	

Personal en Obra		Estado del tiempo/Duración		
Cargo	Cant.		a.m.	p.m.
Ingeniero residente	1	Soleado	x	
oficial	1	Seco	x	
Auxiliar de construcción	2	Nublado		
		Lluvia Pasajera		
		Lluvioso		

Actividades Desarrolladas
Se firma el acta de inicio, marcando oficialmente el comienzo del proyecto. Esta actividad, formaliza el compromiso de todas las partes involucradas y establece el punto de partida para las tareas programadas conforme a lo estipulado en el contrato. La firma del acta de inicio valida los términos y condiciones para el desarrollo del proyecto. Con esta formalidad cumplida, se procede a la movilización de equipos y personal al sitio de la obra para iniciar las primeras actividades constructivas.

Equipos en Obra			Accidentes en Obra				
Descripción	Cant.	Estado	¿Ocurrió algún accidente?	Si		No	x
			¿Hubo lesión?	Si		No	
			Nombre:				
			Cargo:				
			Actividad que desempeñaba:				
			Hora:				

Ing. JESUS MARIA PARADA ROJAS
Contratista

Ing. LUIS EDUARDO OSTOS MARCHENA
Residente de Interventoria

CONTROL DE OBRA
BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 05 de diciembre de 2024	Localización: Tauretes, Cubara Boyacá	Hoja No. 02
Entidad Contratante: ALCALDIA DE CUBARA	Contratista: SOLSIC RC SAS	
Contrato de Obra No.	Objeto: MEJORAMIENTO DEL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO OROZCO, COMUNIDAD INDÍGENA DE TAURETES, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	
MC 095 de 2024		


Personal en Obra		Estado del tiempo/Duración		
Cargo	Cant.		a.m.	p.m.
Ingeniero residente	1	Soleado	x	
oficial	1	Seco	x	
Auxiliar de construcción	2	Nublado		
		Lluvia Pasajera		
		Lluvioso		

Actividades Desarrolladas
se trabajó en la logística del proyecto y la compra y suministro de materiales de construcción (ferretería), acarreos de materiales al puente Orozco, Una vez que el contratista suministró los insumos necesarios, se dio inicio a las actividades de acerramiento de la madera siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto.

Equipos en Obra			Accidentes en Obra				
Descripción	Cant.	Estado	¿Ocurrió algún accidente?	Si		No	x
			¿Hubo lesión?	Si		No	
			Nombre:				
			Cargo:				
			Actividad que desempeñaba:				
			Hora:				



Ing. JESUS MARIA PARADA ROJAS
Contratista



Ing. LUIS EDUARDO OSTOS MARCHENA
Residente de Interventoria

CONTROL DE OBRA
BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 06 de diciembre de 2024	Localización: Tauretes, Cubara Boyacá	Hoja No. 03
Entidad Contratante: ALCALDIA DE CUBARA	Contratista: SOLSIC RC SAS	
Contrato de Obra No. MC 095 de 2024	Objeto: MEJORAMIENTO DEL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO OROZCO, COMUNIDAD INDÍGENA DE TAURETES, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	


Personal en Obra		Estado del tiempo/Duración		
Cargo	Cant.		a.m.	p.m.
Ingeniero residente	1	Soleado	x	
oficial	1	Seco	x	
Auxiliar de construcción	2	Nublado		
		Lluvia Pasajera		
		Lluvioso		

Actividades Desarrolladas
se continuaron las actividades de acerramiento y corte y lijado de la madera siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto.

Equipos en Obra			Accidentes en Obra				
Descripción	Cant.	Estado	¿Ocurrió algún accidente?	Si		No	x
			¿Hubo lesión?	Si		No	
			Nombre:				
			Cargo:				
			Actividad que desempeñaba:				
			Hora:				



Ing. JESUS MARIA PARADA ROJAS
Contratista



Ing. LUIS EDUARDO OSTOS MARCHENA
Residente de Interventoria

CONTROL DE OBRA
BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 07 de diciembre de 2024	Localización: Tauretes, Cubara Boyacá	Hoja No. 04
Entidad Contratante: ALCALDIA DE CUBARA	Contratista: SOLSIC RC SAS	
Contrato de Obra No. MC 095 de 2024	Objeto: MEJORAMIENTO DEL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO OROZCO, COMUNIDAD INDÍGENA DE TAURETES, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	

Personal en Obra		Estado del tiempo/Duración		
Cargo	Cant.		a.m.	p.m.
Ingeniero residente	1	Soleado	x	
oficial	1	Seco	x	
Auxiliar de construcción	2	Nublado		
		Lluvia Pasajera		
		Lluvioso		

Actividades Desarrolladas
se continuaron las actividades de acerramiento y corte y lijado de la madera siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto.

Equipos en Obra			Accidentes en Obra				
Descripción	Cant.	Estado	¿Ocurrió algún accidente?	Si		No	x
			¿Hubo lesión?	Si		No	
			Nombre:				
			Cargo:				
			Actividad que desempeñaba:				
			Hora:				



Ing. JESUS MARIA PARADA ROJAS
Contratista



Ing. LUIS EDUARDO OSTOS MARCHENA
Residente de Interventoria

CONTROL DE OBRA
BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 09 de diciembre de 2024	Localización: Tauretes, Cubara Boyacá	Hoja No. 06
Entidad Contratante: ALCALDIA DE CUBARA	Contratista: SOLSIC RC SAS	
Contrato de Obra No. MC 095 de 2024	Objeto: MEJORAMIENTO DEL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO OROZCO, COMUNIDAD INDÍGENA DE TAURETES, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	

Personal en Obra		Estado del tiempo/Duración		
Cargo	Cant.		a.m.	p.m.
Ingeniero residente	1	Soleado	x	
oficial	1	Seco	x	
Auxiliar de construcción	2	Nublado		
		Lluvia Pasajera		
		Lluvioso		

Actividades Desarrolladas
se finalizaron las actividades de acerramiento y corte y lijado de la madera siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto. Y se transportaron las tablas al puente para empezar con las actividades de desmontaje y ensamblaje de las tablas de madera.

Equipos en Obra			Accidentes en Obra				
Descripción	Cant.	Estado	¿Ocurrió algún accidente?	Si		No	x
			¿Hubo lesión?	Si		No	
			Nombre:				
			Cargo:				
			Actividad que desempeñaba:				
			Hora:				



Ing. JESUS MARIA PARADA ROJAS
Contratista



Ing. LUIS EDUARDO OSTOS MARCHENA
Residente de Interventoria

CONTROL DE OBRA
BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 10 de diciembre de 2024	Localización: Tauretes, Cubara Boyacá	Hoja No. 07
Entidad Contratante: ALCALDIA DE CUBARA	Contratista: SOLSIC RC SAS	
Contrato de Obra No.	Objeto: MEJORAMIENTO DEL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO OROZCO, COMUNIDAD INDÍGENA DE TAURETES, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	
MC 095 de 2024		


Personal en Obra		Estado del tiempo/Duración		
Cargo	Cant.		a.m.	p.m.
Ingeniero residente	1	Soleado	x	
oficial	1	Seco	x	
Auxiliar de construcción	2	Nublado		
		Lluvia Pasajera		
		Lluvioso		

Actividades Desarrolladas
Se procede con el desmontaje cuidadoso de la estructura de madera existente que se encuentra en mal estado, y Paralelamente al desmontaje, se inicia el montaje de las tablas nuevas, siguiendo con las especificaciones técnicas

Equipos en Obra			Accidentes en Obra				
Descripción	Cant.	Estado	¿Ocurrió algún accidente?	Si		No	x
			¿Hubo lesión?	Si		No	
			Nombre:				
			Cargo:				
			Actividad que desempeñaba:				
			Hora:				



Ing. JESUS MARIA PARADA ROJAS
Contratista



Ing. LUIS EDUARDO OSTOS MARCHENA
Residente de Interventoria

CONTROL DE OBRA
BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 11 de diciembre de 2024	Localización: Tauretes, Cubara Boyacá	Hoja No. 08
Entidad Contratante: ALCALDIA DE CUBARA	Contratista: SOLSIC RC SAS	
Contrato de Obra No. MC 095 de 2024	Objeto: MEJORAMIENTO DEL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO OROZCO, COMUNIDAD INDÍGENA DE TAURETES, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	

Personal en Obra		Estado del tiempo/Duración		
Cargo	Cant.		a.m.	p.m.
Ingeniero residente	1	Soleado	x	
oficial	1	Seco	x	
Auxiliar de construcción	2	Nublado		
		Lluvia Pasajera		
		Lluvioso		

Actividades Desarrolladas
Se prosiguen dos actividades clave de manera simultánea: Desarme de la Estructura de Madera Existente. Continúa el desmantelamiento cuidadoso de la estructura de madera preexistente. Ensamblaje de la nueva estructura de madera: Al mismo tiempo que se desarma la estructura de madera, sigue el montaje de las nuevas tablas previamente cortadas y lijadas. Este trabajo requiere una coordinación precisa para asegurar que todas las partes se ajusten correctamente y se mantenga la integridad estructural del puente.

Equipos en Obra			Accidentes en Obra				
Descripción	Cant.	Estado	¿Ocurrió algún accidente?	Si		No	x
			¿Hubo lesión?	Si		No	
			Nombre:				
			Cargo:				
			Actividad que desempeñaba:				
			Hora:				

Ing. JESUS MARIA PARADA ROJAS
Contratista

Ing. LUIS EDUARDO OSTOS MARCHENA
Residente de Interventoria

CONTROL DE OBRA
BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 12 de diciembre de 2024	Localización: Tauretes, Cubara Boyacá	Hoja No. 09
Entidad Contratante: ALCALDIA DE CUBARA	Contratista: SOLSIC RC SAS	
Contrato de Obra No. MC 095 de 2024	Objeto: MEJORAMIENTO DEL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO OROZCO, COMUNIDAD INDÍGENA DE TAURETES, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	

Personal en Obra		Estado del tiempo/Duración		
Cargo	Cant.		a.m.	p.m.
Ingeniero residente	1	Soleado	x	
oficial	1	Seco	x	
Auxiliar de construcción	2	Nublado		
		Lluvia Pasajera		
		Lluvioso		

Actividades Desarrolladas
Se continúan dos actividades clave de manera simultánea: Desarme de la Estructura de Madera Existente. Continúa el desmantelamiento cuidadoso de la estructura de madera preexistente. Ensamblaje de la nueva estructura de madera: Al mismo tiempo que se desarma la estructura de madera, sigue el montaje de las nuevas tablas previamente cortadas y lijadas. Este trabajo requiere una coordinación precisa para asegurar que todas las partes se ajusten correctamente y se mantenga la integridad estructural del puente.

Equipos en Obra			Accidentes en Obra				
Descripción	Cant.	Estado	¿Ocurrió algún accidente?	Si		No	x
			¿Hubo lesión?	Si		No	
			Nombre:				
			Cargo:				
			Actividad que desempeñaba:				
			Hora:				

Ing. JESUS MARIA PARADA ROJAS
Contratista

Ing. LUIS EDUARDO OSTOS MARCHENA
Residente de Interventoria

CONTROL DE OBRA
BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 13 de diciembre de 2024	Localización: Tauretes, Cubara Boyacá	Hoja No. 10
Entidad Contratante: ALCALDIA DE CUBARA	Contratista: SOLSIC RC SAS	
Contrato de Obra No. MC 095 de 2024	Objeto: MEJORAMIENTO DEL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO OROZCO, COMUNIDAD INDÍGENA DE TAURETES, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	

Personal en Obra		Estado del tiempo/Duración		
Cargo	Cant.		a.m.	p.m.
Ingeniero residente	1	Soleado	x	
oficial	1	Seco	x	
Auxiliar de construcción	2	Nublado		
		Lluvia Pasajera		
		Lluvioso		

Actividades Desarrolladas
Se finalizan las actividades de desmontaje cuidadoso de la estructura de madera existente que se encuentra en mal estado, y Paralelamente al desmontaje, y del montaje de las tablas nuevas, siguiendo con las especificaciones técnicas

Equipos en Obra			Accidentes en Obra				
Descripción	Cant.	Estado	¿Ocurrió algún accidente?	Si		No	x
			¿Hubo lesión?	Si		No	
			Nombre:				
			Cargo:				
			Actividad que desempeñaba:				
			Hora:				

Ing. JESUS MARIA PARADA ROJAS
Contratista

Ing. LUIS EDUARDO OSTOS MARCHENA
Residente de Interventoria

CONTROL DE OBRA
BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 14 de diciembre de 2024	Localización: Tauretes, Cubara Boyacá	Hoja No. 11
Entidad Contratante: ALCALDIA DE CUBARA	Contratista: SOLSIC RC SAS	
Contrato de Obra No. MC 095 de 2024	Objeto: MEJORAMIENTO DEL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO OROZCO, COMUNIDAD INDÍGENA DE TAURETES, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	


Personal en Obra		Estado del tiempo/Duración		
Cargo	Cant.		a.m.	p.m.
Ingeniero residente	1	Soleado	x	
oficial	1	Seco	x	
Auxiliar de construcción	2	Nublado		
		Lluvia Pasajera		
		Lluvioso		

Actividades Desarrolladas
Se finalizan las actividades de desmontaje cuidadoso de la estructura de madera existente que se encuentra en mal estado, y Paralelamente al desmontaje, y del montaje de las tablas nuevas, siguiendo con las especificaciones técnicas

Equipos en Obra			Accidentes en Obra				
Descripción	Cant.	Estado	¿Ocurrió algún accidente?	Si		No	x
			¿Hubo lesión?	Si		No	
			Nombre:				
			Cargo:				
			Actividad que desempeñaba:				
			Hora:				



Ing. JESUS MARIA PARADA ROJAS
Contratista



Ing. LUIS EDUARDO OSTOS MARCHENA
Residente de Interventoria

CONTROL DE OBRA
BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 15 de diciembre de 2024	Localización: Tauretes, Cubara Boyacá	Hoja No. 12
Entidad Contratante: ALCALDIA DE CUBARA	Contratista: SOLSIC RC SAS	
Contrato de Obra No. MC 095 de 2024	Objeto: MEJORAMIENTO DEL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO OROZCO, COMUNIDAD INDÍGENA DE TAURETES, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	


Personal en Obra		Estado del tiempo/Duración		
Cargo	Cant.		a.m.	p.m.
Ingeniero residente	1	Soleado	x	
oficial	1	Seco	x	
Auxiliar de construcción	2	Nublado		
		Lluvia Pasajera		
		Lluvioso		

Actividades Desarrolladas
Se realizan actividades de limpieza en la zona donde se realizaron los trabajos.

Equipos en Obra			Accidentes en Obra				
Descripción	Cant.	Estado	¿Ocurrió algún accidente?	Si		No	x
			¿Hubo lesión?	Si		No	
			Nombre:				
			Cargo:				
			Actividad que desempeñaba:				
			Hora:				



Ing. JESUS MARIA PARADA ROJAS
Contratista



Ing. LUIS EDUARDO OSTOS MARCHENA
Residente de Interventoria
