DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

ACTA No.	3	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	18/12/2024	CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5653276
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	CONTRATISTA:	CONSULTCIVIL SAS		
INTERVENTOR:	N/A	SUPERVISOR:	ARQ. SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO		
		PERIODO A PAGAR (1):	DEL: FINAL	HASTA: FINAL	
OBJETO:	ADECUACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO GUTIERREZ MENDEZ DE LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ				

En Zipaquirá, a los diez y ocho (18) días del mes de diciembre del año 2024 se reunieron Asdraldo Cardenas Hernandez como representante legal de CONSULTCIVIL SAS actuando como contratista y Sandra Atuesta Alvarado Secretaria Obras Públicas y Supervisor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo final de las siguente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION (Corresponde a la lista de precios unitarios contratada)	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICATORIO #1			MODIFICATORIO #2			MODIFICATORIO #3			MODIFICATORIO #4			ACTA MENSUAL #1			ACTA #1		ACTA #2		ACTA #3		CANTIDADES	VALORES		SALDOS	
				CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VR TOTAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR PARCIAL	ACUMULADO CANTIDADES	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ACTUAL	CANTIDAD	VALOR
DEMOLITICIÓN PLACA POLIDEPORTIVA																															
ICDU176	1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	M3	170,00	$ 46.600	$ 7.777.660	M3	170,00	$ 46.600	$ 7.777.660	M3	170,00	$ 46.600	$ 7.777.660	M3	170,00	$ 46.600	$ 7.777.660	M3	170,00	$ 46.600	$ 7.777.660	170,00	$ 7.777.660					170,00	-	170,00	$ 7.777.660	-	$ -
ICDU1374	2	RETIRO DE CONCRETO ESTRUCTURAL	UN	1,00	$ 1.765.000	$ 1.765.000	UN	1,00	$ 1.765.000	$ 1.765.000	UN	1,00	$ 1.765.000	$ 1.765.000	UN	1,00	$ 1.765.000	$ 1.765.000	UN	1,00	$ 1.765.000	$ 1.765.000							1,00	-	1,00	$ 1.765.000	-	$ -
	3	RETIRO DE MALLA ELECTROSOLDADA	UN	3,00	$ 715.677	$ 1.437.031	UN	3,00	$ 715.677	$ 1.437.031	UN	3,00	$ 715.677	$ 1.437.031	UN	3,00	$ 715.677	$ 1.437.031	UN	3,00	$ 715.677	$ 1.437.031	3,00	$ 1.437.031					3,00	-	3,00	$ 1.437.031	-	$ -
ICDU165	4	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO incl 0.3 M de ancho x el ESPESOR DE SOBREANCHO x 2	M3	85,00	$ 71.033	$ 6.038.246	M3	91,45	$ 71.033	$ 6.493.224	M3	91,45	$ 71.033	$ 6.493.224	M3	91,45	$ 71.033	$ 6.493.224	M3	110,00	$ 71.033	$ 7.813.330	91,45	$ 6.493.224	18,55	$ 1.317.105,65			110,00	-	110,00	$ 7.810.330	-	$ -
ICDU1518	5	DELLENAMIENTO EN CONCRETO, ITEM ALTERNATIVO	M3	87,00	$ 89.564	$ 7.791.565	M3	87,00	$ 89.564	$ 7.791.565	M3	87,00	$ 89.564	$ 7.791.565	M3	87,00	$ 89.564	$ 7.791.565	M3	87,00	$ 89.564	$ 7.791.565	87,00	$ 7.791.565					87,00	-	87,00	$ 7.791.565	-	$ -
ICDU1334	6	PLACA HUELLA CONCRETO 3000 PSI	M3	150,00	$ 91.664	$ 13.749.600	M3	150,00	$ 91.664	$ 13.749.600	M3	150,00	$ 91.664	$ 13.749.600	M3	150,00	$ 91.664	$ 13.749.600	M3	150,00	$ 91.664	$ 13.749.600	76,13	$ 6.978.427					76,13	-	76,13	$ 6.978.427	-	$ -
ICDU1375	7	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	847,40	$ 11.473	$ 9.724.170	KG	847,40	$ 11.473	$ 9.724.170	KG	847,40	$ 11.473	$ 9.724.170	KG	847,40	$ 11.473	$ 9.724.170	KG	847,40	$ 11.473	$ 9.724.170			4.847,40	$ 55.604.190,20			5.694,80	-	5.694,80	$ 65.328.360	-	$ -
ICDU1377	8	SOBRE ACERO REFUERZO 0.20	M	76,00	$ 91.664	$ 6.965.664	M	76,00	$ 91.664	$ 6.965.664	M	76,00	$ 91.664	$ 6.965.664	M	76,00	$ 91.664	$ 6.965.664	M	76,00	$ 91.664	$ 6.965.664			424,00	$ 38.866.816,00			500,00	-	500,00	$ 45.832.480	-	$ -
TORCHIQUE Y ESPALDAR																															
ICDU16.4	9	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN incl 0.30 M ANCHO Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM	M3	171,11	$ 71.012	$ 12.151.604	M3	179,91	$ 71.013	$ 12.769.132	M3	179,91	$ 71.013	$ 12.769.132	M3	90,74	$ 71.013	$ 6.443.725	M3	107,72	$ 71.013	$ 7.649.166	M3	$ 8.953.319	126,08	$ 8.953.319			126,00	-	126,00	$ 8.953.479	-	$ -
ICDU4.17	10	TRAZO Y ESTACADO	M2	355,56	$ 87.341	$ 31.061.115	M2	355,56	$ 87.341	$ 31.061.115	M2	355,56	$ 87.341	$ 31.061.115	M2	368,25	$ 87.341	$ 32.168.573	M2	374,20	$ 87.341	$ 26.429.464	M2	$ 30.729.661	273,72	$ 30.729.661			373,20	-	373,20	$ 30.729.661	-	$ -
ICDU16.9	11	RELLENO (GRAVILLA DE RIO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	91,67	$ 92.305	$ 8.461.762	M3	90,69	$ 92.305	$ 8.371.362	M3	90,69	$ 92.305	$ 8.371.362	M3	0,00	$ 92.305	$ -	M3	0,00	$ 92.305	$ 222	M3	$ -	-	$ -			-	-	-	$ -	-	$ -
ICDU16.8	12	RELLENO EN RECITO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	91,67	$ 89.564	$ 8.210.332	M3	91,67	$ 89.564	$ 8.210.332	M3	13,91	$ 89.564	$ 1.189.410	M3	17,76	$ 89.564	$ 1.590.967	M3	18,88	$ 89.564	$ 1.690.968	M3	$ 1.690.968	18,88	$ 1.690.968			18,88	-	18,88	$ 1.690.968	-	$ -
ICDU16.7	13	RELLENO EN MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	91,67	$ 26.193	$ 2.401.112	M3	107,05	$ 26.193	$ 2.804.051	M3	130,35	$ 26.193	$ 3.414.348	M3	130,35	$ 26.193	$ 3.414.340	M3	146,95	$ 26.193	$ 3.849.061	M3	$ 3.849.061	146,95	$ 3.849.061			146,95	-	146,95	$ 3.849.061	-	$ -
ICDU4.40	14	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 1000 ESTABILIZACION, FILTRO Y SEPARACION	M2	158,05	$ 9.033	$ 1.428.043	M2	377,70	$ 9.033	$ 3.411.764	M2	377,70	$ 9.033	$ 3.411.764	M2	252,00	$ 9.033	$ 2.547.306	M2	422,52	$ 9.033	$ 3.925.486	M2	$ 3.179.616	352,00	$ 3.179.616			352,00	-	352,00	$ 3.179.616	-	$ -
	15	SUMINISTRO de tubos 6" perforado para filtro	ML	231,82	$ 60.432	$ 13.402.026	ML	211,76	$ 60.432	$ 12.840.260	ML	211,76	$ 60.432	$ 12.840.260	ML	141,00	$ 60.432	$ 8.520.912	ML	160,76	$ 60.432	$ 10.636.032	ML	$ 10.636.032	176,00	$ 10.636.032			176,00	-	176,00	$ 10.636.032	-	$ -
CANALETA ANDEN																															
ICDU1.21	16	DEMOLICION PLACA/MACIZOS (0.30 M	M3	31,50	$ 49.467	$ 1.558.211	M3	31,50	$ 49.467	$ 1.558.211	M3	34,65	$ 49.467	$ 1.714.010	M3	-	$ 49.467	$ -	M3	-	$ 49.467	$ -	M3	$ -	-	$ -			-	-	-	$ -	-	$ -
ICDU5.4	17	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI ESPESOR 0.10 M	M2	17,50	$ 103.562	$ 1.812.335	M2	17,50	$ 103.562	$ 1.812.335	M2	17,50	$ 103.562	$ 1.812.335	M2	-	$ 103.562	$ -	M2	-	$ 103.562	$ -	M2	$ -	-	$ -			-	-	-	$ -	-	$ -
ICDU5.13	18	JUNTA EN ICOPOR ESPESOR 1/2"	M	36,00	$ 37.757	$ 1.359.252	M	36,00	$ 37.757	$ 1.359.252	M	36,00	$ 37.757	$ 1.359.252	M	-	$ 37.757	$ -	M	-	$ 37.757	$ -	M	$ -	-	$ -			-	-	-	$ -	-	$ -
ICDU1.23	19	DEMOLICION MALLA ELECTROSOLDADA	M2	78,75	$ 10.180	$ 801.675	M2	78,75	$ 10.180	$ 801.675	M2	78,75	$ 10.180	$ 801.675	0,00%	78,75	$ 10.180	$ 801.675	M2	78,75	$ 10.180	$ 801.675	M2	$ 801.675	78,75	$ 801.675			78,75	-	78,75	$ 801.675	-	$ -
ICDU1.22	20	RETIRO MALLA ELECTROSOLDADA	M2	78,75	$ 11.473	$ 903.410	M2	78,75	$ 11.473	$ 903.410	M2	78,75	$ 11.473	$ 903.410	0,00%	78,75	$ 11.473	$ 903.410	M2	78,75	$ 11.473	$ 903.410	M2	$ 903.410	78,75	$ 903.410			78,75	-	78,75	$ 903.410	-	$ -
ICDU1.13	21	CANAL EN CONCRETO	M	36,00	$ 104.475	$ 3.761.100	M	36,00	$ 104.475	$ 3.761.100	M	-	$ 104.475	$ -	M	-	$ 104.475	$ -	M	-	$ 104.475	$ -	M	$ -	-	$ -			-	-	-	$ -	-	$ -
ICDU1.19	22	RAJANTE PVC 4 MINIMAS, BARBADO	UN	4,00	$ 85.983	$ 343.931	UN	4,00	$ 85.983	$ 343.931	UN	-	$ 85.983	$ -	UN	-	$ 85.983	$ -	UN	-	$ 85.983	$ -	UN	$ -	-	$ -			-	-	-	$ -	-	$ -
PRELIMINARES																															
	CAP-1	INSTALACION DE CERCA ELECTRICA PARA E	ML		$ 4.760	$ -	ML	74,00	$ 4.760	$ 352.733	ML	74,00	$ 4.760	$ 352.733	ML	74,00	$ 4.760	$ 352.733	ML	74,00	$ 4.760	$ 352.733	74,00	$ 352.733					74,00	-	74,00	$ 352.733	-	$ -
	CAP-2	INSTALACION DE PORTE ELECTRICO	UND		$ 1.952.270	$ -	UND	2,00	$ 1.952.270	$ 3.904.541	UND	2,00	$ 1.952.270	$ 3.904.541	UND	2,00	$ 1.952.270	$ 3.904.541	UND	2,00	$ 1.952.270	$ 3.904.541	-	$ -	2,00	$ 3.904.540,92			2,00	-	2,00	$ 3.904.541	-	$ -
	CAP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA POSTE	UND		$ 512.856	$ -	UND	4,00	$ 512.856	$ 2.051.425	UND	4,00	$ 512.856	$ 2.051.425	UND	4,00	$ 512.856	$ 2.051.425	UND	4,00	$ 512.856	$ 2.051.425	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 2.051.424,50	-	4,00	4,00	$ 2.051.425	-	$ -
	CAP-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA AEREA CABLE COBRE #2	ML		$ 46.361	$ -	ML	170,00	$ 46.361	$ 7.881.370	ML	170,00	$ 46.361	$ 7.881.370	ML	185,00	$ 46.361	$ 8.576.785	ML	185,00	$ 46.361	$ 8.576.785	ML	$ 8.047.987	191,45	$ 8.047.987			192,95	$ 8.947.999,95	192,95	$ 8.947.987	0,42	20,69
	CAP-5	TRASBOMBAMIN, DE MATERIALES PETREOS Y TRASBOMBEO DE ESCOMBROS DESDE ENTRADA A CANCHA POR SENDEROS PEATONALES. ESCUELA DE LA ESCUELA	M3		$ 42.949	$ -	M3	397,00	$ 42.949	$ 16.621.152	M3	397,00	$ 42.949	$ 16.621.152	M3	508,23	$ 42.949	$ 21.404.747	M3	601,72	$ 42.949	$ 25.843.100	M3	$ 27.213.924	633,64	$ 27.213.924			633,64	-	633,64	$ 27.214.000	-	$ -
	ICDU135	GUARDA REGULADOR	UND		$ 405.916	$ -	UND	3,00	$ 405.916	$ 1.217.748	UND	3,00	$ 405.916	$ 1.217.748	UND	6,00	$ 405.916	$ 2.435.496	UND	6,00	$ 405.916	$ 2.435.496	UND	$ 2.435.496	6,00	$ 2.435.496			6,00	-	6,00	$ 2.435.496	-	$ -
	CAP-6	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCION	UND		$ 260.793	$ -	UND	3,00	$ 260.793	$ 782.380	UND	3,00	$ 260.793	$ 782.380	UND	6,00	$ 260.793	$ 1.564.759	UND	5,00	$ 260.793	$ 1.303.976	UND	$ 1.564.759	6,00	$ 1.564.759			5,00	-	5,00	$ 1.564.759	1	$ 260.793
PISO DE ANDEN Y PISO INT.																															
ICDU 4.27	CAP-8	CONCRETO 3000 PSI, 2500 PSI 40% RAJON PARA BASE	M3		$ 430.275	$ -									M3	34,80	$ 430.275	$ 14.973.570	M3	34,80	$ 430.275	$ 14.973.570	-	$ -	34,80	$ 14.973.570			34,80	-	34,80	$ 14.973.570	-	$ -
	CAP-9	MANTENIMIENTO Y ADICIONAR DE CAVA BAJA EXISTENTE	ML		$ 15.917	$ -									ML	32,00	$ 15.917	$ 509.344	ML	41,00	$ 15.917	$ 652.597	ML	$ 652.597	41,00	$ 652.597			41,00	-	41,00	$ 652.597	-	$ -
ICDU124	CAP-10	CRUCETA CONCRETO ENTERRADO	M3		$ 265.500	$ -									M3	7,72	$ 265.500	$ 2.050.260	M3	9,60	$ 265.500	$ 2.455.396	-	$ -	9,60	$ 2.455.396			9,60	-	9,60	$ 2.455.396	-	$ -
ICDU1148	CAP-11	EXCAVACION MANUAL EN RIODAMO 0.20 M ANCHO PARA ANCLAJE	M3		$ 122.041	$ -									M3	1,48	$ 122.041	$ 180.621	M3	1,48	$ 122.041	$ 180.621	-	$ -	1,48	$ 180.621			1,48	-	1,48	$ 180.621	-	$ -
	CAP-12	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION, INCLUYE CAMBIO DE TAPA Y ADICIONAR	UND		$ 69.511	$ -									UND	2,00	$ 69.511	$ 139.022	UND	2,00	$ 69.511	$ 139.022	-	$ -	2,00	$ 139.022,00			2,00	-	2,00	$ 139.022	-	$ -
	CAP-13	RELLENO ESTABILIZADO PARA EL PISO	M3		$ 139.390	$ -									M3	16,00	$ 139.390	$ 4.460.840	M3	41,74	$ 139.390	$ 5.816.886	-	$ -	41,74	$ 5.816.886			41,74	-	41,74	$ 5.816.886	-	$ -
	CAP-14	MALLA ELECTROSOLDADA	M2		$ 11.473	$ -									M2	24,00	$ 11.473	$ 275.352	M2	30,30	$ 11.473	$ 347.644	-	$ -	30,30	$ 347.644			30,30	-	30,30	$ 347.644	-	$ -
	CAP-15	BARANDA EN MADERA ROLLIZA CON DIAGONALES EN MADERA PARA PROTECCION DE LOS NIÑOS	ML		$ 75.800	$ -									ML	16,80	$ 75.800	$ 1.409.880	ML	16,80	$ 75.800	$ 1.409.880	ML	$ 1.409.880	16,80	$ 1.409.880			16,80	-	16,80	$ 1.409.880	-	$ -
					VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS	176.389.347,52			170.356.948,22			170.356.948,22				170.356.948,22				189.196.130,65			189.196.130,64								179.375.792	19.385.487,35	189.761.279,35		25.899,61
					VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS	49.893.582,42			56.217.462,91			56.217.462,91				56.217.462,91				47.430.743,11			47.430.743,11								54.224.611	4.252.218,65	47.421.193,17		9.538,68
		ADMINISTRACION	25%			51.571.896,83			42.548.867,05			42.548.867,05				42.548.867,05				47.467.532,66			47.467.532,66								47.181.543,36	4.846.372,1	47.467.915,46		2.229,19
		IMPREVISTOS	5%			3.804.107,87			5.139.678,45			5.139.678,45				5.139.678,45				5.693.703,92			5.693.703,89								2.061.787,66	3.049.485	5.111.274		356,42
		UTILIDAD	5%			8.335.173,72			9.517.787,41			9.517.787,41				9.517.787,41				9.489.566,53			9.489.566,53								3.082.475	6.407.091,9	9.489.567		1.444,03
		IVA 19% SOBRE UTILIDAD	19%			-			-			-				-				-			-								-	-	-		-
					VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS (INCLUYE IVA)	165.515.771,54			226.573.411,13			226.573.411,13				226.573.411,13				252.626.873,76			252.626.873,76								254.882.873,19	27.483.563,1	282.366.436,29		39.470,93

BALANCE PRESUPUESTAL	
VR INICIAL CONTRATO:	165.515.771,54
VR ADICION #1	58.057.640,62
VR ADICION #2	29.841.467,50
VR ACTUAL CONTRATO:	253.414.879,66

ACTA #1	91.495.717,64
ACTA #2	135.193.547,59
ACTA #3 FINAL	25.732.576,47
VALOR EJECUTADO	252.382.462,55
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 38.411,21

% EJECUCION	
%PDE EJECUTAR	0,00%
%TOTAL	100,00%

	253.382.462,55
	38.411,21
	253.420.873,76
	253.420.873,76
	0,00

No. ACTA	FECHA PAGO	DESCRIPCION	No. COMPROBANTE	VALOR FACTURADO	% PAGADO
1	28/05/2024	ACTA 01	2024000169	91.495.917,60	36,21%
2	4/12/2024	ACTA 02	2024008545	77.199.854,14	30,55%
	4/12/2024	ACTA 02	2024008546	58.057.640,62	23,00%
	4/12/2024	ACTA 02	2024008547	26.252,79	0,01%
				-	0,00%
				-	0,00%
				-	0,00%
		TOTAL		226.779.664,15	89,77%

(1) Descripción de la etapa o el periodo facturado, ejm: parcial de obra. Para el caso de pensionados: pago anticipado, mes liso o proceso.

Nota 1:
a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes.
b) Todas las cantidades de obra deben aproximarse al entero (cero) por exceso o por defecto.
c) Todos los valores deberán expresarse en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.
d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría.
e) Anexar las memorias de cantidades de obra los cuales soportan las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.
f) Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad del Contratista quien elaboró y revisó y del Interventor quien verificó, validó y aprobó.
g) La interventoría certifica que verificó y validó los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales del personal representado de la presente acta, tanto del personal operativo como del personal ofertado dentro de la propuesta (Anexar Soportes).
h) La interventoría certifica que el contratista ha cumplido con la disponibilidad del personal propuesto en la oferta con los tiempos establecidos para cada perfil.
i) La interventoría certifica que el contratista ha cumplido con el pago de salarios, prestaciones y demás componentes de los trabajadores tanto operativos como los ofertados en la propuesta y que a la fecha de la presente acta NO se presentan reclamaciones hacia el contratista por falta de pago a los acreedores y personal operativo y profesional.
j) La interventoría certifica que el contratista ha cumplido con el pago de prestaciones sociales según la legislación vigente y que se encuentran relacionados en los análisis de precios unitarios APU presentados por el contratista en la propuesta y los dentro APUS aprobados por la interventoría (Anexar Soportes).
k) En la presente acta se debe anexar los formatos que apliquen de acuerdo al proyecto y que se encuentren en el Sistema de Gestión de Calidad, cuando este aplique a ese ítem de la SUPERVISION.

Nota 2: Instrucciones para la firma:
Elaboró - Representante legal o Director de Obra: Registrar la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT.
Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registrar la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en analizar a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier deficiencia que encuentre con la normatividad sectorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado del municipio de Zipaquirá debe anotar, en único expediente su encuentro con el representante del contratista.
Avalo - Designado por el municipio de Zipaquirá: Registrar la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago realizado del municipio de Zipaquirá. Este revisor consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier deficiencia que encuentre con la normatividad sectorial aplicable.

Elaboró	Aprobó	Avalo
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: ING. ASDRALDO CARDENAS HERNANDEZ	Nombre:	Nombre: ARQ. SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO
REP. LEGAL O DIRECTOR OBRA	REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (Cuando Aplique)	SECRETARIA OBRAS PUBLICAS - SUPERVISOR


DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATOS SIN INTERVENTORIA

N° Contrato	CO1.PCCNTR.5653328	N° Acta Parcial	3	Periodo de Facturación	DEL 16/02/2023 AL 31/05/2024	Acta de Inicio	26/12/2023	Valor Inicial del Contrato	$ 168.515.771,14
Objeto	ADECUACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO GUTIERREZ MENDEZ DE LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ					Acta de Suspensión	8/03/2024	Valor Adición 1	$ 58.057.640,00
						Acta de Reinicio	2/04/2024	Valor Adición 2	$ 25.847.462,00
Contratista	CONSULTCIVIL SAS			NIT/ N° Identificación	901013465-6	Acta de Suspensión	18/04/2024	Valor Actualizado	$ 252.420.873,76
						Acta de Reinicio	2/05/2024		
Director de Obra	ARQ. ALVARO POMPILIO CALDERON			Matricula Profesional	19234965	Plazo del Contrato	15 DIAS		
						Prorroga 1	15 DIAS		
Residente de Obra	ING, ASDRALDO CARDENAS HERNANDEZ			Matricula Profesional	11347236	Prorroga 2	50 DIAS		
						Prorroga 3	15 DIAS		
Supervisor del Contrato	ARQ. SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO			Apoyo a la Supervisión	ARQ. JULIAN ARMANDO POVEDA	Prorroga 4	25 DIAS		
						Plazo Actualizado	120 DIAS		

CAPITULO / ÍTEM	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M	UNIDAD
ONP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA POSTE	UND

ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



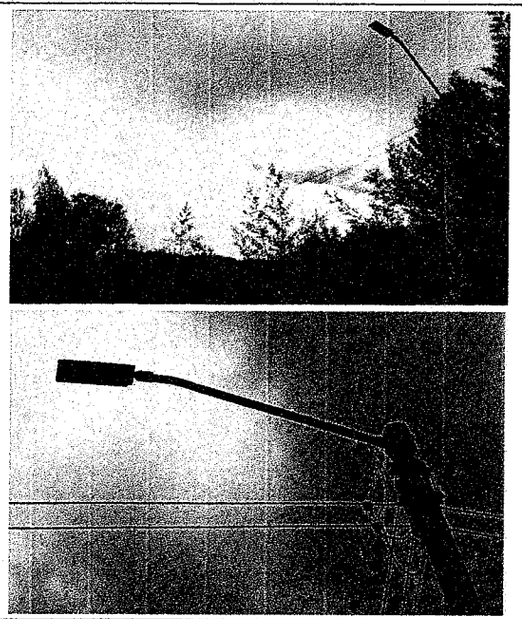

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD			
CORTE 3						
LUMINARIA PARA POSTES				4,00	4,00	4,00
					TOTAL	4,00

OBSERVACIONES:

Fecha de Elaboración	ELABORÓ	REVISÓ	VERIFICÓ	APROBÓ
Firma				
Nombres y Apellidos	Ing. Asdraldo Cardenas	Arq. Alvaro Calderon	Arq. Julian Poveda	Arq. Sandra Atuesta
Cargo	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	APOYO A LA SUPERVISIÓN	SECRETARIA(O) OBRAS PUBLICAS

92

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATOS SIN INTERVENTORIA


N° Contrato	CO1.PCCNTR.5653328	N° Acta Parcial	3	Periodo de Facturación	DEL 16/02/2023 AL 31/05/2024	Acta de Inicio	26/12/2023	Valor Inicial del Contrato	$	168.515.771,14
Objeto	ADECUACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO GUTIERREZ MENDEZ DE LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ					Acta de Suspensión	8/03/2024	Valor Adición 1	$	58.057.640,00
						Acta de Reinicio	2/04/2024	Valor Adición 2	$	25.847.462,00
Contratista	CONSULTCIVIL SAS			NIT/ N° Identificación	901013465-6	Acta de Suspensión	18/04/2024	Valor Actualizado	$	252.420.873,76
						Acta de Reinicio	2/05/2024			
Director de Obra	ARQ. ALVARO POMPILIO CALDERON			Matrícula Profesional	19234965	Plazo del Contrato	15 DIAS			
						Prorroga 1	15 DIAS			
Residente de Obra	ING, ASDRALDO CARDENAS HERNANDEZ			Matrícula Profesional	11347236	Prorroga 2	50 DIAS			
						Prorroga 3	15 DIAS			
Supervisor del Contrato	ARQ. SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO			Apoyo a la Supervisión	ARQ. JULIAN ARMANDO POVEDA	Prorroga 4	25 DIAS			
						Plazo Actualizado	120 DIAS			

CAPITULO / ÍTEM	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M	UNIDAD
ONP-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA AEREA CABLE COBRE #2	ML

ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO





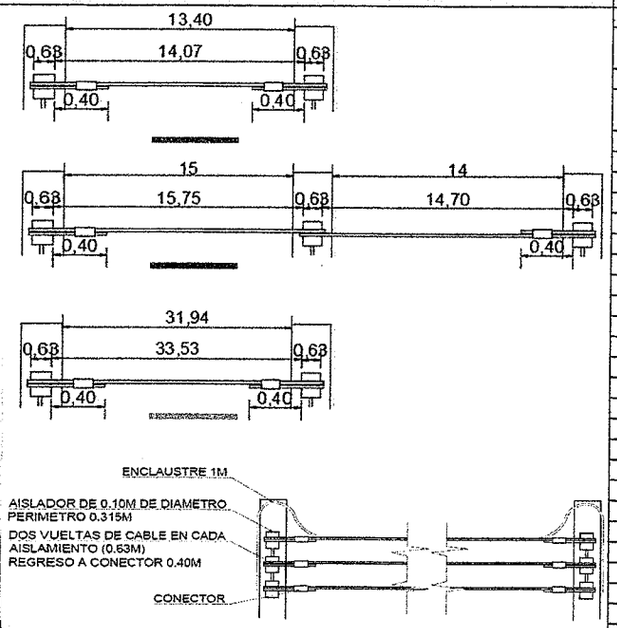

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD			
	0.63 c/u	0.40 c/u				
RED ELECTRICA DE POSTES DE CANCHA	1,26	0,80	14,07	3,00	48,39	48,39
RED ENTRE POSTES	1,89	0,80	30,45	2,00	66,28	66,28
RED DE POSTE VIA PRINCIPAL A CANCHA	1,26	0,80	33,53	2,00	71,18	71,18
ENCLAUSTRES			1,00	5,00	5,00	5,00
					TOTAL	190,85

OBSERVACIONES:


	ELABORÓ	REVISÓ	VERIFICÓ	APROBÓ
Fecha de Elaboración				
Firma				
Nombres y Apellidos	Ing. Asdraldo Cardenas	Arq. Alvaro Calderon	Arq. Julian Poveda	Arq. Sandra Atuesta
Cargo	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	APOYO A LA SUPERVISION	SECRETARIA(O) OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATOS SIN INTERVENTORIA

N° Contrato	CO1.PCCNTR.5653328	N° Acta Parcial	3	Periodo de Facturación	DEL 16/02/2023 AL 31/05/2024	Acta de inicio	26/12/2023	Valor inicial del Contrato	$ 168.515.771,14
Objeto	ADECUACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO GUTIERREZ MENDEZ DE LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ					Acta de Suspensión	8/03/2024	Valor Adición 1	$ 58.057.640,00
						Acta de Reinicio	2/04/2024	Valor Adición 2	$ 25.847.462,00
Contratista	CONSULTCIVIL SAS			NIT/ N° Identificación	901013465-6	Acta de Suspensión	18/04/2024	Valor Actualizado	$ 252.420.873,76
						Acta de Reinicio	2/05/2024		
Director de Obra	ARQ. ALVARO POMPILIO CALDERON			Matricula Profesional	19234965	Plazo del Contrato	15 DIAS		
						Prorroga 1	15 DIAS		
Residente de Obra	ING, ASDRALDO CARDENAS HERNANDEZ			Matricula Profesional	11347236	Prorroga 2	50 DIAS		
						Prorroga 3	15 DIAS		
Supervisor del Contrato	ARQ. SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO			Apoyo a la Supervisión	ARQ. JULIAN ARMANDO POVEDA	Prorroga 4	25 DIAS		
						Plazo Actualizado	120 DIAS		

CAPITULO / ÍTEM	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M	UNIDAD
ONP-12	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION, INCLUYE SONDEO DE TUBERIA ADYACENTE	UND

ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

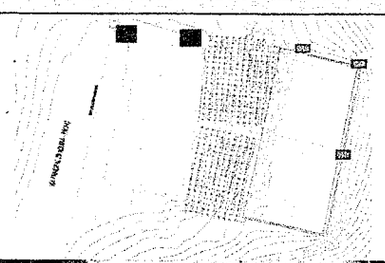





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD			
CORTE 3						
CAJAS EXISTENTES				2,00	2,00	2,00
					TOTAL	2,00

OBSERVACIONES:


	ELABORÓ	REVISÓ	VERIFICÓ	APROBÓ
Fecha de Elaboración				
Firma				
Nombres y Apellidos	Ing. Asdraldo Cardenas	Arq. Alvaro Calderon	Arq. Julian Poveda	Arq. Sandra Atuesta
Cargo	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	APOYO A LA SUPERVISIÓN	SECRETARIA(O) OBRAS PUBLICAS


DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATOS SIN INTERVENTORIA

N° Contrato	CO1.PCCNTR.5653328	N° Acta Parcial	3	Periodo de Facturación	DEL 16/02/2023 AL 31/05/2024	Acta de Inicio	26/12/2023	Valor Inicial del Contrato	$ 168.515.771,14
Objeto	ADECUACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO GUTIERREZ MENDEZ DE LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ					Acta de Suspensión	8/03/2024	Valor Adición 1	$ 58.057.640,00
						Acta de Reinicio	2/04/2024	Valor Adición 2	$ 25.847.462,00
Contratista	CONSULTCIVIL SAS			NIT/ N° Identificación	901013465-6	Acta de Suspensión	18/04/2024	Valor Actualizado	$ 252.420.873,76
						Acta de Reinicio	2/05/2024		
Director de Obra	ARQ. ALVARO POMPILIO CALDERON			Matricula Profesional	19234965	Plazo del Contrato	15 DIAS		
						Prorroga 1	15 DIAS		
Residente de Obra	ING, ASDRALDO CARDENAS HERNANDEZ			Matricula Profesional	-11347236	Prorroga 2	50 DIAS		
						Prorroga 3	15 DIAS		
Supervisor del Contrato	ARQ. SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO			Apoyo a la Supervisión	ARQ. JULIAN ARMANDO POVEDA	Prorroga 4	25 DIAS		
						Plazo Actualizado	120 DIAS		

CAPITULO / ÍTEM	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M	UNIDAD
ONP-14	REJILLA PARA CARCAMO	ML

ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

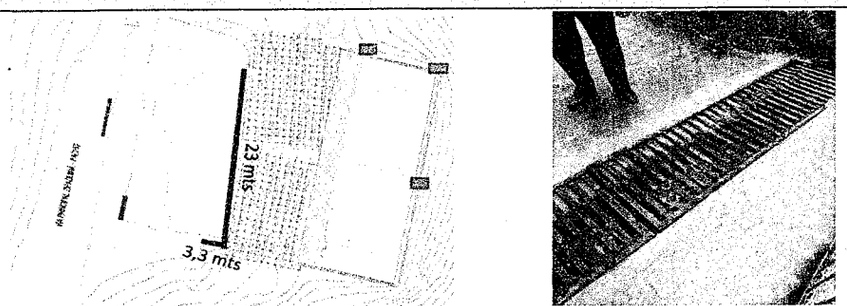

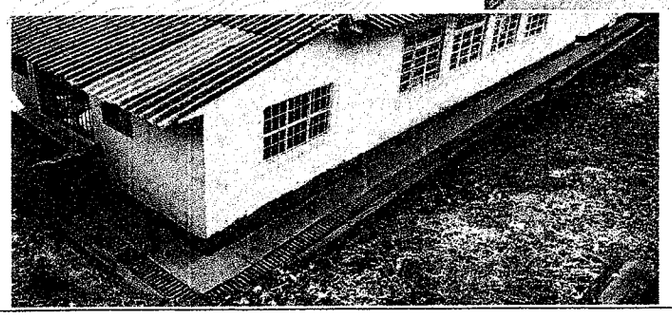

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES LONGITUD	N° ELEMENTOS	CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD TOTAL
CORTE 3						
EDIFICIO PRINCIPAL			26,30	1,00	26,30	26,30
ACCESO COLEGIO			4,00	1,00	4,00	4,00
					TOTAL	30,30

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	REVISÓ	VERIFICÓ	APROBÓ
Fecha de Elaboración				
Firma				
Nombres y Apellidos	Ing. Asdraldo Cardenas	Arq. Alvaro Calderon	Arq. Julian Poveda	Arq. Sandra Atuesta
Cargo	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	APOYO A LA SUPERVISIÓN	SECRETARIA(O) OBRAS PUBLICAS
