INFORME DE SUPERVISION PARA EL PAGO N°01

NOMBRE CONTRATISTA:	KANON RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS S.A.S		
IDENTIFICACIÓN:	901.622.823-2		
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	4330	Responsabilidad DIAN: PN ____ PJ _X__	
	DECLARA:	SI _X___ NO___	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL.		
SUPERVISOR:	MARIO DIAZ MANTILLA – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA		
NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SAMC 05 DE 2024	**FECHA:** 29/11/2024	
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y DEMARCACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y DEL PATINODROMO EN EL SECTOR DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO DEPARTAMENTO DE SANTANDER.		
TERMINO DE DURACIÓN:	TREINTA (30) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
VALOR:	DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON DOCE CENTAVOS MCTE ($248.240.240,12).		
NÚMERO PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.7088031		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	24-01001	**FECHA:** 22/10/2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	24-01536	**FECHA:** 29/11/2024	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo/ Fte de financiación: BTDE RECURSOS DEL BALANCE TASA PRO-DEPORTE 2: GASTOS 2.3: INVERSION 2.3.2: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.3.2.01: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.3.2.01.01: ACTIVOS FIJOS 2.3.2.01.01.001: EDIFICACIONES Y ESTRUCTURA 2.3.2.01.01.001.03: OTRAS ESTRUCTURAS 2.3.2.01.01.001.03.18: CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE 2.3.2.01.01.001.03.18.06: LE:1 SOCORRO GOBIERNO SOCIAL 2.3.2.01.01.001.03.18.06.43: DEPORTE Y RECREACION 2.3.2.01.01.001.03.18.06.43.4301: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte 2.3.2.01.01.001.03.18.06.43.4301.4301004: servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (recursos del balance) Fondo/Fte de financiación: SGDP S.G.P DEPORTE		

	2: GASTOS 2.3: INVERSION 2.3.2: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.3.2.01: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.3.2.01.01: ACTIVOS FIJOS 2.3.2.01.01.001: EDIFICACIONES Y ESTRUCTURA 2.3.2.01.01.001.03: OTRAS ESTRUCTURAS 2.3.2.01.01.001.03.18: CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE 2.3.2.01.01.001.03.18.06: LE:1 SOCORRO GOBIERNO SOCIAL 2.3.2.01.01.001.03.18.06.43: DEPORTE Y RECREACION 2.3.2.01.01.001.03.18.06.43.4301: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte 2.3.2.01.01.001.03.18.06.43.4301.4301004: servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	
PÓLIZAS - GARANTÍAS:	NUMERO:	I-100038878; I-100009516
	COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
	FECHA EXPEDICIÓN:	29/11/2024
	FECHA DE APROBACIÓN:	29/11/2024
FORMA DE PAGO:	El contrato se pagará bajo la modalidad de PRECIOS UNITARIOS, teniendo en cuenta que es el sistema que más facilita la determinación del alcance del objeto del contrato (en relación a criterios de cantidad, calidad, especificación, plazos y costos de ejecución de la obra); además, posibilita la determinación de las obras no previstas, así como los aumentos y disminuciones (mayores y menores cantidades) y las actas se calculan sobre la base de la cantidad de obra ejecutada, verificable por parte de la interventoría, Supervisión y el Contratista. EL MUNICIPIO DEL SOCORRO pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera, en pesos colombianos así: 1. Hasta el noventa por ciento (90%) del contrato con pagos parciales, de acuerdo con la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los ítems de obra desarrollados y el valor unitario, al cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Actas de recibo de obra parcial a satisfacción, debidamente suscritas entre el contratista y supervisor. b) Para cada pago se debe presentar el informe correspondiente debidamente soportado de manera técnica y contable y avalado por el supervisor, factura o documento equivalente y pagos al sistema de seguridad social en salud y pensión de conformidad a la norma vigente. 2. El diez por ciento (10%) final del contrato será cancelado una vez se entregue evidencias al supervisor, del cumplimiento de los requisitos para la liquidación del contrato. Dichas sumas se pagarán una vez cumplidos los requisitos por parte del CONTRATISTA. Para el pago del 10% final, se requiere además de los requisitos mencionados anteriormente en el literal b, lo siguiente: a) Acta de recibo final de la obra a satisfacción suscrita por el contratista y supervisor. b) Anexar la garantía de estabilidad de la obra actualizada y aprobada por la entidad. c) Pago del SENA y FIC por parte del contratista.	
FECHA DE INICIO CONTRATO:	29/11/2024	

FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	29/12/2024		
PERIODO DE COBRO	29/11/2024		
	23/12/2024		
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	NUMERO PLANILLA:	9477659068	9478595298
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	OCTUBRE	NOVIEMBRE
	NUMERO PLANILLA:	9477659068	9478595298
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	OCTUBRE	NOVIEMBRE
	NUMERO PLANILLA:	9477659068	9478595298

ASPECTO TÉCNICO			
ACTIVIDADES CONTRACTUALES -ALCANCE DEL OBJETO	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL	OBSERVACIONES	VERIFICACIÓN
MANTENIMIENTO Y DEMARCACION DE LA CANCHA COAM MUNICIPIO DEL SOCORRO			
1.1 Alistamiento de superficie, reparación de grietas y fisuras con mortero 100% acrílico, reconstrucción de juntas de dilatación y destroncado de superficie con disco diamantado	Se verifica la realización de 466.56m2 de alistamiento de la superficie, reparación de grietas y reconstrucción de juntas de dilatación en la cancha del colegio COAM como se aprecia en memoria de cantidades ejecutadas y registro fotográfico anexo	NINGUNA	CUMPLE
1.2 Aplicación de capa de regulación con mortero 100% acrílico	Se verifica la realización de 73,1927 m2 de aplicación de capa de regulación con mortero 100% acrílico en la cancha del colegio COAM, quedando pendiente de ejecutar una cantidad de 393,37 m2 como se aprecia en memoria de cantidades ejecutadas y registro fotográfico anexo	NUNGIUNA	CUMPLE
1.3 Aplicación de carga de arena sílice malla 60/40 y sello acrílico	Actividad pendiente por ejecutar	NUNGIUNA	PENDIENTE
1.4 Aplicación acabado color con recubrimiento acrílico (2 capas)	Actividad pendiente por ejecutar	NUNGIUNA	PENDIENTE
1.5 Demarcación lineal y estampado de logotipo del escenario deportivo	Actividad pendiente por ejecutar	NUNGIUNA	PENDIENTE
MANTENIMIENTO Y DEMARCACION POLIDEPORTIVO JUVENTUD COMUNERA EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO			
1.1 Alistamiento de superficie, reparación de grietas y fisuras con mortero 100% acrílico, reconstrucción de juntas de dilatación y destroncado de superficie con disco diamantado	Se verifica la realización de 512.80m2 de alistamiento de la superficie, reparación de grietas y reconstrucción de juntas de dilatación en la cancha del polideportiva juventud comunera como se aprecia en memoria de cantidades ejecutadas y registro fotográfico anexo	NUNGIUNA	CUMPLE
1.2 Aplicación de capa de regulación con mortero 100% acrílico	Se verifica la aplicación de 512.80m2 de aplicación de capa de regulación con mortero acrilico, se aprecia con memoria de cantidades ejecutadas y registro fotográfico anexo	NUNGIUNA	CUMPLE
1.3 Aplicación de carga de arena silice malla 60/40 y sello acrílico	Se verifica la aplicación de 512.80 m2 de carga silice y sello acrilico en el polideportiva juventud comunera, se aprecia con memoria	NUNGIUNA	CUMPLE

	de cantidades ejecutadas y registro fotográfico anexo		
1.4 Aplicación acabado color con recubrimiento acrílico (2 capas)	Actividad pendiente por ejecutar	NUNGIUNA	PENDIENTE
1.5 Demarcación lineal y estampado de logotipo para escenario deportivo	Actividad pendiente por ejecutar	NUNGIUNA	PENDIENTE
MANTENIMIENTO Y DEMARCACION CANCHA CIC 16 DE MARZO EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER			
1.1 Alistamiento de superficie, reparación de grietas y fisuras con mortero 100% acrílico, reconstrucción de juntas de dilatación y destroncado de superficie con disco diamantado	Se verifica la realización de 639.18m2 de alistamiento de la superficie, reparación de grietas y reconstrucción de juntas de dilatación en la cancha múltiple CIC 16 de marzo como se aprecia en memoria de cantidades ejecutadas y registro fotográfico anexo	NUNGIUNA	CUMPLE
1.2 Aplicación de capa de regulación con mortero 100% acrílico	Se verifica la aplicación de 639.18m2 de aplicación de capa de regulación con mortero acrílico, se aprecia con memoria de cantidades ejecutadas y registro fotográfico anexo	NUNGIUNA	CUMPLE
1.3 Aplicación de carga de arena sílice malla 60/40 y sello acrílico	Se verifica la aplicación de 639.18 m2 de carga sílice y sello acrílico en la cancha múltiple CIC 16 de marzo se aprecia con memoria de cantidades ejecutadas y registro fotográfico anexo	NUNGIUNA	CUMPLE
1.4 Aplicación acabado color con recubrimiento acrílico (2 capas)	Actividad pendiente por ejecutar	NUNGIUNA	PENDIENTE
1.5 Demarcación lineal y estampado de logotipo para escenario deportivo	Actividad pendiente por ejecutar	NUNGIUNA	PENDIENTE
MANTENIMIENTO Y DEMARCACION DEL PATINODROMO SECTOR VILLA OLIMPICA MUNICIPIO DEL SOCORRO			
1.1 Alistamiento de superficie, reparación de grietas y fisuras con mortero 100% acrílico, reconstrucción de juntas de dilatación y destroncado de superficie con disco diamantado	Se verifica la realización de 1786m2 de alistamiento de la superficie, reparación de grietas y reconstrucción de juntas de dilatación en el patinódromo del municipio del socorro como se aprecia en memoria de cantidades ejecutadas y registro fotográfico anexo	NUNGIUNA	CUMPLE
1.2 Aplicación de capa de regulación con mortero 100% acrílico	Se verifica la aplicación de 1786m2 de aplicación de capa de regulación con mortero acrílico, se aprecia con memoria de cantidades ejecutadas y registro fotográfico anexo	NUNGIUNA	CUMPLE
1.3 Aplicación de carga de arena sílice malla 60/40 y sello acrílico	Se verifica la aplicación de 1786m2 de carga sílice y sello acrílico en el patinódromo del municipio del socorro como se aprecia con memoria de cantidades ejecutadas y registro fotográfico anexo	NUNGIUNA	CUMPLE
1.4 Aplicación acabado color con recubrimiento acrílico (2 capas)	Se verifica la aplicación de 1786m2 distribuido en 2 capas de acabado con recubrimiento acrílico en el patinódromo del socorro Santander, se aprecia en memoria de cantidades ejecutadas y registro fotográfico anexo	NUNGIUNA	CUMPLE

1.5 Demarcación lineal y estampado de logotipo para escenario deportivo	Se verifica la demarcación lineal DE 1786m2 del escenario deportivo y se verifica con memoria de cantidades ejecutadas y registro fotográfico anexo	NUNGIUNA	CUMPLE

RELACIÓN Y BALANCE FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO:	$248.240.240,12	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	$00,00	
VALOR ANTICIPO:		$ 00,00
PRIMER PAGO PRESENTE ACTA: Fecha: 23/12/2024		$ 184.870.243,00
VALOR POR COBRAR:		$ 63.369.997,12
SUMAS IGUALES	**$248.240.240,12**	**$248.240.240,12**

ASPECTO ADMINISTRATIVO		
FACTURA O CUENTA DE COBRO:	FE124	FECHA: 19/12/2024
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS:	PRIMERO	
NÚMERO RECIBO ESTAMPILLA	2502400743609	FECHA: 20/12/2024

OBSERVACIONES ADICIONALES PRESENTE ACTA: SI

Se deja observación que el pago de estampillas No. 2502400743609 se realizo con el numero de orden de pago FE124, la cual fue anulada y expedida la nueva factura número FE127 que es la correcta.

Una vez avalada la ejecución del periodo y revisados los documentos del contratista, este se somete al turno de pago, tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

Se firma por el supervisor en el Municipio del Socorro - Santander, el día: 23 de diciembre de 2024.

Supervisor

MARIO DIAZ MANTILLA
Secretario de Infraestructura

MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER


MANTENIMIENTO Y DEMARCACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y DEL PATINODROMO EN EL SECTOR DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER


ITEM			
1,10	CANCHA COLEGIO AVELINA MORENO COAM	UNIDAD	m2

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	AREA	ALTO	AREA TOTAL
1	Alistamiento de superficie, reparación de grietas y fisuras con mortero 100% acrilico, reconstrucción de juntas de dilatación y destroncado de superficie con disco diamantado.	1	28,80	16,20	466,56	0	466,56
						CANTIDAD	466,56

REGISTRO FOTOGRAFICO Y ESQUEMAS

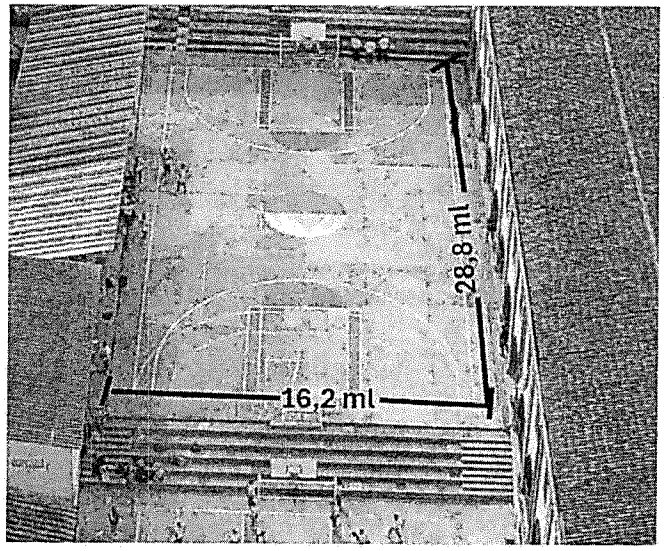

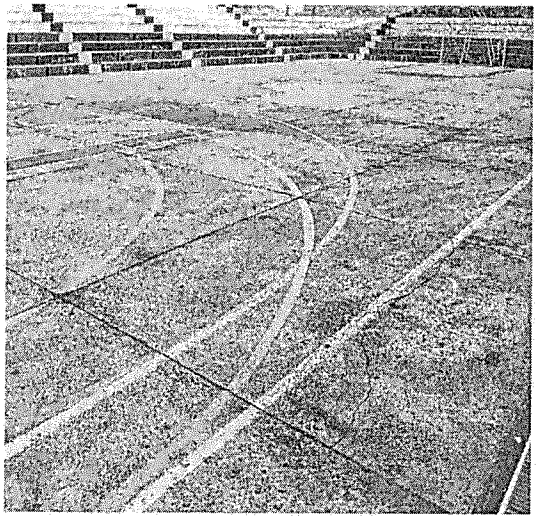



Arq MARIO DIAZ MANTILLA
Secretario de Infraestructura

MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER


MANTENIMIENTO Y DEMARCACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y DEL PATINODROMO EN EL SECTOR DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ITEM			
1,10	POLIDEPORTIVO JUVENTUD COMUNERA	UNIDAD	m2

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	AREA	ALTO	AREA TOTAL
1	Alistamiento de superficie, reparación de grietas y fisuras con mortero 100% acrilico, reconstrucción de juntas de dilatación y destroncado de superficie con disco diamantado.		32,70	15,68	512,80	0,00	512,80
						CANTIDAD	512,80

REGISTRO FOTOGRAFICO Y ESQUEMAS

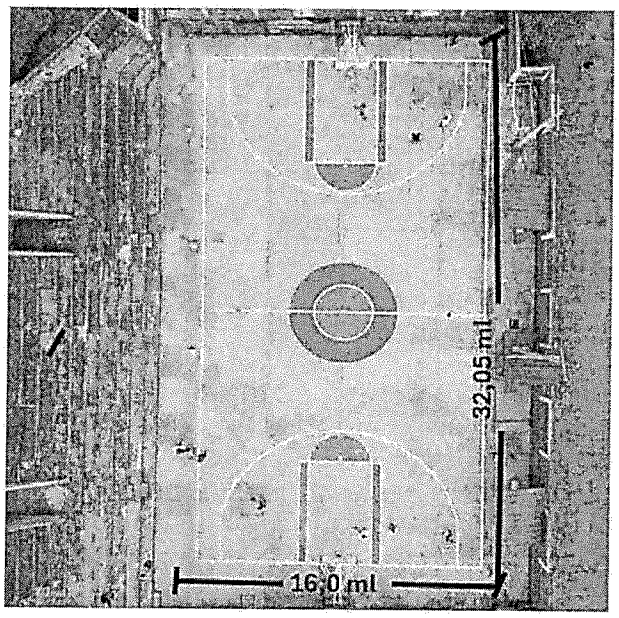





Arq MARIO DIAZ MANTILLA
Secretario de Infraestructura


MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER


MANTENIMIENTO Y DEMARCACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y DEL PATINODROMO EN EL SECTOR DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ITEM			
1,20	POLIDEPORTIVO JUVENTUD COMUNERA	UNIDAD	m2

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	AREA	ALTO	AREA TOTAL
1	Aplicación de capa de regulación con mortero 100% acrilico.	32,70	15,68	512,80	0,00	512,80	512,80
						CANTIDAD	512,80

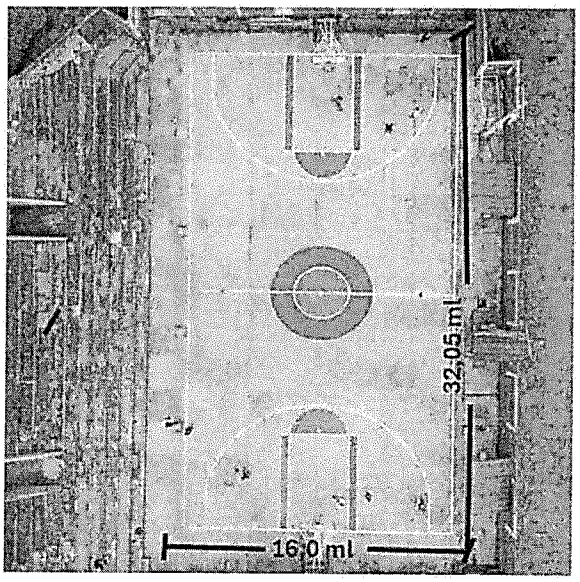

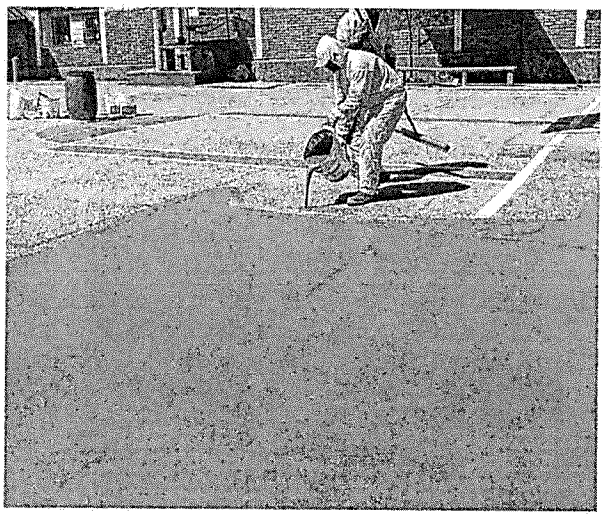



Arq MARIO DIAZ MANTILLA
Secretario de Infraestructura

MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER


MANTENIMIENTO Y DEMARCACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y DEL PATINODROMO EN EL SECTOR DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ITEM			
1,30	POLIDEPORTIVO JUVENTUD COMUNERA	UNIDAD	m2

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	AREA	ALTO	AREA TOTAL
1	Aplicación de carga de arena silice malla 60/40 y sello acrilico.	32,70	15,68	512,80	0,00	512,80	512,80
						CANTIDAD	512,80

REGISTRO FOTOGRAFICO Y ESQUEMAS

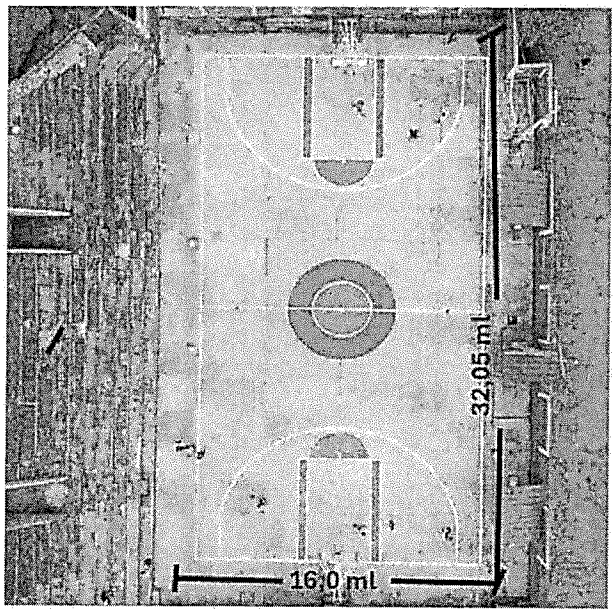





Arq MARIO DIAZ MANTILLA
Secretario de Infraestructura

MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER


MANTENIMIENTO Y DEMARCACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y DEL PATINODROMO EN EL SECTOR DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ITEM			
1,1	CIC 16 DE MARZO	UNIDAD	m2

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	AREA	ALTO	TOTAL
1	Alistamiento de superficie, reparación de grietas y fisuras con mortero 100% acrilico, reconstrucción de juntas de dilatación y destroncado de superficie con disco diamantado.	1,00	30,55	20,92	639,18	0	639,18
						CANTIDAD	639,18

REGISTRO FOTOGRAFICO Y ESQUEMAS

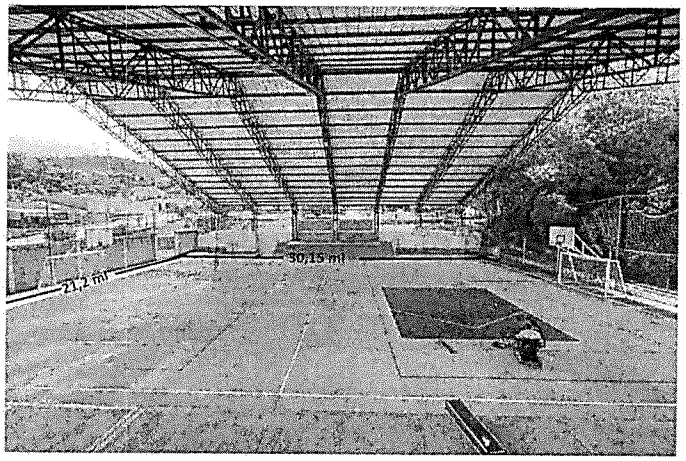



Arq MARIO DIAZ MANTILLA
Secretario de Infraestructura

MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER


MANTENIMIENTO Y DEMARCACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y DEL PATINODROMO EN EL SECTOR DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER


ITEM			
1,2	CIC 16 DE MARZO	UNIDAD	m2

MEMORIAS DE CALCULO

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	AREA	ALTO	TOTAL
1	Aplicación de capa de regulación con mortero 100% acrilico.	1,00	30,55	20,92	639,18	0	639,18
						CANTIDAD	639,18

REGISTRO FOTOGRAFICO Y ESQUEMAS

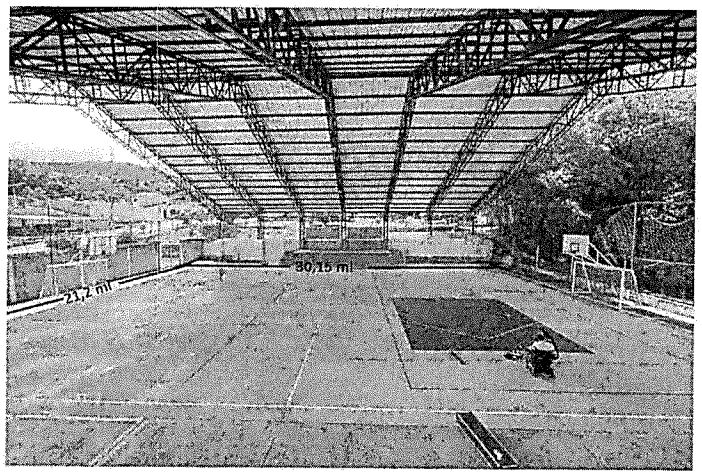

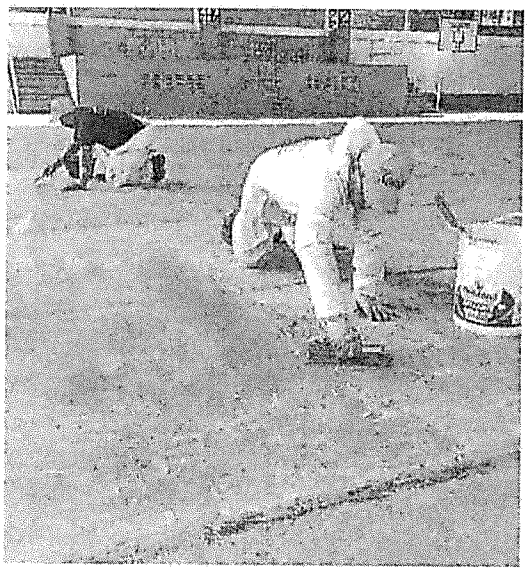

Arq MARIO DIAZ MANTILLA
Secretario de Infraestructura

MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER


MANTENIMIENTO Y DEMARCACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y DEL PATINODROMO EN EL SECTOR DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER


ITEM			
1,3	CIC 16 DE MARZO	UNIDAD	m2


MEMORIAS DE CALCULO

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	AREA	ALTO	TOTAL
1	Aplicación de carga de arena silice malla 60/40 y sello acrilico.	1,00	30,55	20,92	639,18	0	639,18
						CANTIDAD	639,18

REGISTRO FOTOGRAFICO Y ESQUEMAS

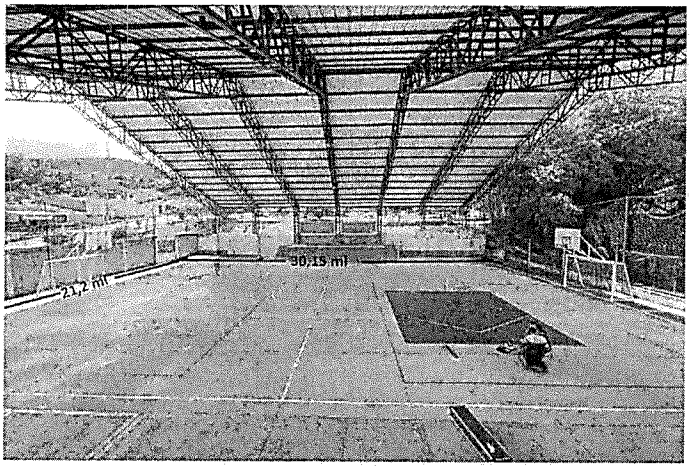

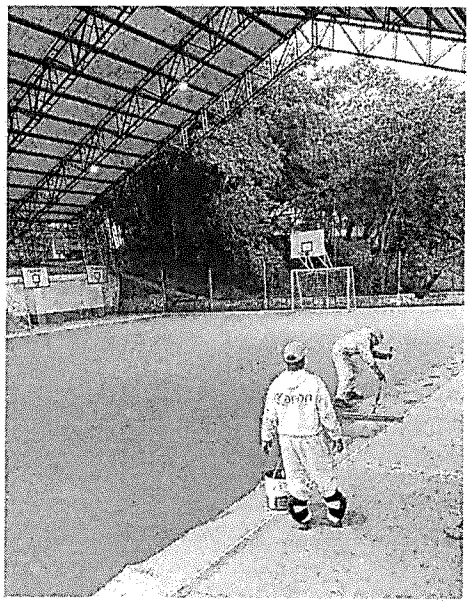

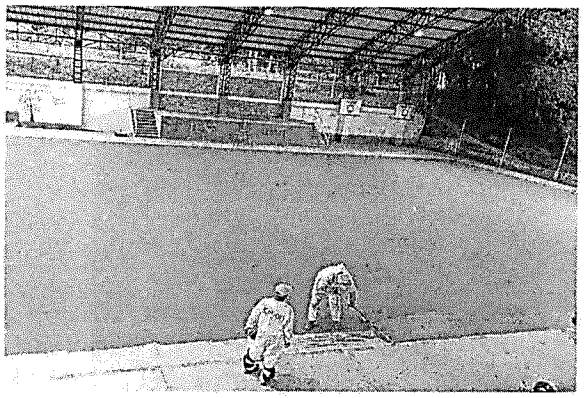

Arq MARIO DIAZ MANTILLA
Secretario de Infraestructura

MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER


MANTENIMIENTO Y DEMARCACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y DEL PATINODROMO EN EL SECTOR DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER


ITEM			
1,1	PATINODROMO SECTOR DE LA VILLA OLIMPICA	UNIDAD	m2


MEMORIAS DE CALCULO

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	AREA	ALTO	TOTAL
1	Alistamiento de superficie, reparación de grietas y fisuras con mortero 100% acrilico, reconstrucción de juntas de dilatación y destroncado de superficie con disco diamantado.	1,00	223,25	8,00	1786	0	1786,00
						CANTIDAD	1786,00

REGISTRO FOTOGRAFICO Y ESQUEMAS

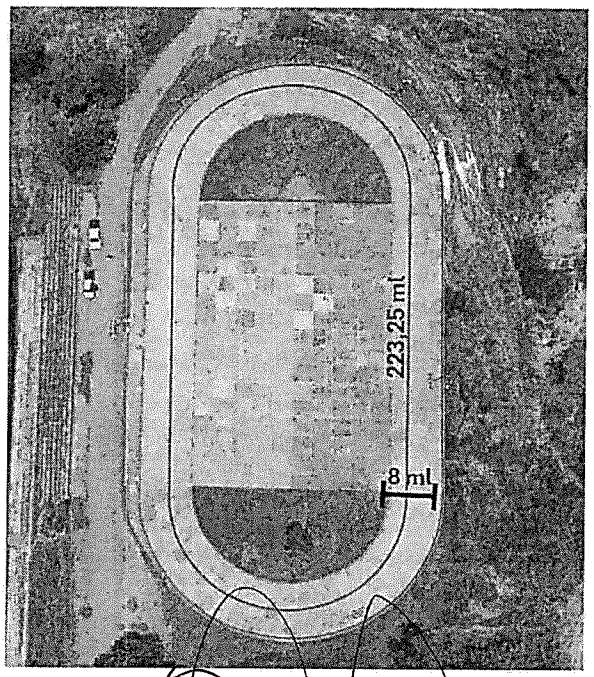

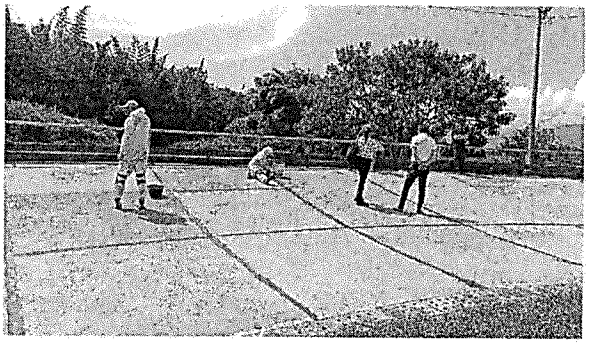

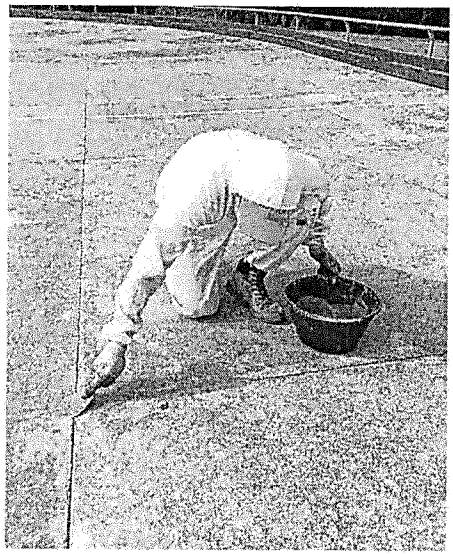

Arq MARIO DIAZ MANTILLA
Secretario de Infraestructura

MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER


MANTENIMIENTO Y DEMARCACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y DEL PATINODROMO EN EL SECTOR DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER


ITEM			
1,2	PATINODROMO SECTOR DE LA VILLA OLIMPICA	UNIDAD	m2

MEMORIAS DE CALCULO

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	AREA	ALTO	TOTAL
1	Aplicación de capa de regulación con mortero 100% acrilico.	1,00	223,25	8,00	1786	0	1786,00
						CANTIDAD	1786,00

REGISTRO FOTOGRAFICO Y ESQUEMAS

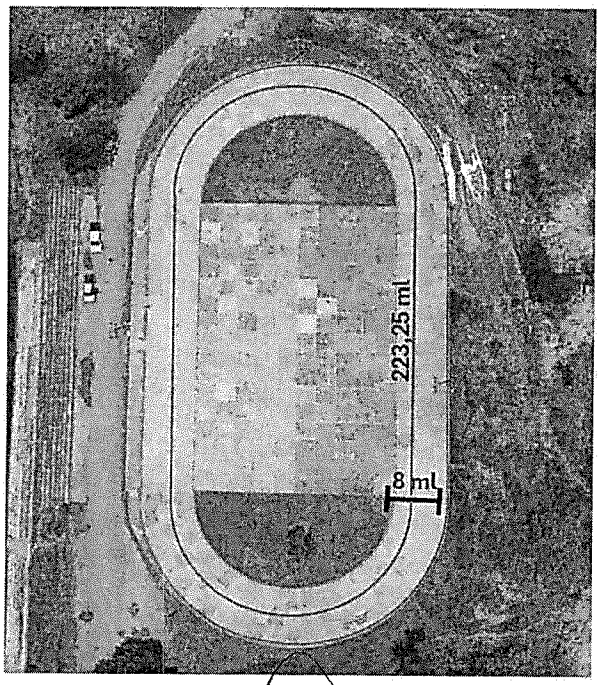

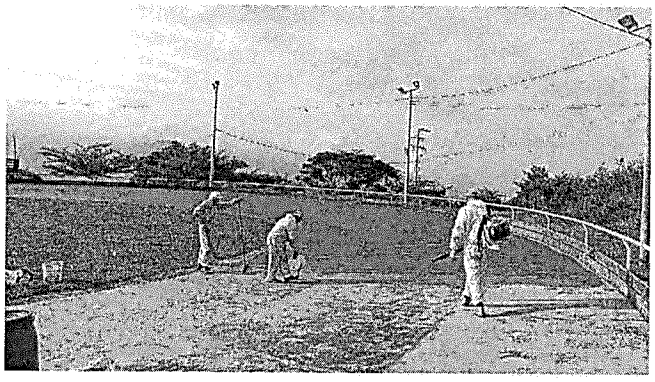



Arq MARIO DIAZ MANTILLA
Secretario de Infraestructura

MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER

MANTENIMIENTO Y DEMARCACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y DEL PATINODROMO EN EL SECTOR DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER


ITEM

1,3	PATINODROMO SECTOR DE LA VILLA OLIMPICA	UNIDAD	m2

MEMORIAS DE CALCULO

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	AREA	ALTO	TOTAL
1	Aplicación de carga de arena silice malla 60/40 y sello acrilico.	1,00	223,25	8,00	1786	0	1786,00
						CANTIDAD	1786,00

REGISTRO FOTOGRAFICO Y ESQUEMAS

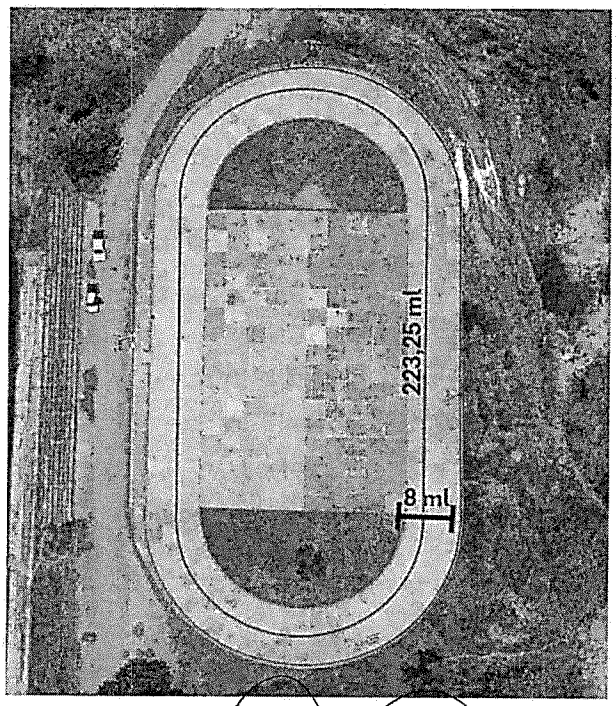





Arq MARIO DIAZ MANTILLA
Secretario de Infraestructura

MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER

MANTENIMIENTO Y DEMARCACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y DEL PATINODROMO EN EL SECTOR DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER


ITEM


1,4	PATINODROMO SECTOR DE LA VILLA OLIMPICA	UNIDAD	m2

MEMORIAS DE CALCULO

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	AREA	ALTO	TOTAL
1	Aplicación de color con recubrimiento acrilico	1,00	223,25	8,00	1786	0	1786,00
						CANTIDAD	1786,00

REGISTRO FOTOGRAFICO Y ESQUEMAS

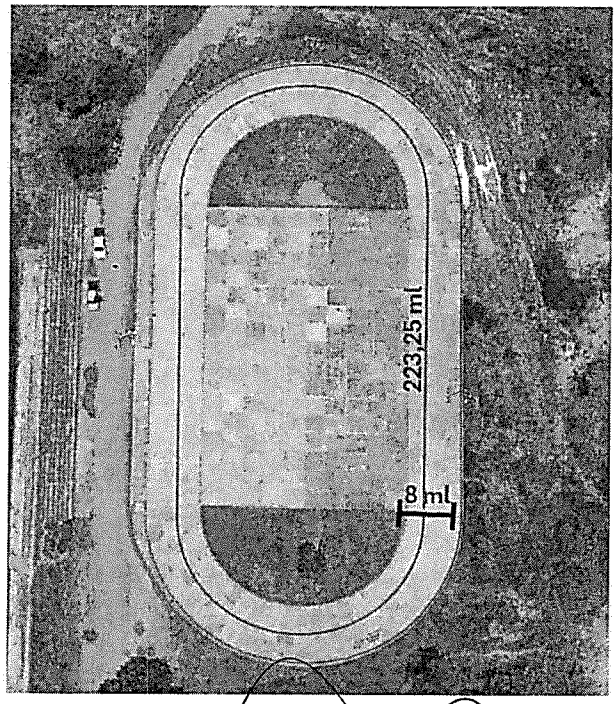

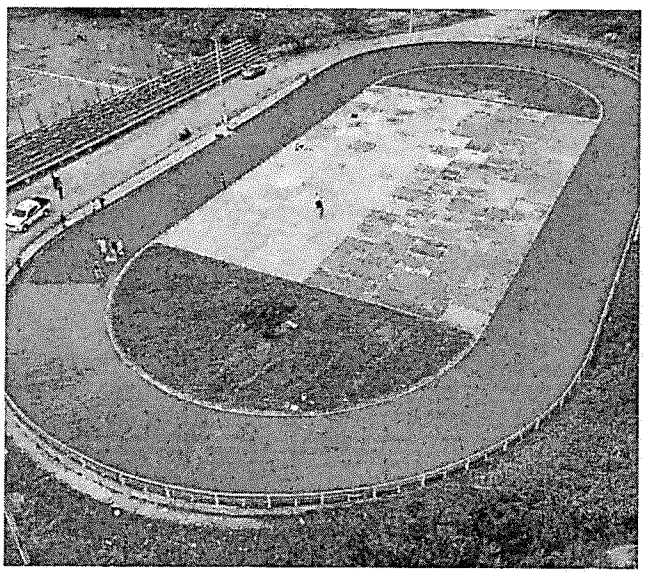

Arq MARIO DIAZ MANTILLA
Secretario de Infraestructura

MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER


MANTENIMIENTO Y DEMARCACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y DEL PATINODROMO EN EL SECTOR DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ITEM			
1,5	PATINODROMO SECTOR DE LA VILLA OLIMPICA	UNIDAD	m2


MEMORIAS DE CALCULO

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	AREA	ALTO	TOTAL
1	Demarcacion lineal y estampado de logotipo en escenario deportivo	1,00	223,25	8,00	1786	0	1786,00
						CANTIDAD	1786,00

REGISTRO FOTOGRAFICO Y ESQUEMAS

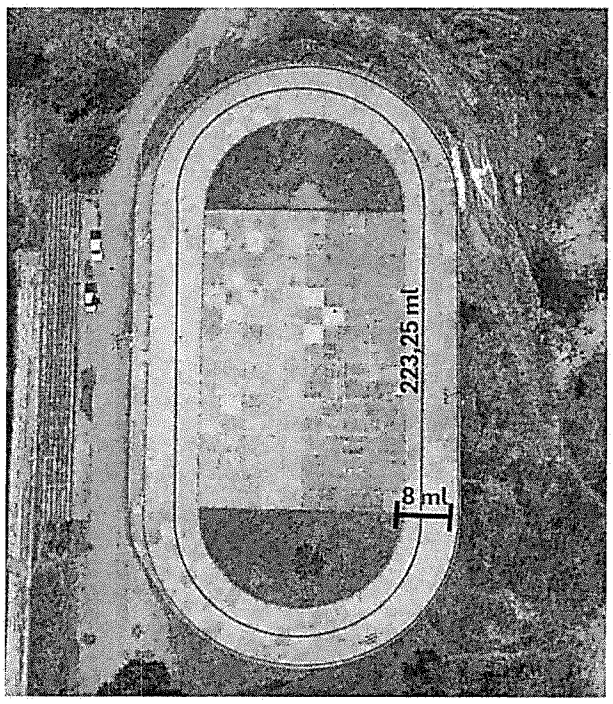



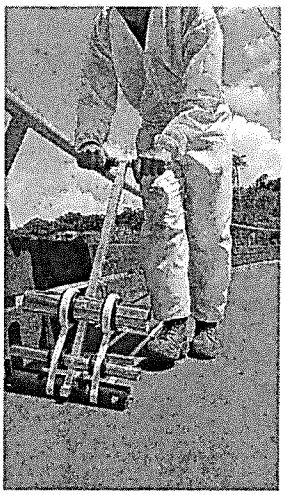



Arq MARIO DIAZ MANTILLA
Secretario de Infraestructura
