
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CO1.PCCNTR.5535582

OBJETO:

RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y ANDENES DE UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 12, REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 12 Y CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO LONGITUDINAL EN UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 13 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.

INFORME AVANCE No. 003

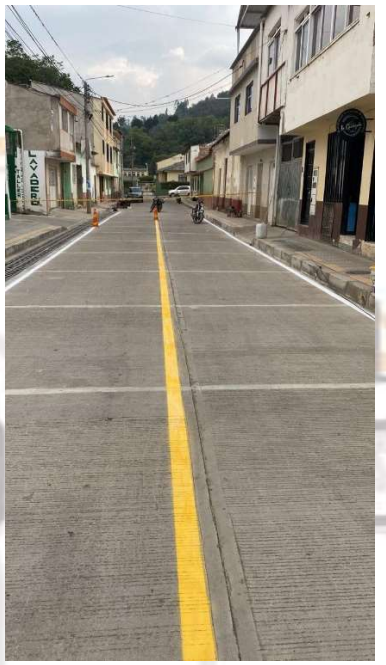

PERIODO DE EJECUCIÓN: DESDE EL 26 DE MARZO DE 2024 HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2024

CONTRATISTA: ASOCONSTRUCCIONES R.J S.A.S OBRA PÚBLICA CO1.PCCNTR.5535582

INTERVENTOR: ANGIE KATHERINE HERNANDEZ MARTINEZ

Teléfono: 6607058 - 3124350737
Dirección: Cra10 n10-82 Málaga Santander
Nuestro correo: Gerenciasoconstrucciones@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El proyecto **"RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y ANDENES DE UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 12, REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 12 Y CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO LONGITUDINAL EN UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 13 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER."**, se encuentra localizado en el municipio de **MALAGA,** departamento de Santander y dista de Bucaramanga a 140 km, aproximadamente.

La ejecución del proyecto se ha venido realizando a lo largo de la carrera 11 entre calles 11, 12 y 13 con la intervención de la margen izquierda en el sentido Norte Sur, para el cambio de tubería de agua potable en un diámetro de 6" y la construcción del canal recolector de aguas lluvias. A lo largo de carrera 11 entre calles 11 y 12 se ha realizado el cambio de redes de alcantarillado y la continuación del cambio de tubería de agua potable y la construcción del canal de aguas lluvias, también la adecuación del terreno para el suministro y colocación de concreto rígido, obras de urbanismo y señalización.

Con la ejecución de este proyecto se busca mitigar los problemas de inundación a lo largo de la calle 12 y la carrera 11 entre calles 11y 12, además de beneficiar a cerca de 25 viviendas con el cumplimento del plan maestro de acueducto y alcantarillado para sus viviendas.

Finalmente, la ejecución de este contrato se está desarrollando en los términos establecidos por la Entidad Contratante (2 meses) y una prórroga en tiempo de quince (15) días debido a un ajuste realizado al proyecto garantizando las condiciones indicadas en los documentos que hacen parte integral del proyecto. Cabe resaltar que este contrato tuvo interventoría a cargo de la Ingeniera Angie Katherine Hernández Martínez.

1. TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

1.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.5535582
FECHA DEL CONTRATO	11 DE NOVIEMBRE DE 2023
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO:	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y ANDENES DE UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 12, REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 12 Y CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO LONGITUDINAL EN UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 13 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.
VALOR INICIAL	QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL Y CORRIENTE ($595.292.264,79 M/CTE).
VALOR ADICIONAL	VEINTISIETE MILLONES ($27.000.000,00)
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL	QUINCE (15) DIAS
CONTRATISTA	ASOCONSTRUCCIONES R.J S.A.S. NIT. 900.557.482-2 R.L. ROQUE JULIO SUAREZ GONZÁLEZ C.C. No. 13.930.350 DE MÁLAGA
SUPERVISOR	ING. JHON STEVEN AGUDELO LOPEZ REPRESENTANTE LEGAL IMPULSA MAS
INTERVENTOR	ING. ANGIE KATHERINE HERNANDEZ MARTINEZ CC. 1.096.957.470 DE MÁLAGA
ANTICIPO	SI ____ NO __X__ VALOR $ _____ (PORCENTAJE ____ %)
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA SUSPENSION No. 01	11 DE ENERO DE 2024
FECHA DE REINICIO No. 01	21 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE ABRIL DE 2024

1.2. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA

ACTA	FECHA	OBSERVACION
INICIO	16 DE NOVIEMBRE DE 2023	Se suscribe Acta de Inicio, que reposa en el expediente contractual.
MODIFICACION DE CANTIDADES	1 DE DICIEMBRE DE 2023	Se suscribe Acta de Modificación de cantidades y precios no previstos No. 001, teniendo en cuenta las condiciones en campo.
ACTA DE SUSPENSION No. 001	11 DE ENERO DE 2024	Se suscribe acta de Suspensión No. 001 y se realizan dos prórrogas a la suspensión en razón a la demora en la actualización del proyecto.
ACTA DE REINICIO No. 001	21 DE MARZO DE 2024	Se suscribe acta de reinicio una vez solucionadas las situaciones que originaron la suspensión y sus prorrogas.

PRORROGA No. 001	26 DE MARZO DE 2024	Se suscribe Prorroga al contrato de Obra por un termino de quince (15) días, para realizar las labores de señalización y urbanismo.

1.3. CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO.

Los cambios técnicos y modificaciones al proyecto están soportadas en las condiciones del terreno además de actividades e insumos necesarios para la correcta instalación de la tubería de agua potable y el atraque de tuberías sanitarias, así como adecuación del terreno a pavimentar, de la cual se deriva el Acta de Modificación de Cantidades y Precios no previstos suscrita por el Contratista de Obra, Supervisor e Interventor, donde se incluyen nuevos ítems que son considerados necesarios para llevar a cabo la ejecución del contrato y que no habían sido contemplados inicialmente, garantizando un adecuado proceso constructivo de las estructuras y de los tramos de aducción y conducción de agua.

Por las razones anteriores también se realizó una actualización al proyecto que permitiera la realización de las actividades de obra correspondientes a señalización horizontal, vertical y obras de urbanismo.

1.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

1.4.1 ACTIVIDADES TECNICAS:

Revisión de sitios de ejecución de las obras, para hacer un análisis integral del proyecto en conjunto con la Interventoría, verificando las condiciones del terreno y condiciones de accesibilidad a los sitios de construcción de las obras, derivándose el Comité de Obra referido y posterior Acta de Modificación de cantidades y precios no previstos No. 001.

Localización: Se realiza visita con personal de la firma de Interventoría y Secretaría de Planeación e Infraestructura del municipio de Málaga, determinándose las localizaciones de los puntos a intervenir, informándose al Contratista las actividades a ejecutar.

Adicionalmente, se revisan las condiciones del contrato presentes en las cantidades de obra a ejecutar, análisis de precios unitarios con el fin de adecuar procedimientos, materiales y directrices, de tal forma que el resultado sea conforme lo contratado por el contratante.
Finalmente, se desarrollaron seguimiento a las cantidades de obra de forma periódica en conjunto con personal de la firma Interventora para llevar un seguimiento real de las actividades

ejecutadas, verificando el límite presupuestal condicionado en el proyecto. Las siguientes cantidades fueron contempladas inicialmente dentro del proyecto y sus modificaciones han sido ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES	CANTIDADES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION (ADICIÓN)		CANTIDADES TOTAL EJECUTADAS	
		UND	CANT.	V.PARCIAL	CANT.	V.PARCIAL
GENERAL						
1	**PRELIMINARES**					
1,10	Localización y replanteo	m2	942,35	$3.430.712,95	942,35	3.430.712,95
1,20	Demolición y remoción de andenes y placas en pavimento en concreto existentes (Incluye transporte de material hasta escombrera y derecho de botadero)	m2	898,37	$16.771.376,32	898,37	16.771.376,32
1,30	Demolición y remoción de bordillos existentes (Incluye transporte de material contaminado hasta escombrera y derecho de botadero)	m	219,90	$2.256.559,47	219,90	2.256.559,47
1,40	Demolición de muro de Entrada a Conjunto ESSA (Incluye transporte de material contaminado hasta escombrera y derecho a botadero)	ml	2,00	$33.807,46	2,00	33.807,46
				$22.492.456,20		**$22.492.456,20**
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**					
2,10	Excavación mecánica en material común del sitio para nivelación del terreno (Incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m3	299,90	$8.039.418,54	299,90	8.039.418,54
2,20	Material seleccionado Tmax 3" para nivelación del terreno (incluye transporte, extendido, nivelación y compactación)	m3	128,81	$15.419.716,41	128,81	15.419.716,41
				$23.459.134,95		**$23.459.134,95**
3	**ESTRCUTURA DE SUMIDEROS**					
3,10	Excavación manual en material común del sitio para construcción de sumideros (Incluye transporte de material contaminado hasta	m3	96,46	$6.065.741,87	96,46	6.065.741,87

Teléfono: 6607058 - 3124350737
Dirección: Cra10 n10-82 Málaga Santander
Nuestro correo: Gerenciasoconstrucciones@gmail.com

ASOCONSTRUCCIONES RJ
Nit: 900557482-2

	escombrera y derecho de botadero)					
3,20	Acero figurado de refuerzo de 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI) para sumideros	Kg	5.399,67	$52.179.908,62	5.399,67	52.179.908,62
3,30	Concreto impermeabilizado de 210 kg/cm² (3.000 PSI) para sumideros	m3	59,20	$96.874.661,15	59,20	96.874.661,15
3,40	Rejilla Constuida en Taller para Sumidero Longitudinal (carcamo)	kg	6.423,29	$120.369.354,18	6.423,29	120.369.354,18
				$275.489.665,82		**$275.489.665,82**
4	**REPOSICION DE REDES ALCANTARILLADO**					
4,10	Excavación manual en material común del sitio para Intalacion de Tuberia Domiciliarias (Incluye transporte de material contaminado hasta escombrera y derecho de botadero)	m3	26,68	$1.677.731,63	26,68	1.677.731,63
4,20	Excavación mecánica en material común del sitio para Instalación de Tuberia Principal (Incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m3	73,14	$1.960.663,80	73,14	1.960.663,80
4,30	Instalacion de Tuberia Sanitaria de 12" Suministrada por EPMM	ml	79,50	$4.406.840,75	79,50	4.406.840,75
4,40	Suministro e Instalacion de Tuberia PVC Novasfort de D= 6"	ml	74,35	$6.115.226,20	74,35	6.115.226,20
4,50	Construccion de Cajas Domiciliarias 60x60x50	und	18,00	$13.378.598,86	18,00	13.378.598,86
4,60	Construccion de Pozos de Inspeccion 1<H<2	und	2,00	$7.809.397,43	2,00	7.809.397,43
4,70	Suministro e Instalacion de Silla Yee PVC sanitarias de 6" a 12"	Und	18,00	$4.088.305,05	18,00	4.088.305,05
				$39.436.763,72		**$39.436.763,72**
5	**REPOSICION DE REDES ACUEDUCTO**					
5,10	Excavación manual en material común del sitio para conexión de tuberias domiciliarias de acueducto (Incluye transporte de material contaminado hasta escombrera y derecho de botadero)	m3	35,52	$2.233.621,72	35,52	2.233.621,72

5,20	Instalacion de Tuberia de 6" RDE 21 Suministrada por EPMM	ml	132,80	$4.746.978,03	132,80	4.746.978,03
5,30	Suministro e instalación Tuberia presión 2" rde 21	ml	89,40	$4.471.176,56	89,40	4.471.176,56
5,40	Suministro e instalacion Tee Union Campana Ø 6"X 2"X6"	und	-	$0,00	-	-
5,50	Suministro e instalacion de acometida PF+UAD Ø 1/2"	ml	27,00	$1.505.537,04	27,00	1.505.537,04
5,60	Suministro e instalacion de cajas y tapas para medidor	und	20,00	$3.453.306,70	20,00	3.453.306,70
				$16.410.620,05		**$16.410.620,05**
6	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO**					
6,10	Base granular clase A para estructura de pavimento- e=0,25 m (incluye transporte, suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación)	m3	160,16	$27.869.658,67	160,16	27.869.658,67
6,20	Acero de refuerzo de 60.000 PSI para dovelas, barras de anclaje, y Losas Irregulares (Incluye transporte)	Kg	689,56	$6.663.588,29	689,56	6.663.588,29
6,30	Acero de Canastillas para dovelas (Incluye Transporte)	kg	121,50	$1.230.868,22	121,50	1.230.868,22
6,40	Pavimento en concreto de 5.000 PSI; MR=42.5 Mpa	m3	102,72	$87.396.029,26	102,72	87.396.029,26
6,50	Corte y Sellado de juntas	m	384,30	$4.503.681,00	384,30	4.503.681,00
				$127.663.825,44		**$127.663.825,44**
7	**URBANISMO**					
7,10	Excavación manual en material común para instalación de bordillos (Incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m3	9,60	$603.681,55	9,60	603.681,55
7,20	Bordillo prefabricado A10, A80, hombros o similar, 3.500 PSI (variable x 0,20 x 0,80 m)	m	166,90	$16.812.887,29	166,90	16.812.887,29
7,30	Bordillo Para Delimitacion y Contencion de adoquin Partes Externas(0.25*0.35)	ml	-	$0,00	-	-
7,40	Placa en concreto reforzado de 3.000 PSI	m2	-	$0,00	-	-

ASG CONSTRUCCIONES RJ
Nit: 900557482-2

	e=0,10 m, con malla electrosoldada, para anden aceeso en rampas					
7,50	Tableta de cemento lisa de 0,4x0,4 m, en color gris	m2	79,18	$10.027.090,36	79,18	10.027.090,36
7,60	Tableta de cemento táctil de 0,4x0,4 m, para línea alerta o podotactil de personas con movilidad reducida	m2	66,20	$11.084.831,02	66,20	11.084.831,02
7,70	Tableta de cemento táctil de 0,2x0,4 m, para demarcacion guía de personas con movilidad reducida	m2	29,10	$4.872.637,20	29,10	4.872.637,20
				$43.401.127,42		**$43.401.127,42**
8	**SEÑALIZACIÓN VIAL**					
8,10	Señal vertical de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (60 x 60) cm	Und	4,00	$3.380.646,92	4,00	3.380.646,92
8,20	Demarcación vial con pintura tipo trafico	m2	32,29	$1.661.512,67	32,29	1.661.512,67
8,30	Línea de demarcación vial con pintura tipo tráfico acrílico y microesferas reflectivas, ancho de 0.12 m (en el eje y costados laterales)	m	352,40	$1.394.763,88	352,40	1.394.763,88
				$6.436.923,47		**$6.436.923,47**
9	**NO PREVISTOS**					
9,01	Demolición de pozo de inspección (incluye trasiego por la obra y retiro a escombrera)	Und	1,00	$696.304,68	1,00	696.304,68
9,02	Atraque para tubería en concreto de 2.000Psi	m3	21,22	$14.428.778,83	21,22	14.428.778,83
9,03	Relleno de zanja con arena para sentar tuberías	m3	25,37	$4.553.757,68	25,37	4.553.757,68
9,04	Pedraplén tamaño máximo 6"(incluye transporte, extendido, nivelación y compactación)	m3	18,25	$3.213.965,98	18,25	3.213.965,98
9,05	Suministro e instalación de Collarín 6x1/2" PVC	Und	12,00	$1.080.279,78	12,00	1.080.279,78
9,06	Suministro e instalación de Collarín 2x1/2" PVC	Und	15,00	$1.049.321,63	15,00	1.049.321,63
9,07	Suministro e instalación de Tee 6x6x6 + buje de 6x4 + buje de 4x2 PVC	Und	3,00	$3.235.353,32	3,00	3.235.353,32
9,08	Suministro e instalación de Semicodo 6" presión PVC	Und	5,00	$2.075.620,69	5,00	2.075.620,69
9,09	Concreto solado de limpieza e=0.05 [m]	m2	167,76	$11.777.840,59	167,76	11.777.840,59

9,10	Adecuación de bajantes de aguas lluvias para desagüe a estructura de pavimento	Und	22,00	$2.271.577,88	22,00	2.271.577,88
9,11	Suministro e instalación de codo 6" de gran radio 22.5° PVC	und	1,00	$458.227,56	1,00	458.227,56
9,12	Demolición de muro en concreto reforzado	m2	0,64	$80.088,35	0,64	80.088,35
9,13	Suministro e instalación de unión 6" hf	Und	1,00	$785.445,60	1,00	785.445,60
9,14	Construcción de rampa para acceso vehícular en andenes e= 0.12 m concreto de 4.000 (Psi), acabado escobillado	m2	66,27	$11.692.566,54	66,27	11.692.566,54
9,15	Construccion de Rampas de Acceso peatonal, en concreto de 3000 psi acabado escobillado	Und	17,00	$4.658.189,30	17,00	4.658.189,30
9,16	Construcción de caja de inspección energía eléctrica	Und	2,00	$803.829,32	2,00	803.829,32
				$62.861.147,73		**$62.861.147,73**
		SUBTOTAL		**$617.651.664,80**		**$617.651.664,80**
		COSTO TOTAL OBRA		**$617.651.664,80**		**$617.651.664,80**
		PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO		$3.600.000,00		$3.600.000,00
		PLAN ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL		$1.040.600,00		$1.040.600,00
		COSTO TOTAL OBRA		**$622.292.264,80**		**$622.292.264,80**

De otra parte, con la suscripción del Acta de Modificación de cantidades, se hizo absolutamente necesaria la inclusión de ítems no previstos con el fin de garantizar la funcionabilidad del proyecto. También para la actualización del proyecto, producto de solicitudes realizadas por el contratista de obra, a la supervisión y a la interventoría se definieron las actividades necesarias para dar cierre al proyecto cumpliendo el objeto inicialmente planteado.

La modificación de cantidades e inclusión de ítems no previstos en la actualización del proyecto, estuvieron soportadas en lo siguiente:

1.- Que, para el ente contratante dar cumplimento de lo solicitado por el sistema general de regalías en cuanto al alcance del proyecto, se hacía necesaria la actualización del proyecto de tal manera que se destinara la totalidad de los recursos propuestos inicialmente para la terminación y funcionabilidad del proyecto que origino el presente contrato de obra.

Así las cosas, de una forma general se presentan las cantidades ejecutadas en el acta parcial No. 002, dentro del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5535582 cuyo objeto obedece a

RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y ANDENES DE UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 12, REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 12 Y CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO LONGITUDINAL EN UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 13 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES	ACTA PARCIAL DE COBRO No.3 (10 de abril de 2024)		CANTIDADES TOTAL EJECUTADAS	
		UND	CANT.	V.PARCIAL	CANT.	V.PARCIAL
GENERAL						
1	**PRELIMINARES**					
1,10	Localización y replanteo	m2	-	$0,00	942,35	3.430.712,95
1,20	Demolición y remoción de andenes y placas en pavimento en concreto existentes (Incluye transporte de material hasta escombrera y derecho de botadero)	m2	-	$0,00	898,37	16.771.376,32
1,30	Demolición y remoción de bordillos existentes (Incluye transporte de material contaminado hasta escombrera y derecho de botadero)	m	-	$0,00	219,90	2.256.559,47
1,40	Demolición de muro de Entrada a Conjunto ESSA (Incluye transporte de material contaminado hasta escombrera y derecho a botadero)	ml	-	$0,00	2,00	33.807,46
				$0,00		**$22.492.456,20**
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**					
2,10	Excavación mecánica en material común del sitio para nivelación del terreno (Incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m3	-	$0,00	299,90	8.039.418,54
2,20	Material seleccionado Tmax 3" para nivelación del terreno (incluye transporte, extendido, nivelación y compactación)	m3	-	$0,00	128,81	15.419.716,41
				$0,00		**$23.459.134,95**
3	**ESTRCUTURA DE SUMIDEROS**					
3,10	Excavación manual en material común del sitio para construcción de sumideros (Incluye transporte de material	m3	-	$0,00	96,46	6.065.741,87

ASOCONSTRUCCIONES RJ
Nit: 900557482-2

	contaminado hasta escombrera y derecho de botadero)					
3,20	Acero figurado de refuerzo de 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI) para sumideros	Kg	-	$0,00	5.399,67	52.179.908,62
3,30	Concreto impermeabilizado de 210 kg/cm² (3.000 PSI) para sumideros	m3	-	$0,00	59,20	96.874.661,15
3,40	Rejilla Construida en Taller para Sumidero Longitudinal (carcamo)	kg	95,87	$1.796.557,53	6.423,29	120.369.354,18
				$1.796.557,53		**$275.489.665,82**
4	**REPOSICION DE REDES ALCANTARILLADO**					
4,10	Excavación manual en material común del sitio para Instalación de tubería Domiciliarias (Incluye transporte de material contaminado hasta escombrera y derecho de botadero)	m3	-	$0,00	26,68	1.677.731,63
4,20	Excavación mecánica en material común del sitio para Instalación de Tuberia Principal (Incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m3	-	$0,00	73,14	1.960.663,80
4,30	instalación de Tuberia Sanitaria de 12" Suministrada por EPMM	ml	-	$0,00	79,50	4.406.840,75
4,40	Suministro e instalación de tubería PVC Novasfort de D= 6"	ml	-	$0,00	74,35	6.115.226,20
4,50	Construcción de Cajas Domiciliarias 60x60x50	und	-	$0,00	18,00	13.378.598,86
4,60	construcción de Pozos de inspección 1<H<2	und	-	$0,00	2,00	7.809.397,43
4,70	Suministro e instalación de Silla Yee PVC sanitarias de 6" a 12"	Und	-	$0,00	18,00	4.088.305,05
				$0,00		**$39.436.763,72**
5	**REPOSICION DE REDES ACUEDUCTO**					
5,10	Excavación manual en material común del sitio para conexión de tuberias domiciliarias de acueducto (Incluye transporte de material contaminado hasta escombrera y derecho de botadero)	m3	-	$0,00	35,52	2.233.621,72
5,20	instalación de tubería de 6" RDE 21 Suministrada por EPMM	ml	-	$0,00	132,80	4.746.978,03
5,30	Suministro e instalación Tuberia presión 2" rde 21	ml	-	$0,00	89,40	4.471.176,56

Teléfono: 6607058 - 3124350737
Dirección: Cra10 n10-82 Málaga Santander
Nuestro correo: Gerenciasoconstrucciones@gmail.com

5,40	Suministro e instalación Tee Union Campana Ø 6"X 2"X6"	und	-	$0,00	-	-
5,50	Suministro e instalación de acometida PF+UAD Ø 1/2"	ml	-	$0,00	27,00	1.505.537,04
5,60	Suministro e instalación de cajas y tapas para medidor	und	-	$0,00	20,00	3.453.306,70
				$0,00		**$16.410.620,05**
6	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO**					
6,10	Base granular clase A para estructura de pavimento-e=0,25 m (incluye transporte, suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación)	m3	34,15	$5.942.487,78	160,16	27.869.658,67
6,20	Acero de refuerzo de 60.000 PSI para dovelas, barras de anclaje, y Losas Irregulares (Incluye transporte)	Kg	-	$0,00	689,56	6.663.588,29
6,30	Acero de Canastillas para dovelas (Incluye Transporte)	kg	-	$0,00	121,50	1.230.868,22
6,40	Pavimento en concreto de 5.000 PSI; MR=42.5 Mpa	m3	-	$0,00	102,72	87.396.029,26
6,50	Corte y Sellado de juntas	m	-	$0,00	384,30	4.503.681,00
				$5.942.487,78		**$127.663.825,44**
7	**URBANISMO**					
7,10	Excavación manual en material común para instalación de bordillos (Incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m3	-	$0,00	9,60	603.681,55
7,20	Bordillo prefabricado A10, A80, hombros o similar, 3.500 PSI (variable x 0,20 x 0,80 m)	m	-	$0,00	166,90	16.812.887,29
7,30	Bordillo Para delimitación y contención de adoquín Partes Externas(0.25*0.35)	ml	-	$0,00	-	-
7,40	Placa en concreto reforzado de 3.000 PSI e=0,10 m, con malla electrosoldada, para anden acceso en rampas	m2	-	$0,00	-	-
7,50	Tableta de cemento lisa de 0,4x0,4 m, en color gris	m2	79,18	$10.027.090,36	79,18	10.027.090,36
7,60	Tableta de cemento táctil de 0,4x0,4 m, para línea alerta o podo táctil de personas con movilidad reducida	m2	66,20	$11.084.831,02	66,20	11.084.831,02
7,70	Tableta de cemento táctil de 0,2x0,4 m, para	m2	29,10	$4.872.637,20	29,10	4.872.637,20

ASO CONSTRUCCIONES RJ
Nit: 900557482-2

	demarcación guía de personas con movilidad reducida					
				$25.984.558,58		**$43.401.127,42**
8	**SEÑALIZACIÓN VIAL**					
8,10	Señal vertical de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (60 x 60) cm	Und	4,00	$3.380.646,92	4,00	3.380.646,92
8,20	Demarcación vial con pintura tipo trafico	m2	32,29	$1.661.512,67	32,29	1.661.512,67
8,30	Línea de demarcación vial con pintura tipo tráfico acrílico y microesferas reflectivas, ancho de 0.12 m (en el eje y costados laterales)	m	352,40	$1.394.763,88	352,40	1.394.763,88
				$6.436.923,47		**$6.436.923,47**
9	**NO PREVISTOS**					
9,01	Demolición de pozo de inspección (incluye trasiego por la obra y retiro a escombrera)	Und	-	$0,00	1,00	696.304,68
9,02	Atraque para tubería en concreto de 2.000Psi	m3	-	$0,00	21,22	14.428.778,83
9,03	Relleno de zanja con arena para sentar tuberías	m3	-	$0,00	25,37	4.553.757,68
9,04	Pedraplén tamaño máximo 6"(incluye transporte, extendido, nivelación y compactación)	m3	-	$0,00	18,25	3.213.965,98
9,05	Suministro e instalación de Collarín 6x1/2" PVC	Und	-	$0,00	12,00	1.080.279,78
9,06	Suministro e instalación de Collarín 2x1/2" PVC	Und	-	$0,00	15,00	1.049.321,63
9,07	Suministro e instalación de Tee 6x6x6 + buje de 6x4 + buje de 4x2 PVC	Und	-	$0,00	3,00	3.235.353,32
9,08	Suministro e instalación de Semicodo 6" presión PVC	Und	-	$0,00	5,00	2.075.620,69
9,09	Concreto solado de limpieza e=0.05 [m]	m2	-	$0,00	167,76	11.777.840,59
9,10	Adecuación de bajantes de aguas lluvias para desagüe a estructura de pavimento	Und	22,00	$2.271.577,88	22,00	2.271.577,88
9,11	Suministro e instalación de codo 6" de gran radio 22.5° PVC	und	-	$0,00	1,00	458.227,56
9,12	Demolición de muro en concreto reforzado	m2	-	$0,00	0,64	80.088,35
9,13	Suministro e instalación de unión 6" hf	Und	-	$0,00	1,00	785.445,60
9,14	Construcción de rampa para acceso vehícular en andenes e= 0.12 m concreto de 4.000 (Psi), acabado escobillado	m2	66,27	$11.692.566,54	66,27	11.692.566,54
9,15	construcción de Rampas de Acceso peatonal, en	Und	17,00	$4.658.189,30	17,00	4.658.189,30

	concreto de 3000 psi acabado escobillado					
9,16	Construcción de caja de inspección energía eléctrica	Und	-	$0,00	2,00	803.829,32
				$18.622.333,72		**$62.861.147,73**
			SUBTOTAL	**$58.782.861,08**		**$617.651.664,80**
			COSTO TOTAL OBRA	**$58.782.861,08**		**$617.651.664,80**
			PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	$3.600.000,00		$3.600.000,00
			PLAN ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL	$1.040.600,00		$1.040.600,00
			COSTO TOTAL OBRA	**$63.423.461,08**		**$622.292.264,80**

El acumulado de ejecución a la fecha corresponde a la totalidad de la obra, equivalente al 100% del costo del contrato.

1.4.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS: Se ha desarrollado la socialización del proyecto con las comunidades beneficiarias del proyecto, registros que reposan en la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Málaga.

De otra parte, durante el tiempo transcurrido del contrato se ha realizado e implementado el sistema de salud y seguridad en el trabajo de acuerdo al personal presente en obra, realizando exámenes de ingreso a los trabajadores, garantizando la entrega de dotación y elementos de protección personal para cada persona que hace parte del proyecto.

Mantener comunicación permanente con la Administración Municipal, Impulsa más, así como con la parte interventora del proyecto Ing. Angie Katherine Hernández Martínez.

Las actividades administrativas también incluyen la afiliación de personal al Sistema General de seguridad social, adquisición de pólizas requeridas en el contrato suscrito, seguimiento de las actividades y del tiempo de ejecución de acuerdo a la programación de obra establecida para cumplir a cabalidad el alcance de la obra dentro del plazo del contrato.

Trámites documentales correspondientes, como la suscripción acta de Suspensión, reinicio y prorrogas, proyección de informes y actas relacionadas a la ejecución del contrato.

1.4.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS: Debido a que el contrato renuncio al anticipo, no se presenta inversión del anticipo, sin embargo, se hace control al flujo de caja de acuerdo a la programación de obra. Estas actividades iniciaron con el programa de inversión, compra de

materiales, alquiler de equipos para la ejecución de las actividades, junto con el transporte y almacenamiento de los mismos, así como el balance del contrato de obra.

ASO CONSTRUCCIONES RJ
Nit: 900557482-2

1.4.4 ACTIVIDAES AMBIENTALES: De acuerdo con la Ley, se realizó entrega de los elementos de protección personal a los trabajadores, donde se evidencia lo especificado según imagen anexa. Seguridad social para los trabajadores. Socialización del proyecto con las comunidades beneficiarias. Además de dar cumplimiento a lo pactado en el plan de Manejo Ambiental.

1.4.4. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: El contratista cumplió con los pagos de seguridad social presentado planillas del personal en obra, así como con el control de calidad de materiales usados en obra y sistema de seguridad y salud en el trabajo. Se cumplió con el plan de manejo de Tránsito.

1.6. RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro: El personal solicitado según el pliego de condiciones o términos de referencia son:

CARGO	CANTIDAD	AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Director de Obra	1	Si
Profesional SG SST	1	Si
Inspector de obra	1	Si
Oficial	1	Si
Ayudantes	3	Si

1.7. RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

La relación de equipo utilizado en el desarrollo del presente contrato se discrimina en el siguiente cuadro:

EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD
Mezcladora	1	1 Bulto
Vibrador de concreto	1	
Volqueta	1	7 m3
Retroexcavadora	1	Pajarita

Vibro compactador	1	
Herramienta menor		

1.8. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA

Nombre de la Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Pólizas expedidas

Nº del contrato de seguro (póliza), o del contrato de fiducia mercantil por el cual se crea el patrimonio autónomo, o de la garantía Bancaria y carta de stand by	CONCEPTO DEL RIESGO QUE SE CUBRE	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AAAA)	Hasta (DD/MM/AAAA)
96-44-101186483	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/11/2023	10/08/2024
96-44-101186483	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	11/11/2023	10/08/2024
96-44-101186483	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/11/2023	10/04/2027
96-44-101186483	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10/04/2024	09/04/2029
96-40-101065515	REPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	11/11/2023	10/04/2024

INFORME SOBRE EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La empresa ASOCONSTRUCCIONES RJ SAS ha venido desarrollando la ejecución del sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, para la ejecución del contrato de la referencia. Así pues, algunas de las actividades desarrolladas dentro de este proceso son:

- **Validación de hojas de vida propuestas para mano de obra no calificada:** Se hizo necesario valorar las hojas de vida presentadas para mano de obra no calificada, realizando un filtro inicial en la edad de los interesados, por tanto, fueron rechazadas las hojas de vida de personal mayor a 80 años y menor de 18 años por no tener la mayoría de edad para poder desempeñar actividades laborales.

- **Programación y realización de examen de ingreso laboral:** Aquellas personas que fueron inicialmente seleccionados para desempeñar actividades de mano de obra no calificada, tuvo la respectiva programación y realización de los exámenes de ingreso laboral, donde la profesional de la salud dio recomendaciones sobre el estado de salud de cada uno de los trabajadores, indicando actividades prohibidas para algunos de ellos dadas sus condiciones de salud, posturas adecuadas, uso de elementos de protección personal, entre otros.

- **Afiliación a salud, pensión y riesgos laborales:** Una vez tenido el visto bueno y condiciones aptas de cada trabajador por parte de la profesional de salud se procedió a inscribir y afiliar a los respectivos sistemas de salud, pensión y riesgos laborales al personal con el que se decide laborar, situación que fue enviada y verificada por la Interventoría para el inicio de ejecución de los trabajos en los frentes respectivos.
  No obstante lo anterior, esta afiliación se pone de manifiesto en el pago de la planilla de seguridad social, referente a los meses respectivos de ejecución de obra, donde se muestra el ingreso del personal para la ejecución de actividades.

- **Capacitación de ingreso a la empresa, inducción, reinducción en seguridad y salud en el trabajo, riesgos laborales, entre otros:** Se desarrolló una capacitación de ingreso a la empresa con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra organización las políticas, reglamentos, procedimiento y normas establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores. En la inducción se dieron los siguientes temas: planeación estratégica, cultura organizacional, derechos y obligaciones, manual de funciones del cargo a desempeñar, manual de responsabilidades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, bases del sistema general de seguridad social, conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo, explicación del reglamento de higiene y seguridad industrial, entrega y explicación de los estándares generales de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, divulgación de factores de riesgo al interior de la empresa: biológicos, psicosociales, fenómenos naturales, físicos, mecánicos, químicos, entre otros.
- **Entrega de elementos de protección personal (EPP) y dotación:** Para poder llevar a cabo la ejecución de los trabajos respectivos de obras, la empresa ASOCONSTRUCCIONES RJ SAS realizó la entrega de elementos de protección personal y dotación consistente en gafas, casco, guantes, tapabocas y camisa de la empresa, al personal de los diferentes frentes de obra.

Así las cosas, la empresa ASOCONSTRUCCIONES RJ SAS da cumplimiento a lo establecido en la ley con relación al Sistema de seguridad y salud en el trabajo.



ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S.
NIT 900.557.482-2
Carrera 10 # 10 - 82
Tel: (57) 3124350737
Málaga - Colombia
julistam.01@gmail.com

Factura Electrónica
No. 267

Señores	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL IMPULSA MAS SAS		
NIT	901.700.548-6	**Teléfono**	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	ED MUNICIPAL ALCALDIA DE QUIMBAYA	**Ciudad**	Quimbaya - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/06/2024, 11:37
Expedición	06/06/2024, 11:38
Vencimiento	06/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Pago Final del Contrato de Obra Cuyo objeto es RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y ANDENES DE UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 12, REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 12 Y CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO LONGITUDINAL EN UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 13 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER	1.00	63,423,461.08	0.00	63,423,461.08

Fabricante Software y Provedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 1

Total Bruto	63,423,461.08
Total a Pagar	63,423,461.08

Valor en Letras:
Sesenta y tres millones cuatrocientos veintitres mil cuatrocientos sesenta y un pesos m/cte con ocho cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 63,423,461.08

Observaciones:
Para consignaciones por favor consignar a la cuenta de Ahorros Nº. 31288596231

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764048509003 aprobado en 20230504 prefijo desde el número 242 al 400 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa
CUFE: d82cd360339f86f61c792219a2f8e385d53d6eb9f3aef332f599b47b9a6735ee3a1a3a1513e95b1a496fba9def9538a5

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CO1.PCCNTR.5535582

OBJETO:

RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y ANDENES DE UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 12, REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 12 Y CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO LONGITUDINAL EN UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 13 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.

INFORME PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL

PERIODO DE EJECUCIÓN: DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2024

CONTRATISTA: ASOCONSTRUCCIONES R.J S.A.S OBRA PÚBLICA CO1.PCCNTR.5535582

INTERVENTOR: ANGIE KATHERINE HERNANDEZ MARTINEZ

Teléfono: 6607058 - 3124350737
Dirección: Cra10 n10-82 Málaga Santander
Nuestro correo: Gerenciasoconstrucciones@gmail.com

1.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.5535582
FECHA DEL CONTRATO	11 DE NOVIEMBRE DE 2023
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO:	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y ANDENES DE UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 12, REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 12 Y CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO LONGITUDINAL EN UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 13 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.
VALOR INICIAL	QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL Y CORRIENTE ($595.292.264,79 M/CTE).
VALOR ADICIONAL	VEINTISIETE MILLONES ($27.000.000,00)
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL	QUINCE (15) DIAS
CONTRATISTA	ASOCONSTRUCCIONES R.J S.A.S. NIT. 900.557.482-2 R.L. ROQUE JULIO SUAREZ GONZÁLEZ C.C. No. 13.930.350 DE MÁLAGA
SUPERVISOR	ING. JHON STEVEN AGUDELO LOPEZ REPRESENTANTE LEGAL IMPULSA MAS
INTERVENTOR	ING. ANGIE KATHERINE HERNANDEZ MARTINEZ CC. 1.096.957.470 DE MÁLAGA
ANTICIPO	SI ____ NO __X__ VALOR $ _____ (PORCENTAJE ____ %)
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA SUSPENSION No. 01	11 DE ENERO DE 2024
FECHA DE REINICIO No. 01	21 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE ABRIL DE 2024

El presente plan es el instrumento técnico de manejo ambiental para la RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y ANDENES DE UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 12, REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 12 Y CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO LONGITUDINAL EN UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 13 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.

Este proyecto no requiere de licencia ambiental para su ejecución. Como es el caso de esta obra la cual tiene como objeto la Pavimentación de vías, cumple con particularidades, en cuanto a su alcance, duración, área de ejecución, características de su entorno ambiental y necesidades de intervención de recursos naturales que requieran permisos o licencias. El seguimiento y control se hará solamente sobre lo declarado por el contratista.

Esta declaración debe corresponder a un compromiso profesional y ético de adecuada valoración, con el objetivo de no omitir aspectos esenciales que generen consecuencias negativas que a mediano y largo plazo afecten la calidad de las obras y su entorno.


La responsabilidad de la ingeniería de diseño y construcción, deriva de la intervención de recursos de patrimonio colectivo: (agua, suelo, flora, materiales de construcción, entre otros), necesarios para el desarrollo de las obras. Por lo tanto, los ejecutores se obligan a seguir las mejores prácticas de ingeniería, calidad y autocontrol, para prevenir y evitar impactos que degraden su calidad y uso futuro, afectando a las siguientes generaciones.

En tal sentido, la responsabilidad sectorial en la que se enmarca el presente documento se refiere a la autorregulación para promover el desarrollo sostenible. Así, sus usuarios directos, interventores y contratistas, deben tener claridad que no es un ejercicio de cumplimiento de requisitos legales ante autoridades ambientales, sino que busca potencializar los proyectos, en las mejoras en la calidad de vida y el desarrollo regional y local de la zona. Este enfoque, además de mejorar la calidad de las obras, igualmente lleva a mejorar la percepción de progreso por los usuarios y comunidades. Los avances en ingeniería permitirán que los responsables institucionales de proyectos, orienten los esfuerzos y recursos al desarrollo de actividades estratégicas, que contribuyan al cumplimiento de las metas de sostenibilidad que requiere el país para mejorar su competitividad.

Las fichas que se presentan definen las medidas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar cada uno de los impactos negativos identificados, en concordancia con el grado de alteración, los diferentes componentes ambientales considerados y las condiciones iniciales del entorno. Así mismo, para los impactos positivos o beneficiosos identificados, se formulan acciones para su aprovechamiento y potencialización.

FUENTES DE MATERIALES

Se realizo la adquisición de materiales para el proyecto objeto del presente estudio, en la planta de propiedad del señor Edgar Chaparro Cely, quien cuenta con Certificado de Registro de Comercializadores de Minerales. Se indica que la planta se encuentra ubicada en el municipio de Covarachía Boyacá a una distancia de 36 kilómetros de distancia al casco urbano del municipio de Málaga. De allí se utilizarán los materiales pétreos necesarios para realizar los trabajos de pavimentación.



AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

Certificado

Registro Único de Comercializadores de Minerales
RUCOM

Registro RUCOM-20200731017127

En cumplimiento del Capítulo 6° del Decreto Único Reglamentario del Sector de Minas y Energía No. 1073 del 25 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería certifica que EDGAR CHAPARRO CELY con CEDULA número 7223769 acredita la calidad de comercializador autorizado inscrito en el Registro Único de Comercializadores de Minerales.

La presente certificación permite al comercializador realizar de forma regular la actividad de comprar y vender minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos, exportarlos o consumirlos y tiene una vigencia del 31-08-2020 hasta el 31-07-2021. Durante el mes de mayo de 2021 el interesado debe realizar los trámites de renovación indicada en el Decreto 1073 de 2015.

Se acredita al comercializador de minerales luego de verificar y validar la información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - y consultar en la Base de datos de Confecámaras.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO AUTORIZA AL COMERCIALIZADOR A REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MINERALES.

Dado en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de agosto del año 2020.

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

PABLO ROBERTO BERNAL LOPEZ
Gerente de Proyecto - Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

DEMANDA AMBIENTAL DE RECURSOS NATURALES

- **Recurso Suelo:** El recurso suelo será necesario debido a los sitios de disposición final de residuos de construcción y el del corredor vial.

- **Recurso Hídrico:** El recurso agua será necesario en las siguientes actividades industriales: producción de concretos y mitigación de la contaminación atmosférica.

- **Agua para consumo humano:** Se estima una población flotante entre cuerpo de ingenieros, operarios, mecánicos y personal técnico de 10 personas y resulta un total de 450 hombres/mes que, con un consumo promedio de 150 lts por persona por día, requiere 202.5 m3 de agua en los 3 meses de duración del proyecto. Agua que será suministrada del acueducto municipal en el área del proyecto.

Sumando las cantidades anteriores se observa que la necesidad de agua es de unos 145.08 m3, que equivaldría a un caudal constante de 0.02 litros por segundo durante tres meses en los que se ha programado la ejecución del proyecto. El agua para el proyecto, será suministrada del acueducto municipal.

SEÑALIZACIÓN EN CASO DE CONTAR CON CARPAS O ÁREAS TEMPORALES DENTRO DEL FRENTE DE OBRA.

Las señales de seguridad de prohibición, obligación, prevención y de información necesarias cumplirán con la reglamentación necesaria de forma, color, contraste y textos así:



LUGAR DE APLICACION

Área de influencia directa del proyecto

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN

Grupo de gestión Ambiental y Social

ASOCONSTRUCCIONES RJ

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CO1.PCCNTR.5535582

OBJETO:

RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y ANDENES DE UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 12, REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 12 Y CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO LONGITUDINAL EN UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 13 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.

INFORME PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

PERIODO DE EJECUCIÓN: DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2024

CONTRATISTA: ASOCONSTRUCCIONES R.J S.A.S OBRA PÚBLICA CO1.PCCNTR.5535582

INTERVENTOR: ANGIE KATHERINE HERNANDEZ MARTINEZ

Teléfono: 6607058 - 3124350737
Dirección: Cra10 n10-82 Málaga Santander
Nuestro correo: Gerenciasoconstrucciones@gmail.com

1.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.5535582
FECHA DEL CONTRATO	11 DE NOVIEMBRE DE 2023
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO:	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y ANDENES DE UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 12, REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 12 Y CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO LONGITUDINAL EN UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 13 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER.
VALOR INICIAL	QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL Y CORRIENTE ($595.292.264,79 M/CTE).
VALOR ADICIONAL	VEINTISIETE MILLONES ($27.000.000,00)
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL	QUINCE (15) DIAS
CONTRATISTA	ASOCONSTRUCCIONES R.J S.A.S. NIT. 900.557.482-2 R.L. ROQUE JULIO SUAREZ GONZÁLEZ C.C. No. 13.930.350 DE MÁLAGA
SUPERVISOR	ING. JHON STEVEN AGUDELO LOPEZ REPRESENTANTE LEGAL IMPULSA MAS
INTERVENTOR	ING. ANGIE KATHERINE HERNANDEZ MARTINEZ CC. 1.096.957.470 DE MÁLAGA
ANTICIPO	SI ____ NO __X__ VALOR $ _____ (PORCENTAJE ____ %)
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA SUSPENSION No. 01	11 DE ENERO DE 2024
FECHA DE REINICIO No. 01	21 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE ABRIL DE 2024

GENERALIDADES

El objetivo principal es disminuir el impacto generado por las obras que se desarrollan en las vías públicas; por lo que se propone brindar seguridad y comodidad a los usuarios de la vía realizando soluciones básicas de señalización que cumplan con las normas establecidas para el manejo de tráfico, con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes y hacer más ágil el tránsito de los vehículos procurando reducir las molestias en su desplazamiento por la vía.

En la ejecución del plan de manejo de tránsito se tuvo en cuenta las características de la obra, asegurando niveles de operación aceptables y restringiendo la circulación vial lo menos posible.

El tipo de obra se clasifica según las interferencias para este caso se define como obras de interferencia mínima pues esta comprende únicamente los espacios de circulación afectados, ya que normalmente se intervienen tramos de circulación peatonal o de bajos volúmenes vehiculares, por lo que el plan de manejo debe cubrir una distancia de aproximación hasta de 500m en carreteras.

SEÑALIZACIÓN Y ADECUACIONES TEMPORALES

Los dispositivos para la regulación de tránsito permanecieron durante la ejecución de esta y se retiraron cuando se sanearon las condiciones que dieron origen a su instalación.

Los componentes más importantes de la señalización son:

- Señales verticales de tránsito: Se emplean en zonas de construcción y ejecución de obras viales son del mismo tipo de las de los grupos de reglamentarias, informativas y preventivas, clasifica. Para todas las señales verticales se utilizará materiales reflectivos Tipo I. Las señales verticales que se usarán en el plan de manejo son las que se identifican en el manual de señalización vial del ministerio de transportes con los siguientes códigos son:
  - Señales Preventivas: SPO-01, SPO-02, SPO-03
  - Señales Reglamentarias: SRO-01, SRO-02, SRO-03
  - Señales Informativas: SIO-01, SIO-02, SIO-03, SIO-04, SIO-05

  Las señales se instalaron al lado derecho de la vía, cuando fue necesario, en las zonas de trabajo se podrán instalar señales sobre la calzada en soportes portátiles, y también es permitido ubicarlas sobre las barreras. Se recomienda ubicar la primera señal de prevención en vías de menor jerarquía a una distancia entre los 100 y 200m.

- Dispositivos para la canalización del tránsito: Su función es encauzar el tránsito a través de la zona de trabajos y marcando las transiciones graduales necesarias en los casos en que se reduce el ancho de la vía o se generan movimientos inesperados; con el fin de garantizar el paso de los vehículos en forma gradual y segura en el área de trabajo, considerando la seguridad de los peatones, trabajadores y equipos de la obra. El cierre de carriles de circulación se hará en una longitud mínima de 200m. El cierre se hará por medio de algunos elementos como barricadas, delineadores tubulares con cinta plástica de delineación con separación entre ellos de 5m, y barreras plásticas.

- Paletas y banderas: Se usan comúnmente en las horas del día para efectos de regulación del tránsito en vías afectadas por la ejecución de obras. Las paletas son elementos fabricados en madera, plástico u otros materiales semirígidos livianos, que tienen la misma forma y características de la señal SR-01 Pare y que contiene los mensajes de “PARE” por una cara y de “SIGA” o “LENTO” en la otra cara. El tamaño mínimo de la paleta corresponderá a la inscripción de un octágono dentro de un círculo mínimo de 45 cm de diámetro.
  El fondo de la cara de “PARE”, será de color rojo con letras y bordes blancos y el fondo de la cara “SIGA”, será de color verde con letras y bordes blancos, todos ellos fabricados en lámina reflectiva Tipo I. El soporte de la paleta tendrá como mínimo 1,20 m de longitud y será de color blanco.

MATERIALES

SEÑALES VERTICALES DE TRÁNSITO.

Material reflectivo: Debe cumplir con las especificaciones contenidas en la Norma Técnica Colombiana NTC-4739. Deben elaborarse en lámina reflectiva Tipo I o de características superiores.
Material para tableros: Lamina de aluminio, acero galvanizado.
Postes de soporte: Perfil en ángulo de dos pulgadas (2”) por dos (2”) por un cuarto de

pulgada (1/4”)

Materiales para los brazos: Crucetas en ángulo de hierro de dos pulgadas (2”) por dos pulgadas (2”) por un octavo de pulgada (1/8”)

DISPOSITIVOS PARA LA CANALIZACIÓN DEL TRÁNSITO

BARRICADAS: Bandas o listones horizontales con longitud entre 2.0, y 2.4m y una altura de 0.20m, separadas por espacios iguales. Las franjas de las barreras serán de colores alternados blanco y naranja y serán elaboradas en material reflectivo Tipo III, de tal manera que sean visibles bajo condiciones atmosféricas normales a una distancia mínima de 300m, cuando se iluminen con las luces altas de un vehículo normal.

DELINEADORES TUBULARES: Están fabricados en material plástico anaranjado, con protección UV para evitar su decoloración y de alta resistencia al impacto, de tal manera que no se deteriore ni cause daño a los vehículos. Deberán contar con tres bandas de 7.5cm, separadas entre sí no menos de 10cm, elaboradas en lámina reflectiva blanca Tipo III o Tipo IV. La cinta plástica debe ser de color negro y amarillo o amarillo y blanco.

BARRERAS PLÁSTICAS FLEXIBLES (maletines): Son fabricados en material plástico, su color deberá ser naranja y contarán con franjas de lamina reflectiva Tipo III o IV, distribuidas en sentido horizontal y vertical, para lograr que estos dispositivos tengan un peos que evite su fácil movimiento, deberán ser llenadas con agua o arena.

PERSONAL

Se tendrán en cuenta 2 auxiliares de transito intermitentes, los cuales serán seleccionados y capacitados para realizar las funciones, ya que son los responsables de la seguridad de conductores y empleados, además que tienen el mayor contacto con el público. Por tales razones un banderero deberá cumplir con los siguientes

requisitos:

- Buenas condiciones físicas, incluidas visión, audición y estatura.
- Tener buenos modales
- Buena presentación personal, sentido de responsabilidad, particularmente para la prevención de riesgos de accidentes al público y trabajadores.
- Conocer las normas básicas de tránsito.

La indumentaria del auxiliar de transito constará de:
Un casco de color amarillo con franjas horizontales de 10 cm de largo por 5 cm de ancho, fabricadas en lámina reflectiva Tipo III, de color blanco en el frente y rojo en la parte posterior.

Chaleco color naranja con un mínimo de dos franjas (horizontales, verticales u oblicuas), de 5 cm cada una, en cinta reflectiva que cumpla con los coeficientes de retrorreflección especificados en la norma técnica colombiana NTC - 4739, para la lámina reflectiva Tipo I. Las franjas serán en color blanco, rojo o amarillo.

Cuando las condiciones climáticas lo requieran, el auxiliar de transio usará un impermeable de color amarillo, con una franja blanca en cinta reflectiva de 15 cm de ancho, colocada horizontalmente en el tercio superior, a la altura del tórax.

El auxiliar de tránsito deberá estar visible para los conductores que se acercan, desde una distancia suficiente que permita una respuesta oportuna en el cumplimiento de las instrucciones que se impartan. Esta distancia está relacionada con las velocidades de aproximación.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900557482
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ASOCONSTRUCCIONES RJ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 16A N 5-39	TELÉFONO:	6603012
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7923595257**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/04/18		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		584851534	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 228.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.800	$ 0	$ 228.800
SUBTOTALES:										**$ 228.800**	**$ 0**	**$ 228.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 5.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.200	$ 0	$ 0	$ 5.200
SUBTOTALES:													**$ 57.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 57.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.600	$ 99.600	$ 0	$ 0	$ 99.600
SUBTOTALES:									**$ 99.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 99.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	2	$ 57.200	$ 0	$ 57.200
SUBTOTALES:			**$ 57.200**	**$ 0**	**$ 57.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																													SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900557482
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ASOCONSTRUCCIONES RJ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 16A N 5-39	TELÉFONO:	6603012
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7913994110**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	enero
	AÑO:	2023		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		15			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/02/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		440716360

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 44.000
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 6.300
800224808	230301	230301-PORVENIR	5	$ 326.400
		SUBTOTAL:	7	**$ 376.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 23.800
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 11.100
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 59.700
		SUBTOTAL:	7	**$ 94.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	7	$ 94.500
		SUBTOTAL:	7	**$ 94.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7	$ 164.000
		SUBTOTAL:	7	**$ 164.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 719.800**
VALOR MORA:	**$ 10.000**
TOTAL PAGADO:	**$ 729.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900557482
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ASOCONSTRUCCIONES RJ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 16A N 5-39	TELÉFONO:	6603012
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7913994285**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/02/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		440791499

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 69.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	$ 346.800
		SUBTOTAL:	4	**$ 416.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 52.200
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 52.000
		SUBTOTAL:	4	**$ 104.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	4	$ 88.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 88.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 181.100
		SUBTOTAL:	4	**$ 181.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 790.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 790.100**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900557482
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ASOCONSTRUCCIONES RJ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 16A N 5-39	TELÉFONO:	6603012
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7919532925**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	marzo
	AÑO:	2024		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/03/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		514164054

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 52.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 52.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 52.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 52.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 90.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 90.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 402.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 402.500**
