

RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA - PUEBLO RICO

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces
1	**MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE**	**150 días**	**mié 11/12/24**	**sáb 10/05/25**	
2	INICIO DE PROYECTO	0 días	mié 11/12/24	mié 11/12/24	
3	**PRELIMINARES**	**86 días**	**mié 11/12/24**	**jue 6/03/25**	
4	Valla de identificación de obra área menor a 4 m2, colocada en cerchas metálica, incluye mantenimiento durante la construcción	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24	2CC
5	Campamento, incluye teja de zinc, piso en tierra , tabla.	5 días	jue 2/01/25	lun 6/01/25	
6	Localización y replant	3 días	mar 7/01/25	jue 9/01/25	5
7	Limpieza y nivelación	5 días	vie 10/01/25	mar 14/01/25	6
8	Nivelación terreno con material del sitio	6 días	mié 15/01/25	lun 20/01/25	7
9	Cargue de material manual	3 días	jue 2/01/25	sáb 4/01/25	10CC
10	Retiro de material sobrante cargue manual (distancia 1 a	3 días	jue 2/01/25	sáb 4/01/25	5CC
11	Alquiler andamio tubular certificado, incluye manipulación y teleras	60 días	lun 6/01/25	jue 6/03/25	13FC+1 día
12	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**	**26 días**	**lun 16/12/24**	**vie 10/01/25**	
13	Corte con disco muro ambos lados	3 días	jue 2/01/25	sáb 4/01/25	10FC-3 días
14	Demolición muro en soga, incluye revoque y/o enchape	6 días	jue 26/12/24	mar 31/12/24	4FC+14 días
15	Demolición manual de concreto (Placas y Estructuras Enterradas)	7 días	jue 2/01/25	mié 8/01/25	13CC
16	Demolición losa sobre terreno	7 días	jue 2/01/25	mié 8/01/25	15CC
17	Desmonte aparatos sanitarios, con recuperación de ellos	2 días	mié 18/12/24	jue 19/12/24	4FC+6 días
18	Desmonte cielo falso	5 días	vie 20/12/24	mar 24/12/24	17
19	Desmonte de puerta metálicas o de madera, incluye	4 días	lun 16/12/24	jue 19/12/24	4FC+4 días
20	Desmonte techo de fibrocemento, incluye desmonte de estructura metálica	6 días	jue 26/12/24	mar 31/12/24	18FC+1 día
21	Corte de piso en Concreto con cortadora autopropulsada	6 días	dom 5/01/25	vie 10/01/25	13
22	**EXCAVACIONES Y LLENC**	**9 días**	**jue 9/01/25**	**vie 17/01/25**	
23	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	3 días	jue 9/01/25	sáb 11/01/25	12FC-2 días

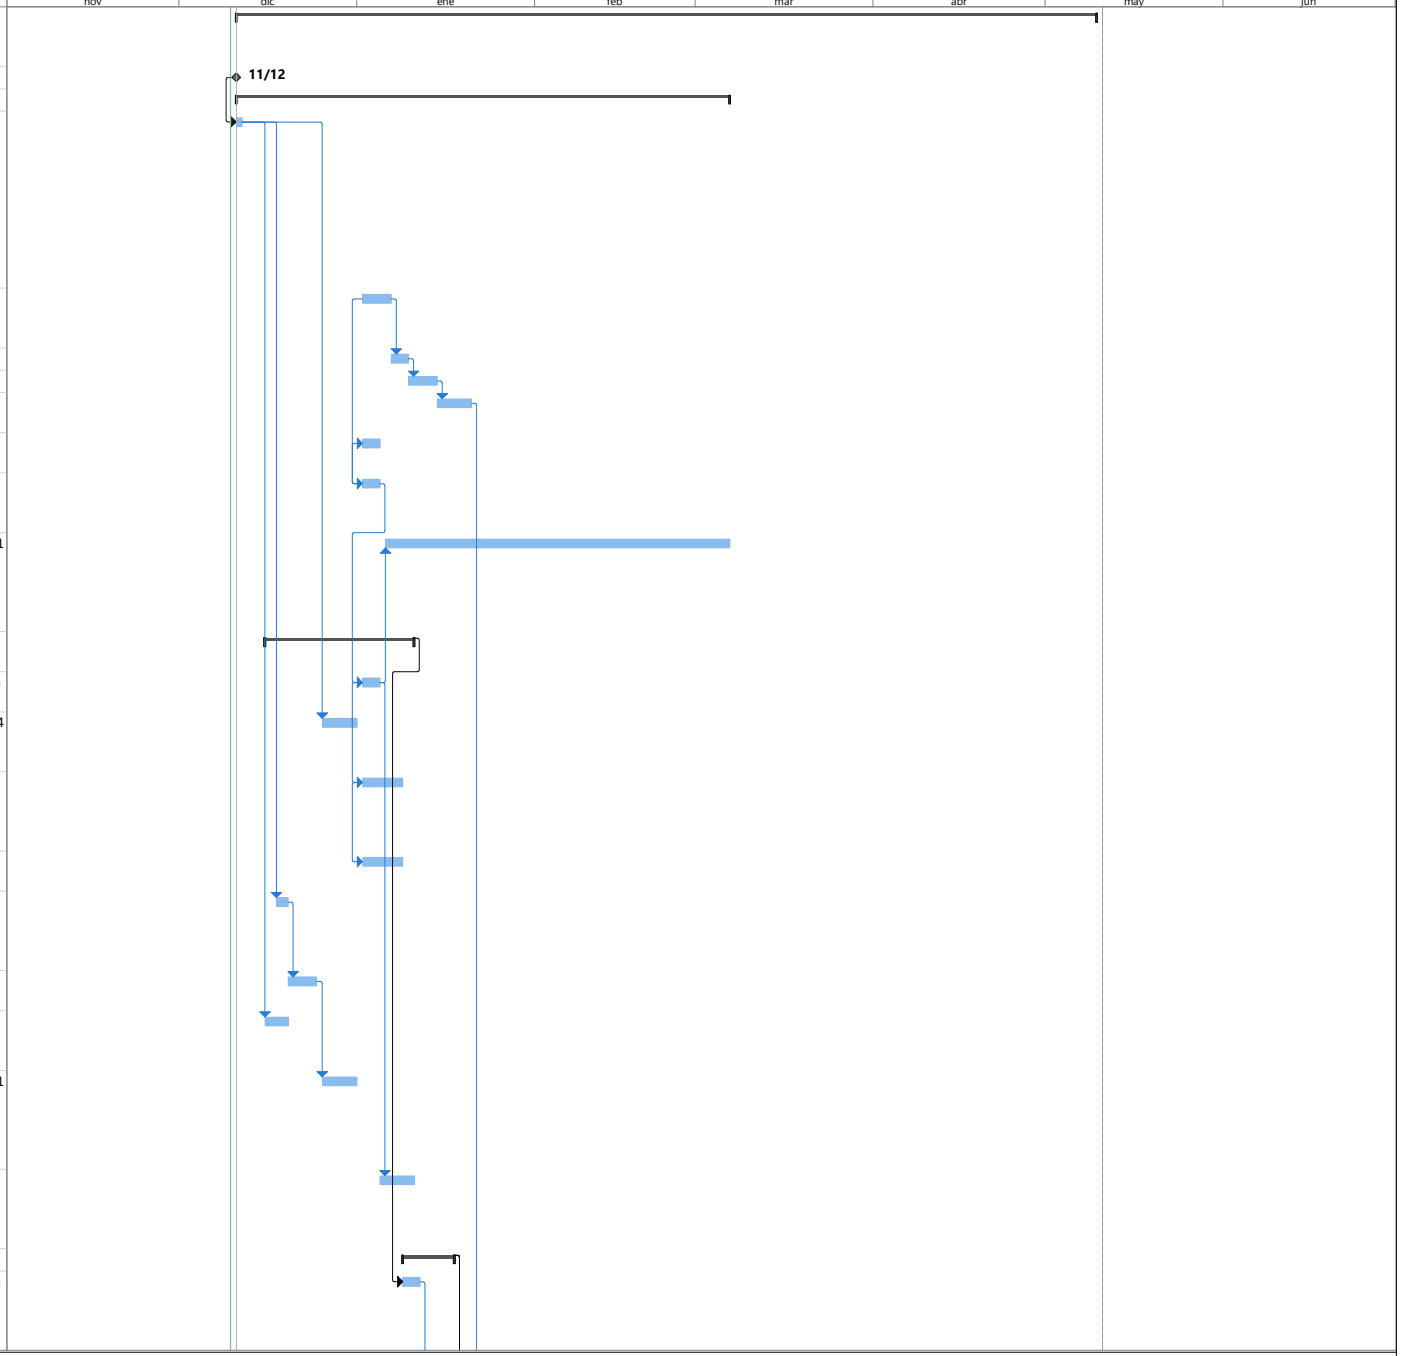


HACER DE COLOMBIA


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces
24	Excavación en conglomerado seco de 0 - 2 m manual	2 días	dom 12/01/25	lun 13/01/25	23
25	Lleno compactado con material granular	2 días	mar 14/01/25	mié 15/01/25	24
26	Lleno con piedra, incluye transporte	2 días	jue 16/01/25	vie 17/01/25	25
27	**ELEMENTOS DE CONCRE**	**22 días**	**sáb 18/01/25**	**sáb 8/02/25**	
28	Solado en concreto de 10,3 Mpa	2 días	sáb 18/01/25	dom 19/01/25	22
29	Caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa	5 días	sáb 18/01/25	mié 22/01/25	22
30	Zapatas en concreto de 28 Mpa (4000 psi), no incluye refuerzo	4 días	sáb 18/01/25	mar 21/01/25	22
31	Viga de enlace de zapatas en concreto de 28 Mpa, no incluye refuerzo	3 días	mié 22/01/25	vie 24/01/25	30
32	Placa de contrapiso en concreto de 28 Mpa e = 0,10 m	3 días	sáb 25/01/25	lun 27/01/25	31
33	Columna en concreto de 28 Mpa sección entre 1601 cm2 - 2500 cm2	2 días	mar 28/01/25	mié 29/01/25	32
34	Escalera en concreto de 28 Mpa o estructura metalica, (precio a a pactar)	3 días	jue 30/01/25	sáb 1/02/25	33
35	Placa steeldeck en concreto de 28 Mpa (3.000 psi) de e = 0,10 m, incluye malla electrosoldada	4 días	dom 2/02/25	mié 5/02/25	34
36	Viga aérea en concreto de 28 Mpa, no incluye acero	3 días	jue 6/02/25	sáb 8/02/25	35
37	**MAMPOSTERIA**	**19 días**	**dom 9/02/25**	**jue 27/02/25**	
38	Muro en bloque No.05 No Estructura, Incluye Mortero en Celdas y Acero de Refuerzo	9 días	dom 9/02/25	lun 17/02/25	27
39	Revoque muro incluye dilataciones y filos	8 días	mar 18/02/25	mar 25/02/25	38
40	Filos y dilataciones	2 días	mié 26/02/25	jue 27/02/25	39
41	**PISOS Y ENCHAPES**	**9 días**	**jue 6/03/25**	**vie 14/03/25**	
42	Piso en baldosa tipo Terrazzo No. 5 P5B, pulido incluye mortero	6 días	jue 6/03/25	mar 11/03/25	49
43	Piso en cerámica tipo antique 30,5 x 30,5, color blanco o beige	2 días	jue 6/03/25	vie 7/03/25	49

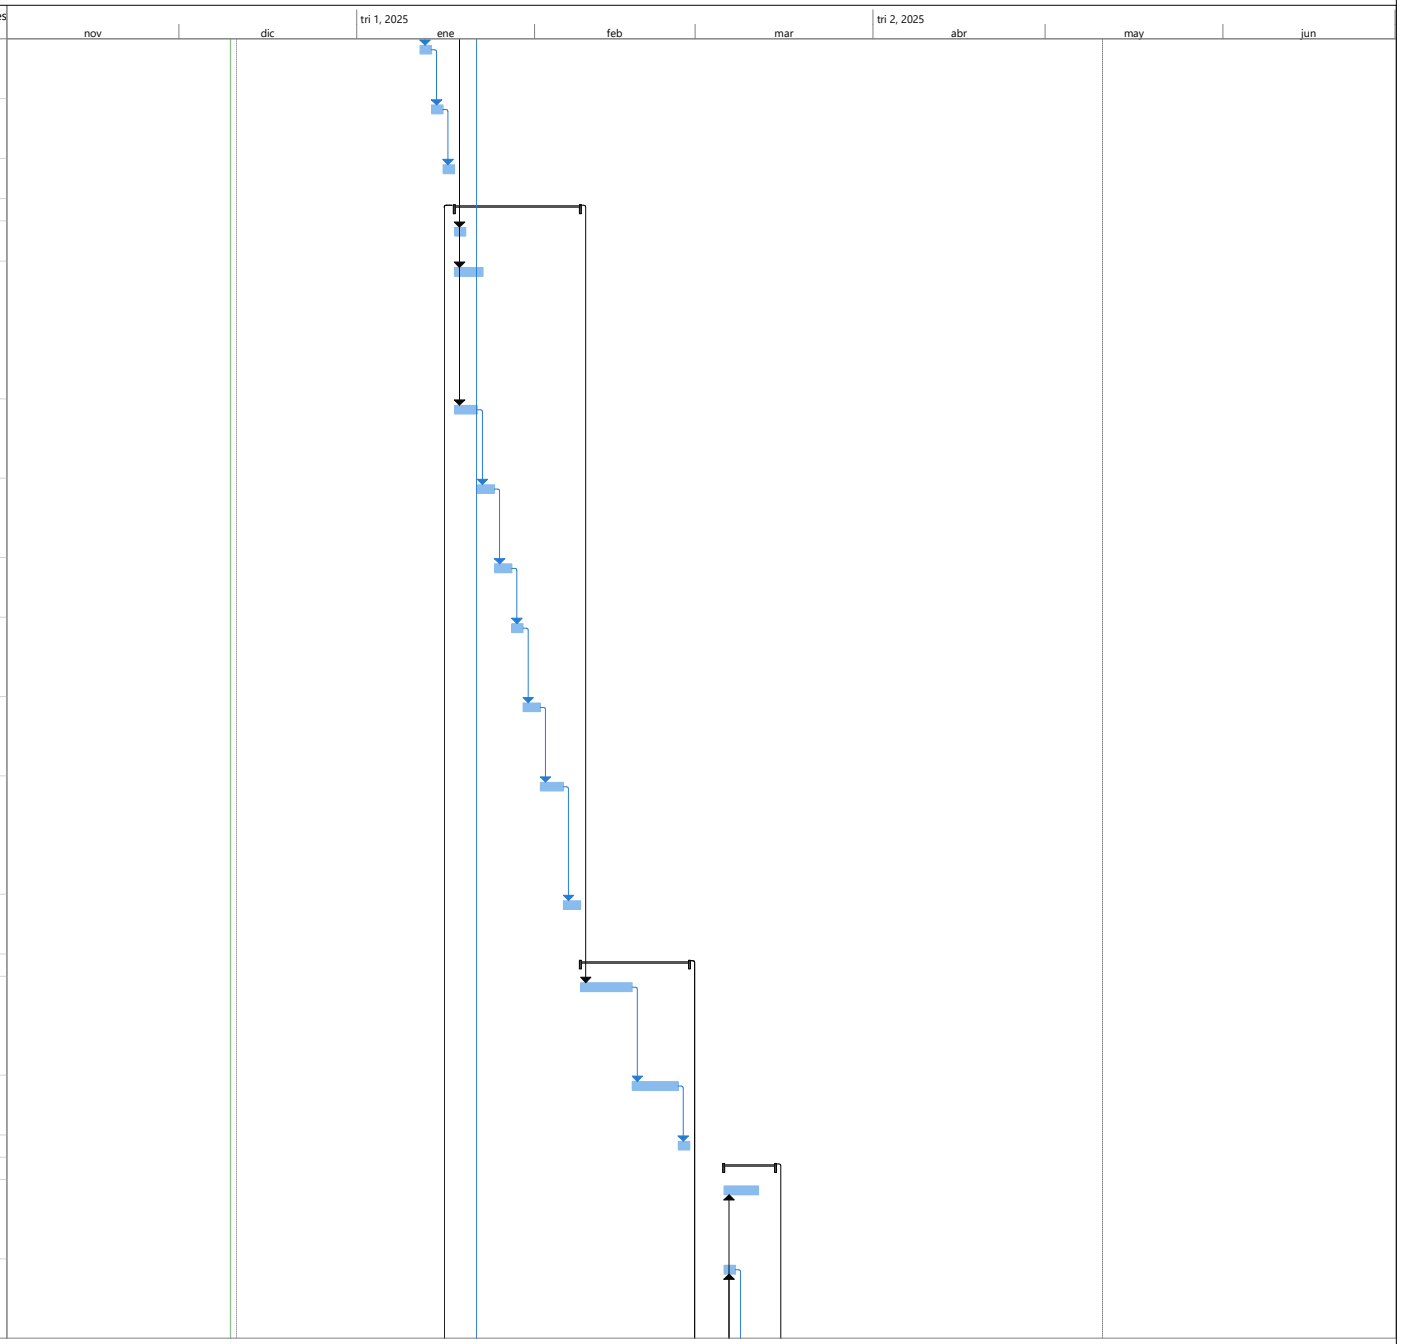


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces
44	Piso en cerámica de 1ra. de 20 x 20 cm tipo Duratech no incluye mortero	2 días	sáb 8/03/25	dom 9/03/25	43
45	Guarda escoba en baldosa tipo Terrazzo No. 5 P5B	3 días	lun 10/03/25	mié 12/03/25	44
46	Pirlán de bronce en cerámica	2 días	jue 13/03/25	vie 14/03/25	45
47	**PINTURAS**	**12 días**	**sáb 15/03/25**	**mié 26/03/25**	
48	Estuco y pintura muros 3 manos TIPO KORAZA o tipo 1	12 días	sáb 15/03/25	mié 26/03/25	41
49	**CUBIERTAS**	**6 días**	**vie 28/02/25**	**mié 5/03/25**	
50	Techo en teja de barro, incluye manto impermeabilizante, esterilla y mortero 1:3 impermeabilizado	3 días	vie 28/02/25	dom 2/03/25	37
51	Cielo falso en aluminio natural e icopor perlita lisa o	3 días	lun 3/03/25	mié 5/03/25	50
52	Suministro y colocación de	3 días	lun 3/03/25	mié 5/03/25	51CC
53	**CARPINTERIA METALICA**	**30 días**	**jue 27/03/25**	**vie 25/04/25**	
54	Ventana int negro corrediza, incluye vidrio de 6 mm	6 días	jue 27/03/25	mar 1/04/25	47
55	Rejilla metálica , incluye bisagras, anticorrosivo y	6 días	mié 2/04/25	lun 7/04/25	54
56	Pasamanos en acero inoxidable e instalado incluye instalación todo	6 días	mar 8/04/25	dom 13/04/25	55
57	División para baño en acero inoxidable, incluye instalación	6 días	lun 14/04/25	sáb 19/04/25	56
58	Celosia en perfil metalico para	6 días	dom 20/04/25	vie 25/04/25	57
59	**CARPINTERIA DE MADE**	**20 días**	**jue 27/03/25**	**mar 15/04/25**	
60	Puerta y ventanas de madera maciza no mdf ni aglomerados, marco en lámina C 20 de 0,9 x 2,30 m, incluye anticorrosivo, pintura, barniz, chapa de bola de madera, manija y tope	20 días	jue 27/03/25	mar 15/04/25	53CC
61	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**10 días**	**sáb 26/04/25**	**lun 5/05/25**	
62	Sanitario ahorrador One Piece Solare Blanco corona con fluxómetro	10 días	sáb 26/04/25	lun 5/05/25	53
63	Lavamanos tipo acuacer de pedestal	10 días	sáb 26/04/25	lun 5/05/25	62CC
64	Orinal tipo Institucional con	10 días	sáb 26/04/25	lun 5/05/25	62CC
65	Poceta corrida de aseo en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) incluye granito pulido, longitud de	10 días	sáb 26/04/25	lun 5/05/25	62CC

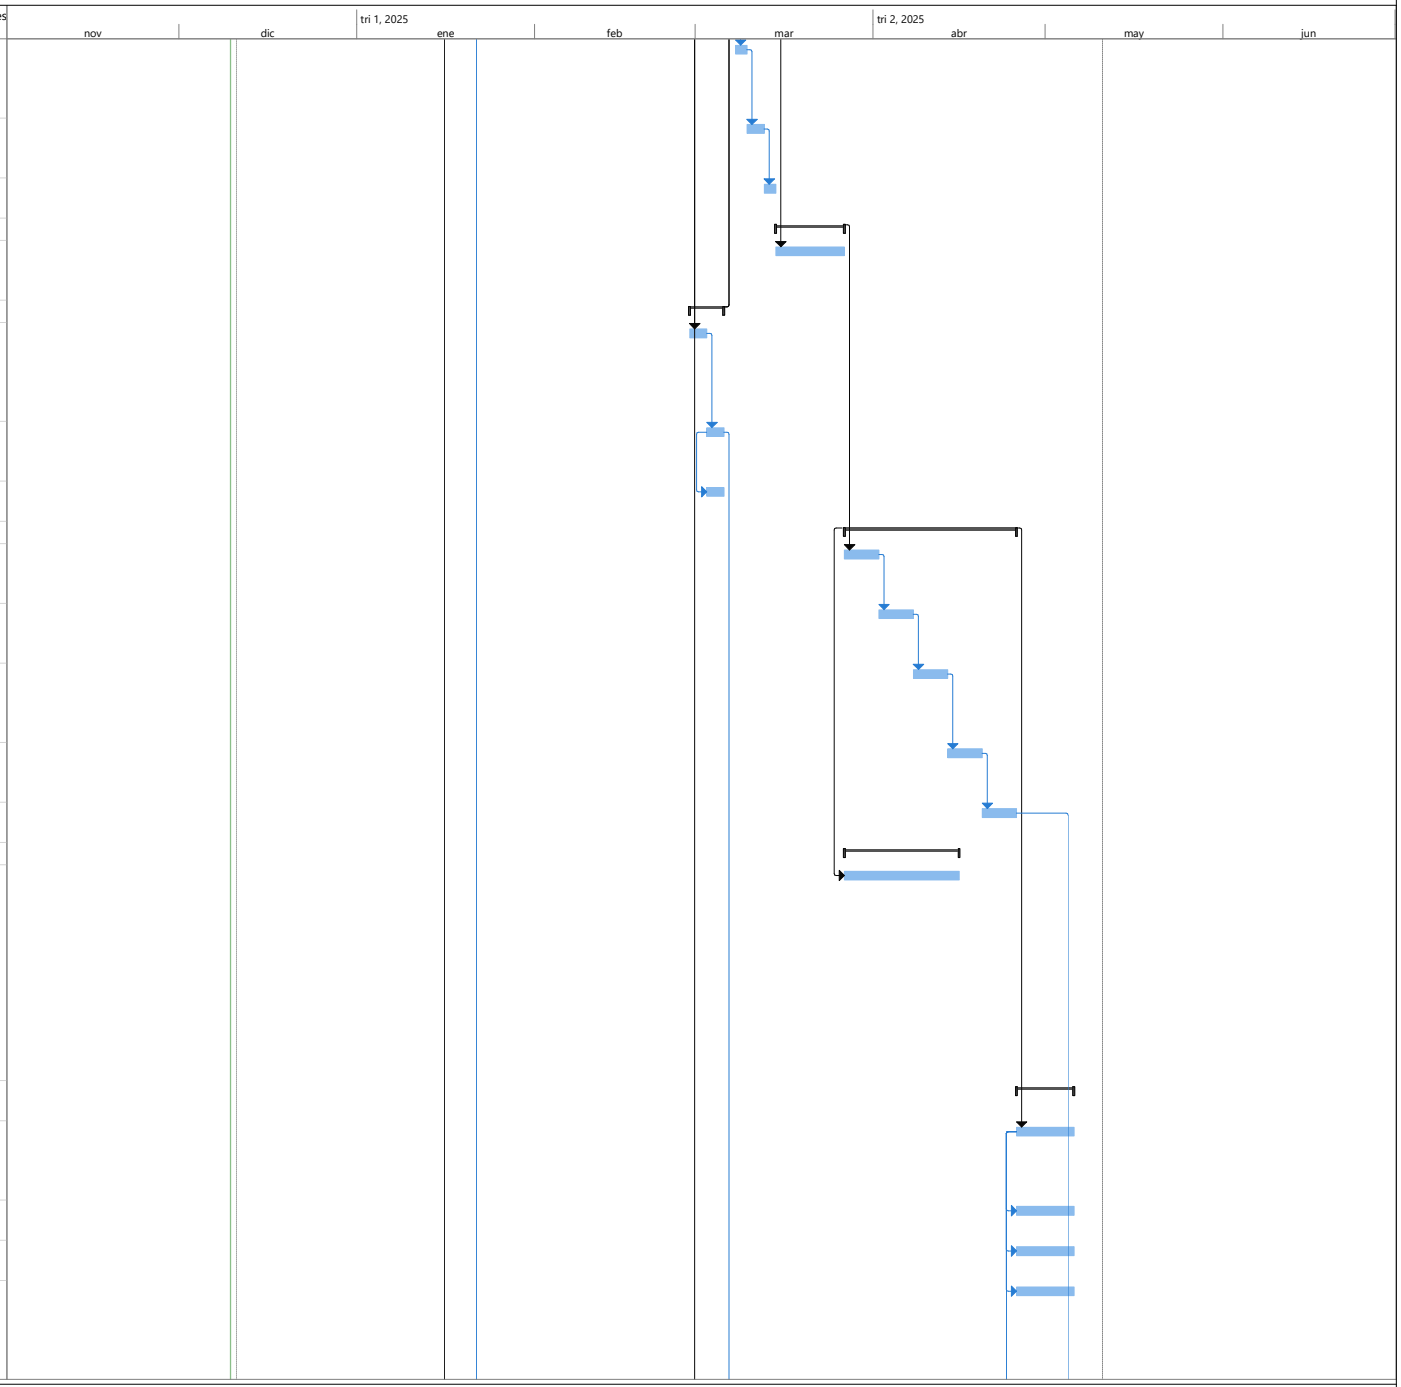

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces
66	Incrustaciones tipo Avanti (viene por 6	10 días	sáb 26/04/25	lun 5/05/25	62CC
67	Mezclador para lavaplatos	10 días	sáb 26/04/25	lun 5/05/25	62CC
68	**PUNTOS HIDRAULICOS**	**30 días**	**vie 28/02/25**	**sáb 29/03/25**	
69	Punto hidráulico PVC de 1/2" L prom = 3 m	30 días	vie 28/02/25	sáb 29/03/25	37
70	Tubería PVC presión de 3/4" rde 21	30 días	vie 28/02/25	sáb 29/03/25	69CC
71	Tubería PVC presión de 1/2" rde 9	30 días	vie 28/02/25	sáb 29/03/25	69CC
72	Cheque de 1" en bronce	30 días	vie 28/02/25	sáb 29/03/25	69CC
73	Registro de corte de 1/2"	30 días	vie 28/02/25	sáb 29/03/25	69CC
74	Medidor de 1/2" volumétrico tipo "C"	30 días	vie 28/02/25	sáb 29/03/25	69CC
75	Caja para Medidor	30 días	vie 28/02/25	sáb 29/03/25	69CC
76	Flotador	30 días	vie 28/02/25	sáb 29/03/25	69CC
77	Montaje Aparatos (Sanirtarios, Lavamanos, Orinal, etc)	30 días	vie 28/02/25	sáb 29/03/25	69CC
78	Manual de Operación y Mantenimiento	30 días	vie 28/02/25	sáb 29/03/25	69CC
79	Planos Records	30 días	vie 28/02/25	sáb 29/03/25	69CC
80	Desinfeccion del Sistema de Agua Potable	30 días	vie 28/02/25	sáb 29/03/25	69CC
81	**PUNTOS SANITARIOS**	**30 días**	**vie 28/02/25**	**sáb 29/03/25**	
82	Tubería PVC de ventilación de 2", incluye accesorios	30 días	vie 28/02/25	sáb 29/03/25	69CC
83	Tubería PVC sanitaria de 2", incluye accesorios	30 días	vie 28/02/25	sáb 29/03/25	69CC
84	Tubería PVC sanitaria de 3", incluye accesorios	30 días	vie 28/02/25	sáb 29/03/25	69CC
85	Tubería PVC sanitaria de 4", incluye accesorios	30 días	vie 28/02/25	sáb 29/03/25	69CC
86	Punto sanitario PVC de 2" L prom = 3 m	30 días	vie 28/02/25	sáb 29/03/25	69CC
87	Punto sanitario PVC de 4" (3 m)	30 días	vie 28/02/25	sáb 29/03/25	69CC
88	Puntos Sanitarios (Lavamanos, Sanitarios, Orinal, etc)	30 días	vie 28/02/25	sáb 29/03/25	69CC
89	Tragante 3"	30 días	vie 28/02/25	sáb 29/03/25	69CC
90	Soporte Tipo Pera o Abrazadera	30 días	vie 28/02/25	sáb 29/03/25	69CC
91	Prueba de Flujo	30 días	vie 28/02/25	sáb 29/03/25	69CC
92	Prueba de Estanqueidad por Bajante	30 días	vie 28/02/25	sáb 29/03/25	69CC
93	Planos Records	30 días	vie 28/02/25	sáb 29/03/25	69CC
94	**ELEMENTOS ELECTRICO**	**45 días**	**jue 6/03/25**	**sáb 19/04/25**	

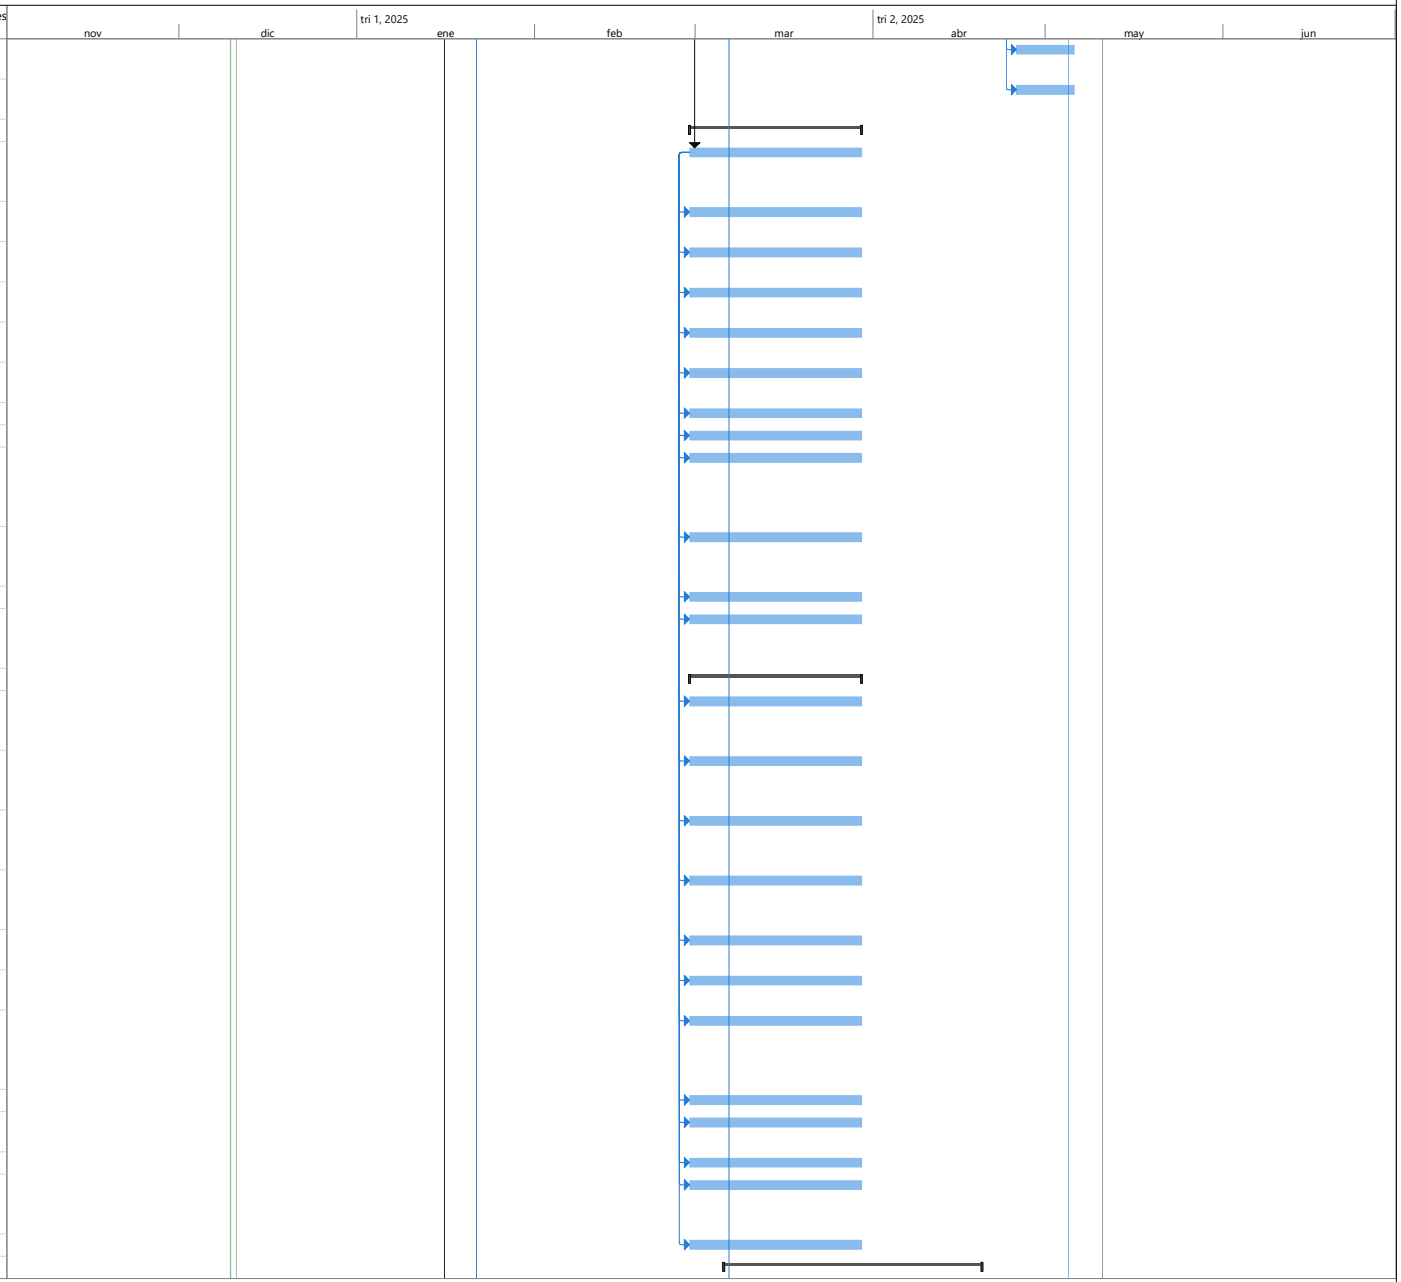


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces
95	Suministro e instalación de planta eléctrica tipo cabinada ANTIRUIDO de 13.3kW/15KVA Servicio Prime, Eficientes a Nivel de Pueblo Rico Risaralda 208/120V, incluye suministro, transporte, Izaje, Bases anti vibratorias, Rejillas de ventilación para ingreso	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	51
96	Suministro e instalación de UPS BIFASICA 3KVA 208/120V True Online con Bypass interno, autonomía de 10 minutos. incluye todos los elementos requeridos para una completa y optima instalación.	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC
97	Suministro e instalación de Barraje de distribución Normal (TN), este barraje deberá ser apto para la conexión de 25 circuitos y deberá tener reserva para 4 mas, 3F 5H 208/120V además deberá ser apto para soportar el esfuerzo sigma generado por la ICC.	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC
98	Suministro e instalación caja para medidor trifásico, incluye puesta a tierra, breaker de protección principal, medidor de energía trifásico 10 (100A) electrónico, obra civil y demás accesorios para un completo y optimo montaje.	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC

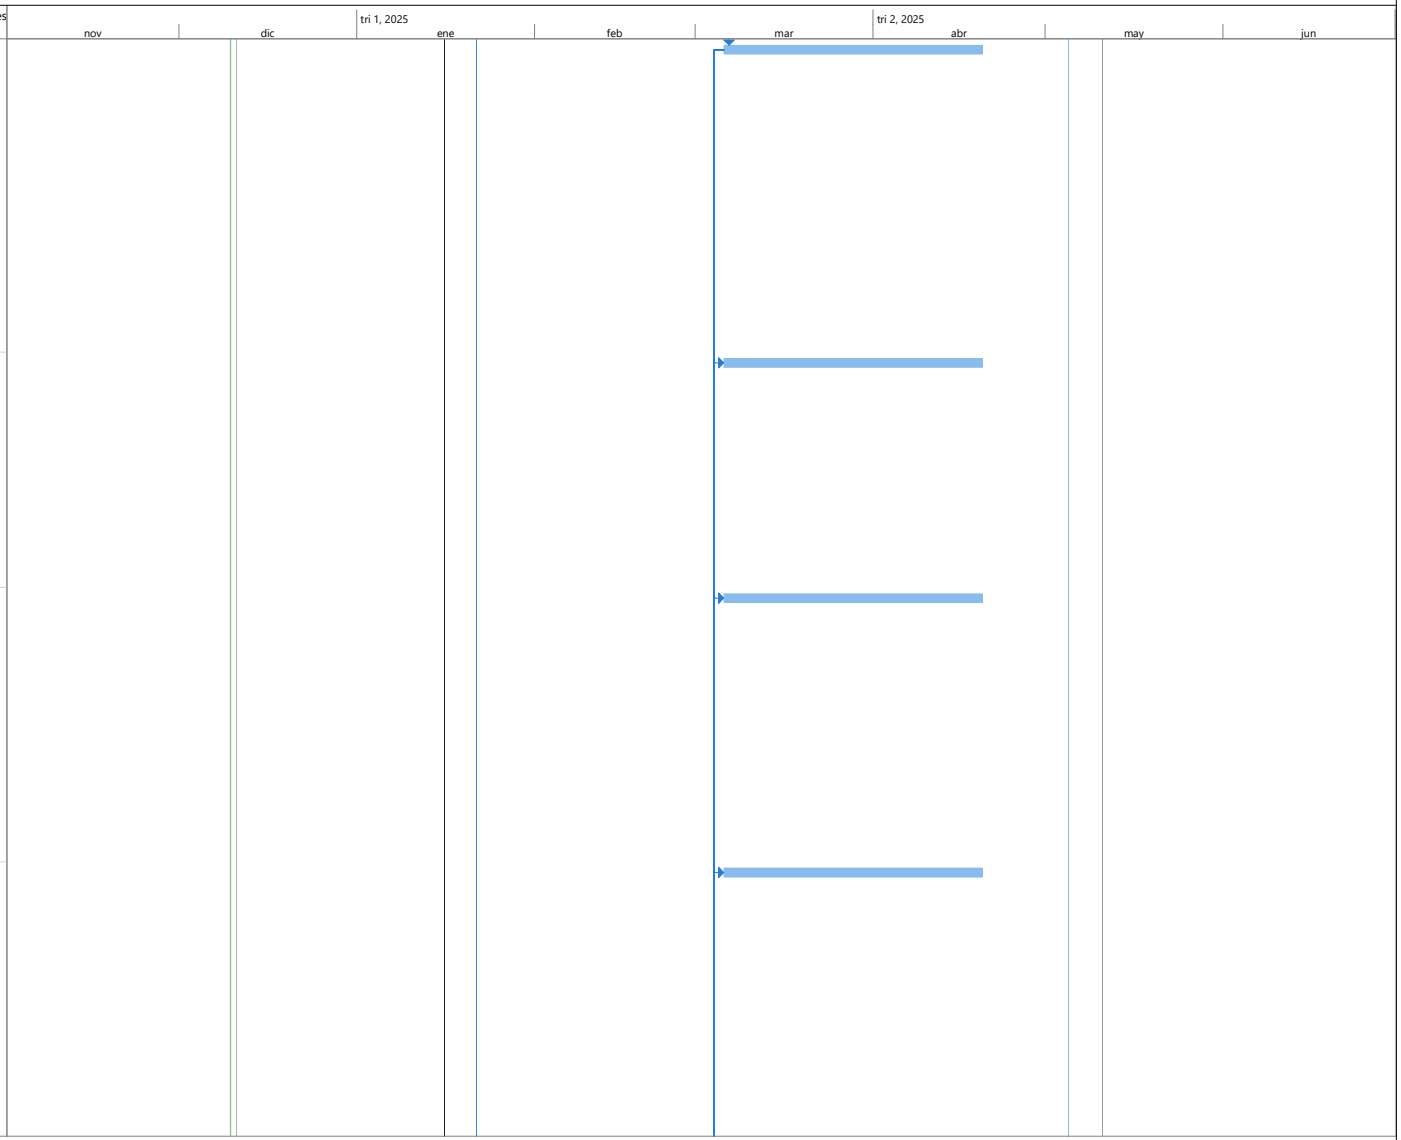


RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA - PUEBLO RICO

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces
99	(En caso que se requiera)Suministro e instalación de Acometida concéntrica en (3x4+1x6) Cu, desde red de energía publica hasta caja para medidor de energía, avalada por el operador de red de energía de la zona, incluye bajante en tubería IMC 1-1/2", capac	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC
100	Suministro e instalación de Conductor, Terminales, marcas y aditamentos alimentador desde CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO a Transferencia automática en (3x4+1x6+1x8) Cu. incluye tubería EMT 1-1/2" con sus respectivos accesorios de instalación.	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC
101	Suministro e instalación de Conductor, Terminales, marcas y aditamentos alimentador desde Planta de Energía a Transferencia automática en (3x4+1x6+1x8) Cu. incluye tubería EMT 1-1/2" con sus respectivos accesorios de instalación.	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC
102	Suministro e instalación de Conductor, Terminales, marcas y aditamentos alimentador desde Transferencia automática hasta tablero eléctrico Normal/Regulado, en (3x4+1x6+1x8) Cu. incluye tubería EMT 1-1/2" con sus respectivos accesorios de instalación.	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC

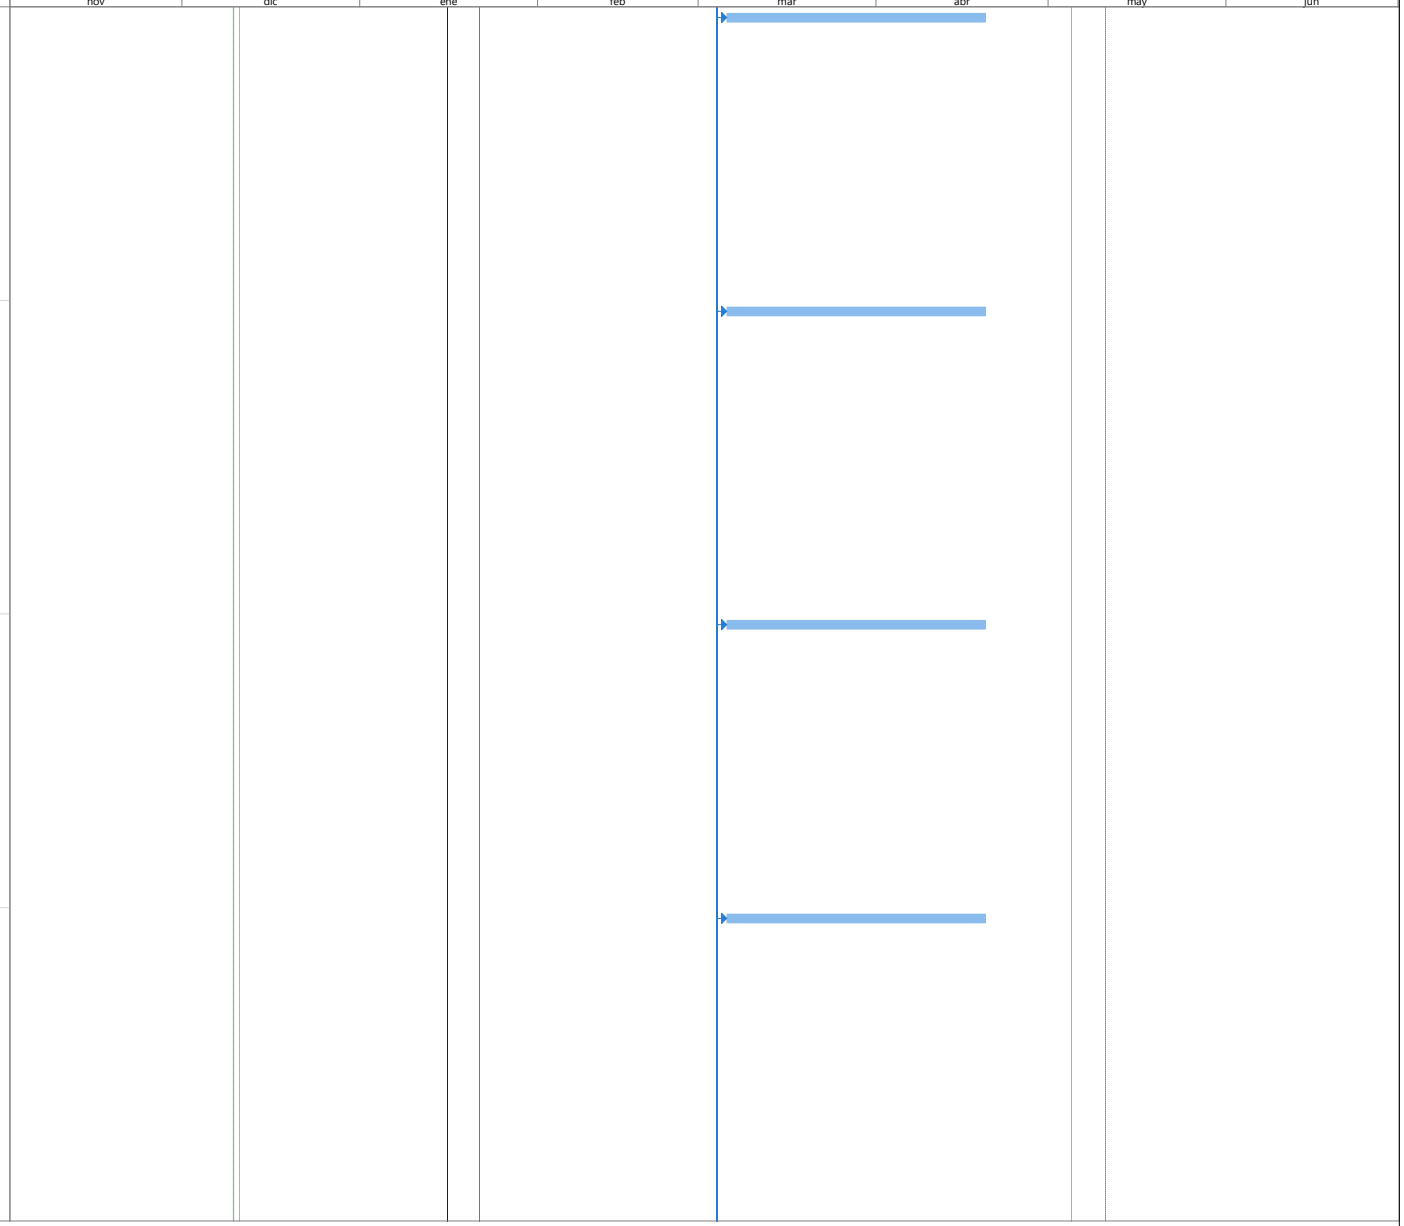


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces
103	Suministro e instalación de Canaleta metálica con división calibre 26 – 10x4x240cm soporte tecnológico con división interna, incluye accesorios de fijación y montaje.	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC
104	Suministro e instalación de salida para Tomacorriente monofásico doble 2P+T, 15A-125V . Incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC
105	Suministro e instalación de salida para Tomacorriente monofásico doble 2P+T, 15A-125V para instalación en canaleta perimetral, incluye faceplate. Incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su comple	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC
106	Suministro e instalación de salida para Tomacorriente monofásico doble 2P+T, 15A-125V Color Naranja para sistema Regulado marca para instalación en canaleta perimetral, incluye faceplate. Incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC
107	Suministro e instalación de salida para Tomacorriente monofásico doble 2P+T, 15A-125V Color Naranja para sistema Regulado l, incluye faceplate. Incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC

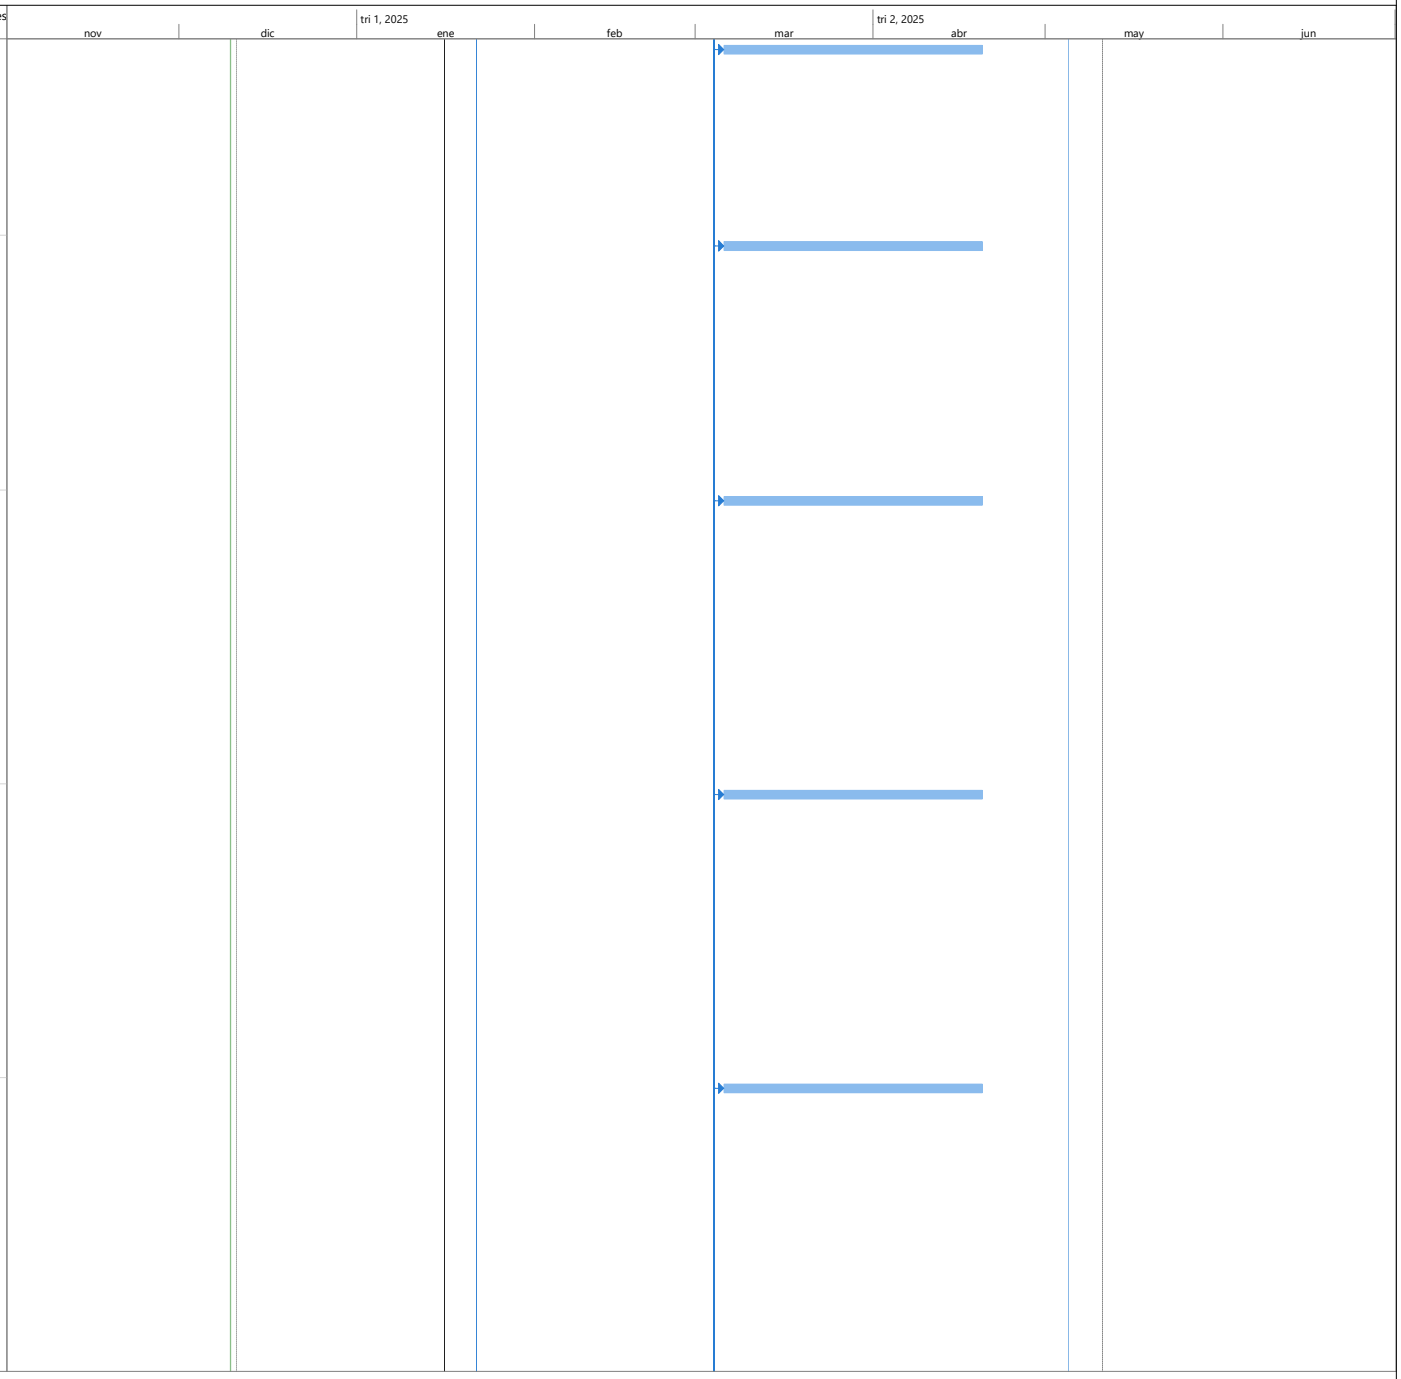


RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA - PUEBLO RICO

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces
108	Suministro e instalación de Tomacorriente monofásico GFCI 2P+T, 15A-125V . Incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC
109	Suministro e instalación de Tomacorriente monofásico doble 2P+T, 15A-125V para piso, Cubierta en bronce con protección de Toma eléctrica. Botón anti apertura. Caja de hierro, Incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elemen	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC
110	Suministro e instalación de arranque electrico para Ascensor de discapacitados 2P+T, 120V , (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC
111	Suministro e instalación de interruptor de alumbrado 15A sencillo, Incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC
112	Suministro e instalación de interruptor de alumbrado 15A Doble, Incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC

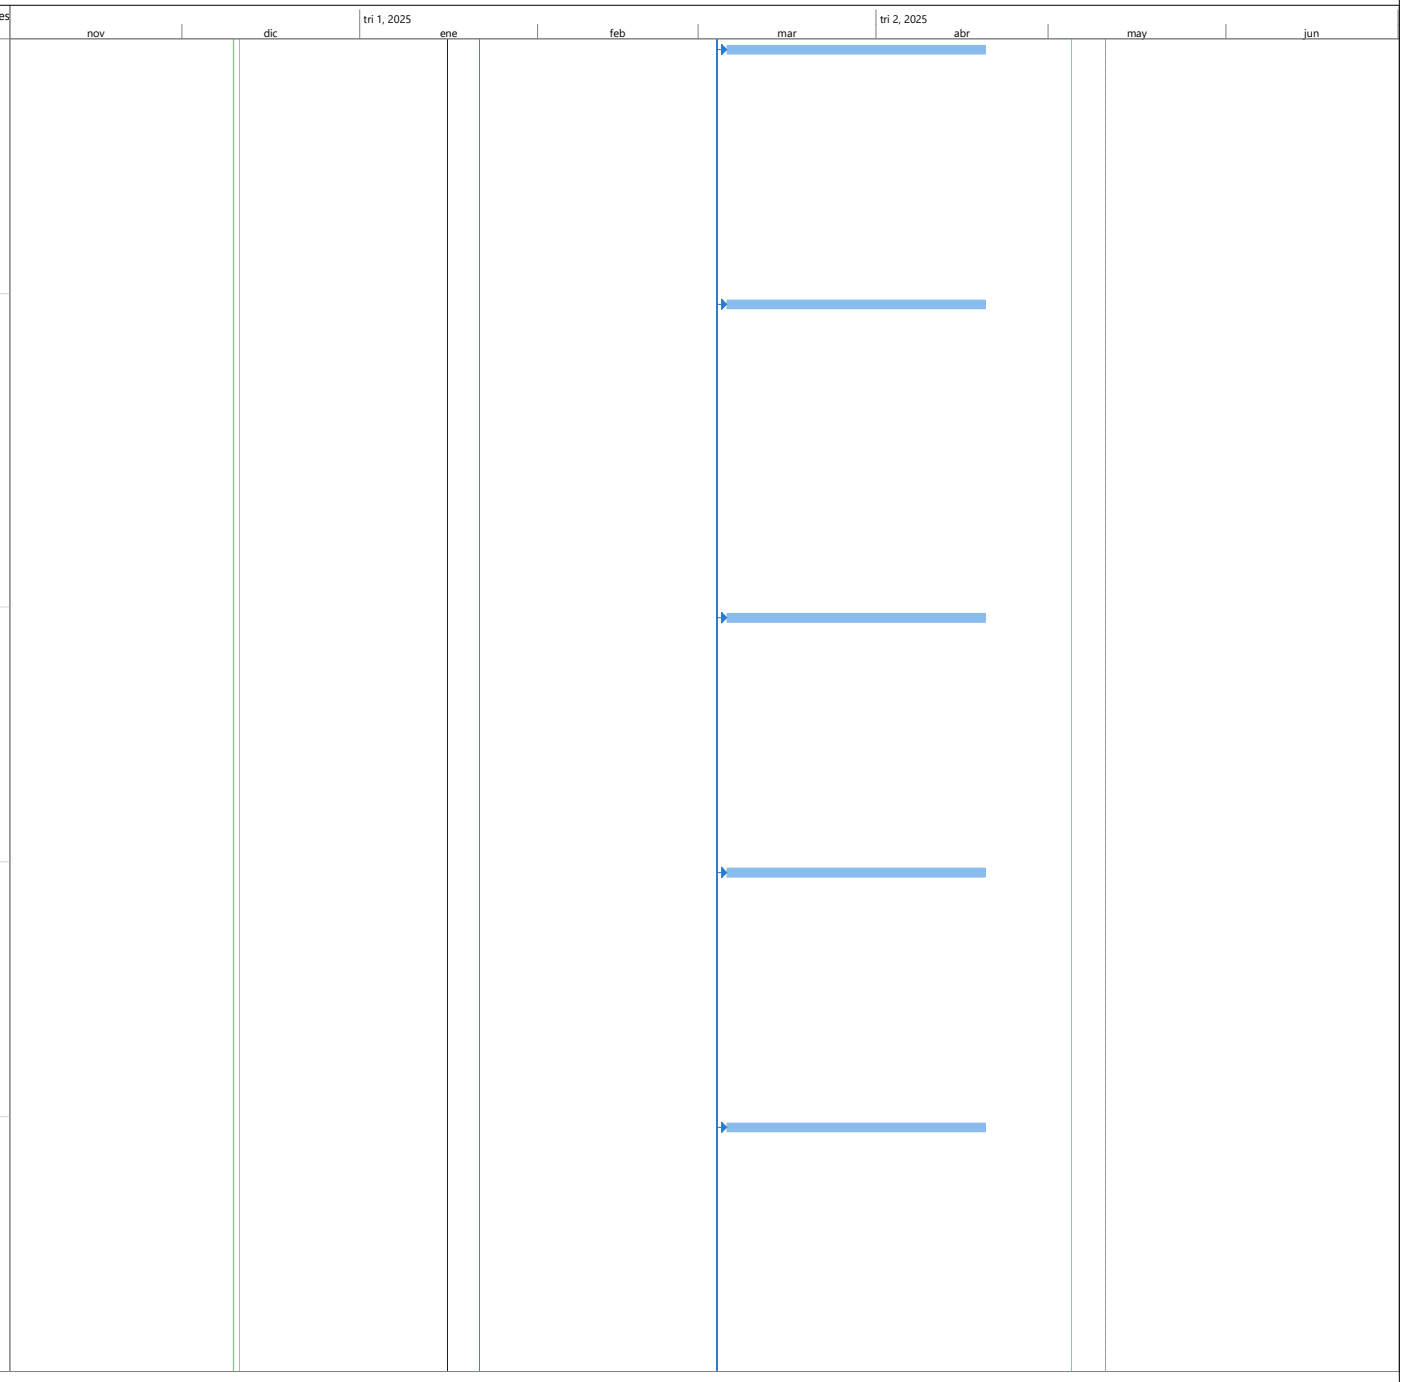


RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA - PUEBLO RICO

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces
113	Suministro e instalación de interruptor de alumbrado 15A Triple, Incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC
114	Suministro e instalación de interruptor de alumbrado 15A Conmutable sencillo, Incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC
115	Suministro e instalación de Sensor De Movimiento Techo Infrarrojo 360 Grados Sobreponer para sistema de alumbrado 15A, Incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC
116	suministro e instalación de salida para LUMINARIA -LED PANEL RD 18W DL, cumple con RETILAP, incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC

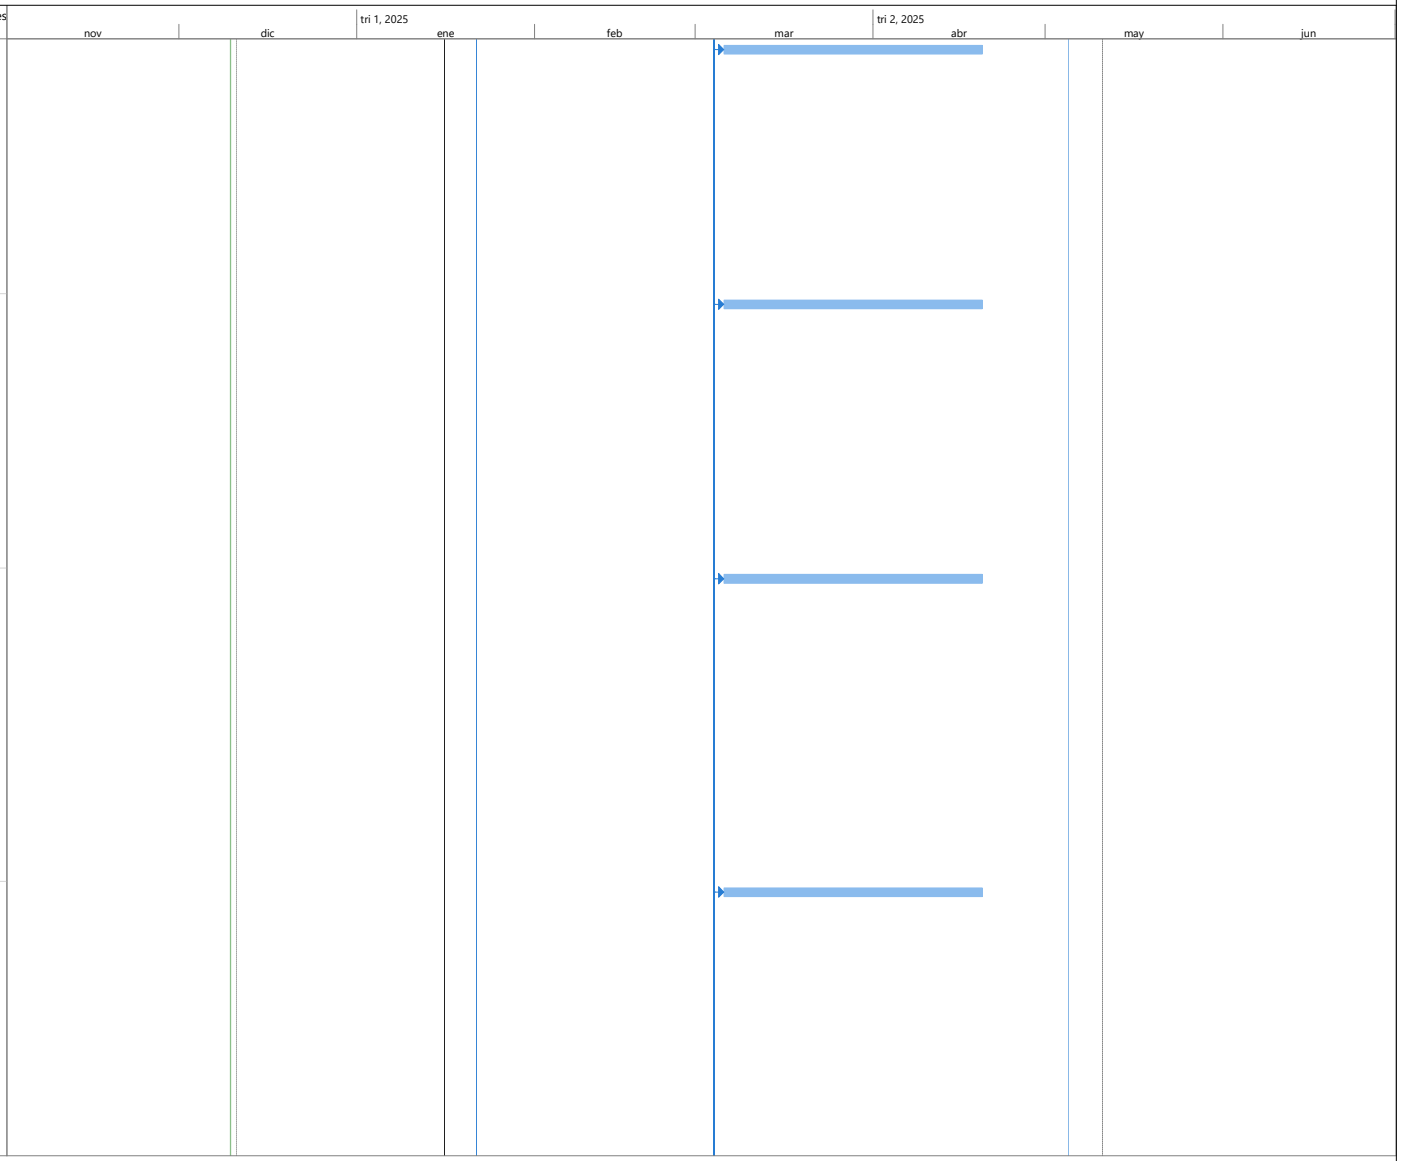


RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA - PUEBLO RICO


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces
117	suministro e instalación de salida para LUMINARIA LED PANEL RC 30W NW MINICONTINUUM, cumple con RETILAP, incluye todos los elementos necesarios para su instalación (Cableado, Tubería, conductor encauchetado, soportes para instalación y demás elementos req	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC
118	suministro e instalación de salida para luminaria LUMINARIA LED PANEL SQ 40W DL UNV 50HR, cumple con RETILAP, incluye todos los elementos necesarios para su instalación (Cableado, Tubería, conductor encauchetado, soportes para instalación y demás element	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC
119	suministro e instalación de Salida LUMINARIA LED APLIQUE DE PARED CURVE 6.5W, cumple con RETILAP, incluye (Cableado, Tubería, conectores, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalación)	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC
120	suministro e instalación de LUMINARIA de emergencia R1, Luminaria de emergencia con botón de prueba e indicador de carga, Carcasa termoplastica, con cabezales cuadrados ajustables, Tipo de montaje: Sobreponer, Tiempo de recarga: 24 horas, cumple con RETIL	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC

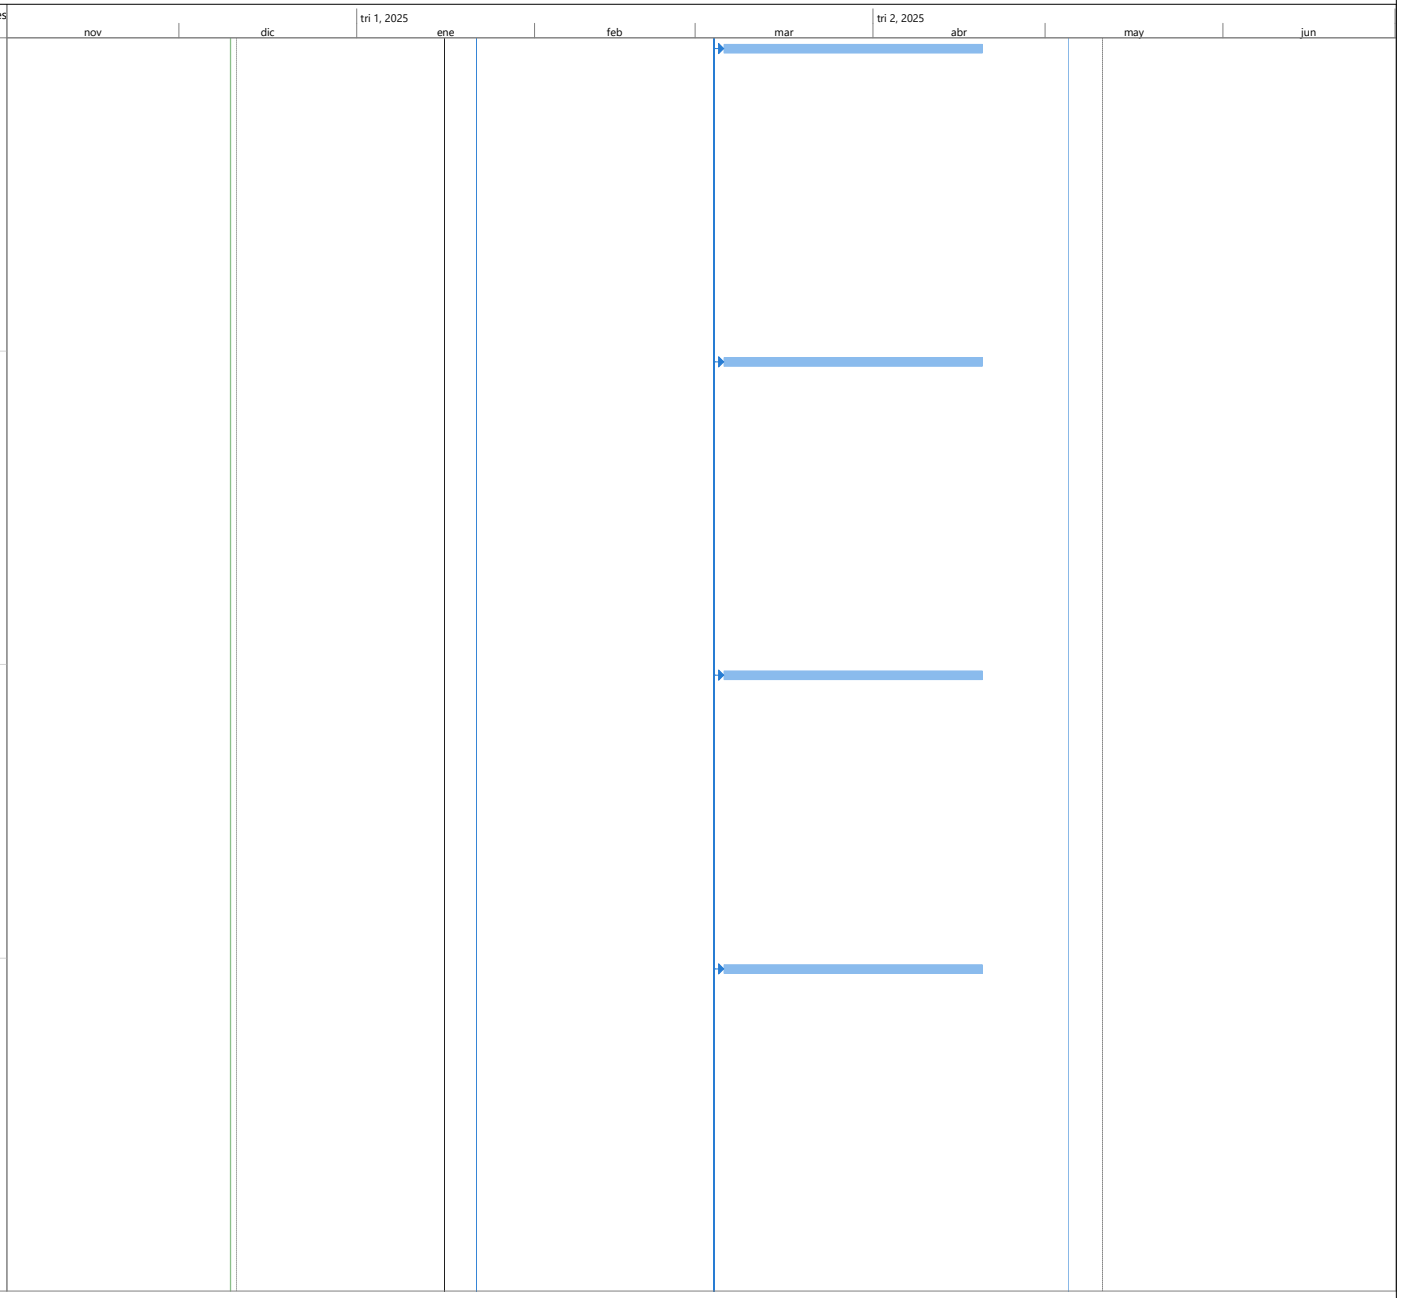

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces
121	suministro e instalación de LUMINARIA AVISO DE SALIDA CON DOBLE SPOT, Luminaria de emergencia con botón de prueba e indicador de carga, Carcasa termoplastica, con cabezales cuadrados ajustables, Tipo de montaje: Sobreponer, Tiempo de recarga: 24 horas, cu	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC
122	suministro e instalación de LUMINARIA -LED PANEL RD 18W DL, cumple con RETILAP, incluye todos los elementos necesarios para su instalación (conductor encauchetado, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima instalació	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC
123	suministro e instalación de LUMINARIA LED PANEL RC 30W NW MINICONTINUUM, cumple con RETILAP, incluye todos los elementos necesarios para su instalación (conductor encauchetado, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y opti	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC
124	suministro e instalación de luminaria LUMINARIA LED PANEL SQ 40W DL UNV 50HR, cumple con RETILAP, incluye todos los elementos necesarios para su instalación (conductor encauchetado, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC

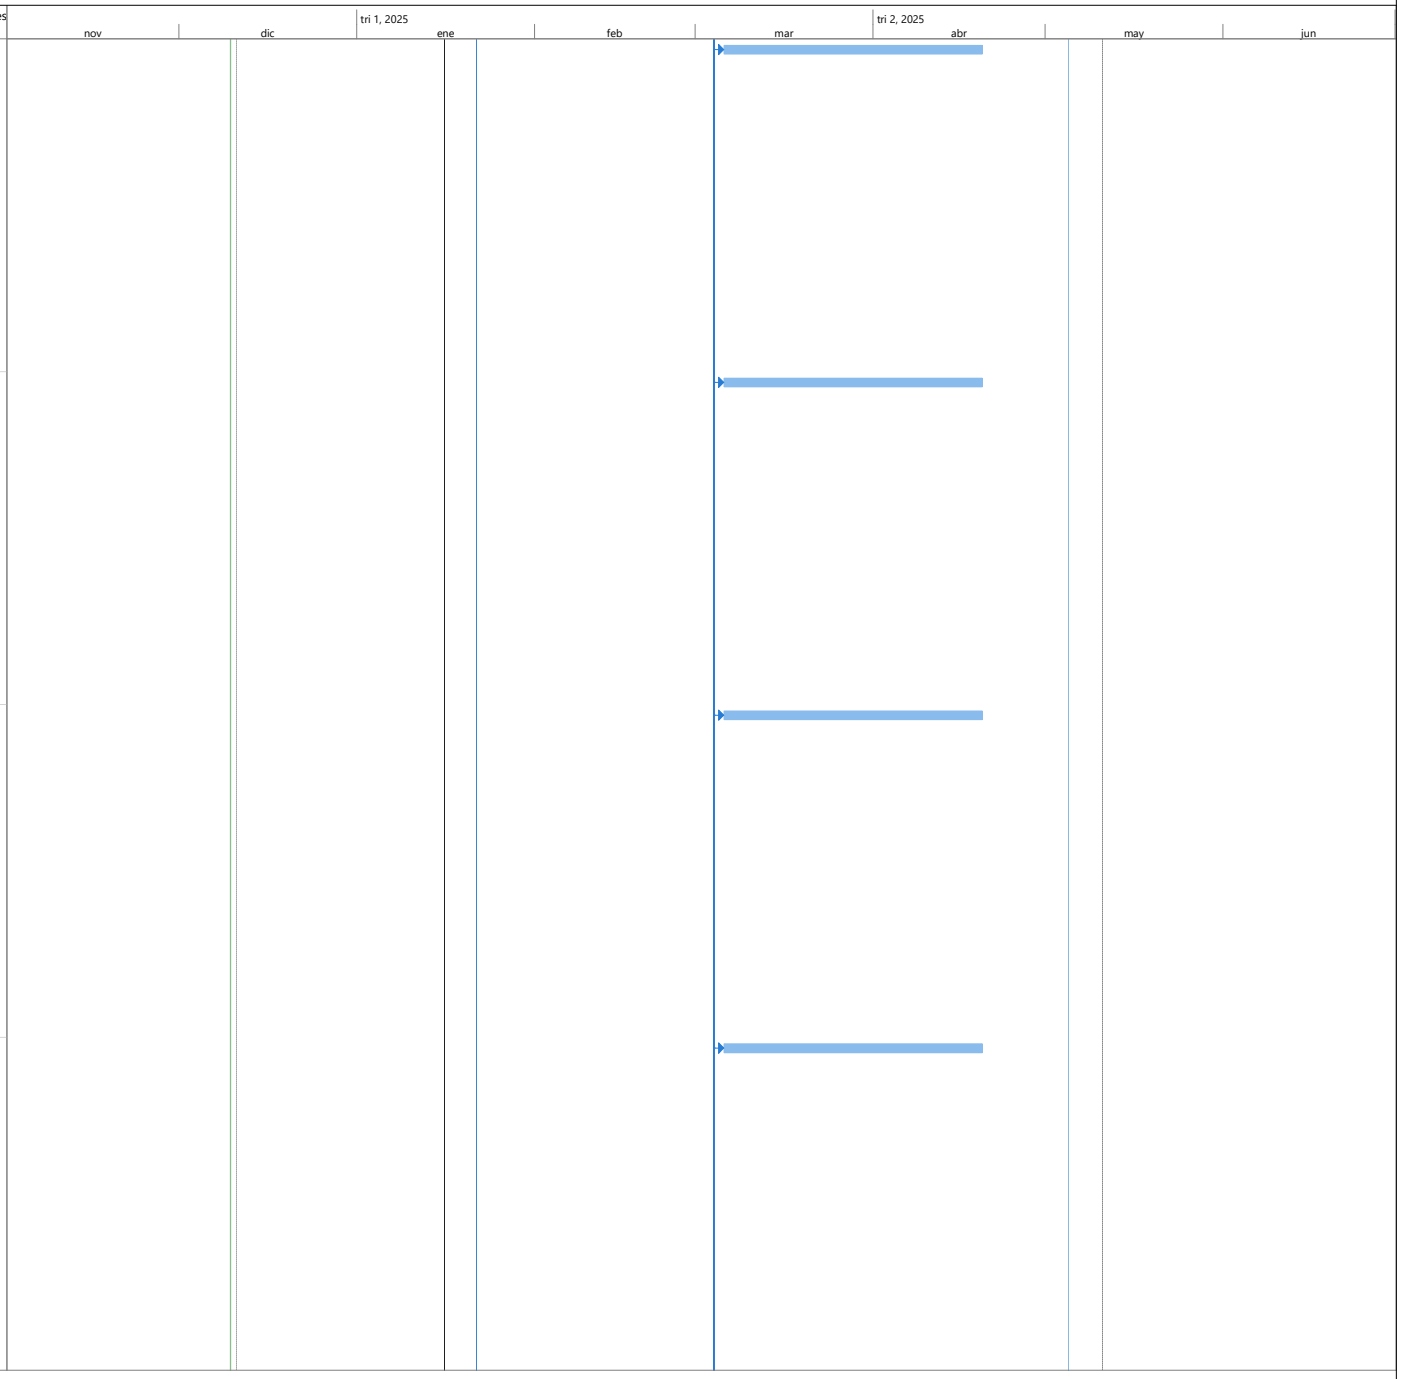


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces
125	suministro e instalación de LUMINARIA LED APLIQUE DE PARED CURVE 6.5W, cumple con RETILAP, incluye todos los elementos necesarios para su instalación (conductor encauchetado, soportes para instalación y demás elementos requeridos para su completa y optima	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC
126	suministro e instalación de LUMINARIA de emergencia R1, Luminaria de emergencia con botón de prueba e indicador de carga, Carcasa termoplastica, con cabezales cuadrados ajustables, Tipo de montaje: Sobreponer, Tiempo de recarga: 24 horas, cumple con RETIL	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC
127	suministro e instalación de LUMINARIA AVISO DE SALIDA CON DOBLE SPOT, Luminaria de emergencia con botón de prueba e indicador de carga, Carcasa termoplastica, con cabezales cuadrados ajustables, Tipo de montaje: Sobreponer, Tiempo de recarga: 24 horas, cu	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC
128	Tramites y pago para la certificación de las instalaciones eléctricas por parte de una entidad certificadora del RETIE.	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC
129	Tramites y pago para la certificación de las instalaciones eléctricas por parte de una entidad certificadora del RETILAP.	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC

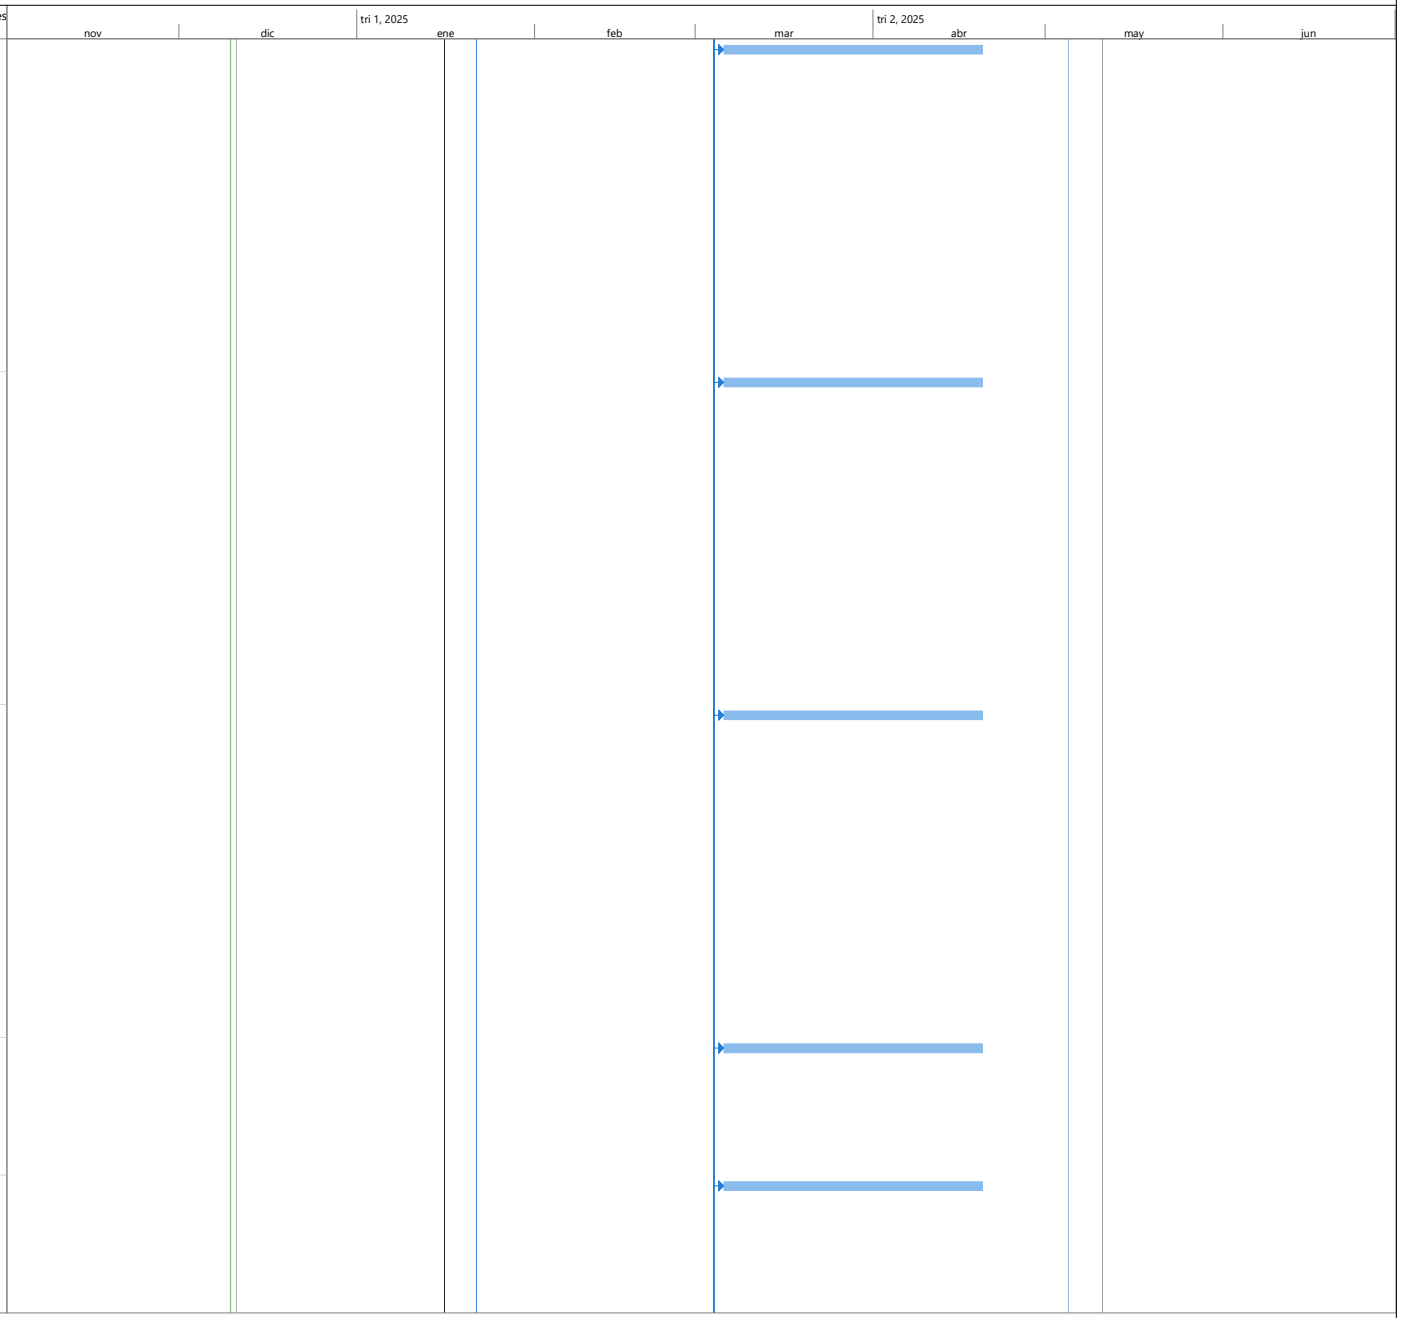

RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA - PUEBLO RICO

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces
130	Ajustes y verificación de diseño detallado según el capítulo 10 1 del RETIE	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC
131	Acompañamiento desde el inicio del proyecto de un inspector RETIE RETILAP para verificación y ajustes por parte del contratista de planos, memorias de cálculo y documentación relacionada con el diseño detallado RETIE y certificación RETIE y RETILAP ante u	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC
132	Suministro e instalación Rack de muro de 12U, incluye Ventilacion, 2 PDU de 4 Tomas Dobles Cada una, 2 Bandejas Portaequipos, 2 Organizador de cables Horizontal y" 2 Patch Panel de 24 (con sus respectivos Jacks RJ45 CAT.6), Tambien incluye, Patch Cords pa	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC
133	Suministro e instalación de salida para DATOS para puesto de trabajo, incluye Cable UTP CAT.6, Faceplate, Jack CAT.6, marquilla y todos los accesorias para una completa instalación.	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC
134	Suministro e instalación de salida para DATOS para MURO, incluye Cable UTP CAT.6, Caja, Faceplate, Jack CAT.6, marquilla y todos los accesorias para una completa instalación.	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC
135	Suministro e instalación de salida para DATOS para sistema CCTV, incluye Cableado UTP CAT.6, Jack De terminacion en Campo, Marquilla y todos los accesorias para una completa instalación.	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC

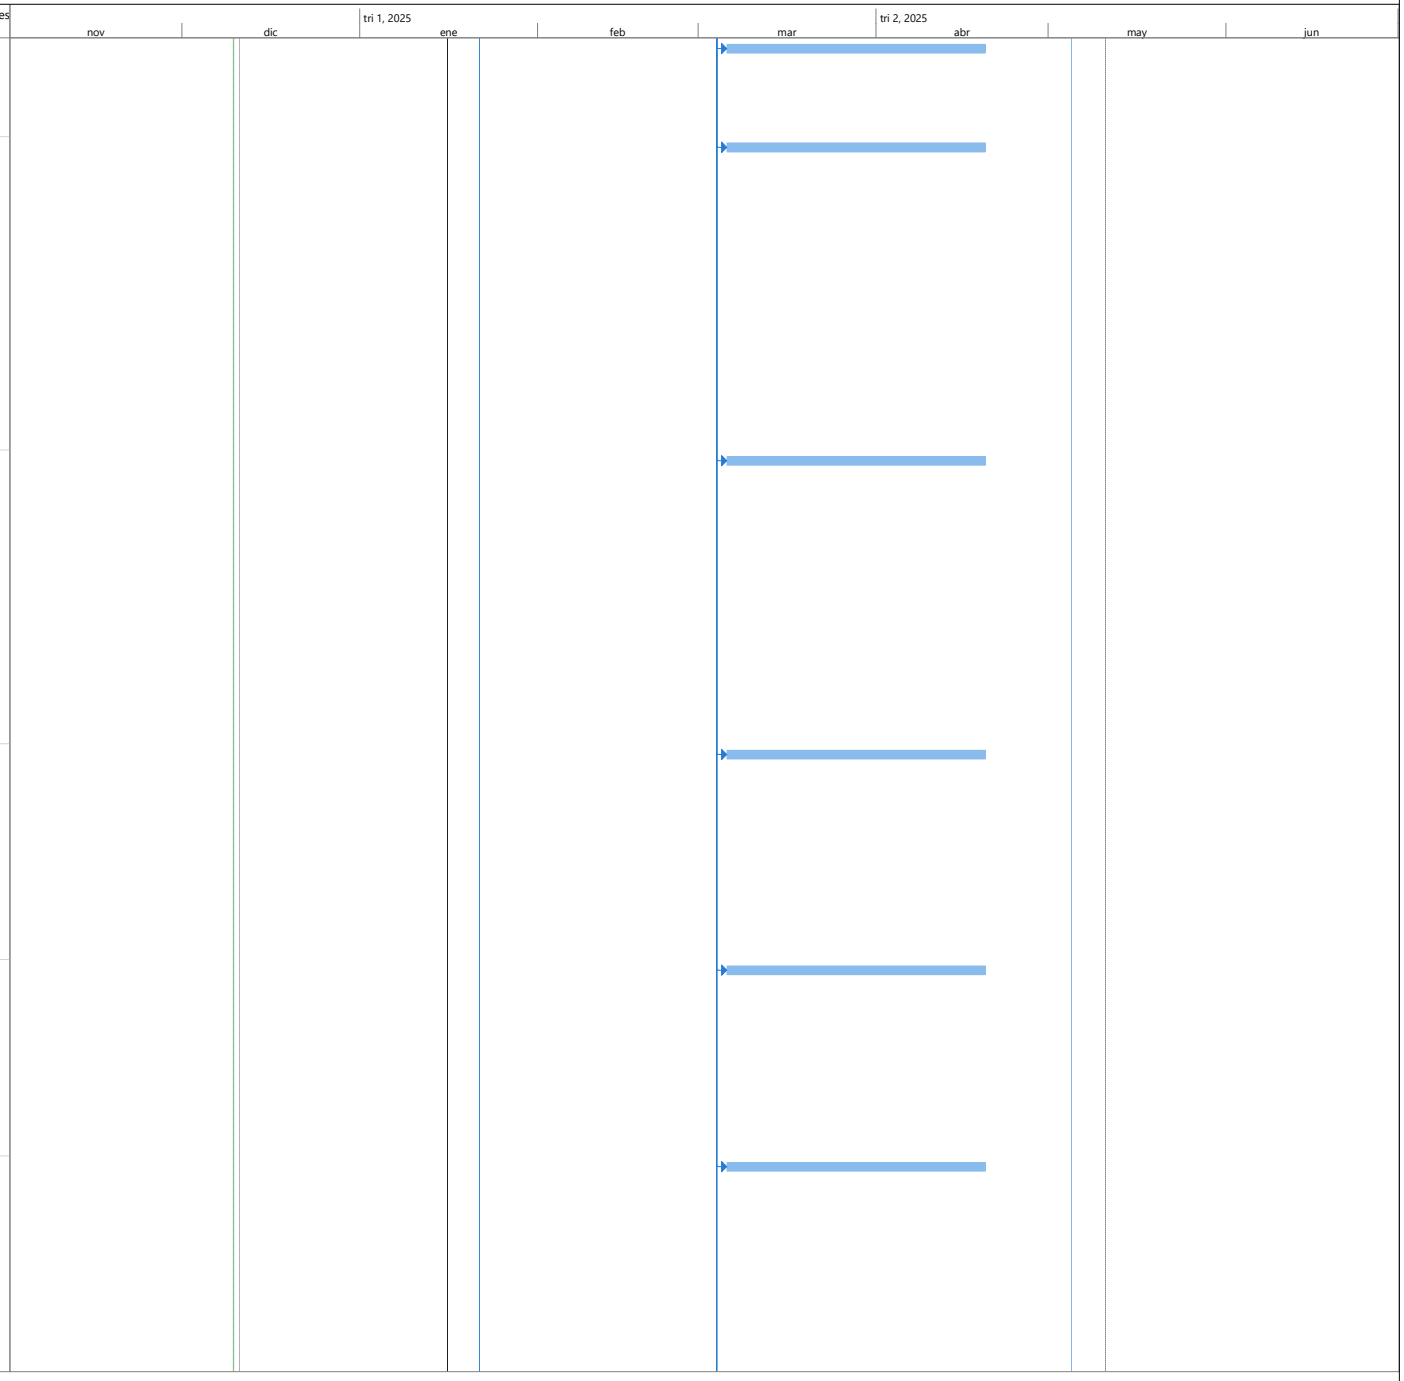

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces
136	Suministro e instalación de salida para DATOS para ACCES POINT, incluye Aparato, Cableado UTP CAT.6, Jack De terminacion en Campo, Marquilla y todos los accesorias para una completa instalación.	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC
137	Suministro e instalación de salida para HDMI para puesto de trabajo, incluye Cable HDMI, Faceplate y todos los accesorias para una completa instalación.	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC
138	Suministro e instalación de salida para HDMI para instalacion en muro, incluye Cable HDMI, Faceplate y todos los accesorias para una completa instalación.	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC
139	Tramites y pago para la certificación de las instalaciones según STD ANSI/TIA.	45 días	jue 6/03/25	sáb 19/04/25	95CC
140	**MANEJO AMBIENTAL Y REFORESTACION**	**5 días**	**lun 5/05/25**	**vie 9/05/25**	
141	Mateado y canastas	5 días	lun 5/05/25	vie 9/05/25	58
142	**VARIOS**	**5 días**	**lun 5/05/25**	**vie 9/05/25**	
143	Cinta antideslizante de 25 mm	5 días	lun 5/05/25	vie 9/05/25	141CC
144	**ACEROS**	**15 días**	**sáb 18/01/25**	**sáb 1/02/25**	
145	Acero Fy = 60.000 psi d>1/4"	15 días	sáb 18/01/25	sáb 1/02/25	27CC
146	Malla electrosoldada M-188 Φ 6.00 mm c/.15m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslapo).	15 días	sáb 18/01/25	sáb 1/02/25	27CC
147	**TRANSPORTE**	**90 días**	**mar 21/01/25**	**dom 20/04/25**	
148	Transporte material (corte, sub-base, base, afirmado, Petreos, arenas, etc)	90 días	mar 21/01/25	dom 20/04/25	8
149	FIN DEL PROYECTO	0 días	sáb 10/05/25	sáb 10/05/25	

