Bogotá D.C., 27 de diciembre de 2024.

Código verificación:
20241227-608

Señores:
SENA REGIONAL CALDAS Grupo de Apoyo Administrativo Mixto.
Atn. OSCAR ANDRES MALDONADO MORA.
Director (E) SENA Regional Caldas.
Manizales (Caldas).

Asunto: Solicitud prórroga No. 1, al contrato No. CO1.PCCNTR.7162714. Hasta el 27 de enero de 2025.

Referencia: *Contrato No*. CO1.PCCNTR.7162714. *Objeto* CONTRATAR EL MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DEL CUARTO DE RESIDUOS APROVECHABLES.

En desarrollo a la ejecución del contrato en referencia, suscrito entre el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – REGIONAL CALDAS y ENGINEER SAS, con fecha de vencimiento del 31 de diciembre de 2024.

¨(…) por regla general, el vencimiento del plazo estipulado es una de las causales de terminación del contrato. Sin embargo, en cuanto no está prohibido, el plazo estipulado en el contrato se puede ampliar o prorrogar mediante acuerdo entre las partes. No existe prohibición legal para la prórroga del plazo de los contratos estatales; por el contrario, en el artículo 40 de la ley 80 de 1993, se puede concluir que está permitida, pues esa norma establece la regla general de la libertad en las estipulaciones. ***De modo que esa disposición (sic) se puede concluir en que los contratos estatales, es posible la prórroga si la respectiva entidad considera que mediante esta figura se cumplen los fines estatales, conforme a los artículos 3 a 5 de la misma Ley, el Orden Público, los principios y finalidad de la misma ley y a los de la buena administración. La prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos. Que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo entre las partes. En relación con los contratos estatales la jurisprudencia y la doctrina han coincidido en la posibilidad de su prorroga, aunque también en la exigencia de que se pacte antes del vencimiento del plazo inicialmente establecido en el contrato****¨. ****(Texto subrayado y en negrilla fuera del texto original).***

De acuerdo con el extracto de sentencia, es posible la prórroga de los contratos estatales, siendo válido y legal en estos negocios jurídicos.

A continuación relaciono los hechos, situaciones ciertas, documentadas y demostradas, las cuales afectan la ejecución del contrato, pero que además éstas resultan necesarias para garantizar la finalidad del respectivo contrato, y que motivan la prórroga del contrato en referencia:

1. El 26 de diciembre de 2024, se firma acta de inicio entre la entidad estatal y el contratista, para empezar con la ejecución del contrato en referencia.
2. El ingeniero director de proyectos realiza la planeación de las actividades del contrato, encontrando que para el buen desarrollo del contrato se precisa más tiempo, esto es, una prórroga hasta el 27 de enero de 2025. (Se adjunta Diagrama de Gantt, en donde se discriminan los plazos y porcentajes de ejecución por cada actividad.

De ante mano agradezco evalúen esta solicitud y pueda ser tomada en cuenta para el óptimo desarrollo del contrato.

Atentamente.



Elquin Carvajal
Representante legal
Email. elquincarvajal@engineer.com
Tel. +57 350685222

C.C. Archivo

TÍTULO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DEL CUARTO DE RESIDUOS APROVECHABLES SENA REGIONAL CALDAS.

Nombre de la empresa ENGINEER SAS


Responsable del proyecto DAVID NOVA

Fecha de inicio del proyecto: 27/12/2024

Incremento de desplazamiento: 0

Leyenda: Según lo previsto | Riesgo bajo | Riesgo medio | Riesgo alto | Sin asignar

Descripción del hito	Categoría	Asignado a	Progreso	Inicio	Días
OBRAS PRELIMINARES					
INSPECCIÓN Y RECORRIDO DE CERRAMIENTO	Según lo previsto	Proesional SST Y Maestro	3%	27/12/2024	2
HIDROLAVADO DE COLUMNAS 17 CM X 17 CM Y ANTEPECHOS 34 CM (FACHALETA Y LADRILLO)	Según lo previsto	Maestro	3%	29/12/2024	1
HIDROLAVADO DE REJAS(H=1,51, PERFILES TUBULAR CUADRADO DE 1" SEPARADOS CADA 15 CM) PARA LIMPIEZA DE OXIDO CON HIDROBLASTING	Riesgo bajo	Maestro	12%	29/12/2024	4
RETIRO DE FACHALETA DETERIORADA CON RASQUETEADA (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	Según lo previsto	Maestro	3%	2/01/2025	1
DESMONTE DE REJA EN MAL ESTADO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	Según lo previsto	Maestro	2%	3/01/2025	1
DEMOLICIÓN DE ANTEPECHO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	Según lo previsto	Maestro	1%	4/01/2025	1
DESMONTE DE PERFIL DE RIELES SUPERIOR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	Según lo previsto	Maestro	1%	5/01/2025	1
DESMONTE DE PUERTA CORREDIZA CON RIELES (1,82 X 1,50 M)	Según lo previsto	Maestro	1%	6/01/2025	1
CONSTRUCCION					
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FACHALETA ARQUITECTONICA PARA ENCHAPE DE ANTEPECHOS - Arcilla 29*9 cm.	Riesgo bajo	Maestro	8%	7/01/2025	3
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA Y ANTICORROSIVO PARA REJAS. Incluye Ambas caras	Riesgo bajo	Maestro	13%	10/01/2025	4
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FACHALETA ARQUITECTÓNICA LISA PARA ENCHAPE DE COLUMNAS - Arcilla 29*9 cm. Incluye relleno en columnas en concreto de 21 Mpa	Riesgo bajo	Maestro	4%	14/01/2025	1
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJA EN TUBO CUADRADO DE ACERO DE 1" CADA 15 CM Y PARALES HORIZONTALES DE 0,09 X 0,025, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	Según lo previsto	Maestro	24%	15/01/2025	5
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PERFIL DE RIELES SUPERIOR EN ALUMINIO PARA PUERTA CORREDIZA INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO	Según lo previsto	Maestro	3%	20/01/2025	1
INSTALACIÓN DE PUERTA DE RIELES SUPERIOR (1,82 X 1,50 M)	Riesgo bajo	Maestro	3%	21/01/2025	1
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA Y ANTICORROSIVO PARA PUERTA DE MARCO TUBULAR Y REJA ESLABONADA Y RODACHINAS . (1,82 X 1,50 M)	Según lo previsto	Maestro	3%	22/01/2025	1
SOLDADURA 6013 DE UNIONES DESAJUSADAS O SUELTAS	Según lo previsto	Maestro	5%	23/01/2025	1
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA Y ANTICORROSIVO PARA POSTE DE TUBO FIJO DE PUERTA.	Según lo previsto	Maestro	1%	24/01/2025	1
DADO EN CONCRETO DE 10X20X 5 CM PARA INSTALACIÓN DE REJAS NUEVAS	Según lo previsto	Maestro	8%	25/01/2025	2
SELLADO DE JUNTAS CON ELASTOMERICO PARA EXTERIORES ANTIHONGOS	Según lo previsto	Maestro	2%	27/01/2025	1

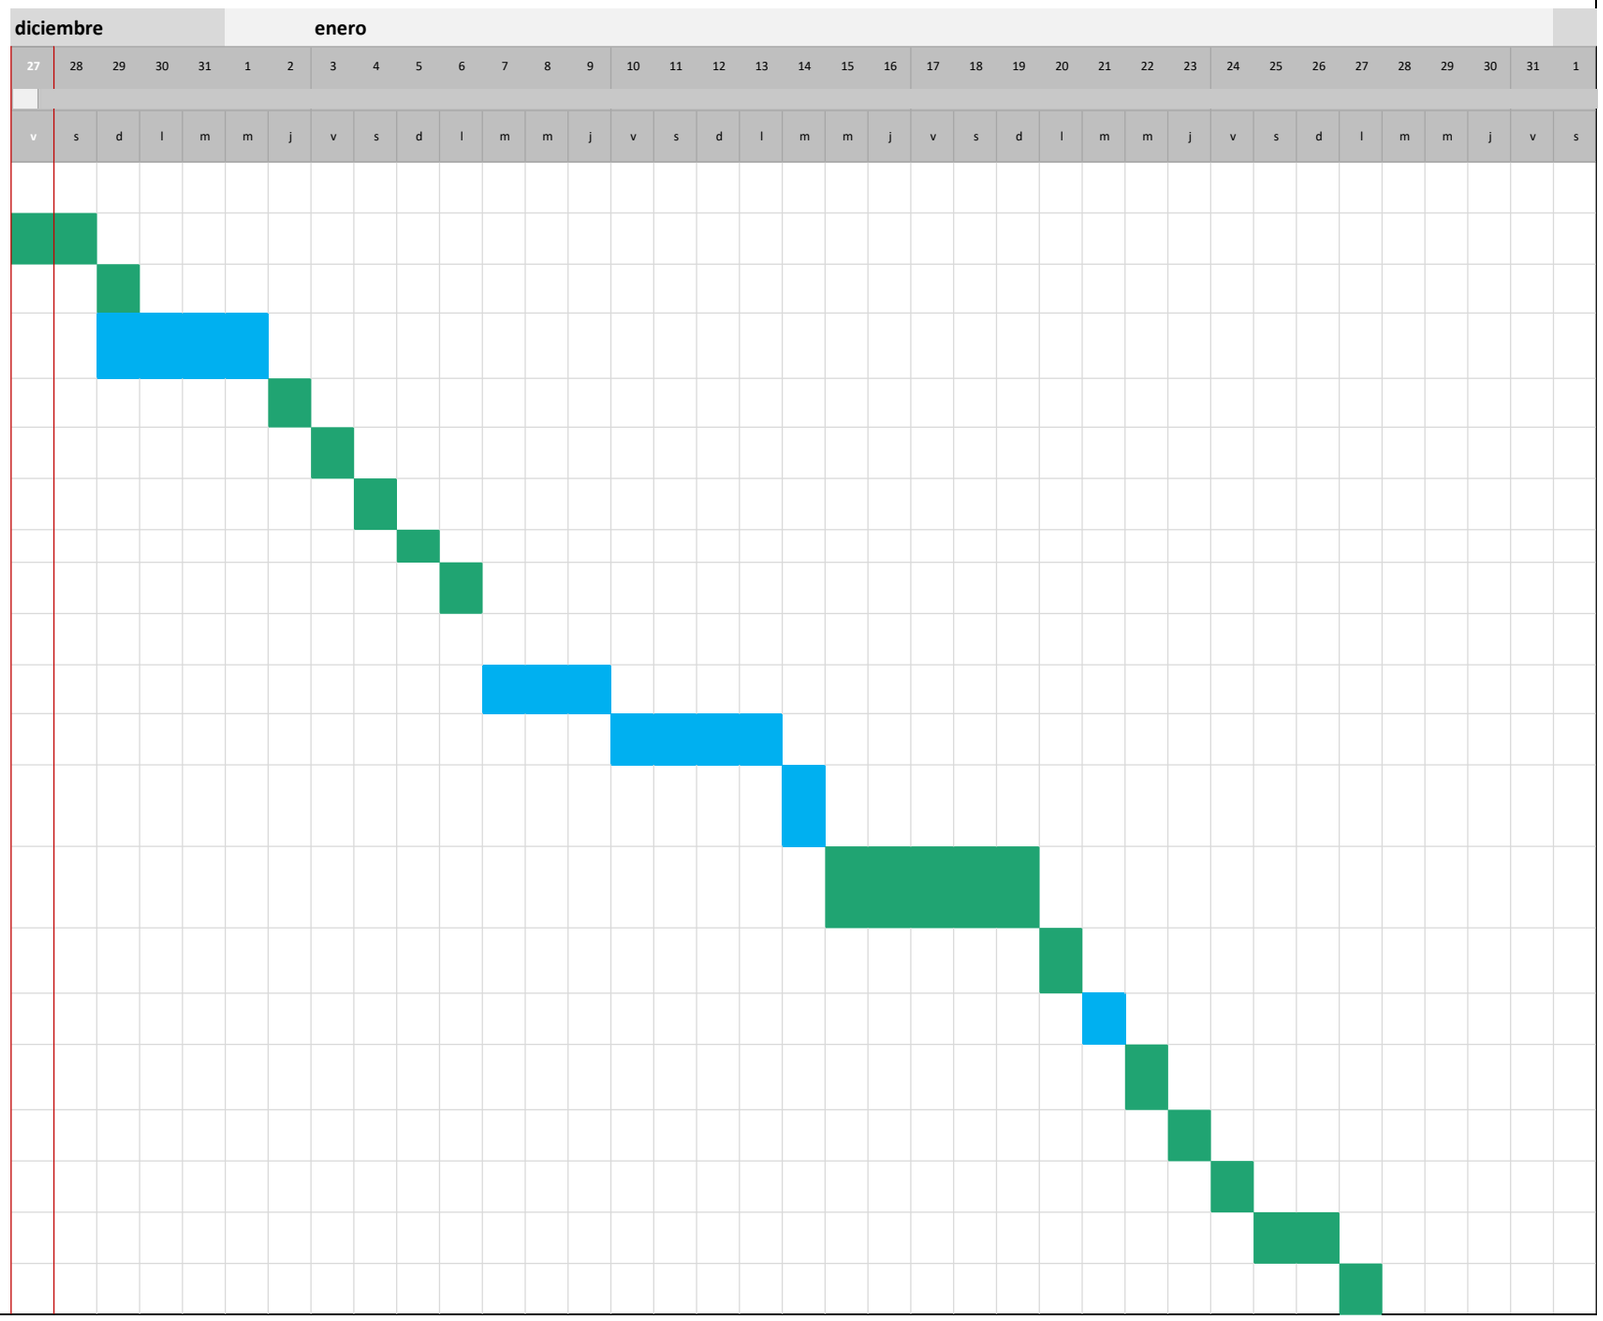

Proyectó: David Nova Nova - Director de proyecto.
Ing. Civil.
