FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-32	**PROCESO** Construcción de Proyectos	**VERSIÓN** 2.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

DIRECCIÓN TÉCNICA DE: **CONSTRUCCIONES** **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE**

CONTRATO No (Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☑
SELECCIÓN ABREVIADA ☐

IDU-LP-SGI-024-2019
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION, DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO AUTOPISTA NORTE (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) NIT 901.350.469-1

MIEMBROS DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

OHL INFRAESTRUCTURAS S.A.S (escriba el nombre del integrante con mayor participación)	% PARTICIPACIÓN	65 %
ALCA INGENIERIA S.A.S (escriba el nombre del integrante con la segunda mayor participación)	% PARTICIPACIÓN	25 %
FAWCETT S.A.S (escriba el nombre del integrante con la tercera mayor participación)	% PARTICIPACIÓN	10 %

(Se incluyen todos los miembros del consorcio o unión temporal en orden de mayor a menor participación)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. IDU-1642-2019
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

INTERVENTOR CONSORCIO CICLORUTAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901.350.457-1 (Escriba el NIT del Interventor)

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
(Escriba el nombre del Supervisor designado por el IDU para el contrato de Interventoría)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION IDU OSCAR EMILIO HERNÁNDEZ CORDOBA
(Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU asignado para el contrato)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO VEINTITRÉS (23) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 2 (Día) DE JUNIO (Mes) DE 2020 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 51.917.677.964,00
(Indique en este espacio el valor Inicial del contrato en números)

PRÓRROGAS:

PRÓRROGA No.	1	DE FECHA	18-jun-21	PLAZO	4 meses y 17 días - Etapa Estudios y Diseños
PRÓRROGA No.	2	DE FECHA	28-mar-23	PLAZO	10 meses - Etapa de construcción
PRÓRROGA No.	3	DE FECHA	27-dic-23	PLAZO	06 meses - Etapa de construcción
PRÓRROGA No.	4	DE FECHA	23-jul-24	PLAZO	01 meses - Etapa de construcción

TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS PLAZO DIAS

SUSPENSIONES:

ACTA No.	3	ACTA DE SUSPENSIÓN No.1	No.	1	DE FECHA	1-ene-21	DÍAS CALENDARIO	17
ACTA No.	4	REINICIO			DE FECHA	18-ene-21		
ACTA No.	7	ACTA DE SUSPENSIÓN No.2	No.	2	DE FECHA	17-mar-21	DÍAS CALENDARIO	19
ACTA No.	8	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	2	DE FECHA	31-mar-21	DÍAS CALENDARIO	15
ACTA No.	10	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	2	DE FECHA	20-abr-21	DÍAS CALENDARIO	13
ACTA No.	11	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	2	DE FECHA	30-abr-21	DÍAS CALENDARIO	15
ACTA No.	13	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	2	DE FECHA	14-may-21	DÍAS CALENDARIO	13
ACTA No.	14	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	2	DE FECHA	31-may-21	DÍAS CALENDARIO	8
ACTA No.	15	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	2	DE FECHA	8-jun-21	DÍAS CALENDARIO	8
ACTA No.	16	REINICIO			DE FECHA	16-jun-21		
ACTA No.	17	ACTA DE SUSPENSIÓN No.3	No.	3	DE FECHA	17-jun-21	DÍAS CALENDARIO	1
ACTA No.	18	REINICIO			DE FECHA	18-jun-21		
ACTA No.	21	ACTA DE SUSPENSIÓN No.4	No.	4	DE FECHA	17-sep-21	DÍAS CALENDARIO	15
ACTA No.	22	REINICIO			DE FECHA	2-oct-21		
ACTA No.	23	ACTA DE SUSPENSIÓN No.5	No.	5	DE FECHA	18-nov-21	DÍAS CALENDARIO	11
ACTA No.	24	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	5	DE FECHA	29-nov-21	DÍAS CALENDARIO	2
ACTA No.	25	ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	5	DE FECHA	1-dic-21	DÍAS CALENDARIO	1
ACTA No.	26	REINICIO			DE FECHA	2-dic-21		
ACTA No.	27	ACTA DE SUSPENSIÓN No.6	No.	6	DE FECHA	3-dic-21	DÍAS CALENDARIO	1
ACTA No.	28	REINICIO			DE FECHA	4-dic-21		
ACTA No.	51	ACTA DE SUSPENSIÓN No.7	No.	7	DE FECHA	3-feb-23	DÍAS CALENDARIO	17
ACTA No.	52	DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	No.	7	DE FECHA	20-feb-23	DÍAS CALENDARIO	22
ACTA No.	56	DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	No.	7	DE FECHA	14-mar-23	DÍAS CALENDARIO	7
ACTA No.	58	REINICIO			DE FECHA	23-mar-23		
ACTA No.	115	ACTA DE SUSPENSIÓN No.8	No.	8	DE FECHA	27-jun-24	DÍAS CALENDARIO	15
ACTA No.	119	DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	No.	8	DE FECHA	12-jul-24	DÍAS CALENDARIO	5
ACTA No.	120	DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	No.	8	DE FECHA	17-jul-24	DÍAS CALENDARIO	5
ACTA No.	121	REINICIO			DE FECHA	22-jul-24		

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES **No. DÍAS** **210**

PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUARENTA Y CUATRO (44) MESES CON DIECISIETE (17) DIAS
(Indique en este espacio el plazo Total en días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE TERMINACIÓN 23 (Día) DE SEPTIEMBRE (Mes) DE 2024 (Año)

MAYORES CANTIDADES:

CANTIDADES No.	N/A	DE FECHA	N/A	VALOR	N/A
CANTIDADES No.	N/A	DE FECHA	N/A	VALOR	N/A
VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES				VALOR	$ -

ADICIONES:

ADICIÓN No.	1	DE FECHA		VALOR	$ 107.791.969,00
ADICIÓN No.	2	DE FECHA		VALOR	$ 57.694.431,00
VALOR TOTAL DE ADICIONES				VALOR	$ 165.486.400,00

☑

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 52.083.164.364,00

3. RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

N.	RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS	ESTADO
1	Tramo Funcional No. 1 Ubicado entre calle 127 y 128 BIS	En remate
2	Tramo Funcional No. 2 ubicado entre calle 114 y 127	En remate
3	Tramo Funcional No. 3 ubicado entre calle 100 y 114	En remate
4	Tramo Funcional No. 4 ubicado entre CALLE 92 y 100	En remate
5	Tramo Funcional No. 5 ubicado entre calle 87 y 92	En remate
6	Tramo Funcional No. 6 ubicado entre calle 80 y 87	En remate

4. RELACIÓN DE OBRAS Y/O DETALLALES FALTANTES			
TRAMOS 1 - 2 - 3.			
N.	**RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS**	**DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD, LAS OBRAS EN CORRECCIÓN O EN REMATE / OBSERVACIONES**	**CRONOGRAMA DE ENTREGA**
Tramo Funcional No. 1 Ubicado entre calle 127 y 128 BIS			
1	Bocacalles	Calle 128B - Remates de asfalto con fisuras y lleno de huecos por toma de Núcleos.	13/10/2024
2	Espacio Público	Fisuras en concretos de espacio público en esquina nor oriental de calle 128B.	28/09/2024
3	Espacio Público	Fisuras en concretos de espacio público en esquina nor oriental de calle 128B.	28/09/2024
4	Redes húmedas	Tapa de pozo pluvial deteriorada en costado oriental en calle 128B	28/09/2024
5	Bocacalles	Mal estado del asfalto en reposición por canalización en calle 128B.	31/10/2024
6	Bocacalles	K0+000 - Sardinel A-10 mal rematado en costado sur oriental de calle 128B - esquina concesionarios.	27/09/2024
7	Espacio Público	K0+000 - Fisura en hombro de rampa.	27/09/2024
8	Espacio Público	K0+003 - loseta toperol alerta presenta fisura.	28/09/2024
9	Cicloruta	Del K0+010 al K0+030 - Pendiente sellos de juntas de concreto ocre en cicloruta.	28/09/2024
10	Espacio Público	K0+150 a K0+151 - Pendiente emboquillado de losetas y presencia de fisura.	28/09/2024
11	Señalización	Del K0+180 al K0+193 - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas.	31/10/2024
12	Accesos Vehiculares	K0+195 - En rampa de acceso vehicular la loseta toperol no presenta estampado por desgaste prematuro.	31/10/2024
13	Señalización	K0+195 - Pintura de cicloruta deteriorada y levantada.	31/10/2024
14	Bocacalles	K0+228 - Concreto de rampa occidental de pompeyano presenta desgaste y deterioro considetrado en calle 127D.	31/10/2024
15	Redes húmedas	En calle 127D cargue de pozo presenta deterioro.	31/10/2024
16	Bocacalles	En calle 127D el concreto del pompeyano no presenta texturizado en cruce peatonal.	29/09/2024
17	Bocacalles	En calle 127D rampa occidental de pompeyano presenta deterioro y mal remate contra el asfalto.	24/10/2024
18	Espacio Público	En K0+266 el concreto de las cintas de ajuste de cajas presenta fisuras.	27/09/2024
19	Señalización	K0+244 - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas.	31/10/2024
20	Espacio Público	K0+550 - Hundimiento de losetas en cicloruta.	2/10/2024
21	Cicloruta	K0+332 - Tropezón entre asfalto y cámara de ETB.	24/10/2024
22	Cicloruta	Del K0+340 al K0+350 - Tropezón entre bordillo y concreto de cicloruta.	24/10/2024
23	Espacio Público	En K0+375 Falta emboquillado en loseta alerta costado occidental, y deterioro de sardinel en borde de vía.	31/10/2024
24	Señalización	En K0+375 falta emboquillado de adoquín y demarcación de cicloruta.	31/10/2024
25	Redes húmedas	En calle 127B bis - Fisura en concreto de pompeyano y deterioro de tapa y cargue de pozo sanitario.	27/09/2024
26	Señalización	En rampa occidental de pompeyano calle 127B bis, pintura deteriorada y mal ejecutado corte y remate contra asfalto	31/10/2024
27	Redes húmedas	En calle 128B bis, costado oriental, deterioro en cargue de pozo pluvial y en corte de rampa de pompeyano contra asfalto.	29/09/2024
28	Bocacalles	En calle 127B bis el concreto del pompeyano no presenta texturizado en cruce peatonal.	29/09/2024
29	Cicloruta	En K0+403 bordillo deteriorado en costado oriental de cicloruta.	27/09/2024
30	Espacio Público	En K0+467 se presenta tropezón entre loseta toperol y tapete podotáctil instalado.	28/09/2024

31	Señalización	Del K0+495 al K0+505 - Pendiente demarcación en cicloruta y corregir demarcación por cambio de losetas.	31/10/2024
32	Señalización	En K0+510 la demarcación en el paradero presenta deterioro.	31/10/2024
33	Señalización	Del K0+518 al K0+528 - Pendiente demarcación en cicloruta y corregir demarcación por cambio de losetas.	31/10/2024
34	Espacio Público	En K0+538 se presenta tropezón en bordillo transversal.	27/09/2024
35	Cicloruta	Del K0+545 al K0+570 falta remate de acabado de Baranda borde de cicloruta.	31/10/2024
36	Bocacalles	En K0+680 el sardinel A-10 se ha deteriorado.	27/09/2024
37	Bocacalles	En K0+680 sardinel A-10 presenta tropezón con sumidero en costado nor oriental - límite.	28/09/2024
Tramo Funcional No. 2 ubicado entre calle 114 y 127			
38	Bocacalles	Bordillo deteriorado en conectante sur occidente de autonorte con calle 127.	27/09/2024
39	Bocacalles	Pendiente reposición de newjersey en conectante sur occidente de autonorte con autopista en lado sur.	29/09/2024
40	Cicloruta	K0+722 al K0+752 - tropezón entre asfalto y bordilloen cicloruta.	13/10/2024
41	Señalización	K0+722 al K0+752 - Pendiente demarcación de cicloruta	31/10/2024
42	Espacio Público	K0+778 - Adoquín con tropezón contra caja mal rematado.	27/09/2024
43	Paisajismo	Del K0+800 al K0+880 pendiente retiro de tocones y postes sobrantes.	31/10/2024
44	Señalización	K0+845 - pompeyano de conectante occidente norte de calle 127 con autonorte señalización horizontal deteriorada.	31/10/2024
45	Bocacalles	K0+845 - pompeyano de conectante occidente norte de calle 127 con autonorte bordillo agrietado costado occidental.	31/10/2024
46	Bocacalles	K0+845 - pompeyano de conectante occidente norte de calle 127 con autonorte bordillo agrietado costado Oriental.	31/10/2024
47	Bocacalles	K0+845 - pompeyano de conectante occidente norte de calle 127 con autonorte mal estampado el concreto.	31/10/2024
48	Señalización	En K0+880 en pompeyano de conectante sur oriente de autonorte con calle 127, señalización horizontal deteriorada.	31/10/2024
49	Espacio Público	En K0+880 en pompeyano de conectante sur oriente de autonorte con calle 127, mal emboquillado de bordillos.	27/09/2024
50	Espacio Público	En K0+895 las cintas de ajuste de caja está fisurada.	31/10/2024
51	Mobiliario	En K0+908 las bancas están desportilladas y agrietadas.	31/10/2024
52	Mobiliario	En K0+908 las bancas están desportilladas y agrietadas.	31/10/2024
53	Espacio Público	En K0+910 pendiente reposición de baranda en inicio de rampa peatonal de transmilenio.	24/09/2024
54	Espacio Público	Del K0+895 al K0+916 adoquín de arcilla presenta desgaste prematuro.	10/10/2024
55	Bocacalles	En pompeyano de calle 125, bordillos con fisuras en rampa occidental.	31/10/2024
56	Redes húmedas	En pompeyano de calle 125 tapa y cargue de pozo presentan deterior.	31/10/2024
57	Señalización	En pompeyano de calle 125 Señalización horizontal en general está deteriorada.	31/10/2024
58	Espacio Público	En K0+927 el concreto de ajuste de las cajas presentan múltiples fisuras con mal aspecto físico.	31/10/2024
59	Señalización	Del K0+934 al K0+944 - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas.	31/10/2024
60	Señalización	Del K0+977 al K0+990 - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas.	31/10/2024
61	Señalización	Del K0+997 al K1+000 - Pendiente corregir demarcación en cicloruta con solo imprimante actualmente.	31/10/2024
62	Espacio Público	En K1+005 mal remate de loseta contra franja de ajuste de caja.	26/09/2024
63	Señalización	En rampa de acceso vehicular en K1+030 la señalización horizontal general presenta deterioro.	31/10/2024
64	Espacio Público	Del K1+033 al K1+043 falta emboquillado de adoquín y corregir juntas muy abiertas.	27/09/2024

65	Mobiliario	En K1+054 bancas desportilladas y fisuradas.	31/10/2024
66	Cicloruta	Del K1+064 al K1+082 mezcla asfáltica de cicloruta está abierta y presenta tropezones con bordillos.	13/10/2024
67	Espacio Público	En K1+078 bordillo deteriorado.	26/09/2024
68	Señalización	En acceso vehicular predio 122-56 la señalización horizontal presenta deterioro.	31/10/2024
69	Cicloruta	En K1+167 bordillo deteriorado y mal rematado en cicloruta.	26/09/2024
70	Señalización	En K1+167 Señalización horizontal con deterioro.	31/10/2024
71	Espacio Público	En K1+185 losetas sin emboquillar.	26/09/2024
72	Señalización	En K1+210 pendiente terminar señalización de cicloruta	31/10/2024
73	Bocacalles	En K1+214 concreto de pompeyano calle 122 agrietado en rampa nor oriental.	31/10/2024
74	Señalización	En pompeyano de calle 122 la señalización horizontal presenta deterioro general.	31/10/2024
75	Espacio Público	En K1+235 las franjas de ajustes de cajas y pozo presentan múltiples fisuras con mal aspecto.	31/10/2024
76	Espacio Público	En K1+235 costado occidental losetas sin emboquillar.	28/09/2024
77	Señalización	Del K1+240 al K1+250 - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar	31/10/2024
78	Espacio Público	Del K1+240 al K1+280 pendiente remate de asfalto contra sardinel en borde de vía.	27/09/2024
79	Espacio Público	en K1+246 franja de ajuste presenta tropezón contra predio y afectación de acabado.	27/09/2024
80	Señalización	Rampa de acceso a predio en K1+270 presenta deterioro general la señalizción horizontal.	31/10/2024
81	Espacio Público	En K1+273 pendiente remate por afectación de predio privado por obras.	30/09/2024
82	Señalización	Rampa de acceso a predio en K1+293 presenta deterioro general la señalizción horizontal.	31/10/2024
83	Accesos Vehiculares	Remate de rampa con predio 118-82 corregir tropezon y rematar.	27/09/2024
84	Accesos Vehiculares	Corregir remate de rampa contra asfalto en predio 118-74	30/09/2024
85	Accesos Vehiculares	En K1+320 concreto agrietado contra caja ENEL.	31/10/2024
86	Espacio Público	Del K1+320 al K1+340 pendiente remate de asfalto contra sardinel en borde de vía.	26/09/2024
87	Señalización	K1+350 - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar	31/10/2024
88	Señalización	Del K1+351 al K1+364 señalización horizontal con deterioro general.	31/10/2024
89	Espacio Público	En K1+376 corregir juntas separadas y emboquillado de loseta.	31/10/2024
90	Señalización	En K1+392 pendiente señalización de cicloruta.	31/10/2024
91	Señalización	K1+420 señalización horizontal con deterioro en acceso vehicular en general.	31/10/2024
92	Espacio Público	En K1+450 tropezón en tapete podotáctil y falta de emboquillado de adoquín.	27/09/2024
93	Espacio Público	En K1+455 bordillo deteriorado al norte de paradero.	31/10/2024
94	Señalización	Del K1+466 al K1+480 - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar	3/10/2024
95	Espacio Público	Del K1+469 al K1+480 corregir emboquillado de loseta.	26/09/2024
96	Cicloruta	En K1+494 bordillo deteriorado en cicloruta.	26/09/2024
97	Señalización	En k1+496 señalización horizontal de rampa en general deteriorada.	31/10/2024
98	Señalización	En K1+505 falta señalización en asfalto de cicloruta.	31/10/2024
99	Espacio Público	Del K1+505 al K1+520 las juntas de las losetas están muy abiertas y les falta emboquillado.	31/10/2024

100	Señalización	En K1+520 en acceso vehicular señalización general presenta deterioro.	31/10/2024
101	Accesos Vehiculares	En K1+520 en acceso vehicular bordillos agrietados.	26/09/2024
102	Accesos Vehiculares	En K1+520 en acceso vehicular pendiente reposición por afectación en predio privado.	17/10/2024
103	Señalización	En K1+550 - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar	31/10/2024
104	Accesos Vehiculares	En K1+554 falta remate de bordillo deteriorado.	26/09/2024
105	Espacio Público	Del K1+554 al K1+560 falta emboquillado de adoquín hacia paramento.	31/10/2024
106	Espacio Público	En K1+560 - Pendiente reposición de muro por afectación por obra.	31/10/2024
107	Señalización	Calle 116 conectante norte la señalización general presenta deterioro.	31/10/2024
108	Bocacalles	En K1+561 pendiente de ampliación de texturizado en cruce peatonal.	27/09/2024
109	Redes húmedas	Tapa de pozo sanitario deteriorada en calle 116 conectante norte.	26/09/2024
110	Bocacalles	Bordillo occidental agrietado en pompeyano de calle 116 conectante norte.	31/10/2024
111	Señalización	Pendiente señalización de cicloruta bajo puente de calle 116.	24/09/2024
112	Espacio Público	Del K1+570 al K1+590 pendiente remate de asfalto contra sardinel A-10 en borde de vía.	26/09/2024
113	Espacio Público	Del K1+570 al K1+590 hundimiento en adoquines instalados y materiales prefabricados.	28/09/2024
114	Señalización	En pompeyano de calle 116 conectante sur la señalización presenta deterioro general.	31/10/2024
115	Espacio Público	Andén sur oriental de calle 116 hacia oriente, adoquín desalineado.	25/09/2024
116	Señalización	Del K1+605 al K1+615 pendiente corregir señalización en cicloruta por cambio de losetas.	3/10/2024
117	Señalización	Del K1+625 al K1+655 la señalización de la cicloruta está deteriorada y se ha borrado.	31/10/2024
118	Cicloruta	En K1+646 hay hundimiento de asfalto contra cámara.	13/10/2024
119	Señalización	En rampa de acceso vehicular en K1+660 la señalización horizontal general presenta deterioro.	27/09/2024
120	Señalización	Del K1+600 al K1+780 pendiente remate de acabado de pintura de baranda reinstalada.	25/09/2024
121	Espacio Público	K1+670 al K1+690 pendiente emboquillado de prefabricados.	25/09/2024
122	Espacio Público	En K1+700 pendiente instalación de loseta.	25/09/2024
123	Espacio Público	K1+715 pendiente remate de cinta de ajuste en concreto.	25/09/2024
124	Señalización	Rampa de acceso vehicular a Parqueaderos Tequendama presenta deterioro general su señalización horizontal.	31/10/2024
125	Accesos Vehiculares	Rampa de acceso vehicular a Parqueaderos Tequendama presenta deterioro en bordillos.	31/10/2024
126	Accesos Vehiculares	Rampa de acceso vehicular a Parqueaderos Tequendama presenta deterioro general el concreto estampado.	17/10/2024
127	Accesos Vehiculares	En K1+750 pendiente remata de rampa de acceso vehicular hacia paramento de predio 114-20.	25/09/2024
128	Señalización	Del K1+770 al K1+777 - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar	3/10/2024
129	Señalización	Pompeyano de calle 114 la señalización horizontal presenta deterioro general.	31/10/2024
130	Bocacalles	Pompeyano de calle 114 lpresenta bordillos agrietados.	31/10/2024
131	Redes húmedas	cargue de pozos deteriorados.lpresenta bordillos agrietados.	31/10/2024
132	Espacio Público	En espacio público del costado sur de la calle 114 pendiente terminar de corregir acabados por afectación de la obra.	27/09/2024
Tramo Funcional No. 3 ubicado entre calle 100 y 114			
133	Señalización	En K1+865 pendiente completar la señalización horizontal en caja.	3/10/2024

134	Señalización	En K1+885 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general la señalización horizontal.	31/10/2024
135	Accesos Vehiculares	En K1+885 rampa de acceso vehicular presentan deterioro los bordillos	31/10/2024
136	Señalización	Del K1+902 al K1+912 - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar	3/10/2024
137	Mobiliario	En K1+908 3 bancas desportilladas y fisuradas.	31/10/2024
138	Espacio Público	K1+918 pendiente rematar franja de ajuste de cajas - fisuras.	17/10/2024
139	Señalización	Pompeyano de calle 109 presenta deterioro general su señalización horizontal.	31/10/2024
140	Bocacalles	Pompeyano de calle 109 presenta deterioro general sus bordillos incluyendo grietas.	31/10/2024
141	Señalización	Del K1+940 al K1+950 - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar	31/10/2024
142	Espacio Público	Del K1+940 al K1+990 pendiente reposición de enchape de muro afectado por obra.	31/10/2024
143	Espacio Público	En K2+010 acabados con juntas muy abiertas, sin emboquillado y presentan hundimientos.	31/10/2024
144	Espacio Público	K2+020 al K2+030 acabados con hundimientos y falta de emboquillado.	28/09/2024
145	Señalización	En K2+033 pendiente demarcación de cicloruta.	3/10/2024
146	Señalización	Del K2+040 al K2+050. - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar	3/10/2024
147	Espacio Público	K2+050 loseta toperol debe ser de 40x40 no de 20x30.	25/09/2024
148	Señalización	En K2+058. - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar	3/10/2024
149	Cicloruta	Del K2+080 al K2+088 asfalto de cicloruta presenta hundimiento contra pozo.	13/10/2024
150	Accesos Vehiculares	En K2+090 la rampa de acceso vehicular debe ser reprocesada por mal estampado su concreto.	31/10/2024
151	Señalización	En K2+098. - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar	3/10/2024
152	Señalización	En K2+105. - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar	3/10/2024
153	Accesos Vehiculares	K2+100 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general en señaización horizontal.	31/10/2024
154	Accesos Vehiculares	K2+110 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general en señaización horizontal.	31/10/2024
155	Señalización	En K2+116 pendiente señalización de cicloruta.	3/10/2024
156	Accesos Vehiculares	K2+120 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general au señaización horizontal.	31/10/2024
157	Cicloruta	K2+140 pendiente rematar bordillo de cicloruta.	25/09/2024
158	Señalización	Del K2+165 al K2+175. - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar	3/10/2024
159	Señalización	Del K2+182 al K2+192. - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar	3/10/2024
160	Espacio Público	Del K2+182 al K2+192. - hundimientos en prefabricados de paradero y falta de emboquillado.	25/09/2024
161	Señalización	K2+195. - corregir demarcación por modificaciones.	3/10/2024
162	Señalización	Del K2+216 al K2+222. - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar	31/10/2024
163	Señalización	Pompeyano de calle 106 presenta deterioro general su señalización.	31/10/2024
164	Espacio Público	Del K2+243 al K2+250 hundimiento de adoquín contra caja en andén sur de calle 106.	2/10/2024
165	Espacio Público	Del K2+250 al K2+310 pendiente remate de acabados de baranda reinstalada.	31/10/2024
166	Señalización	Pompeyano de calle 105 presenta deterioro general su señalización horizontal.	31/10/2024
167	Señalización	K2+326. - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar	31/10/2024
168	Espacio Público	En K2+360 pendiente emboquillado de bordillo deteriorado	25/09/2024

169	Señalización	En K2+364 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	31/10/2024
170	Espacio Público	Del K2+383 al K2+393 pendiente emboquillado de losetas.	17/10/2024
171	Señalización	Del K2+383 deterioro de señalización en rampa de acceso vehicular	31/10/2024
172	Cicloruta	Del K2+397 al K2+405 asfalto está abierto y deteriorado en cicloruta.	13/10/2024
173	Espacio Público	K2+420 al K2+425 pendiente emate de asfalto contra sardinel A-10 en borde de vía.	25/09/2024
174	Espacio Público	K2+420 al K2+428 pendiente emboquillado de loseta.	25/09/2024
175	Señalización	Rampas de acceso vehicular a estació Petrobras presentna deterioro general su señalización.	31/10/2024
176	Espacio Público	K2+438 al K2+446 presencia en loseta de tropezones, hundimientos, juntas abiertas y falta de emboquillado.	25/09/2024
177	Accesos Vehiculares	Del K2+455 al K2+460 se debe reprocesar concreto mal estampado.	31/10/2024
178	Señalización	En K2+465 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	31/10/2024
179	Señalización	K2+476 al K2+486 - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar	31/10/2024
180	Señalización	Pompeyano de calle 104 presenta deterioro general su señalización.	31/10/2024
181	Bocacalles	Pompeyano de calle 104 presenta bordillos agrietados	31/10/2024
182	Redes húmedas	Pompeyano de calle 104 cargue de pozo deteriorado.	31/10/2024
183	Señalización	K2+520 - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar	31/10/2024
184	Espacio Público	K2+520 al K2+550 peniente emboquillado de loseta.	25/09/2024
185	Espacio Público	K2+567 mala instalación de tapete podotactil - mal corte.	28/09/2024
186	Señalización	En K2+590 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	31/10/2024
187	Señalización	En K2+615 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	31/10/2024
188	Señalización	K2+620 al K2+625 - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar	31/10/2024
189	Señalización	K2+640 al K2+645 - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar	31/10/2024
190	Espacio Público	K2+640 al K2+645 - Losetas rotas y pendiente emboquillado.	25/09/2024
191	Señalización	En K2+651 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	31/10/2024
192	Espacio Público	K2+655 pendiente rematar sardinel A-10 contra hombrera de rampa.	27/09/2024
193	Espacio Público	K2+650 rematar asfalto contra sardinel A-10 en borde de vía.	25/09/2024
194	Señalización	K2+674 - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar	31/10/2024
195	Señalización	Pompeyano de calle 103 presenta deterioro general su señalización.	31/10/2024
196	Bocacalles	Pompeyano de calle 103 presenta bordillos agrietados	31/10/2024
197	Redes húmedas	Pompeyano de calle 103 cargue de pozo deteriorado.	31/10/2024
198	Señalización	K2+700 al K2+710 - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar	31/10/2024
199	Señalización	K2+700 al K2+710 - Corregir demarcación en cicloruta.	26/09/2024
200	Señalización	K2+700 al K2+710 - Corregir demarcación en cicloruta.	3/10/2024
201	Señalización	K2+778 - Pendiente demarcación de cicloruta y emboquillado de losetas.	3/10/2024
202	Señalización	En K2+780 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	31/10/2024
203	Accesos Vehiculares	En K2+780 rampa de acceso vehicular presenta deterioro y grietas en bordillos.	31/10/2024

204	Señalización	K2+825 pendiente demarcación de cicloruta y emboquillado de loseta.	3/10/2024
205	Espacio Público	K2+825 - Pendiente remate de acabado sitio de poste.	31/10/2024
206	Señalización	En K2+823 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	26/09/2024
207	Señalización	En K2+830 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	31/10/2024
208	Cicloruta	K2+840 - Hundimientos en losetas y tropezones en sardinel espacio público y cicloruta	26/09/2024
209	Espacio Público	K2+850 al K2+860 pendiente emboquillado de losetas.	25/09/2024
210	Señalización	En K2+885 al K2+890 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	31/10/2024
211	Accesos Vehiculares	K2+880 al K2+895 rampa de acceso vehicular presenta deterioro y grietas en bordillos.	31/10/2024
212	Señalización	En K2+902 al K2+914 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	26/09/2024
213	Accesos Vehiculares	K2+913 deterioro de concreto terracota de rampa de acceso vehicular.	31/10/2024
214	Señalización	Pompeyanos de calle 100 costado norte, ambos pompeyanos presentan deterioro general su señalización.	31/10/2024
215	Espacio Público	K2+492 - andén nor oriental de calle 100 prefabricados presentan hundimientos.	27/09/2024
TRAMOS 4 - 5 - 6.			
N.	**RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS**	**DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD, LAS OBRAS EN CORRECCIÓN O EN REMATE / OBSERVACIONES**	**CRONOGRAMA DE ENTREGA**
Tramo Funcional No. 4 ubicado entre CALLE 92 y 100			
1	Señalización	Pompeyano sur de calle 100 conectante occidente a norte señalización horizontal presenta deterioro general.	31/10/2024
2	Bocacalle	Pompeyano sur de calle 100 conectante occidente a norte bordillos en general con grietas.	31/10/2024
3	Bocacalle	Pompeyano sur de calle 100 conectante occidente a norte rampa occidental mal cortada y mal rematada con asfalto y grietas.	31/10/2024
4	Bocacalle	Separador sur de calle 100 entre concetantes, sardinel presenta desportillamientos.	27/09/2024
5	Bocacalle	Separador sur de calle 100 entre concetantes, sardineles con fisuras y sin sellar juntas.	27/09/2024
6	Señalización	Pompeyano sur de calle 100 conectante sue a oriente señalización horizontal presenta deterioro general.	2/10/2024
7	Bocacalle	Pompeyano sur de calle 100 conectante sur a oriente rampa oriental cn cncreto deteriorado.	31/10/2024
8	Bocacalle	Pompeyano sur de calle 100 conectante sur a oriente rampa oriental asfalto mal rematado con grietas, cárcamo superficial fisura asfalto.	13/10/2024
9	Espacio Público	K3+063 cinta de ajuste en costado oriental deteriorada.	30/09/2024
10	Espacio Público	K3+063 al K3+112 costado occidental con hundimientos, tropezones y desalineado.	1/10/2024
11	Espacio Público	K3+063 al K3+112 costado occidental con hundimientos, tropezones y desalineado.	30/09/2024
12	Espacio Público	K3+063 al K3+112 costado occidental con hundimientos, tropezones y desalineado.	30/09/2024
13	Espacio Público	K3+072 costado oriental, adoquín con hundimientos y mal emboquillado.	1/10/2024
14	Espacio Público	K3+083 costado oriental, adoquín con hundimientos y mal emboquillado.	1/10/2024
15	Espacio Público	K3+092 al K3+117 pisos con hundimientos, tropezones y mal emboquillado.	1/10/2024
16	Espacio Público	K3+113 loseta alerta fisurada.	1/10/2024
17	Espacio Público	K3+125 costado oriental, bordillos con desportillamientos u fisuras	31/10/2024
18	Espacio Público	K3+120 costado occidental, adoquín sin emboquillar.	31/10/2024
19	Espacio Público	K3+120 al K3+145 costado occidental, adoquín con junta abierta y tropezones contra loseta alerta.	31/10/2024
20	Espacio Público	K3+143 al K3+155 costado oriental, prefabricados con hundimientos y tropezones.	31/10/2024

21	Espacio Público	K3+143 al K3+155 costado oriental, prefabricados con hundimientos y tropezones.	31/10/2024
22	Espacio Público	K3+155 al K3+170 costado occidental, adoquín sin emboquillar.	30/09/2024
23	Espacio Público	K3+170 costado occidental, adoquín presenta tropezones	31/10/2024
24	Espacio Público	K3+168 al K3+190 costado oriental, aoquín con hundimientos, tropezones y sin emboquillar.	31/10/2024
25	Espacio Público	K3+168 al K3+190 costado oriental, aoquín con hundimientos, tropezones y sin emboquillar.	31/10/2024
26	Espacio Público	K3+200 costado oriental vía pacificada, concreto con tropezones.	1/10/2024
27	Señalización	Pompeyano de calle 97 presenta deterioro general la señalización horizontal.	31/10/2024
28	Señalización	Vía paificada calle 100 costado sur, señalización horizontal presenta deterioro general.	31/10/2024
29	Bocacalle	Pompeyano de calle 97 presenta bordillos con grietas.	31/10/2024
30	Espacio Público	K3+220 al K3+228, adoquín terracota con hundimientos, pendiente remates y sin emboquillar.	6/10/2024
31	Espacio Público	K3+230 sardinel desportillado, mal alineado y sin boquilla.	28/09/2024
32	Espacio Público	K3+248 bordillo con hundimiento junto a loseta.	28/09/2024
33	Señalización	En K3+290 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	2/10/2024
34	Accesos Vehiculares	En K3+290 rampa de acceso vehicular presenta bordillos con grietas.	28/09/2024
35	Espacio Público	K3+300 al K3+ 338 losetas sin emboquillar.	28/09/2024
36	Espacio Público	K3+300 al K3+ 338 losetas sin emboquillar.	28/09/2024
37	Espacio Público	K3+330 al K3+337 bordillos desportillado y con hundimiento.	28/09/2024
38	Espacio Público	K3+338 adoquín sin emboquillar.	28/09/2024
39	Señalización	En K3+360 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	31/10/2024
40	Accesos Vehiculares	En K3+360 rampa de acceso vehicular presenta bordillos agrietados.	31/10/2024
41	Señalización	Pompeyano de calle 95 presenta deterioro general la señalización horizontal.	31/10/2024
42	Bocacalle	Pompeyano de calle 95 presenta bordillos agrietados.	31/10/2024
43	Bocacalle	K3+390 sardinel A-10 desportillado y con hundimientos	30/09/2024
44	Espacio Público	K3+403 al K3+405 adoquín con hundimientos sin emboquillar.	1/10/2024
45	Accesos Vehiculares	En K3+460 rampa de acceso vehicular presenta bordillos agrietados.	2/10/2024
46	Accesos Vehiculares	En K3+483 rampa de acceso vehicular presenta bordillos agrietados.	2/10/2024
47	Accesos Vehiculares	En K3+524 rampa de acceso vehicular presenta bordillos agrietados.	2/10/2024
48	Espacio Público	K3+551 loseta sin emboquillar.	2/10/2024
49	Bocacalle	K3+560 sardinel A-10 desportillado.	2/10/2024
50	Espacio Público	K3+560 adoquín sin emboquillar.	2/10/2024
51	Espacio Público	Separador calle 95 adoquín sin emboquillar.	2/10/2024
52	Espacio Público	Separador calle 94 adoquín sin emboquillar.	2/10/2024
53	Bocacalle	Separador calle 94 sardinel desportillado.	2/10/2024
54	Espacio Público	K3+583 al K3++590 pisos prefabricados con hundimientos y falta de emboquillado.	3/10/2024
55	Espacio Público	K3+583 al K3++590 pisos prefabricados con hundimientos y falta de emboquillado.	3/10/2024
56	Espacio Público	K3+593 al K3+663 losetas y bordillos con hundimientos, tropezones y falta de emboquillado.	3/10/2024

57	Espacio Público	K3+593 al K3+663 losetas y bordillos con hundimientos, tropezones y falta de emboquillado.	3/10/2024
58	Espacio Público	K3+593 al K3+663 losetas y bordillos con hundimientos, tropezones y falta de emboquillado.	3/10/2024
59	Espacio Público	K3+593 al K3+663 losetas y bordillos con hundimientos, tropezones y falta de emboquillado.	3/10/2024
60	Accesos Vehiculares	En K3+677 rampa de acceso vehicular presenta bordillos agrietados y desportillados.	3/10/2024
61	Espacio Público	K3+685 concreto de ajuste de pozo presenta fisuras múltiples.	30/09/2024
62	Espacio Público	K3+685 al K3+720 losetas con hundimientos, tropezones y falta de emboquillado.	6/10/2024
63	Espacio Público	K3+722 adoquín sin emboquillar.	30/09/2024
64	Espacio Público	K3+730 al K3+735 adoquín sin emboquillar	30/09/2024
65	Señalización	Pompeyano de calle 92 presenta deterioro general la señalización horizontal.	31/10/2024
66	Espacio Público	K3+740 adoquín sin emboquillar en zona de cicloruta	30/09/2024
67	Espacio Público	K3+740 loseta alerta sin emboquillar	30/09/2024
68	Cicloruta	Concreto deteriorado en box coulvert bajo ciclopuente del K3+760 al K3+765.	31/10/2024
Tramo Funcional No. 5 ubicado entre calle 87 y 92			
69	Espacio Público	K3+930 al K3+953 adoquín sin emboquillar y falta cinta de ajuste.	10/10/2024
70	Espacio Público	K3+930 al K3+953 adoquín sin emboquillar y falta concreto de ajuste.	10/10/2024
71	Espacio Público	K3+930 al K3+953 adoquín sin emboquillar y falta cinta de ajuste.	10/10/2024
72	Espacio Público	K3+993 loseta alerta presenta hundimientos	3/10/2024
73	Señalización	K3+970 al K4+050 señalización general de cicloruta presenta deterioro.	31/10/2024
74	Cicloruta	K4+000 al K4+025 junta abierta entre asfalto de cicloruta y bordillo.	13/10/2024
75	Cicloruta	K4+032 asfalto presenta grietas.	13/10/2024
76	Cicloruta	K4+045 al K4+055 concreto de cicloruta con tropezones y junta contra bordillos muy abierta.	17/10/2024
77	Espacio Público	K4+055 al K4+070 adoquín con hundimientos, tropezones y mal alineado.	3/10/2024
78	Espacio Público	K4+055 al K4+070 adoquín con hundimientos, tropezones y mal alineado.	31/10/2024
79	Señalización	Pompeyano de calle 90 presenta deterioro general la señalización horizontal.	31/10/2024
80	Bocacalle	Pompeyano de calle 90 presenta bordillos con grietas.	31/10/2024
81	Bocacalle	Calle 90 pendiente correctivos de asfalto de reposición en bocacalle. Mal instalado con mal aspecto físico los parches.	13/10/2024
82	Espacio Público	K4+080 al K4+085 adoquín sin emboquillar.	6/10/2024
83	Espacio Público	K4+070 hacia calle 90 adoquín con hundimientos y tropezones.	6/10/2024
84	Espacio Público	K4+086 al K4+115 juntas abiertas en pisos y falta de emboquillado.	3/10/2024
85	Espacio Público	K4+086 al K4+115 juntas abiertas en pisos y falta de emboquillado.	31/10/2024
86	Espacio Público	K4+086 al K4+120 costao oriental de plazoleta el virrey adoquín con hundimientos y tropezones.	3/10/2024
87	Espacio Público	K4+086 al K4+120 costao oriental de plazoleta el virrey adoquín con hundimientos y tropezones.	31/102024
88	Espacio Público	K4+130 al K4+160 costao oriental de plazoleta el virrey adoquín con hundimientos, tropezones y falta emboquillar.	3/10/2024
89	Señalización	K4+160 al K4+178 señalización horizontal de rampas de accesos vehiculares presentan deterioro.	1/10/2024
90	Accesos Vehiculares	K4+160 al K4+178 rampas de accesos vehiculares presentan bordillos deteriorados y agrietados.	10/10/2024
91	Espacio Público	K4+150 costado occidental plazoleta el virrey, adoquín con hundimientos, tropezones y falta de emboquillao.	10/10/2024

92	Accesos Vehiculares	K4+188 rampa de acceso vehicular sin demarcación horiontal.	30/09/2024
93	Accesos Vehiculares	K4+188 rampa de acceso vehicular bordillos agrietados.	31/10/2024
94	Espacio Público	K4+191 bordillos desportillados y juntas abiertas junto a cargue de pozo.	10/10/2024
95	Señalización	Rampa de acceso a vía pacificada presenta deterioro su señalización horizontal.	31/10/2024
96	Espacio Público	K4+205 materiales prefabricados en rampa sin recibir por grietas, hundimientos, tropezones.	10/10/2024
97	Espacio Público	K4+318 adoquín sin rematar	3/10/2024
98	Espacio Público	K4+332 aoquín sin rematar y falta emboquillado	10/10/2024
99	Espacio Público	K4+340 hacia calle 87 loseta alerta con hundimientos y tropezones contra bordillo.	3/10/2024
Tramo Funcional No. 6 ubicado entre calle 80 y 87			
100	Señalización	Pompeyano de calle 87 presenta deterioro general la señalización horizontal.	31/10/2024
101	Bocacalle	K4+340 sardinel junto a pompeyano presenta desportillamientos.	10/10/2024
102	Bocacalle	Pompeyano de calle 87 presenta bordillos agrietados.	31/10/2024
103	Espacio Público	K4+355 al K4+363 material prefabricado mal alineado, con hundimientos y falta emboquillado.	13/10/2024
104	Espacio Público	K4+363 loseta alerta con tropezones.	13/10/2024
105	Espacio Público	K4+363 al K4+373 losetas sin emboquillar.	13/10/2024
106	Espacio Público	K4+373 al K4+400 losetas sin emboquillar.	13/10/2024
107	Espacio Público	K4+375 al K4+382 bordillos A-80 desportillados.	13/10/2024
108	Espacio Público	K4+380 al K4+395 pendiente remate de asfalto contra sardinel en borde de vía.	13/10/2024
109	Espacio Público	K4+394 al K4+400 bordillos desportillados.	13/10/2024
110	Espacio Público	K4+394 al K4+400 bordillos desportillados.	13/10/2024
111	Señalización	En K4+395 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	30/09/2024
112	Señalización	En K4+405 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	31/10/2024
113	Espacio Público	K4+397 al K4+402 pendiente remate de asfalto contra sardinel en borde de vía.	13/10/2024
114	Espacio Público	K4+406 al K4+433 pendiente emboquillado de losetas.	13/10/2024
115	Espacio Público	K4+433 junta abierta entre loseta alerta y bordillos.	13/10/2024
116	Señalización	En K4+435 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	30/09/2024
117	Espacio Público	K4+443 junta abierta entre bordillos y losetas alertas.	13/10/2024
118	Espacio Público	K4+438 al K4+443 pendiente remate de asfalto contra sardinel en borde de vía.	13/10/2024
119	Señalización	En K4+445 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	30/09/2024
120	Espacio Público	K4+447 franja de ajuste con tropezón en zona de matera.	17/10/2024
121	Señalización	En K4+463 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	31/10/2024
122	Espacio Público	K4+474 bordillo deconfinado, junta abierta y sin emboquillar loseta.	13/10/2024
123	Espacio Público	K4+470 al K4+480 pendiente emboquillar losetas.	13/10/2024
124	Espacio Público	K4+480 sin emboquillar bordillo y canal.	13/10/2024
125	Espacio Público	K4+480 al K4+490 juntas abiertas entre loseta y canal.	13/10/2024
126	Espacio Público	K4+490 concreto mal estampado, desalineado con tropezones y hundimientos. Junta abierta contra losetas.	31/10/2024

127	Señalización	En K4+492 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	1/10/2024
128	Señalización	En K4+500 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	1/10/2024
129	Señalización	En K4+510 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	30/09/2024
130	Espacio Público	K4+515 loseta alerta con tropezones.	17/10/2024
131	Espacio Público	K4+537 al K4+539 adoquines sin emboquillar.	17/10/2024
132	Espacio Público	K4+530 loseta alerta sin rematar.	17/10/2024
133	Señalización	En K4+552 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	1/10/2024
134	Espacio Público	K4+556 al K4+569 losetas sin emboquillar.	17/10/2024
135	Señalización	En K4+575 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	1/10/2024
136	Accesos Vehiculares	En K4+575 rampa de acceso vehicular presenta bordillos agrietados	31/10/2024
137	Señalización	En K4+585 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	1/10/2024
138	Espacio Público	K4+592 al K4+600 losetas con juntas muy abiertas y sin emboquillar.	17/10/2024
139	Espacio Público	K4+600 bordillo agrietado.	31/10/2024
140	Espacio Público	K4+606 concreto de matera agrietado.	17/10/2024
141	Espacio Público	K4+613 bordillo con hundimientos y tropezones junto a matera.	17/10/2024
142	Espacio Público	K4+635 loseta con junta abierta y adoquines sin emboquillar.	17/10/2024
143	Bocacalle	K4+673 pendiente rematar concreto en borde de vía hombro del espacio público costado sur de calle 85.	17/10/2024
144	Espacio Público	K4+673 al K4+680 pendiente emboquillado de pisos prefabricados.	17/10/2024
145	Accesos Vehiculares	En K4+585 rampa de acceso vehicular presenta bordillos agrietados	17/10/2024
146	Señalización	En K4+720 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización ybordillos con grietas.	31/10/2024
147	Accesos Vehiculares	En K4+720 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización y bordillos con grietas.	31/10/2024
148	Señalización	En K4+735 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	31/10/2024
149	Espacio Público	K4+740 concreto fundido como bordillo, contra matera presenta deterioro.	17/10/2024
150	Espacio Público	K4+740 al K4+758 losetas pendiente su emboquillado.	17/10/2024
151	Espacio Público	K4+765 al K4+775 losetas pendiente su emboquillado.	17/10/2024
152	Espacio Público	K4+775 pendiente remate contra paramento por afectación de obra.	17/10/2024
153	Señalización	En K4+780 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	1/10/2024
154	Accesos Vehiculares	En K4+780 rampa de acceso vehicular presenta bordillos agrietados.	31/10/2024
155	Espacio Público	K4+800 al K4+880 losetas sin emboquillar.	17/10/2024
156	Espacio Público	K4+824 losetas con hundimiento y franja de ajuste de caja mal aspecto y agrietamientos.	17/10/2024
157	Espacio Público	K4+835 al K4+840 adoquines con tropezones y falta de emboquillado.	17/10/2024
158	Espacio Público	K4+850 al K4+870 adoquines con tropezones y falta de emboquillado.	17/10/2024
159	Espacio Público	K4+910 al K4+945 adoquines con hundimientos, tropezones y faltade emboquillado.	17/10/2024
160	Señalización	En K5+000 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	31/10/2024
161	Accesos Vehiculares	En K5+000 rampa de acceso vehicular presenta bordillos agrietados.	31/10/2024
162	Accesos Vehiculares	En K5+035 rampa de acceso vehicular presenta bordillos desportillados.	17/10/2024

163	Señalización	En K5+055 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	31/10/2024
164	Espacio Público	K5+065 losetas con fisuras y falta de emboquillado.	17/10/2024

El no cumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma de entrega de las No conformidades, obras en corrección o en remate, según lo acordado en el Numeral 4 servirán de soporte para el inicio inmediato por parte del Idu de las actuaciones administrativas tendientes a su cumplimiento así como también para el inicio del procedimiento para la declaratoria y cobro de las sanciones previstas en la Legislación Colombiana y en el contrato.

Con la firma de la presente acta se deja constancia de la finalización del plazo contractual únicamente y se incluye en ella el estado de las obras contratadas a esta fecha.

La terminación de los trabajos no releva al interventor ni al contratista de sus responsabilidades y obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos que lo integran, a las establecidas en las normas legales vigentes, y en especial las referidas a la calidad de los mismos y de sus materiales. Asi mismo el contratista e Interventor se comprometen a modificar y mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Esta Acta se debe suscribir junto con la interventoría a más tardar un (1) día después de la fecha de vencimiento del plazo de la ejecución.

Una vez suscrita la presente Acta, el Contratista debe actualizar las garantías del Contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

veinticuatro (Día en letras) 24 (Día en números) días del mes de septiembre (Mes en que se firma el acta) de 2024 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre)

Representante Legal del Contratista
JOSE MARIA PEREZ LASHERAS

(Firma)

(Nombre)

Representante Legal del Interventor
JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCÍA

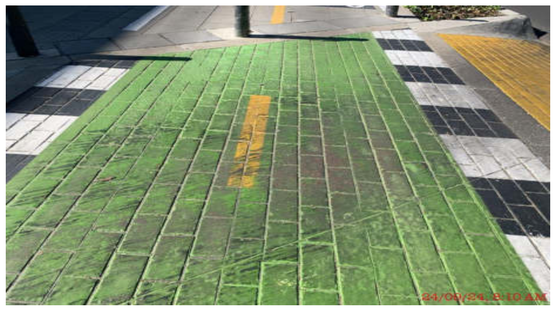
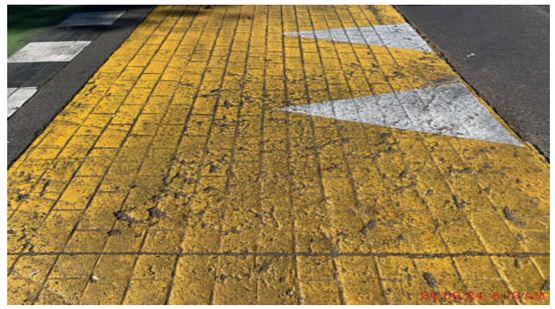
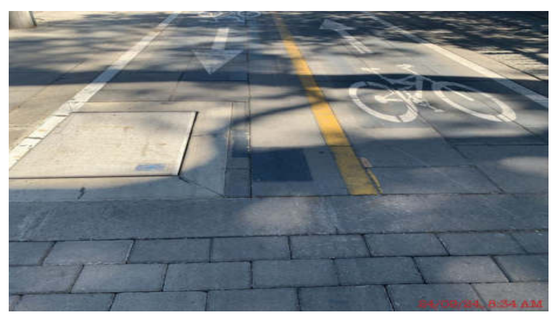
REGISTRO FOTOGRAFICO
PENDIENTES DE OBRA AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL
TRAMOS 1 - 2 - 3

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			FECHA	24	Septiembre	2024
LOCALIZACION	BOGOTA DC						
CONTRATISTA :	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	CONTRATO No:	1640 DE 2019				
INTERVENTORIA :	CONSORCIO CICLORUTAS	CONTRATO No:	1642 DE 2019				

HITO	ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO		
	TRAMO 1			
		1 Calle 128B - Remates de asfalto con fisuras y lleno de huecos por toma de Núcleos.	2 Fisuras en concretos de espacio público en esquina nor oriental de calle 128B.	3 Fisuras en concretos de espacio público en esquina nor oriental de calle 128B.
	TRAMO 1			
		4 Tapa de pozo pluvial deteriorada en costado oriental en calle 128B	5 Mal etado del asfalto en reposición por canalización en calle 128B.	6 K0+000 - Sardinel A-10 mal rematado en costado sur oriental de calle 128B - esquina concesionarios.
	TRAMO 1			
		7 K0+000 - Fisura en hombro de rampa.	8 K0+003 - loseta toperol alerta presenta fisura.	9 Del K0+010 al K0+030 - Pendiente sellos de juntas de concreto ocre en cicloruta.
	TRAMO 1			
		10 K0+150 a K0+151 - Pendiente emboquillado de losetas y presencia de fisura.	11 Del K0+180 al K0+193 - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas.	12 K0+195 - En rampa de acceso vehicular la loseta toperol no presenta estampado por desgaste prematuro.

REGISTRO FOTOGRAFICO
PENDIENTES DE OBRA AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL
TRAMOS 1 - 2 - 3

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			FECHA	24	Septiembre	2024
LOCALIZACION	BOGOTA DC						
CONTRATISTA :	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	CONTRATO No:	1640 DE 2019				
INTERVENTORIA :	CONSORCIO CICLORUTAS	CONTRATO No:	1642 DE 2019				

TRAMO 1			
	13 K0+195 - Pintura de cicloruta deteriorada y levantada.	**14** K0+228 - Concreto de rampa occidental de pompeyano presenta desgaste y deterioro considetrado en calle 127D.	**15** En calle 127D cargue de pozo presenta deterioro.
TRAMO 1			
	16 En calle 127D el concreto del pompeyano no presenta texturizado en cruce peatonal.	**17** En calle 127D rampa occidental de pompeyano presenta deterioro y mal remate contra el asfalto.	**18** En K0+266 el concreto de las cintas de ajuste de cajas presenta fisuras.
TRAMO 1			
	19 K0+244 - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas.	**20** K0+550 - Hundimiento de losetas en cicloruta.	**21** K0+332 - Tropezón entre asfalto y cámara de ETB.
TRAMO 1			
	22 Del K0+340 al K0+350 - Tropezón entre bordillo y concreto de cicloruta.	**23** En K0+375 Falta emboquillado en loseta alerta costado occidental, y deterioro de sardinel en borde de vía.	**24** En K0+375 falta emboquillado de adoquín y demarcación de cicloruta.

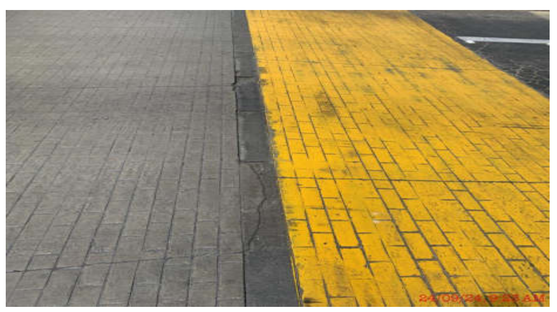
REGISTRO FOTOGRAFICO
PENDIENTES DE OBRA AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL
TRAMOS 1 - 2 - 3

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			FECHA	24	Septiembre	2024
LOCALIZACION	BOGOTA DC						
CONTRATISTA :	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	CONTRATO No:	1640 DE 2019				
INTERVENTORIA :	CONSORCIO CICLORUTAS	CONTRATO No:	1642 DE 2019				

TRAMO 1			
	25 En calle 127B bis - Fisura en concreto de pompeyano y deterioro de tapa y cargue de pozo sanitario.	26 En rampa occidental de pompeyano calle 127B bis, pintura deteriorada y mal ejecutado corte y remate contra asfalto	27 En calle 128B bis, costado oriental, deterioro en cargue de pozo pluvial y en corte de rampa de pompeyano contra asfalto.
TRAMO 1			
	28 En calle 127B bis el concreto del pompeyano no presenta texturizado en cruce peatonal.	29 En K0+403 bordillo deteriorado en costado oriental de cicloruta.	30 En K0+467 se presenta tropezón entre loseta toperol y tapete podotáctil instalado.
TRAMO 1			
	31 Del K0+495 al K0+505 - Pendiente demarcación en cicloruta y corregir demarcación por cambio de losetas.	32 En K0+510 la emarcación en el paradero presenta deterioro.	33 Del K0+518 al K0+528 - Pendiente demarcación en cicloruta y corregir demarcación por cambio de losetas.
TRAMO 1			
	34 En K0+538 se presenta tropezón en bordillo transversal.	35 Del K0+545 al K0+570 falta remate de acabado de Baranda borde de cicloruta.	36 En K0+680 l sardinel A-10 se ha deteriorado.

REGISTRO FOTOGRAFICO
PENDIENTES DE OBRA AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL
TRAMOS 1 - 2 - 3

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			FECHA	24	Septiembre	2024
LOCALIZACION	BOGOTA DC						
CONTRATISTA :	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	CONTRATO No:	1640 DE 2019				
INTERVENTORIA :	CONSORCIO CICLORUTAS	CONTRATO No:	1642 DE 2019				

TRAMO 1			
	37 En K0+680 sardinel A-10 presenta tropezón con sumidero en costado nor oriental - límite.		
TRAMO 2			
	38 Bordillo deteriorado en conectante sur occidente de autonorte con calle 127.	39 Pendiente reposición de newjersey en conectante sur occidente de autonorte con autopista en lado sur.	40 K0+722 al K0+752 - tropezón entre asfalto y bordilloen cicloruta.
TRAMO 2			
	41 K0+722 al K0+752 - Pendiente demarcación de cicloruta	42 K0+778 - Adoquín con tropezón contra caja mal rematado.	43 Del K0+800 al K0+880 pendiente retiro de tocones y postes sobrantes.
TRAMO 2			
	44 K0+845 - pompeyano de conectante occidente norte de calle 127 con autonorte señalización horizontal deteriorada.	45 K0+845 - pompeyano de conectante occidente norte de calle 127 con autonorte bordillo agrietado costado occidental.	46 K0+845 - pompeyano de conectante occidente norte de calle 127 con autonorte bordillo agrietado costado riental.

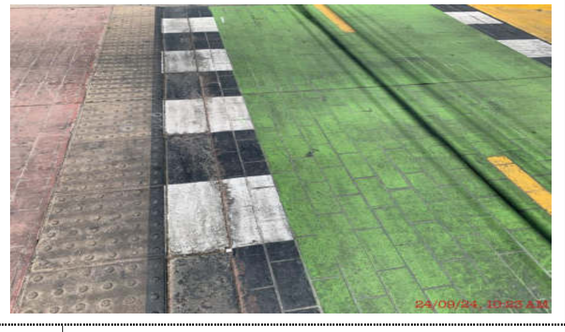
REGISTRO FOTOGRAFICO
PENDIENTES DE OBRA AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL
TRAMOS 1 - 2 - 3

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			FECHA	24	Septiembre	2024
LOCALIZACION	BOGOTA DC						
CONTRATISTA :	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	CONTRATO No:	1640 DE 2019				
INTERVENTORIA :	CONSORCIO CICLORUTAS	CONTRATO No:	1642 DE 2019				

TRAMO 2			
	47 K0+845 - pompeyano de conectante occidente norte de calle 127 con autonorte mal estampado el concreto.	**48** En K0+880 en pompeyano de conectante sur oriente de autonorte con calle 127, señalización horizontal deteriorada.	**49** En K0+880 en pompeyano de conectante sur oriente de autonorte con calle 127, mal emboquillado de bordillos.
TRAMO 2			
	50 En K0+895 las cintas de ajuste de caja está fisurada.	**51** En K0+908 las bancas están desportilladas y agrietadas.	**52** En K0+908 las bancas están desportilladas y agrietadas.
TRAMO 2			
	53 En K0+910 pendiente reposición de baranda en inicio de rampa peatonal de transmilenio.	**54** Del K0+895 al K0+916 adoquín de arcilla presenta desgaste prematuro.	**55** En pompeyano de calle 125, bordillos con fisuras en rampa occidental.
TRAMO 2			
	56 En pompeyano de calle 125 tapa y cargue de pozo presentan deterior.	**57** En pompeyano de calle 125 tseñalización horizontal en general está deteriorada.	**58** En K0+927 el concreto de ajuste de las cajas presentan múltiples fisuras con mal aspecto físico.

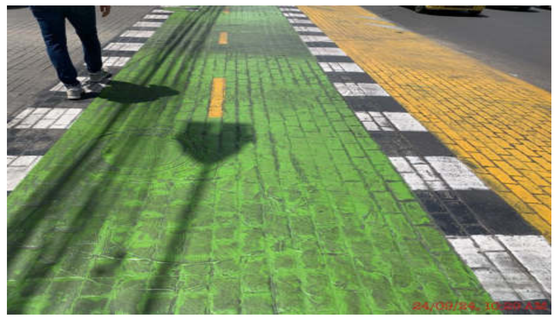
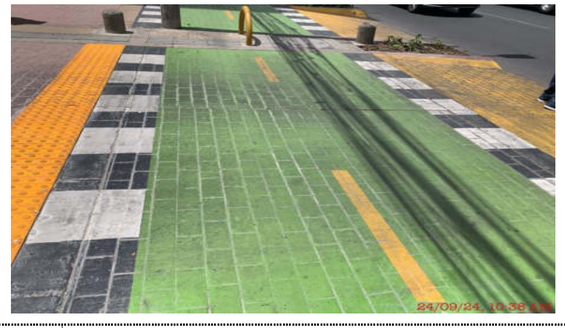
REGISTRO FOTOGRAFICO
PENDIENTES DE OBRA AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL
TRAMOS 1 - 2 - 3

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			FECHA	24	Septiembre	2024
LOCALIZACION	BOGOTA DC						
CONTRATISTA :	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	CONTRATO No:	1640 DE 2019				
INTERVENTORIA :	CONSORCIO CICLORUTAS	CONTRATO No:	1642 DE 2019				

TRAMO 2					
	59	Del K0+934 al K0+944 - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas.	60	Del K0+977 al K0+990 - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas.	61	Del K0+997 al K1+000 - Pendiente corregir demarcación en cicloruta con solo imprimante actualmente.
TRAMO 2					
	62	En K1+005 mal remate de loseta contra franja de ajuste de caja.	63	En rampa de acceso vehicular en K1+030 la señalización horizontal general presenta deterioro.	64	Del K1+033 al K1+043 falta emboquillado de adoquín y corregir juntas muy abiertas.
TRAMO 2					
	65	En K1+054 bancas desportilladas y fisuradas.	66	Del K1+064 al K1+082 mezcla asfáltica de cicloruta está abierta y presenta tropezones con bordillos.	67	En K1+078 bordillo deteriorado.
TRAMO 2					
	68	En acceso vehicular predio 122-56 la señalización horizontal presenta deterioro.	69	En K1+167 bordillo deteriorado y mal rematado en cicloruta.	70	En K1+167 Señalización horizontal con deterioro.

REGISTRO FOTOGRAFICO
PENDIENTES DE OBRA AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL
TRAMOS 1 - 2 - 3

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			FECHA	24	Septiembre	2024
LOCALIZACION	BOGOTA DC						
CONTRATISTA :	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	CONTRATO No:	1640 DE 2019				
INTERVENTORIA :	CONSORCIO CICLORUTAS	CONTRATO No:	1642 DE 2019				

TRAMO 2			
	71 En K1+185 losetas sin emboquillar.	72 En K1+210 pendiente terminar señalización de cicloruta	73 En K1+214 concreto de pompeyano calle 122 agrietado en rampa nor oriental.
TRAMO 2			
	74 En pompeyano de calle 122 la señalización horizontal presenta deterioro general.	75 En K1+235 las franjas de ajustes de cajas y pozo presentan múltiples fisuras con mal aspecto.	76 En K1+235 costado occidental losetas sin emboquillar.
TRAMO 2			
	77 Del K1+240 al K1+250 - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar	78 Del K1+240 al K1+280 pendiente remate de asfalto contra sardinel en borde de vía.	79 en K1+246 franja de ajuste presenta tropezón contra predio y afectación de acabado.
TRAMO 2			
	80 Rampa de acceso a predio en K1+270 presenta deterioro general la señalizción horizontal.	81 En K1+273 pendiente remate por afectación de predio privado por obras.	82 Rampa de acceso a predio en K1+293 presenta deterioro general la señalizción horizontal.

REGISTRO FOTOGRAFICO
PENDIENTES DE OBRA AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL
TRAMOS 1 - 2 - 3

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			FECHA	24	Septiembre	2024
LOCALIZACION	BOGOTA DC						
CONTRATISTA :	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	CONTRATO No:	1640 DE 2019				
INTERVENTORIA :	CONSORCIO CICLORUTAS	CONTRATO No:	1642 DE 2019				

TRAMO 2			
	83 Remate de rampa con predio 118-82 corregir tropezon y rematar.	**84** Corregir remate de rampa contra asfalto en predio 118-74	**85** En K1+320 concreto agrietado contra caja ENEL.
TRAMO 2			
	86 Del K1+320 al K1+340 pendiente remate de asfalto contra sardinel en bord de vía.	**87** K1+350 - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar	**88** Del K1+351 al K1+364 señalización horizontal con deterioro general.
TRAMO 2			
	89 En K1+376 correjir juntas separadas y emboquillado de loseta.	**90** En K1+392 pendiente señalización de cicloruta.	**91** K1+420 señalización horizontal con deterioro en acceso vehicular en general.
			
	92 En K1+450 tropezón en tapete podotáctil y falta de emboquillado de adoquín.	**93** En K1+455 bordillo deteriorado al norte de paradero.	**94** Del K1+466 al K1+480 - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar

REGISTRO FOTOGRAFICO
PENDIENTES DE OBRA AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL
TRAMOS 1 - 2 - 3

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			FECHA	24	Septiembre	2024
LOCALIZACION	BOGOTA DC						
CONTRATISTA :	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	CONTRATO No:	1640 DE 2019				
INTERVENTORIA :	CONSORCIO CICLORUTAS	CONTRATO No:	1642 DE 2019				

TRAMO 2					
	95 Del K1+469 al K1+480 corregir emboquillado de loseta.	96 En K1+494 bordillo deteriorado en cicloruta.	97 En k1+496 señalización horizontal de rampa en general deteriorada.		
TRAMO 2					
	98 En K1+505 falta señalización en asfalto de cicloruta.	99 Del K1+505 al K1+520 las juntas de las losetas están muy abiertas y les falta emboquillado.	100 En K1+520 en acceso vehicular señalización general presenta deterioro.		
TRAMO 2					
	101 En K1+520 en acceso vehicular bordillos agrietados.	102 En K1+520 en acceso vehicular pendiente reposición por afectación en predio privado.	103 En K1+550 - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar		
TRAMO 2					
	104 En K1+554 falta remate de bordillo deteriorado.	105 Del K1+554 al K1+560 falta emboquillado de adoquín hacia paramento.	106 En K1+560 - Pendiente reposición de muro por afectación por obra.		

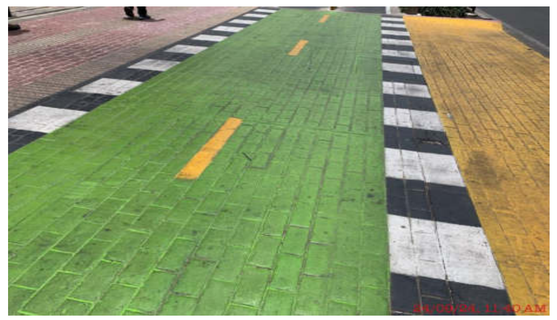
REGISTRO FOTOGRAFICO
PENDIENTES DE OBRA AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL
TRAMOS 1 - 2 - 3

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			FECHA	24	Septiembre	2024
LOCALIZACION	BOGOTA DC						
CONTRATISTA :	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	CONTRATO No:	1640 DE 2019				
INTERVENTORIA :	CONSORCIO CICLORUTAS	CONTRATO No:	1642 DE 2019				

TRAMO 2			
	107 Calle 116 conectante norte la señalización general presenta deterioro.	**108** En K1+561 pendiente de ampliación de texturizado en cruce peatonal.	**109** Tapa de pozo sanitario deteriorada en calle 116 conectante norte.
TRAMO 2			
	110 Bordillo occidental agrietado en pompeyano de calle 116 conectante norte.	**111** Pendiente señalización de cicloruta bajo puente de calle 116.	**112** Del K1+570 al K1+590 pendiente remate de asfalto contra sardinel A-10 en borde de vía.
TRAMO 2			
	113 Del K1+570 al K1+590 hundimiento en adoquines instalados y materiales prefabricados.	**114** En pompeyano de calle 116 conectante sur la señalización presenta deterioro general.	**115** Andén sur oriental de calle 116 hacia oriente, adoquín desalineado.
TRAMO 2			
	116 Del K1+605 al K1+615 pendiente corregir señalización en cicloruta por cambio de losetas.	**117** Del K1+625 al K1+655 la señalización de la cicloruta está deteriorada y se ha borrado.	**118** En K1+646 hay hundimiento de asfalto contra cámara.

REGISTRO FOTOGRAFICO
PENDIENTES DE OBRA AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL
TRAMOS 1 - 2 - 3

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			FECHA	24	Septiembre	2024
LOCALIZACION	BOGOTA DC						
CONTRATISTA :	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	CONTRATO No:	1640 DE 2019				
INTERVENTORIA :	CONSORCIO CICLORUTAS	CONTRATO No:	1642 DE 2019				

TRAMO 2			
	119 En rampa de acceso vehicular en K1+660 la señalización horizontal general presenta deterioro.	**120** Del K1+600 al K1+780 pendiente remate de acabado de pintura de baranda reinstalada.	**121** K1+670 al K1+690 pendiente emboquillado de prefabricados.
TRAMO 2			
	122 En K1+700 pendiente instalación de loseta.	**123** K1+715 pendiente remate de cinta de ajuste en concreto.	**124** Rampa de acceso vehicular a Parqueaderos Tequendama presenta deterioro general su señalización horizontal.
TRAMO 2			
	125 Rampa de acceso vehicular a Parqueaderos Tequendama presenta deterioro en bordillos.	**126** Rampa de acceso vehicular a Parqueaderos Tequendama presenta deterioro general el concreto estampado.	**127** En K1+750 pendiente remata de rampa de acceso vehicular hacia paramento de predio 114-20.
TRAMO 2			
	128 Del K1+770 al K1+777 - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar	**129** Pompeyano de calle 114 la señalización horizontal presenta deterioro general.	**130** Pompeyano de calle 114 lpresenta bordillos agrietados.

REGISTRO FOTOGRAFICO
PENDIENTES DE OBRA AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL
TRAMOS 1 - 2 - 3

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			FECHA	24	Septiembre	2024
LOCALIZACION	BOGOTA DC						
CONTRATISTA :	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	CONTRATO No:	1640 DE 2019				
INTERVENTORIA :	CONSORCIO CICLORUTAS	CONTRATO No:	1642 DE 2019				

TRAMO 2			
	131 cargue de pozos deteriorados.lpresenta bordillos agrietados.	132 Enespacio público del costado sur de la calle 114 pendiente terminar de corregir acabados por afectación de la obra.	
TRAMO 3			
	133 En K1+865 pendiente completar la señalización horizontal en caja.	134 En K1+885 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general la señalización horizontal.	135 En K1+885 rampa de acceso vehicular presentan deterioro los bordillos.l.
TRAMO 3			
	136 Del K1+902 al K1+912 - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar	137 En K1+908 3 bancas desportilladas y fisuradas.	138 K1+918 pendiente rematar franja de ajuste de cajas - fisuras.
TRAMO 3			
	139 Pompeyano de calle 109 presenta deterioro general su señalización horizontal.	140 Pompeyano de calle 109 presenta deterioro general sus bordillos incluyendo grietas.	141 Del K1+940 al K1+950 - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar

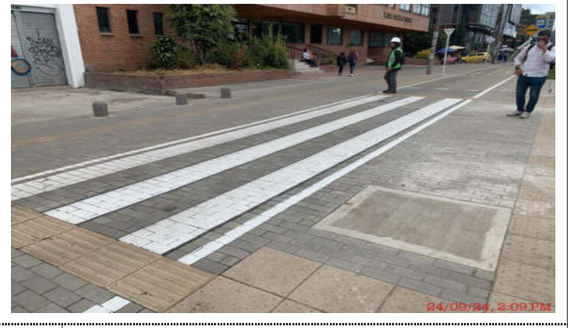
REGISTRO FOTOGRAFICO
PENDIENTES DE OBRA AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL
TRAMOS 1 - 2 - 3

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			FECHA	24	Septiembre	2024
LOCALIZACION	BOGOTA DC						
CONTRATISTA :	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	CONTRATO No:	1640 DE 2019				
INTERVENTORIA :	CONSORCIO CICLORUTAS	CONTRATO No:	1642 DE 2019				

TRAMO 3			
	142 Del K1+940 al K1+990 pendiente reposición de enchape de muro afectado por obra.	**143** En K2+010 acabados con juntas muy abiertas, sin emboquillado y presentan hundimientos.	**144** K2+020 al K2+030 acabados con hundimientos y falta de emboquillado.
TRAMO 3			
	145 En K2+033 pendiente demarcación de cicloruta.	**146** Del K2+040 al K2+050. - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar	**147** K2+050 loseta toperol debe ser de 40x40 no de 20x30.
TRAMO 3			
	148 En K2+058. - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar	**149** Del K2+080 al K2+088 asfalto de cicloruta presenta hundimiento contra pozo.	**150** En K2+090 la rampa de acceso vehicular debe ser reprocesada por mal estampado su concreto.
TRAMO 3			
	151 En K2+098. - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar	**152** En K2+105. - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar	**153** K2+100 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general au señaización horizontal.

REGISTRO FOTOGRAFICO
PENDIENTES DE OBRA AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL
TRAMOS 1 - 2 - 3

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			FECHA	24	Septiembre	2024
LOCALIZACION	BOGOTA DC						
CONTRATISTA :	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	CONTRATO No:	1640 DE 2019				
INTERVENTORIA :	CONSORCIO CICLORUTAS	CONTRATO No:	1642 DE 2019				

TRAMO 3		154	K2+110 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general au señaización horizontal.		155	En K2+116 pendiente señalización de cicloruta.		156	K2+120 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general au señaización horizontal.
TRAMO 3		157	K2+140 pendiente rematar bordillo de cicloruta.		158	Del K2+165 al K2+175. - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar		159	Del K2+182 al K2+192. - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar
TRAMO 3		160	Del K2+182 al K2+192. - hundimientos en prefabricados de paradero y falta de emboquillado.		161	K2+195. - corregir demarcación por modificaciones.		162	Del K2+216 al K2+222. - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar
TRAMO 3		163	Pompeyano de calle 106 presenta deterioro general su señalización.		164	Del K2+243 al K2+250 hundimiento de adoquín contra caja en andén sur de calle 106.		165	Del K2+250 al K2+310 pendiente remate de acabados de baranda reinstalada.

REGISTRO FOTOGRAFICO
PENDIENTES DE OBRA AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL
TRAMOS 1 - 2 - 3

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			FECHA	24	Septiembre	2024
LOCALIZACION	BOGOTA DC						
CONTRATISTA :	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	CONTRATO No:	1640 DE 2019				
INTERVENTORIA :	CONSORCIO CICLORUTAS	CONTRATO No:	1642 DE 2019				

TRAMO 3			
	166 Pompeyano de calle 105 presenta deterioro general su señalización horizontal.	**167** K2+326. - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar	**168** En K2+360 pendiente emboquillado de bordillo deterirado.
TRAMO 3			
	169 En K2+364 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	**170** Del K2+383 al K2+393 pendiente emboquillado de losetas.	**171** Del K2+383 deterioro de señalización en rampa de acceso vehicular
TRAMO 3			
	172 Del K2+397 al K2+405 asfalto está abierto y deteriorado en cicloruta.	**173** K2+420 al K2+425 pendiente emate de asfalto contra sardinel A-10 en borde de vía.	**174** K2+420 al K2+428 pendiente emboquillado de loseta.
TRAMO 3			
	175 Rampas de acceso vehicular a estació Petrobras presentna deterioro general su señalización.	**176** K2+438 al K2+446 presencia en loseta de tropezones, hundimientos, juntas abiertas y falta de emboquillado.	**177** Del K2+455 al K2+460 se debe reprocesar concreto mal estampado.

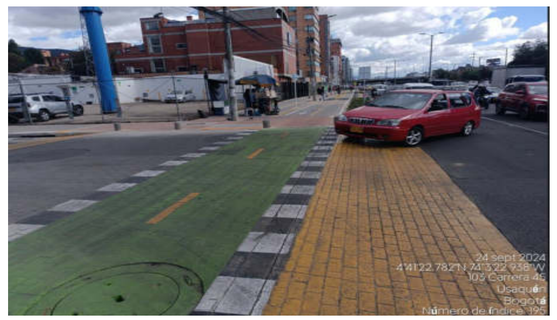
REGISTRO FOTOGRAFICO
PENDIENTES DE OBRA AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL
TRAMOS 1 - 2 - 3

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			FECHA	24	Septiembre	2024
LOCALIZACION	BOGOTA DC						
CONTRATISTA :	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	CONTRATO No:	1640 DE 2019				
INTERVENTORIA :	CONSORCIO CICLORUTAS	CONTRATO No:	1642 DE 2019				

TRAMO 3			
	178 En K2+465 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	**179** K2+476 al K2+486 - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar	**180** Pompeyano de calle 104 presenta deterioro general su señalización.
TRAMO 3			
	181 Pompeyano de calle 104 presenta bordillos agrietados	**182** Pompeyano de calle 104 cargue de pozo deteriorado.	**183** K2+520 - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar
TRAMO 3			
	184 K2+520 al K2+550 peniente emboquillado de loseta.	**185** K2+567 mala instalación de tapete podotactil - mal corte.	**186** En K2+590 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.
TRAMO 3			
	187 En K2+615 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	**188** K2+620 al K2+625 - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar	**189** K2+640 al K2+645 - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar

REGISTRO FOTOGRAFICO
PENDIENTES DE OBRA AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL
TRAMOS 1 - 2 - 3

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			FECHA	24	Septiembre	2024
LOCALIZACION	BOGOTA DC						
CONTRATISTA :	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	CONTRATO No:	1640 DE 2019				
INTERVENTORIA :	CONSORCIO CICLORUTAS	CONTRATO No:	1642 DE 2019				

TRAMO 3			
	190 K2+640 al K2+645 - Losetas rotas y pendiete emboquillado.	**191** En K2+651 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	**192** K2+655 pendiente rematar sardinel A-10 contra hombrera de rampa.
TRAMO 3			
	193 K2+650 rematar asfalto contra sardinel A-10 en borde de vía.	**194** K2+674 - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar	**195** Pompeyano de calle 103 presenta deterioro general su señalización.
TRAMO 3			
	196 Pompeyano de calle 103 presenta bordillos agrietados	**197** Pompeyano de calle 103 cargue de pozo deteriorado.	**198** K2+700 al K2+710 - Pendiente corregir demarcación en cicloruta por cambio de losetas. Emboquillar
TRAMO 3			
	199 K2+715 - Loseta alerta presenta hundimiento	**200** K2+700 al K2+710 - Corregir demarcación en cicloruta.	**201** K2+778 - Pendiente demarcación de cicloruta y emboquillado de losetas.

REGISTRO FOTOGRAFICO
PENDIENTES DE OBRA AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL
TRAMOS 1 - 2 - 3

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			FECHA	24	Septiembre	2024
LOCALIZACION	BOGOTA DC						
CONTRATISTA :	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	CONTRATO No:	1640 DE 2019				
INTERVENTORIA :	CONSORCIO CICLORUTAS	CONTRATO No:	1642 DE 2019				

TRAMO 3		**202**	En K2+780 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.		**203**	En K2+780 rampa de acceso vehicular presenta deterioro y grietas en bordillos.		**204**	K2+825 pendiente demarcación de cicloruta y emboquillado de loseta.
TRAMO 3		**205**	K2+825 - Pendiente remate de acabado sitio de poste.		**206**	En K2+823 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.		**207**	En K2+830 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.
TRAMO 3		**208**	K2+840 - Hundimientos en losetas y tropezones en sardinel espacio público y cicloruta		**209**	K2+850 al K2+860 pendinte emboquillado de losetas.		**210**	En K2+885 al K2+890 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.
TRAMO 3		**211**	K2+880 al K2+895 rampa de acceso vehicular presenta deterioro y grietas en bordillos.		**212**	En K2+902 al K2+914 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.		**213**	K2+913 deterioro de concreto terracota de rampa de acceso vehicular.

REGISTRO FOTOGRAFICO
PENDIENTES DE OBRA AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL
TRAMOS 1 - 2 - 3

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			FECHA	24	Septiembre	2024
LOCALIZACION	BOGOTA DC						
CONTRATISTA :	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	CONTRATO No:	1640 DE 2019				
INTERVENTORIA :	CONSORCIO CICLORUTAS	CONTRATO No:	1642 DE 2019				

TRAMO 3



214	Pompeyanos de calle 100 costado norte, ambos pompeyanos presentan deterioro general su señalización.



215	K2+492 - andén nor oriental de calle 100 prefabricados presentan hundimientos.

REGISTRO FOTOGRAFICO
PENDIENTES DE OBRA AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL
TRAMOS 4 - 5 - 6.

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			FECHA	25	Septiembre	2024
LOCALIZACION	BOGOTA DC						
CONTRATISTA :	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	CONTRATO No:	1640 DE 2019				
INTERVENTORIA :	CONSORCIO CICLORUTAS	CONTRATO No:	1642 DE 2019				

HITO	ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO		
	TRAMO 4			
		1 Pompeyano sur de calle 100 conectante occidente a norte señalización horizontal presenta deterioro general.	2 Pompeyano sur de calle 100 conectante occidente a norte bordillos en general con grietas.	3 Pompeyano sur de calle 100 conectante occidente a norte rampa occidental mal cortada y mal rematada con asfalto y grietas.
	TRAMO 4			
		4 Separador sur de calle 100 entre concetantes, sardinel presenta desportillamientos.	5 Separador sur de calle 100 entre concetantes, sardineles con fisuras y sin sellar juntas.	6 Pompeyano sur de calle 100 conectante sue a oriente señalización horizontal presenta deterioro general.
	TRAMO 4			
		7 Pompeyano sur de calle 100 conectante sue a oriente rampa oriental cn cncreto deteriorado.	8 Pompeyano sur de calle 100 conectante sue a oriente rampa oriental asfalto mal rematado con grietas, cárcamo superficial fisura asfalro.	9 K3+063 cinta de ajuste en costdo oriental deteriorada.
	TRAMO 4			
		10 K3+063 al K3+112 costado occidental con hundimientos, tropezones y desalineado.	11 K3+063 al K3+112 costado occidental con hundimientos, tropezones y desalineado.	12 K3+063 al K3+112 costado occidental con hundimientos, tropezones y desalineado.

REGISTRO FOTOGRAFICO
PENDIENTES DE OBRA AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL
TRAMOS 4 - 5 - 6.

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			FECHA	25	Septiembre	2024
LOCALIZACION	BOGOTA DC						
CONTRATISTA :	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	CONTRATO No:	1640 DE 2019				
INTERVENTORIA :	CONSORCIO CICLORUTAS	CONTRATO No:	1642 DE 2019				

TRAMO 4			
	13 K3+072 costado oriental, adoquín con hundimientos y mal emboquillado.	**14** K3+083 costado oriental, adoquín con hundimientos y mal emboquillado.	**15** K3+092 al K3+117 pisos con hundimientos, tropezones y mal emboquillado.
TRAMO 4			
	16 K3+113 loseta alerta fisurada.	**17** K3+125 costado oriental, bordillos con desportillamientos u fisuras	**18** K3+120 costado occidental, adoquín sin emboquillar.
TRAMO 4			
	19 K3+120 al K3+145 costado occidental, adoquín con junta abierta y tropezones contra loseta alerta.	**20** K3+143 al K3+155 costado oriental, prefabricados con hundimientos y tropezones.	**21** K3+143 al K3+155 costado oriental, prefabricados con hundimientos y tropezones.
TRAMO 4			
	22 K3+155 al K3+170 costado occidental, adoquín sin emboquillar.	**23** K3+170 costado occidental, adoquín presenta tropezones	**24** K3+168 al K3+190 costado oriental, aoquín con hundimientos, tropezones y sin emboquillar.

REGISTRO FOTOGRAFICO
PENDIENTES DE OBRA AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL
TRAMOS 4 - 5 - 6.

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			FECHA	25	Septiembre	2024
LOCALIZACION	BOGOTA DC						
CONTRATISTA :	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	CONTRATO No:	1640 DE 2019				
INTERVENTORIA :	CONSORCIO CICLORUTAS	CONTRATO No:	1642 DE 2019				

TRAMO 4			
	25 K3+168 al K3+190 costado oriental, aoquín con hundimientos, tropezones y sin emboquillar.	**26** K3+200 costado oriental vía pacificada, concreto con tropezones.	**27** Pompeyano de calle 97 presenta deterioro general la señalización horizontal.
TRAMO 4			
	28 Vía paificada calle 100 costado sur, señalización horizontal presenta deterioro general.	**29** Pompeyano de calle 97 presenta bordillos con grietas.	**30** K3+220 al K3+228, adoquín terracota con hundimientos, pendiente remates y sin emboquillar.
TRAMO 4			
	31 K3+230 sardinel desportillado, mal alineado y sin boquilla.	**32** K3+248 bordillo con hundimiento junto a loseta.	**33** En K3+290 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señal
TRAMO 4			
	34 En K3+290 rampa de acceso vehicular presenta bordillos con grietas.	**35** K3+300 al K3+ 338 losetas sin emboquillar.	**36** K3+300 al K3+ 338 losetas sin emboquillar.

REGISTRO FOTOGRAFICO
PENDIENTES DE OBRA AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL
TRAMOS 4 - 5 - 6.

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			FECHA	25	Septiembre	2024
LOCALIZACION	BOGOTA DC						
CONTRATISTA :	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	CONTRATO No:	1640 DE 2019				
INTERVENTORIA :	CONSORCIO CICLORUTAS	CONTRATO No:	1642 DE 2019				

TRAMO 4		37	K3+330 al K3+337 bordillos desportilladso y con hundimiento.		38	K3+338 adoquín sin emboquillar.		39	En K3+360 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.
TRAMO 4		40	En K3+360 rampa de acceso vehicular presenta bordillos agrietados.		41	Pompeyano de calle 95 presenta deterioro general la señalización horizontal.		42	Pompeyano de calle 95 presenta bordillos agrietados.
TRAMO 4		43	K3+390 sardinel A-10 desportillado y con hundimientos		44	K3+403 al K3+405 adoquín con hundimientos sin emboquillar.		45	En K3+460 rampa de acceso vehicular presenta bordillos agrietados.
TRAMO 4		46	En K3+483 rampa de acceso vehicular presenta bordillos agrietados.		47	En K3+524 rampa de acceso vehicular presenta bordillos agrietados.		48	K3+551 loseta sin emboquillar.

REGISTRO FOTOGRAFICO
PENDIENTES DE OBRA AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL
TRAMOS 4 - 5 - 6.

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			FECHA	25	Septiembre	2024
LOCALIZACION	BOGOTA DC						
CONTRATISTA :	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	CONTRATO No:	1640 DE 2019				
INTERVENTORIA :	CONSORCIO CICLORUTAS	CONTRATO No:	1642 DE 2019				

TRAMO 4			
	49 K3+560 sardinel A-10 desportillado.	**50** K3+560 adoquín sin emboquillar.	**51** Separador calle 95 adoquín sin emboquillar.
TRAMO 4			
	52 Separador calle 94 adoquín sin emboquillar.	**53** Separador calle 94 sardinel desportillado.	**54** K3+583 al K3++590 pisos prefabricados con hundimientos y falta de emboquillado.
TRAMO 4			
	55 K3+583 al K3++590 pisos prefabricados con hundimientos y falta de emboquillado.	**56** K3+593 al K3+663 losetas y bordillos con hundimientos, tropezones y falta de emboquillado.	**57** K3+593 al K3+663 losetas y bordillos con hundimientos, tropezones y falta de emboquillado.
TRAMO 4			
	58 K3+593 al K3+663 losetas y bordillos con hundimientos, tropezones y falta de emboquillado.	**59** K3+593 al K3+663 losetas y bordillos con hundimientos, tropezones y falta de emboquillado.	**60** En K3+677 rampa de acceso vehicular presenta bordillos agrietados y desportillados.

REGISTRO FOTOGRAFICO
PENDIENTES DE OBRA AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL
TRAMOS 4 - 5 - 6.

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			FECHA	25	Septiembre	2024
LOCALIZACION	BOGOTA DC						
CONTRATISTA :	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	CONTRATO No:	1640 DE 2019				
INTERVENTORIA :	CONSORCIO CICLORUTAS	CONTRATO No:	1642 DE 2019				

TRAMO 4		61	K3+685 concreto de ajuste de pozo presenta fisuras múltiples.		62	K3+685 al K3+720 losetas con hundimientos, tropezones y falta de emboquillado.		63	K3+722 adoquín sin emboquillar.
TRAMO 4		64	K3+730 al K3+735 adoquín sin emboquillar		65	Pompeyano de calle 92 presenta deterioro general la señalización horizontal.		66	K3+740 adoquín sin emboquillar en zona de cicloruta
TRAMO 4		67	K3+740 loseta alerta sin emboquillar		68	Concreto deteriorado en box coulvert bajo ciclopuente del K3+760 al K3+765.			
TRAMO 5		69	K3+930 al K3+953 adoquín sin emboquillar y falta cinta de ajuste.		70	K3+930 al K3+953 adoquín sin emboquillar y falta concreto de ajuste.		71	K3+930 al K3+953 adoquín sin emboquillar y falta cinta de ajuste.

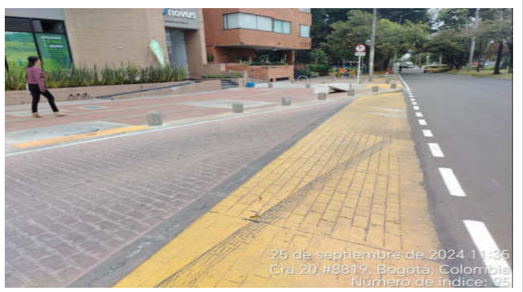
REGISTRO FOTOGRAFICO
PENDIENTES DE OBRA AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL
TRAMOS 4 - 5 - 6.

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			FECHA	25	Septiembre	2024
LOCALIZACION	BOGOTA DC						
CONTRATISTA :	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	CONTRATO No:	1640 DE 2019				
INTERVENTORIA :	CONSORCIO CICLORUTAS	CONTRATO No:	1642 DE 2019				

TRAMO 5		**72**	K3+993 loseta alerta presenta hundimientos		**73**	K3+970 al K4+050 señalización general de cicloruta presnta deterioro.		**74**	K4+000 al K4+025 junta abierta entre asfalto de cicloruta y bordillo.
TRAMO 5		**75**	K4+032 asfalto presenta grietas.		**76**	K4+045 al K4+055 concreto de cicloruta con tropezones y junta contra bordillos muy abierta.		**77**	K4+055 al K4+070 afoquín con hundimientos, tropezones y mal alineado.
TRAMO 5		**78**	K4+055 al K4+070 afoquín con hundimientos, tropezones y mal alineado.		**79**	Pompeyano de calle 90 presenta deterioro general la señalización horizontal.		**80**	Pompeyano de calle 90 presenta bordillos con grietas.
TRAMO 5		**81**	Calle 90 pendiente correctivos de asfalto de reposición en bocacalle. Mal instalado con mal aspecto físico los parches.		**82**	K4+080 al K4+085 afoquín sin emboquillar.		**83**	K4+070 hacia calle 90 adoquín con hundimientos y tropezones.

REGISTRO FOTOGRAFICO
PENDIENTES DE OBRA AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL
TRAMOS 4 - 5 - 6.

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			FECHA	25	Septiembre	2024
LOCALIZACION	BOGOTA DC						
CONTRATISTA :	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	CONTRATO No:	1640 DE 2019				
INTERVENTORIA :	CONSORCIO CICLORUTAS	CONTRATO No:	1642 DE 2019				

TRAMO 5		**84**	K4+086 al K4+115 juntas abiertas en pisos y falta de emboquillado.		**85** K4+086 al K4+115 juntas abiertas en pisos y falta de emboquillado.		**86** K4+086 al K4+120 costao oriental de plazoleta el virrey adoquín con hundimientos y tropezones.
TRAMO 5		**87**	K4+086 al K4+120 costao oriental de plazoleta el virrey adoquín con hundimientos y tropezones.		**88** K4+130 al K4+160 costao oriental de plazoleta el virrey adoquín con hundimientos, tropezones y falta emboquillar.		**89** K4+160 al K4+178 señalización horizontal de rampas de accesos vehiculares presentan deterioro.
TRAMO 5		**90**	K4+160 al K4+178 rampas de accesos vehiculares presentan bordillos deteriorados y agrietados.		**91** K4+150 costao occidental plazoleta el virrey, adoquín con hundimientos, tropezones y falta de emboquillao.		**92** K4+188 rampa de acceso vehicular sin demarcación horiontal.
TRAMO 5		**93**	K4+188 rampa de acceso vehicular bordillos agrietados.		**94** K4+191 bordillos desportillados y juntas abiertas junto a cargue de pozo.		**95** Rampa de acceso a vía pacificada presenta deterioro su señalización horizontal.

REGISTRO FOTOGRAFICO
PENDIENTES DE OBRA AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL
TRAMOS 4 - 5 - 6.

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			FECHA	25	Septiembre	2024
LOCALIZACION	BOGOTA DC						
CONTRATISTA :	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	CONTRATO No:	1640 DE 2019				
INTERVENTORIA :	CONSORCIO CICLORUTAS	CONTRATO No:	1642 DE 2019				

TRAMO 5				
	96 K4+205 materiales prefabricados en rampa sin recibir por grietas, hundimientos, tropezones.	**97** K4+318 adoquín sin rematar	**98** K4+332 aoquín sin rematar y falta emboquillado	
TRAMO 5				
	99 K4+340 hacia calle 87 loseta alerta con hundimientos y tropezones contra bordillo.			
TRAMO 6				
	100 Pompeyano de calle 87 presenta deterioro general la señalización horizontal.	**101** K4+340 sardinel junto a pompeyano presenta desportillamientos.	**102** Pompeyano de calle 87 presenta bordillos agrietados.	
TRAMO 6				
	103 K4+355 al K4+363 material prefabricado mal alineado, con hundimientos y falta emboquillado.	**104** K4+363 loseta alerta con tropezones.	**105** K4+363 al K4+373 losetas sin emboquillar.	

REGISTRO FOTOGRAFICO
PENDIENTES DE OBRA AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL
TRAMOS 4 - 5 - 6.

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			FECHA	25	Septiembre	2024
LOCALIZACION	BOGOTA DC						
CONTRATISTA :	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	CONTRATO No:	1640 DE 2019				
INTERVENTORIA :	CONSORCIO CICLORUTAS	CONTRATO No:	1642 DE 2019				

TRAMO 6		106	K4+373 al K4+400 losetas sin emboquillar.		107	K4+375 al K4+382 bordillos A-80 desportillados.		108	K4+380 al K4+395 pendiente remate de asfalto contra sardinel en borde de vía.
TRAMO 6		109	K4+394 al K4+400 bordillos desportillados.		110	K4+394 al K4+400 bordillos desportillados.		111	En K4+395 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.
TRAMO 6		112	En K4+405 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.		113	K4+397 al K4+402 pendiente remate de asfalto contra sardinel en borde de vía.		114	K4+406 al K4+433 pendiente emboquillado de losetas.
TRAMO 6		115	K4+433 junta abierta entre loseta alerta y bordillos.		116	En K4+435 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.		117	K4+443 junta abierta enre bordillos y losetas alertas.

REGISTRO FOTOGRAFICO
PENDIENTES DE OBRA AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL
TRAMOS 4 - 5 - 6.

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			FECHA	25	Septiembre	2024
LOCALIZACION	BOGOTA DC						
CONTRATISTA :	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	CONTRATO No:	1640 DE 2019				
INTERVENTORIA :	CONSORCIO CICLORUTAS	CONTRATO No:	1642 DE 2019				

TRAMO 6			
	118 K4+438 al K4+443 pendiente remate de asfalto contra sardinel en borde de vía.	**119** En K4+445 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	**120** K4+447 franja de ajuste con tropezón en zona de matera.
TRAMO 6			
	121 En K4+463 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	**122** K4+474 bordillo deconfinado, junta abierta y sin emboquillar loseta.	**123** K4+470 al K4+480 pendiente emboquillar losetas.
TRAMO 6			
	124 K4+480 sin emboquillar bordillo y canal.	**125** K4+480 al K4+490 juntas abiertas entre loseta y canal.	**126** K4+490 concreto mal estampado, desalineado con tropezones y hundimientoa. Junta abierta contra losetas.
TRAMO 6			
	127 En K4+492 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	**128** En K4+500 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	**129** En K4+510 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.

REGISTRO FOTOGRAFICO
PENDIENTES DE OBRA AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL
TRAMOS 4 - 5 - 6.

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			FECHA	25	Septiembre	2024
LOCALIZACION	BOGOTA DC						
CONTRATISTA :	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	CONTRATO No:	1640 DE 2019				
INTERVENTORIA :	CONSORCIO CICLORUTAS	CONTRATO No:	1642 DE 2019				

TRAMO 6			
	130 K4+515 loseta alerta con tropezones.	**131** K4+537 al K4+539 adoquines sin emboquillar.	**132** K4+530 loseta alerta sin rematar.
TRAMO 6			
	133 En K4+552 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	**134** K4+556 al K4+569 losetas sin emboquillar.	**135** En K4+575 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.
TRAMO 6			
	136 En K4+575 rampa de acceso vehicular presenta bordillos agrietados	**137** En K4+585 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	**138** K4+592 al K4+600 losetas con juntas muy abiertas y sin emboquillar.
TRAMO 6			
	139 K4+600 bordillo agietado.	**140** K4+606 concreto de matera agrietado.	**141** K4+613 bordillo con hundimientos y tropezones junto a matera.

REGISTRO FOTOGRAFICO
PENDIENTES DE OBRA AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL
TRAMOS 4 - 5 - 6.

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			FECHA	25	Septiembre	2024
LOCALIZACION	BOGOTA DC						
CONTRATISTA :	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	CONTRATO No:	1640 DE 2019				
INTERVENTORIA :	CONSORCIO CICLORUTAS	CONTRATO No:	1642 DE 2019				

TRAMO 6		**142**	K4+635 loseta con junta abierta y adoquines sin emboquillar.		**143**	K4+673 pendiente rematar concreto en borde de vía hombro del espacio público costado sur de calle 85.		**144**	K4+673 al K4+680 pendiente emboquillado de pisos prefabricados.
TRAMO 6		**145**	En K4+585 rampa de acceso vehicular presenta bordillos agrietados		**146**	En K4+720 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización ybordillos con grietas.		**147**	En K4+720 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización ybordillos con grietas.
TRAMO 6		**148**	En K4+735 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.		**149**	K4+740 concreto fundido como bordillo, contra matera presenta deterioro.		**150**	K4+740 al K4+758 losetas pendiente su emboquillado.
TRAMO 6		**151**	K4+765 al K4+775 losetas pendiente su emboquillado.		**152**	K4+775 pendiente remate contra paramento por afectación de obra.		**153**	En K4+780 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.

REGISTRO FOTOGRAFICO
PENDIENTES DE OBRA AL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL
TRAMOS 4 - 5 - 6.

UNIDAD EJECUTORA:	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			FECHA	25	Septiembre	2024
LOCALIZACION	BOGOTA DC						
CONTRATISTA :	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	CONTRATO No:	1640 DE 2019				
INTERVENTORIA :	CONSORCIO CICLORUTAS	CONTRATO No:	1642 DE 2019				

TRAMO 6			
	154 En K4+780 rampa de acceso vehicular presenta bordillos agrietados.	**155** K4+800 al K4+880 losetas sin emboquillar.	**156** K4+824 losetas con hundimiento y franja de ajuste de caja mal aspecto y agrietamientos.
TRAMO 6			
	157 K4+835 al K4+840 adoquines con tropezones y falta de emboquillado.	**158** K4+850 al K4+870 adoquines con tropezones y falta de emboquillado.	**159** K4+910 al K4+945 adoquines con hundimientos, tropezones y faltade emboquillado.
TRAMO 6			
	160 En K5+000 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	**161** En K5+000 rampa de acceso vehicular presenta bordillos agrietados.	**162** En K5+035 rampa de acceso vehicular presenta bordillos desportillados.
TRAMO 6			
	163 En K5+055 rampa de acceso vehicular presenta deterioro general su señalización.	**164** K5+065 losetas con fisuras y falta de emboquillado.	
