Gobernación del Cauca Oficina Asesora Jurídica	**RECIBIDO A SATISFACCION BIENES Y/O SERVICIOS**	**Código: GC-F06** **Versión: 3** **Fecha:14/02/2024** **Página : 1 de 8**

TIIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME
PARCIAL	X	FINAL		2017-2023	25/07/2023 al 04/10/2023 – 01/11/2023 al 22/12/2023 – 06/11/24 al 06/11/24

N° PROCESO CONTRATACION SECOP	MODALIDAD MINIMA CUANTIA DC-SI-MC-003-2023		
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA – Secretaría de Infraestructura		
CONTRATISTA	OCINC INGENIERIA SAS NIT. 900849031-8 R.L. RUBEN DARIO SOLARTE GUZMAN Email: ocincingenieria@gmail.com Popayán - Cauca		
No. DE IDENTIFICACION	C.C. 76.331.752 de Popayán- Cauca		
No. DE CELULAR Y/O TELEFONO	3108531924		
CDP No.	899 del 16 de enero de 2023 5067 del 30 de octubre de 2024	CRP No.	6839 del 19 de julio de 2023 10742 del 11 de diciembre de 2024
IMPUTACION PRESUPUESTAL	3 - 2.3.1.01.22.01.01.2.3.2.02.02.08 - 991 03 - 2.3.1.22.01.0700.05.2.3.2.02.02.08 - 896		
NUMERO DE PAGO	ACTA DE PAGO PARCIAL No 01		
VALOR A PAGAR	$ 14.103.218		

BALANCE FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 58.679.578	
VALOR EJECUTADO		$ 14.103.218
SALDO POR EJECUTAR		$ 44.576.360

SEGURIDAD SOCIAL			
9458813096	AGOSTO2023		$761.500
9458813129	SEPTIEMBRE 2023		$1.474.900
9460625509	NOVIEMBRE 2023		$577.600
9460517657	DICIEMBRE 2023		$1.144.600
9478990896	NOVIEMBRE 2024		$ 432.1000

OBJETO DEL CONTRATO

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESPECIALIZADA CON ÉNFASIS EN LA MODALIDAD AGROINDUSTRIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MISAK MAMÁ MANUELA, MUNICIPIO DE SILVIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA."

JUSTIFICACION Y DETALLLE DE ACTIVIDADES Y/O BIENES

El suscrito MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO Profesional Universitario Secretaría de Educación y Cultura - Secretaría de Infraestructura, en calidad de Supervisor del contrato en mención, certifica que el contratista ha desarrollado las actividades descritas en el contrato, las cuales se encuentran debidamente soportadas con los productos que se relacionan y dentro del periodo de tiempo estipulado en el mismo; y relacionados en la factura electrónica de venta No FE32 del 12 diciembre de 2024, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas. A continuación, se relaciona los elementos entregados:

- RP – Registro presupuestal del contrato y adicional
- CDP – Certificado de disponibilidad presupuestal
- Factura electrónica No
- Acta de modificación No 01
- Acta de recibo No 01
- Planillas de seguridad social
- Acta de pago parcial No 01
- Acta de modificación No 01
- Certificado de pago de parafiscales
- Certificación de SIA OBSERVA
- RUT
- Cuenta bancaria

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Durante el periodo comprendido entre el 25 de julio de 2023 al 04 de octubre 2023; del 01 de noviembre de 2023 al 22 de diciembre de 2023; del 06 de noviembre de 2024 al 29 de noviembre de 2024 el contratista efectúa cumplimiento de su objeto contractual, De acuerdo con las actas de entrega, se autoriza el pago del acta parcial de pago No 01 contrato de interventoría No 2017-2023 por un valor de CATORCE MILLONES CIENTOTRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE $ $ 14.103.218

1. Por parte de la supervisión se realizaron los actos administrativos para el contrato de interventoría No 2017-2023 como: actas de suspensión, reinicios, prorrogas, adicionales en cuantía, seguimiento a las pólizas y demás solicitudes realizadas, las cuales se relacionen a continuación:

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
Entidad Contratante:	GOBERNACIÓN DEL CAUCA
Supervisión:	MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO
Interventor:	RUBEN DARÍO SOLARTE GUZMA
Objeto del Contrato:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESPECIALIZADA CON ÉNFASIS EN LA MODALIDAD AGROINDUSTRIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MISAK MAMÁ MANUELA, MUNICIPIO DE SILVIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA."
Contrato No:	2017 - 2023
Contratista de la obra:	LEIDER VILLEGAS SANDOVAL- C.C No. 76.292.060
Valor Inicial del Contrato:	CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($47.387.661), IVA INCLUIDO
Valor adicional:	ONCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($11.291.917)
Valor Total del Contrato:	CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO.M/CTE ($58.679.578), IVA INCLUIDO.
Plazo:	Cinco (5) Meses
ACTA DE INICIO	25 DE JULIO DEL 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No 01	04 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No 02	22 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 01 A LA SUSPENSIÓN 02	22 DE FEBRERO DE 2024
PRORROGA 02 A LA SUSPENSIÓN 02	22 DE MARZO DE 2024
PRORROGA 03 A LA SUSPENSIÓN 02	23 DE MAYO DE 2024
REINICIO 3	06 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTRO SI No 1	06 DE DICIEMBRE DE 2024

2. Se realizo seguimiento a las garantías del contrato, como se describen a continuación:

SEGUIMIENTO DE POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERTORIA

CONTRATO PRINCIPAL						
PÓLIZA	No.	ASEGURADORA	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
			CUMPLIMIENTO	$ 9.477.532,20	27/06/2023	30/03/2024

CUMPLIMIENTO	CCS-100021623 Anexo No.0	SEGUROS MUNDIAL	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	$ 2.369.383,05	27/06/2023	30/11/2026
			CALIDAD DEL SERVICIO	$ 9.477.532,20	SI AMPARA 5 AÑOS	SI AMPARA 5 AÑOS

POLIZA ACTA DE INICIO

PÓLIZA	No.	ASEGURADORA	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO	CCS-100021623 Anexo No.1	SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	$ 9.477.532,20	18/10/2023	02/06/2024
			PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	$ 2.369.383,05	18/10/2023	02/02/2027
			CALIDAD DEL SERVICIO	$ 9.477.532,20	SI AMPARA 5 AÑOS	SI AMPARA 5 AÑOS

POLIZA ACTA SUSPENSIÓN No 01 Y REINICIO No 01

PÓLIZA	No.	ASEGURADORA	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO	CCS-100021623 Anexo No.2	SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	$ 9.477.532,20	06/11/2024	20/04/2025
			PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	$ 2.369.383,05	06/11/2024	20/12/2024
			CALIDAD DEL SERVICIO	$ 9.477.532,20	SI AMPARA 5 AÑOS	SI AMPARA 5 AÑOS

POLIZA OTROSI No o1

PÓLIZA	No.	ASEGURADORA	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO	CCS-100021623 Anexo No.4	SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	$ 11.735.915,00	06/12/2024	05/05/2024
			PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	$ 2.933.978,90	06/12/2024	05/01/2028
			CALIDAD DEL SERVICIO	$ 11.735.915,60	SI AMPARA 5 AÑOS	SI AMPARA 5 AÑOS

3. La supervisión tramito un adicional en cuantía por el valor de $153.939.259 con viabilidad ajustada No 03 de 11 de septiembre de 2024, por un valor de$142.647.343 para el contrato de obra No 1740-2023 por la inclusión de 7 ítems no previstos y mayores cantidades y un valor de $11.291.917 para el contrato de interventoría No 2017-2023, a continuación, se relaciona según la forma de pago el adicional correspondiente a la interventoría.

COSTOS DE ADICION DE INTERVENTORÍA			
CONTRATO No 2017-2023	OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESPECIALIZADA CON ÉNFASIS EN LA MODALIDAD AGROINDUSTRIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MISAK MAMÁ MANUELA, MUNICIPIO DE SILVIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA."		
DATOS DEL CONTRATO DE OBRA			
Valor contrato de obra inicial	$		618.913.629
Adiciòn contrato de obra	$		142.647.343
Valor Total contrato de obra	$		761.560.972
DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTROIA			
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA FORMA DE PAGO	VALOR INCLUIDO IVA	PLAZO INICAL VALOR SIN IVA	5 VALOR MAXIMO A ADICIONAR
Valor Contrato interventoría	$ 47.387.661,00	$ 39.821.564,00	
25% (Por PERMANENCIA)	$ 11.846.915,25	$ 9.955.391,00	$ 2.369.383,00
60% (por avance de obra)	$ 28.432.596,60	$ 23.892.938,00	$ 6.553.151,00
15% (suscripción acta liquidación)	$ 4.738.766,10	$ 3.982.156,00	
No. De meses por adicionar			2
COSTO 2 MESES DE INTERVENTORÍA			$ 11.291.917,00

4. De igual manera se solicitó traslado de recursos por un valor de **$229.148.312,** se adjunta estructura financiera del proyecto.

CONCEPTO	VALOR VIABILIZADO	RESERVA PRESUPUESTAL 2023	VALOR A TRASLADAR 2024	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
EJECUCION DE OBRA	$657.490.339	$ 618.913.629	$38.576.710	$142.647.343	$800.137.682
INTERVENTORÍA	$55.818.713	$47.387.661	$8.431.052	$11.291.917	$67.110.630
MOBILIARIO	$ 182.140.550	-	$ 182.140.550	-	$ 182.140.550
TOTAL	$ 895.449.602	$666.301.290	$229.148.312	$153.939.259	$1.049.388.861

5. De esta manera se firmó en la plataforma secop II el OtroSi No 01 con fecha del 06 de diciembre e de 2024.

6. En los informes mensuales presentados por interventoría se hace el reporte de las siguientes actividades realizadas en obra:

   - Se llevaron a cabo las actividades correspondientes a la cimentación, destacando la instalación completa del filtro dren francés, un ítem no previsto inicialmente. la cimentación se ejecutó de manera eficiente, con un alto rendimiento que refleja un avance del 72 % respecto a lo planificado.

   - Se iniciaron las estructuras en concreto, abordando las siguientes actividades: la instalación de acero de refuerzo flejado de 60,000 PSI (420 MPa), la construcción de columnas de concreto de 3,000 PSI con secciones mayores a 30 cm, y la colocación de concreto para los muros en contrapiso.


- Se ejecutaron actividades correspondientes al capítulo de red sanitaria, cuya incorporación fue priorizada debido al avance y al orden constructivo, con el propósito de evitar futuras complicaciones técnicas. Entre las actividades desarrolladas destacan la instalación de tubería de PVC Novafort de 6" y la construcción de cajas de inspección de 80x80 cm en concreto.

- Se llevaron a cabo las actividades correspondientes al capítulo de red pluvial, cuya incorporación fue esencial para garantizar el orden constructivo de la obra y satisfacer las necesidades técnicas del proyecto. Entre las actividades desarrolladas se incluyen: la construcción de cajas de inspección de 80x80 cm en concreto, cámaras de inspección tipo B con alturas entre 1.50 y 2.00 m, la instalación de brocales con piso y tapa, así como la colocación de tuberías de PVC de 6" (saneamiento) y PVC Novafort de 8".

Se avala el pago No 01 por el valor de CATORCE MILLONES CIENTOTRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($14.103.218), discriminados de la siguiente manera: por cuota fija mensual un valor $ 6.287.98, y por avance de obra el valor de $7.816.120.

REGISTRO FOTOGRAFICO


Excavación y perfilado

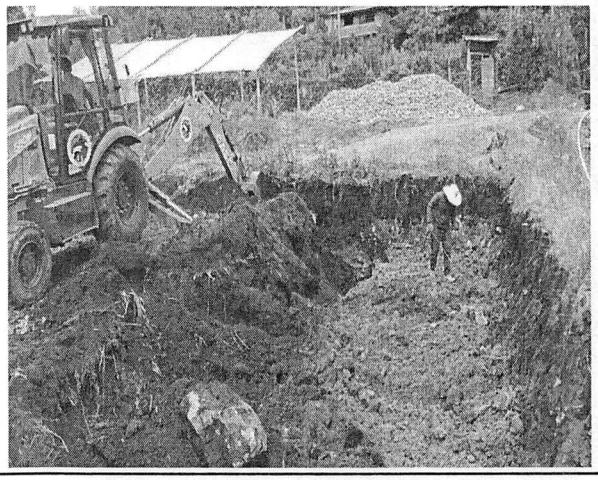


Instalación de drenaje francés




fundición de vigas de cimentación en concreto

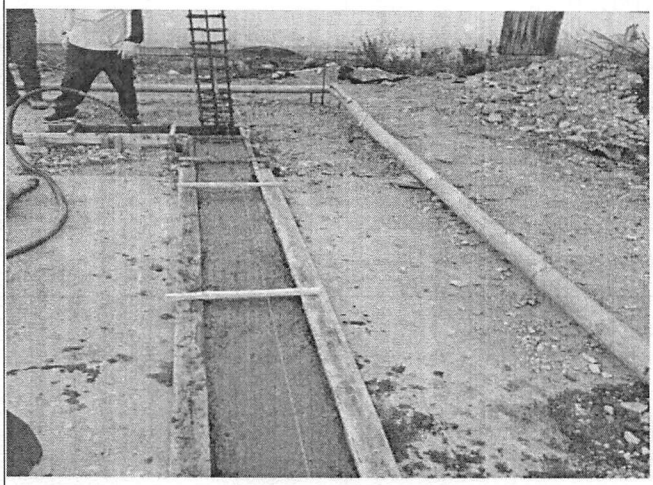

cimentación y columnas

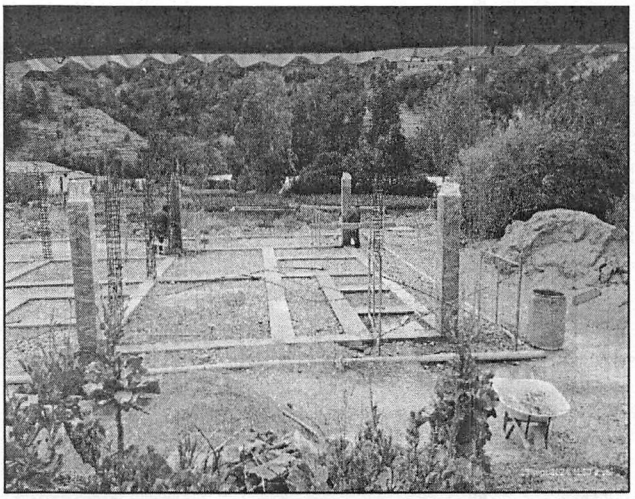

Ensayo de laboratorio

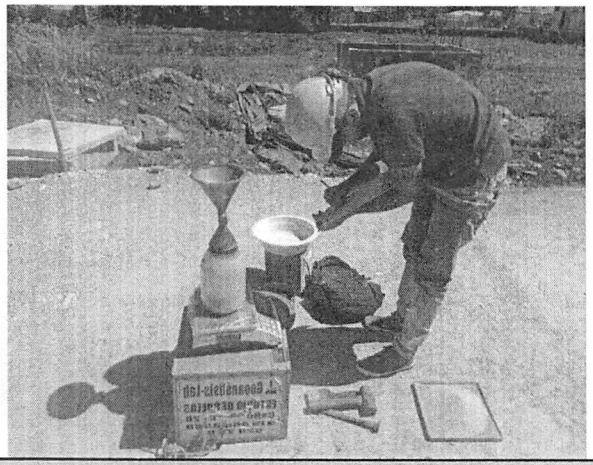



cámara de inspección



NOTAS

El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas, dentro del período de tiempo comprendido el 25 de julio de 2023 al 04 de octubre 2023; del 01 de noviembre de 2023 al 22 de diciembre de 2023; del 06 de noviembre de 2024 al 29 de noviembre de 2024 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

Gobernación del Cauca Oficina Asesora Jurídica	**RECIBIDO A SATISFACCION BIENES Y/O SERVICIOS**	**Código: GC-F06**
		Versión: 3
		Fecha:14/02/2024
		Página : 8 de 8

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FIRMA	
DATOS APOYO A LA SUPERVISION	
NOMBRE	GINNA MARCELA MACIAS MARTINEZ
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FIRMA	
FECHA ELABORACION	03 de diciembre de 2024

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900849031	8	OCINC INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RUBEN DARIO SOLARTE GUZMAN	CALLE 2 SUR 26-49	PASTO-NARIÑO	3148579565	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	58813096	9458813096	E	2023/09/08	2023/11/10	BANCO AV VILLAS	63	$761,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: RUBEN DARIO SOLARTE GUZMAN (2 Afiliados)																							$2,306,000	$369,000			$2,306,000	$92,300			$2,306,000	$92,300			$2,306,000		$160,500		$0	$0		$714,100
Centro de Trabajo: POSITIVA (2 Afiliados)																							$2,306,000	$369,000			$2,306,000	$92,300			$2,306,000	$92,300			$2,306,000		$160,500		$0	$0		$714,100
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (2 Afiliados)																							$2,306,000	$369,000			$2,306,000	$92,300			$2,306,000	$92,300			$2,306,000		$160,500		$0	$0		$714,100
1	CC	12981495	CHAMORRO SERVIO	X																	230201	15	$1,250,000	$200,000	EPS017	15	$1,250,000	$50,000	CCF35	15	$1,250,000	$50,000	14-23	15	$1,250,000	6.960%	$87,000	15	$0	$0	Si	$387,000
2	CC	1085267037	GUIZA GERMAN	X																	25-14	15	$1,056,000	$169,000	EPS005	15	$1,056,000	$42,300	CCF35	15	$1,056,000	$42,300	14-23	15	$1,056,000	6.960%	$73,500	15	$0	$0	Si	$327,100
Total		**Afiliados(2)**																					$2,306,000	$369,000			$2,306,000	$92,300			$2,306,000	$92,300			$2,306,000		$160,500		$0	$0		$714,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900849031	8	OCINC INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RUBEN DARIO SOLARTE GUZMAN	CALLE 2 SUR 26-49	PASTO-NARIÑO	3148579565	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	58813096	9458813096	E	2023/09/08	2023/11/10	BANCO AV VILLAS	63	$761,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$369,000	$24,500	$0	$393,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$169,000	$11,200	$0	$180,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$200,000	$13,300	$0	$213,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$160,500	$10,600	$0	$171,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$160,500	$10,600	$0	$171,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$92,300	$6,100	$0	$98,400
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	$92,300	$6,100	$0	$98,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$92,300	$6,200	$0	$98,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$50,000	$3,400	$0	$53,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$42,300	$2,800	$0	$45,100
TOTAL				**2**	**$714,100**	**$47,400**	**$0**	**$761,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900849031	8	OCINC INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RUBEN DARIO SOLARTE GUZMAN	CALLE 2 SUR 26-49	PASTO-NARIÑO	3148579565	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	58813129	9458813129	E	2023/10/09	2023/11/10	BANCO AV VILLAS	32	$1,474,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: RUBEN DARIO SOLARTE GUZMAN (2 Afiliados)																						$4,612,000	$738,000			$4,612,000	$184,500			$4,612,000	$184,500			$4,612,000		$321,000		$0	$0		$1,428,000
Centro de Trabajo: POSITIVA (2 Afiliados)																						$4,612,000	$738,000			$4,612,000	$184,500			$4,612,000	$184,500			$4,612,000		$321,000		$0	$0		$1,428,000
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (2 Afiliados)																						$4,612,000	$738,000			$4,612,000	$184,500			$4,612,000	$184,500			$4,612,000		$321,000		$0	$0		$1,428,000
1	CC	12981495	CHAMORRO SERVIO																		230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF35	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
2	CC	1085267037	GUIZA GERMAN																		25-14	30	$2,112,000	$338,000	EPS005	30	$2,112,000	$84,500	CCF35	30	$2,112,000	$84,500	14-23	30	$2,112,000	6.960%	$147,000	30	$0	$0	SI	$654,000
Total			**Afiliados(2)**																				$4,612,000	$738,000			$4,612,000	$184,500			$4,612,000	$184,500			$4,612,000		$321,000		$0	$0		$1,428,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900849031	8	OCINC INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RUBEN DARIO SOLARTE GUZMAN	CALLE 2 SUR 26-49	PASTO-NARIÑO	3148579565	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	58813129	9458813129	E	2023/10/09	2023/11/10	BANCO AV VILLAS	32	$1,474,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$738,000	$24,200	$0	$762,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$338,000	$11,100	$0	$349,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$400,000	$13,100	$0	$413,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$321,000	$10,500	$0	$331,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$321,000	$10,500	$0	$331,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$184,500	$6,100	$0	$190,600
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	$184,500	$6,100	$0	$190,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$184,500	$6,100	$0	$190,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$100,000	$3,300	$0	$103,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$84,500	$2,800	$0	$87,300
TOTAL				**2**	**$1,428,000**	**$46,900**	**$0**	**$1,474,900**

2024/12/10 06:39 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900849031	8	OCINC INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RUBEN DARIO SOLARTE GUZMAN	CALLE 2 SUR 26-49	PASTO-NARIÑO	3148579565	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	60625509	9460625509	E	2023/12/11	2023/12/26	BANCO AV VILLAS	15	$577,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: RUBEN DARIO SOLARTE GUZMAN (2 Afiliados)																						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$569,000
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)																						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$569,000
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (2 Afiliados)																						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$569,000
1	CC	87301651	DIAZ JOSE	X																230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF35	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
2	CC	76324239	MUÑOZ JUAN	X																25-14	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF35	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
Total		**Afiliados(2)**																				$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$569,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900849031	8	OCINC INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RUBEN DARIO SOLARTE GUZMAN	CALLE 2 SUR 26-49	PASTO-NARIÑO	3148579565	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	60625509	9460625509	E	2023/12/11	2023/12/26	BANCO AV VILLAS	15	$577,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$371,200	$5,600	$0	$376,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$2,800	$0	$188,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$2,800	$0	$188,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$12,200	$200	$0	$12,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$12,200	$200	$0	$12,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$92,800	$1,400	$0	$94,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	$92,800	$1,400	$0	$94,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$92,800	$1,400	$0	$94,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$46,400	$700	$0	$47,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$700	$0	$47,100
TOTAL				**2**	**$569,000**	**$8,600**	**$0**	**$577,600**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900849031	8	OCINC INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RUBEN DARIO SOLARTE GUZMAN	CALLE 2 SUR 26-49	PASTO-NARIÑO	3148579565	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	60517657	9460517657	E	2024/01/10	2023/12/20	BANCO AV VILLAS	0	$1,144,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: RUBEN DARIO SOLARTE GUZMAN (2 Afiliados)																						$3,696,800	$591,500			$3,696,800	$147,900			$3,696,800	$147,900			$3,696,800		$257,300		$0	$0		$1,144,600
Centro de Trabajo: POSITIVA (2 Afiliados)																						$3,696,800	$591,500			$3,696,800	$147,900			$3,696,800	$147,900			$3,696,800		$257,300		$0	$0		$1,144,600
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (2 Afiliados)																						$3,696,800	$591,500			$3,696,800	$147,900			$3,696,800	$147,900			$3,696,800		$257,300		$0	$0		$1,144,600
1	CC	12981495	CHAMORRO SERVIO																		230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF35	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
2	CC	1085267037	GUIZA GERMAN		X																25-14	17	$1,196,800	$191,500	EPS005	17	$1,196,800	$47,900	CCF35	17	$1,196,800	$47,900	14-23	17	$1,196,800	6.960%	$83,300	17	$0	$0	Si	$370,600
Total		**Afiliados(2)**																					$3,696,800	$591,500			$3,696,800	$147,900			$3,696,800	$147,900			$3,696,800		$257,300		$0	$0		$1,144,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900849031	8	OCINC INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RUBEN DARIO SOLARTE GUZMAN	CALLE 2 SUR 26-49	PASTO-NARIÑO	3148579565	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	60517657	9460517657	E	2024/01/10	2023/12/20	BANCO AV VILLAS	0	$1,144,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$591,500	$0	$0	$591,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$191,500	$0	$0	$191,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$400,000	$0	$0	$400,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$257,300	$0	$0	$257,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$257,300	$0	$0	$257,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$147,900	$0	$0	$147,900
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	$147,900	$0	$0	$147,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$147,900	$0	$0	$147,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$100,000	$0	$0	$100,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$47,900	$0	$0	$47,900
TOTAL				**2**	**$1,144,600**	**$0**	**$0**	**$1,144,600**

2024/12/10 06:41 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900849031	8	OCINC INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RUBEN DARIO SOLARTE GUZMAN	CALLE 2 SUR 26-49	PASTO-NARIÑO	3148579565	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	05145467	9478990896	E	2024/12/09	2024/12/17	BANCO DE OCCIDENTE	8	$432,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.		Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: RUBEN DARIO SOLARTE GUZMAN (2 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$429,600
Centro de Trabajo: POSITIVA (2 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$429,600
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (2 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$429,600
1	CC	10523123	GUZMAN JOSE	X	X																	0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$110,800
2	CC	93378931	SANCHEZ JAVIER	X	X																25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF35	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
Total			**Afiliados(2)**																				$1,300,000	$208,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$429,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900849031	8	OCINC INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RUBEN DARIO SOLARTE GUZMAN	CALLE 2 SUR 26-49	PASTO-NARIÑO	3148579565	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	05145467	9478990896	E	2024/12/09	2024/12/17	BANCO DE OCCIDENTE	8	$432,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,200	$0	$209,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$1,200	$0	$209,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$13,600	$100	$0	$13,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$13,600	$100	$0	$13,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$600	$0	$104,600
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	$104,000	$600	$0	$104,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$104,000	$600	$0	$104,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$300	$0	$52,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$300	$0	$52,300
TOTAL				**2**	**$429,600**	**$2,500**	**$0**	**$432,100**

2024/12/17 02:51 PM

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 2
CONTRATO DE OBRA No 1740-2023



OCINC INGENIERIA S.A.S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
MUNICIPIO DE POPAYÁN.

POPAYÁN-CAUCA
12 DE DICIEMBRE DE 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

INFORME DE INTERVENTORÍA
DEL PERIODO 06 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2017 – 2023

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESPECIALIZADA CON ÉNFASIS EN LA MODALIDAD AGROINDUSTRIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MISAK MAMÁ MANUELA, MUNICIPIO DE SILVIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA."

OCINC INGENIERIA S.A.S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
MUNICIPIO DE POPAYÁN.

POPAYÁN – CAUCA
12 DE DICIEMBRE DE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION. 4
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 5
3. LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO. 6
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 6

4.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA: 6

4.2 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA EN EL PRESENTE PERIODO: 10

4.3 INFORME DE AVANCE 12

4.4 CRONOGRAMA CONTRATO 1740 – 2023 14

4.5 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 14

4.6 GARANTÍAS DEL CONTRATO 14

5. INFROMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 15

5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 16

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA. 17

5.3 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 19

5.4 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 19

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO 20
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 32

1. INTRODUCCION.

El Departamento del Cauca, a través de la Secretaría de Infraestructura, trabaja con el firme propósito de fortalecer el sector educativo en la región mediante un apoyo técnico integral. Este objetivo se centra en la formulación, evaluación y viabilización de proyectos de inversión en infraestructura educativa, con el fin de responder a las necesidades específicas de cada institución.

La meta principal es garantizar que los espacios educativos sean adecuados, seguros y funcionales, contribuyendo a un entorno de aprendizaje que fomente la excelencia académica y el desarrollo integral de los estudiantes. Este apoyo técnico no solo incluye la orientación para la estructuración de los proyectos, sino también el acompañamiento durante su ejecución y seguimiento, asegurando que los resultados cumplan con los estándares de calidad y sostenibilidad.

En este contexto, la comunidad educativa ha venido desarrollando de manera espontánea espacios para sus actividades, sin contar con el respaldo técnico adecuado. Esto ha resultado en áreas reducidas, recorridos incoherentes y acabados no aptos para los procesos educativos. Además, el crecimiento del laboratorio agroindustrial, donde cada año se procesan mayores cantidades y se suman más estudiantes a las prácticas educativas, ha evidenciado la necesidad de contar con infraestructura adecuada para el aprendizaje técnico.

Esta situación ha generado un problema crítico: el limitado acceso de la población en edad escolar a educación especializada. Las condiciones inadecuadas de los ambientes complementarios afectan la calidad de la formación académica, reducen el nivel productivo técnico especializado, aumentan la deserción escolar, y disminuyen la motivación de los jóvenes hacia la formación técnica, comprometiendo la conservación de saberes locales, culturales y socioeconómicos.

En la Institución Educativa Misak Mamá Manuela, que atiende a 611 estudiantes en los grados de preescolar a 11°, las condiciones de infraestructura agropecuaria son insuficientes para el desarrollo de actividades pedagógicas óptimas.

Con el propósito de solucionar esta problemática, se formuló el proyecto**:** "Construcción de un aula especializada con énfasis en la modalidad agroindustrial en la Institución Educativa Misak Mamá Manuela, municipio de Silvia, Departamento del Cauca"**.**

En atención a este objetivo, el pasado 10 de mayo de 2023, se llevó a cabo la convocatoria pública bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía (DC-SI-SAMC-001-2023), cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto de construcción del aula especializada con énfasis en la modalidad agroindustrial en la Institución Educativa Misak Mamá Manuela, municipio de Silvia, Departamento del Cauca."

Este proyecto busca fortalecer la infraestructura educativa, garantizar un ambiente adecuado para el aprendizaje técnico especializado y mejorar la calidad educativa de la región.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto, objeto de control y seguimiento en el marco del contrato de interventoría 2017-2023, tiene como finalidad la Construcción de un aula especializada con énfasis en la modalidad agroindustrial en la Institución Educativa Misak Mamá Manuela, municipio de Silvia, Departamento del Cauca. Este espacio busca fortalecer las capacidades educativas y técnicas de los estudiantes, promoviendo su formación en el ámbito agroindustrial y contribuyendo al desarrollo regional.

A continuación, se presenta el plano que detalla la distribución del aula, incluyendo las áreas funcionales diseñadas para satisfacer los requerimientos pedagógicos y técnicos del proyecto.

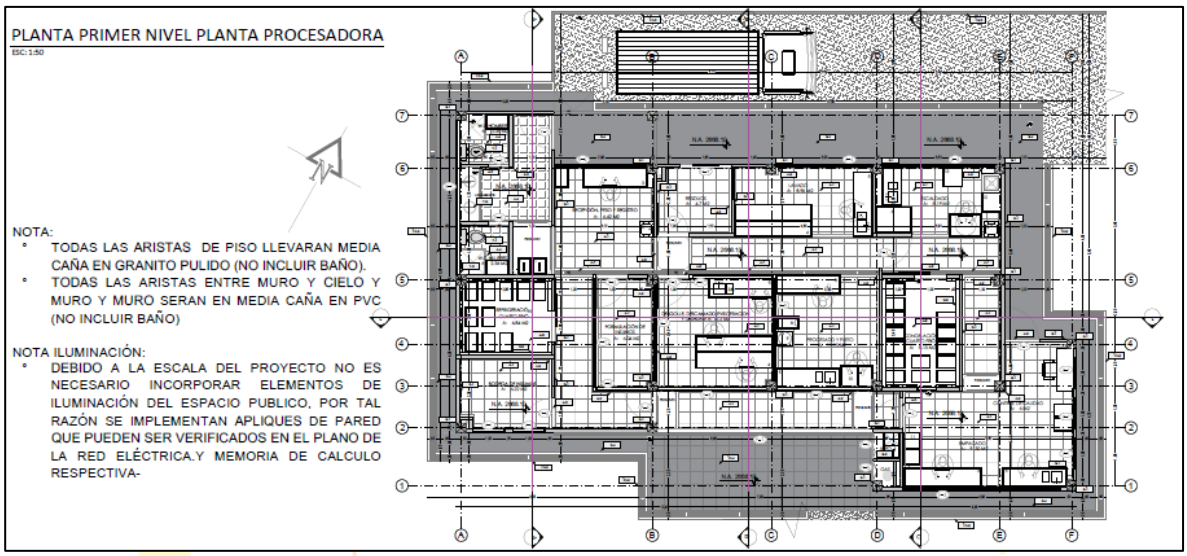


Ilustración 1. Distribución arquitectónica 1 nivel planta procesadora

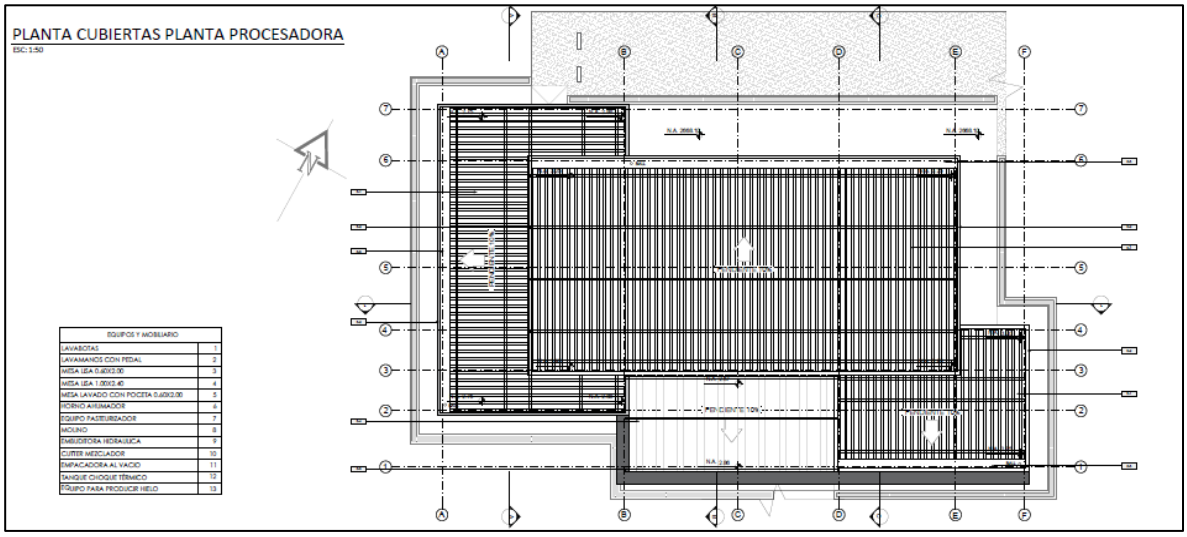


Ilustración 2. Planta cubierta planta procesadora

3. LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO.

La Institución Educativa Misak Mamá Manuela se encuentra en el resguardo de Guambia, específicamente en la vereda Las Delicias del municipio de Silvia, Cauca. Su ubicación está a tan solo 2 kilómetros de la cabecera municipal, lo que equivale a un tiempo de recorrido de aproximadamente 5 a 10 minutos por vía terrestre.

El lote de la institución está estratégicamente situado junto a la carretera, lo que facilita su acceso y conexión con la zona urbana de Silvia a través de la vía terciaria. Además, cuenta con una adecuada disponibilidad de servicios básicos y privados, entre ellos una red de acueducto, red eléctrica y una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) propia, que garantiza el suministro y manejo eficiente de recursos esenciales para el desarrollo de sus actividades académicas y administrativas.



Ilustración 3. Localización institución educativa misak mama manuela

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA No 1740-2023:

Tabla 1. Ficha Técnica Contrato De Obra

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
Entidad Contratante:	GOBERNACIÓN DEL CAUCA
Interventor:	OCINC INGENIERIA S.A.S RUBEN DARÍO SOLARTE GUZMAN CC. 76.331.752 DE POPAYÁN
Supervisión:	MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO
Objeto del Contrato:	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESPECIALIZADA CON ÉNFASIS EN LA MODALIDAD AGROINDUSTRIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MISAK MAMÁ MANUELA, MUNICIPIO DE SILVIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. "

Contrato de obra No:	1740 - 2023
Contratista de la obra:	LEIDER VILLEGAS SANDOVAL - C.C No. 76.292.060
Valor Inicial del Contrato:	SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE. ($618.913.629)
Valor Total del Contrato:	SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE. ($618.913.629)
Plazo:	Cinco (5) Meses
Actas de Inicio	25 DE JULIO DE 2023
Fecha Inicial de Terminación:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha Final de Terminación:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Terminación Inicial:	24 DE DICIEMRBE DE 2023
Otro si No 01	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Suspensión No.1:	04 DE OCTUBRE DE 2023
Suspensión No 02:	22 DE DICIEMBRE DE 2024
Prorroga No 01 a la Suspensión No 02:	22 DE FEBRERO DE 2024
Prorroga No 02 a la Suspensión No 02:	22 DE MARZO DE 2024
Prorroga No 03 a la Suspensión No 02:	23 DE MAYO DE 2024
Reinicio No. 3:	06 DE NOVIEMBRE DEL 2024
Otro si No 02	26 DE NOVIEMBRE DEL 2024
Valor adicional:	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/MCTE. ($142.647.342)
Valor total:	SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($761.560.972)

4.2 DESCRIPCION GENERAL DEL AJUSTE AL CONTRATO DE OBRA No 1740-2023:

El 15 de agosto de 2024, de común acuerdo, el contratista de la obra, el interventor y el supervisor decidieron fijar precios para varios ítems no previstos que no fueron contemplados inicialmente en el presupuesto oficial de igual manera las mayores y menores cantidades para

algunas actividades. Este ajuste resulta indispensable para incluir actividades clave que permitan la correcta ejecución del objeto del contrato de obra, que en este caso es:

"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESPECIALIZADA CON ÉNFASIS EN LA MODALIDAD AGROINDUSTRIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MISAK MAMÁ MANUELA, MUNICIPIO DE SILVIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA."

Los ítems no contemplados inicialmente, pero cuya incorporación es necesaria, son los siguientes:

1. **Reconocimiento por sobrecostos de acarreo (ítems 1.8 y 1.9):** Debido a que el presupuesto original no contempló las distancias involucradas, es necesario incluir estos costos para garantizar el transporte adecuado de los materiales de construcción dentro de los plazos contractuales establecidos.

2. **Geotextil no tejido 1600:** Este material permite el paso del agua, filtrando los materiales finos y evitando la formación de cavernas por erosión. Su inclusión es fundamental para garantizar la estabilidad del terreno y el control del nivel freático, así como de las aguas superficiales.

3. **Demolición de estructuras existentes:** Es indispensable incorporar esta actividad, ya que el desarrollo del proyecto requiere eliminar estructuras existentes para realizar las modificaciones necesarias.

4. **Filtro tipo dren francés:** Este elemento se considera crucial para evitar que el agua subterránea o superficial dañe los cimientos de la edificación, asegurando la durabilidad de la estructura.

5. **Cerramiento en lona verde:** Este ítem se incorpora como parte de la normativa y para delimitar claramente el área del proyecto. Además, garantiza la seguridad tanto del personal como de las personas cercanas al sitio de la obra.

6. **Excavación en conglomerado:** Esta actividad, no contemplada inicialmente, resulta fundamental para el desarrollo de los cimientos y para alcanzar las profundidades adecuadas necesarias para la cimentación de la obra.

Este ajuste asegura que el proyecto pueda ejecutarse de manera eficiente, cumpliendo con los estándares técnicos y contractuales establecidos.

A continuación, se presenta el presupuesto acordado para estos siete ítems adicionales:

Tabla 2. Presupuesto ítems no previstos

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ITEMS NO PREVISTOS:				
NP 01	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600	M2	664.25	$ 14,574.00	$ 9,680,780.00
NP 02	RECONOCIMIENTO POR SOBRECOSTOS DE ACARREO ITEM 1.8 Y ITEM 1.9	M3/KM	25176.14	$ 1,229.00	$ 30,941,476.00
NP 03	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	M2	20.16	$ 11,214.00	$ 226,074.00
NP 04	FILTRO TIPO DREN FRANCÉS	ML	85.26	$ 310,087.00	$ 26,438,018.00
NP 05	CONCRETO PARA MURO EN CONTRAPISO	ML	60.16	$ 46,908.00	$ 2,821,985.00
NP 06	CERRAMIENTO EN LONA VERDE	ML	104.00	$ 14,865.00	$ 1,545,960.00
NP 07	EXCAVACION EN CONGLOMERADO	M3	445.80	$ 26,000.00	$ 11,590,800.00

Asimismo, fue necesario actualizar las mayores y menores cantidades debido a la modificación en los alcances de algunas actividades, lo que implicó realizar ajustes en dichas actividades. A continuación, se detallan las mayores y menores cantidades:

Tabla 3. Mayores y menores cantidades de obra

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIAL	CANT. MODIFICADA
1.1	EXCAVACIÓN A MAQUINA SIN RETIRO	M3	380.00	796.36
1.2	LOCALIZACIÓN-REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	M2	165.09	508.03
1.3	CONFIGURACIÓN – NIVELACIÓN TERRENO	M2	166.00	255.14
1.4	RETIRO ESCOMBROS A MÁQUINA <= 10 KM	M3	380.00	796.36
1.6	ENTIBADO PARA POZO DE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO	M2	12.00	18.86
1.8	RELLENO TIERRA – NIVELACIÓN + ACARREO	M3	253.00	452.94
1.9	RELLENO COMP.MAT.SELECC. 10 KM	M3	127.00	148.86
2.4	SOLADO ESPESOR E=0.05 M 2000 PSI 14 MPA	M2	72.00	73.26
2.5	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA	M3	20.00	36.69
2.6	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CM	M3	8.00	10.23

3.4	VIGA CONCRETO- AEREA 3000 PSI	M3	11.00	11.38
3.9	ESTRUCTURA METÁLICA	KLS	1.685	1829.10
4.2	TEJA POLICARBONATO 10 MM 4 PAREDES COLOR OPAL	M2	20.00	20.77
6.2	TUB. PVC 4 SANI	ML	41.00	45.85
8.6	TUB. PVS 6 SANI.	ML	49.00	51.49
8.7	TUB PVC NOVAFORT 8"	ML	107.00	107.40
12.1	NAVE ALUM. ENCHAPADA LLENA BAT. INCLUYE MARCO Y CHAPA INCLUYE SILICONA PARA JUNTAS	M2	24.00	24.64
12.7	VENTANA ALUM. CORREDIZA SEGÚN DISEÑO INCLUYE SILICONA PARA JUNTAS Y VIDRIO	M2	6.00	13.68
13.1	ANDEN COONCRETO 10 CM 3000 PSI	M2	29.00	51.43
13.3	LIMPIEZA GENERAL	M2	110.00	496.18

Finalmente, considerando los ítems no previstos, así como las mayores y menores cantidades, se presenta el siguiente adicional presupuestal:

Tabla 4. valor del ajuste presupuestal

Valor costo directo obra	$	109,728,725.00
Administración	$	24,140,320.00
Imprevistos	$	3,291,862.00
Utilidad	$	5,486,436.00
Total	**$**	**142,647,343.00**

4.3 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA EN EL PRESENTE PERIODO:

Este capítulo aborda de forma detallada y precisa el progreso alcanzado en las metas previamente establecidas y actualmente en ejecución. En el transcurso del periodo actual, se

han implementado diversas actividades que cuentan con la supervisión de la interventoría para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.

- ✓ Se iniciaron las actividades preliminares, incluyendo la atención de ítems no previstos, con el objetivo de garantizar un óptimo desarrollo y calidad del proyecto. La interventoría realizó la supervisión correspondiente para asegurar el correcto desarrollo de los trabajos y el adecuado uso de los materiales. En este capítulo, se logró completar el 100 % de las actividades programadas según cronograma de ejecución. Específicamente, en la demolición de losa de concreto se reporta un avance del 16 %, mientras que en la excavación de conglomerado el progreso alcanza el 86 %. El resto de las actividades fueron ejecutadas en su totalidad, evidenciando un rendimiento acorde con lo planificado y asegurando el cumplimiento de los tiempos establecidos en el contrato.

- ✓ Se llevaron a cabo las actividades correspondientes a la cimentación, destacando la instalación completa del filtro dren francés, un ítem no previsto inicialmente. Las labores relacionadas con la cimentación se ejecutaron de manera eficiente, con un alto rendimiento que refleja un avance del 72 % respecto a lo planificado. La interventoría desempeñó un rol clave al realizar la supervisión y el acompañamiento necesarios para garantizar la calidad del proceso constructivo, asegurando a su vez un desempeño acorde con los tiempos establecidos en el contrato de obra.

- ✓ Se iniciaron las estructuras en concreto, abordando las siguientes actividades: la instalación de acero de refuerzo flejado de 60,000 PSI (420 MPa), la construcción de columnas de concreto de 3,000 PSI con secciones mayores a 30 cm, y la colocación de concreto para los muros en contrapiso. La interventoría llevó a cabo el seguimiento y control de calidad para asegurar el cumplimiento de los estándares establecidos. Aunque el avance registrado en este capítulo es reducido, el rendimiento alcanzado resulta adecuado y se ajusta a los tiempos establecidos en el contrato de obra.

- ✓ Se ejecutaron actividades correspondientes al capítulo de red sanitaria, cuya incorporación fue priorizada debido al avance y al orden constructivo, con el propósito de evitar futuras complicaciones técnicas. Entre las actividades desarrolladas destacan la instalación de tubería de PVC Novafort de 6" y la construcción de cajas de inspección de 80x80 cm en concreto. Se llevó a cabo la supervisión correspondiente para garantizar el control de calidad en cada proceso. Además, el contratista de obra demostró un buen rendimiento, cumpliendo con las expectativas técnicas y operativas del proyecto.

- ✓ Se llevaron a cabo las actividades correspondientes al capítulo de red pluvial, cuya incorporación fue esencial para garantizar el orden constructivo de la obra y satisfacer las necesidades técnicas del proyecto. Entre las actividades desarrolladas se incluyen:

la construcción de cajas de inspección de 80x80 cm en concreto, cámaras de inspección tipo B con alturas entre 1.50 y 2.00 m, la instalación de brocales con piso y tapa, así como la colocación de tuberías de PVC de 6" (saneamiento) y PVC Novafort de 8". La supervisión técnica se realizó de manera continua para asegurar el control de calidad en cada proceso constructivo. El contratista de obra demostró un desempeño satisfactorio, cumpliendo con las expectativas técnicas y operativas, lo cual garantiza el progreso eficiente del proyecto.

4.4 INFORME DE AVANCE

La Interventoría en cumplimiento de sus funciones Técnicas, Administrativas, Financiera, social y ambiental, supervisó las actividades desarrolladas durante este periodo y se constató que se cumplieran acorde a las especificaciones contratadas.

El avance acumulado de esta obra es del **37.60%** lo cual representa una inversión de **$286,357,063.00** dicha inversión se ha realizado en las siguientes actividades ejecutadas:

Tabla 5. Actividades acumuladas ejecutadas en el presente periodo

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. TOTAL
1	**PRELIMINARES**			
1.1	EXCAVACIÓN A MAQUINA SIN RETIRO	M3	796.36	$ 3,344,712.00
1.2	LOCALIZACIÓN-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	508.03	$ 1,676,499.00
1.3	CONFIGURACIÓN - NIVELACIÓN TERRENO	M2	496.18	$ 426,715.00
1.4	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10 KM	M3	796.36	$ 14,175,208.00
1.5	BOMBEO	DIA	60.00	$ 6,402,000.00
1.6	ENTIBADO PARA POZO DE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO	M2	18.86	$ 744,970.00
1.7	EXCAVACIÓN TIERRA A MANO BAJO AGUA H=2.0	M3	3.16	$ 73,312.00
1.8	RELLENO TIERRA - NIVELACIÓN +ACARREO	M3	485.98	$ 18,904,622.00
1.9	RELLENO COMP.MAT.SELECC.10 KM	M3	188.25	$ 27,446,850.00
	ITEMS NO PREVISTOS			
NP-01	GEOTEXTIL NT 1600	M2	664.25	$ 9,680,780.00
NP-02	ACARREO DE TRANSPORTE	M3-KM	25,176.14	$ 30,941,476.00
NP-03	DEMOLICION LOSA DE CONCRETO	M2	3.36	$ 37,679.00

NP-06	CERRAMIENTO EN LONA VERDE	ML	104.00	$	1,545,960.00
NP-07	EXCAVACION EN CONGLOMERADO	M3	385.49	$	10,022,740.00
2.	**CIMENTACION**				
2.2	CONCRETO CICLÓPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3	5.78	$	2,436,270.00
2.3	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	33.07	$	591,953.00
2.4	SOLADO ESPESOR E=0.05 M 2000 PSI 14 MPA	M2	73.26	$	1,970,694.00
2.5	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA	M3	16.63	$	11,107,177.00
2.6	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CM	M3	6.61	$	5,143,241.00
2.7	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420 Mpa	KLS	2,014.61	$	12,792,774.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
NP-04	FILTRO DREN FRANCES	ML	85.26	$	26,438,018.00
3.	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS**				
3.1	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420 Mpa	KLS	1,285.74	$	8,164,449.00
3.2	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI >30 CM SECCIÓN	M3	4.00	$	3,606,800.00
NP-05	CONCRETO PARA MURO EN CONTRAPISO	ML	60.16	$	2,821,985.00
6.	**RED SANITARIA**				
6.3	TUB PVC NOVAFORT 6"	ML	91.80	$	6,031,260.00
6.4	CAJA INSPECCIÓN 80x80 CM [CONCRETO]	UND	7.00	$	2,976,400.00
8.	**RED PLUVIAL**				
8.3	CAJA INSPECCIÓN 80 x 80 CM [CONCRETO]	UND	3.00	$	1,275,600.00
8.4	CÁMARA INSPECCIÓN TIPO B H=1.50-2.00 M	UND	1.00	$	1,936,300.00
8.5	BROCAL INCLUYE PISO Y TAPA	UND	1.00	$	554,600.00
8.6	TUB. PVC 6 SANI.	ML	7.00	$	472,500.00
8.7	TUB PVC NOVAFORT 8"	ML	84.60	$	6,531,120.00

4.5 CRONOGRAMA CONTRATO 1740 – 2023

Tabla 6. Programado Vs Ejecutado

	PROGRAMADO %	EJECUTADO %
AVANCE EJECUTADO	34.30	37.60
AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	34.30	37.60

4.6 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 7. Avance Financiero Obra

VALOR INICIAL CONTRATO DE OBRA:	$618.913.629
VALOR ADICIONAL	$142.647.343
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA:	$761.560.972
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA:	$284.347.315
SALDO POR EJECUTAR:	$477.213.657

4.7 GARANTÍAS DEL CONTRATO

El contratista ha constituido una garantía a favor del Departamento del Cauca que contiene los amparos que se relacionan a continuación:

NOTA: Dado que el contrato de obra no cuenta con una póliza de inicio, se identificó la necesidad de subsanar esta situación para garantizar que el contrato cumpla con todas las coberturas requeridas y asegure la protección tanto del proyecto como de las partes involucradas.

Para ello, se procedió a incluir la subsanación correspondiente en las pólizas asociadas al Acta de Suspensión No. 02 y al Acta de Reinicio No. 03. Este procedimiento asegura que:

1. **Cumplimiento:** El contrato de obra queda respaldado desde el momento de su reactivación, ofreciendo garantías en caso de eventualidades durante su ejecución.
2. **Responsabilidad civil extracontractual:** Se alinea el contrato con las exigencias legales y contractuales, brindando seguridad jurídica y financiera al proyecto.

Con esta medida, se asegura la continuidad del contrato bajo un marco de garantías completas, minimizando riesgos y fortaleciendo la confianza en la ejecución de las actividades programadas. Se recomienda realizar una revisión periódica de las pólizas vigentes para asegurar su adecuada actualización y validez durante toda la vigencia del contrato.

Tabla 8. Garantías del Contrato de Obra

POLIZA CONTRATO DE OBRA						
PÓLIZA	**No.**	**ASEGURADORA**	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
					DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	435-47-994000053374 Anexo No.0	SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	$ 123.782.725,80	10/05/2023	12/03/2024
			PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	$ 30.945.681,45	10/05/2023	12/11/2026
			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 61.891.362,90	SI AMPARA 5 AÑOS	SI AMPARA 5 AÑOS
RCE	435-74-994000013171 Anexo No.0	SOLIDARIA DE COLOMBIA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 232.000.000,00	10/05/2023	10/10/2023

Tabla 9. Garantías Acta De Suspensión No. 1 y Reinicio No. 1.

POLIZA ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 1 Y REINICIO NO. 1.						
PÓLIZA	**No.**	**ASEGURADORA**	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
					DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	435-47-994000053374 Anexo No.1	SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	$123.782.725,80	10/05/2023	12/03/2024
			PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	$ 30.945.681,45	10/05/2023	12/11/2024
			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 61.891.362,90	SI AMPARA 5 AÑOS	SI AMPARA 5 AÑOS
RCE	435-74-994000013171 Anexo No.1	SOLIDARIA DE COLOMBIA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$232.000.000,00	10/10/2023	12/11/2023

Tabla 10. Garantías Acta De Suspensión No. 2 y Reinicio No. 3.

POLIZA ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 1 Y REINICIO NO. 1.						
PÓLIZA	**No.**	**ASEGURADORA**	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
					DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	435-47-994000053374 Anexo No.3	SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	$123.782.725,80	25/07/2023	10/06/2025
			PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	$ 30.945.681,45	25/07/2023	10/02/2028
			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 61.891.362,90	SI AMPARA 5 AÑOS	SI AMPARA 5 AÑOS
RCE	435-74-994000013171 Anexo No.3	SOLIDARIADE COLOMBIA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$260.000.000,00	25/03/2024	10/02/2025

Tabla 11. Garantías otro si No 2

POLIZA OTRO SI No 2						
PÓLIZA	**No.**	**ASEGURADORA**	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
					DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	435-47-994000053374 Anexo No.4	SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	$152.312.194,20	25/07/2023	10/06/2025
			PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	$ 38.078.048,55	25/07/2023	10/02/2028
			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 76.156.097,10	SI AMPARA 5 AÑOS	SI AMPARA 5 AÑOS
RCE	435-74-994000013171 Anexo No.4	SOLIDARIADE COLOMBIA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$260.000.000,00	25/03/2024	10/02/2025

5. INFROMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Tabla 11. Ficha Técnica Contrato De Interventoría

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEL CAUCA
SUPERVISIÓN:	MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO
INTERVENTOR:	RUBEN DARÍO SOLARTE GUZMA
OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESPECIALIZADA CON ÉNFASIS EN LA MODALIDAD AGROINDUSTRIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MISAK MAMÁ MANUELA, MUNICIPIO DE SILVIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA."
CONTRATO NO:	2017 - 2023
CONTRATISTA DE LA OBRA:	LEIDER VILLEGAS SANDOVAL- C.C No. 76.292.060
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($47.387.661), IVA incluido
VALOR ADICIONAL:	ONCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($11.291.917)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO.M/CTE ($58.679.578), IVA incluido.
PLAZO INICIAL:	Cinco (5) Meses
PLAZO ADICIONAL:	Dos (2) Meses
PLAZO TOTAL:	Siete (7) Meses

ACTA DE INICIO	25 DE JULIO DEL 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No 01	04 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No 02	22 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 01 A LA SUSPENSIÓN 02	22 DE FEBRERO DE 2024
PRORROGA 02 A LA SUSPENSIÓN 02	22 DE MARZO DE 2024
PRORROGA 03 A LA SUSPENSIÓN 02	23 DE MAYO DE 2024
REINICIO 3	06 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTRO SI No 1	06 DE DICIEMBRE DE 2024

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

- ✓ La interventoría supervisó el inicio de las actividades preliminares, incluyendo la atención de ítems no previstos, con el objetivo de garantizar un desarrollo adecuado y de calidad en el proyecto. En este capítulo, se logró completar el 100 % de las actividades programadas, destacando avances específicos como la demolición de losa de concreto con un 16 % y la excavación de conglomerado con un 86 %. El resto de las actividades se ejecutaron en su totalidad, evidenciando un rendimiento acorde con lo planificado y cumpliendo con los plazos establecidos en el contrato.

- ✓ Durante las actividades de cimentación, la interventoría supervisó la instalación del filtro dren francés, un ítem no previsto inicialmente, así como otros trabajos que se llevaron a cabo de manera eficiente. El capítulo refleja un avance del 72 % respecto a lo planificado. El acompañamiento constante permitió garantizar la calidad del proceso constructivo y mantener el desempeño dentro de los tiempos estipulados en el contrato.

- ✓ En el desarrollo de las estructuras en concreto, la interventoría supervisó actividades como la instalación de acero de refuerzo flejado de 60,000 PSI (420 MPa), la construcción de columnas de concreto de 3,000 PSI con secciones mayores a 30 cm, y la colocación de concreto para los muros en contrapiso. Aunque el avance registrado en este capítulo fue limitado, el rendimiento observado fue adecuado y consistente con los tiempos establecidos en el contrato, gracias al seguimiento y control de calidad realizados por la interventoría.

- ✓ La interventoría priorizó la supervisión de las actividades correspondientes a la red sanitaria, asegurando su incorporación anticipada para evitar futuras complicaciones técnicas. Las actividades incluyeron la instalación de tuberías de PVC Novafort de 6" y la construcción de cajas de inspección de 80x80 cm en concreto. El control de calidad se llevó a cabo de manera rigurosa, evidenciándose un buen rendimiento por parte del contratista, cumpliendo con las expectativas técnicas y operativas del proyecto.

- ✓ Se supervisaron las actividades del capítulo de red pluvial, necesarias para garantizar el orden constructivo y atender las demandas técnicas del proyecto. Entre las actividades desarrolladas destacan la construcción de cajas de inspección de 80x80 cm en concreto, cámaras de inspección tipo B con alturas de 1.50 a 2.00 m, la instalación de brocales con piso y tapa, y la colocación de tuberías de PVC de 6" (saneamiento) y PVC Novafort de 8". La interventoría realizó un control técnico continuo, asegurando la calidad de cada proceso y validando que el contratista alcanzara un desempeño satisfactorio, en línea con las exigencias del proyecto.

- ✓ En cumplimiento de las funciones asignadas a la interventoría en el marco del contrato No. 1740-2023, se llevó a cabo la revisión exhaustiva de la documentación presentada por el contratista para solicitar el cambio del Ingeniero Director de Obra y del Ingeniero Residente de Obra. Este proceso incluyó la validación de las hojas de vida, los certificados laborales y demás soportes, verificando que los profesionales propuestos cumplieran con los requisitos de experiencia general y específica establecidos en el pliego de condiciones. Como resultado, se constató que los ingenieros LEYDER VILLEGAS SANDOVAL y OSCAR VILLEGAS SANDOVAL cuentan con las competencias necesarias para asumir los roles propuestos, garantizando así la continuidad del proyecto con personal calificado. Cabe destacar que el aval para el cambio de estos profesionales fue otorgado el día 25 de julio de 2023. Adicionalmente, la interventoría realizó una supervisión técnica del proceso de transición entre los responsables salientes y los nuevos profesionales. Esta labor incluyó la coordinación para asegurar que la información técnica y administrativa pertinente fuera transferida de manera eficiente, minimizando el impacto en la ejecución del contrato. Así mismo, se verificó que los nuevos responsables se encuentran familiarizados con las actividades en curso, los cronogramas establecidos y las especificaciones técnicas del proyecto, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los objetivos del contrato y la calidad de las obras.

- ✓ La interventoría mantuvo un control exhaustivo en cada etapa del proyecto, asegurando que las actividades ejecutadas cumplieran con los estándares de calidad, rendimiento y cronograma establecidos. Pese a los desafíos en algunos capítulos, el avance global del proyecto refleja un trabajo coordinado que permite avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos contractuales

5.3 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 12. Avance Financiero Interventoría

VALOR INICIAL CONTRATO DEINTERVENTORIA	$47.387.661
VALOR ADICIONAL	$11.291.917
VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	$58.679.578
VALOR POR EJECUTAR:	$58.679.578

5.4 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El contratista ha constituido una garantía a favor del Departamento del Cauca, la cual incluye los siguientes amparos:

Tabla 13. Garantías del Contrato Inicial

CONTRATO PRINCIPAL						
PÓLIZA	**No.**	**ASEGURADORA**	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
					DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	CCS-100021623 Anexo No.0	SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	$ 9.477.532,20	27/06/2023	30/03/2024
			PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	$ 2.369.383,05	27/06/2023	30/11/2026
			CALIDAD DEL SERVICIO	$ 9.477.532,20	SI AMPARA 5 AÑOS	SI AMPARA 5 AÑOS

Tabla 14. Garantías Acta De Suspensión No. 1 y Reinicio No. 1.

POLIZA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 Y REINICIO No. 1						
PÓLIZA	**No.**	**ASEGURADORA**	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
					DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	CCS-100021623 Anexo No.1	SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	$ 9.477.532,20	18/10/2023	02/06/2024
			PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	$ 2.369.383,05	18/10/2023	02/02/2027
			CALIDAD DEL SERVICIO	$ 9.477.532,20	SI AMPARA 5 AÑOS	SI AMPARA 5 AÑOS

Tabla 15. Garantías acta de suspensión No. 2 y reinicio 3

POLIZA ACTA SUSPENSIÓN No. 2 Y REINICIO No. 2						
PÓLIZA	**No.**	**ASEGURADORA**	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
					DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	CCS-100021623 Anexo No.2	SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	$ 9.477.532,20	06/11/2024	20/04/2025
			PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	$ 2.369.383,05	06/11/2024	20/12/2024
			CALIDAD DEL SERVICIO	$ 9.477.532,20	SI AMPARA 5 AÑOS	SI AMPARA 5 AÑOS

Tabla 16. Garantías Otro si No 1

POLIZA OTRO SI No 1						
PÓLIZA	**No.**	**ASEGURADORA**	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
					DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	CCS-100021623 Anexo No.4	SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	$ 11.735.915,00	06/12/2024	05/05/2024
			PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	$ 2.933.978,90	06/12/2024	05/01/2028
			CALIDAD DEL SERVICIO	$ 11.735.915,60	SI AMPARA 5 AÑOS	SI AMPARA 5 AÑOS

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDADES PRELIMINARES



Se lleva a cabo la actividad de excavación y perfilado, tras lo cual se procederá a la cimentación de la estructura proyectada.



Se realizan actividades de excavación de zanjas para la implementación de sistemas de alcantarillado, acueducto y obras de drenaje.

CIMENTACION



Se lleva a cabo la construcción de vigas de cimentación con su respectiva formaleta, garantizando la capacidad portante del suelo para soportar las cargas de la estructura.



Se instala el acero de refuerzo para la zapata de cimentación, el cual garantiza mayor resistencia y ductilidad al concreto empleado en la misma.



Zapata de cimentación finalizada, evidenciando que el concreto ha completado su periodo de fraguado, superando las 24 horas.



Se realiza la fundición de vigas de cimentación en concreto, con el propósito de interconectar toda la cimentación y servir como base para soportar la estructura en altura.

ESTRUCTURAS DE CONCRETO



Columna de concreto finalizada, reforzada con acero para aumentar su resistencia y optimizar su comportamiento frente a flexocompresión y cargas axiales, asegurando su capacidad para soportar las cargas propias de la estructura.



Instalación y localización de formales para la posterior fundición de las columnas en concreto



Se instala papel plástico en las columnas para asegurar una humedad adecuada y garantizar el correcto curado del concreto.
TOMA DE MUESTRAS ENSAYO DE LABORATORIO

Se realiza la toma de muestras para ensayos de densidad y humedad en el suelo, con el fin de garantizar la calidad técnica y la durabilidad de la estructura que se planea construir.



Se realiza la toma de datos del ensayo de cono de arena y densidades para un agregado fino, lo que permitirá obtener un estimado de la densidad y evaluar la resistencia del suelo donde se ubicará la cimentación.

RED SANITARIA



Se realiza la instalación de drenaje francés con el fin de prevenir que el agua subterránea y superficial penetre o dañe los cimientos de los edificios.



Instalación y construcción de cámara sanitaria para la recolección de redes pluviales que deben ser evacuadas de la estructura



Se realizó la construcción de una cámara de inspección con el propósito de establecer un punto de control estratégico y funcional sobre la red de alcantarillado instalada para el salón de especialidad agroindustrial. Esta estructura permite verificar el correcto funcionamiento del sistema, facilitando su monitoreo, mantenimiento y optimización. Con ello, se busca garantizar la eficiencia operativa y prolongar la vida útil de la infraestructura instalada.

ITEMS NO PREVISTOS



Se llevó a cabo la instalación de geotextil con el propósito de actuar como filtro eficiente para el manejo del agua, debido a la presencia de escorrentía y un nivel freático superficial en la zona intervenida. Este material permite la separación, filtración y drenaje del agua, evitando la saturación del suelo y promoviendo su estabilidad.



Se realizó un relleno utilizando material de adición adecuado, seleccionado específicamente para trabajar en conjunto con el geotextil previamente instalado. Este procedimiento tiene como objetivo principal mitigar el drenaje superficial y garantizar una gestión eficiente del agua en la zona intervenida.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contrato refleja un avance significativo en relación con los tiempos establecidos, con un porcentaje ejecutado del 37.90 %, superando el 34.3 % programado. Este rendimiento superior es un indicador clave que demuestra la viabilidad de cumplir con todas las actividades planificadas dentro de los plazos contractuales establecidos.

Por su parte, la interventoría ha llevado a cabo un seguimiento y control exhaustivo del contratista, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los alcances definidos en el proyecto. Estas acciones incluyen revisiones periódicas de los avances físicos, la calidad de los trabajos y el cumplimiento del cronograma, permitiendo la detección y corrección oportuna de cualquier desviación.

De igual manera, se llevaron a cabo los ensayos de densidad utilizando el método del Cono de Arena (INV E 161-13), con el propósito de verificar las densidades y comprobar el grado de compactación en los materiales de relleno compactados artificialmente, donde se exige especificaciones de humedad y densidad. En este caso, se empleó un ensayo Proctor Modificado para determinar la consistencia y densidad del material, así como para rectificar la humedad natural presente en el suelo. La interventoría supervisó y verificó que estos ensayos cumplieran con los requerimientos técnicos establecidos, garantizando así la calidad y durabilidad del proyecto en ejecución.

La comunicación constante entre el contratista y la interventoría ha sido un pilar fundamental para la resolución ágil de problemas surgidos durante la ejecución. Esta colaboración efectiva ha permitido mitigar retrasos y garantizar que las actividades continúen con fluidez, un factor crucial para el éxito del proyecto.

En términos generales, las actividades realizadas por el contratista presentan un nivel satisfactorio de calidad y cumplen con las normativas aplicables al diseño y construcción del proyecto. Se han alcanzado los estándares requeridos en seguridad, funcionalidad y acabados, reflejando una ejecución adecuada y una coordinación eficiente entre los actores involucrados.

Finalmente, se recomienda enfocar esfuerzos en la optimización y agilización de las tareas pendientes, adoptando estrategias efectivas de planificación y ejecución que permitan garantizar la culminación del 100 % de las obras contractuales dentro del plazo estipulado. Esto implica priorizar actividades críticas, asegurar la disponibilidad de recursos humanos y materiales, y coordinar adecuadamente a todos los equipos involucrados en el proyecto.

Asimismo, se sugiere implementar un seguimiento constante del avance de las actividades para identificar posibles contratiempos a tiempo y tomar medidas correctivas de manera inmediata. De este modo, se garantizará no solo el cumplimiento de los plazos, sino también la calidad y eficiencia en la entrega final, asegurando el logro integral de los objetivos establecidos para el proyecto.

Cordialmente;



RUBEN DARIO SOLARTE GUZMAN
R.L OCINC INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

8. ANEXOS

BITACORA DE OBRA

Scanned with CamScanner

Martes 25 de Julio de 2023

Se firma el acta de inicio del contrato de Obra N° 1740-2023 en la plataforma del SECOP II

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Periodo del Miercoles 26 de Julio de 2023 al Martes 03 de Octubre de 2023

Durante este periodo se realizan revisiones de los diseños entregados por la entidad contratante, encontrando presuntas inconsistencias, en diversos comites se revisan las observaciones, mediante oficio el contratista de Obra solicito la suspensión del contrato justificando los motivos por lo cual la interventoria avala la suspensión del contrato.

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Miercoles 04 de Octubre de 2023

Se realiza la suspensión del contrato de Obra 1740-2023 en la plataforma del SECOP II

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Miercoles 01 de Noviembre de 2023

Se firma el acta de reinicio N° 01 del contrato de Obra 1740-2023 en la plataforma del SECOP II.

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Jueves 02 de Noviembre de 2023

Se realiza visita al sitio de obra para coordinar el inicio de actividades que no se encuentran sujetas a un ajuste de obra. Clima: Soleado

Personal en Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoria, Maestro de Obra

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Viernes 03 de Noviembre de 2023

Se realiza la localización del área a intervenir para la construcción del Aula Especializada, se realiza recorrido en la zona de instalación de tuberia sanitaria y pluvial, encontrando que es necesario realizar un cambio en la ubicación del cabezal de entrega de la tubería pluvial ya

que según los planos este debe entregarse en un lote junto al rio, lote que no pertenece a la institución educativa, por lo cual no es posible construir el cabezal en este lugar y se debe cambiar al lote perteneciente al colegio. Tambien se observa la necesidad de demoler un área de losa para la instalacion de la tuberia que conduce a la PTAR. Clima en Obra: Soleado, Personal en Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoria, 1 maestro de Obra 1 ayudante. Equipo: Herramienta Menor.

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

- Sabado 04 de Noviembre de 2023

No se realizan actividades en obra.

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

- Domingo 05 de Noviembre de 2023

No se realizan actividades en obra.

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

- Lunes 06 de Noviembre de 2023

Se realiza localización y replanteo de la tuberia sanitaria y pluvial para iniciar las excavaciones. Clima: Nublado, Personal en obra: Residente de Obra, Residente de Interventoria. 1 maestro y 1 ayudante.

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra.

- Martes 07 de Noviembre de 2023

Se inician las excavaciones para instalación de tuberia sanitaria desde el cuarto especializado hacia PTAR existente Clima: Nublado en la mañana - Soleado en la tarde. Personal en Obra: Residente de Obra, Residente de interventoria 1 maestro y 1 ayudante. Equipo: Herramienta Menor

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

- Miercoles 08 de Noviembre de 2023

Se continua con las excavaciones para instalacion de tuberia sanitaria Clima: Soleado. Personal en Obra: Residente de Obra, 1 maestro, 1 ayudante

Oscar E Villegas

Scanned with CamScanner

Jueves 09 de Noviembre de 2023

Se continuan los trabajos de excavación, el material no es material común, es un conglomerado, lo cual reduce el rendimiento de los trabajadores. Clima: Lloviznas leves. Personal en Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoria, 1 maestro y 1 ayudante. Equipo: Herramienta Menor

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra.

Viernes 10 de Noviembre de 2023

Se presentan fuertes lluvias que impiden el trabajo de excavaciones, se suspenden las actividades. Personal en Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoria. 1 maestro y 1 ayudante.

Oscar E Villegas
Ing Residente de Obra
Ing. Oscar Eduardo Villegas

Sábado 11 de Noviembre de 2023

No se realizan actividades en obra.

Oscar E Villegas
Ing Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Domingo 12 de Noviembre de 2023

No se realizan actividades en obra.

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Lunes 13 de Noviembre de 2023

Dia festivo, no se realizan actividades en obra

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Martes 14 de Noviembre de 2023

Se continuan las excavaciones hacia la PTAR existente incluyendo la excavación para las cajas de inspección. Clima: Soleado. Personal en Obra: Residente de obra. Residente de Interventoria. 1 maestro y 2 ayudantes.
Equipo: Herramienta Menor

Oscar E Villegas
Ing Oscar Eduardo Villegas
Residente de obra

Scanned with CamScanner

Miercoles 15 de Noviembre de 2023

Se finalizan las excavaciones para la tuberia sanitaria hasta la PTAR existente, en una revision de la PTAR se corrobora que esta se encuentra llena ya que recibe multiples aguas servidas de la institucion educativa. Clima: Soleado Personal en Obra: Residente de Obra. Residente de Interventoria. 1 maestro y 2 ayudantes. Equipo: Herramienta Menor

Oscar E Villegas
Ing Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Jueves 16 de Noviembre de 2023

Se inicia la instalación de la tuberia sanitaria (Novafort 6"), instalación de tuberia y relleno de zanjas. Clima: Nublado Personal en Obra: Residente de Obra. Residente de interventoria 1 maestro y 2 ayudantes Equipo: Herramienta Menor.

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra.

Viernes 17 de Noviembre de 2023

Se continua la instalacion de tuberia sanitaria y relleno de zanjas
Clima: Nublado. Personal en Obra: Residente de Obra 1 maestro y 1 ayudante.

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Sábado 18 de Noviembre de 2023

No se realizan actividades en Obra

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Domingo 19 de Noviembre de 2023

No se realizan actividades en obra

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Lunes 20 de Noviembre de 2023

Continua la instalacion de tuberia sanitaria y relleno de zanjas, la zona de la losa existente no ha sido intervenida. Clima: Soleado
Personal en Obra: Residente de Obra. 1 maestro 1 ayudante Equipo: Herramienta menor

Oscar E Villegas
Ing Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Martes 21 de Noviembre de 2023

Se finaliza la instalación de tubería sanitaria y relleno de zanjas se inicia armado de formaletas para cajas de inspección. Clima: Soleado Personal en Obra: Residente de Obra. Residente de Interventoría 1 maestro 1 ayudante Equipo: Herramienta Menor

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Miercoles 22 de Noviembre de 2023

Se inicia instalación de formaletas para cajas de inspección del tramo sanitario. Clima: Soleado. Personal en Obra: Residente de Obra. Residente de Interventoría. 1 maestro 1 ayudante. Equipo: Herramienta menor.

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Jueves 23 de Noviembre de 2023

Se realiza la fundición de cajas de inspección del tramo sanitario. Clima: Soleado. Personal en Obra: Residente de Obra 1 maestro 2 ayudantes Equipo: Herramienta Menor.

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Viernes 24 de Noviembre de 2023

Se desinstalan las formaletas de las cajas de inspección Fundidas y se instalan en las excavaciones restantes para realizar la fundición de los ultimos cajas de inspección. Clima: Nublado. Personal: Residente de Obra. Residente Interventoría 1 maestro 2 ayudantes Equipo: Herramienta Menor.

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Sabado 25 de Noviembre de 2023

Se realiza la fundición de las cajas de inspección restantes del tramo sanitario. Clima: Soleado. Personal en Obra: Residente de Obra 1 maestro 1 ayudante. Equipo: Herramientas Menor

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Scanned with CamScanner

Domingo 26 de Noviembre de 2023

No se realizan actividades en obra

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Lunes 27 de Noviembre de 2023

Se localiza la ubicación de la cámara de inspección pluvial se inicia su excavación. Clima: Nublado. Personal en Obra: Residente de Obra, Residente de interventoria 1 maestro 1 ayudante Equipo: Herramienta menor.

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Martes 28 de Noviembre de 2023

Se finaliza excavación para la cámara de inspección se inicia excavación para instalación de tubería Novafort 8" pluvial, de igual forma que la tubería sanitaria, esta excavación no es en material común sino en conglomerado Clima: Nublado Personal: Residente de Obra. Residente Interventoria 1 maestro 1 ayudante Equipo: Herramienta Menor

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Miercoles 29 de Noviembre de 2023

Continua la excavación para tubería pluvial incluyendo excavación para cajas de inspección Clima: Nublado Personal: Residente de Obra Residente de interventoria 1 maestro 1 ayudante. Equipo: Herramienta Menor

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Jueves 30 de Noviembre de 2023

Se continua la excavación para instalación de tubería pluvial el trabajo se hace intermitente a causa del clima. Clima: Lluvias durante el día. Personal en obra: Residente de Obra. Residente Interventoria. 1 maestro 1 ayudante Equipo: Herramienta menor

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Scanned with CamScanner

Viernes 01 de diciembre de 2023

Se continua la excavacion para la tuberia pluvial, se realiza limpieza en la zona de construcción del cabezal de entrega. Se proyecta finalizar la excavación el dia lunes. Clima: Nublado. Personal en Obra. Residente de Obra. Residente Interventoria 1 maestro 1 ayudante. Equipo: Herramienta Menor

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Sábado 02 de diciembre de 2023

No se realizan actividades en obra

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Domingo 03 de diciembre de 2023

No se realizan actividades en obra

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Lunes 04 de diciembre de 2023

Se finaliza la excavación para la tuberia pluvial. Clima: Soleado

Personal: Residente de Obra, Residente de Interventoria. 1 maestro 1 ayudante

Equipo: Herramienta menor

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Martes 05 de diciembre de 2023

Se inicia la instalación de la tuberia pluvial (Novafort 8") entre la cámara de inspección y el cabezal de entrega, se instala el tramo de tuberia Novafort 6" entre la caja de inspección final y la cámara de inspección. Clima: Soleado. Personal: Residente de Obra, Residente Interventoria 1 maestro 2 ayudantes. Equipo: Herramienta Menor

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Miercoles 06 de diciembre de 2023

Se continua la instalación de la tuberia pluvial (Novafort 8"). Clima: Soleado

Personal: Residente de Obra. Residente Interventoria. 1 maestro 1 ayudante.

Equipo: Herramienta menor

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra.

Jueves 07 de diciembre de 2023

Se continua la instalacion de tuberia pluvial, se trabajo de manera intermitente por causa del clima en la zona. Clima: Lluvias fuertes intermitentes. Personal: Residente de Obra. Residente interventoria, 1 maestro 1 ayudante. Equipo: Herramienta menor

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Viernes 08 de diciembre de 2023

Dia festivo no se realizan actividades en obra

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Sabado 09 de diciembre 2023

No se realizan actividades en obra

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Domingo 10 de diciembre 2023

No se realizan actividades en Obra

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Lunes 11 de diciembre de 2023

Se finalizan la instalación de tuberia Novafort 8" y el relleno de la excavación, pendiente fundicion cámara de inspección, cajas de inspección y ~~[illegible]~~ cabezal de entrega. Clima: Nublado. Personal: Ing. Residente de Obra. Residente Interventoria 1 maestro y 1 ayudante. Equipo: Herramienta menor

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Martes 12 de diciembre de 2023

Se realiza armado e instalacion de formaleta para cámara de inspección, se instala formaleta para fundicion de 2 cajas de inspección, Clima: Soleado. Personal: Residente de Obra. Residente de Interventoria. 1 maestro 1 ayudante. Equipo: Herramienta Menor

Oscar E Villegas

Scanned with CamScanner

Miercoles 13 de diciembre de 2023

Se realiza fundicion de cámara de inspección y cajas de inspección Adicionalmente se instala formaleta para fundición de cabezal de entrega. Clima: Soleado. Personal: Residente de Obra. Residente de Interventoria. 1 maestro 3 ayudantes. Equipo: Herramienta Menor

Oscar E Villegas
Ing Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Jueves 14 de diciembre de 2023

Se instala formaleta para brocal de la cámara de inspección Se realiza fundición del concreto ciclopeo del cabezal de entrega Se retiran formaletas de las cajas de inspección. Clima: Soleado Personal: Residente de Obra. Residente de interventoria 1 maestro 3 ayudantes Equipo: Herramienta Menor.

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Viernes 15 de diciembre de 2023

Se realiza fundición del brocal y tapa de la cámara de inspección adicionalmente se realiza fundición del cabezal de entrega Clima: Nublado. Personal en Obra: Residente de Obra. Residente de Interventoria 1 maestro 2 ayudantes. Equipo: Herramienta menor

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Sábado 16 de diciembre de 2023

Se inicia la excavacion para el reemplazo de suelo en el área de construcción del aula especializada, se realiza excavación de pozos para abatimiento del nivel freático. Clima Nublado. Personal en Obra: Residente de Obra. Residente de Interventoria 1 operario 2 conductores. Equipo. Pajarita de llantas, 2 volquetas sencillas

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Domingo 17 de diciembre de 2023

No se realizan actividades en obra

Oscar E Villegas
Ing Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Scanned with CamScanner

Lunes 18 de diciembre de 2023

Se continua la excavacion a máquina para el reemplazo de suelo, se continua con el bote de escombros de la excavacion y se continua con el bombeo una vez se termina la excavacion bajo agua de los pozos. Clima: Soleado. Personal en Obra: Residente de Obra Residente Interventoria 1 Operario 2 conductores 1 maestro 1 ayudante. Equipo 1 pajarita, 2 volquetas sencillas, herramienta menor.

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Martes 19 de diciembre de 2023

Continuan labores de excavación a maquina y retiro de escombros, se continua el bombeo de los pozos. Para garantizar el ingreso de los vehiculos el canal se encuentra protegido. Clima: Soleado. Personal en obra: Residente de Obra. Residente de Interventoria. 1 operario 2 conductores. Equipo 1 pajarita 2 volquetas sencillas.

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Miercoles 20 de diciembre de 2023

Sigue la excavación a máquina, el bombeo y el retiro de escombros. Clima: Nublado. Personal: Residente de Obra. Residente de interventoria 1 operario 2 conductores. Equipo: 1 pajarita, 2 volquetas sencillas

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Jueves 21 de diciembre de 2023

Se termina la excavación a maquina y el retiro de escombros, el bombeo continua. Clima: Nublado. Personal en obra: Residente de Obra. Residente de Interventoria 1 operario. 2 conductores. Equipo 1 pajarita y 2 volquetas sencillas

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Scanned with CamScanner

Viernes 22 de diciembre de 2023

Se realizo suspensión N° 02 del contrato de Obra 1740-2023 en la plataforma Secop II.

Oscar E Villegas
Ing Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Miercoles 06 de noviembre de 2024

Se realiza el reinicio N° 02 del contrato de Obra 1740-2023 en la plataforma SECOP II teniendo en cuenta que ya se cuenta con la viabilidad del ajuste solicitado en Planeación departamental

Oscar E Villegas
Ing Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Jueves 07 de noviembre de 2024

Se realiza instalación de geotextil en el piso y paredes de la excavacion según recomendaciones del estudio de suelos, inicia el figurado de acero para cimentación. Una vez instalado el geotextil inicia el relleno con material adecuado segun estudio de suelos. Clima: Nublado. Personal en obra Residente de Obra Residente de interventoria 1 Operario. 3 conductores. 1 maestro 4 ayudantes. Equipo: 1 pajarita. 3 volquetas sencillas, Herramienta menor

Oscar E Villegas
Ing Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Viernes 08 de noviembre de 2024

Continua relleno con material adecuado segun estudio de suelos, continua flejado de acero de refuerzo para cimentación. Ingresa piedra filtro para dren frances. Clima: Nublado Personal en Obra Residente de Obra, Residente de Interventoria. 2 operarios. 4 conductores 1 maestro. 4 ayudantes. Equipo: 1 pajarita. 1 vibrocompactador 4 volquetas sencillas. Herramienta menor

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Sabado 09 de noviembre de 2024

Se continua y termina el relleno con material adecuado, se inicia ingreso de material para ultima capa de relleno (Material Seleccionado) según especificaciones del estudio de suelos, se figura acero de refuerzo para cimentación y columnas. Clima: Nublado. Personal

Scanned with CamScanner

en Obra: Residente de Obra. Residente de Interventoria. 2 operarios 1 maestro 4 ayudantes. Equipo: 1 pajarita, 1 vibrocompactador, 6 volquetas sencillas. Herramienta menor

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Domingo 10 de noviembre de 2024

Se finaliza el relleno segun especificaciones del estudio de suelos. Clima: Nublado. Personal en Obra Residente de Obra Residente de Interventoria 2 operarios Equipo 1 pajarita 1 vibrocompactador 6 volquetas sencillas

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Lunes 11 de noviembre de 2024

Se realiza localizacion y replanteo del aula especializada, se inician excavaciones para el dren frances, continua figurado de acero de refuerzo. Clima: Nublado. Personal en Obra: 1 Operario Residente de Obra. 1 maestro 4 ayudantes. Equipo: Herramienta menor. 1 pajarita

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Martes 12 de noviembre de 2024

Continua la excavación para el dren frances, inicia excavación para zapatas. Clima: Soleado. Personal en obra: 1 Operario Residente de Obra Residente de Interventoria 1 maestro 6 ayudantes. Equipo: 1 pajarita. Herramienta menor

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Miercoles 13 de noviembre de 2024

Finaliza excavación para dren Frances, inician construcción del mismo con la instalación del geotextil en el piso y paredes de la excavación, continuan excavaciones para zapatas Clima: Soleado Personal en obra: Residente de Obra, Residente Interventoria 1 operario 1 maestro 4 ayudantes Equipo 1 pajarita Herramienta menor

Scanned with CamScanner

Jueves 14 de noviembre de 2024
Se realiza instalacion de tuberia perforada y fundición de caja de inspección para dren frances, inicia llenado del dren con la piedra filtro, se finaliza la excavación para zapatas Clima: Nublado Personal en obra: Residente de Obra Residente de interventoria 1 maestro 4 ayudantes. Equipo: Herramienta menor

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de obra

Viernes 15 de noviembre de 2024
Se continua el llenado del dren con la piedra filtro, se inicia fundicion de soladas de limpieza en las zapatas, se inicia excavación para vigas de cimentación Clima: Soleado Personal en obra: Residente de Obra Residente de interventoria 1 maestro 6 ayudantes Equipo: Herramienta menor, Mezcladora de concreto

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Sábado 16 de noviembre de 2024
Se finaliza el llenado del dren con la piedra filtro, se finaliza fundicion de soladas de zapatas, se inicia instalación de acero de refuerzo, continua la excavacion para las vigas de cimentación Clima: Soleado. Personal en obra: Residente de Obra. Residente de Interventoria 1 maestro 4 ayudantes Equipo: Herramienta menor, Mezcladora de concreto

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Domingo 17 de noviembre de 2024
Se finaliza instalación de acero de refuerzo de zapatas y columnas, se finaliza excavación de vigas de cimentacion se inicia fundicion de soladas de vigas. Clima: Nublado. Personal en Obra: Residente de Obra. Residente de Interventoria 1 maestro 4 ayudantes. Equipo: Herramienta menor, Mezcladora

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de obra

Scanned with CamScanner

Lunes 18 de Noviembre de 2024

Se realiza fundicion de zapatas e inicia instalación de acero de refuerzo para vigas de cimentación. Clima: Soleado Personal en Obra: Residente de Obra 1 maestro 4 ayudantes Equipo: Herramienta Menor, mezcladora

Oscar E Villegas
Ing Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Martes 19 de Noviembre de 2024

Se finaliza instalación de acero de refuerzo de vigas de cimentación, se inicia la fundición de ésta vigas (principales) se continuara con la fundicion de muro cimentación para muros Clima: Nublado. Personal en Obra: Residente de Obra Residente de Interventoria 1 maestro 4 ayudantes Equipo: Herramienta menor Mezcladora de concreto

Oscar E Villegas
Ing Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Miercoles 20 de Noviembre de 2024

Se Finaliza Fundicion de vigas de cimentacion para muros según diseño estructural. Se inicia instalación de formaletas para fundicion de columnas. Clima: Nublado. Personal en Obra: Residente de Obra. Residente de Interventoria 1 maestro 4 ayudantes. Equipo Herramienta menor, mezcladora.

Oscar E Villegas
Ing Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Jueves 21 de Noviembre de 2024

Se inica Fundicion de columnas, se termina instalación de formaletas para columnas restantes. Clima: Nublado. Personal en obra: Residente de Obra. Residente de interventoria 1 maestro 4 ayudantes. Equipo: Herramienta menor, mezcladora

Oscar E Villegas
Ing. Oscar Eduardo Villegas
Residente de Obra

Scanned with CamScanner

Viernes 22 de noviembre de 2024

Se finaliza fundicion de columnas, se programa desencofrado para la próxima semana. Clima: Nublado. Personal en Obra: Residente de Obra. Residente de Interventoria 1 maestro 4 ayudantes. Equipo: Herramienta menor. mezcladora de concreto

Oscar E Villegas

Ing. Oscar Eduardo villegas
Residente de Obra

Scanned with CamScanner

ENSAYOS DE LABORATORIO

Scanned with CamScanner

GEOANALISIS - LAB
Laboratorio de Concretos, Suelos y Pavimentos

ENSAYO DE DENSIDAD EN EL TERRENO

METODO DEL CONO Y LA ARENA (INV E-161 - 13)

FECHA : 11 DE NOVIEMBRE DE 2024
PROYECTO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNA AULA ESPECIALIZADA CON ENFASIS EN LA MODALIDAD AGROINDUSTRIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MISAK MAMA MANUELA, MUNICIPIO DE SILVIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
UBICACIÓN: INSTITUCION EDUCATIVA MISAK MAMA MANUELA, RESGUARDO INDIGENA DE GUAMBIA, MUNICIPIO DE SILVIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
SOLICITA: LEYDER VILLEGAS SANDOVAL
MATERIAL: MATERIAL DE MEJORAMIENTO

Densidad #:	**PR**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Abscisa:						
Peso frasco inicial.	grs.	6800	6752	6720	6712	6654
Peso frasco final.	grs.	3260	3148	3162	3160	2816
Peso arena total usada.	grs.	3540	3604	3558	3552	3838
Constante del cono.	grs.	1780	1780	1780	1780	1780
Peso arena en el hueco.	grs.	1760	1824	1778	1772	2058
Densidad de la arena.	grs/c.c.	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452
Vol. Del hueco.	c.c.	1212	1256	1225	1220	1417
Peso material fino humedo.	grs.	2142	2344	2110	2226	2504
Humedad.	%	14,4	14,3	14,0	11,0	9,3
Peso material fino seco.	grs.	1872	2050	1850	2005	2292
Peso material grueso humedo.		605	434	542	450	486
Humedad.		1	1	1	1	1
Peso material grueso seco.		599	430	537	446	481
peso total del material seco	grs.	2471	2480	2387	2450	2773
Densidad seca.	grs/c.c.	2,04	1,97	1,95	2,01	1,96
Densidad max. De lab.	grs/c.c.	2,033	2,033	2,033	2,033	2,033
Humedad optima.	%	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70
Compactacion.	%	100,3	97,1	95,9	98,8	96,2
Compactacion Especificada	%					

HUMEDAD

Capsula No.		1	2	1	1	1
Peso cap. + wh.	grs.	338,00	322,10	315,00	319,00	315,00
Peso cap. + ws.	grs.	304,25	290,42	284,12	294,12	294,12
Peso capsula.	grs.	70,23	69,53	64,12	68,56	68,56
Humedad.	%	14,4	14,3	14,0	11,0	9,3

Observaciones:

ESTUDIO DE SUELOS-ENSAYOS DE LABORATORIO-CONTROL DE CALIDAD
Calle 42N No.6-28 Barrio Vega de Prieto Tel. 8202306 Cel.3154683980 Popayán
Email:geoanalisislab@hotmail.com

Scanned with CamScanner


GEOANALISIS - LAB
Laboratorio de Concretos, Suelos y Pavimentos

ENSAYO DE COMPACTACIÓN EN LABORATORIO
(NORMA I.N.V. E - 142)

FECHA: 2 DE AGOSTO DE 2024
OBRA: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNA AULA ESPECIALIZADA CON ENFASIS EN LA MODALIDAD AGROINDUSTRIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MISAK MAMA MANUELA, MUNICIPIO DE SILVIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
UBICACIÓN: INSTITUCION EDUCATIVA MISAK MAMA MANUELA, RESGUARDO INDIGENA DE GUAMBIA, MUNICIPIO DE SILVIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
SOLICITA: LEYDER VILLEGAS SANDOVAL
MATERIAL: MATERIAL DE MEJORAMIENTO

DENSIDAD	PESO MOLDE + SUELO COMPACTADO (gr)	11152	11221	11288	11326
	PESO MOLDE (gr)	6500	6500	6500	6500
	PESO SUELO COMPACTADO (gr)	4652,0	4721,0	4788,0	4826,0
	VOLUMEN DEL MOLDE (c.c.)	2068,6	2068,6	2068,6	2068,6
	DENSIDAD HÚMEDA (gr/c.c.)	2,249	2,282	2,315	2,333
	DENSIDAD SECA (gr/c.c.)	2,020	2,029	2,032	2,026
HUMEDAD	TARA No	1	2	3	4
	PESO SUELO HUMEDA + TARA (gr)	74,01	89,18	75,76	78,05
	PESO SUELO SECO + TARA (gr)	67,25	79,81	67,13	68,46
	PESO TARA (gr)	7,58	4,78	4,96	5,25
	PESO AGUA (gr)	6,8	9,4	8,6	9,6
	PESO SUELO SECO (gr)	59,7	75,0	62,2	63,2
	HUMEDAD (%)	11,3	12,5	13,9	15,2

PROCTOR MODIFICADO

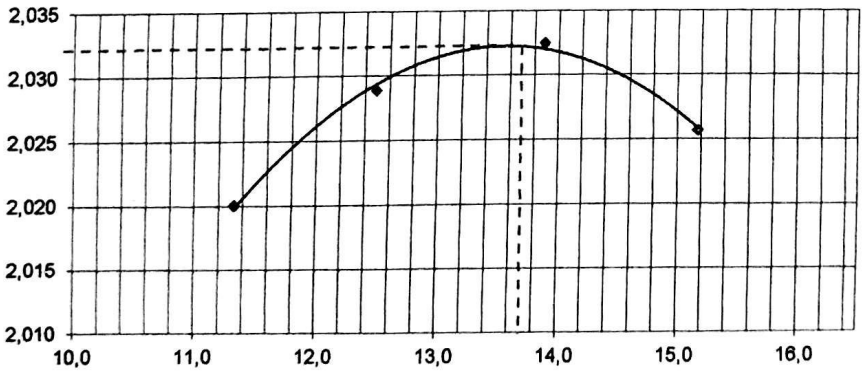

TIPO DE ENSAYO
PROCTOR MODIFICADO

VOL. MOLDE:	2068,6
PESO MART.:	10 lb
No CAPAS:	5
H. CAÍDA:	18 "
#GOLPES	56

ENSAYO SOBRE MATERIAL

PASA TAMIZ: **3/4"**

RESULTADOS:	
Densidad Max Seca	**2,033 gr/cm³**
% Humedad Optima	**13,70**

OBSERVACIONES:

ESTUDIO DE SUELOS-ENSAYOS DE LABORATORIO-CONTROL DE CALIDAD
Calle 42N No.6-28 Barrio Vega de Prieto Tel. 8202306 Cel.3154683980 Popayán
Email:geoanalisislab@hotmail.com

Luis Enrique Tobar Plaza
Geoanalisis - Lab
MAT. 19615096060 CAU

Scanned with CamScanner

POLIZAS

Scanned with CamScanner

seguros mundial
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.06.27 11:23:09 -05'00'

Código de Seguridad: Zn6I17PKMf2uxV9sB6P6Ag==

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLASICA DEL 06-04-2021 1317 P.M.

No. PÓLIZA CCS-100021623 **No. ANEXO** 0 **No. CERTIFICADO** 100007536 **No. RIESGO**

TIPO DE DOCUMENTO **FECHA DE EXPEDICIÓN** 27/06/2023 **SUC EXPEDIDORA** CEN CALI SUR

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del 27/06/2023	24:00 Horas Del 30/11/2028		N/A	N/A

TOMADOR	OCINC INGENIERIA SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.849.031-8
DIRECCIÓN	CL 20 B N 7 B 18	**TELÉFONO**	3148579565
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	**No. DOC. IDENTIDAD**	891.580.016-8
DIRECCIÓN	CARRERA 6 CALLE 22 NORTE NO 22N-02	**TELÉFONO**	8215535
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	**No. DOC. IDENTIDAD**	891.580.016-8
DIRECCIÓN	CARRERA 6 CALLE 22 NORTE NO 22N-02	**TELÉFONO**	8215535

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO 2017-2023 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCION DE UN AULA ESPECIALIZADA CON ENFASIS EN LA MODALIDAD AGROINDUSTRIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MISAK MAMA MANUELA, MUNICIPIO DE SILVIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE GARANTIA TENDRA UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DEL ASEGURADO, LA CUAL DEBERA SER REPORTADA OPORTUNAMENTE A LA COMPAÑIA ASEGURADORA.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 27/06/2023	24:00 Horas Del 30/03/2024	9.477.532,20	17.981,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 27/06/2023	24:00 Horas Del 30/11/2026	2.369.383,05	16.255,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 30/11/2023	24:00 Horas Del 30/11/2028	9.477.532,20	85.391,00

TOTAL ASEGURADO $ 21.324.447,45

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
JAVIER PAZ SUAREZ Y CIA LTDA SUS ASESORES	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	119.627,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	119.627,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	24.679,00
TOTAL A PAGAR	$	148.306,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/06/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACION DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA)

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PSE.COM.CO/MUNDIAL O A NUESTRO CANAL TRANSACCIONAL, DIGITE EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VERIFICA LA EXPEDICIÓN DE ESTAS ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 10 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990 **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACIÓN AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA POLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE TENGO A MI DISPOSICION LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA MANIFIESTO ADEMAS QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACION ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI INDICADO SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA ASI COMO LAS GARANTIAS EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA POLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO

Firma Autorizada Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA ARBELAEZ VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.670

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Scanned with CamScanner

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA: RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APP

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CCS-100021623** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **OCINC INGENIERIA SAS** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO DEL CAUCA / DEPARTAMENTO DEL CAUCA ,** expedida por la Compañía en **27/06/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN CALI SUR a los **27** días del mes **JUNIO** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

Scanned with CamScanner

seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.11.18 11:37:19 -05:00

Código de Seguridad: dk3ypnnnddaZkWv1ZBHobQ==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021 1317 P 05-PPSUS20000000059 D007

No. PÓLIZA CCS-100021623 **No. ANEXO** 2 **No. CERTIFICADO** 100126701 **No. RIESGO**

TIPO DE DOCUMENTO **FECHA DE EXPEDICIÓN** 18/11/2024 **SUC. EXPEDIDORA** CEN CALI SUR

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del	27/06/2023	24:00 Horas Del	20/12/2029	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	OCINC INGENIERIA SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.849.031-8
DIRECCIÓN	CL 70 B N 7 B 18	**TELÉFONO**	3148579565
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	**No. DOC. IDENTIDAD**	891.580.016-8
DIRECCIÓN	CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA CUARTO PISO	**TELÉFONO**	8244201
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	**No. DOC. IDENTIDAD**	891.580.016-8
DIRECCIÓN	CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA CUARTO PISO	**TELÉFONO**	8244201

OBJETO DE CONTRATO

SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO PARA HACER CONSTAR QUE SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS EN LA POLIZA ARRIBA CITADA MEDIANTE:

- ACTA DE SUSPENSION NO 02 DE FECHA 22/12/2023
- ACTA DE REINICIO No 02 DE FECHA 22/02/2024
- PRORROGA NO 01 A LA SUSPENSION No 02 DE FECHA 22/02/2024
- ACTA DE REINICIO No 01 DE LA PRORROGA No 01 A LA SUSPENSION NO 02 DE FECHA 21/03/2024
- PRORROGA NO 02 A LA SUSPENSION No 02 DE FECHA 22/03/2024
- ACTA DE REINICIO 01 DE LA PRORROGA NO 02 A LA SUSPENSION No 02 DE FECHA 22/05/2024
- PRORROGA NO 03 A LA SUSPENSION NO 02, DE FECHA 22/05/2024
- ACTA DE REINICIO NO 03 DE FECHA 06/11/2024

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 06/11/2024	24:00 Horas Del 20/04/2025	9.477.532,20	20.902,50
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 06/11/2024	24:00 Horas Del 20/12/2024	2.369.383,05	11.846,92
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 20/12/2024	24:00 Horas Del 20/12/2029	9.477.532,20	0,00

TOTAL ASEGURADO $ 21.324.447,45

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
JAVIER PAZ SUAREZ Y CIA LTDA SUS ASESORES	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	32.749,42
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	32.749,42
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	6.222,39
TOTAL A PAGAR	$	38.971,81

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/11/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACION DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA)

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A SEGUROSMUNDIAL.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VERIFICA LA EXISTENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA POLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO

Firma Autorizada Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atencion al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento

HOJA No.

Scanned with CamScanner

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CCS-100021623	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	100126701	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/11/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN CALI SUR

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/06/2023	24:00 Horas Del	20/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ADICIONALMENTE, SE ACLARA QUE LA VIGENCIA INICIAL DE LA POLIZA RIGE A PARTIR DEL 27/06/2023. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.2017-2023 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESPECIALIZADA CON ÉNFASIS EN LA MODALIDAD AGROINDUSTRIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MISAK MAMÁ MANUELA, MUNICIPIO DE SILVIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE GARANTIA TENDRA UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DEL ASEGURADO, LA CUAL DEBERA SER REPORTADA OPORTUNAMENTE A LA COMPAÑIA ASEGURADORA.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA AMF

Scanned with CamScanner

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CCS-100021623** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **OCINC INGENIERIA SAS** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO DEL CAUCA / DEPARTAMENTO DEL CAUCA ,** expedida por la Compañía en **18/11/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN CALI SUR a los **18** días del mes **NOVIEMBRE** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Scanned with CamScanner

seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.12.12 11:14:23 -05:00

Código de Seguridad: 2bgGSCVhXogb31RGa+KUJA==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE [illegible] BOGOTÁ
TELÉFONO [illegible] FAX [illegible] WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS20000000059 0001

No. PÓLIZA CCS-100021623	**No. ANEXO** 1	**No. CERTIFICADO** 100107196		**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO		**FECHA DE EXPEDICIÓN** 12/12/2023		**SUC. EXPEDIDORA** CEN CALI SUR	
VIGENCIA DESDE	**VIGENCIA HASTA**	**DÍAS**	**VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE**		**VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA**
00:00 Horas Del 27/06/2023	24:00 Horas Del 02/02/2029		N/A	N/A	N/A N/A

TOMADOR	OCINC INGENIERIA SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.849.031-8
DIRECCIÓN	CL 70 B N 7 B 18	**TELÉFONO**	3148579565
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	**No. DOC. IDENTIDAD**	891.580.016-8
DIRECCIÓN	CARRERA 6 CALLE 22 NORTE NO 22N-02	**TELÉFONO**	8235535
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	**No. DOC. IDENTIDAD**	891.580.016-8
DIRECCIÓN	CARRERA 6 CALLE 22 NORTE NO 22N-02	**TELÉFONO**	8235535

OBJETO DE CONTRATO

OBJETO DE LA MODIFICACION:
SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION A LA POLIZA ARRIBA CITADA, PARA HACER CONSTAR QUE SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS , A PETICION DE LA ENTIDAD ASEGURADA MEDIANTE ACTA DE INICIO DE FECHA 25-07-2023, ACTA DE SUSPENSION NO 01 DE FECHA 21-09-2023 Y ACTA DE REINICIO NO 01 DE FECHA 18-10-2023 . LAS DEMAS CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.2017-2023 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESPECIALIZADA CON ÉNFASIS EN LA MODALIDAD AGROINDUSTRIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MISAK MAMÁ MANUELA, MUNICIPIO DE SILVIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 18/10/2023	24:00 Horas Del 02/06/2024	9.477.532,20	6.666,67
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 18/10/2023	24:00 Horas Del 02/02/2027	2.369.383,05	6.666,67
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 02/02/2024	24:00 Horas Del 02/02/2029	9.477.532,20	6.666,67
		TOTAL ASEGURADO	$ 21.324.447,45	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
JAVIER PAZ SUAREZ Y CIA LTDA SUS ASESORES	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	20.000,01
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	20.000,01
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	3.800,00
TOTAL A PAGAR	$	23.800,01

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/11/2028

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA)

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMAS QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento

Scanned with CamScanner

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R0000000059-D00I

No. PÓLIZA	CCS-100021623	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	10010196	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN CALI SUR

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/06/2023	24:00 Horas Del	02/02/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE GARANTIA TENDRA UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DEL ASEGURADO, LA CUAL DEBERA SER REPORTADA OPORTUNAMENTE A LA COMPAÑIA ASEGURADORA.

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISOS APP

Scanned with CamScanner

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CCS-100021623** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **OCINC INGENIERIA SAS** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO DEL CAUCA / DEPARTAMENTO DEL CAUCA ,** expedida por la Compañía en **12/12/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN CALI SUR a los **12** días del mes **DICIEMBRE** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Scanned with CamScanner

Aseguradora Solidaria de Colombia

N.T. 860.524.054-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4351805322

PÓLIZA No: 435 -74 - 994000013171 ANEXO:3

AGENCIA EXPEDIDORA: POPAYAN DELEGADA — COD AGE: 435 — RAMO: 74 — PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DIA / MES / AÑO)	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN (DIA / MES / AÑO)
07 / 11 / 2024		25 / 03 / 2024	23:59	10 / 02 / 2025	23:59	322	08 / 11 / 2024

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	DIAS
	25 / 03 / 2024	23:59	10 / 02 / 2025	23:59	322

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: LEYDER VILLEGAS SANDOVAL — IDENTIFICACIÓN: CC 76.292.060

DIRECCIÓN: CL 6 S A 16 APTO 204 — CIUDAD: POPAYÁN, CAUCA — TELEFONO: 6028218755

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL CAUCA — IDENTIFICACIÓN: NIT 891.580.016-8

DIRECCIÓN: CRA 7 CALLE 4 ESQUINA — CIUDAD: POPAYÁN, CAUCA — TELÉFONO: 6028244201

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL CAUCA NIT : 891580016

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: CAUCA CIUDAD: SILVIA

DIRECCION: CALLE 0 NO. 0-0

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: SERVICIOS MANZANA: 0-1

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$ 260,000,000.00 260,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO PARA HACER CONSTAR QUE SE ACLARA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SEGUN LAS SIGUIENTES ACTAS:

- ACTA DE INICIO DE FECHA 25/07/2023
- ACTA DE SUSPENSION No. 1 DE FECHA 04/10/2023
- ACTA DE REINICIO No. 01 DE FECHA 01/11/2023
- ACTA DE SUSPENSION No. 2 DE FECHA 22/12/2023
- ACTA DE REINICIO No. 3 DE FECHA 06/11/2024

LA VIGENCIA TOTAL DE LA POLIZA COMPRENDE DESDE EL 25/07/2023 HASTA 10/02/2025

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
$ ***260,000,000.00	$ **********84,000	$*****5,000.00	$ *******16,910	$ **********105,910

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
DARLIS MARIA RICO ACHINTE	3093	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701881000019(8020)000000000007000435180532

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No 9A-45 Piso 12 Bogota

CARTOLEDO 0

CADB257ADF06FD7E5E

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 8229 * Correo electrónico: defensoriaseguros@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martinez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221 Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Para mayor información le invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site/1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMODATO CID Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2506 DIC/03 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAN RETENCION EN LA FUENTE

Scanned with CamScanner

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA POPAYAN DELEGADA COD AGENCIA 435 RAMO 74 No POLIZA 994000013171 ANEXO 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE **LEYDER VILLEGAS SANDOVAL** IDENTIFICACION CC **76.292.060**

ASEGURADO **DEPARTAMENTO DEL CAUCA** IDENTIFICACION NIT **891.580.016-8**

BENEFICIARIO **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACION NIT **001-8**

TEXTO ITEM 1

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CLAUSULADO COMPLEMENTARIO OBRA No. 1740- 2023, APROBADO EL 10/05/2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESPECIALIZADA CON ENFASIS EN LA MODALIDAD AGROINDUSTRIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NISAK MAYÁ MANUELA, MUNICIPIO DE SILVIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

CLIENTE

Scanned with CamScanner

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT 860 524 654 6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4351805314

PÓLIZA No: 435 - 47 - 994000053374 ANEXO: 3

AGENCIA EXPEDIDORA: POPAYAN DELEGADA — COD AGENCIA: 435 — RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA — TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN: DIA	MES	AÑO	FECHA DE IMPRESIÓN: DIA	MES	AÑO
07	11	2024	08	11	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **LEYDER VILLEGAS SANDOVAL** — IDENTIFICACIÓN CC: 76.292.050

DIRECCIÓN: CL 6 9 A 16 APTO 204 — CIUDAD: POPAYÁN, CAUCA — TELEFONO: 3028218755

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **DEPARTAMENTO DEL CAUCA** — IDENTIFICACIÓN NIT: 891.580.016-8

BENEFICIARIO: **DEPARTAMENTO DEL CAUCA** — IDENTIFICACIÓN NIT: 891.580.016-8

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	25/07/2023	10/06/2025	123,762,735.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	25/07/2023	10/03/2028	30,945,683.45
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	61,891,362.90

BENEFICIARIOS
NIT 891580016 - DEPARTAMENTO DEL CAUCA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO PARA HACER CONSTAR QUE SE ACLARA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SEGUN LAS SIGUIENTES ACTAS:

- ACTA DE INICIO DE FECHA 25/07/2023
- ACTA DE SUSPENSION No. 1 DE FECHA 04/10/2023
- ACTA DE REINICIO No. 01 DE FECHA 01/11/2023
- ACTA DE SUSPENSION No. 2 DE FECHA 22/12/2023
- ACTA DE REINICIO No. 3 DE FECHA 06/11/2024

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA GARANTIA

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
$ ***216,619,770.15	$ **********313,950	$*****5,000.00	$ *******60,501	$ **********379,551

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
CARLOS MARIA RICO ACHINTE	3093	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y IDÓNEOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), NOTIFICACIONES PUSH, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRONICO Y EN AL CUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP, POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO, POR FAVOR INGRESAR A [illegible]. MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN, DE MANERA [illegible] EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y, EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REPORTADO SOCIEDAD, LO QUE INCLUYE EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE ESE EL CASO, DURANTE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, LO REGULADA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, AGORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SANCIONES RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ EN LA OPCIÓN [illegible].

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU POLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS. TU RESPALDO SEGUROS PATRIMONIALES ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD LE INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701661000019(8020)000000000007000435180531

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADB257ADF06FC7756 CLIEN 8

Defensor del Consumidor Financiero - Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6329 * Correo electrónico: defensorprincipal@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero - Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlogabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221 Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información le invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/wp-content/uploads/Cartilla2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2500 DIAN - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

CONTRIBUCIÓN SOBRE

Scanned with CamScanner

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA POPAYAN DELEGADA | COD AGENCIA 435 | RAMO 47 | No POLIZA 994000053374 | ANEXO 3

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	LEYDER VILLEGAS SANDOVAL	IDENTIFICACIÓN	CC	76.292.060
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	IDENTIFICACION	NIT	891.580.016-8
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	IDENTIFICACIÓN	NIT	891.580.016-8

TEXTO ITEM 1

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CLAUSULADO COMPLEMENTARIO OBRA No 1740- 2021, APROBADO EL 10/05/2021 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESPECIALIZADA CON ENFASIS EN LA MODALIDAD AGROINDUSTRIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MISAK MAMÁ MANUELA, MUNICIPIO DE SILVIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

CLIENTE

Scanned with CamScanner

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4351805322

PÓLIZA No: 435 -74 - 994000013171 ANEXO:1

AGENCIA EXPEDIDORA: POPAYAN DELEGADA — COD AGE: 435 — RAMO: 74 — PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
31	10	2023		10	10	2023	23:59	12	11	2023	23:59	33	31	10	2023

A LAS (vigencia desde) | A LAS (vigencia hasta)

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
	10	10	2023	23:59	12	11	2023	23:59	33

VIGENCIA DESDE — A LAS — VIGENCIA HASTA — A LAS

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: LEYDER VILLEGAS SANDOVAL — IDENTIFICACIÓN: CC 76.292.060

DIRECCIÓN: CL 6 9 A 16 APTO 204 — CIUDAD: POPAYAN, CAUCA — TELÉFONO: 6028218755

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL CAUCA — IDENTIFICACIÓN NIT: 891.580.016-8

DIRECCIÓN: CRA 7 CALLE 4 ESQUINA — CIUDAD: POPAYAN, CAUCA — TELÉFONO: 6028244201

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL CAUCA NIT : 891580016

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: CAUCA CIUDAD: SILVIA

DIRECCION: CALLE 0 NO. 0-0

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: SERVICIOS MANZANA: 0-1

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 232,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO DE LA POLIZA ARRIBA CITADA PARA ACTUALIZAR LAS VIGENCIAS A LAS GARANTIAS DEL CLAUSULADO COMPLEMENTARIO OBRA No. 1740- 2023, SEGUN ACTA DE SUSPENSION No. 01 DE FECHA 19/09/2023 Y ACTA DE REINICIO No. 01 DE FECHA 20/10/2023.

VIGENCIA DESDE 10/05/2023 HASTA 12/11/2023.

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN VIGENTES.

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CLAUSULADO COMPLEMENTARIO OBRA No. 1740- 2023, APROBADO EL 10/05/2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESPECIALIZADA CON ENFASIS EN LA MODALIDAD AGROINDUSTRIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MISAK MAMÁ MANUELA, MUNICIPIO DE SILVIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
$ ***232,000,000.00	$ ****************0	$*********0.00	$ ***********0	$ ****************0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
DARLIS MARIA RICO ACHINTE	3093	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000700043818053 2

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

NAVIDAL 0

CADE25790706FB7656 CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2596 DIC/03 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

Scanned with CamScanner

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4351805314

PÓLIZA No: 435 - 47 - 994000053374 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: POPAYAN DELEGADA — COD. AGENCIA: 435 — RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
31	10	2023	31	10	2023

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: LEYDER VILLEGAS SANDOVAL — IDENTIFICACIÓN: CC 76.292.060

DIRECCIÓN: CL 6 9 A 16 APTO 204 — CIUDAD: POPAYAN, CAUCA — TELÉFONO: 6028218755

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL CAUCA — IDENTIFICACIÓN: NIT 891.580.016-8

BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL CAUCA — IDENTIFICACIÓN: NIT 891.580.016-8

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	10/05/2023	12/03/2024	123,782,725 80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	10/05/2023	12/11/2026	30,945,681 45
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	61,891,362 90

BENEFICIARIOS
NIT 891580016 - DEPARTAMENTO DEL CAUCA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO DE LA POLIZA ARRIBA CITADA PARA ACTUALIZAR LAS VIGENCIAS A LAS GARANTIAS DEL CLAUSULADO COMPLEMENTARIO OBRA No. 1740- 2023, SEGUN ACTA DE SUSPENSION No. 01 DE FECHA 19/09/2023 Y ACTA DE REINICIO No. 01 DE FECHA 20/10/2023.

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN VIGENTES.

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CLAUSULADO COMPLEMENTARIO OBRA No. 1740- 2023, APROBADO EL 10/05/2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESPECIALIZADA CON ENFASIS EN LA MODALIDAD AGROINDUSTRIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MISAK MAMÁ MANUELA, MUNICIPIO DE SILVIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

*** NOTA ACLARATORIA ***

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***216,619,770.15	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
DARLIS MARIA RICO ACHINTE	3093	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLITICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www solidaria com co en la opción SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www solidaria com co en la opción SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

(415)7701861000019(8020)000000000070004351805314

FIRMA ASEGURADOR — FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogota — CLIENTE

CADB25790706FB7657

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-36 Oficina 221 Bogota * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 8229 * Correo electrónico: defensorasolidaria@gmail com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web.
https //aseguradorasolidaria com co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Cell Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2506 DIC/05 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAN RETENCION EN LA FUENTE

Scanned with CamScanner

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4351805314

PÓLIZA No: 435 - 47 - 994000053374 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: POPAYAN DELEGADA COD AGENCIA 435 RAMO 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESION: IMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICION	15	05	2023
FECHA DE IMPRESIÓN	15	05	2023

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: LEYDER VILLEGAS SANDOVAL IDENTIFICACION: CC 76.292.060

DIRECCION: CL 6 9 A 16 APTO 204 CIUDAD: POPAYAN, CAUCA TELEFONO: 6028218755

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL CAUCA IDENTIFICACION NIT 891.580.016-8

BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL CAUCA IDENTIFICACION NIT 891.580.016-8

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	10/05/2023	10/02/2024	123,782,725.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	10/05/2023	10/10/2026	30,945,681.45
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	61,891,362.90

BENEFICIARIOS
NIT 891580016 - DEPARTAMENTO DEL CAUCA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CLAUSULADO COMPLEMENTARIO OBRA No. 1740- 2023, APROBADO EL 10/05/2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESPECIALIZADA CON ENFASIS EN LA MODALIDAD AGROINDUSTRIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MISAK MAMÁ MANUELA, MUNICIPIO DE SILVIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
$ ***216,619,770.15	$ ********1,171,366	$****15,000.00	$ ******225,410	$ ********1,411,776

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
CARLIS MARIA RICO ACHINTE	3093	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN: DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARAMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

(415)7709861000019(8020)000000000007000435180631

FIRMA ASEGURADOR

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADB2579070FF97D5E

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 # 29-21 Oficina 221 Bogotá * Teléfono: (601) 468 7174
Fax: (601) 468 7174 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensorsolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2506 JICMG RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6601 ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE

Scanned with CamScanner

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 830.524.884-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4351805322

PÓLIZA No: 435 -74 - 994000013171 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA POPAYAN DELEGADA — COD AGE 435 — RAMO 74 — PAP

FECHA DE EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
15	05	2023		10	05	2023	23:59		10	10	2023	23:59		153	15	05	2023

MODALIDAD FACTURACIÓN ANUAL — TIPO DE IMPRESION IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO EXPEDICION

VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	DIAS
	10	05	2023	23:59		10	10	2023	23:59		153

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE LEYDER VILLEGAS SANDOVAL — IDENTIFICACION CC 76.292.060

DIRECCION CL 6 9 A 16 APTO 204 — CIUDAD POPAYAN, CAUCA — TELEFONO 6028218755

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO DEPARTAMENTO DEL CAUCA — IDENTIFICACION NIT 891.580.016-8

DIRECCION CRA 7 CALLE 4 ESQUINA — CIUDAD POPAYAN, CAUCA — TELEFONO 6028244201

BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACION NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL CAUCA NIT . 891580016

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: CAUCA CIUDAD: SILVIA

DIRECCION: CALLE 0 NO. 0-0

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: SERVICIOS MANZANA: 0-1

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 232,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CLAUSULADO COMPLEMENTARIO OBRA No. 1740- 2023, APROBADO EL 10/05/2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESPECIALIZADA CON ENFASIS EN LA MODALIDAD AGROINDUSTRIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MISAK MAMÁ MANUELA, MUNICIPIO DE SILVIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
$ ***232,000,000.00	$ **********291,748	$**********0.00	$ *******55,432	$ **********347,180

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
DARLIS MARIA RICO ACHINTE	3093	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7709861000919(8020)000000000070004361805322

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 8A-49 Piso 12 Bogotá

CAD8257907CFF97D5D — CLIENTE — LEWA:TEROS 0

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 # 29-21 Oficina 221 Bogotá * Teléfono: (601) 458 7174
Fax. (601) 458 7174 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información le invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2506 DIC/05 REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE


VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Scanned with CamScanner

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4





NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4351805314

PÓLIZA No: 435 - 47 - 994000053374 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: POPAYAN DELEGADA — COD AGENCIA: 435 — RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION — TIPO DE IMPRESION: IMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICION	15	05	2023
FECHA DE IMPRESION	15	05	2023

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: LEYDER VILLEGAS SANDOVAL — IDENTIFICACION: CC 76.292.060

DIRECCION: CL 6 9 A 16 APTO 204 — CIUDAD: POPAYAN, CAUCA — TELEFONO: 6028218755

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL CAUCA — IDENTIFICACION: NIT 891.580.016-8

BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL CAUCA — IDENTIFICACION: NIT 891.580.016-8

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	10/05/2023	10/02/2024	123,782,725.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	10/05/2023	10/10/2026	30,945,681.45
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		61,891,362.90

BENEFICIARIOS
NIT 891580016 - DEPARTAMENTO DEL CAUCA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CLAUSULADO COMPLEMENTARIO OBRA No. 1740- 2023, APROBADO EL 10/05/2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESPECIALIZADA CON ENFASIS EN LA MODALIDAD AGROINDUSTRIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MISAK MAMÁ MANUELA, MUNICIPIO DE SILVIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
$ ***216,619,770.15	$ ********1,171,366	$****15,000.00	$ ******225,410	$ ********1,411,776

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
DARLIS MARIA RICO ACHINTE	3093	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD. LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000078004351806 31

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No 8A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CADB2579070FF97D5E


Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 # 29-21 Oficina 221 Bogotá * Teléfono: (601) 458 7174
Fax: (601) 458 7174 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES. 2468 DE 2015 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL




NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4351805322

PÓLIZA No: 435 -74 - 994000013171 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: POPAYAN DELEGADA — COD AGE: 435 — RAMO: 74 — PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
15	05	2023	10	05	2023	23:59	10	10	2023	23:59	153	15	05	2023

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL — TIPO DE IMPRESION: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION

VIGENCIA DEL ANEXO DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
10	05	2023	23:59	10	10	2023	23:59	153

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: LEYDER VILLEGAS SANDOVAL — IDENTIFICACION: CC 76.292.060
DIRECCION: CL 6 9 A 16 APTO 204 — CIUDAD: POPAYAN, CAUCA — TELEFONO: 6028218755

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL CAUCA — IDENTIFICACION: NIT 891.580.016-8
DIRECCION: CRA 7 CALLE 4 ESQUINA — CIUDAD: POPAYAN, CAUCA — TELEFONO: 6028244201
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACION: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL CAUCA — NIT : 891580016

ITEM: 1 — DEPARTAMENTO: CAUCA — CIUDAD: SILVIA

DIRECCION: CALLE 0 NO. 0-0

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO — TIPO DE RIESGO: SERVICIOS — MANZANA: 0-1

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 232,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CLAUSULADO COMPLEMENTARIO OBRA No. 1740- 2023, APROBADO EL 10/05/2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESPECIALIZADA CON ENFASIS EN LA MODALIDAD AGROINDUSTRIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MISAK MAMÁ MANUELA, MUNICIPIO DE SILVIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
$ ***232,000,000.00	$ **********291,748	$*********0.00	$ *******55,432	$ **********347,180

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
DARLIE MARIA RICO ACHINTE	3093	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000919(8020)000000000070004351805322

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No 8A-45 Piso 12 Bogotá

CAD8257907CFF97D5D — CLIENTE — LEVANTEROS 0

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 # 29 21 Oficina 221 Bogotá * Teléfono: (601) 458 7174
Fax: (601) 458 7174 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensorsolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web.
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2506 DICIAS - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Scanned with CamScanner

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT 830.524.654-4

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4351805322

PÓLIZA No: 435 -74 - 994000013171 ANEXO:1

AGENCIA EXPEDIDORA: POPAYAN DELEGADA — COD AGE: 435 — RAMO: 74 — PAP

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
31	10	2023		10	10	2023	23:59 A LAS	12	11	2023	23:59 A LAS	33	31	10	2023

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
	10	10	2023	23:59 A LAS	12	11	2023	23:59 A LAS	33

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: LEYDER VILLEGAS SANDOVAL — IDENTIFICACIÓN: CC 76.292.060
DIRECCIÓN: CL 6 9 A 16 APTO 204 — CIUDAD: POPAYAN, CAUCA — TELÉFONO: 6028218735

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL CAUCA — IDENTIFICACIÓN: NIT 891.580.016-8
DIRECCIÓN: CRA 7 CALLE 4 ESQUINA — CIUDAD: POPAYAN, CAUCA — TELÉFONO: 6028244201
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL CAUCA — NIT : 891580016

ITEM: 1 — DEPARTAMENTO: CAUCA — CIUDAD: SILVIA

DIRECCION: CALLE 0 NO. 0-0

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO — TIPO DE RIESGO: SERVICIOS — MANZANA: 0-1

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 232,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO DE LA POLIZA ARRIBA CITADA PARA ACTUALIZAR LAS VIGENCIAS A LAS GARANTIAS DEL CLAUSULADO COMPLEMENTARIO OBRA No. 1740- 2023, SEGUN ACTA DE SUSPENSION No. 01 DE FECHA 19/09/2023 Y ACTA DE REINICIO No. 01 DE FECHA 20/10/2023.

VIGENCIA DESDE 10/05/2023 HASTA 12/11/2023.

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN VIGENTES.

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CLAUSULADO COMPLEMENTARIO OBRA No. 1740- 2023, APROBADO EL 10/05/2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESPECIALIZADA CON ENFASIS EN LA MODALIDAD AGROINDUSTRIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MISAK MAMÁ MANUELA, MUNICIPIO DE SILVIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
$ ***232,000,000.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
DARLIS MARIA RICO ACHINTE	3093	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000435180532

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

NAVIDAD 0

CAD825790706FB7656

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call C..., por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2506 DIC/03 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Scanned with CamScanner

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4351805314

PÓLIZA No: 435 - 47 - 994000053374 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: POPAYAN DELEGADA COD AGENCIA: 435 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESION: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	10	2023	31	10	2023

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: LEYDER VILLEGAS SANDOVAL IDENTIFICACION: CC 76.292.060

DIRECCION: CL 6 9 A 16 APTO 204 CIUDAD: POPAYAN, CAUCA TELÉFONO: 6028218755

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL CAUCA IDENTIFICACION: NIT 891.580.016-8

BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL CAUCA IDENTIFICACION: NIT 891.580.016-8

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	10/05/2023	12/03/2024	123,782,725.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	10/05/2023	12/11/2026	30,945,681.45
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	61,891,362.90

BENEFICIARIOS
NIT 891580016 - DEPARTAMENTO DEL CAUCA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO DE LA POLIZA ARRIBA CITADA PARA ACTUALIZAR LAS VIGENCIAS A LAS GARANTIAS DEL CLAUSULADO COMPLEMENTARIO OBRA No. 1740- 2023, SEGUN ACTA DE SUSPENSION No. 01 DE FECHA 19/09/2023 Y ACTA DE REINICIO No. 01 DE FECHA 20/10/2023.

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN VIGENTES.

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CLAUSULADO COMPLEMENTARIO OBRA No. 1740- 2023, APROBADO EL 10/05/2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESPECIALIZADA CON ENFASIS EN LA MODALIDAD AGROINDUSTRIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MISAK MAMÁ MANUELA, MUNICIPIO DE SILVIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

*** NOTA ACLARATORIA ***

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
$ ***216,619,770.15	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
DARLIS MARIA RICO ACHINTE	3093	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y, EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARAMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www solidaria com co en la opción SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES
Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www solidaria com co en la opción SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

(415)7701861000019(8020)000000000007000435180531

FIRMA ASEGURADOR FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá CLIENTE

CADB25790706FB7657

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221. Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https //aseguradorasolidaria com co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento
GRAN CONTRIBUYENTE - RES 2506 DIC/03 - REGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6601 ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Scanned with CamScanner

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT 860.524.547-1

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4351805322

PÓLIZA No: 435 -74 - 994000013171 ANEXO:3

AGENCIA EXPEDIDORA: POPAYAN DELEGADA — COD AGE: 435 — RAMO: 74 — RAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DIA / MES / AÑO)	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN (DIA / MES / AÑO)
07 / 11 / 2024		25 / 03 / 2024 / 23:59		10 / 02 / 2025 / 23:59		322	08 / 11 / 2024

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN: PREIMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	DIAS
	25 / 03 / 2024 / 23:59		10 / 02 / 2025 / 23:59		322

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: LEYDER VILLEGAS SANDOVAL — IDENTIFICACION: CC 76.292.060

DIRECCIÓN: CL 6 9 A 16 APTO 204 — CIUDAD: POPAYÁN, CAUCA — TELEFONO: 6028218755

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL CAUCA — IDENTIFICACION: NIT 891.580.016-8

DIRECCIÓN: CRA 7 CALLE 4 ESQUINA — CIUDAD: POPAYÁN, CAUCA — TELEFONO: 6028244201

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACION: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL CAUCA — NIT : 891580016

ITEM: 1 — DEPARTAMENTO: CAUCA — CIUDAD: SILVIA

DIRECCION: CALLE 0 NO. 0-0

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO — TIPO DE RIESGO: SERVICIOS — MANZANA: 0-1

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$ 250,000,000.00 250,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO PARA HACER CONSTAR QUE SE ACLARA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SEGUN LAS SIGUIENTES ACTAS:

- ACTA DE INICIO DE FECHA 25/07/2023
- ACTA DE SUSPENSION No. 1 DE FECHA 04/10/2023
- ACTA DE REINICIO No. 01 DE FECHA 01/11/2023
- ACTA DE SUSPENSION No. 2 DE FECHA 22/12/2023
- ACTA DE REINICIO No. 3 DE FECHA 06/11/2024

LA VIGENCIA TOTAL DE LA POLIZA COMPRENDE DESDE EL 25/07/2023 HASTA 10/02/2025

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
$ ***260,000,000.00	$ **********84,000	$*****5,000.00	$ ******16,910	$ **********105,910

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
CARLOS MARIA RICO ACHINTE	3093	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACIÓN AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861030019(8020)000000000007000435180532

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADB257A8F06FD7B58

CLIENTE

CARTOLEDO 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2506 DIC/93 REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 ENTIDAD COOPERATIVA NO RETIENE IVA NI RETIENE EN LA FUENTE

CONDICIONADO 30/01/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Gustavo Rueda Serrano – Celular: 312 342 8220 – Correo electrónico: defensorialrueda@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Cano – Celular: 316 223 4304 – Correo electrónico: martinezcanoabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 29-39 oficina 201 Bogotá – Teléfonos: (601) 791 91 99 – Fax: (601) 791 91 00 – Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:30 p.m.
Para mayor información le invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://segurosolidaria.com.co/wp-content/uploads/2023/01/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4351805314

PÓLIZA No: 435 - 47 - 994000053374 ANEXO: 3

AGENCIA EXPEDIDORA: POPAYAN DELEGADA — COD AGENCIA: 435 — RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA — TIPO DE IMPRESION: REIMPRESION

FECHA DE EXPEDICION: DIA	MES	AÑO	FECHA DE IMPRESION: DIA	MES	AÑO
07	11	2024	08	11	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: LEYDER VILLEGAS SANDOVAL — IDENTIFICACION CC: 76.292.050

DIRECCION: CL 6 9 A 16 APTO 204 — CIUDAD: POPAYÁN, CAUCA — TELÉFONO: 3028218755

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL CAUCA — IDENTIFICACION NIT: 891.580.016-8

BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL CAUCA — IDENTIFICACION NIT: 891.580.016-8

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	25/07/2023	10/06/2025	123,762,735.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	25/07/2023	10/02/2028	30,945,681.45
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		61,891,362.90

BENEFICIARIOS
NIT 891580016 - DEPARTAMENTO DEL CAUCA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO PARA HACER CONSTAR QUE SE ACLARA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SEGUN LAS SIGUIENTES ACTAS:

- ACTA DE INICIO DE FECHA 25/07/2023
- ACTA DE SUSPENSION No. 1 DE FECHA 04/10/2023
- ACTA DE REINICIO No. 01 DE FECHA 01/11/2023
- ACTA DE SUSPENSION No. 2 DE FECHA 22/12/2023
- ACTA DE REINICIO No. 3 DE FECHA 06/11/2024

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA GARANTIA

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
$ ***216,619,770.15	$ **********313,950	$*****5,000.00	$ *******60,501	$ **********379,551

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
DARLIS MARIA RICO ACHINTE	3093	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y MODIFICADOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES (WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA, YO Y LOS GESTORES COMERCIALES DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJERÍA DE TEXTO Y WHATSAPP, POR MEDIO DE DIGITAL AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, CANAL PARA FINES EXCLUSIVOS POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A https://www.solidaria.com.co/proteccion-de-datos/

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y, EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DE LA REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIONES Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE AMPLÍA EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD, SALVO QUE LA LEY ESTABLEZCA EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES DE INTERÉS/POLÍTICA DE PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS - CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000003000037000435180531

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADB257ADF06FC7756

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero - Principal: Manuel Guillermo Acuña Barrera - Celular: 312 343 6253 - Correo electrónico: defensoriaprincipal@asesoriasdefensoriales.com.co
Defensor del Consumidor Financiero - Suplente: Jorge Humberto Martín Luna - Celular: 312 223 4364 - Correo electrónico: martinjorgeabogado@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-36 oficina 201 Bogotá - Teléfono: (601) 791 91 90 - Fax: (601) 791 91 90 - Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 2:00 p.m. y 3:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/defensoria/ - Circular 029/2014 - Circular Básica Jurídica - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6601 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2560 DE 2013 - RÉGIMEN COMÚN

Scanned with CamScanner

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Escaneado con CamScanner

PAGOSIMPLE | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2024-01-11, 12:20:19 PM **Tipo Planilla:** I: Planilla independientes **Número Planilla:** 1057803104

Periodo Cotización: agosto de 2023

Periodo Servicio: agosto de 2023

PAGADO 28/09/2023

Datos del Aportante

Razón Social	RUBEN DARIO SOLARTE GUZMAN		
Documento	CC76331752	**Dirección**	CRA 17 No 56N-50 ALTOS DE MORINDA APTO C
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3148579565
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	POPAYAN	**Departamento**	CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	

Detalle de los Pagos por Administradora

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 288.000	$ 4.800	$ 292.800
N800251440	EPS005	EPS SANITAS	1	$ 225.000	$ 3.700	$ 228.700
Total Pagado				$ 513.000	$ 8.500	$ 521.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2023-10-26, 11:34:13 AM **Tipo Planilla:** I: Planilla independientes **Número Planilla:** 1058020714

Periodo Cotización: septiembre de 2023

Periodo Servicio: septiembre de 2023

PAGADO 05/10/2023

Datos del Aportante

Razón Social	RUBEN DARIO SOLARTE GUZMAN		
Documento	CC76331752	**Dirección**	CRA 17 No 56N-50 ALTOS DE MORINDA APTO C
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3148579565
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	POPAYAN	**Departamento**	CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	

Detalle de los Pagos por Administradora

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 288.000	$ 0	$ 288.000
N800251440	EPS005	EPS SANITAS	1	$ 225.000	$ 0	$ 225.000
Total Pagado				$ 513.000	$ 0	$ 513.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-13, 12:54:08 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1068026714

Periodo Cotización: octubre de 2024 Periodo Servicio: octubre de 2024

PAGADO 13/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RUBEN DARIO SOLARTE GUZMAN		
Documento	CC76331752	**Dirección**	CRA 17 No 56N-50 ALTOS DE MORINDA APTO C
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3148579565
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	POPAYAN	**Departamento**	CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 76331752	RUBEN DARIO SOLARTE GUZMAN	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.800.000	$ 225.000	0.522	$ 1.800.000	$ 9.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 0	$ 288.000	$ 225.000	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.400	$ 0	$ 522.400

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-15, 12:22:52 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1061643675

Periodo Cotización: noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** noviembre de 2023

PAGADO 28/03/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RUBEN DARIO SOLARTE GUZMAN		
Documento	CC76331752	**Dirección**	CRA 17 No 56N-50 ALTOS DE MORINDA APTO C
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3148579565
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	POPAYAN	**Departamento**	CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 76331752	RUBEN DARIO SOLARTE GUZMAN	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 145.000	6.960	$ 1.160.000	$ 80.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400	$ 40.500	$ 451.900

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-04, 09:53:34 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1068545779

Periodo Cotización: noviembre de 2024 **Periodo Servicio:** noviembre de 2024

PAGADO 04/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RUBEN DARIO SOLARTE GUZMAN		
Documento	CC76331752	**Dirección**	CRA 17 No 56N-50 ALTOS DE MORINDA APTO C
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3148579565
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	POPAYAN	**Departamento**	CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 76331752	RUBEN DARIO SOLARTE GUZMAN	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.800.000	$ 225.000	0.522	$ 1.800.000	$ 9.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 0	$ 288.000	$ 225.000	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.400	$ 0	$ 522.400

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del Pais: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.
