EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

ACTA N° 3

ACTA Nª	1	PERIODO	Agosto-Octubre -2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	4 meses 5 dias	FECHA DE INICIACION:	4 meses 5 dias	FECHA DE INICIACION:	26 junio de 2024
CONTRATO DE OBRA No :	COP-004-2024-CO	CONTRATO DE INTERVENTORIA No :		CD-18 DE 2024	$			860.378.644	26 septiembre de 2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIVERSOS TRAMOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL,ANTIOQUIA				CONINGECON SAS				AS Ingenieria Activa SAS

	CONDICIONES ORIGINALES					OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA N°1		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA N 2		OBRA EJECUTADA ACTA 3 - 06112024		OBRA EJECUTADA ACUMULADO		CONDIONES ACTALIZADAS (OCT-2024)	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	**PRELIMINARES Y DEMOLICIONES**				$ -										
1.1	Localización, Trazado y Replanteo con equipos de precision, incluye levantamiento de los elementos representivos y entrega final de memorias digitales.	día	15,00	$ 725.030,00	$ 10.875.450,00	3,00	$ 2.175.090	2,00	$ 1.450.060	2,00	$ 1.450.060	7,00	$ 5.075.210	7,00	$ 5.075.210
1.2	Instalación de cerramiento provisional en tela verde con una altura de 2.1 m	ml	100,00	$ 21.410,00	$ 2.141.000,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	100,00	$ 2.141.000
1.3	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría	M3	120,00	$ 172.837,00	$ 20.740.440,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	74,63	$ 12.899.070
1.4	Demolición de pavimento asfáltico, de cualquier espesor. Incluye corte con cortadora según trazado y cargue, transporte y disposición final de escombros	m3	80,00	$ 117.503,00	$ 9.400.240,00	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	80,00	$ 9.400.240
2	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				$ -		$ -		$ -			0,00	$ -	-	$ -
2.1	Excavación manual de material heterogéneo de 0-2m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye transporte y botada de material proveniente en sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio	m3	500,00	$ 32.015,00	$ 16.007.500,00	64,73	$ 2.072.340	102,97	$ 3.296.585	152,31	$ 4.876.205	320,01	$ 10.245.129	320,01	$ 10.245.129
2.2	Llenos con material de préstamo tipo afirmado, compactados mecánicamente. Incluye suministro, transporte y colocación del material, la compactación de la misma y transporte interno.	m3	100,00	$ 207.653,00	$ 20.765.300,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	9,25	$ 1.920.790
2.3	Llenos con material proveniente de la excavación compactados mecánicamente. Incluye transporte interno	m3	50,00	$ 29.845,00	$ 1.492.250,00		$ -	7,20	$ 214.884	33,13	$ 988.765	40,33	$ 1.203.649	40,33	$ 1.203.649
3	**BASE GRANULAR**				$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
3.1	Suministro, transporte, colocación y compactación por medios mecánicos de Base Granular de acuerdo a especificación 330 de INVIAS	m3	350,00	$ 243.489,00	$ 85.221.150,00	50,07	$ 12.191.494	58,36	$ 14.210.018	98,48	$ 23.978.797	206,91	$ 50.380.309	206,91	$ 50.380.309
4	**CONCRETOS Y ACEROS**				$ -		$ -		$ -			0,00	$ -		$ -
4.1	Suministro, transporte y colocación de Bordillo prefabricado de concreto de 21 Mpa, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto (BOBAR o BOREC) Dimensiones 15*35*80. Incluye mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	Und	800,00	$ 115.072,00	$ 92.057.600,00	347,79	$ 40.020.891	231,00	$ 26.581.632	576,00	$ 66.281.472	1.154,79	$ 132.883.995	1.154,79	$ 132.883.995
4.2	Suministro, transporte, figuración y colocación de acero de refuerzo de figurado fy: 420 Mpa - 60000 PSI, corrugado.	kg	1100,00	$ 8.268,00	$ 9.094.800,00	59,68	$ 493.459	0,00	$ -	254,71	$ 2.105.942	314,39	$ 2.599.401	314,39	$ 2.599.401
4.3	Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada D-84	m2	700,00	$ 10.288,00	$ 7.201.600,00		$ -	1,30	$ 13.374	7,34	$ 75.514	8,64	$ 88.888	8,64	$ 88.888
4.4	Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 21 Mpa para estructuras varias, incluye formaleta y los elementos para su instalación.	m3	40,00	$ 778.915,00	$ 31.156.600,00	0,87	$ 677.656	1,02	$ 794.493	10,34	$ 8.053.981	12,23	$ 9.526.130	12,23	$ 9.526.130
5	**ANDENES**				$ -		$ -		$ -			0,00	$ -	-	$ -
5.1	Construcción de Piso en adoquín de concreto dimensiones 20x20x6cm, colores acordes con lo indicado por la supervisión. Incluye suministro y transporte de los adoquines, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017.	m2	200,00	$ 147.112,00	$ 29.422.400,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	136,88	$ 20.137.317
5.2	Colocación de ADOQUÍN TÁCTIL GUÍA O ALERTA 20 x 20 x 6. Colores indicados por la supervisión. Para un ancho de 0,20 m. Incluye suministro y transporte de los adoquines, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas, arena de sello y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento según diseño y recomendaciones del M.E.P.	ml	1593,98	$ 47.461,00	$ 75.651.884,78	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	616,49	$ 29.259.454
5.3	Construcción de LÍNEA DEMARCADORA VISUAL EN ADOQUÍN ADOP-A DE 0.10 x 0.20 x 0.06 m, color amarillo, salmón o jaspe. Incluye suministro y transporte de los adoquines sello en arena de revoque, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017.	ml	1600,00	$ 24.323,00	$ 38.916.800,00	249,15	$ 6.060.075	257,72	$ 6.268.524	418,03	$ 10.167.744	924,90	$ 22.496.343	924,90	$ 22.496.343
5.4	Construcción de Piso en adoquín tipo terracota español dimensiones 20x10x6cm, colores acordes con lo indicado por la supervisión. Incluye suministro y transporte de los adoquines, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017.	m2	800,00	$ 171.708,00	$ 137.366.400,00	166,51	$ 28.591.099	200,73	$ 34.466.947	344,36	$ 59.129.367	711,60	$ 122.187.413	711,60	$ 122.187.413

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

ACTA N° 3

ACTA Nª	1	PERIODO	Agosto-Octubre -2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	4 meses 5 dias	FECHA DE INICIACION:	4 meses 5 dias	FECHA DE INICIACION:	26 junio de 2024
CONTRATO DE OBRA No :	COP-004-2024-CO	CONTRATO DE INTERVENTORIA No :		CD-18 DE 2024	$			860.378.644	26 septiembre de 2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIVERSOS TRAMOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL,ANTIOQUIA				CONINGECON SAS				AS Ingenieria Activa SAS

	CONDICIONES ORIGINALES					OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA N°1		PRESENTE ACTA N 2		OBRA EJECUTADA ACTA 3 - 06112024		ACUMULADO		CONDIONES ACTALIZADAS (OCT-2024)	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
5.5	Construcción de Piso en adoquín tipo terracota español dimensiones 20x10x8cm, colores acordes con lo indicado por la supervisión. Incluye suministro y transporte de los adoquines, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017.	m2	140,00	$ 207.763,00	$ 29.086.820,00	53,04	$ 11.020.394	83,17	$ 17.279.649	106,60	$ 22.147.536	242,81	$ 50.447.578	242,81	$ 50.447.578
6	VARIOS				$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -
6.1	Construcción de SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B (1.10m x 0.80m medidas externas y prof=0.90m e=0.20m), en concreto de 17.5 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja metálica, formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento,según diseño y especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos y entresuelo se pagarán en su ítem respectivo.	Und	10,00	$ 1.159.705,00	$ 11.597.050,00		$ -	8,00	$ 9.277.640	4,00	$ 4.638.820	12,00	$ 13.916.460	12,00	$ 13.916.460
6.2	Caja de inspección 60x60 cm incluye tapa e=12 cm (und)	Und	10,00	$ 563.686,00	$ 5.636.860,00		$ -	6,00	$ 3.382.116	25,00	$ 14.092.150	31,00	$ 17.474.266	21,00	$ 11.837.406
6.3	Suministro, transporte e instalación de tubería sanitaria 100 mm, (4 Pulgadas). Incluye transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie, adhesivo y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación se pagará en su ítem respectivo	ml	18,00	$ 29.415,00	$ 529.470,00	4,20	$ 123.543	12,00	$ 352.980	16,40	$ 482.406	32,60	$ 958.929	32,60	$ 958.929
6.4	Suministro, transporte e instalación de tubería de presión 1/2" incluye los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	5,00	$ 7.914,00	$ 39.570,00	6,20	$ 49.067	6,20	$ 49.067	4,00	$ 31.656	16,40	$ 129.790	16,40	$ 129.790
6.5	Desmonte y reinstalación de caja de registro contador de agua, incluye los materiales y accesorios necesario para la reinstalación	und	5,00	$ 32.533,00	$ 162.665,00	27,00	$ 878.391	24,00	$ 780.792	36,00	$ 1.171.188	87,00	$ 2.830.371	91,00	$ 2.960.503
OE	OBRA EXTRA											0,00			
OE-1	Suministro transporte e instalacion de concreto de 21 MPA para ajuste entre pavimento y bordillo.	ml		$ 19.666,00	$ -	285,19	$ 5.608.547	163,14	$ 3.208.311	339,25	$ 6.671.691	787,58	$ 15.488.548	787,58	$ 15.488.548
OE-2	Suministro transporte e instalacion de ADOQUÍN TÁCTIL GUÍA O ALERTA 20 x 20 x 6 cm. Colores indicados por la supervisión. Para un ancho de 0,20 m. Incluye suministro y transporte de los adoquines, arena para la instalación, corte de piezas, arena de sello y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento según diseño y recomendaciones del M.E.P.	ml		$ 34.910,00	$ -	224,59	$ 7.840.437	177,56	$ 6.198.620	356,50	$ 12.445.415	758,65	$ 26.484.472	758,65	$ 26.484.472
OE-3	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría	m3		$ 168.877,00	$ -	20,76	$ 3.505.887	62,80	$ 10.605.476	77,47	$ 13.082.901	161,03	$ 27.194.263	161,03	$ 27.194.263
OE-4	Demolición de pavimento asfáltico, de cualquier espesor. Incluye corte con cortadora según trazado y cargue, transporte y disposición final de escombros	m3		$ 110.738,00	$ -	16,51	$ 1.828.284	18,46	$ 2.044.223	31,06	$ 3.439.522	66,03	$ 7.312.030	66,03	$ 7.312.030
OE-5	Suministro , transporte e instalacion de rejilla metalica de 1,0 x0,20 , para carcamos en andes, marco externo en angulo de 1 1/2 pulg por 1/8", marco interno en angulo de 1 pulgada por 1/8", con varilla de 1/2 pulgada cuadrada con separacion aproximada de 1,2 cms, incluye pintura anticorrosiva y tres visagras mariposas	M		$ 453.995,00					$ -	20,50	$ 9.306.898	20,50	$ 9.306.898	18,50	$ 8.398.908
OE-6	Desmonte y reinstalacion de medidor de agua potable en las viviendas. Incluye utilizacion de tuberia de 1/2, bocas, accesorios, acondicionador de superficie, adhesivo y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación se pagará en su ítem respectivo	Und		$ 170.139,00					$ -	7,00	$ 1.190.973	7,00	$ 1.190.973	7,00	$ 1.190.973
OE-7	Suministro, transporte e instalación de tubería sanitaria 150mm, (6 Pulgadas). Incluye transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie, adhesivo y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos, se pagará en su ítem respectivo	ML		$ 67.326,00					$ -	53,75	$ 3.618.773	53,75	$ 3.618.773	53,75	$ 3.618.773

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

ACTA N° 3

ACTA Nª	1	PERIODO	Agosto-Octubre -2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	4 meses 5 dias	FECHA DE INICIACION:	4 meses 5 dias	FECHA DE INICIACION:	26 junio de 2024
CONTRATO DE OBRA No :	COP-004-2024-CO	CONTRATO DE INTERVENTORIA No :		CD-18 DE 2024	$ 860.378.644				26 septiembre de 2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIVERSOS TRAMOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL,ANTIOQUIA				CONINGECON SAS				AS Ingenieria Activa SAS

	CONDICIONES ORIGINALES					OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA N°1		PRESENTE ACTA N 2		OBRA EJECUTADA ACTA 3 - 06112024		ACUMULADO		CONDIONES ACTALIZADAS (OCT-2024)		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
OE-8	Suministro, transporte e instalación de tubería sanitaria 250mm, (10 Pulgadas). Incluye transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie, adhesivo y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación se pagará en su ítem respectivo	ML		$ 102.364,00					$ -	67,20	$ 6.878.861	67,20	$ 6.878.861	67,20	$ 6.878.861	
OE-9	Suministro, transporte e instalación de silla YEE de 250mm por 110 mm novafort, (10"x4"). Incluye transporte de los materiales, adapatador de novaforta tuberia lisa, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und		$ 269.697,00						3,00	$ 809.091	3,00	$ 809.091	3,00	$ 809.091	
OE-10	Excavación manual, en cualquier material y grado de húmedad de 2 a 4 m. incluye botada, para brechas de redes de conexiones de sumideros y manholes	m3		$ 193.727,00						0,00	$ -			12,30	$ 2.382.842	
OE-11	Suministro, transporte y colocación de entibado temporal en tablón de madera para excavaciones bajo cualquier altura y grado de humedad. Incluye suministro, transporte y colocación de elementos en madera. (2 usos)	M2		$ 43.512,00							$ -			0,00	$ 10	
OE-12	Suministro, transporte y colocación de triturado 3/4" (19mm) para base de brecha en instalación de tuberías.	M3		$ 229.014,00							$ -			1,95	$ 446.577	
OE-13	Suministro, transporte e instalación de baranda para zona peatoanal-vehicular, en tuberia negra pesada de 2" con acabados en esmalte, platinas con pernos de anclaje, y todos los lelemtos para su biuen funcionamiento 2 horizontales y verticales cada 2,0 m	ML		$ 331.525,00					$ -		$ -	0,00	$ -	20,00	$ 6.630.500	
OE-14	Suministro, transporte y Construcción de Cilindro Ø 1,2 m. para cámaras de inspección. Incluye peldaños en acero galvanizado en caliente, suministro, transporte e instalación de los materiales.	ML		$ 1.091.754,00							$ -			8,10	$ 8.843.207	
OE-15	Suministro e instalación cono concéntrico para cámara de inspección. Diámetro interior=1.20m. Incluye material, equipo, transportes, mano de obra y herramienta. .	und		$ 762.714,00					$ -		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 2.288.142	
OE-16	Suministro, Transporte y colocación de Juego de cuello y anillo para camara de inspeccion, incluye tapa prefabricada , para cámara de inspección. (Ø= 0.7 m)	und		$ 985.115,00					$ -		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 2.955.345	
OE-17	Suministro, transporte e instalación de mortero para ajustes de fajas en andenes y fachadas incluye materiales, ranuras, filetes, elementos necesarios para su correcta construcción, demolicion del mortero existente y disposicion final de los sobrantes	m2		$ 77.372,00					$ -		$ -	0,00	$ -	7,00	$ 541.604	
OE-18	Colocación de TABLETAS DE 30X30 GRES, con t mortero 1:3 pendientady pegacort , Incluye suministro y transporte de los materiales, juntas de dilatación y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento, (espesor mínimo del mortero=0,08 m.). La unidad de medida es	m2		$ 134.900,00					$ -		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 404.700	
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 634.563.850		$ 123.136.654		$ 140.475.391		$ 277.115.728	0,00	$ 540.727.770		$ 634.563.850,00	$ 634.563.849,78
	ADMINISTRACION	26,00%			$ 164.986.601		$ 32.015.530		$ 36.523.602		$ 72.050.089		$ 140.589.220		$ 164.986.601,00	
	UTILIDAD	5%			$ 31.728.192		$ 6.156.833		$ 7.023.770		$ 13.855.786		$ 27.036.389		$ 31.728.193,00	
	ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 2.700.000				$ 2.700.000,00				$ 2.700.000,00		$ 2.700.000,00	
	PMT				$ 12.400.000				$ 6.547.563,00		$ -		$ 6.547.563,00		$ 12.400.000,00	
	PMA				$ 14.000.000		$ -		$ 6.731.000,00		$ -		$ 6.731.000,00		$ 14.000.000,00	
	NOTA ACLARATORIA: LOS VALORES QUE VAN AL CENTAVO SONREDONDEADOS SEGÚN CIFRA ,SI ES UN NUMERO MENOR A CINCO LA CIFRA SE MANTIENEN , PERO SI ES UN NUMERO IGUAL O SUPERIOR A CINCO POR DEFECTO SE INCREMENTA UN DIGITO. LOS PAGOS SE EFECTUAN CON CIFRAS EN PESO. DESCUENTO POR DECIMALES GENERADOS , DE LOS SIGUIENTES ITEMS CON LAS RESPECTIVAS CANTIDADES: 2.1 (64,7302688); 4.2 (59,683); Y 5.5 (53,0431)								-$ 4,00							
	Valor total básico				$ 860.378.644		$ 161.309.017		$ 200.001.322		$ 363.021.603		$ 724.331.942		$ 860.378.644	

Firma
Nombre: Claudia Janeth Cano Vallejo
REPRESENTANTE LEGAL / DIRECTORA DE OBRA
Contratista:
Matricula No.: 05202154385 DE Ant.

Firma
Nombre: Sofia Valencia Vallego
REPRESENTANTE LEGAL O DELEGADO
Interventoría:
AS Ingenieria Activa SAS

Firma
Nombre: Santiago Osorio Torres
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Interventoría:
AS Ingenieria Activa SAS

Firma
Nombre. Arq. Valeria Cendoya Arias
SUPERVISOR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Municipio
El Carmen de Viboral


EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

EDUR
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural

			ACTA N°	**3 y4**
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia
ÍTEM	1.1	**UNIDAD DE MEDIDA**		dia
DESCRIPCIÓN	Localización, Trazado y Replanteo con equipos de precision, incluye levantamiento de los elementos representivos y entrega final de memorias digitales.			

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	dia	Total	Acumul.
	carrera 30	ENTRE CALLES 31 y 32					2	2	2,00
					TOTAL			2,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO

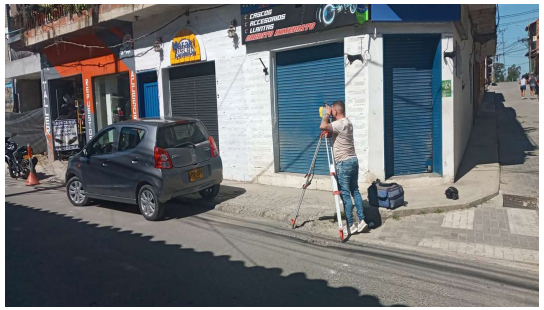



Firma
Nombre : Jaime L. Garcia Restrepo
Residente de Obra
Contratista: CONINGECON SAS
Matricula No.: 052021865 ANT

Firma
Nombre: Luis Alfonso Valencia Posada
Residente de interventoria
Interventoría:
AS Ingenieria Activa SAS

Municipio
El Carmen de Viboral

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

EDUR
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural

			ACTA Nº	**3**
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia
ÍTEM	2.1	**UNIDAD DE MEDIDA**		m3
DESCRIPCIÓN		Excavación manual de material heterogéneo de 0-2m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye transporte y botada de material proveniente en sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio		

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantidad	Total	
12/8/2024	CUADRA 6 COSTADO ORIENTAL	CARRERA 33 ENTRE CALLES 32 Y 33	32-91	8,7	1,4	0,18	1	2,19	2,19
			rejilla	-1,2	0,35	0,18	1	-0,08	2,12
			32-80 y 32-78	7,75	1,62	0,18	1	2,26	4,38
			contador	-0,35	0,5	0,18	1	-0,03	4,35
			contador	-0,35	0,5	0,18	1	-0,03	4,31
			32-70	9,6	1,7	0,18	1	2,94	7,25
			contador	-0,43	0,51	0,18	1	-0,04	7,21
			contador	-0,43	0,55	0,18	1	-0,04	7,17
			rejilla	-1,2	0,35	0,18	1	-0,08	7,09
			32-66	6,8	1,63	0,18	1	2,00	9,09
			contador	-0,4	0,51	0,18	1	-0,04	9,05
			rejilla	-1,7	0,5	0,18	1	-0,15	8,90
			32-56	5,5	1,54	0,18	1	1,52	10,42
			contador	-0,4	0,51	0,18	1	-0,04	10,39
			32-46 (edificio)	7,39	1,43	0,18	1	1,90	12,29
			32-36	5,32	1,1	0,18	1	1,05	13,34
			contador	-0,4	0,51	0,18	1	-0,04	13,31
			32-34	7,8	1,05	0,18	1	1,47	14,78
			contador	-0,4	0,51	0,18	1	-0,04	14,74
			32-28 Y 32-26	4,04	2,22	0,18	1	1,61	16,36
			contador	-0,5	0,4	0,18	1	-0,04	16,32
			32-16	4,82	0,99	0,18	1	0,86	17,18
			contador	-0,5	0,4	0,18	1	-0,04	17,14
			32-12	4,29	0,93	0,18	1	0,72	17,86
			contador	-0,46	0,4	0,18	1	-0,03	17,83

Municipio
El Carmen de Viboral

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

EDUR
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural

			ACTA Nº	**3**
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia
ÍTEM	2,1	**UNIDAD DE MEDIDA**		m3
DESCRIPCIÓN		Excavación manual de material heterogéneo de 0-2m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye transporte y botada de material proveniente en sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio		

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantidad	Total	
			32-06			0,18	1	0,00	17,83
				5	2,14	0,18	1	1,93	19,76
				3	1,8	0,18	1	0,97	20,73
				2	1,12	0,18	1	0,40	21,13
				6,2	1,43	0,18	1	1,60	22,73
			caja	-0,85	0,85	0,18	1	-0,13	22,60
			contador	-0,4	0,5	0,18	1	-0,04	22,56
			bordillo	42,50	0,2	0,17	1	1,45	24,01
	CUADRA 6 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 33-32 VEHICULAR	32-56	5,2	1,54	0,26	1	2,08	26,09
		CRRA 33 ENTRE CALES 33-32 VEHICULAR	32-46 edificio	2,96	1,54	0,26	1	1,19	27,27
		CRRA 33 ENTRE CALES 33-32 VEHICULAR	32-46 edificio	0,5	1,12	0,26	1	0,15	27,42
		CRRA 33 ENTRE CALES 33-32 VEHICULAR	32-34	2,96	2,23	0,26	1	1,72	29,13
			31-80 FACHADA A LA CALLE 32	4,56	0,72	0,18	1	0,59	29,73
			contador	-0,5	0,4	0,18	1	-0,04	29,69
			contador	-0,5	0,4	0,18	1	-0,04	29,65
				3,1	2,04	0,18	1	1,14	30,79
			contador	-0,5	0,4	0,18	1	-0,04	30,76
			contador	-0,5	0,4	0,18	1	-0,04	30,72
			31-80 CURVA	3	1,7	0,18	1	0,92	31,64
			31-80 FACHADA CRR 33	3,37	1,68	0,18	1	1,02	32,66
			caja	-0,7	0,7	0,18	1	-0,09	32,57
			31-76 A 31-72	14	1,56	0,18	1	3,93	36,50
			caja	-0,8	0,8	0,18	1	-0,12	36,38
			caja	-0,8	8	0,18	1	-1,15	35,23
			contador	-1,53	0,55	0,18	4	-0,61	34,63
			31-64	8,2	1,38	0,18	1	2,04	36,66
			contador	-0,5	0,4	0,18	1	-0,04	36,63
			rejilla	-1,15	0,3	0,18	1	-0,06	36,57

Municipio
El Carmen de Viboral

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

EDUR
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural

			ACTA Nº	**3**
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia
ÍTEM	2,1	**UNIDAD DE MEDIDA**		m3
DESCRIPCIÓN		Excavación manual de material heterogéneo de 0-2m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye transporte y botada de material proveniente en sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio		

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantidad	Total	
	CUADRA 7 COSTADO oriental	CARRERA 33 ENTRE CALLES 31 Y 32	31-56	4,95	1,42	0,18	1	1,27	37,83
			contador	-0,40	0,5	0,18	1	-0,04	37,79
			contador	-0,40	0,5	0,18	1	-0,04	37,76
			31-48	7,35	1,45	0,18	1	1,92	39,68
			contador	-0,40	0,5	0,18	1	-0,04	39,64
			31-42	4,72	1,44	0,18	1	1,22	40,86
			caja 1 y caja 2	-0,87	1,53	0,18	1	-0,24	40,63
			31-40	3,2	1,4	0,18	1	0,81	41,43
			caja	-0,8	0,8	0,18	1	-0,12	41,32
			31-32	4,14	2,28	0,18	1	1,70	43,02
			contadores	-1,40	0,55	0,18	1	-0,14	42,88
			caja 1	-0,80	0,8	0,18	1	-0,12	42,76
			31-26	7,49	1,4	0,18	1	1,89	44,65
			caja 1	-0,80	0,8	0,18	1	-0,12	44,53
			contador	-0,40	0,5	0,18	1	-0,04	44,50
			31-22 ron viejo de caldas	2,13	1,38	0,18	1	0,53	45,03
			31-20	3,7	1,38	0,18	1	0,92	45,95
			31-18	2,25	1,4	0,18	1	0,57	46,51
			contador	-0,40	0,5	0,18	1	-0,04	46,48
			31-16	2,6	1,4	0,18	1	0,66	47,13
			31-04	5,6	1,4	0,18	1	1,41	48,54
			caja 1	-0,30	0,3	0,18	1	-0,02	48,53
			curva	2,5	1,4	0,18	1	0,63	49,16
			esquina	3,6	1,55	0,18	1	1,00	50,16
			bordillo	76,00	0,2	0,17	1	2,58	52,75
	CUADRA 7 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 32-31 VEHICULAR	31-40	3,15	1,4	0,26	1	1,15	53,89
			caja	-0,8	0,8	0,26	1	-0,17	53,73
		CRRA 33 ENTRE CALES 32-31 VEHICULAR	31-36	3,47	2,1	0,26	1	1,89	55,62

Municipio
El Carmen de Viboral

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

EDUR
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural

ACTA Nº				**3**							
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia							
ÍTEM	2,1	**UNIDAD DE MEDIDA**		m3							
DESCRIPCIÓN		Excavación manual de material heterogéneo de 0-2m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye transporte y botada de material proveniente en sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio									
Fecha	**FRENTE DE TRABAJO**		**Descripción**	**Observaciones**	**Long.**	**Ancho**	**Prof.**	**Cantidad**	**Total**		
	CUADRA 8 COSTADO oriental		CRRA 33 ENTRE CALLES 30 Y 31	31-103 esquina	2,7	2	0,18	1	0,97	56,59	
				contador	-0,5	0,4	0,18	1	-0,04	56,56	
				31-103 X CRR33- 30-79 GARAJE NEGRO	14,3	1,7	0,18	1	4,38	60,93	
				30-76	3,6	1,65	0,18	1	1,07	62,00	
				contador	-0,5	0,4	0,18	1	-0,04	61,97	
				30-74	4,6	1,62	0,18	1	1,34	63,31	
				contador	-0,5	0,4	0,18	1	-0,04	63,27	
				caja	-0,8	0,8	0,18	1	-0,12	63,16	
				30-60	8,16	1,54	0,18	1	2,26	65,42	
				contador	-0,40	0,5	0,18	1	-0,04	65,38	
				30-52	8,22	1,5	0,18	1	2,22	67,60	
				contador	-0,40	0,5	0,18	1	-0,04	67,56	
				30-42	6,37	1,45	0,18	1	1,66	69,23	
				contador	-0,40	0,5	0,18	1	-0,04	69,19	
				contador	-0,40	0,5	0,18	1	-0,04	69,16	
				caja	-0,80	0,8	0,18	1	-0,12	69,04	
				rejilla	-1,00	0,25	0,18	1	-0,05	69,00	
				30-30	4,3	2,55	0,18	1	1,97	70,97	
				contador	-1,53	0,7	0,18	1	-0,19	70,78	
				30-18	7,55	1,32	0,18	1	1,79	72,57	
				contador	-0,40	0,5	0,18	1	-0,04	72,53	
				caja	-0,80	0,8	0,18	1	-0,12	72,42	
				30--06 y 30 - 10	6,2	2,06	0,18	1	2,30	74,72	
				contadores	-1,53	0,6	0,18	1	-0,17	74,55	
				bordillo	90,90	0,2	0,17	1	3,09	77,64	
			CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30	30-74	2,35	1,64	0,26	1	1,00	78,65	
			CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30	30-40	7,25	1,4	0,26	1	2,64	81,28	
			CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30	contador	-0,40	0,5	0,26	1	-0,05	81,23	

Municipio
El Carmen de Viboral

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

EDUR
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural

			ACTA Nº	**3**
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia
ÍTEM	2,1	**UNIDAD DE MEDIDA**		m3
DESCRIPCIÓN		Excavación manual de material heterogéneo de 0-2m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye transporte y botada de material proveniente en sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio		

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantidad	Total	
	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30	rejilla	-2,70	0,26	0,26	1	-0,18	81,05
		CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30	rejilla	-1,72	0,28	0,26	1	-0,13	80,92
		CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30	30-30 edificio yamaha	1,53	1,5	0,26	1	0,60	81,52
		CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30	30-30 edificio yamaha	2,47	2,65	0,26	1	1,70	83,22
		CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30	30-30 edificio yamaha	0,9	1,53	0,26	1	0,36	83,58
		CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30	30-30 edificio yamaha	2,5	2,62	0,26	1	1,70	85,28
	CUADRA 9 COSTADO Occidental	CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 PEATONAL	30-81-CURVA	3,2	1,4	0,18	1	0,81	86,09
			31-79 SOBRE 33	7,00	1,64	0,18	1	2,07	88,16
			30-75	3	1,64	0,18	1	0,89	89,04
			30-69 EDF	1,3	3,13	0,18	1	0,73	89,77
			AGENCIA DE VIAJES	2,23	3,72	0,18	1	1,49	91,27
			30-39	4,66	1,33	0,18	1	1,12	92,38
			contador	-0,40	0,5	0,18	1	-0,04	92,35
			30-31	8,44	1,29	0,18	1	1,96	94,31
			30-21	3,62	2,23	0,18	1	1,45	95,76
			2 contador	-0,80	2,45	0,18	1	-0,35	95,41
			30-15	5,55	1,23	0,18	1	1,23	96,64
			edificio calle 30 x cr 33 occidental-norte	3,55	0,4	0,18	1	0,26	96,89
			contador	-0,40	0,5	0,18	1	-0,04	96,86
				3,9	2,7	0,18	1	1,90	98,75
				-0,80	8	0,18	1	-1,15	97,60
				2,80	3,25	0,18	1	1,64	99,24
				-0,80	0,8	0,18	1	-0,12	99,12
				3,00	3,2	0,18	1	1,73	100,85
			esquina	2,50	2,4	0,18	1	1,08	101,93
			calle 30 entre cr 33 y cr 34	8,80	1,4	0,18	1	2,22	104,15
			cajas	-0,70	0,7	0,18	5	-0,44	103,71

Municipio El Carmen de Viboral	**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR**	EDUR Empresa de Desarrollo Urbano y Rural

			ACTA Nº	**3**
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia
ÍTEM	2,1	**UNIDAD DE MEDIDA**		m3
DESCRIPCIÓN		Excavación manual de material heterogéneo de 0-2m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye transporte y botada de material proveniente en sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio		

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantidad	Total	
			contadores	-0,50	0,4	0,18	5	-0,18	103,53
			bordillo	109,65	0,2	0,17	1	3,73	107,26
	CUADRA 9 COSTADO OCCIDENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 VEHICULAR	30-75	2,9	1,68	0,26	1	1,27	108,52
		CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 VEHICULAR	caja	-0,82	0,8	0,26	1	-0,17	108,35
		CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 VEHICULAR	contador	-0,40	0,5	0,26	1	-0,05	108,30
		CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 VEHICULAR	30-69 EDF	5,6	4,36	0,26	1	6,35	114,65
		CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 VEHICULAR	caja	-1,63	1	0,26	1	-0,42	114,22
		CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 VEHICULAR	agencia de viajes	4,8	3,4	0,26	1	4,24	118,47
		CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 VEHICULAR	guia	-2,38	0,2	0,26	1	-0,12	118,34
		CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 VEHICULAR	COOTRACARMEN curva	2,00	1,38	0,26	0,5	0,36	118,70
			COOTRACARMEN	11,50	1,44	0,26	1	4,31	123,01
			contador	-0,5	0,4	0,26	1	-0,05	122,96
			30-39	3,57	1,41	0,26	1	1,31	124,26
			caja	-0,9	0,7	0,26	1	-0,16	124,10
			contador	-0,6	0,45	0,26	1	-0,07	124,03
12/8/2024			32-06- POR LA 32	7,1	1,94	0,18	1	2,48	126,51
12/8/2024			Traslado sumidero crr33 con calle 33 esquina -1	1,4	0,9	0,7	1	0,88	127,39
12/8/2024			Traslado sumidero crr33 con calle 33 esquina -2	0,52	0,3	0,72	1	0,11	127,50
12/8/2024			Traslado sumidero crr33 con calle 33 esquina -2	0,62	0,56	0,72	1	0,25	127,75

Municipio
El Carmen de Viboral

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

EDUR
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural

			ACTA Nº	**3**
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia
ÍTEM	2,1	**UNIDAD DE MEDIDA**		m3
DESCRIPCIÓN		Excavación manual de material heterogéneo de 0-2m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye transporte y botada de material proveniente en sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio		


Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantidad	Total	
10/9/2024			Excavacion para muro de bordillo vaciadoo de la 31-26 la 31-16	20,2	0,9	0,56	1	10,18	137,93
10/9/2024			EXCAVACION PARA CAJAS DE CAMBIO DE LA 31-26 la 31-16	0,7	0,97	0,56	3	1,14	139,08
9/9/2024	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 PEATONAL	Excavacion para instalar tuberia de 10" de 31-80 a 31-64	67,2	0,30	0,55	1	11,09	150,16
			SUMIDERO INTERSECION ENTRE CRR33 Y CALLE 33A	1,50	1,10	1,30	1	2,15	152,31
					TOTAL			**152,31**	

REGISTRO FOTOGRAFICO







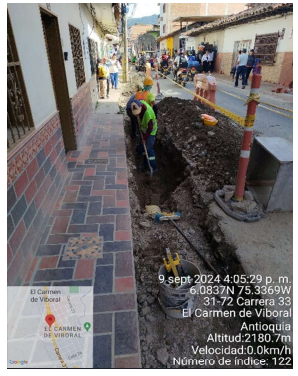

Firma
Nombre : Jaime L. Garcia Restrepo
Residente de Obra
Contratista: CONINGECON SAS
Matricula No.: 052021865 ANT

Firma
Nombre: Luis Alfonso Valencia Posada
Residente de interventoria
Interventoría:
AS Ingenieria Activa SAS

Municipio
El Carmen de Viboral

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

EDUR
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural

ACTA Nº	**3**

CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia
ÍTEM	2.3	**UNIDAD DE MEDIDA**		m3
DESCRIPCIÓN			Llenos con material proveniente de la excavación compactados mecánicamente. Incluye transporte interno	

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantid	Total	Acumul.
	CUADRA 6 COSTADO OCCIDENTAL		Excavacion para instalar tuberia de 6" de 32-66 al	24	0,7	0,3	1	5,04	5,04
	CUADRA 5 COSTADO OCCIDENTAL	CRRA 33 CALLE 32 Y 31	TUBERIA DE 4"	1,40	0,60	0,20	4	0,67	5,71
	CUADRA 5 COSTADO OCCIDENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 32-31	TUBERIA 6"-DE GARAJE Nº 31-51 A 31-33	23,76	0,60	0,20	1	2,85	8,56
	CUADRA 5 COSTADO OCCIDENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 32-31	TUBERIA 6"-DE GARAJE Nº 31-13 SUMIDERO	14,30	0,60	0,20	1	1,72	10,28
Septiembre	CUADRA 5 COSTADO OCCIDENTAL	CRRA 33 CALLE 32 Y 31	TUBERIA DE 4"	1,40	0,60	0,20	4	0,67	10,95
Septiembre	CUADRA 8COSTADO OCCIDENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 C.E	TUBERIA 10"	67,20	0,60	0,55	1	22,18	33,13
				TOTAL				**33,13**	

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firma

Nombre : Jaime L. Garcia Restrepo
Residente de Obra
Contratista: CONINGECON SAS
Matricula No.: 052021865 ANT

Firma

Nombre: Luis Alfonso Valencia Posada
Residente de interventoria
Interventoría:
AS Ingenieria Activa SAS

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

				ACTA Nº	**3 y 4**
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia	
ÍTEM	3.1	**UNIDAD DE MEDIDA**		m3	
DESCRIPCIÓN		Suministro, transporte, colocación y compactación por medios mecánicos de Base Granular de acuerdo a especificación 330 de INVIAS			

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Area	Ancho	Prof.	Cantid	Total	Acum
	CUADRA 6 COSTADO ORIENTAL	CARRERA 33 ENTRE CALLES 32 Y 33	32-91	8,7	1,4	0,15	1	1,83	1,83
			rejilla	-1,2	0,35	0,15	1	-0,06	1,76
			32-80 y 32-78	7,75	1,62	0,15	1	1,88	3,65
			contador	-0,35	0,5	0,15	1	-0,03	3,62
			contador	-0,35	0,5	0,15	1	-0,03	3,59
			32-70	9,6	1,7	0,15	1	2,45	6,04
			contador	-0,43	0,51	0,15	1	-0,03	6,01
			contador	-0,43	0,55	0,15	1	-0,04	5,97
			rejilla	-1,2	0,35	0,15	1	-0,06	5,91
			32-66	6,8	1,63	0,15	1	1,66	7,57
			contador	-0,4	0,51	0,15	1	-0,03	7,54
			rejilla	-1,7	0,5	0,15	1	-0,13	7,42
			32-56	5,5	1,54	0,15	1	1,27	8,69
			contador	-0,4	0,51	0,15	1	-0,03	8,66
			32-46 (edificio)	7,39	1,43	0,15	1	1,59	10,24
			32-36	5,32	1,1	0,15	1	0,88	11,12
			contador	-0,4	0,51	0,15	1	-0,03	11,09
			32-34	7,8	1,05	0,15	1	1,23	12,32
			contador	-0,4	0,51	0,15	1	-0,03	12,29
			32-28 Y 32-26	4,04	2,22	0,15	1	1,35	13,63
			contador	-0,5	0,4	0,15	1	-0,03	13,60
			32-16	4,82	0,99	0,15	1	0,72	14,32
			contador	-0,5	0,4	0,15	1	-0,03	14,29
			32-12	4,29	0,93	0,15	1	0,60	14,89
			contador	-0,46	0,4	0,15	1	-0,03	14,86
			32-06			0,15	1	0,00	14,86
				5	2,14	0,15	1	1,61	16,46
				3	1,8	0,15	1	0,81	17,27
				2	1,12	0,15	1	0,34	17,61
				6,2	1,43	0,15	1	1,33	18,94
			caja	-0,85	0,85	0,15	1	-0,11	18,83
			contador	-0,4	0,5	0,15	1	-0,03	18,80
	CUADRA 6 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 33-32 VEHICULAR	32-56	5,2	1,54	0,25	1	2,00	20,80
		CRRA 33 ENTRE CALES 33-32 VEHICULAR	32-46 edificio	2,96	1,54	0,25	1	1,14	21,94
		CRRA 33 ENTRE CALES 33-32 VEHICULAR	32-46 edificio	0,5	1,12	0,25	1	0,14	22,08

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

				ACTA Nº	**3 y 4**
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia	
ÍTEM	3,1	**UNIDAD DE MEDIDA**		m3	
DESCRIPCIÓN		Suministro, transporte, colocación y compactación por medios mecánicos de Base Granular de acuerdo a especificación 330 de INVIAS			

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Area	Ancho	Prof.	Cantid	Total	Acum
		CRRA 33 ENTRE CALES 33-32 VEHICULAR	32-34	2,96	2,23	0,25	1	1,65	23,73
	CUADRA 7 COSTADO oriental	CARRERA 33 ENTRE CALLES 31 Y 32	31-80 FACHADA A LA CALLE 32	4,56	0,72	0,15	1	0,49	24,22
			contador	-0,5	0,4	0,15	1	-0,03	24,19
			contador	-0,5	0,4	0,15	1	-0,03	24,16
				3,1	2,04	0,15	1	0,95	25,11
			contador	-0,5	0,4	0,15	1	-0,03	25,08
			contador	-0,5	0,4	0,15	1	-0,03	25,05
			31-80 CURVA	3	1,7	0,15	1	0,77	25,82
			31-80 FACHADA CRR 33	3,37	1,68	0,15	1	0,85	26,67
			caja	-0,7	0,7	0,15	1	-0,07	26,59
			31-76 A 31-72	14	1,56	0,15	1	3,28	29,87
			caja	-0,8	0,8	0,15	1	-0,10	29,77
			caja	-0,8	8	0,15	1	-0,96	28,81
			contador	-1,53	0,55	0,15	4	-0,50	28,31
			31-64	8,2	1,38	0,15	1	1,70	30,01
			contador	-0,5	0,4	0,15	1	-0,03	29,98
			rejilla	-1,15	0,3	0,15	1	-0,05	29,92
			31-56	4,95	1,42	0,15	1	1,05	30,98
			contador	-0,40	0,5	0,15	1	-0,03	30,95
			contador	-0,40	0,5	0,15	1	-0,03	30,92
			31-48	7,35	1,45	0,15	1	1,60	32,52
			contador	-0,40	0,5	0,15	1	-0,03	32,49
			31-42	4,72	1,44	0,15	1	1,02	33,51
			caja 1 y caja 2	-0,87	1,53	0,15	1	-0,20	33,31
			31-40	3,2	1,4	0,15	1	0,67	33,98
			caja	-0,8	0,8	0,15	1	-0,10	33,88
			31-32	4,14	2,28	0,15	1	1,42	35,30
			contadores	-1,40	0,55	0,15	1	-0,12	35,18
			caja 1	-0,80	0,8	0,15	1	-0,10	35,09

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

ACTA Nº				**3 y 4**	
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia	
ÍTEM	3,1	**UNIDAD DE MEDIDA**		m3	
DESCRIPCIÓN		Suministro, transporte, colocación y compactación por medios mecánicos de Base Granular de acuerdo a especificación 330 de INVIAS			

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Area	Ancho	Prof.	Cantid	Total	Acum
			31-26	7,49	1,4	0,15	1	1,57	36,66
			caja 1	-0,80	0,8	0,15	1	-0,10	36,56
			contador	-0,40	0,5	0,15	1	-0,03	36,53
			31-22 ron viejo de caldas	2,13	1,38	0,15	1	0,44	36,98
			31-20	3,7	1,38	0,15	1	0,77	37,74
			31-18	2,25	1,4	0,15	1	0,47	38,21
			contador	-0,40	0,5	0,15	1	-0,03	38,18
			31-16	2,6	1,4	0,15	1	0,55	38,73
			31-04	5,6	1,4	0,15	1	1,18	39,91
			caja 1	-0,30	0,3	0,15	1	-0,01	39,89
			curva	2,5	1,4	0,15	1	0,53	40,42
			esquina	3,6	1,55	0,15	1	0,84	41,25
	CUADRA 7 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 32-31 VEHICULAR	31-40	3,15	1,4	0,25	1	1,10	42,36
			caja	-0,8	0,8	0,25	1	-0,16	42,20
		CRRA 33 ENTRE CALES 32-31 VEHICULAR	31-36	3,47	2,1	0,25	1	1,82	44,02
	CUADRA 8 COSTADO oriental	CRRA 33 ENTRE CALLES 30 Y 31	31-103 esquina	2,7	2	0,15	1	0,81	44,83
			contador	-0,5	0,4	0,15	1	-0,03	44,80
			31-103 X CRR33- 30-79 GARAJE NEGRO	14,3	1,7	0,15	1	3,65	48,45
			30-76	3,6	1,65	0,15	1	0,89	49,34
			contador	-0,5	0,4	0,15	1	-0,03	49,31
			30-74	4,6	1,62	0,15	1	1,12	50,42
			contador	-0,5	0,4	0,15	1	-0,03	50,39
			caja	-0,8	0,8	0,15	1	-0,10	50,30
			30-60	8,16	1,54	0,15	1	1,88	52,18
			contador	-0,40	0,5	0,15	1	-0,03	52,15
			30-52	8,22	1,5	0,15	1	1,85	54,00
			contador	-0,40	0,5	0,15	1	-0,03	53,97
			30-42	6,37	1,45	0,15	1	1,39	55,36
			contador	-0,40	0,5	0,15	1	-0,03	55,33
			contador	-0,40	0,5	0,15	1	-0,03	55,30
			caja	-0,80	0,8	0,15	1	-0,10	55,20
			rejilla	-1,00	0,25	0,15	1	-0,04	55,16

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

				ACTA Nº	**3 y 4**
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia	
ÍTEM	3,1	**UNIDAD DE MEDIDA**		m3	
DESCRIPCIÓN		Suministro, transporte, colocación y compactación por medios mecánicos de Base Granular de acuerdo a especificación 330 de INVIAS			

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Area	Ancho	Prof.	Cantid	Total	Acum
			30-30	4,3	2,55	0,15	1	1,64	56,81
			contador	-1,53	0,7	0,15	1	-0,16	56,65
			30-18	7,55	1,32	0,15	1	1,49	58,14
			contador	-0,40	0,5	0,15	1	-0,03	58,11
			caja	-0,80	0,8	0,15	1	-0,10	58,02
			30--06 y 30 - 10	6,2	2,06	0,15	1	1,92	59,93
			contadores	-1,53	0,6	0,15	1	-0,14	59,80
	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30 VEHICULARL	30-74	2,35	1,64	0,25	1	0,96	60,76
		CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30 VEHICULARL	30-40	7,25	1,4	0,25	1	2,54	63,30
		CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30 VEHICULARL	contador	-0,40	0,5	0,25	1	-0,05	63,25
		CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30 VEHICULARL	rejilla	-2,70	0,26	0,25	1	-0,18	63,07
		CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30 VEHICULARL	rejilla	-1,72	0,28	0,25	1	-0,12	62,95
		CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30 VEHICULARL	30-30 edificio yamaha	1,53	1,5	0,25	1	0,57	63,52
		CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30 VEHICULARL	30-30 edificio yamaha	2,47	2,65	0,25	1	1,64	65,16
		CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30 VEHICULARL	30-30 edificio yamaha	0,9	1,53	0,25	1	0,34	65,51
		CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30 VEHICULARL	30-30 edificio yamaha	2,5	2,62	0,25	1	1,64	67,14
	CUADRA 9 COSTADO Occidental	CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 PEATONAL	30-81-CURVA	3,2	1,4	0,15	1	0,67	67,81
			31-79 SOBRE 33	7,00	1,64	0,15	1	1,72	69,54
			30-75	3	1,64	0,15	1	0,74	70,27
			30-69 EDF	1,3	3,13	0,15	1	0,61	70,89
			AGENCIA DE VIAJES	2,23	3,72	0,15	1	1,24	72,13
			30-39	4,66	1,33	0,15	1	0,93	73,06
			contador	-0,40	0,5	0,15	1	-0,03	73,03
			30-31	8,44	1,29	0,15	1	1,63	74,66
			30-21	3,62	2,23	0,15	1	1,21	75,87
			2 contador	-0,80	2,45	0,15	1	-0,29	75,58
			30-15	5,55	1,23	0,15	1	1,02	76,60
			edificio calle 30 x cr 33 occidental-norte	3,55	0,4	0,15	1	0,21	76,82
			contador	-0,40	0,5	0,15	1	-0,03	76,79
				3,9	2,7	0,15	1	1,58	78,37
				-0,80	8	0,15	1	-0,96	77,41
				2,80	3,25	0,15	1	1,37	78,77
				-0,80	0,8	0,15	1	-0,10	78,67
				3,00	3,2	0,15	1	1,44	80,11

Municipio
El Carmen de Viboral


EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

EDUR
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural

				ACTA Nº	**3 y 4**
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia	
ÍTEM	3.1	**UNIDAD DE MEDIDA**		m3	
DESCRIPCIÓN		Suministro, transporte, colocación y compactación por medios mecánicos de Base Granular de acuerdo a especificación 330 de INVIAS			

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Area	Ancho	Prof.	Cantid	Total	Acum
			esquina	2,50	2,4	0,15	1	0,90	81,01
			calle 30 entre cr 33 y cr 34	8,80	1,4	0,15	1	1,85	82,86
			cajas	-0,70	0,7	0,15	5	-0,37	82,50
			contadores	-0,50	0,4	0,15	5	-0,15	82,35
	CUADRA 9 COSTADO OCCIDENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 VEHICULAR	30-75	2,9	1,68	0,25	1	1,22	83,56
		CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 VEHICULAR	caja	-0,82	0,8	0,25	1	-0,16	83,40
		CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 VEHICULAR	contador	-0,40	0,5	0,25	1	-0,05	83,35
		CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 VEHICULAR	30-69 EDF	5,6	4,36	0,25	1	6,10	89,45
		CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 VEHICULAR	caja	-1,63	1	0,25	1	-0,41	89,05
		CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 VEHICULAR	agencia de viajes	4,8	3,4	0,25	1	4,08	93,13
		CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 VEHICULAR	guia	-2,38	0,2	0,25	1	-0,12	93,01
		CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 VEHICULAR	COOTRACARMEN curva	2,00	1,38	0,25	0,5	0,35	93,35
			COOTRACARMEN	11,50	1,44	0,25	1	4,14	97,49
			contador	-0,5	0,4	0,25	1	-0,05	97,44
			30-39	3,57	1,41	0,25	1	1,26	98,70
			caja	-0,9	0,7	0,25	1	-0,16	98,54
			contador	-0,6	0,45	0,25	1	-0,07	98,48
				TOTAL				**98,48**	

REGISTRO FOTOGRAFICO









Firma
Nombre : Jaime L. Garcia Restrepo
Residente de Obra
Contratista: CONINGECON SAS
Matricula No.: 052021865 ANT

Firma
Nombre: Luis Alfonso Valencia Posada
Residente de interventoria
Interventoría:
AS Ingenieria Activa SAS

Municipio
El Carmen de Viboral

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

EDUR
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural

ACTA Nº	**3**


CONTRATO No	**COP-004-2024-CO**	**CONTRATISTA**	**CONINGECON S.A.S**	**Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia**
ÍTEM	4.1	**UNIDAD DE MEDIDA**		**Und**
DESCRIPCIÓN		Suministro, transporte y colocación de Bordillo prefabricado de concreto de 21 Mpa, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto (BOBAR o BOREC) Dimensiones 15*35*80. Incluye mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.		

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho cordon con pega	Prof.	Cantidad	Total	Acumul
semana 9	CUADRA 6 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALLES 33-32	Bordillo	42,50	0,82		1	52,00	52,00
	CUADRA 7 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALLES 32-31	Bordillo	76	0,82		1	93,00	145,00
	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30	Bordillo	90,90	0,82		1	111,00	256,00
	CUADRA 9 COSTADO OCCIDENTAL	CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30	Bordillo	109,65	0,82		1	134,00	390,00
	CUADRA 10 COSTADO OCCIDENTAL	CRRA 30 ENTRE CALLES 31-32	Bordillo	78	0,82		1	95,00	485,00
	CUADRA 11 COSTADO ORIENTAL	CRRA 30 ENTRE CALLES 31-32	Bordillo	75	0,82		1	91,00	576,00
					TOTAL			**576,00**	

REGISTRO FOTOGRAFICO









Firma
Nombre : Jaime L. Garcia Restrepo
Residente de Obra
Contratista: CONINGECON SAS
Matricula No.: 052021865 ANT

Firma
Nombre: Luis Alfonso Valencia Posada
Residente de interventoria
Interventoría:
AS Ingenieria Activa SAS

Municipio El Carmen de Viboral	**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR**	EDUR Empresa de Desarrollo Urbano y Rural

ACTA Nº **3**

CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia
ÍTEM	4,2	**UNIDAD DE MEDIDA**		Kg
DESCRIPCIÓN			Suministro, transporte, figuración y colocación de acero de refuerzo de figurado fy: 420 Mpa - 60000 PSI, corrugado.	

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	DIAMETR	LONG	CANTIDAD	LOG TOTAL	KG/M	KG	Acumul
	CUADRA 7 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 FRENTE A CALLE 31 COSTADO NORTE -MURO CONTENCCIONX CALLE 32-VASTAGO	ACERO HORIZONTAL	3/8"	20,20	4,00	80,80	0,56	45,25	45,25
	CUADRA 7 COSTADO OCCIDENTAL	CRRA 33 FRENTE A CALLE 31 COSTADO NORTE -MURO CONTENCCIONX CALLE 32- VASTAGO	ACERO TRASLAPOS	3/8"	1,65	4,00	6,60	0,56	3,70	48,94
	CUADRA7 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 FRENTE A CALLE 31 COSTADO NORTE -MURO CONTENCCIONX CALLE 32- VASTAGO	ACERO VERTICAL	1/2"	1,30	80,80	105,04	0,99	104,41	153,35
	CUADRA7 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 FRENTE A CALLE 31 COSTADO NORTE -MURO CONTENCCIONX CALLE 32-ZAPATA	ACERO HORIZONTAL	1/2"	20,20	3,00	60,60	0,99	60,24	213,59
	CUADRA 7 COSTADO OCCIDENTAL	CRRA 33 FRENTE A CALLE 31 COSTADO NORTE -MURO CONTENCCIONX CALLE 32- ZAPATA	ACERO TRASLAPOS	1/2"	1,65	3,00	4,95	0,99	4,92	218,51
	CUADRA7 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 FRENTE A CALLE 31 COSTADO NORTE -MURO CONTENCCIONX CALLE 32- ZAPATA	ACERO transversal	3/8"	0,80	80,80	64,64	0,56	36,20	254,71
					TOTAL				**254,71**	

REGISTRO FOTOGRAFICO









Firma
Nombre : Jaime L. Garcia Restrepo
Residente de Obra
Contratista: CONINGECON SAS
Matricula No.: 052021865 ANT

Firma
Nombre: Luis Alfonso Valencia Posada
Residente de interventoria
Interventoría:
AS Ingenieria Activa SAS

Municipio
El Carmen de Viboral

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

EDUR
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural

ACTA N°	**3**

CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia
ÍTEM	4.3	**UNIDAD DE MEDIDA**		m2
DESCRIPCIÓN		Sum		

Fecha	**FRENTE DE TRABAJO**	**Descripción**	**Observaciones**	DIAMETR	LONG	ANCHO	AREA	CANTIDA	AREA TO	Acumul.
	CUADRA 6 COSTADO OCCIDENTAL	CRRA 33 # 32-06	Muro de Resinte Tramo-1 (malla doble)	D-85	0,56	6,55	3,668	2	7,336	7,34
				TOTAL					**7,34**	

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firma
Nombre : Jaime L. Garcia Restrepo
Residente de Obra
Contratista: CONINGECON SAS
Matricula No.: 052021865 ANT

Firma
Nombre: Luis Alfonso Valencia Posada
Residente de interventoria
Interventoría:
AS Ingenieria Activa SAS

Municipio El Carmen de Viboral	**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR**										EDUR Empresa de Desarrollo Urbano y Rural EL CARMEN DE VIBORAL
				ACTA N°	**2**						
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras							
ÍTEM	4,4		**UNIDAD DE MEDIDA**	m3							
DESCRIPCION			Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 21 Mpa para estructuras varias, incluye formaleta y los elementos para su								
Fecha	**FRENTE DE TRABAJO**		**Descripción**	**Observaciones**	**Lo**	**An**	**Pr**	**Co**	**To**	**Ac**	

Municipio El Carmen de Viboral	**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR**										EDUR Empresa de Desarrollo Urbano y Rural
				ACTA N°	**3**						
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras							
ÍTEM	4,4		**UNIDAD DE MEDIDA**	m3							
DESCRIPCIÓN			Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 21 Mpa para estructuras varias, incluye formaleta y los elementos para su instalación.								
Fecha	**FRENTE DE TRABAJO**		**Descripción**	**Observaciones**	**Long.**	**Ancho**	**Prof.**	**Cantidad**	**Total**	**Acumul.**	
4-sep-24	CUADRA 6 COSTADO OCCIDENTAL		CRRA 33 # 32-06	Muro de Resinte Tramo-1-VASTAGO	6,55	0,3	0,56	2	2,20	2,20	
	CUADRA 7 COSTADO ORIENTAL		CRRA 33 FRENTE A CALLE 31 COSTADO NORTE -MURO CONTENCCIONX CALLE 32-VASTAGO	VASTAGO	20,20	0,15	0,70	1,00	2,12	4,32	
	CUADRA 7 COSTADO ORIENTAL		CRRA 33 FRENTE A CALLE 31 COSTADO NORTE -MURO CONTENCCIONX CALLE 32-ZAPATA	ZAPATA	20,00	0,60	0,25	1,00	3,00	7,32	
	CUADRA 6 COSTADO ORIENTAL		32-91	VACIADO PARA DE CARCAMO	2,3	0,15	0,33	1	0,11	7,44	
	CUADRA 6 COSTADO ORIENTAL			piso	1,3	0,45	0,15	1	0,09	7,52	
	CUADRA 6 COSTADO ORIENTAL		32-70	VACIADO PARA DE CARCAMO	2,3	0,15	0,12	1	0,04	7,56	
	CUADRA 6 COSTADO ORIENTAL			piso	1,3	0,45	0,15	1	0,09	7,65	
	CUADRA 6 COSTADO ORIENTAL		32-66	VACIADO PARA DE CARCAMO	3,3	0,15	0,12	1	0,06	7,71	
	CUADRA 6 COSTADO ORIENTAL			piso	1,8	0,45	0,15	1	0,12	7,83	
	CUADRA 4 COSTADO OCCIDENTAL		32-65 (1)	VACIADO PARA DE CARCAMO	2,3	0,15	0,05	1	0,02	7,67	
	CUADRA 4 COSTADO OCCIDENTAL			piso	1,3	0,45	0,15	1	0,09	7,76	
	CUADRA 4 COSTADO OCCIDENTAL		32-65 (2)	VACIADO PARA DE CARCAMO	2,3	0,15	0,33	1	0,11	7,87	
	CUADRA 4 COSTADO OCCIDENTAL			piso	1,3	0,45	0,15	1	0,09	7,96	
	CUADRA 4 COSTADO OCCIDENTAL		32-65 (3)	VACIADO PARA DE CARCAMO	4,3	0,15	0,18	1	0,12	8,08	
	CUADRA 4 COSTADO OCCIDENTAL			piso	2,3	0,45	0,15	1	0,16	8,23	
	CUADRA 7 COSTADO OCCIDENTAL		31-64	VACIADO PARA DE CARCAMO	2,3	0,15	0,27	1	0,09	8,32	
	CUADRA 7 COSTADO OCCIDENTAL			piso	1,3	0,45	0,15	1	0,09	8,41	
	CUADRA 5 COSTADO OCCIDENTAL		31-59	VACIADO PARA DE CARCAMO	2,3	0,15	0,2	1	0,07	8,48	
	CUADRA 5 COSTADO OCCIDENTAL			piso	1,3	0,45	0,15	1	0,09	8,57	

Municipio
El Carmen de Viboral

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

EDUR
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural
EL CARMEN DE VIBORAL

ACTA Nº | **2**

CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras
ÍTEM	4,4	**UNIDAD DE MEDIDA**		m3
DESCRIPCION			Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 21 Mpa para estructuras varias, incluye formaleta y los elementos para su	

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Lo	An	Pr	Co	To	Ac
	CUADRA 5 COSTADO OCCIDENTAL	31-51	VACIADO PARA DE CARCAMO	2,3	0,15	0,15	1	0,05	8,62
	CUADRA 5 COSTADO OCCIDENTAL		piso	1,3	0,45	0,15	1	0,09	8,71
	CUADRA 5 COSTADO OCCIDENTAL	31-37	VACIADO PARA DE CARCAMO	2,3	0,15	0,15	1	0,05	8,76
	CUADRA 5 COSTADO OCCIDENTAL		piso	1,3	0,45	0,15	1	0,09	8,85
	CUADRA 5 COSTADO OCCIDENTAL	31-35	VACIADO PARA DE CARCAMO	2,3	0,15	0,12	1	0,04	8,89
	CUADRA 5 COSTADO OCCIDENTAL		piso	1,3	0,45	0,15	1	0,09	8,98
	CUADRA 5 COSTADO OCCIDENTAL	31-13	VACIADO PARA DE CARCAMO	5,3	0,15	0,25	1	0,20	9,18
	CUADRA 5 COSTADO OCCIDENTAL		piso	2,8	0,45	0,15	1	0,19	9,36
	CUADRA 8 COSTADO OCCIDENTAL	30-78	VACIADO PARA DE CARCAMO	2,3	0,15	0,16	1	0,06	9,03
	CUADRA 8 COSTADO OCCIDENTAL		piso	1,3	0,45	0,15	1	0,09	9,12
	CUADRA 8 COSTADO OCCIDENTAL	30-42	VACIADO PARA DE CARCAMO	2,3	0,15	0,16	1	0,06	9,42
	CUADRA 8 COSTADO OCCIDENTAL		piso	1,3	0,45	0,15	1	0,09	9,51
	CUADRA 8 COSTADO OCCIDENTAL	30-40 (motos)	VACIADO PARA DE CARCAMO	4,3	0,15	0,2	1	0,13	9,64
	CUADRA 8 COSTADO OCCIDENTAL		piso	2,3	0,45	0,15	1	0,16	9,79
	CUADRA 8 COSTADO OCCIDENTAL	30-38 (motos)	VACIADO PARA DE CARCAMO	3,3	0,15	0,2	1	0,10	9,89
			piso	1,8	0,45	0,15	1	0,12	10,01
					TOTAL			**10,34**	

REGISTRO FOTOGRAFICO









Firma
Nombre : Jaime L. García Restrepo
Residente de Obra
Contratista: CONINGECON SAS
Matricula No.: 052021865 ANT

Firma
Nombre: Luis Alfonso Valencia Posada
Residente de interventoria
Interventoría:
AS Ingenieria Activa SAS

Municipio
El Carmen de Viboral

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

EDUR
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural


			ACTA N°	**3**
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia
ÍTEM	5,3	**UNIDAD DE MEDIDA**		ml
DESCRIPCIÓN	Construcción de LÍNEA DEMARCADORA VISUAL EN ADOQUÍN ADOP-A DE 0.10 x 0.20 x 0.06 m, color amarillo, salmón o jaspe. Incluye suministro y transporte de los adoquines sello en arena de revoque, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017.			

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantida	Total	Acumul.
12/8/2024	CUADRA 6 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 33-32	Longitudinal	97,3			1	97,30	97,30
			transversales	15,03			1	15,03	112,33
18/8/2024	CUADRA 7 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 32-31	Longitudinal	87,1			1	87,10	199,43
			transversales	18,09			1	18,09	217,52
6/9/2024	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30	Longitudinal	83,50			1	83,50	301,02
			transversales	16,19			1	16,19	317,21
	CUADRA 9 COSTADO Occidental	CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30	Longitudinal	83,70			1	83,70	400,91
			transversales	17,12			1	17,12	418,03
				TOTAL				**418,03**	

REGISTRO FOTOGRAFICO





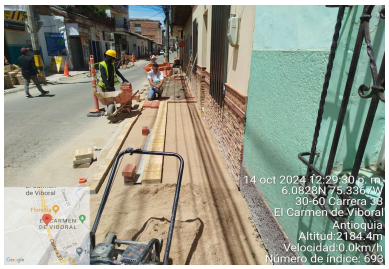



Firma
Nombre : Jaime L. Garcia Restrepo
Residente de Obra
Contratista: CONINGECON SAS
Matricula No.: 052021865 ANT

Firma
Nombre: Luis Alfonso Valencia Posada
Residente de interventoria
Interventoría:
AS Ingenieria Activa SAS

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

		ACTA Nº		**1**
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia
ÍTEM	5.4	**UNIDAD DE MEDIDA**		m2
DESCRIPCIÓN	Construcción de Piso en adoquín tipo terracota español dimensiones 20x10x6cm, colores acordes con lo indicado por la supervisión. Incluye suministro y transporte de los adoquines, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017.			

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantid	Total	Acumul

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

		ACTA Nº		**3**
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia
ÍTEM	5.4	**UNIDAD DE MEDIDA**		m2
DESCRIPCIÓN	Construcción de Piso en adoquín tipo terracota español dimensiones 20x10x6cm, colores acordes con lo indicado por la supervisión. Incluye suministro y transporte de los adoquines, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017.			

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantid	Total	Acumul
12/8/2024			32-91	8,7	1,4		1,00	12,18	12,18
			guia y tactil	-8,7	0,2		1,00	-1,74	10,44
			linea demarcadora	-8,7	0,1		1,00	-0,87	9,57
			rejilla	-1,2	0,35		1,00	-0,42	9,15
			tapete tactil	-0,9	0,62		1,00	-0,56	8,59
12/8/2024			32-80 y 32-78	7,75	1,62		1,00	12,56	21,15
			guia y tactil	-7,75	0,2		1,00	-1,55	19,60
			linea demarcadora	-7,75	0,1		1,00	-0,78	18,82
12/8/2024			contador	-0,35	0,5		1,00	-0,18	18,65
			contador	-0,35	0,5		1,00	-0,18	18,47
12/8/2024			32-70	9,6	1,7		1,00	16,32	34,79
			guia y tactil	-9,6	0,2		1,00	-1,92	32,87
			linea demarcadora	-9,6	0,1		1,00	-0,96	31,91
12/8/2024			contador	-0,43	0,51		1,00	-0,22	31,69
12/8/2024			contador	-0,43	0,55		1,00	-0,24	31,46
			rejilla	-1,2	0,35		1,00	-0,42	31,04

	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR	

ACTA Nº				1
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia
ÍTEM	5.4	**UNIDAD DE MEDIDA**		m2
DESCRIPCIÓN	Construcción de Piso en adoquín tipo terracota español dimensiones 20x10x6cm, colores acordes con lo indicado por la supervisión. Incluye suministro y transporte de los adoquines, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017.			

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantid	Total	Acumul
12/8/2024	CUADRA 6 COSTADO ORIENTAL	CARRERA 33 ENTRE CALLES 32 Y 33	32-66	6,8	1,63		1,00	11,08	42,12
			guia y tactil	-6,8	0,2		1,00	-1,36	40,76
			linea demarcadora	-6,8	0,1		1,00	-0,68	40,08
12/8/2024			contador	-0,4	0,51		1,00	-0,20	39,88
			rejilla	-1,7	0,5		1,00	-0,85	39,03
12/8/2024			32-56	5,5	1,54		1,00	8,47	47,50
			guia y tactil	-5,5	0,2		1,00	-1,10	46,40
			linea demarcadora	-5,5	0,1		1,00	-0,55	45,85
12/8/2024			contador	-0,4	0,51		1,00	-0,20	45,64
12/8/2024			32-46 (edificio)	7,39	1,43		1,00	10,57	56,21
			guia y tactil	-7,39	0,2		1,00	-1,48	54,73
			linea demarcadora	-7,39	0,1		1,00	-0,74	53,99
12/8/2024			32-36	5,32	1,1		1,00	5,85	59,84
			guia y tactil	-5,32	0,2		1,00	-1,06	58,78
			linea demarcadora	-5,32	0,1		1,00	-0,53	58,25
12/8/2024			contador	-0,4	0,51		1,00	-0,20	58,04
12/8/2024			32-34	7,8	1,05		1,00	8,19	66,23
			guia y tactil	-7,8	0,2		1,00	-1,56	64,67
			linea demarcadora	-7,8	0,1		1,00	-0,78	63,89
12/8/2024			contador	-0,4	0,51		1,00	-0,20	63,69
12/8/2024			32-28 Y 32-26	4,04	2,22		1,00	8,97	72,66
			guia y tactil	-4,04	0,2		1,00	-0,81	71,85
			linea demarcadora	-4,04	0,1		1,00	-0,40	71,45
			contador	-0,5	0,4		1,00	-0,20	71,25
12/8/2024			32-16	4,82	0,99		1,00	4,77	76,02
			guia y tactil	-4,82	0,2		1,00	-0,96	75,06
			linea demarcadora	-4,82	0,1		1,00	-0,48	74,57
			contador	-0,5	0,4		1,00	-0,20	74,37

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

			ACTA Nº	**1**
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia
ÍTEM	5.4	**UNIDAD DE MEDIDA**		m2
DESCRIPCIÓN	Construcción de Piso en adoquín tipo terracota español dimensiones 20x10x6cm, colores acordes con lo indicado por la supervisión. Incluye suministro y transporte de los adoquines, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017.			

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantid	Total	Acumul
12/8/2024			32-12	4,29	0,93		1,00	3,99	78,36
			guia y tactil	-4,29	0,2		1,00	-0,86	77,51
			linea demarcadora	-4,29	0,1		1,00	-0,43	77,08
			contador	-0,46	0,4		1,00	-0,18	76,89
12/8/2024			32-06				1,00	0,00	76,89
				5	2,14		1,00	10,70	87,59
			guia y tactil	-5	0,2		1,00	-1,00	86,59
			linea demarcadora	-5	0,1		1,00	-0,50	86,09
				3	1,8		1,00	5,40	91,49
			guia y tactil	-3	0,2		1,00	-0,60	90,89
			linea demarcadora	-3	0,1		1,00	-0,30	90,59
				2	1,12		1,00	2,24	92,83
			guia y tactil	-2	0,2		1,00	-0,40	92,43
			linea demarcadora	-2	0,1		1,00	-0,20	92,23
				6,2	1,43		1,00	8,87	101,10
			guia y tactil	-6,2	0,2		1,00	-1,24	99,86
			linea demarcadora	-6,2	0,1		1,00	-0,62	99,24
			caja	-0,85	0,85		1,00	-0,72	98,52
			contador	-0,4	0,5		1,00	-0,20	98,32
			tapete tactil	-1	0,96		1,00	-0,96	97,36
			linea transversal	-13,96	0,1		1,00	-1,40	95,96
			31-80 FACHADA A LA CALLE 32	4,56	0,72		1,00	3,28	99,24
			contador	-0,5	0,4		1,00	-0,20	99,04
			contador	-0,5	0,4		1,00	-0,20	98,84
			guia y tactil	-4,56	0,2		1,00	-0,91	97,93
			linea demarcadora	-4,56	0,1		1,00	-0,46	97,47
				3,1	2,04		1,00	6,32	103,80
			contador	-0,5	0,4		1,00	-0,20	103,60
			guia y tactil	-3,1	0,2		1,00	-0,62	102,98
			linea demarcadora	-3,1	0,1		1,00	-0,31	102,67
			contador	-0,5	0,4		1,00	-0,20	102,47

	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR	

			ACTA Nº	**1**
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia
ÍTEM	5.4	**UNIDAD DE MEDIDA**		m2
DESCRIPCIÓN	Construcción de Piso en adoquín tipo terracota español dimensiones 20x10x6cm, colores acordes con lo indicado por la supervisión. Incluye suministro y transporte de los adoquines, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017.			

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantid	Total	Acumul
18/8/2024			31-80 CURVA	3	1,7		1,00	5,10	107,57
			tapete tactil	-1	1		1,00	-1,00	106,57
18/8/2024			31-80 FACHADA CRR 33	3,37	1,68		1,00	5,66	112,23
			guia y tactil	-3,37	0,2		1,00	-0,67	111,56
			linea demarcadora	-3,37	0,1		1,00	-0,34	111,22
			caja	-0,7	0,7		1,00	-0,49	110,73
18/8/2024			31-76 A 31-72	14	1,56		1,00	21,84	132,57
			guia y tactil	-14	0,2		1,00	-2,80	129,77
			linea demarcadora-long	-14	0,1		1,00	-1,40	128,37
			caja	-0,8	0,8		1,00	-0,64	127,73
			caja	-0,8	8		1,00	-6,40	121,33
			contador	-1,53	0,55		4,00	-3,37	117,96
18/8/2024			31-64	8,2	1,38		1,00	11,32	129,28
			guia y tactil	-8,2	0,2		1,00	-1,64	127,64
			linea demarcadora	-8,2	0,1		1,00	-0,82	126,82
			contador	-0,5	0,4		1,00	-0,20	126,62
			rejilla	-1,15	0,3		1,00	-0,35	126,27
18/8/2024			31-56	4,95	1,42		1,00	7,03	133,30
			guia y tactil	-4,95	0,2		1,00	-0,99	132,31
			linea demarcadora	-4,95	0,1		1,00	-0,50	131,82
18/8/2024			contador	-0,40	0,5		1,00	-0,20	131,62
18/8/2024			contador	-0,40	0,5		1,00	-0,20	131,42
18/8/2024			31-48	7,35	1,45		1,00	10,66	142,08
			guia y tactil	-7,35	0,2		1,00	-1,47	140,61
			linea demarcadora	-7,35	0,1		1,00	-0,74	139,87
18/8/2024			contador	-0,40	0,5		1,00	-0,20	139,67
18/8/2024	CUADRA 7 COSTADO oriental	CARRERA 33 ENTRE CALLES 31 Y 32	31-42	4,72	1,44		1,00	6,80	146,47
			guia y tactil	-4,72	0,2		1,00	-0,94	145,52
			linea demarcadora	-4,72	0,1		1,00	-0,47	145,05
18/8/2024			caja 1 y caja 2	-0,87	1,53		1,00	-1,33	143,72

	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR	

ACTA Nº				1
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia
ÍTEM	5.4	**UNIDAD DE MEDIDA**		m2
DESCRIPCIÓN	Construcción de Piso en adoquín tipo terracota español dimensiones 20x10x6cm, colores acordes con lo indicado por la supervisión. Incluye suministro y transporte de los adoquines, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017.			

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantid	Total	Acumu
18/8/2024			31-32	4,14	2,28		1,00	9,44	153,16
			guia y tactil	-4,14	0,2		1,00	-0,83	152,33
			linea demarcadora	-4,14	0,1		1,00	-0,41	151,92
18/8/2024			contadores	-1,40	0,55		1,00	-0,77	151,15
18/8/2024			caja 1	-0,80	0,8		1,00	-0,64	150,51
18/8/2024			31-26	7,49	1,4		1,00	10,49	160,99
			guia y tactil	-7,49	0,2		1,00	-1,50	159,50
			linea demarcadora	-7,49	0,1		1,00	-0,75	158,75
18/8/2024			caja 1	-0,80	0,8		1,00	-0,64	158,11
18/8/2024			contador	-0,40	0,5		1,00	-0,20	157,91
18/8/2024			31-22 ron viejo de caldas	2,13	1,38		1,00	2,94	160,85
			guia y tactil	-2,13	0,2		1,00	-0,43	160,42
			linea demarcadora	-2,13	0,1		1,00	-0,21	160,21
			31-20	3,7	1,38		1,00	5,11	165,31
			guia y tactil	-3,7	0,2		1,00	-0,74	164,57
			linea demarcadora	-3,7	0,1		1,00	-0,37	164,20
18/8/2024			31-18	2,25	1,4		1,00	3,15	167,35
			guia y tactil	-2,25	0,2		1,00	-0,45	166,90
			linea demarcadora	-2,25	0,1		1,00	-0,23	166,68
18/8/2024			contador	-0,40	0,5		1,00	-0,20	166,48
18/8/2024			31-16	2,6	1,4		1,00	3,64	170,12
			guia y tactil	-2,6	0,2		1,00	-0,52	169,60
			linea demarcadora	-2,6	0,1		1,00	-0,26	169,34
18/8/2024			31-04	5,6	1,4		1,00	7,84	177,18
			guia y tactil	-5,6	0,2		1,00	-1,12	176,06
			linea demarcadora	-5,6	0,1		1,00	-0,56	175,50
18/8/2024			caja 1	-0,30	0,3		1,00	-0,09	175,41
			curva	2,5	1,4		1,00	3,50	178,91
			guia y tactil	-2,5	0,2		1,00	-0,50	178,41
			linea demarcadora	-2,5	0,1		1,00	-0,25	178,16

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

			ACTA Nº	**1**
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia
ÍTEM	5.4	**UNIDAD DE MEDIDA**		m2
DESCRIPCIÓN	Construcción de Piso en adoquín tipo terracota español dimensiones 20x10x6cm, colores acordes con lo indicado por la supervisión. Incluye suministro y transporte de los adoquines, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017.			

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantid	Total	Acumul
			esquina	3,6	1,55		1,00	5,58	183,74
			tapete tactil	-1	0,95		1,00	-0,95	182,79
			linea transversal	-17,01	0,1		1,00	-1,70	181,09
			31-103 esquina	2,7	2		1,00	5,40	186,49
			guia y tactil	-2,7	0,2		1,00	-0,54	185,95
			linea demarcadora	-2,7	0,1		1,00	-0,27	185,68
			contador	-0,5	0,4		1,00	-0,20	185,48
			tapete tactil	-1,3	1		1,00	-1,30	184,18
			31-103 X CRR33- 30-79 GARAJE NEGRO	14,3	1,7		1,00	24,31	208,49
			guia y tactil	-14,3	0,2		1,00	-2,86	205,63
			linea demarcadora	-14,3	0,1		1,00	-1,43	204,20
			30-76	3,6	1,65		1,00	5,94	210,14
			guia y tactil	-3,6	0,2		1,00	-0,72	209,42
			linea demarcadora	-3,6	0,1		1,00	-0,36	209,06
			contador	-0,5	0,4		1,00	-0,20	208,86
			30-74	4,6	1,62		1,00	7,45	216,31
			guia y tactil	-4,6	0,2		1,00	-0,92	215,39
			linea demarcadora	-4,6	0,1		1,00	-0,46	214,93
			contador	-0,5	0,4		1,00	-0,20	214,73
			caja	-0,8	0,8		1,00	-0,64	214,09
6/9/2024			30-60	8,16	1,54		1,00	12,57	226,66
			guia y tactil	-8,16	0,2		1,00	-1,63	225,02
			linea demarcadora	-8,16	0,1		1,00	-0,82	224,21
18/8/2024			contador	-0,40	0,5		1,00	-0,20	224,01
6/9/2024			30-52	8,22	1,5		1,00	12,33	236,34
	CUADRA 8 COSTADO oriental	CRRA 33 ENTRE CALLES 30 Y 31	guia y tactil	-8,22	0,2		1,00	-1,64	234,69
			linea demarcadora	-8,22	0,1		1,00	-0,82	233,87
18/8/2024			contador	-0,40	0,5		1,00	-0,20	233,67

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

			ACTA Nº	**1**
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia
ÍTEM	5.4	**UNIDAD DE MEDIDA**		m2
DESCRIPCIÓN	Construcción de Piso en adoquín tipo terracota español dimensiones 20x10x6cm, colores acordes con lo indicado por la supervisión. Incluye suministro y transporte de los adoquines, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017.			

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantid	Total	Acumu
6/9/2024			30-42	6,37	1,45		1,00	9,24	242,91
			guia y tactil	-6,37	0,2		1,00	-1,27	241,63
			linea demarcadora	-6,37	0,1		1,00	-0,64	241,00
18/8/2024			contador	-0,40	0,5		1,00	-0,20	240,80
18/8/2024			contador	-0,40	0,5		1,00	-0,20	240,60
			caja	-0,80	0,8		1,00	-0,64	239,96
			rejilla	-1,00	0,25		1,00	-0,25	239,71
6/9/2024			30-30	4,3	2,55		1,00	10,97	250,67
			guia y tactil	-4,3	0,2		1,00	-0,86	249,81
			linea demarcadora	-4,3	0,1		1,00	-0,43	249,38
18/8/2024			contador	-1,53	0,7		1,00	-1,07	248,31
6/9/2024			30-18	7,55	1,32		1,00	9,97	258,28
			guia y tactil	-7,55	0,2		1,00	-1,51	256,77
			linea demarcadora	-7,55	0,1		1,00	-0,76	256,01
			contador	-0,40	0,5		1,00	-0,20	255,81
			caja	-0,80	0,8		1,00	-0,64	255,17
6/9/2024			30--06 y 30 - 10	6,2	2,06		1,00	12,77	267,94
			guia y tactil	-6,2	0,2		1,00	-1,24	266,70
			linea demarcadora	-6,2	0,1		1,00	-0,62	266,08
			contadores	-1,53	0,6		1,00	-0,92	265,17
			linea transversal	-16,19	0,1		1,00	-1,62	263,55
18/8/2024			30-81-CURVA	3,2	1,4		1,00	4,48	268,03
			linea demarcadora	-3,2	0,1		1,00	-0,32	267,71
			tapete tactil	-1	1		1,00	-1,00	266,71
18/8/2024			30-79 SOBRE 33	7,00	1,64		1,00	11,48	278,19
			guia y tactil	-7	0,2		1,00	-1,40	276,79
			linea demarcadora	-7	0,1		1,00	-0,70	276,09
18/8/2024			30-75	3	1,64		1,00	4,92	281,01
			guia y tactil	-3	0,2		1,00	-0,60	280,41
			linea demarcadora	-3	0,1		1,00	-0,30	280,11

	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR	

			ACTA Nº	**1**
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia
ÍTEM	5.4	**UNIDAD DE MEDIDA**		m2
DESCRIPCIÓN	Construcción de Piso en adoquín tipo terracota español dimensiones 20x10x6cm, colores acordes con lo indicado por la supervisión. Incluye suministro y transporte de los adoquines, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017.			

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantid	Total	Acumul
18/8/2024	CUADRA 9 COSTADO Occidental	CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 PEATONAL	30-69 EDF	1,3	3,13		1,00	4,07	284,18
			guia y tactil	-1,3	0,2		1,00	-0,26	283,92
			linea demarcadora	-1,3	0,1		1,00	-0,13	283,79
18/8/2024			AGENCIA DE VIAJES	2,23	3,72		1,00	8,30	292,08
			guia y tactil	-2,23	0,2		1,00	-0,45	291,64
			linea demarcadora	-2,23	0,1		1,00	-0,22	291,41
			30-39	4,66	1,33		1,00	6,20	297,61
			guia y tactil	-4,66	0,2		1,00	-0,93	296,68
			linea demarcadora	-4,66	0,1		1,00	-0,47	296,21
			contador	-0,40	0,5		1,00	-0,20	296,01
			30-31	8,44	1,29		1,00	10,89	306,90
			guia y tactil	-8,44	0,2		1,00	-1,69	305,21
			linea demarcadora	-8,44	0,1		1,00	-0,84	304,37
			30-21	3,62	2,23		1,00	8,07	312,44
			guia y tactil	-3,62	0,2		1,00	-0,72	311,72
			linea demarcadora	-3,62	0,1		1,00	-0,36	311,35
			2 contador	-0,80	2,45		1,00	-1,96	309,39
			30-15	5,55	1,23		1,00	6,83	316,22
			guia y tactil	-5,55	0,2		1,00	-1,11	315,11
			linea demarcadora	-5,55	0,1		1,00	-0,56	314,56
			edificio calle 30 x cr 33 occidental-norte	3,55	0,4		1,00	1,42	315,98
			contador	-0,40	0,5		1,00	-0,20	315,78
				3,9	2,7		1,00	10,53	326,31
			guia y tactil	-3,9	0,2		1,00	-0,78	325,53
			linea demarcadora	-3,9	0,1		1,00	-0,39	325,14
				-0,80	8		1,00	-6,40	318,74
				2,80	3,25		1,00	9,10	327,84
			guia y tactil	-2,8	0,2		1,00	-0,56	327,28
			linea demarcadora	-2,8	0,1		1,00	-0,28	327,00
				-0,80	0,8		1,00	-0,64	326,36

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

ACTA Nº				1
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia
ÍTEM	5.4	**UNIDAD DE MEDIDA**		m2
DESCRIPCIÓN	Construcción de Piso en adoquín tipo terracota español dimensiones 20x10x6cm, colores acordes con lo indicado por la supervisión. Incluye suministro y transporte de los adoquines, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017.			

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantid	Total	Acumu
				3,00	3,2		1,00	9,60	335,74
			guia y tactil	-3	0,2		1,00	-0,60	335,14
			linea demarcadora	-3	0,1		1,00	-0,30	334,84
			esquina	2,50	2,4		1,00	6,00	340,84
			tapete tactil	-1	1		1,00	-1,00	339,84
			calle 30 entre cr 33 y cr 34	8,80	1,4		1,00	12,32	352,16
			guia y tactil	-8,8	0,2		1,00	-1,76	350,40
			linea demarcadora	-8,8	0,1		1,00	-0,88	349,52
			cajas	-0,70	0,7		5,00	-2,45	347,07
			contadores	-0,50	0,4		5,00	-1,00	346,07
			linea transversal	-17,12	0,1		1,00	-1,71	344,36
				TOTAL				344,36	

REGISTRO FOTOGRAFICO









Firma

Nombre : Jaime L. Garcia Restrepo
Residente de Obra
Contratista: CONINGECON SAS
Matricula No.: 052021865 ANT

Firma

Nombre: Luis Alfonso Valencia Posada
Residente de interventoria
Interventoría:
AS Ingenieria Activa SAS

	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR	

				ACTA Nº	**1**					
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia						
ÍTEM	5.5	**UNIDAD DE MEDIDA**		m2						
DESCRIPCIÓN		Construcción de Piso en adoquín tipo terracota español dimensiones 20x10x8cm, colores acordes con lo indicado por la supervisión. Incluye suministro y transporte de los adoquines, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017.								
Fecha	**FRENTE DE TRABAJO**	**Descripción**	**Observaciones**	**Long.**	**Ancho**	**Prof.**	**Cantidad**	**Total**	**Acumul.**	

Municipio
El Carmen de Viboral

	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

EDUR
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural

				ACTA Nº	**3**					
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia						
ÍTEM	5.5	**UNIDAD DE MEDIDA**		m2						
DESCRIPCIÓN		Construcción de Piso en adoquín tipo terracota español dimensiones 20x10x8cm, colores acordes con lo indicado por la supervisión. Incluye suministro y transporte de los adoquines, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017.								
Fecha	**FRENTE DE TRABAJO**	**Descripción**	**Observaciones**	**Long.**	**Ancho**	**Prof.**	**Cantidad**	**Total**	**Acumul.**	
12/8/2024	CUADRA 6 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 33-32 VEHICULAR	32-56	5,2	1,54		1	8,01	8,01	
	CUADRA 6 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 33-32 VEHICULAR	guia y tactil	-5,2	0,2		1	-1,04	6,97	
	CUADRA 6 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 33-32 VEHICULAR	linea demarcadora-long	-5,2	0,1		1	-0,52	6,45	
12/8/2024	CUADRA 6 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 33-32 VEHICULAR	32-46 edificio	2,96	1,54		1	4,56	11,01	
	CUADRA 6 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 33-32 VEHICULAR	guia y tactil	-2,96	0,2		1	-0,59	10,41	
	CUADRA 6 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 33-32 VEHICULAR	linea demarcadora-long	-2,96	0,1		1	-0,30	10,12	
	CUADRA 6 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 33-32 VEHICULAR	32-46 edificio	0,5	1,12		1	0,56	10,68	
	CUADRA 6 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 33-32 VEHICULAR	guia y tactil	-0,5	0,2		1	-0,10	10,58	
	CUADRA 6 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 33-32 VEHICULAR	linea demarcadora-long	-0,5	0,1		1	-0,05	10,53	

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

ACTA Nº				**1**						
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia						
ÍTEM	5,5	**UNIDAD DE MEDIDA**		m2						
DESCRIPCIÓN	Construcción de Piso en adoquín tipo terracota español dimensiones 20x10x8cm, colores acordes con lo indicado por la supervisión. Incluye suministro y transporte de los adoquines, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017.									

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantidad	Total	Acumul.
12/8/2024	CUADRA 6 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 33-32 VEHICULAR	32-34	2,96	2,23		1	6,60	17,13
	CUADRA 6 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 33-32 VEHICULAR	guia y tactil	-2,96	0,2		1	-0,59	16,54
	CUADRA 6 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 33-32 VEHICULAR	linea demarcadora-long	-2,96	0,1		1	-0,30	16,24
	CUADRA 7 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 32-31 VEHICULAR	31-40	3,15	1,4		1	4,41	20,65
	CUADRA 7 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 32-31 VEHICULAR	guia y tactil	-3,15	0,2		1	-0,63	20,02
	CUADRA 7 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 32-31 VEHICULAR	linea demarcadora-long	-3,15	0,1		1	-0,32	19,71
			caja	-0,8	0,8		1	-0,64	19,07
18/8/2024	CUADRA 7 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 32-31 VEHICULAR	31-36	3,47	2,1		1	7,29	26,35
	CUADRA 7 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 32-31 VEHICULAR	guia y tactil	-3,47	0,2		1	-0,69	25,66
	CUADRA 7 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 32-31 VEHICULAR	linea demarcadora-long	-3,47	0,1		1	-0,35	25,31
	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30 VEHICULARL	30-74	2,35	1,64		1	3,85	29,17
	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30 VEHICULARL	guia y tactil	-2,35	0,2		1	-0,47	28,70
	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30 VEHICULARL	linea demarcadora-long	-2,35	0,1		1	-0,24	28,46
6/9/2024	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30 VEHICULARL	30-40	7,25	1,4		1	10,15	38,61
	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30 VEHICULARL	guia y tactil	-7,25	0,2		1	-1,45	37,16
	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30 VEHICULARL	linea demarcadora-long	-7,25	0,1		1	-0,73	36,44

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

			ACTA Nº	**1**	
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia	
ÍTEM	5.5	**UNIDAD DE MEDIDA**		m2	
DESCRIPCIÓN		Construcción de Piso en adoquín tipo terracota español dimensiones 20x10x8cm, colores acordes con lo indicado por la supervisión. Incluye suministro y transporte de los adoquines, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017.			

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantidad	Total	Acumul.
18/8/2024	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30 VEHICULARL	contador	-0,40	0,5		1	-0,20	36,24
	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30 VEHICULARL	rejilla	-2,70	0,26		1	-0,70	35,53
	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30 VEHICULARL	rejilla	-1,72	0,28		1	-0,48	35,05
6/9/2024	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30 VEHICULARL	30-30 edificio yamaha	1,53	1,5		1	2,30	37,35
	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30 VEHICULARL	guia y tactil	-1,53	0,2		1	-0,31	37,04
	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30 VEHICULARL	linea demarcadora-long	-1,53	0,1		1	-0,15	36,89
6/9/2024	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30 VEHICULARL	30-30 edificio yamaha	2,47	2,65		1	6,55	43,43
	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30 VEHICULARL	guia y tactil	-2,47	0,2		1	-0,49	42,94
	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30 VEHICULARL	linea demarcadora-long	-2,47	0,1		1	-0,25	42,69
6/9/2024	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30 VEHICULARL	30-30 edificio yamaha	0,9	1,53		1	1,38	44,07
	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30 VEHICULARL	guia y tactil	-0,9	0,2		1	-0,18	43,89
	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30 VEHICULARL	linea demarcadora-long	-0,9	0,1		1	-0,09	43,80
	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30 VEHICULARL	30-30 edificio yamaha	2,5	2,62		1	6,55	50,35
	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30 VEHICULARL	guia y tactil	-2,5	0,2		1	-0,50	49,85
	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30 VEHICULARL	linea demarcadora-long	-2,5	0,1		1	-0,25	49,60
18/8/2024		CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 VEHICULAR	30-75	2,9	1,68		1	4,87	54,47

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

ACTA Nº				**1**
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia
ÍTEM	5.5	**UNIDAD DE MEDIDA**		m2
DESCRIPCIÓN	Construcción de Piso en adoquín tipo terracota español dimensiones 20x10x8cm, colores acordes con lo indicado por la supervisión. Incluye suministro y transporte de los adoquines, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017.			

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantidad	Total	Acumul.
	CUADRA 9 COSTADO OCCIDENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 VEHICULAR	guia y tactil	-2,9	0,2		1	-0,58	53,89
		CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 VEHICULAR	linea demarcadora-long	-2,9	0,1		1	-0,29	53,60
		CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 VEHICULAR	caja	-0,82	0,8		1	-0,66	52,95
18/8/2024		CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 VEHICULAR	contador	-0,40	0,5		1	-0,20	52,75
18/8/2024		CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 VEHICULAR	30-69 EDF	5,6	4,36		1	24,42	77,16
		CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 VEHICULAR	guia y tactil	-5,6	0,2		1	-1,12	76,04
		CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 VEHICULAR	linea demarcadora-long	-5,6	0,1		1	-0,56	75,48
		CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 VEHICULAR	caja	-1,63	1		1	-1,63	73,85
18/8/2024		CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 VEHICULAR	agencia de viajes	4,8	3,4		1	16,32	90,17
		CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 VEHICULAR	guia	-2,38	0,2		1	-0,48	89,70
		CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 VEHICULAR	tapete tactil	-1,3	0,86		1	-1,12	88,58
		CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 VEHICULAR	linea demarcadora-long	-4,28	0,1		1	-0,43	88,15
18/8/2024		CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 VEHICULAR	COOTRACARMEN curva	2,00	1,38		0,5	1,38	89,53
		CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 VEHICULAR	tapete tactil	1,1	1		1	1,10	90,63
			COOTRACARMEN	11,50	1,44		1	16,56	107,19
			guia y tactil	-11,5	0,2		1	-2,30	104,89
			linea demarcadora-long	-11,5	0,1		1	-1,15	103,74


EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR


				ACTA Nº	**1**
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia	
ÍTEM	5.5	**UNIDAD DE MEDIDA**		m2	
DESCRIPCIÓN		Construcción de Piso en adoquín tipo terracota español dimensiones 20x10x8cm, colores acordes con lo indicado por la supervisión. Incluye suministro y transporte de los adoquines, sello de juntas en arena, cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017.			

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantidad	Total	Acumul.
			contador	-0,5	0,4		1	-0,20	103,54
			30-39	3,57	1,41		1	5,03	108,57
			guia y tactil	-3,57	0,2		1	-0,71	107,86
			linea demarcadora-long	-3,57	0,1		1	-0,36	107,50
			caja	-0,9	0,7		1	-0,63	106,87
			contador	-0,6	0,45		1	-0,27	106,60
					TOTAL			**106,60**	

REGISTRO FOTOGRAFICO



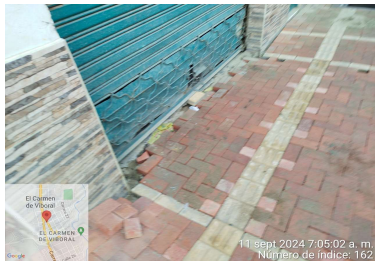

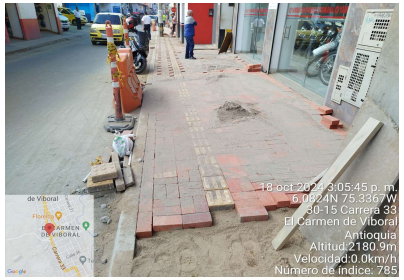

Firma

Nombre : Jaime L. Garcia Restrepo
Residente de Obra
Contratista: CONINGECON SAS
Matricula No.: 052021865 ANT

Firma

Nombre: Luis Alfonso Valencia Posada
Residente de interventoria
Interventoría:
AS Ingenieria Activa SAS

Municipio
El Carmen de Viboral

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

EDUR
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural

			ACTA Nº	**3**
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia
ÍTEM	6.1	**UNIDAD DE MEDIDA**		Und
DESCRIPCIÓN	Construcción de SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B (1.10m x 0.80m medidas externas y prof=0.90m e=0.20m), en concreto de 17.5 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja metálica, formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento,según diseño y especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos y entresuelo se pagarán en su ítem respectivo.			

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantid	Total	Acumu
	CUADRA 7 COSTADO ORIENTAL	SOBRE CARRERA 33 CRUCE CALLE 31	ESQUINA-NORTE				1	1	1
	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	SOBRE CARRERA 33 CRUCE CALLE 31	ESQUINA NORTE				1	1	2,00
	CUADRA 9 COSTADO OCCIDENTAL	SOBRE CARRERA 33 CRUCE CALLE 31	ESQUINA-SUR				1	1	3,00
	CUADRA 9 COSTADO OCCIDENTAL	SOBRE CARRERA 33 SOBRE CALLE 31	ESQUINA				1	1	4,00
				TOTAL				**4,00**	

REGISTRO FOTOGRAFICO









Firma
Nombre : Jaime L. Garcia Restrepo
Residente de Obra
Contratista: CONINGECON SAS
Matricula No.: 052021865 ANT

Firma
Nombre: Luis Alfonso Valencia Posada
Residente de interventoria
Interventoría:
AS Ingenieria Activa SAS

Municipio El Carmen de Viboral	**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR**				EDUR Empresa de Desarrollo Urbano y Rural
				ACTA Nº	**3**
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia	
ÍTEM	6.2	**UNIDAD DE MEDIDA**		und	
DESCRIPCIÓN		Caja de inspección 60x60 cm incluye tapa e=12 cm (und)			

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantidad	Total	Acumul.
	CUADRA 9 COSTADO OCCIDENTAL	esquina calle x carrara 33 subiendo hacai la carrera 34	esquina calle x carrara 33 subiendo hacai la carrera 34				4	4	4
	CUADRA 9 COSTADO OCCIDENTAL	30-02	CAJAS ELECTRICAS				3	3	7
	CUADRA 9 COSTADO OCCIDENTAL	30--10	CAJAS ELECTRICAS				1	1	8
	CUADRA 9 COSTADO OCCIDENTAL	30-30	CAJAS DE PASO				1	1	9
	CUADRA 9 COSTADO OCCIDENTAL	30-42	CAJAS DE PASO				1	1	10
	UADRA 8 COSTADO ORIENTALCCIDENT	30-39	CAJAS DE PASO				1	1	11
	UADRA 8 COSTADO ORIENTALCCIDENT	30-69	CAJAS DE PASO				2	2	13
	UADRA 8 COSTADO ORIENTALCCIDENT	30-75	CAJAS DE PASO				1	1	14
	UADRA 8 COSTADO ORIENTALCCIDENT	30-74	CAJAS DE PASO				1	1	15
	CUADRA 5 COSTADO OCCIDENTAL	CR33 X CLL 31	CAJAS DE PASO				1	1	16
	CUADRA 5 COSTADO OCCIDENTAL	31-24	CAJAS DE PASO				1	1	17
	CUADRA 5 COSTADO OCCIDENTAL	31-32	CAJAS DE PASO				1	1	18
	CUADRA 5 COSTADO OCCIDENTAL	31-40	CAJAS DE PASO				1	1	19
	CUADRA 5 COSTADO OCCIDENTAL	31-42	CAJAS DE PASO				2	2	21
	CUADRA 5 COSTADO OCCIDENTAL	31-72	CAJAS ELECTRICAS				1	1	22
	CUADRA 5 COSTADO OCCIDENTAL	31-76	CAJAS ELECTRICAS				1	1	23
	CUADRA 5 COSTADO OCCIDENTAL	31-80	CAJAS ELECTRICAS				1	1	24
	CUADRA 6 COSTADO OCCIDENTAL	32-06	CAJAS DE PASO				1	1	25
					TOTAL			**25,00**	

REGISTRO FOTOGRAFICO









Firma
Nombre : Jaime L. García Restrepo
Residente de Obra
Contratista: CONINGECON SAS
Matricula No.: 052021865 ANT

Firma
Nombre: Luis Alfonso Valencia Posada
Residente de interventoria
Interventoría:
AS Ingenieria Activa SAS

Municipio
El Carmen de Viboral

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

EDUR
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural

			ACTA N°	**3**
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia
ÍTEM	6,3	**UNIDAD DE MEDIDA**		ml
DESCRIPCIÓN		Suministro, transporte e instalación de tubería sanitaria 100 mm, (4 Pulgadas). Incluye transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie, adhesivo y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación se pagará en su ítem respectivo		

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantidad	Total	Acumul
	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 # 30-31	INSTALACIONES CONEXIÓN DE TUBERIA A SUMIDERO	16,4				16	16,40
					TOTAL			16,40	

REGISTRO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre : Jaime L. Garcia Restrepo
Residente de Obra
Contratista: CONINGECON SAS
Matricula No.: 052021865 ANT

Firma
Nombre: Luis Alfonso Valencia Posada
Residente de interventoria
Interventoría:
AS Ingenieria Activa SAS

Municipio
El Carmen de Viboral

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

EDUR
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural

			ACTA Nº	**3**
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia
ÍTEM	6.4	**UNIDAD DE MEDIDA**		ml
DESCRIPCIÓN		Suministro, transporte e instalación de tubería de presión 1/2" incluye los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.		

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantidad	Total	Acumul.
	CUADRA 6 ORIENTAL	CRRA 33 # 32-32	INSTALACIONES E, PROLONGCION DE MEDIDORES	1			1	1	1
	CUADRA 7 ORIENTAL	CRRA 33 # 31-56	INSTALACIONES E, PROLONGCION DE MEDIDORES	1			1	1	2
	CUADRA 8 ORIENTAL	CRRA 33 # 30-42	INSTALACIONES E, PROLONGCION DE MEDIDORES	2			1	2	4
					TOTAL			4,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firma
Nombre : Jaime L. Garcia Restrepo
Residente de Obra
Contratista: CONINGECON SAS
Matricula No.: 052021865 ANT

Firma
Nombre: Luis Alfonso Valencia Posada
Residente de interventoria
Interventoría:
AS Ingenieria Activa SAS

Municipio
El Carmen de Viboral


EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

EDUR
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural

			ACTA Nº	**3**
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia
ÍTEM	6.5	**UNIDAD DE MEDIDA**		und
DESCRIPCIÓN		Desmonte y reinstalación de caja de registro contador de agua, incluye los materiales y accesorios necesario para la reinstalación		

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantidad	Total	Acumul.
	CUADRA 6 COSTADO OCCIDENTAL	CRRA 33 ENTRE 32-33					7	7	7
	CUADRA 7 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE 32-31					16	16	23
	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE 31-30					13	13	36
				TOTAL				**36,00**	

REGISTRO FOTOGRAFICO

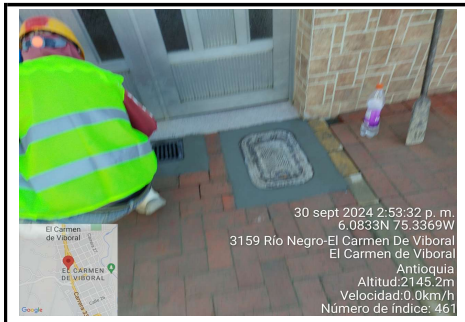





Firma

Nombre : Jaime L. Garcia Restrepo
Residente de Obra
Contratista: CONINGECON SAS
Matricula No.: 052021865 ANT

Firma

Nombre: Luis Alfonso Valencia Posada
Residente de interventoria
Interventoría:
AS Ingenieria Activa SAS

Municipio
El Carmen de Viboral

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

EDUR
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural

			ACTA Nº	**3**
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia
ÍTEM	OE - 1	**UNIDAD DE MEDIDA**		ml
DESCRIPCIÓN		Suministro transporte e instalacion de concreto de 21 MPA para ajuste entre pavimento y bordillo.		

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantid	Total	Acumul.
	CUADRA 6 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALLES 33-32	Bordillo	**42,50**				42,5	42,50
	CUADRA 7 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALLES 32-31	Bordillo	96,2				96,2	138,70
	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30	Bordillo	90,90				90,9	229,60
	CUADRA 9 COSTADO OCCIDENTAL	CRRA 33 ENTRE CALLES 31-30	Bordillo	**109,65**				109,65	339,25
				TOTAL				**339,25**	

REGISTRO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre : Jaime L. Garcia Restrepo
Residente de Obra
Contratista: CONINGECON SAS
Matricula No.: 052021865 ANT

Firma
Nombre: Luis Alfonso Valencia Posada
Residente de interventoria
Interventoría:
AS Ingenieria Activa SAS

Municipio
El Carmen de Viboral

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

EDUR
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural

ACTA Nº				**3**
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia
ÍTEM	OE - 2	**UNIDAD DE MEDIDA**		ml
DESCRIPCIÓN		Suminstro, transporte einstalacion de ADOQUÍN TÁCTIL GUÍA O ALERTA 20 x 20 x 6. Colores indicados por la supervisión. Para un ancho de 0,20 m. Incluye suministro y transporte de los adoquines,Arena de pega para la instalación, corte de piezas, arena de sello y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento según diseño y recomendaciones del M.E.P.		

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantidad	Total	Acumul.
12/8/2024	CUADRA 6 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 33-32	LONGUITUDINAL GUIA	97,3			1	97,3	97,30
			ADOQUIN TACTIL	0,9			1	0,9	98,20
			ADOQUIN TACTIL	1			1	1	99,20
18/8/2024	CUADRA 7 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 32-31	LONGUITUDINAL GUIA	89,5			1	89,5	188,70
			ADOQUIN TACTIL	1			1	1	189,70
			ADOQUIN TACTIL	1			1	1	190,70
18/8/2024	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 30-31	LONGUITUDINAL GUIA	81,90			1	81,9	272,60
			ADOQUIN TACTIL	1,3			1	1,3	273,90
18/8/2024	CUADRA 9 COSTADO OCCIDENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 30-31	LONGUITUDINAL GUIA	80,30			1	80,3	354,20
			ADOQUIN TACTIL	1,3			1	1,3	355,50
			ADOQUIN TACTIL	1			1	1	356,50
			TOTAL					**356,50**	

REGISTRO FOTOGRAFICO







Firma

Nombre : Jaime L. Garcia Restrepo
Residente de Obra
Contratista: CONINGECON SAS
Matricula No.: 052021865 ANT

Firma

Nombre: Luis Alfonso Valencia Posada
Residente de interventoria
Interventoría:
AS Ingenieria Activa SAS

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

ACTA N°				**2**						
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia						
ÍTEM	OE - 3	**UNIDAD DE MEDIDA**		M3						
DESCRIPCIÓN		DEMOLICION ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría								
Fecha	**FRENTE DE TRABAJO**	**Descripción**	**Observaciones**	**Long.**	**Ancho**	**Prof.**	**Cantid**	**Total**	**Acumul.**	

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

ACTA N°				**3**						
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia						
ÍTEM	OE - 3	**UNIDAD DE MEDIDA**		M3						
DESCRIPCIÓN		DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas y su								
Fecha	**FRENTE DE TRABAJO**	**Descripción**	**Observaciones**	**Long.**	**Ancho**	**Prof.**	**Cantid**	**Total**	**Acumul.**	
	CUADRA 6 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 33-32 PEATONAL	32-91 sec 1	7,27	0,75	0,15	1	0,82	0,82	
			32-91 sec 2	6,3	0,48	0,15	1	0,45	1,27	
			32-91 bordillo	7,26	0,35	0,25	1	0,64	1,91	
			32-80 -sec 1	6,55	0,71	0,15	1	0,70	2,60	
			32-80 -sec 2	6,55	0,47	0,15	1	0,46	3,07	
			contador	0,43	0,5	0,15	1	0,03	3,10	
			32-78-sec 1	10	0,17	0,15	1	0,26	3,35	
			32-78-sec 2	10	0,5	0,15	1	0,75	4,10	
			contador	0,43	0,5	0,15	1	0,03	4,14	
			contador	0,43	0,5	0,15	1	0,03	4,17	
			32-66-sec 1	6,8	0,73	0,15	1	0,74	4,91	
			32-66-sec2	6,8	0,47	0,15	1	0,48	5,39	
			contador	0,43	0,5	0,15	1	0,03	5,42	
			32-56-sec -1	10,7	0,57	0,15	1	0,91	6,34	
			32-56-sec 2	8	0,5	0,15	1	0,60	6,94	
			contador	0,4	0,51	0,15	1	0,03	6,97	

Municipio
El Carmen de Viboral

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

EDUR
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural
EL CARMEN DE VIBORAL

				ACTA N°	**2**
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia	
ÍTEM	OE - 3	**UNIDAD DE MEDIDA**		M3	
DESCRIPCIÓN		DEMOLICION ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría			

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantid	Total	Acumul.
			32-46	10,85	1,15	0,15	1	1,87	8,84
			32-36	5,32	0,92	0,15	1	0,73	9,58
			contador	0,4	0,51	0,15	1	0,03	9,61
			32-34	0,4	1	0,15	1	0,06	9,67
			contador	0,4	0,51	0,15	1	0,03	9,70
			32-28 Y 32-26	7	2,02	0,15	1	2,12	11,82
			32-16	4,82	0,63	0,15	1	0,46	12,27
			32-12	4,29	0,67	0,15	1	0,43	12,70
			32-06	16,9	1,95	0,15	1	4,94	17,65
			Bordillo -via	106,87	0,2	0,25	1	5,34	22,99
			31-80 FACHADA A LA CALLE 32	2	1,75	0,15	1	0,53	23,52
			DESCUENTO PAGADO ACTA N° 2					-17,24	6,28
			31-81 FACHADA A LA CALLE 32	8,5	1,85	0,15	1	2,36	8,64
			31-81 FACHADA A LA CALLE 32 VIGA	1,3	0,2	0,15	1	0,04	8,67
			31-81 FACHADA A LA CALLE 32	7,2	0,2	0,15	1	0,22	8,89
			31-80 FACHADA A LA CALLE 32	2,3	1,06	0,15	1	0,37	9,26
			31-80 FACHADA A LA CALLE 32-BORDILLO	2,3	0,15	0,25	1	0,09	9,34
			contador	0,40	0,5	0,15	1	0,03	9,37
			31-80 CURVA	3,7	1,14	0,15	1	0,63	10,01
			31-80 FACHADA CRR 33	3,37	1,14	0,15	1	0,58	10,58
			31-80 FACHADA CRR 33 CONTRAHUELLA ANDEN	3,37	0,95	0,15	1	0,48	11,06
			31-80 FACHADA CRR 33- PISO INFERIOR CONTRAHUELLA VIA	3,37	0,95	0,15	1	0,48	11,54
			31-76 A 31-72	14,26	0,91	0,15	1	1,95	13,49
			31-76 A 31-72	0,79	0,84	0,15	1	0,10	13,59
			31-76 A 31-72	1,13	1,1	0,15	1	0,19	13,77
			31-76 A 31-72	0,9	1	0,15	1	0,14	13,91

Municipio El Carmen de Viboral	**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR**	EDUR Empresa de Desarrollo Urbano y Rural EL CARMEN DE VIBORAL

			ACTA N°	**2**
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia
ÍTEM	OE - 3	**UNIDAD DE MEDIDA**		M3
DESCRIPCIÓN		DEMOLICION ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría		

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantid	Total	Acumul.
	CUADRA 7 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 32-31 PEATONAL	31-76 A 31-72-BORDILLO	14,26	0,15	0,25	1	0,53	14,44
			contador	0,40	0,5	0,15	1	0,03	14,47
			contador	0,40	0,5	0,15	1	0,03	14,50
			contador	0,40	0,5	0,15	1	0,03	14,53
			contador	0,40	0,5	0,15	1	0,03	14,56
			31-64	8,2	0,43	0,15	1	0,53	15,09
			31-64	8,2	0,6	0,15	1	0,74	15,83
			31-64-peldaños	1,1	0,3	0,15	1	0,05	15,88
			31-64-peldaños	1,1	0,29	0,15	1	0,05	15,93
			31-56	4,95	0,29	0,15	1	0,22	16,14
			31-56	4,95	0,84	0,15	1	0,62	16,77
			contador	0,40	0,5	0,15	1	0,03	16,80
			contador	0,40	0,5	0,15	1	0,03	16,83
			31-48	7,35	0,1	0,15	1	0,11	16,94
			31-48	7,35	0,95	0,15	1	1,05	17,99
			31-48-LOSA	0,77	0,5	0,15	1	0,06	18,04
			contador	0,40	0,5	0,15	1	0,03	18,07
			31-42	4,72	1,11	0,15	1	0,79	18,86
			31-42	4,72	0,69	0,15	1	0,49	19,35
			31-42- BORDILLO	5,74	0,15	0,25	1	0,22	19,56
			caja 1	0,50	0,5	0,15	1	0,04	19,60
			caja 2	0,8	0,61	0,15	1	0,07	19,67
			31-40	3,06	1,6	0,15	1	0,73	20,41
			31-40	3,06	0,3	0,2	1	0,18	20,59
			31-40- BORDILLO	4,08	0,15	0,15	1	0,09	20,68
			caja 1	0,50	0,5	0,15	1	0,04	20,72
			caja 2	0,8	0,61	0,15	1	0,07	20,79
			31-36	3,7	2,35	0,15	1	1,30	22,10
			31-26	7,49	0	0,15	1	0,00	22,10

Municipio El Carmen de Viboral

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

EDUR Empresa de Desarrollo Urbano y Rural EL CARMEN DE VIBORAL

			ACTA N°	**2**
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia
ÍTEM	OE - 3	**UNIDAD DE MEDIDA**		M3
DESCRIPCIÓN		DEMOLICION ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría		

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantid	Total	Acumul.
			caja 1	0,30	0,3	0,15	1	0,01	22,11
			31-20	3,8	0,11	0,15	1	0,06	22,17
			31-18	2,25	-0,25	0,15	1	-0,08	22,09
			contador	0,40	0,5	0,15	1	0,03	22,12
			31-16	2,6	0,14	0,15	1	0,05	22,17
			31-04	5,6	1,85	0,15	1	1,55	23,73
			caja 1	0,30	0,3	0,15	1	0,01	23,74
			31-04 BORDILLO	8	0,15	0,25	1	0,30	24,04
			31-103 X CRR33- 30-79 Y 30,76-SEC-1	17,65	0,8	0,15	1	2,12	26,16
			31-103 X CRR33- 30-79 Y 30,76-SEC-2	17,65	0,4	0,15	1	1,06	27,22
			30-74-PEATONAL- SEC-1	3,80	0,62	0,15	1	0,35	27,57
			30-74-PEAT-SEC-2	3,80	0,74	0,15	1	0,42	27,99
			30-74-PEAT-SEC-2-BORDILLO	3,80	0,15	0,25	1	0,14	28,14
			30-74-GARAJE- SEC-1	3,44	0,41	0,15	1	0,21	28,35
			30-74-GARAJE-SEC-2	3,44	0,74	0,15	1	0,38	28,73
			30-74-GARAJE-SEC-2-BORDILLO	3,44	0,15	0,25	1	0,13	28,86
			CAJA	0,50	0,5	0,15	1	0,04	28,90
			30-60-SEC-1	8,16	0,81	0,15	1	0,99	29,89
			30-60-SEC-2	8,16	0,24	0,15	1	0,29	30,18
			30-60-SEC-1-BORDILLO-1	8,16	0,15	0,25	1	0,31	30,49
			30-60-SEC-2-BORDILLO-2	8,16	0,15	0,25	1	0,31	30,79
			contador	0,40	0,5	0,15	1	0,03	30,82
			30-52	8,22	0,13	0,15	1	0,16	30,98
			30-52-SEC-1	8,22	0,63	0,15	1	0,78	31,76
			30-52 SEC-2	8,22	0,24	0,15	1	0,30	32,06
			30-52-SEC-1-BORDILLO-1	8,22	0,15	0,25	1	0,31	32,36
			30-52-SEC-2-BORDILLO-2	8,22	0,15	0,25	1	0,31	32,67
			contador	0,40	1,28	0,15	1	0,08	32,75
			30-42	6,37	0,08	0,15	1	0,08	32,83

Municipio
El Carmen de Viboral

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

EDUR
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural
EL CARMEN DE VIBORAL

ACTA N°				**2**						
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia						
ÍTEM	OE - 3	**UNIDAD DE MEDIDA**		M3						
DESCRIPCIÓN		DEMOLICION ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría								

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantid	Total	Acumul.
	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 PEATONAL	30-42-SEC-1	6,37	0,63	0,15	1	0,60	33,43
			30-42 SEC-2	6,37	0,24	0,15	1	0,23	33,66
			30-42-SEC-2-BORDILLO-1	6,37	0,15	0,25	1	0,24	33,90
			30-42-SEC-2-BORDILLO-2	6,37	0,15	0,25	1	0,24	34,14
			contador	0,40	0,55	0,15	1	0,03	34,17
			contador	0,40	1,93	0,15	1	0,12	34,28
			30-40-SEC-1	8,04	0,2	0,15	1	0,24	34,53
			30-40-SEC-2	8,04	0,26	0,15	1	0,31	34,84
			30-40-BORDILLO -1	8,04	0,15	0,25	1	0,30	35,14
			30-40-BORDILLO -2	8,04	0,2	0,25	1	0,40	35,54
			contador	0,40	0,5	0,15	1	0,03	35,57
			30-30-SEC-1	1,53	0,03	0,15	1	0,01	35,58
			30-30-SEC-2	1,53	0,59	0,15	1	0,14	35,71
			contador	1,53	0,51	0,15	1	0,12	35,83
			30-30-SEC-1	2,47	1,81	0,15	1	0,67	36,50
			30-30-SEC-2	2,47	0,59	0,15	1	0,22	36,72
			30-30-SEC-1	6,36	1,81	0,3	1	3,45	40,17
			30-30-SEC-2	6,36	0,59	0,15	1	0,56	40,74
			30-30	2,17	1,81	0,15	1	0,59	41,33
			30-30	2,17	0,59	0,15	1	0,19	41,52
			30-30-viga	6,4	0,2	0,15	1	0,19	41,71
			30-30-placa	3,5	1,5	0,15	1	0,79	42,50
			30-18 SEC-1	7,13	-0,71	0,15	1	-0,76	41,74
			30-18 SEC-2	7,13	0,59	0,15	1	0,63	42,37
			30-18 SEC-3	7,13	0,9	0,15	1	0,96	43,33
			30-18 BORDILLO	7,13	0,15	0,25	1	0,27	43,60
			contador	0,80	0,8	0,15	1	0,10	43,70
			30--10-SEC-1	2,35	0,44	0,15	1	0,16	43,85
			30--10-SEC-2	2,35	0,5	0,15	1	0,18	44,03

Municipio
El Carmen de Viboral

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

EDUR
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural
EL CARMEN DE VIBORAL

ACTA N°				**2**							
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia							
ÍTEM	OE - 3	**UNIDAD DE MEDIDA**		M3							
DESCRIPCIÓN		DEMOLICION ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría									

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantid	Total	Acumul.
			30--10-SEC-3	2,35	0,36	0,15	1	0,13	44,15
			30--10- BORDILLO	2,35	0,15	0,25	1	0,09	44,24
			30--06-SEC-1	2,8	0,49	0,15	1	0,21	44,45
			30--06-SEC-2	2,8	0,5	0,15	1	0,21	44,66
			30--06-SEC-3	2,8	0,4	0,15	1	0,17	44,83
			30--06-BORDILLO	2,8	0,15	0,25	1	0,11	44,93
			30--02-SEC-1	1,3	2,4	0,15	1	0,47	45,40
			30--02-SEC-2	3,8	0,95	0,15	1	0,54	45,94
			30--02-BORDILLO	4,1	0,15	0,25	1	0,15	46,09
			contador	0,40	3,43	0,15	1	0,21	46,30
			contador	0,40	0,2	0,15	1	0,01	46,31
	CUADRA 9 COSTADO OCCIDENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 PEATONAL	30-81-CURVA- SEC-2	3	1,14	0,15	1	0,51	46,82
			30-79 SOBRE 33	7,00	0,14	0,15	1	0,15	46,97
			30-79 SOBRE 33-BORDILLO	7,00	0,15	0,25	1	0,26	47,23
			30-75	5,5	0,84	0,15	1	0,69	47,93
			30-75-BORDILLO	5,5	0,15	0,15	1	0,12	48,05
			30-69 EDF-SEC-1	7,4	2,4	0,15	1	2,66	50,72
			30-69 EDF-SEC-2	7,4	1,8	0,15	1	2,00	52,71
			AGENCIA DE VIAJES-SEC-1	3,4	0,74	0,25	1	0,63	53,34
			AGENCIA DE VIAJES-SEC-2	6,7	0,72	0,25	1	1,21	54,55
			AGENCIA DE VIAJES-SEC-2´	3,9	1,17	0,15	1	0,68	55,23
			AGENCIA DE VIAJES-SEC-3	3,7	1,48	0,15	1	0,82	56,05
			AGENCIA DE VIAJES- BORDILLO	6,7	0,15	0,25	1	0,25	56,31
			AGENCIA DE VIAJES- MURO TRANSV	1,19	0,2	0,15	1	0,04	56,34
			COTRA CARMEN	11,5	1,1	0,25	1	3,16	59,50
			30-39	7,64	1,15	0,15	1	1,32	60,82
			30-39-BORDILLO	7,64	0,15	0,25	1	0,29	61,11
			30-31	6,1	1,1	0,15	1	1,01	62,11
			30-31-BORDILLO	6,1	0,15	0,25	1	0,23	62,34

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

			ACTA N°	**2**
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia
ÍTEM	OE - 3	**UNIDAD DE MEDIDA**		M3
DESCRIPCIÓN		DEMOLICION ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría		

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantid	Total	Acumul.
			contador	0,43	0,51	0,15	1	0,03	62,38
			30-21	3,7	1,9	0,15	1	1,05	63,43
			30-21-BORDILLO	6,1	0,15	0,25	1	0,23	63,66
			contador	2,32	1,93	0,15	1	0,67	64,33
			contador	0,4	0,51	0,15	1	0,03	64,36
			contador	0,4	0,51	0,15	1	0,03	64,39
			30-15	5,4	1,1	0,15	1	0,89	65,28
			30-15-BORDILLO	5,4	0,15	0,25	1	0,20	65,49
			30-02	12	3,07	0,25	1	9,21	74,70
			CALLE 30 SUBIENDO HACIA CR 34	10	1,7	0,15	1	2,55	77,25
			RAMPA	1,5	1	0,15	1	0,23	77,47
					TOTAL			**77,47**	

REGISTRO FOTOGRAFICO









Firma

Nombre : Jaime L. Garcia Restrepo
Residente de Obra
Contratista: CONINGECON SAS
Matricula No.: 052021865 ANT

Firma

Nombre: Luis Alfonso Valencia Posada
Residente de interve
Interventoría:
AS Ingenieria Activa SAS

Municipio El Carmen de Viboral

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

EDUR Empresa de Desarrollo Urbano y Rural

ACTA Nº				**3**							
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia							
ÍTEM	OE - 4	**UNIDAD DE MEDIDA**		m3							
DESCRIPCIÓN		Demolición de pavimento asfáltico, de cualquier espesor. Incluye corte con cortadora según trazado y cargue, transporte y disposición final de escombros									
Fecha	**FRENTE DE TRABAJO**	**Descripción**	**Observaciones**	**Area**	**Ancho**	**Prof.**	**Cantida**	**Total**	**Acumul**		
12/8/2024	CUADRA 6 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 33-32	32-91	5,8	0,4	0,14		0,32	0,32		
12/8/2024			32-80	6,55	0,67	0,14		0,61	0,94		
12/8/2024			32-78 y 32-70	10	1,28	0,14		1,79	2,73		
12/8/2024			32-66	6,8	0,75	0,14		0,71	3,45		
12/8/2024			32-56	10,7	0,78	0,14		1,17	4,61		
12/8/2024			32-46	10,85	0,5	0,14		0,76	5,37		
12/8/2024			32-36	5,32	0,48	0,14		0,36	5,73		
12/8/2024			32-34	7,8	0,4	0,14		0,44	6,17		
12/8/2024			32-28 Y 32-26	7	0,43	0,14		0,42	6,59		
12/8/2024			32-16	4,82	0,57	0,14		0,38	6,97		
12/8/2024			32-12	4	0,53	0,14		0,30	7,27		
12/8/2024			32-06	7	0,4	0,14		0,39	7,66		
12/8/2024			32-06- CURVA	4	0,3	0,14		0,17	7,83		
	CUADRA 6 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 33-32 PEATONAL- pagado en acta 2	Area plano topografico	-34,26	1	0,13		-4,45	3,38		
18/8/2024	CUADRA 7 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 31-32 PEATONAL	31-81 FACHADA A LA CALLE 32	1,3	0,2	0,25		0,07	3,44		
18/8/2024			31-80 CURVA	3,7	1,14	0,12		0,51	3,95		
18/8/2024			31-80 FACHADA CRR 33- PISO INFERIOR	3,37	0,95	0,12		0,38	4,33		
18/8/2024			31-76 A 31-72	14,26	0,89	0,12		1,52	5,85		
18/8/2024			31-64	8,2	0,87	0,12		0,86	6,71		
18/8/2024			31-56	4,95	0,77	0,12		0,46	7,17		
18/8/2024			31-48	7,35	0,85	0,12		0,75	7,92		
18/8/2024			31-32	7,97	2,71	0,14		3,02	10,94		
18/8/2024			31-26	7,49	1,7	0,12		1,53	12,47		
18/8/2024			31-04	5,6	3,43	0,12		2,30	14,77		


6/9/2024	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 PEATONAL	31-103 X CRR33-HASTA 30-70	17,65	0,8	0,14		1,98	16,75
6/9/2024			30-60	8,16	0,8	0,14		0,91	17,67
6/9/2024			30-52	8,22	0,8	0,14		0,92	18,59
6/9/2024			30-42	6,37	0,8	0,14		0,71	19,30
6/9/2024			30-40	8,04	1,29	0,14		1,45	20,75
6/9/2024			30-30	12,53	0,5	0,14		0,88	21,63
6/9/2024			30-18	7,13	0,4	0,14		0,40	22,03
6/9/2024			30--10	2,35	1,05	0,14		0,35	22,37
6/9/2024			30--06	2,8	1,01	0,14		0,40	22,77
6/9/2024			30--02	5,1	0,06	0,14		0,04	22,81
18/8/2024	CUADRA 9 COSTADO OCCIDENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 PEATONAL	30-81-CURVA	3	0,66	0,14		0,28	23,09
18/8/2024			30-79 SOBRE 33	7,00	1,8	0,14		1,76	24,85
18/8/2024			30-75	5,5	1,8	0,14		1,39	26,24
18/8/2024			30-69 EDF	4,4	0,6	0,14		0,37	26,61
18/8/2024			AGENCIA DE VIAJES	6,7	0,6	0,14		0,56	27,17
18/8/2024			30-39	7,64	0,6	0,14		0,64	27,81
18/8/2024			30-31	6,1	0,6	0,14		0,51	28,33
18/8/2024			30-21	3,7	0,6	0,14		0,31	28,64
18/8/2024			30-15	5,4	0,6	0,14		0,45	29,09
18/8/2024			30-02	12	0,6	0,14		1,01	30,10
18/8/2024	CUADRA 9 COSTADO OCCIDENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 31-30 VEHICULAR	COTRA CARMEN	11,5	0,6	0,14		0,97	31,06
					TOTAL			**31,06**	

REGISTRO FOTROGRAFICO









Firma

Nombre : Jaime L. Garcia Restrepo
Residente de Obra
Contratista: CONINGECON SAS
Matricula No.: 052021865 ANT

Firma

Nombre: Luis Alfonso Valencia Posada
Residente de interve
Interventoría:
AS Ingenieria Activa SAS

Municipio
El Carmen de Viboral

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

EDUR
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural

ACTA Nº				**3**							
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S								
ÍTEM	OE - 5	**UNIDAD DE MEDIDA**		Und							
DESCRIPCIÓN		Suministro, transporte e instalacion de rejilla para carcamo de1,0x0,2x0,08m) en zona peatonal,									
Fecha	**FRENTE DE TRABAJO**	**Descripción**	**Observaciones**	**Longitud**	**Ancho**	**Prof.**	**Cantidad**	**Total**	**Acumul.**		
	CUADRA 6 COSTADO ORIENTAL	32-91		1,00			1	1,00	1,00		
	CUADRA 6 COSTADO ORIENTAL	32-70		1,00			1	1,00	2,00		
	CUADRA 6 COSTADO ORIENTAL	32-66		1,50			1	1,50	3,50		
	CUADRA 4 COSTADO ORIENTAL	32-65(1)		2,00			1	2,00	4,00		
	CUADRA 4 COSTADO ORIENTAL	32-65(2)		1,00			1	1,00	5,00		
	CUADRA 4 COSTADO ORIENTAL	32-65(3)		1,00			1	1,00	6,00		
	CUADRA 7 COSTADO ORIENTAL	31-64		1,00			1	1,00	7,00		
	CUADRA 7 COSTADO ORIENTAL	31-59		1,00			1	1,00	8,00		
	CUADRA 5 COSTADO ORIENTAL	31-51		1,00			1	1,00	9,00		
	CUADRA 5 COSTADO ORIENTAL	31-37		1,00			1	1,00	10,00		
	CUADRA 5 COSTADO ORIENTAL	31-35		1,00			1	1,00	11,00		
	CUADRA 5 COSTADO ORIENTAL	31-13		2,50			1	2,50	13,50		
	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	30-78		1,00			1	1,00	14,50		
	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	30-42		1,00			1	1,00	14,50		
	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	30-40		2,00			1	2,00	16,50		
	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	30-38		1,50			1	1,50	18,00		
				TOTAL				**20,50**			

REGISTRO FOTROGRAFICO









Firma

Nombre : Jaime L. Garcia Restrepo
Residente de Obra
Contratista: CONINGECON SAS
Matricula No.: 052021865 ANT

Firma

Nombre: Luis Alfonso Valencia Posada
Residente de interventoria
Interventoría:
AS Ingenieria Activa SAS

Municipio El Carmen de Viboral	**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR**			EDUR Empresa de Desarrollo Urbano y Rural

			ACTA Nº	**3**
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia
ÍTEM	OE - 6	**UNIDAD DE MEDIDA**		Und
DESCRIPCIÓN		Desmonte y reinstalacion de medidor de agua potable en las viviendas. Incluye utilizacion de tuberia de 1/2, bocas, accesorios, acondicionador de superficie, adhesivo y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación se pagará en su ítem respectivo		

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Area	Ancho	Prof.	Cantidad	Total	Acumul.
	CUADRA 1 COSTADO OCCIDENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 34-33A COSTADO-OCCIDENTAL					3	3	3,00
	CUADRA 5 COSTADO OCCIDENTAL	CRRA 33 ENTRE 34-33					2	2	2,00
	CUADRA 5 COSTADO OCCIDENTAL	CRRA 33 ENTRE 32-31					2	2	2,00
						TOTAL		**7,00**	

REGISTRO FOTROGRAFICO





Firma

Nombre : Jaime L. Garcia Restrepo
Residente de Obra
Contratista: CONINGECON SAS
Matricula No.: 052021865 ANT

Firma


Nombre: Luis Alfonso Valencia Posada
Residente de interventoria
Interventoría:
AS Ingenieria Activa SAS

Municipio El Carmen de Viboral	**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR**	EDUR Empresa de Desarrollo Urbano y Rural

			ACTA N°	**3**
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia
ÍTEM	OE-7	**UNIDAD DE MEDIDA**		M
DESCRIPCIÓN		Suministro, transporte e instalación de tubería sanitaria 150mm, (6 Pulgadas). Incluye transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie, adhesivo y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos, se pagará en su ítem respectivo		

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantidad	Total	Acumul.
	CUADRA 5 COSTADO OCCIDENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 32-31	DE GARAJE N° 31-51 A 31-33	15,60			1	15,60	15,60
	CUADRA 5 COSTADO OCCIDENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 32-31	de Garaje N° 31-15 a sumidero	14,60			1	14,60	30,20
	CUADRA 6 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 32-33	de 32-70 A 32-91	23,55			1	23,55	53,75
					TOTAL			**53,75**	

REGISTRO FOTOGRAFICO

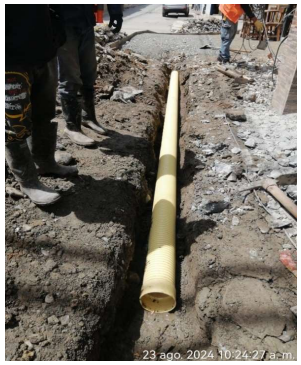





Firma

Nombre : Jaime L. Garcia Restrepo
Residente de Obra
Contratista: CONINGECON SAS
Matricula No.: 052021865 ANT

Firma

Nombre: Luis Alfonso Valencia Posada
Residente de interventoria
Interventoría:
AS Ingenieria Activa SAS

Municipio
El Carmen de Viboral

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

EDUR
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural

			ACTA N°	**3**
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia
ÍTEM	OE-8	**UNIDAD DE MEDIDA**		M
DESCRIPCIÓN		Suministro, transporte e instalación de tubería sanitaria 250mm, (10 Pulgadas). Incluye transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie, adhesivo y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación se pagará en su ítem respectivo		

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantidad	Total	Acumul.
	CUADRA 7 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 32-31	DESDE # 31-64 A SUMIDERO CALLE 32	20,50			1	20,50	20,50
	CUADRA 8 COSTADO ORIENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 31-30	DESDE LA 30-42 A SUMIDERO CALLE 31	46,70			1	46,70	67,20
				TOTAL				**67,20**	

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firma

Nombre : Jaime L. Garcia Restrepo
Residente de Obra
Contratista: CONINGECON SAS
Matricula No.: 052021865 ANT

Firma

Nombre: Luis Alfonso Valencia Posada
Residente de interventoria
Interventoría:
AS Ingenieria Activa SAS

Municipio
El Carmen de Viboral

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL EDUR

EDUR
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural

			ACTA N°	**3**
CONTRATO No	COP-004-2024-CO	**CONTRATISTA**	CONINGECON S.A.S	Construcción, demolición, rehabilitación, mantenimiento, reconstrucción de andenes y obras complementarias en diversos tramos de la zona urbana del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia
ÍTEM	OE-7	**UNIDAD DE MEDIDA**		UND
DESCRIPCIÓN		Suministro, transporte e instalación de silla YEE de 250mm por 110 mm novafort, (10"x4"). Incluye transporte de los materiales, adapatador de novaforta tuberia lisa, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.		

Fecha	FRENTE DE TRABAJO	Descripción	Observaciones	Long.	Ancho	Prof.	Cantidad	Total	Acumul.
	CUADRA 8 COSTADO OCCIDENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 32-33	DESDE # 32-12 ALA 32-56	1,00			1	1,00	1,00
	CUADRA 8 COSTADO OCCIDENTAL	CRRA 33 ENTRE CALES 32-33	DESDE # 32-12 ALA 32-56	1,00			1	1,00	2,00
	CUADRA 8 COSTADO OCCIDENTAL	CALLE 332 SN-CE	CONEXION DE SUMIDERO A CAJA RED PRICIPAL	1,00			1	1,00	3,00
							TOTAL		3,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firma

Nombre : Jaime L. Garcia Restrepo
Residente de Obra
Contratista: CONINGECON SAS
Matricula No.: 052021865 ANT

Firma

Nombre: Luis Alfonso Valencia Posada
Residente de interventoria
Interventoría:
AS Ingenieria Activa SAS
