	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2
		FECHA	30-dic-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **PROGRAMA DE INVERSIONES** N/A

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 4

CONTRATO No: 2277 DE 2024


OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

CONTRATISTA: INGEPRO CONSTRUCTORA SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A **INTERVENTOR:** N/A

PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS EN ESTA VIGENCIA. (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	1 ago 2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	$ 161.912.124,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	$ 173.000.000,00
PLAZO ACUMULADO:	6 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL	31 ene 2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA)	$ 11.087.876,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(I%) OBRA PROGRAMADA) (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor Programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	1 AGO 2024	2 SEP 2024	3 OCT 2024	4 NOV 2024	5 DIC 2024	6 ENE 2025
I. EXPLANACIONES	4.110	2,64%	2,41%	% P	0,50%	0,50%	0,50%	2,64%	0,00%	0,00%
				$P	784	784	784	4.110		
	4.110	2,47%	4.018	$E	0	0	0	4.018		
				%E	0,00%	0,00%	0,00%			
II. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES	8.353	5,36%	0,00%	% P	1,07%	1,07%	1,07%	5,36%	0,00%	0,00%
				$P	1.671	1.671	1.671	8.353		
	8.353	5,01%	0	$E	0	0	0			
				%E	0,00%	0,00%	0,00%			
III. PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	0	0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$P	0	0	0			
	0	0,00%	0	$E	0	0	0			
				%E	0,00%	0,00%	0,00%			
IV. ESTRUCTURAS Y DRENAJES	25.450	16,34%	8,49%	% P	3,27%	3,27%	3,27%	16,34%	0,00%	0,00%
				$P	5.090	5.090	5.090	25.450		
	25.450	15,26%	14.163	$E	0	0	0	14.163		
				%E	0,00%	0,00%	0,00%			
V. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	0	0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$P	0	0	0	0	0	0
	0	0,00%	0	$E	0	0	0			
				%E	0,00%	0,00%	0,00%			
VI. OBRAS VARIAS	0	0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$P	0	0	0			
	0	0,00%	0	$E	0	0	0			
				%E	0,00%	0,00%	0,00%			
VII. TRANSPORTE	0	0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$P	0	0	0			
	0	0,00%	0	$E	0	0	0			
				%E	0,00%	0,00%	0,00%			
ÍTEMS NO PREVISTOS	117.824		27,82%	% P				45,39%	7,67%	26,99%
				$P				70.694	13.123	44.998
	128.815	77,26%	46.388,00	$E				46.388		
				%E				29,79%	0,00%	
AJUSTES				% P					0,00%	0,00%
				$P					0,4	0,0
	0,40	0,000%	0,00	$E						
				%E						
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	155.737	24,34%	38,73%							
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	166.728	100,00%	64.570							

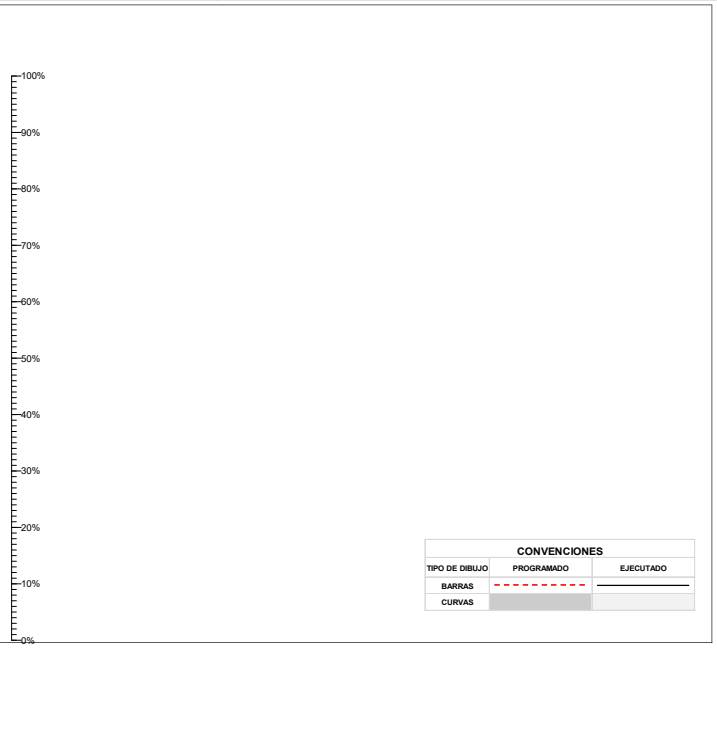

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 2
FECHA	30 dic 2024 (Día / Mes / Año)
