I. IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No. **NA**	CONVENIO No. **156-2023**	OS No. **NA**

INFORME DE: **SUPERVISIÓN X** **INTERVENTORÍA _____**

CONVENIENTES: - MUNICIPIO DE TELLO (Ejecutor) – FERNANDO ALIPIO SOLANO GOMEZ.
- CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM.

OBJETO: "*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM Y EL MUNICIPIO DE TELLO PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SEPTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN DOMESTICO EN HOGARES DISPERSOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA, PARA LA CONSERVACION Y DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS.*".

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 24 de febrero de 2023
FECHA DE INICIO: 3 de marzo de 2023
DURACIÓN INICIAL: Nueve (9) meses
DURACION FINAL: Veintiún (21) meses
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 2 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACION FINAL: 30 de diciembre de 2024

OTROSIS, ADICIONALES Y SUSPENSIONES:
Suspensión 1: 25 de julio de 2023
Reiniciación 1: 22 de agosto de 2023
Otrosi 1: Fecha 05 de septiembre de 2023 (adicional en valor $168.183.490.oo, recursos del Municipio)
Otrosi 2: Fecha 19 de diciembre de 2023 (adicional en plazo – 6 meses)
Otrosi 3: Fecha 24 de junio de 2024 (adicional en plazo – 6 meses)
Otrosi 4: Fecha 11 de diciembre de 2024 (modifica numeral 7 de la cláusula segunda convenio 156 de 2023)

FECHA DEL INFORME: 30 de diciembre de 2024

II. ANTECEDENTES (BITACORA)

- ✓ El Convenio Interadministrativo No.156 fue suscrito el día 24 de febrero de 2023, entre Municipio de Tello y la CAM.

- ✓ El Convenio No.156 de 2023 cuenta con Acta de Inicio de fecha 3 de marzo de 2023, tiene un plazo inicial de nueve (9) meses contados a partir de la firma de dicha acta.

- ✓ Mediante los oficios 1633 2023-S de fecha 23 de mayo de 2023, y 5417 2023-S de fecha 6 de julio de 2023, la CAM a través de la Subdirección de Gestión Ambiental ha realizado requerimientos de avance y seguimiento al convenio.

- ✓ El Municipio de Tello mediante oficio de fecha 24 de julio de 2023, solicitó la suspensión del convenio para: revisar las condiciones, cantidades y precios unitarios para determinar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio, acorde con las variaciones del mercado.

- ✓ Se suscribió el acta de suspensión No.1 de fecha 25 de julio de 2023, atendiendo la solicitud y justificación presentada por el Municipio de Tello.

- ✓ Mediante oficio de fecha 22 de agosto de 2023, el municipio de Tello informa que realizó una revisión exhaustiva de las condiciones pactadas en el convenio, teniendo en cuenta que cantidades y precios del proyecto deben ser ajustadas a las condiciones del mercado para el municipio la presente vigencia 2023, y lo justifica.


- ✓ Se suscribió el acta de reinicio No.1 de fecha 22 de agosto de 2023, una vez terminado el motivo que generó la suspensión.

- ✓ El día 24 de agosto de 2023 se elaboró el acta de justificación para la celebración del otrosi No.1 al convenio interadministrativo No.156 de 2023 suscrito entre el Municipio de Tello y la CAM.

- ✓ Se suscribió el Adicional No.1 al convenio interadministrativo 156 de 2023, con fecha 5 de septiembre de 2023, donde se adiciona el valor de $168.183.490 con recursos del Municipio, al monto del aporte inicial del ente territorial al convenio y respaldados con el CDP 2023000593 del 23 de agosto de 2023.

    - Valor inicial aporte del Municipio de Tello por la suma de $64.444.684 en efectivo, respaldados con el certificado de disponibilidad presupuestal 2023000065 del 24 de enero de 2023
    - Valor adicional del Municipio de Tello por la suma de $168.183.490 en efectivo, respaldados con el certificado de disponibilidad presupuestal 2023000593 del 23 de agosto de 2023.
    - Valor del aporte de la CAM por la suma de $920.638.346 en efectivo, respaldado con el certificado de disponibilidad presupuestal 2023000176 del 31 de enero de 2023, no se modifica.

- ✓ El municipio de tello en calidad de ejecutor del proyecto, reporta la publicación del proceso precontractual de Licitación Pública LP-002-2023 objeto del convenio para la "REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SEPTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN DOMESTICO EN HOGARES DISPERSOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA, PARA LA CONSERVACIÓN Y DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO CELEBRADO CON LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM Y EL MUNICIPIO DE TELLO", y publicando el aviso de la Convocatoria el día 26 de septiembre de 2023 en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP. La convocatoria presentó el siguiente cronograma:

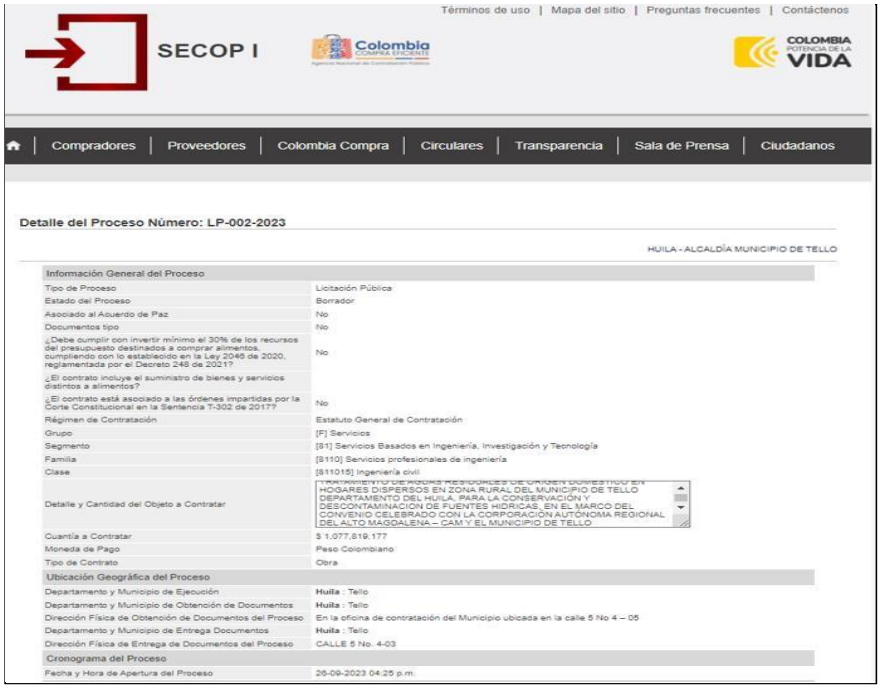

Términos de uso | Mapa del sitio | Preguntas frecuentes | Contáctenos

SECOP I

Colombia Compra Eficiente


COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Compradores | Proveedores | Colombia Compra | Circulares | Transparencia | Sala de Prensa | Ciudadanos

Detalle del Proceso Número: LP-002-2023

HUILA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE TELLO

Información General del Proceso	
Tipo de Proceso	Licitación Pública
Estado del Proceso	Borrador
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Documentos tipo	No
¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	No
¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?	
¿El contrato está asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017?	No
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[F] Servicios
Segmento	[81] Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología
Familia	[8110] Servicios profesionales de ingeniería
Clase	[811015] Ingeniería civil
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	[illegible] HOGARES DISPERSOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA, PARA LA CONSERVACIÓN Y DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO CELEBRADO CON LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM Y EL MUNICIPIO DE TELLO
Cuantía a Contratar	$ 1.077.819.177
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Obra
Ubicación Geográfica del Proceso	
Departamento y Municipio de Ejecución	**Huila** : Tello
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	**Huila** : Tello
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso	En la oficina de contratación del Municipio ubicada en la calle 5 No 4 – 05
Departamento y Municipio de Entrega Documentos	**Huila** : Tello
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	CALLE 5 No. 4-03
Cronograma del Proceso	
Fecha y Hora de Apertura del Proceso	26-09-2023 04:25 p.m.

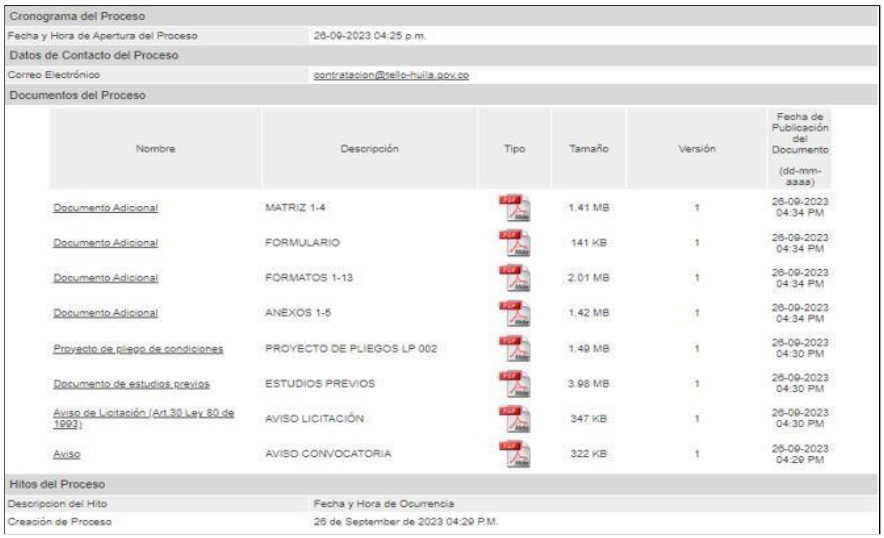

Cronograma del Proceso	
Fecha y Hora de Apertura del Proceso	26-09-2023 04:25 p.m.
Datos de Contacto del Proceso	
Correo Electrónico	contratacion@tello-huila.gov.co

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	MATRIZ 1-4		1.41 MB	1	26-09-2023 04:34 PM
Documento Adicional	FORMULARIO		141 KB	1	26-09-2023 04:34 PM
Documento Adicional	FORMATOS 1-13		2.01 MB	1	26-09-2023 04:34 PM
Documento Adicional	ANEXOS 1-5		1.42 MB	1	26-09-2023 04:34 PM
Proyecto de pliego de condiciones	PROYECTO DE PLIEGOS LP 002		1.49 MB	1	26-09-2023 04:30 PM
Documento de estudios previos	ESTUDIOS PREVIOS		3.98 MB	1	26-09-2023 04:30 PM
Aviso de Licitación (Art.30 Ley 80 de 1993)	AVISO LICITACIÓN		347 KB	1	26-09-2023 04:30 PM
Aviso	AVISO CONVOCATORIA		322 KB	1	26-09-2023 04:29 PM

Hitos del Proceso	
Descripcion del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Creación de Proceso	26 de September de 2023 04:29 P.M.

Anexo 2 - Cronograma Licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico			
Código	CCE-EICP-IDI-13	Versión	1

Actividad	Fecha	Lugar	Norma
Publicación del aviso de convocatoria pública	26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación Estudios y Documentos Previos	26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	HASTA EL 07 DE OCTUBRE DE 2023	En la Oficina de Contratación del Municipio de Tello y/o a través del correo electrónico: contratacion@tello-huila.gov.co	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	10 DE OCTUBRE DE 2023	[Enlace SECOP I] [Página web de la Entidad]	L. 80/93 art. 30
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	13 DE OCTUBRE DE 2023	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	13 DE OCTUBRE DE 2023	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del pliego de condiciones definitivo	13 DE OCTUBRE DE 2023	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Audiencia de asignación de Riesgos	17 DE OCTUBRE DE 2023 A LAS 10:00 AM	Calle 5 No. 4-03 , oficina de contratacion. Municipio de Tello H	L. 80/93 art. 30
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	13 - 17 DE OCTUBRE DE 2023	En la Oficina de Contratación del Municipio de Tello y/o a través del correo electrónico: contratacion@tello-huila.gov.co	Fecha definida por la Entidad.
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	18 DE OCTUBRE DE 2023	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Plazo máximo para la expedición de Adendas	18 DE OCTUBRE DE 2023	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.
Fecha de cierre	24 DE OCTUBRE DE 2023 A LAS 9:00 AM	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1	24 DE OCTUBRE DE 2023	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	31 DE OCTUBRE DE 2023	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	HASTA EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	08 DE NOVIEMBRE DE 2023	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	09 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 AM	Calle 5 No. 4-03 , oficina de contratacion. Municipio de Tello H	Fecha definida por la Entidad.
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	09 DE NOVIEMBRE DE 2023	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.
Firma del Contrato	10 DE NOVIEMBRE DE 2023	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	10 DE NOVIEMBRE DE 2023	Calle 5 No. 4-03 , oficina de contratacion. Municipio de Tello H	Fecha definida por la Entidad.
Aprobación de garantías	10 DE NOVIEMBRE DE 2023		Fecha definida por la Entidad.

- ✓ El municipio de Tello mediante oficio de fecha 4 de diciembre de 2023, solicita adición en plazo de seis (6) meses al convenio interadministrativo 156 de 2023, para dar continuidad a lo pactado contractualmente y suplir las etapas de ejecución del proyecto y liquidación teniendo en cuenta que:


  - Que el municipio de Tello mediante resolución 338 del 13 de octubre de 2023, dio apertura a la licitación pública 002 de 2023, para seleccionar el contratista de obra.
  - Que el municipio de Tello mediante resolución 370 del 16 de noviembre de 2023, dio apertura al concurso de méritos 003 de 2023, para seleccionar la interventoría.
  - Que mediante Resolución 387 del 30 de noviembre de 2023, el Municipio de Tello resolvió adjudicar el proceso de Licitación Pública 002 de 2023 una vez superado todo el trámite administrativo y de publicidad, en la plataforma SECOP.

- Que el plazo inicialmente establecido en el convenio No.156 de 2023 se encuentra próximo a vencerse, impidiendo así, ejecutar y llevar a feliz término la construcción de las unidades sépticas objeto del convenio.
- Que de conformidad con lo anterior, el Municipio de Tello solicita adicionar 6 meses en plazo al convenio.

✓ El día 7 de diciembre de 2023 se elaboró el acta de justificación para la celebración del otrosi No.2 (adicional en plazo) al convenio interadministrativo No.156 de 2023 suscrito entre el Municipio de Tello y la CAM.

✓ Se suscribió el Adicional No.2 con fecha 19 de diciembre de 2023, donde se adiciona seis (6) meses en plazo al convenio interadministrativo 156 de 2023.


✓ El municipio de Tello en calidad de ejecutor del proyecto, remite copia de la minuta del contrato de obra 183 de 2023 suscrito con el CONSORCIO POZOS TELLO 2023 con NIT.901.780.033-7 representado legalmente por el Ing. Jairo Armando Castañeda Fierro, por valor de $1.077.819.177, resultado del proceso de Licitación Pública LP-002- 2023 cuyo objeto es "REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SEPTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN DOMESTICO EN HOGARES DISPERSOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA, PARA LA CONSERVACIÓN Y DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO CELEBRADO CON LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM Y EL MUNICIPIO DE TELLO".

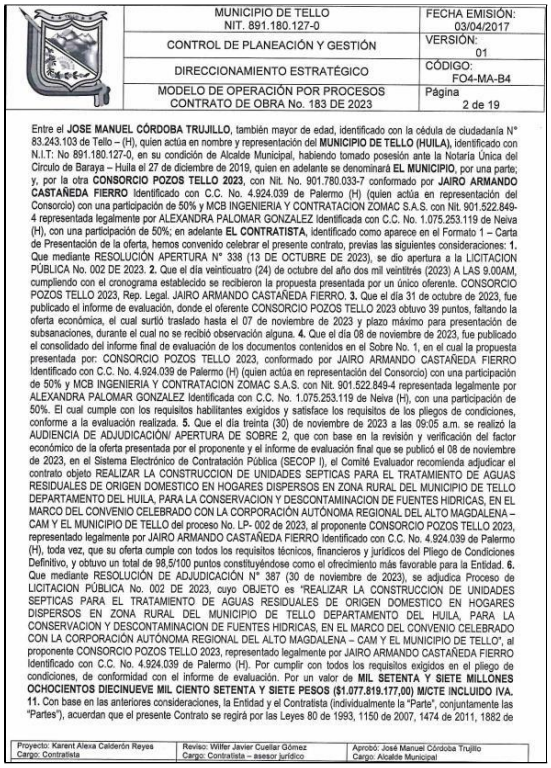

MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO4-MA-B4
MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS CONTRATO DE OBRA No. 183 DE 2023	Página 2 de 19

Entre el **JOSE MANUEL CÓRDOBA TRUJILLO**, también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 83.243.103 de Tello – (H), quien actúa en nombre y representación del **MUNICIPIO DE TELLO (HUILA)**, identificado con N.I.T: No 891.180.127-0, en su condición de Alcalde Municipal, habiendo tomado posesión ante la Notaría Única del Círculo de Baraya – Huila el 27 de diciembre de 2019, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte; y, por la otra **CONSORCIO POZOS TELLO 2023**, con Nit. No. 901.780.033-7 conformado por **JAIRO ARMANDO CASTAÑEDA FIERRO** Identificado con C.C. No. 4.924.039 de Palermo (H) (quien actúa en representación del Consorcio) con una participación de 50% y MCB INGENIERIA Y CONTRATACION ZOMAC S.A.S. con Nit. 901.522.849-4 representada legalmente por ALEXANDRA PALOMAR GONZALEZ Identificada con C.C. No. 1.075.253.119 de Neiva (H), con una participación de 50%; en adelante **EL CONTRATISTA**, identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones: **1.** Que mediante RESOLUCIÓN APERTURA N° 338 (13 DE OCTUBRE DE 2023), se dio apertura a la LICITACION PÚBLICA No. 002 DE 2023. **2.** Que el día veinticuatro (24) de octubre del año dos mil veintitrés (2023) A LAS 9.00AM, cumpliendo con el cronograma establecido se recibieron la propuesta presentada por un único oferente. CONSORCIO POZOS TELLO 2023, Rep. Legal. JAIRO ARMANDO CASTAÑEDA FIERRO. **3.** Que el día 31 de octubre de 2023, fue publicado el informe de evaluación, donde el oferente CONSORCIO POZOS TELLO 2023 obtuvo 39 puntos, faltando la oferta económica, el cual surtió traslado hasta el 07 de noviembre de 2023 y plazo máximo para presentación de subsanaciones, durante el cual no se recibió observación alguna. **4.** Que el día 08 de noviembre de 2023, fue publicado el consolidado del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1, en el cual la propuesta presentada por: CONSORCIO POZOS TELLO 2023, conformado por JAIRO ARMANDO CASTAÑEDA FIERRO Identificado con C.C. No. 4.924.039 de Palermo (H) (quien actúa en representación del Consorcio) con una participación de 50% y MCB INGENIERIA Y CONTRATACION ZOMAC S.A.S. con Nit. 901.522.849-4 representada legalmente por ALEXANDRA PALOMAR GONZALEZ Identificada con C.C. No. 1.075.253.119 de Neiva (H), con una participación de 50%. El cual cumple con los requisitos habilitantes exigidos y satisface los requisitos de los pliegos de condiciones, conforme a la evaluación realizada. **5.** Que el día treinta (30) de noviembre de 2023 a las 09:05 a.m. se realizó la AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN/ APERTURA DE SOBRE 2, que con base en la revisión y verificación del factor económico de la oferta presentada por el proponente y el informe de evaluación final que se publicó el 08 de noviembre de 2023, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), el Comité Evaluador recomienda adjudicar el contrato objeto REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SEPTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN DOMESTICO EN HOGARES DISPERSOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA, PARA LA CONSERVACION Y DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO CELEBRADO CON LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM Y EL MUNICIPIO DE TELLO del proceso No. LP- 002 de 2023, al proponente CONSORCIO POZOS TELLO 2023, representado legalmente por JAIRO ARMANDO CASTAÑEDA FIERRO Identificado con C.C. No. 4.924.039 de Palermo (H), toda vez, que su oferta cumple con todos los requisitos técnicos, financieros y jurídicos del Pliego de Condiciones Definitivo, y obtuvo un total de 98,5/100 puntos constituyéndose como el ofrecimiento más favorable para la Entidad. **6.** Que mediante RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N° 387 (30 de noviembre de 2023), se adjudica Proceso de LICITACION PÚBLICA No. 002 DE 2023, cuyo OBJETO es "REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SEPTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN DOMESTICO EN HOGARES DISPERSOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA, PARA LA CONSERVACION Y DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO CELEBRADO CON LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM Y EL MUNICIPIO DE TELLO", al proponente CONSORCIO POZOS TELLO 2023, representado legalmente por JAIRO ARMANDO CASTAÑEDA FIERRO Identificado con C.C. No. 4.924.039 de Palermo (H). Por cumplir con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, de conformidad con el informe de evaluación. Por un valor de **MIL SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS ($1.077.819.177,00) M/CTE INCLUIDO IVA. 11.** Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la "Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de

Proyecto: Karent Alexa Calderón Reyes Cargo: Contratista	Revisó: Wilfer Javier Cuellar Gómez Cargo: Contratista – asesor jurídico	Aprobó: José Manuel Córdoba Trujillo Cargo: Alcalde Municipal

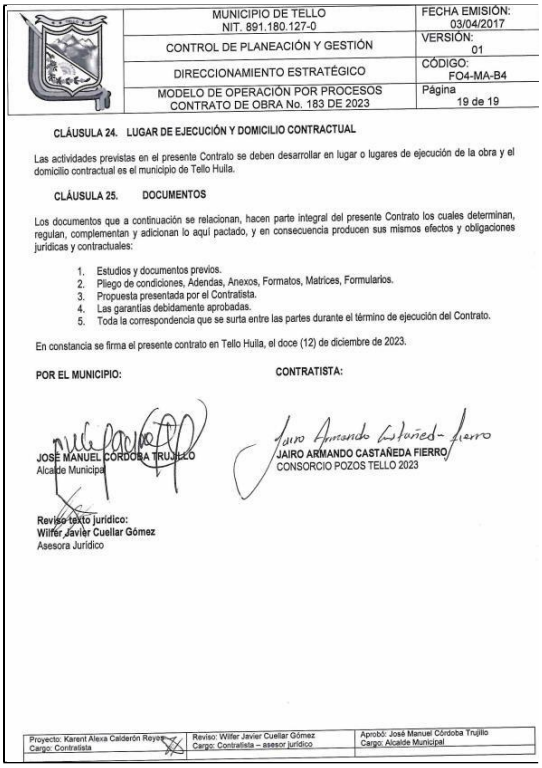

MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO4-MA-B4
MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS CONTRATO DE OBRA No. 183 DE 2023	Página 19 de 19

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en lugar o lugares de ejecución de la obra y el domicilio contractual es el municipio de Tello Huila.

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

En constancia se firma el presente contrato en Tello Huila, el doce (12) de diciembre de 2023.

POR EL MUNICIPIO: **CONTRATISTA:**


JOSE MANUEL CÓRDOBA TRUJILLO
Alcalde Municipal

JAIRO ARMANDO CASTAÑEDA FIERRO
CONSORCIO POZOS TELLO 2023

Revisó texto jurídico:
Wilfer Javier Cuellar Gómez
Asesora Jurídico

Proyecto: Karent Alexa Calderón Reyes Cargo: Contratista	Revisó: Wilfer Javier Cuellar Gómez Cargo: Contratista – asesor jurídico	Aprobó: José Manuel Córdoba Trujillo Cargo: Alcalde Municipal


- ✓ Así mismo, el municipio de Tello remite copia de la minuta del contrato de interventoría 184 de 2023 suscrito con el señor ANGEL FERNANDO RAMIREZ PERDOMO identificado con CC.12.120.877 por valor de $75.447.342, resultado del proceso de concurso de méritos abierto CM-003-2023, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SEPTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN DOMESTICO EN HOGARES DISPERSOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA, PARA LA CONSERVACIÓN Y DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO CELEBRADO CON LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM Y EL MUNICIPIO DE TELLO".

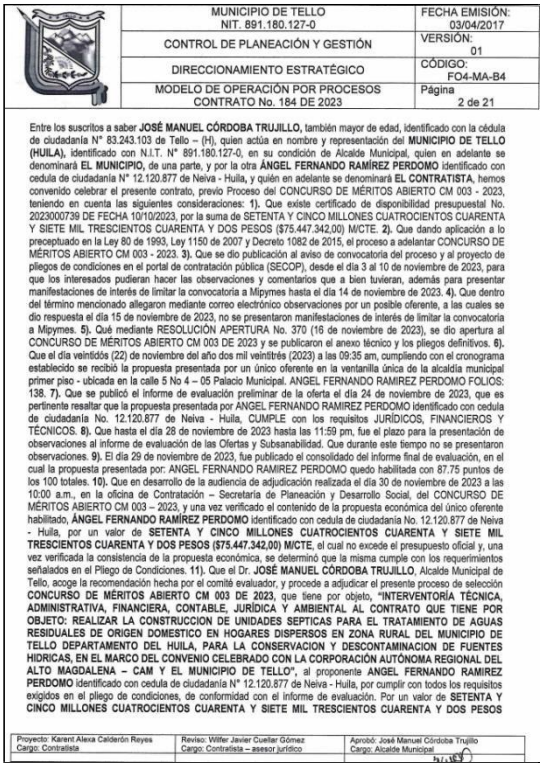

MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO4-MA-B4
MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS CONTRATO No. 184 DE 2023	Página 2 de 21

Entre los suscritos a saber **JOSÉ MANUEL CÓRDOBA TRUJILLO,** también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 83.243.103 de Tello – (H), quien actúa en nombre y representación del **MUNICIPIO DE TELLO (HUILA),** identificado con N.I.T. N° 891.180.127-0, en su condición de Alcalde Municipal, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO,** de una parte, y por la otra **ÁNGEL FERNANDO RAMÍREZ PERDOMO** identificado con cedula de ciudadanía N° 12.120.877 de Neiva - Huila, y quién en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el presente contrato, previo Proceso del CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO CM 003 - 2023, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **1).** Que existe certificado de disponibilidad presupuestal No. 2023000739 DE FECHA 10/10/2023, por la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($75.447.342,00) M/CTE. **2).** Que dando aplicación a lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, el proceso a adelantar CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO CM 003 - 2023. **3).** Que se dio publicación al aviso de convocatoria del proceso y al proyecto de pliegos de condiciones en el portal de contratación pública (SECOP), desde el día 3 al 10 de noviembre de 2023, para que los interesados pudieran hacer las observaciones y comentarios que a bien tuvieran, además para presentar manifestaciones de interés de limitar la convocatoria a Mipymes hasta el día 14 de noviembre de 2023. **4).** Que dentro del término mencionado allegaron mediante correo electrónico observaciones por un posible cierre, a las cuales se dio respuesta el día 15 de noviembre de 2023, no se presentaron manifestaciones de interés de limitar la convocatoria a Mipymes. **5).** Qué mediante RESOLUCIÓN APERTURA No. 370 (16 de noviembre de 2023), se dio apertura al CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO CM 003 DE 2023 y se publicaron el anexo técnico y los pliegos definitivos. **6).** Que el día veintidós (22) de noviembre del año dos mil veintitrés (2023) a las 09:35 am, cumpliendo con el cronograma establecido se recibió la propuesta presentada por un único oferente en la ventanilla única de la alcaldía municipal primer piso - ubicada en la calle 5 No 4 – 05 Palacio Municipal. ANGEL FERNANDO RAMIREZ PERDOMO FOLIOS: 138. **7).** Que se publicó el informe de evaluación preliminar de la oferta el día 24 de noviembre de 2023, que es pertinente resaltar que la propuesta presentada por ANGEL FERNANDO RAMIREZ PERDOMO identificado con cedula de ciudadanía No. 12.120.877 de Neiva - Huila, CUMPLE con los requisitos JURÍDICOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS. **8).** Que hasta el día 28 de noviembre de 2023 hasta las 11:59 pm, fue el plazo para la presentación de observaciones al informe de evaluación de las Ofertas y Subsanabilidad. Que durante este tiempo no se presentaron observaciones. **9).** El día 29 de noviembre de 2023, fue publicado el consolidado del informe final de evaluación, en el cual la propuesta presentada por: ANGEL FERNANDO RAMIREZ PERDOMO quedo habilitada con 87.75 puntos de los 100 totales. **10).** Que en desarrollo de la audiencia de adjudicación realizada el día 30 de noviembre de 2023 a las 10:00 a.m., en la oficina de Contratación – Secretaria de Planeación y Desarrollo Social, del CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO CM 003 – 2023, y una vez verificado el contenido de la propuesta económica del único oferente habilitado, **ÁNGEL FERNANDO RAMÍREZ PERDOMO** identificado con cedula de ciudadanía No. 12.120.877 de Neiva - Huila, por un valor de **SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($75.447.342,00) M/CTE**, el cual no excede el presupuesto oficial y, una vez verificada la consistencia de la propuesta económica, se determinó que la misma cumple con los requerimientos señalados en el Pliego de Condiciones. **11).** Que el Dr. **JOSÉ MANUEL CÓRDOBA TRUJILLO**, Alcalde Municipal de Tello, acoge la recomendación hecha por el comité evaluador, y procede a adjudicar el presente proceso de selección **CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO CM 003 DE 2023,** que tiene por objeto, **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SEPTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN DOMESTICO EN HOGARES DISPERSOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA, PARA LA CONSERVACION Y DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO CELEBRADO CON LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM Y EL MUNICIPIO DE TELLO",** al proponente **ANGEL FERNANDO RAMIREZ PERDOMO** identificado con cedula de ciudadanía N° 12.120.877 de Neiva - Huila, por cumplir con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, de conformidad con el informe de evaluación. Por un valor de **SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS**

Proyecto: Karent Alexa Calderón Reyes Cargo: Contratista	Revisó: Wilfer Javier Cuellar Gómez Cargo: Contratista – asesor jurídico	Aprobó: José Manuel Córdoba Trujillo Cargo: Alcalde Municipal

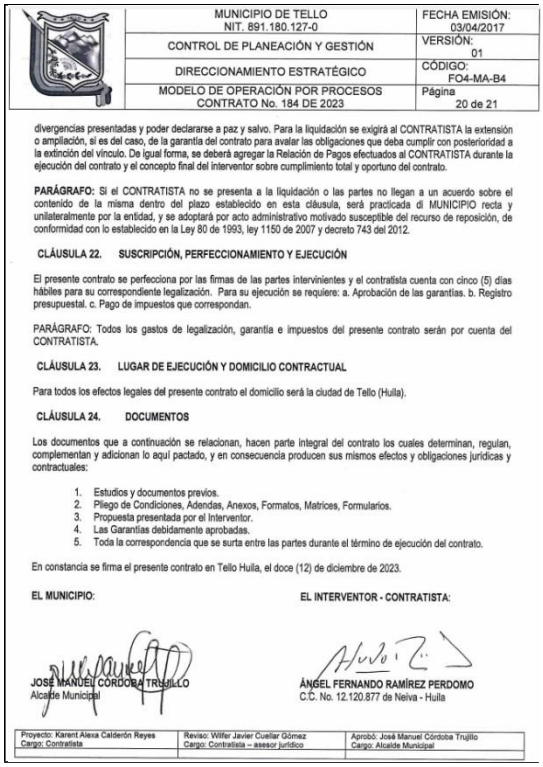

MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 03/04/2017
CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 01
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO4-MA-B4
MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS CONTRATO No. 184 DE 2023	Página 20 de 21

divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del vínculo. De igual forma, se deberá agregar la Relación de Pagos efectuados al CONTRATISTA durante la ejecución del contrato y el concepto final del interventor sobre cumplimiento total y oportuno del contrato.

PARÁGRAFO: Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma dentro del plazo establecido en esta cláusula, será practicada di MUNICIPIO recta y unilateralmente por la entidad, y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y decreto 743 del 2012.

CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

El presente contrato se perfecciona por las firmas de las partes intervinientes y el contratista cuenta con cinco (5) días hábiles para su correspondiente legalización. Para su ejecución se requiere: a. Aprobación de las garantías. b. Registro presupuestal. c. Pago de impuestos que correspondan.

PARÁGRAFO: Todos los gastos de legalización, garantía e impuestos del presente contrato serán por cuenta del CONTRATISTA.

CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos legales del presente contrato el domicilio será la ciudad de Tello (Huila).

CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Interventor.
4. Las Garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato.

En constancia se firma el presente contrato en Tello Huila, el doce (12) de diciembre de 2023.

EL MUNICIPIO: **EL INTERVENTOR - CONTRATISTA:**

JOSÉ MANUEL CÓRDOBA TRUJILLO
Alcalde Municipal

ÁNGEL FERNANDO RAMÍREZ PERDOMO
C.C. No. 12.120.877 de Neiva - Huila

Proyecto: Karent Alexa Calderón Reyes Cargo: Contratista	Revisó: Wilfer Javier Cuellar Gómez Cargo: Contratista – asesor jurídico	Aprobó: José Manuel Córdoba Trujillo Cargo: Alcalde Municipal

- ✓ Mediante oficio 3880 de fecha 09 de febrero de 2024, se solicitó información del avance en la ejecución del contrato 183 de 2023 a cargo del Municipio de Tello, derivado del convenio interadministrativo 156 de 2023 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM Y EL MUNICIPIO DE TELLO PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SEPTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN DOMESTICO EN HOGARES DISPERSOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA, PARA LA CONSERVACION Y DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS"; sin obtener respuesta.

- ✓ Nuevamente mediante oficio 6065 de fecha 01 de marzo de 2024, se reiteró la solicitud de información respecto al avance en la ejecución del contrato 183 de 2023 a cargo del Municipio de Tello, derivado del convenio interadministrativo 156 de 2023 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM Y EL MUNICIPIO DE TELLO PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SEPTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN DOMESTICO EN HOGARES DISPERSOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA, PARA LA CONSERVACION Y DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS"; y citando a un comité técnico de seguimiento para el día 7 de marzo de 2024 a las 8:00am, sin obtener respuesta escrita y finalizada la jornada no se presentó representante alguno del municipio de Tello al comité de supervisión para seguimiento en la fecha y hora indicada.



Neiva,

Numero de radicado: 6065 2024-S
Fecha y Hora: 01/03/2024 13:36:08

Doctor:
FERNANDO ALIPIO SOLANO GOMEZ
Alcalde Municipal
contactenos@tello-huila.gov.co
Tello (H)

Doctora:
KATHERINE TOVAR
Secretaria de Planeación y Desarrollo Social
planeacion@tello-huila.gov.co
Tello (H)

Asunto: Nuevamente solicitud de información, Convenio interadministrativo 156 de 2023.

Cordial y respetuoso saludo,

Muy comedidamente le solicitamos reiterando lo expuesto en el oficio 3880 del 9/02/2024, brindamos información del avance de la ejecución contractual a cargo del municipio de Tello, derivada del convenio del asunto y cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM Y EL MUNICIPIO DE TELLO PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SEPTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN DOMESTICO EN HOGARES DISPERSOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA, PARA LA CONSERVACION Y DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS."

Así mismo, convocamos de manera atenta un comité de supervisión para seguimiento al convenio del asunto el día jueves 7 de marzo a las 8:00am en la sala de juntas de esta dependencia, y conocer de primera mano la situación contractual que derivó en la selección del oferente CONSORCIO POZOS TELLO 2023 (Contrato de obra No.183 de 2023), y el oferente ANGEL FERNANDO RAMIREZ PERDOMO (Contrato de Interventoría No.184 de 2023), el avance de ejecución acorde al cronograma del proyecto presentado y ajustado por el municipio, y el plazo del citado convenio.

Cordialmente,


Edisney Silva Argote
Firmado digitalmente por Edisney Silva Argote
Fecha: 2024.03.01 11:58:58 -05'00'

EDISNEY SILVA ARGOTE
Subdirectora de Gestión Ambiental (E)

Anexo: Copia del oficio 3880 del 09/02/2024 (1 folio)

TRD: Facilitativos SGA/2024
Proyecto: Ing. L.Obregon

Sede Principal
Carrera 1 No. 60-79 Barrio Las Mercedes
Neiva - Huila (Colombia)
radicacion@cam.gov.co
(608) 866 4454
www.cam.gov.co

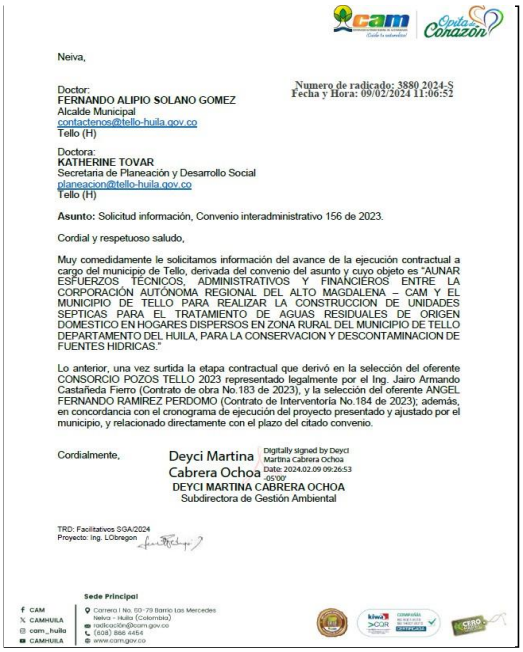

Neiva,

Numero de radicado: 3880 2024-S
Fecha y Hora: 09/02/2024 11:06:52

Doctor:
FERNANDO ALIPIO SOLANO GOMEZ
Alcalde Municipal
contactenos@tello-huila.gov.co
Tello (H)

Doctora:
KATHERINE TOVAR
Secretaria de Planeación y Desarrollo Social
planeacion@tello-huila.gov.co
Tello (H)

Asunto: Solicitud información, Convenio interadministrativo 156 de 2023.

Cordial y respetuoso saludo,

Muy comedidamente le solicitamos información del avance de la ejecución contractual a cargo del municipio de Tello, derivada del convenio del asunto y cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM Y EL MUNICIPIO DE TELLO PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SEPTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN DOMESTICO EN HOGARES DISPERSOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA, PARA LA CONSERVACION Y DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS."

Lo anterior, una vez surtida la etapa contractual que derivó en la selección del oferente CONSORCIO POZOS TELLO 2023 representado legalmente por el Ing. Jairo Armando Castañeda Fierro (Contrato de obra No.183 de 2023), y la selección del oferente ANGEL FERNANDO RAMIREZ PERDOMO (Contrato de Interventoria No.184 de 2023); además, en concordancia con el cronograma de ejecución del proyecto presentado y ajustado por el municipio, y relacionado directamente con el plazo del citado convenio.

Cordialmente,

Deyci Martina Cabrera Ochoa
Digitally signed by Deyci Martina Cabrera Ochoa
Date: 2024.02.09 09:26:53 -05'00'


DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA
Subdirectora de Gestión Ambiental

TRD: Facilitativos SGA/2024
Proyecto: Ing. L.Obregon

Sede Principal
Carrera 1 No. 60-79 Barrio Las Mercedes
Neiva - Huila (Colombia)
radicacion@cam.gov.co
(608) 866 4454
www.cam.gov.co

- ✓ Con oficio radicado CAM 7733 del 11/03/2024 el municipio de Tello responde la solicitud de la CAM, argumentando el aplazamiento en el inicio de la ejecución del proyecto en la necesidad de refrendar las reservas presupuestales.

- ✓ Se oficio nuevamente bajo el numero radicado CAM 10134 de fecha 22 de abril de 2024 al municipio de Tello, pidiendo información del avance en la ejecución del contrato 183 de 2023 a cargo del Municipio de Tello, derivado del convenio interadministrativo 156 de 2023 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM Y EL MUNICIPIO DE TELLO PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SEPTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN DOMESTICO EN HOGARES DISPERSOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA, PARA LA CONSERVACION Y DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS"; y recomendando al municipio que se haga un nuevo cronograma de ejecución actualizado.

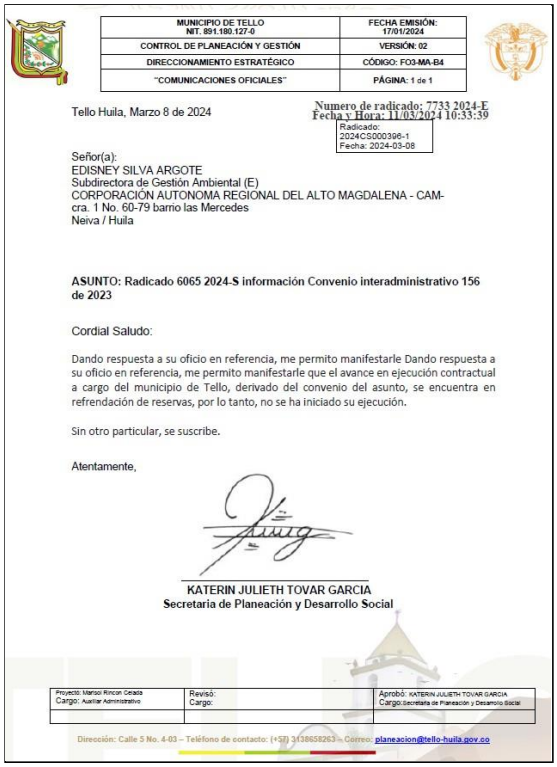

MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 17/01/2024
CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 02
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO3-MA-B4
"COMUNICACIONES OFICIALES"	PÁGINA: 1 de 1

Tello Huila, Marzo 8 de 2024

Numero de radicado: 7733 2024-E
Fecha y Hora: 11/03/2024 10:33:39

Radicado: 2024CS000396-1
Fecha: 2024-03-08

Señor(a):
EDISNEY SILVA ARGOTE
Subdirectora de Gestión Ambiental (E)
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM-
cra. 1 No. 60-79 barrio las Mercedes
Neiva / Huila

ASUNTO: Radicado 6065 2024-S información Convenio interadministrativo 156 de 2023

Cordial Saludo:

Dando respuesta a su oficio en referencia, me permito manifestarle Dando respuesta a su oficio en referencia, me permito manifestarle que el avance en ejecución contractual a cargo del municipio de Tello, derivado del convenio del asunto, se encuentra en refrendación de reservas, por lo tanto, no se ha iniciado su ejecución.

Sin otro particular, se suscribe.

Atentamente,

KATERIN JULIETH TOVAR GARCIA
Secretaria de Planeación y Desarrollo Social

Proyectó: Marisol Rincon Ceiada Cargo: Auxiliar Administrativo	Revisó: Cargo:	Aprobó: KATERIN JULIETH TOVAR GARCIA Cargo:Secretaria de Planeación y Desarrollo Social

Dirección: Calle 5 No. 4-03 – Teléfono de contacto: (+57) 3138658263 – Correo: planeacion@tello-huila.gov.co



Neiva,

Doctor:
FERNANDO ALIPIO SOLANO GOMEZ
Alcalde Municipal
contactenos@tello-huila.gov.co
Tello (H)

Numero de radicado: 10134 2024-S
Fecha y Hora: 22/04/2024 15:26:43

Doctora:
KATHERIN JULIETH TOVAR GARCIA
Secretaria de Planeación y Desarrollo Social
planeacion@tello-huila.gov.co
Tello (H)

Asunto: Solicitud de información, refrendación de reserva y avance Convenio interadministrativo 156 de 2023.

Cordial y respetuoso saludo,

Muy comedidamente le solicitamos información acerca del trámite de refrendación de la reserva presupuestal, de los recursos CAM destinados al convenio del asunto cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM Y EL MUNICIPIO DE TELLO PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SEPTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN DOMESTICO EN HOGARES DISPERSOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA, PARA LA CONSERVACION Y DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS."

Así mismo, por favor brindarnos información del avance en la ejecución del contrato de obra 183 de 2023 – CONSORCIO POZOS TELLO 2023 y contrato de interventoría 184 de 2023 – ANGEL FERNANDO RAMIREZ PERDOMO, a cargo del municipio de Tello y derivados del referido convenio.

Finalmente, consideramos pertinente por parte del municipio de Tello presentar el cronograma ajustado de la ejecución del proyecto, que le permita a la Corporación hacer seguimiento a las condiciones pactadas en el Convenio 156 de 2023.

Cordialmente,

Deyci Martina Cabrera Ochoa
Digitally signed by Deyci Martina Cabrera Ochoa
Date: 2024.04.22 14:30:47 -05'00'


DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA
Subdirectora de Gestión Ambiental

TRD: Facilitativos SGA/2024
Proyecto: Ing. LObregon

Sede Principal
Carrera I No. 60-79 Barrio Las Mercedes
Neiva - Huila (Colombia)
radicacion@cam.gov.co
(608) 866 4454
www.cam.gov.co

CAM
CAMHUILA
cam_huila
CAMHUILA

- ✓ Con oficio de fecha 21 de mayo de 2024, el municipio de Tello solicita adicionar en 6 meses más el plazo del convenio interadministrativo 156 de 2023, donde expone que las reservas presupuestales no han sido refrendadas por parte de la Contraloría Departamental imposibilitando la ejecución de los contratos de obra derivados del convenio, que el clima resulta ser muy desfavorable generando dificultad para el trabajo en terreno y riesgo de seguridad para el equipo y trabajadores, que la región ha experimentado disturbios sociales generando dificultad para adquirir la mano de obra, y que en determinadas zonas los materiales se tendrán que transportar a lomo de mula.

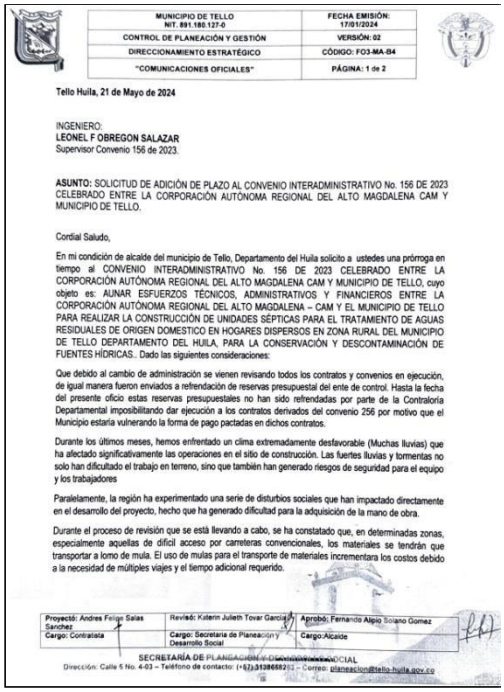

MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 17/01/2024
CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 02
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO3-MA-B4
"COMUNICACIONES OFICIALES"	PÁGINA: 1 de 2

Tello Huila, 21 de Mayo de 2024

INGENIERO:
LEONEL F OBREGON SALAZAR
Supervisor Convenio 156 de 2023.

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICIÓN DE PLAZO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 156 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM Y MUNICIPIO DE TELLO.

Cordial Saludo,

En mi condición de alcalde del municipio de Tello, Departamento del Huila solicito a ustedes una prórroga en tiempo al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 156 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM Y MUNICIPIO DE TELLO, cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM Y EL MUNICIPIO DE TELLO PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SÉPTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN DOMESTICO EN HOGARES DISPERSOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA, PARA LA CONSERVACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS.. Dado las siguientes consideraciones:

Que debido al cambio de administración se vienen revisando todos los contratos y convenios en ejecución, de igual manera fueron enviados a refrendación de reservas presupuestal del ente de control. Hasta la fecha del presente oficio estas reservas presupuestales no han sido refrendadas por parte de la Contraloría Departamental imposibilitando dar ejecución a los contratos derivados del convenio 256 por motivo que el Municipio estaría vulnerando la forma de pago pactadas en dichos contratos.


Durante los últimos meses, hemos enfrentado un clima extremadamente desfavorable (Muchas lluvias) que ha afectado significativamente las operaciones en el sitio de construcción. Las fuertes lluvias y tormentas no solo han dificultado el trabajo en terreno, sino que también han generado riesgos de seguridad para el equipo y los trabajadores

Paralelamente, la región ha experimentado una serie de disturbios sociales que han impactado directamente en el desarrollo del proyecto, hecho que ha generado dificultad para la adquisición de la mano de obra.

Durante el proceso de revisión que se está llevando a cabo, se ha constatado que, en determinadas zonas, especialmente aquellas de difícil acceso por carreteras convencionales, los materiales se tendrán que transportar a lomo de mula. El uso de mulas para el transporte de materiales incrementara los costos debido a la necesidad de múltiples viajes y el tiempo adicional requerido.

Proyectó: Andres Felipe Salas Sanchez	Revisó: Katerin Julieth Tovar Garcia	Aprobó: Fernando Alpio Solano Gomez
Cargo: Contratista	Cargo: Secretaria de Planeación y Desarrollo Social	Cargo:Alcalde

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
Dirección: Calle 5 No. 4-03 – Teléfono de contacto: (+57) 3138658203 – Correo: planeacion@tello-huila.gov.co

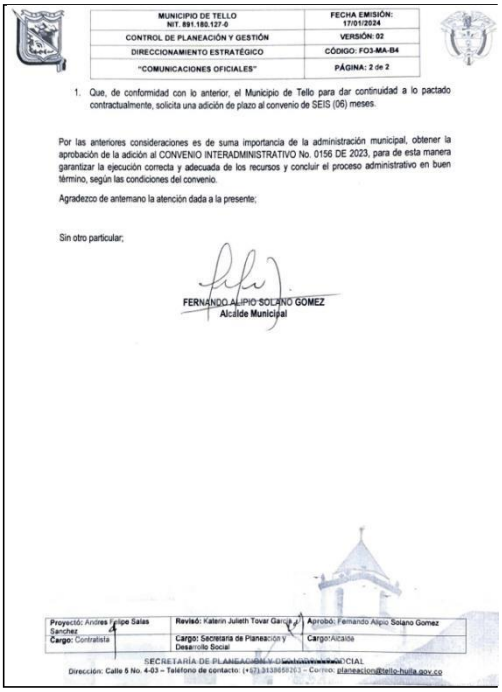

MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0	FECHA EMISIÓN: 17/01/2024
CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 02
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: FO3-MA-B4
"COMUNICACIONES OFICIALES"	PÁGINA: 2 de 2

1. Que, de conformidad con lo anterior, el Municipio de Tello para dar continuidad a lo pactado contractualmente, solicita una adición de plazo al convenio de SEIS (06) meses.

Por las anteriores consideraciones es de suma importancia de la administración municipal, obtener la aprobación de la adición al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0156 DE 2023, para de esta manera garantizar la ejecución correcta y adecuada de los recursos y concluir el proceso administrativo en buen término, según las condiciones del convenio.

Agradezco de antemano la atención dada a la presente;

Sin otro particular;

FERNANDO ALIPIO SOLANO GÓMEZ
Alcalde Municipal

Proyectó: Andres Felipe Salas Sanchez	Revisó: Katerin Julieth Tovar Garcia	Aprobó: Fernando Alpio Solano Gomez
Cargo: Contratista	Cargo: Secretaria de Planeación y Desarrollo Social	Cargo:Alcalde

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
Dirección: Calle 5 No. 4-03 – Teléfono de contacto: (+57) 3138658203 – Correo: planeacion@tello-huila.gov.co

- ✓ El día 24 de mayo de 2024 se elaboró el acta de justificación para la celebración del otrosi No.3 (adicional en plazo) al convenio interadministrativo No.156 de 2023 suscrito entre el Municipio de Tello y la CAM.

- ✓ Con radicado 17195 de fecha 17 junio de 2024, el municipio de Tello remite cronograma actualizado de ejecución del convenio.

- ✓ Se suscribió el Adicional No.3 con fecha 24 de junio de 2024, donde se adiciona seis (6) meses en plazo al convenio interadministrativo 156 de 2023.



ACTA DE JUSTIFICACIÓN ADICIONAL	Código:	F-CAM-192
	Versión:	2
	Fecha:	09 Abr 14

ACTA DE JUSTIFICACION PARA LA CELEBRACION DE OTROSÍ N° 03 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 156 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM y EL MUNICIPIO DE TELLO

OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM y el Municipio de Tello, para realizar la construcción de unidades sépticas para el tratamiento de aguas residuales en hogares dispersos en zona rural del Municipio de Tello Departamento del Huila, para la conservación y descontaminación de fuentes hídricas.
CONTRATISTA	**MUNICIPIO DE TELLO** NIT. 891.180.127-0
REPRESENTANTE LEGAL	**FERNANDO ALIPIO SOLANO GOMEZ**
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	Novecientos Ochenta y Cinco Millones Ochenta y Tres Mil Treinta Pesos ($985.083.030.oo) M/Cte.
OTROSI 1 (5 septiembre de 2023)	Adiciona ciento sesenta y ocho millones ciento ochenta y tres mil cuatrocientos noventa pesos ($168.183.490) Mcte., con recursos del municipio
VALOR FINAL DEL CONVENIO	Mil ciento cincuenta y tres millones doscientos sesenta y seis mil quinientos diecinueve pesos ($1.153.266.520.oo) M/Cte.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Nueve (9) meses contados a partir del acta de inicio.
OTROSI 2 (19 diciembre de 2023)	Adiciona en plazo 180 días
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	Quince (15) meses contados a partir del acta de inicio.
FECHA ACTA DE INICIO	3/03/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	Julio 25 Del 2023
FECHA DE REINICIO 1	Agosto 22 del 2023

Página 1|6



ACTA DE JUSTIFICACIÓN ADICIONAL	Código:	F-CAM-192
	Versión:	2
	Fecha:	09 Abr 14

ACTA DE JUSTIFICACION PARA LA CELEBRACION DE OTROSÍ N° 03 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 156 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM y EL MUNICIPIO DE TELLO

También considera que los disturbios sociales experimentados en la región, han impactado directamente en el desarrollo del proyecto generando dificultad para la adquisición de la mano de obra.
Que conforme el proceso de revisión que se adelanta del proyecto, considera el municipio que los materiales se tendrán que transportar a lomo de mula en determinadas zonas, especialmente aquellas de difícil acceso por carreteras convencionales.

DE ACUERDO CON LAS ANTERIORES CONSIDERACIONES LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL OTROSI MODIFICATORIO No.3 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.156 DEL 24 DE FEBRERO DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM y EL MUNICIPIO DE TELLO, CON EL FIN DE ADICIONAR TIEMPO EN SEIS (6) MESES PARA QUE SE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE DICHO CONVENIO, ASÍ:

1. **Adiciónese** a la CLAUSULA CUARTA del convenio interadministrativo No.156 del 24 de febrero de 2023, sobre el PLAZO DE EJECUCIÓN, seis (6) meses, quedando así: "El convenio tendrá una duración total de veintiún (21) meses contados a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del convenio.

Los demás términos, condiciones y estipulaciones del convenio interadministrativo No.156 del 24 de febrero de 2023, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM y el Municipio de Tello, no modificados por el presente documento continúan vigentes.

El presente documento se perfecciona con la firma de las partes, por acuerdo entre ellas, en constancia se firma por los que en ella intervinieron, el día 24 de mayo de 2024.


LEONEL F OBREGON SALAZAR
Profesional Especializado – CAM
Supervisor

FERNANDO ALIPIO SOLANO GOMEZ
Alcalde Municipal de Tello-Huila

KATERIN JULIETH TOVAR GARCIA
Secretaria de Planeación y Desarrollo Social
Tello (H)

DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA
Subdirectora de Gestión Ambiental


Página 6|6

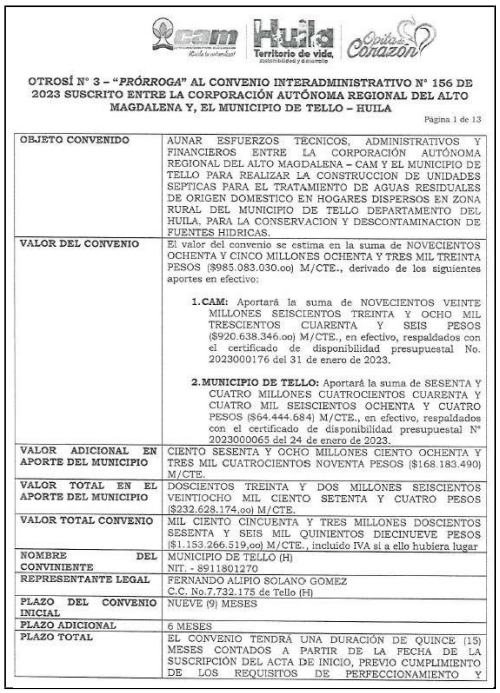

OTROSÍ N° 3 – "PRÓRROGA" AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 156 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA Y, EL MUNICIPIO DE TELLO – HUILA

Página 1 de 13

OBJETO CONVENIDO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM Y EL MUNICIPIO DE TELLO PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SEPTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN DOMESTICO EN HOGARES DISPERSOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA, PARA LA CONSERVACION Y DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS.
VALOR DEL CONVENIO	El valor del convenio se estima en la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL TREINTA PESOS ($985.083.030.oo) M/CTE., derivado de los siguientes aportes en efectivo: 1. **CAM:** Aportará la suma de NOVECIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($920.638.346.oo) M/CTE., en efectivo, respaldados con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2023000176 del 31 de enero de 2023. 2. **MUNICIPIO DE TELLO:** Aportará la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($64.444.684) M/CTE., en efectivo, respaldados con el certificado de disponibilidad presupuestal N° 2023000065 del 24 de enero de 2023.
VALOR ADICIONAL EN APORTE DEL MUNICIPIO	CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS ($168.183.490) M/CTE.
VALOR TOTAL EN EL APORTE DEL MUNICIPIO	DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS ($232.628.174,oo) M/CTE.
VALOR TOTAL CONVENIO	MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS ($1.153.266.519,oo) M/CTE., incluido IVA si a ello hubiera lugar
NOMBRE DEL CONVINIENTE	MUNICIPIO DE TELLO (H) NIT. - 8911801270
REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO ALIPIO SOLANO GOMEZ C.C. No.7.732.175 de Tello (H)
PLAZO DEL CONVENIO INICIAL	NUEVE (9) MESES
PLAZO ADICIONAL	6 MESES
PLAZO TOTAL	EL CONVENIO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE QUINCE (15) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y

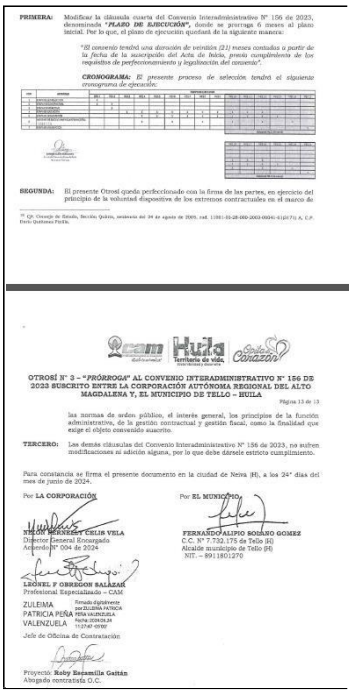

PRIMERA: Modificar la cláusula cuarta del Convenio Interadministrativo N° 156 de 2023, denominada "***PLAZO DE EJECUCIÓN***", donde se prorroga 6 meses al plazo inicial. Por lo que, el plazo de ejecución quedará de la siguiente manera:

"El convenio tendrá una duración de veintiún (21) meses contados a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del convenio".

CRONOGRAMA: *El presente proceso de selección tendrá el siguiente cronograma de ejecución:*

SEGUNDA: El presente Otrosí queda perfeccionado con la firma de las partes, en ejercicio del principio de la voluntad dispositiva de los extremos contractuales en el marco de

OTROSÍ N° 3 – "PRÓRROGA" AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 156 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA Y, EL MUNICIPIO DE TELLO – HUILA

Página 13 de 13

las normas de orden público, el interés general, los principios de la función administrativa, de la gestión contractual y gestión fiscal, como la finalidad que exige el objeto convenido suscrito.

TERCERO: Las demás cláusulas del Convenio Interadministrativo N° 156 de 2023, no sufren modificaciones ni adición alguna, por lo que debe dársele estricto cumplimiento.

Para constancia se firma el presente documento en la ciudad de Neiva (H), a los 24° días del mes de junio de 2024.

Por **LA CORPORACIÓN**

WILSON HERNEY CELIS VELA
Director General Encargado
Acuerdo N° 004 de 2024

LEONEL F OBREGON SALAZAR
Profesional Especializado – CAM

ZULEIMA PATRICIA PEÑA VALENZUELA
Jefe de Oficina de Contratación

Por **EL MUNICIPIO**

FERNANDO ALIPIO SOLANO GOMEZ
C.C. N° 7.732.175 de Tello (H)
Alcalde municipio de Tello (H)
NIT. – 8911801270

Proyectó: **Roby Escamilla Gaitán**
Abogado contratista O.C.

- ✓ Con oficio radicado CAM 19827 de fecha 22 de julio de 2024 dirigido al municipio de Tello, la CAM pide información del avance del convenio interadministrativo 156 de 2023 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM Y EL MUNICIPIO DE TELLO PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SEPTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN DOMESTICO EN HOGARES DISPERSOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA, PARA LA CONSERVACION Y DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS"; y recomendando al municipio que los recursos CAM son de la vigencia 2023 por lo tanto deben ejecutarse a más tardar al 31 diciembre de 2024, y por tanto debe adoptar todas las medidas administrativas y contractuales necesarias para la ejecución del convenio en la presente vigencia 2024; sin obtener respuesta.



Neiva, 19 de julio de 2024

Numero de radicado: 19827 2024-S
Fecha y Hora: 22/07/2024 15:16:11

Doctor:
FERNANDO ALIPIO SOLANO GOMEZ
Alcalde Municipal
contactenos@tello-huila.gov.co

Doctora:
KATHERIN JULIETH TOVAR GARCIA
Secretaria de Planeación y Desarrollo Social
planeacion@tello-huila.gov.co
Tello (H)

Asunto: Solicitud de información avance, Convenio interadministrativo 156 de 2023.

Cordial y respetuoso saludo,

Con motivo de la firma del convenio del asunto, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM Y EL MUNICIPIO DE TELLO PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SEPTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN DOMESTICO EN HOGARES DISPERSOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA, PARA LA CONSERVACION Y DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS.", se comprometieron recursos CAM de la vigencia 2023 que deben ser ejecutados y pagados como fecha límite 31 de diciembre de 2024; de lo contrario, expira la reserva presupuestal con las correspondientes consecuencias para el proyecto, para el Municipio de Tello como ejecutor del mismo y para nuestra institución, ante los entes de control.

El convenio del asunto se suscribió el 24 de febrero de 2023, con el siguiente desarrollo:
Acta de inicio, de fecha 3 de marzo de 2023
Acta de suspensión uno, de fecha 25 de julio de 2023
Acta de reinicio uno, de fecha 22 de agosto de 2023
Adicional uno con recursos del municipio, de fecha 5 de septiembre de 2023
Adicional dos en plazo (6 meses), de fecha 7 de diciembre de 2023
Adicional tres en plazo (6 meses), de fecha 24 de junio de 2024

Conforme lo anterior, le solicitamos muy comedidamente informarnos de manera urgente el avance en la ejecución de las obras, e implementar las medidas administrativas y contractuales de manera oportuna para el cumplimiento eficaz del convenio.


Cordialmente,

DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA
Subdirectora de Gestión Ambiental

TRD: Facilitativos SGA/2024
Proyectó: Ing. LObregon

Sede Principal

- ✓ Con oficio radicado CAM 25678 de fecha 05 de septiembre de 2024 dirigido al municipio de Tello, la CAM reitera la solicitud de información del avance del convenio interadministrativo 156 de 2023 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM Y EL MUNICIPIO DE TELLO PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SEPTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN DOMESTICO EN HOGARES DISPERSOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA, PARA LA CONSERVACION Y DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS"; y recomendando de manera apremiante al municipio que los recursos CAM son de la vigencia 2023 por lo tanto deben ejecutarse a más tardar al 31 diciembre de 2024, y adoptar todas las medidas administrativas y contractuales necesarias para la ejecución del convenio en la presente vigencia 2024.

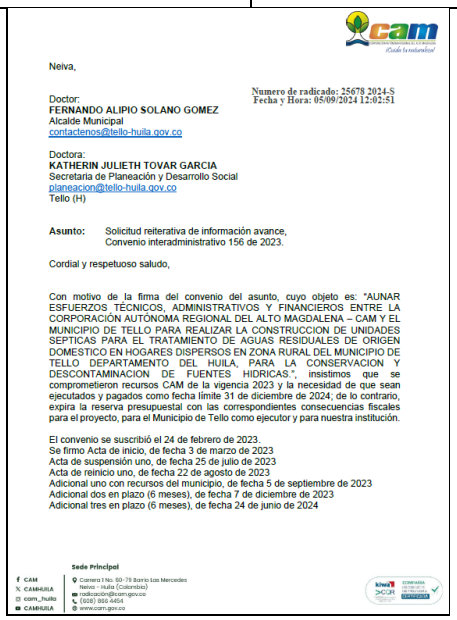

Neiva,

Numero de radicado: 25678 2024-S
Fecha y Hora: 05/09/2024 12:02:51

Doctor:
FERNANDO ALIPIO SOLANO GOMEZ
Alcalde Municipal
contactenos@tello-huila.gov.co

Doctora:
KATHERIN JULIETH TOVAR GARCIA
Secretaria de Planeación y Desarrollo Social
planeacion@tello-huila.gov.co
Tello (H)


Asunto: Solicitud reiterativa de información avance, Convenio interadministrativo 156 de 2023.

Cordial y respetuoso saludo,

Con motivo de la firma del convenio del asunto, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM Y EL MUNICIPIO DE TELLO PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SEPTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN DOMESTICO EN HOGARES DISPERSOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA, PARA LA CONSERVACION Y DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS.", insistimos que se comprometieron recursos CAM de la vigencia 2023 y la necesidad de que sean ejecutados y pagados como fecha límite 31 de diciembre de 2024; de lo contrario, expira la reserva presupuestal con las correspondientes consecuencias fiscales para el proyecto, para el Municipio de Tello como ejecutor y para nuestra institución.

El convenio se suscribió el 24 de febrero de 2023.
Se firmo Acta de inicio, de fecha 3 de marzo de 2023
Acta de suspensión uno, de fecha 25 de julio de 2023
Acta de reinicio uno, de fecha 22 de agosto de 2023
Adicional uno con recursos del municipio, de fecha 5 de septiembre de 2023
Adicional dos en plazo (6 meses), de fecha 7 de diciembre de 2023
Adicional tres en plazo (6 meses), de fecha 24 de junio de 2024

Sede Principal

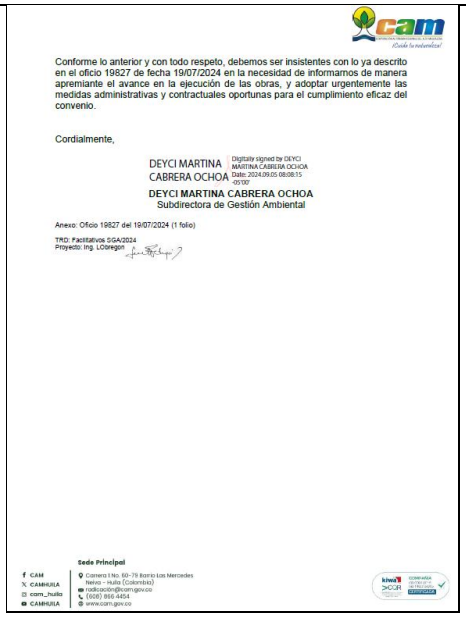

Conforme lo anterior y con todo respeto, debemos ser insistentes con lo ya descrito en el oficio 19827 de fecha 19/07/2024 en la necesidad de informarnos de manera apremiante el avance en la ejecución de las obras, y adoptar urgentemente las medidas administrativas y contractuales oportunas para el cumplimiento eficaz del convenio.

Cordialmente,

DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA
Digitally signed by DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA
Date: 2024.09.05 08:08:15 -05'00'

DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA
Subdirectora de Gestión Ambiental

Anexo: Oficio 19827 del 19/07/2024 (1 folio)

TRD: Facilitativos SGA/2024
Proyectó: Ing. LOdregon

Sede Principal

- ✓ Mediante oficio de fecha 20 de noviembre de 2024, el municipio de Tello solicita una modificación de mayores y menores cantidades, y creación de nuevo ítem, por situaciones de orden público y sociales que impacta directamente en el personal de la obra por el conflicto armado, viviendas que ya no están habitadas por estas mismas razones, dificultades de tránsito para el acceso a la zona por las restricciones que generan inseguridad e incertidumbre, las fuertes lluvias que impiden o dificultan el acceso, y que conllevo a la ejecución solamente de 13 sistemas sépticos convencionales; proponiendo entonces, por las difíciles condiciones actuales de la zona de ejecución el proyecto la alternativa de implementar sistemas sépticos integrados con componentes PVC para 139 beneficiarios, y alcanzar un total de 152 sistemas de tratamiento ejecutados, permitiendo cumplir con el mismo objetivo de tratamiento de las aguas residuales de origen doméstico y con mayor celeridad en su transporte, rendimiento en su ejecución para lograr el objeto contractual en el término establecido y no abandonar el proyecto de familias en zonas muy apartadas afectadas por el conflicto armado a lo largo de la historia, haciendo presencia como estado en beneficio de estas comunidades muy vulnerables.

- ✓ El día 02 de diciembre de 2024 se elaboró el acta de justificación para la celebración del otrosí No.4 al convenio interadministrativo No.156 de 2023 suscrito entre el Municipio de Tello y la CAM.

- ✓ Se suscribió el OTROSI No.4 con fecha 11 de diciembre de 2024, donde se modifica el numeral 7 de la cláusula segunda del convenio interadministrativo 156 de 2023, denominada "OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL MUNICIPIO".

- ✓ Mediante oficio de fecha 19 de diciembre el Municipio de Tello, solicita el segundo desembolso del 30%, y remite certificación de pago de seguridad social, informe de contratista de obra, certificación de interventoría, informe de supervisión del municipio de Tello.

"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SÉPTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN DOMESTICO EN HOGARES DISPERSOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA, PARA LA CONSERVACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO CELEBRADO CON LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ACTO MAGDALENA - CAM Y EL MUNICIPIO DE TELLO".

*** INFORME DE OBRA**

SUPERVISIÓN	KATERIN JULIETH TOVAR GARCIA	ENTIDAD	MUNICIPIO DE TELLO
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO DE OBRA	183 DE 2023		
OBJETO	"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SÉPTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN DOMESTICO EN HOGARES DISPERSOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA, PARA LA CONSERVACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO CELEBRADO CON LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ACTO MAGDALENA - CAM Y EL MUNICIPIO DE TELLO".	PERIODO DEL INFORME	Entre el 16 de noviembre al 19 de diciembre de 2024
CONTRATISTA	CONSORCIO POZOS TELLO 2023	NIT: No. 901.780.033-7	
REPRESENTANTE LEGAL:	JAIRO ARMANDO CASTAÑEDA FIERRO	C.C.4.924.039 PALERMO HUILA	
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	12 de diciembre de 2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	16 de septiembre de 2024		
FECHA DE RECIBO INICIAL	16 diciembre de 2024		
FECHA DE FINAL	31 de diciembre de 2024		
PLAZO INICIAL	Tres (03) meses a partir de la suscripción del acta de inicio.		
PLAZO ADICIONAL	Quince (15) días		
PLAZO TOTAL	Tres (3) meses quince (15) días		
VALOR INICIAL	"MIL SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS ($1.077.819.177) MCTE.		

ITEM DE PAGO	CONDICIONES MODIFICADAS					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. de fecha		ACUMULADO	
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	**CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO**								
1.1	**REALIZAR OBRAS PRELIMINARES TANQUE SÉPTICO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO**								
1.1.1	TRAZADO SOBRE TERRENO	M2	499,98	$ 4.075,10	$ 2.037.468,00	369,98	$ 1.507.705,50	369,98	$ 1.507.705,50
1.1.2	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO COMÚN	M3	943,12	$ 27.297,60	$ 25.744.967,00	452,08	$ 12.340.562,52	452,08	$ 12.340.562,52
1.2	**CONSTRUCCIÓN TRAMPA DE GRASA**								
1.2.1	CONSTRUCCIÓN TRAMPA DE GRASA DE CONFORMIDAD CON PLANOS, CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES	UND	13	$ 381.914,00	$ 4.964.882,00	13,00	$ 4.964.882,00	13,00	$ 4.964.882,00
1.3	**CONSTRUCCIÓN TANQUE SÉPTICO Y FILTRO ANAERÓBICO FAFA**							0,00	$ -
1.3.1	CONSTRUCCIÓN TANQUE SÉPTICO DE CONFORMIDAD CON PLANOS, CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES.	UND	13	$2.315.778,00	$ 30.105.114,00	13,00	$ 30.105.114,00	13,00	$ 30.105.114,00
1.3.2	CONSTRUCCIÓN FILTRO ANAERÓBICO FAFA DE CONFORMIDAD DE PLANOS, Y CANTIDADES ESPECIFICACIONES	UND	13	$1.196.341,00	$ 15.552.433,00	13,00	$ 15.552.433,00	13,00	$ 15.552.433,00

1.3.3	LECHO FILTRANTE EN GRAVILLA 3/4" HASTA 2" PARA FAFA	M3	10,4	$ 189.290,00	$ 1.968.616,00	10,40	$ 1.968.616,00	10,40	$ 1.968.616,00
1.4	**CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE INFILTRACIÓN**						$ -	0,00	$ -
1.4.1	CAMPO DE INFILTRACIÓN, TUBERÍA DE DRENAJE PVC 3" Y 2" INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO MATERIAL GRAVAS O PIEDRAS LIMPIAS SEGUN ESPECIFICACIONES	UND	13	$866.043,00	$ 11.258.559,00		$ -	0,00	$ -
1.4.2	TRANSPORTE DE MATERIALES	UND	168				$ -	0,00	$ -
13	**NUEVOS ITEMS**						$ -	0,00	$ -
13.1	SISTEMA DE TRATAMIENTO INTEGRADO (POZO SÉPTICO + FILTRO ANAEROBICO VOLUMEN DE 2000 INCLUYE - SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE	UND	139	$ 5.515.894,00	$ 766.709.266,00	90	$ 496.430.460,00	90,00	$ 496.430.460,00
Ajuste al peso									
SUBTOTAL OBRAS (A)					**$ 858.341.305,00**		**$ 562.869.773,00**		**$ 562.869.773,00**
ADMINSTRACION (20%)					$ 171.668.261,00		$ 112.573.954,60		$ 112.573.954,60
IMPREVISTO (2%)					$ 17.166.826,00		$ 11.257.395,00		$ 11.257.395,00
UTILIDAD (3%)					$ 25.750.239,00		$ 16.886.093,00		$ 16.886.093,00
SUBTOTAL AIU (B)					**$ 214.585.326,00**		**$ 140.717.443,00**		**$ 140.717.443,00**
VALOR IVA (OBRA) (19% DE U)					$ 4.892.545,00		$ 3.208.358,00		$ 3.208.358,00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)					$ 1.077.819.177,00		$ 706.795.574,00		$ 706.795.574,00
VALOR TOTAL (A+B)					**$ 1.077.819.177**		**$ 706.795.574,00**		**$ 706.795.574,00**

avance de obra % 65,57

CARLINA CUBILLOS



JAIRO ARMANDO CASTAÑEDA FIERRO
Representante legal CONSORCIO POZOS TELLO 2023

Informe contratista de obra

MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0		FECHA EMISIÓN: 17/01/2024
CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		VERSIÓN: 02
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO: FO32-MA-84-05
		PÁGINA: 1 de 43

1. DATOS GENERALES

convenio interadministrativo 156 de 2023

OBJETO:	*Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM y el Municipio de Tello, para realizar la construcción de unidades sépticas para el tratamiento de aguas residuales en hogares dispersos en zona rural del Municipio de Tello Departamento del Huila, para la conservación y descontaminación de fuentes hídricas*
CONVENIENTES	FERNANDO ALIRIO SOLANO – Alcalde municipio de Tello (H.) CAMILO AUGUSTO AGUDELO PERDOMO - Director de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($1.153.266.419), del MCTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL CONVENIO TENDRA UNA DURACIÓN DE NUEVE (9) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO.
ADICION EN PLAZO Nº1	180 DIAS
ADICION EN PLAZO Nº2	180 DIAS
PLAZO TOTAL	21 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE ACTA DE INICIO	05/03/2023
ACTA DE SUSPENSION	28 DE JULIO DE 2023
ACTA DE REINICIO	22 DE AGOSTO DE 2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN DEL ADICIONAL Nº 1	24 DE AGOSTO DE 2023
OTROSI Nº 2	19 DE DICIEMBRE DE 2023
OTROSI Nº 3	24 DE JUNIO DE 2024
OTROSI Nº 4	11 DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR DESIGNADO CAM	LEONEL FERNANDO OBREGON - Profesional Especializado SGA
SUPERVISOR DESIGNADO ALCALDIA	KATERIN JULIETH TOVAR GARCIA
PERIODO EJECUTADO	DEL 11 AB(03) HASTA EL 30/12/2024

2. INFORMACION FINANCIERA

Valor del convenio interadministrativo 156 de 2023

Aporte de la Alcaldía	SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($64.444.684) MCTE.

Proyectó: Katerin Julieth Tovar Garcia	Revisó: Katerin Julieth Tovar Garcia	Aprobó: Katerin Julieth Tovar Garcia
Cargo: Secretaria de Planeación	Cargo: Secretaria de Planeación	Cargo: Secretaria de Planeación

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
Dirección: Calle 5 No. 4-03 – Teléfono de contacto: (+57) 3187595542 – Correo: planeacion@tello-huila.gov.co


MUNICIPIO DE TELLO NIT. 891.180.127-0		FECHA EMISIÓN: 17/01/2024
CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		VERSIÓN: 02
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO: FO32-MA-84-05
		PÁGINA: 4 de 43

5. CUADRO DE AVANCE DE ACTIVIDADES

ITEM DE PAGO	CONDICIONES MODIFICADAS					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. de fecha		ACUMULADO	
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	**CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO**								
1.1	**REALIZAR OBRAS PRELIMINARES TANQUE SÉPTICO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO**								
1.1.1	TRAZADO SOBRE TERRENO	M2	499,98	$ 4.075,10	$ 2.037.468,00	369,98	$ 1.507.705,50	369,98	$ 1.507.705,50
1.1.2	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO COMÚN	M3	943,12	$ 27.297,60	$ 25.744.967,00	452,08	$ 12.340.562,52	452,08	$ 12.340.562,52
1.2	**CONSTRUCCIÓN TRAMPA DE GRASA**								
1.2.1	CONSTRUCCIÓN TRAMPA DE GRASA DE CONFORMIDAD CON PLANOS, CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES	UND	13	$ 381.914,00	$ 4.964.882,00	13,00	$ 4.964.882,00	13,00	$ 4.964.882,00
1.3	**CONSTRUCCIÓN TANQUE SÉPTICO Y FILTRO ANAERÓBICO FAFA**							0,00	$ -
1.3.1	CONSTRUCCIÓN TANQUE SÉPTICO DE CONFORMIDAD CON PLANOS, CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES.	UND	13	$2.315.778,00	$ 30.105.114,00	13,00	$ 30.105.114,00	13,00	$ 30.105.114,00


Proyectó: Katerin Julieth Tovar Garcia	Revisó: Katerin Julieth Tovar Garcia	Aprobó: Katerin Julieth Tovar Garcia
Cargo: Secretaria de Planeación	Cargo: Secretaria de Planeación	Cargo: Secretaria de Planeación


SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
Dirección: Calle 5 No. 4-03 – Teléfono de contacto: (+57) 3187595542 – Correo: planeacion@tello-huila.gov.co

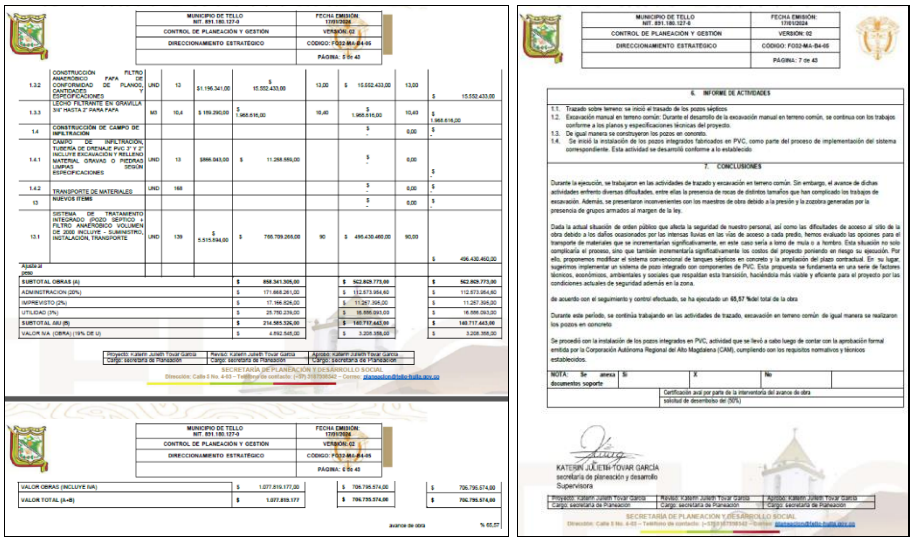

Informe supervisión municipio

- ✓ Con oficio de fecha 27 de diciembre el Municipio de Tello, solicita el tercer y último desembolso por valor de $303.772.138, equivalente al 33% de este giro; para un acumulado final del 93% de inversión del total de los recursos CAM. El municipio allega certificación de pago de seguridad social, informe de contratista de obra, informe de interventoría, informe de supervisión del municipio de Tello.

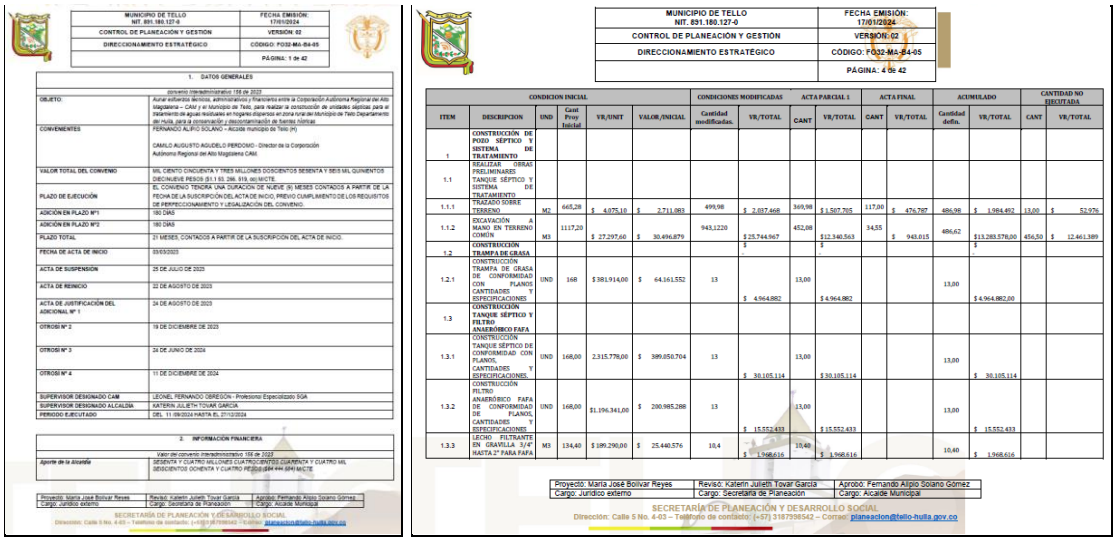

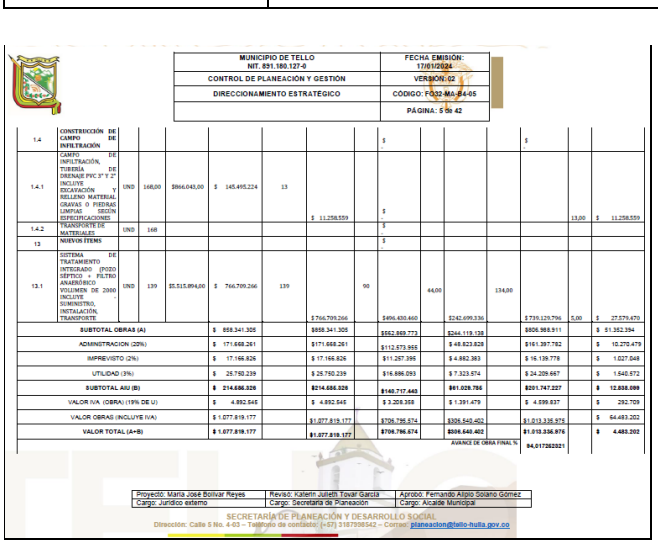

MUNICIPIO DE TELLO — NIT. 891.180.127-0 | FECHA EMISIÓN: 17/01/2024
CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | VERSIÓN: 02
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | CÓDIGO: F032-MA-84-05
PÁGINA: 5 de 42

1.4	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE INFILTRACIÓN								$ -				$ -		
1.4.1	CAMPO DE INFILTRACIÓN, TUBERÍA DE DRENAJE PVC 3" Y 2" INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO MATERIAL GRAVAS O PIEDRAS LIMPIAS SEGÚN ESPECIFICACIONES	UND	168,00	$866.043,00	$ 145.495.224	13	$ 11.258.559		$ -					13,00	$ 11.258.559
1.4.2	TRANSPORTE DE MATERIALES	UND	168						$ -						
13	NUEVOS ÍTEMS								$ -						
13.1	SISTEMA DE TRATAMIENTO INTEGRADO (POZO SÉPTICO + FILTRO ANAERÓBICO VOLUMEN DE 2000 INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE	UND	139	$5.515.894,00	$ 766.709.266	139	$ 766.709.266	90	$496.430.460	44,00	$242.699.336	134,00	$ 739.129.796	5,00	$ 27.579.470
SUBTOTAL OBRAS (A)					$ 858.341.305		$858.341.305		$562.869.773		$244.119.138		$806.988.911		$ 51.352.394
ADMINISTRACION (20%)					$ 171.668.261		$171.668.261		$112.573.955		$ 48.823.828		$161.397.782		$ 10.270.479
IMPREVISTO (2%)					$ 17.166.826		$ 17.166.826		$11.257.395		$ 4.882.383		$ 16.139.778		$ 1.027.048
UTILIDAD (3%)					$ 25.750.239		$ 25.750.239		$16.886.093		$ 7.323.574		$ 24.209.667		$ 1.540.572
SUBTOTAL AIU (B)					$ 214.586.326		$214.585.326		$140.717.443		$61.029.785		$201.747.227		$ 12.838.099
VALOR IVA (OBRA) (19% DE U)					$ 4.892.545		$ 4.892.545		$ 3.208.368		$ 1.391.479		$ 4.599.837		$ 292.709
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)					$ 1.077.819.177		$1.077.819.177		$706.796.574		$306.540.402		$1.013.336.975		$ 64.483.202
VALOR TOTAL (A+B)					$ 1.077.819.177		$1.077.819.177		$706.796.574		$306.540.402		$1.013.336.975		$ 4.483.202
									AVANCE DE OBRA FINAL %				94,017252321		

Proyectó: María José Bolívar Reyes — Cargo: Jurídico externo
Revisó: Katerin Julieth Tovar García — Cargo: Secretaria de Planeación
Aprobó: Fernando Alpio Solano Gómez — Cargo: Alcalde Municipal

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
Dirección: Calle 5 No. 4-03 – Teléfono de contacto: (+57) 3187596542 – Correo: planeacion@tello-huila.gov.co



MUNICIPIO DE TELLO — NIT. 891.180.127-0 | FECHA EMISIÓN: 17/01/2024
CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | VERSIÓN: 02
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | CÓDIGO: F032-MA-84-05
PÁGINA: 6 de 42

5. INFORME DE ACTIVIDADES

1.1. Trazado sobre terreno: se inició el trazado de los pozos sépticos
1.2. Excavación manual en terreno común. Durante el desarrollo de la excavación manual en terreno común, se continuo con los trabajos conforme a los planos y especificaciones técnicas del proyecto.
1.3. De igual manera se construyeron los pozos en concreto.
1.4. Se inició la instalación de los pozos integrados fabricados en PVC, como parte del proceso de implementación del sistema correspondiente. Esta actividad se desarrollo conforme a lo establecido

6. CONCLUSIONES

1.5. A pesar de los Múltiples retos enfrentados durante la ejecución del proyecto, se alcanzó satisfactoriamente el 100% de avance de la obra y financiero monto del 94, 94,017252321 cumpliendo con los objetivos establecidos y entregando una solución funcional a las comunidades beneficiadas


NOTA: De anexo documentos soporte	SI	X	NO
	Certificación Juez por parte de la interventoría del avance de obra		
	Solicitud de desembolso del (94,017252321%)		

KATERIN JULIETH TOVAR GARCÍA
secretaria de planeación y desarrollo
Supervisora

Proyectó: María José Bolívar Reyes — Cargo: Jurídico externo
Revisó: Katerin Julieth Tovar García — Cargo: Secretaria de Planeación
Aprobó: Fernando Alpio Solano Gómez — Cargo: Alcalde Municipal

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
Dirección: Calle 5 No. 4-03 – Teléfono de contacto: (+57) 3187596542 – Correo: planeacion@tello-huila.gov.co

Informe Final supervisión municipio

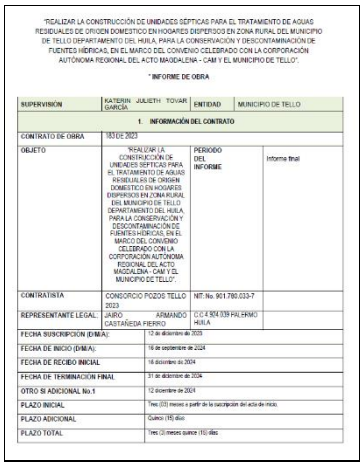

"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SÉPTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN DOMESTICO EN HOGARES DISPERSOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA, PARA LA CONSERVACION Y DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO CELEBRADO CON LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ACTO MAGDALENA - CAM Y EL MUNICIPIO DE TELLO".

" INFORME DE OBRA

SUPERVISIÓN	KATERIN JULIETH TOVAR GARCÍA	ENTIDAD	MUNICIPIO DE TELLO
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO DE OBRA	183 DE 2023		
OBJETO	"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SÉPTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN DOMESTICO EN HOGARES DISPERSOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA, PARA LA CONSERVACION Y DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO CELEBRADO CON LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ACTO MAGDALENA - CAM Y EL MUNICIPIO DE TELLO".	PERIODO DEL INFORME	Informe final
CONTRATISTA	CONSORCIO POZOS TELLO 2023	NIT. No. 901.780.033-7	
REPRESENTANTE LEGAL	JAIRO ARMANDO CASTAÑEDA FIERRO	C.C 4.904.039 PALERMO HUILA	
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	12 de diciembre de 2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	16 de septiembre de 2024		
FECHA DE RECIBO INICIAL	16 diciembre de 2024		
FECHA DE TERMINACION FINAL	31 de diciembre de 2024		
OTRO SI ADICIONAL No.1	12 diciembre de 2024		
PLAZO INICIAL	Tres (03) meses a partir de la suscripción del acta de inicio;		
PLAZO ADICIONAL	Cuatro (15) días		
PLAZO TOTAL	Tres (3) meses quince (15) días		


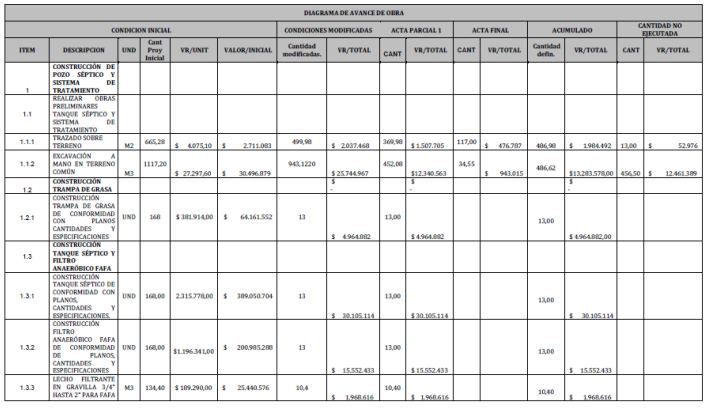


DIAGRAMA DE AVANCE DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICION INICIAL: Cant Proy Inicial	VR/UNIT	VALOR/INICIAL	CONDICIONES MODIFICADAS: Cantidad modificadas.	VR/TOTAL	ACTA PARCIAL 1: CANT	VR/TOTAL	ACTA FINAL: CANT	VR/TOTAL	ACUMULADO: Cantidad defin.	VR/TOTAL	CANTIDAD NO EJECUTADA: CANT	VR/TOTAL
1	CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO														
1.1	REALIZAR OBRAS PRELIMINARES TANQUE SÉPTICO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO														
1.1.1	TRAZADO SOBRE TERRENO	M2	665,28	$ 4.075,10	$ 2.711.083	499,90	$ 2.037.468	369,90	$ 1.507.705	117,00	$ 476.707	486,90	$ 1.984.492	13,00	$ 52.976
1.1.2	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO COMÚN	M3	1117,20	$ 27.297,60	$ 30.496.879	943,1220	$ 25.744.967	452,08	$12.340.563	34,55	$ 943.015	486,62	$13.283.578,00	456,50	$ 12.461.389
1.2	CONSTRUCCIÓN TRAMPA DE GRASA						$ -		$ -				$ -		
1.2.1	CONSTRUCCIÓN TRAMPA DE GRASA DE CONFORMIDAD CON PLANOS Y CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES	UND	168	$ 381.914,00	$ 64.161.552	13	$ 4.964.882	13,00	$ 4.964.882			13,00	$ 4.964.882,00		
1.3	CONSTRUCCIÓN TANQUE SÉPTICO Y FILTRO ANAERÓBICO FAFA														
1.3.1	CONSTRUCCIÓN TANQUE SÉPTICO DE CONFORMIDAD CON PLANOS, CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES	UND	168,00	2.315.770,00	$ 389.050.704	13	$ 30.105.114	13,00	$ 30.105.114			13,00	$ 30.105.114		
1.3.2	CONSTRUCCIÓN FILTRO ANAERÓBICO FAFA DE CONFORMIDAD DE PLANOS, CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES	UND	168,00	$1.196.341,00	$ 200.985.288	13	$ 15.552.433	13,00	$ 15.552.433			13,00	$ 15.552.433		
1.3.3	LECHO FILTRANTE EN GRAVILLA 3/4" HASTA 2" PARA FAFA	M3	134,40	$ 189.290,00	$ 25.440.576	10,4	$ 1.968.616	10,40	$ 1.968.616			10,40	$ 1.968.616		




1.4	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE INFILTRACIÓN								$ -				$ -		
1.4.1	CAMPO DE INFILTRACIÓN, TUBERÍA DE DRENAJE PVC 3" Y 2" INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO MATERIAL GRAVAS O PIEDRAS LIMPIAS SEGÚN ESPECIFICACIONES	UND	168,00	$866.043,00	$ 145.495.224	13	$ 11.258.559		$ -					13,00	$ 11.258.559
1.4.2	TRANSPORTE DE MATERIALES	UND	168						$ -						
13	NUEVOS ÍTEMS								$ -						
13.1	SISTEMA DE TRATAMIENTO INTEGRADO (POZO SÉPTICO + FILTRO ANAERÓBICO VOLUMEN DE 2000 INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE	UND	139	$5.515.894,00	$ 766.709.266	139	$ 766.709.266	90	$496.430.460	44,00	$242.699.336	134,00	$ 739.129.796	5,00	$ 27.579.470
SUBTOTAL OBRAS (A)					$ 858.341.305		$858.341.305		$562.869.773		$244.119.138		$806.988.911		$ 51.352.394
ADMINSTRACION (20%)					$ 171.668.261		$171.668.261		$112.573.955		$ 48.823.828		$161.397.782		$ 10.270.479
IMPREVISTO (2%)					$ 17.166.826		$ 17.166.826		$11.257.395		$ 4.882.383		$ 16.139.778		$ 1.027.048
UTILIDAD (3%)					$ 25.750.239		$ 25.750.239		$16.886.093		$ 7.323.574		$ 24.209.667		$ 1.540.572
SUBTOTAL AIU (B)					$ 214.586.326		$214.585.326		$140.717.443		$61.029.785		$201.747.227		$ 12.838.099
VALOR IVA (OBRA) (19% DE U)					$ 4.892.545		$ 4.892.545		$ 3.208.368		$ 1.391.479		$ 4.599.837		$ 292.709
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)					$ 1.077.819.177		$1.077.819.177		$706.796.574		$306.540.402		$1.013.336.975		$ 64.483.202
VALOR TOTAL (A+B)					$ 1.077.819.177		$1.077.819.177		$706.796.574		$306.540.402		$1.013.336.975		$ 4.483.202
									AVANCE DE OBRA FINAL %				94,017252321		

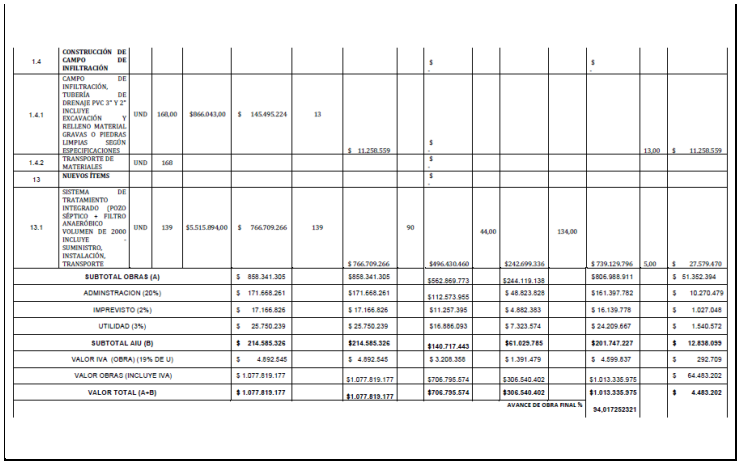

MARÍA ISABEL CARDOSO HERNÁNDEZ

JAIRO ARMANDO CASTAÑEDA FIERRO
Representante legal CONSORCIO POZOS TELLO 2023

Informe Final contratista de obra

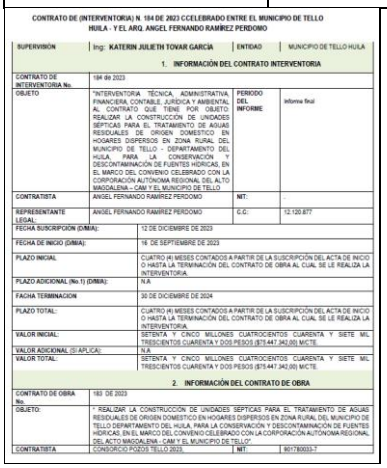

CONTRATO DE (INTERVENTORIA) N. 184 DE 2023 CCELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TELLO HUILA - Y EL ARQ. ANGEL FERNANDO RAMÍREZ PERDOMO


SUPERVISION	Ing: KATERIN JULIETH TOVAR GARCIA	ENTIDAD	MUNICIPIO DE TELLO HUILA

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	184 de 2023		
OBJETO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SÉPTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN DOMESTICO EN HOGARES DISPERSOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TELLO - DEPARTAMENTO DEL HUILA, PARA LA CONSERVACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO CELEBRADO CON LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM Y EL MUNICIPIO DE TELLO."	PERIODO DEL INFORME	Informe final
CONTRATISTA	ANGEL FERNANDO RAMÍREZ PERDOMO	NIT:	-
REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL FERNANDO RAMÍREZ PERDOMO	C.C:	12.120.877
FECHA SUSCRIPCION (D/M/A):	12 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	16 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA AL CUAL SE LE REALIZA LA INTERVENTORIA.		
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	N.A		
FACHA TERMINACION	30 DE DICIEMBRE DE 2024		
PLAZO TOTAL:	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA AL CUAL SE LE REALIZA LA INTERVENTORIA.		
VALOR INICIAL:	SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($75.447.342,00) M/CTE.		
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	N.A		
VALOR TOTAL:	SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($75.447.342,00) M/CTE.		

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.	183 DE 2023		
OBJETO:	" REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SÉPTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN DOMESTICO EN HOGARES DISPERSOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA, PARA LA CONSERVACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO CELEBRADO CON LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ACTO MAGDALENA - CAM Y EL MUNICIPIO DE TELLO"		
CONTRATISTA	CONSORCIO POZOS TELLO 2023.	NIT:	901780033-7

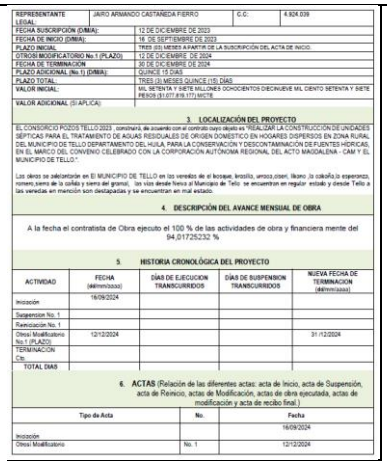

REPRESENTANTE LEGAL	JAIRO ARMANDO CASTAÑEDA FIERRO	C.C:	4.924.039
FECHA SUSCRIPCION (D/M/A):	12 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	16 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
OTROSI MODIFICATORIO No.1 (PLAZO)	12 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACION	30 DE DICIEMBRE DE 2024		
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	QUINCE 15 DIAS		
PLAZO TOTAL:	TRES (3) MESES QUINCE (15) DIAS		
VALOR INICIAL:	MIL SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS ($1.077.819.177) M/CTE		
VALOR ADICIONAL (SI APLICA)			

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

EL CONSORCIO POZOS TELLO 2023 , comunará, de acuerdo con el contrato cuyo objeto es "REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SÉPTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN DOMESTICO EN HOGARES DISPERSOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA, PARA LA CONSERVACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO CELEBRADO CON LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ACTO MAGDALENA - CAM Y EL MUNICIPIO DE TELLO".

Las obras se ejecutarán en El MUNICIPIO DE TELLO en las veredas de el bosque, brasilia, arroca,coser, lisono ,la cabaña,la esperanza, romero,sierra de la cañada y sierra del granizal, las vías desde Neiva al Municipio de Tello se encuentran en regular estado y desde Tello a las veredas en mención son destapadas y se encuentran en mal estado.

4. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA


A la fecha el contratista de Obra ejecuto el 100 % de las actividades de obra y financiera mente del 94,01725232 %

5. HISTORIA CRONOLÓGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Inicación	16/09/2024			
Suspencion No. 1				
Reinicación No. 1				
Otrosi Modificatorio No.1 PLAZO	12/12/2024			31 /12/2024
TERMINACION				
Cls				
TOTAL DIAS				


6. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
Inicación		16/09/2024
Otrosi Modificatorio	No. 1	12/12/2024

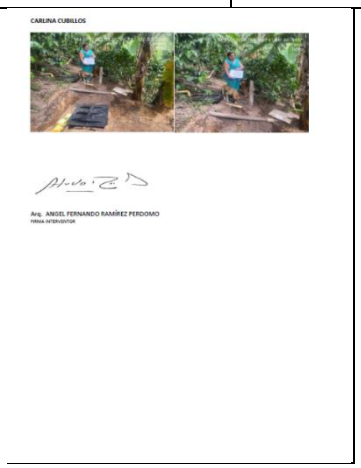

CARLINA CUBILLOS

Arq. ANGEL FERNANDO RAMÍREZ PERDOMO
OBRA INTERVENTOR

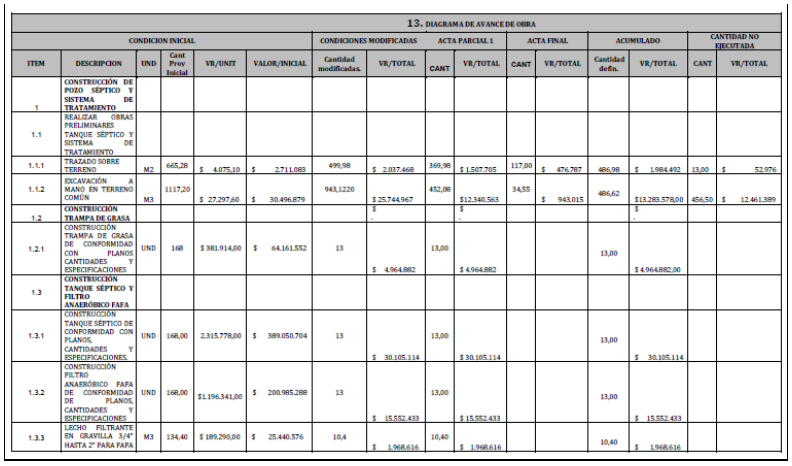

13. DIAGRAMA DE AVANCE DE OBRA

		CONDICION INICIAL				CONDICIONES MODIFICADAS	ACTA PARCIAL 1		ACTA FINAL		ACUMULADO		CANTIDAD NO EJECUTADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	Cant Proy Inicial	VR/UNIT	VALOR/INICIAL	Cantidad modificadas.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	Cantidad defin.	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
1	**CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO**														
1.1	REALIZAR OBRAS PRELIMINARES TANQUE SÉPTICO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO														
1.1.1	TRAZADO SOBRE TERRENO	M2	665,28	$ 4.075,10	$ 2.711.083	499,98	$ 2.037.468	369,98	$ 1.507.705	117,00	$ 476.787	486,98	$ 1.984.492	13,00	$ 52.976
1.1.2	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO COMÚN	M3	1117,20	$ 27.297,60	$ 30.496.879	943,1220	$ 25.744.967	452,88	$12.340.563	34,55	$ 943.015	486,62	$13.283.578,00	456,50	$ 12.461.389
1.2	**CONSTRUCCIÓN TRAMPA DE GRASA**						$ -		$ -				$ -		
1.2.1	CONSTRUCCIÓN TRAMPA DE GRASA DE CONFORMIDAD CON PLANOS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES	UND	168	$ 381.914,00	$ 64.161.552	13	$ 4.964.882	13,00	$ 4.964.882			13,00	$ 4.964.882,00		
1.3	**CONSTRUCCIÓN TANQUE SÉPTICO Y FILTRO ANAERÓBICO FAFA**														
1.3.1	CONSTRUCCIÓN TANQUE SÉPTICO DE CONFORMIDAD CON PLANOS, CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES	UND	168,00	2.315.778,00	$ 389.050.704	13	$ 30.105.114	13,00	$ 30.105.114			13,00	$ 30.105.114		
1.3.2	CONSTRUCCIÓN FILTRO ANAERÓBICO FAFA DE CONFORMIDAD DE PLANOS, CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES	UND	168,00	$1.196.341,00	$ 200.985.288	13	$ 15.552.433	13,00	$ 15.552.433			13,00	$ 15.552.433		
1.3.3	LECHO FILTRANTE EN GRAVILLA 3/4" HASTA 2" PARA FAFA	M3	134,40	$ 189.290,00	$ 25.440.576	10,4	$ 1.968.616	10,40	$ 1.968.616			10,40	$ 1.968.616		
1.4	**CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE INFILTRACIÓN**						$ -		$ -				$ -		
1.4.1	CAMPO DE INFILTRACIÓN, TUBERÍA DE DRENAJE PVC 3" Y 2" INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO MATERIAL GRAVAS O PIEDRAS LIMPIAS SEGÚN ESPECIFICACIONES	UND	168,00	$866.043,00	$ 145.495.224	13	$ 11.258.559		$ -					13,00	$ 11.258.559
1.4.2	TRANSPORTE DE MATERIALES	UND	168						$ -						
13	**NUEVOS ÍTEMS**								$ -						
13.1	SISTEMA DE TRATAMIENTO INTEGRADO (POZO SÉPTICO + FILTRO ANAERÓBICO VOLUMEN DE 2000 INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE	UND	139	$5.515.894,00	$ 766.709.266	139	$ 766.709.266	90	$496.430.460	44,00	$242.699.336	134,00	$ 739.129.796	5,00	$ 27.579.470
SUBTOTAL OBRAS (A)					$ 858.341.305		$858.341.305		$562.869.773		$244.119.138		$806.988.911		$ 51.352.394
ADMINISTRACION (20%)					$ 171.668.261		$171.668.261		$112.573.955		$ 48.823.828		$161.397.782		$ 10.270.479
IMPREVISTO (2%)					$ 17.166.826		$ 17.166.826		$11.257.395		$ 4.882.383		$ 16.139.778		$ 1.027.048
UTILIDAD (3%)					$ 25.750.239		$ 25.750.239		$16.886.093		$ 7.323.574		$ 24.209.667		$ 1.540.572
SUBTOTAL AIU (B)					$ 214.586.326		$214.586.326		$140.717.443		$61.029.786		$201.747.227		$ 12.838.099
VALOR IVA (OBRA) (19% DE U)					$ 4.892.545		$ 4.892.545		$ 3.208.358		$ 1.391.479		$ 4.599.837		$ 292.709
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)					$ 1.077.819.177		$1.077.819.177		$706.796.574		$306.540.402		$1.013.336.976		$ 64.483.202
VALOR TOTAL (A+B)					$ 1.077.819.177		$1.077.819.177		$706.796.574		$306.540.402		$1.013.336.976		$ 4.483.202
												AVANCE DE OBRA FINAL %	$4,017262321		

Informe Final interventoría

III. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN FÍSICA
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO DE TELLO (Ejecutor):

ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Etapa de Legalización	100%	Se cumplió con la suscripción del convenio 156 de 2023, acta de inicio de fecha 3 de marzo de 2023, acta suspensión de fecha 25 de julio de 2023, acta de reinicio de fecha 22 de agosto de 2023, y Otrosí No.1 de fecha 5 de septiembre de 2023; lo anterior, motivó la siguiente etapa pre-contractual con la publicación del proceso LP-0002-2023
Etapa pre-contractual	100%	El proceso LP-0002-2023 se publicó en la plataforma SECOP y terminó con la adjudicación del contrato de obra 183 de 2023, suscrito con el CONSORCIO POZOS TELLO 2023 con NIT.901.780.033-7 representado legalmente por el Ing. Jairo Armando Castañeda Fierro, por valor de $1.077.819.177. El proceso de concurso de méritos abierto CM-003-2023 se publicó en la plataforma SECOP y terminó con la adjudicación del contrato de interventoría 184 de 2023, suscrito con el señor ANGEL FERNANDO RAMIREZ PERDOMO identificado con CC.12.120.877 por valor de $75.447.342. Se suscribió el Adicional No.2 con fecha 19 de diciembre de 2023, donde se adiciona seis (6) meses en plazo al convenio interadministrativo 156 de 2023.
Etapa contractual	100%	Se suscribió el convenio 156 de 2023 acta de inicio de fecha 3 de marzo de 2023 acta suspensión de fecha 25 de julio de 2023 acta de reinicio de fecha 22 de agosto de 2023 proceso LP-0002-2023 Otrosí No.1 de fecha 5 de septiembre de 2023 (adiciona recursos del municipio) Otrosí No.2 de fecha 19 de diciembre de 2023 (adiciona 6 meses) Otrosí No.3 de fecha 24 de junio de 2024 (adiciona 6 meses) Otrosí No.4 de fecha 11 de diciembre de 2024 (modifica numeral 7 de la cláusula segunda convenio 156 de 2023)
Etapa de ejecución	94,41%	Municipio de Tello remite informe de supervisión, con anexo del informe de obra e informe de interventoría del avance final del proyecto (ejecutados en total 147 sistemas sépticos)
Etapa de seguimiento	100%	Se participo de comités técnicos de seguimiento al convenio, y oficios de solicitud de información del avance del proyecto. Se programará un seguimiento durante la vigencia 2025 a las obras físicas ejecutadas por el municipio con recursos CAM.

ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Informe de ejecución física y financiera – recibo final	94,41%	El municipio de Tello reporta en su informe final de supervisión una ejecución física total de obra del 94,017%. La ejecución financiera de los recursos CAM: Se hizo efectivo el 1 1/10/2023 primer desembolso de recursos CAM del 30% al convenio ($ 276.191.503) Se realizo el segundo 30% desembolso de recursos CAM al convenio el 26/12/2024 ($ 276.191.503) Se autoriza el trámite del tercer y último desembolso del 33% de los recursos CAM ($ 303.772.138) Saldo financiero de recursos CAM sin ejecutar – 7% ($ 64.444.684) La ejecución financiera del 100% de los recursos del Municipio para el contrato de obra: ($ 157.180.831)
Etapa de liquidación	0%	Para dar inicio la etapa de liquidación del convenio, el municipio como ejecutor debe liquidar el contrato de obra y de interventoría

IV. ANALISIS DE EJECUCION FINANCIERA

ACTIVIDAD O PRODUCTO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
CONSTRUCCION DE UNIDADES SEPTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN DOMESTICO EN HOGARES DISPERSOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA, PARA LA CONSERVACIÓN Y DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS	$1.077.819.177	$276.191.503	30%	Se realizó el primer desembolso de recursos CAM del 30% al convenio
		$276.191.503	30%	Se realizo el segundo desembolso 30% de recursos CAM al convenio
		$303.772.138	33%	Se autoriza el tercer y último desembolso 33% de recursos CAM al convenio, acorde con la ejecución reportada por el municipio de Tello
		$157.180.831	100%	Los recursos del municipio para ejecución del contrato de obra se invirtieron 100%. El Municipio de Tello suscribió el contrato de obra 183 de 2023 (Ejecución final física de obra 94,01%)
INTERVENTORIA (Recursos del Municipio de Tello)	$75.447.342	$75.447.342	100%	Contrato de interventoría 184 de 2023 - recursos del municipio
TOTAL RECURSOS DEL CONVENIO	**$1.153.266.519**	**$1.088.783.317**	**94,41%**	Del total de recursos del convenio (CAM + MPIO)
Saldo Sin Ejecutar de los recursos CAM		$64.483.202		Del total de los recursos CAM aportados para la ejecución física de la obra, se dejó de ejecutar por parte del municipio de Tello el 7%

A continuación, se presenta en mayor detalle los aportes para su ejecución financiera:

CONVENIO	
No. Convenio y fecha	156 del 24/02/2023
Aportes obra:	
CAM Tasa Retributiva	$920.638.346
Aportes interventoría:	
MUNICIPIO DE TELLO	$64.444.684
Aportes obra Otro si No.1:	
MUNICIPIO DE TELLO	$168.183.490

V. OTROS

CONCEPTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Constancia de pago al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión)	X		El municipio de Tello a través del secretario de hacienda certificó con fecha 20/09/2023 el cumplimiento de forma oportuna y completa con los pagos de seguridad social, para el primer desembolso 30% de los recursos CAM al convenio El Municipio de Tello mediante certificación suscrita por el señor alcalde y su contador, de fecha 17/12/2024, certifican que el ente territorial se encuentra a paz y salvo por concepto de seguridad social, para el segundo desembolso 30% de los recursos CAM al convenio. El Municipio de Tello mediante certificación suscrita por el señor alcalde y su contador, de fecha 20/12/2024, certifican que el ente territorial se encuentra a paz y salvo por concepto de seguridad social, para el tercer desembolso final 33% de los recursos CAM al convenio.
Modificación de garantías			
Cláusulas de responsabilidad Ambiental			
Cláusulas de responsabilidad en Seguridad y Salud en el trabajo			
Otros (Explicar)			

VI. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR (APLICA PARA INFORMES PARCIALES Y SOLO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA)

Calificación Promedio mínima aceptable 3,5

VALORACION DE LA CALIFICACION

- **De 1 a 3,5: No confiable**
- **De 3,6 a 4,5: Confiable**
- **De 4,6 a 5: Muy confiable**

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño técnico	3,5
Oportunidad en entrega	3,0
Cantidad entregada	3,0
Responsabilidad Ambiental	3,5
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el trabajo	3,5
PROMEDIO CALIFICACION	3,3

VII. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

La CAM en ejercicio de la supervisión correspondiente, remitió oficios, atendió y convocó a reuniones, para que se cumpliera con el objeto del convenio, así mismo prestó al municipio el apoyo institucional necesario y conforme a sus competencias para facilitar la ejecución del mismo.

Se realiza el presente informe de supervisión, para el seguimiento al cumplimiento del convenio, referente a la contratación y ejecución final de las obras del proyecto.

Atentamente,



LEONEL F OBREGON SALAZAR
Profesional Especializado
Supervisor CAM
