


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin
1						
2		**OBRAS BAÑOS DANE**	**71 días**	**$ 269.805.638,79**	**mar 17/12/24**	**mar 1/04/25**
3		LEGALIZACIÓN CONTRATO	7 días	$ 0,00	mar 17/12/24	vie 27/12/24
4		REVISIÓN DE DISEÑOS Y PLANIMETRIA	10 días	$ 0,00	vie 20/12/24	jue 9/01/25
5		CERRAMIENTO PROVISIONAL	4 días	$ 0,00	lun 30/12/24	mar 7/01/25
6		DESMONTE, LIMPIEZA Y EMBALAJE DE SANITARIO (INCLUYE DESCONEXIÓN Y RETIRO DE GRIFERÍAS CON TAPONAMIENTO PROVISIONAL DE	5 días	$ 729.810,00	jue 9/01/25	mié 15/01/25
7		DESMONTE, LIMPIEZA Y EMBALAJE DE ORINAL (INCLUYE DESCONEXIÓN Y RETIRO DE GRIFERÍAS CON TAPONAMIENTO PROVISIONAL DE PUNTOS HIDROSANITARIOS).	5 días	$ 171.720,00	jue 9/01/25	mié 15/01/25
8		DESMONTE, LIMPIEZA Y EMBALAJE DE LAVAMANOS (INCLUYE DESCONEXIÓN Y RETIRO DE GRIFERÍAS CON TAPONAMIENTO PROVISIONAL DE PUNTOS HIDROSANITARIOS).	5 días	$ 42.930,00	jue 9/01/25	mié 15/01/25
9		DEMOLICIÓN DE MESÓN EN GRANITO FUNDIDO (INCLUYE DESCONEXIÓN Y RETIRO DE GRIFERÍAS CON TAPONAMIENTO PROVISIONAL DE PUNTOS HIDROSANITARIOS DESMONTE DE LAVAMANOS CERÁMICOS EMPOTRADOS, DEMOLICIÓN DEL GRANITO, , DEMOLICIÓN DE BASES O	7 días	$ 1.770.624,00	jue 9/01/25	vie 17/01/25
10		DEMOLICIÓN DE ENCHAPES EN MUROS DE BAÑOS (INCLUYE RETIRO DEL ESCOMBRO Y DISPOSICIÓN FINAL A BOTADERO AUTORIZADO).	12 días	$ 4.859.676,00	lun 13/01/25	mar 28/01/25

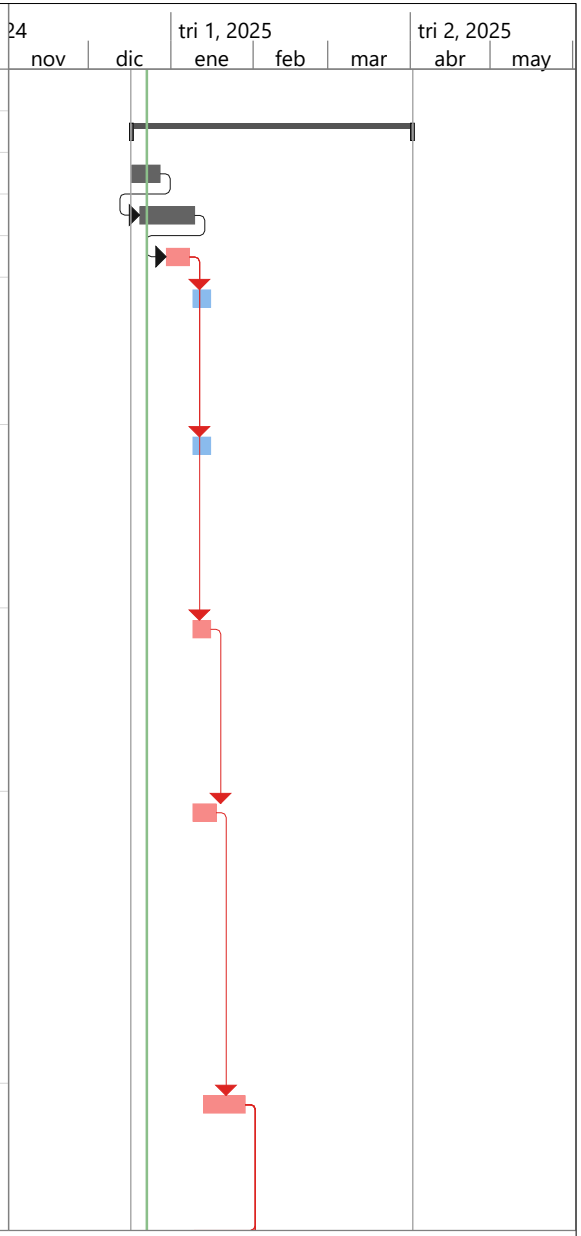


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin
11		DEMOLICIÓN DE ENCHAPES DE PISOS DE BAÑOS (INCLUYE RETIRO DEL ESCOMBRO Y DISPOSICIÓN FINAL A BOTADERO AUTORIZADO).	10 días	$ 2.346.267,60	mié 15/01/25	mar 28/01/25
12		DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBAS (INCLUYE RETIRO DEL ESCOMBRO Y DISPOSICIÓN FINAL A BOTADERO AUTORIZADO).	10 días	$ 317.300,40	mié 15/01/25	mar 28/01/25
13		AFINADO DE MUROS CON PAÑETE 1:4. INCLUYE DILATACIONES, FILOS Y	10 días	$ 7.127.524,80	mié 29/01/25	mar 11/02/25
14		AFINADO Y NIVELACIÓN DE PISO CON MORTERO 1:4 (INCLUYE PLANTILLAS Y REPLANTEO DE NIVELES EN SITIO).	10 días	$ 3.441.192,48	mié 29/01/25	mar 11/02/25
15		CAMBIO DE VÁLVULA DE CORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO BOLA EN PVC DE 1 y un cuarto de pulgada(INCLUYE TAPA REGISTRO EN ACERO INOXIDABLE 20X20, DESMONTE DEL REGISTRO EXISTENTE, ACCESORIOS DE CONEXIÓN EN PVC Y TODO LO NECESARIO PARA	10 días	$ 1.240.200,00	mié 29/01/25	mar 11/02/25
16		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA MUROS EN PORCELANATO NACIONAL TIPO GRAN FORMATO DE 0.60X1.20M RECTIFICADO, COLOR Y TEXTURA A	30 días	$ 34.017.732,00	mié 18/12/24	mar 4/02/25
17		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PISOS EN PORCELANATO NACIONAL TIPO GRAN FORMATO DE 0.60X1.20M RECTIFICADO, ANTIDESLIZANTE, COLOR A ELECCIÓN DE LA ENTIDAD, PARA PISO	40 días	$ 16.423.873,20	vie 27/12/24	mar 25/02/25

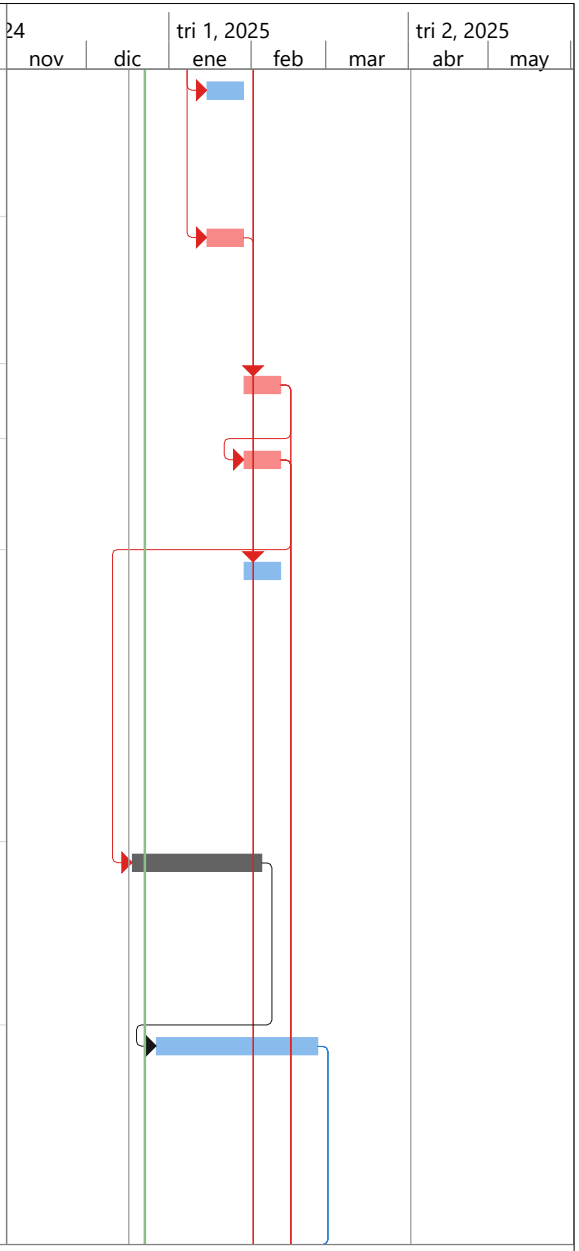


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin
18		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA PARA MUROS EN PORCELANATO NACIONAL TIPO GRAN FORMATO DE 0.10X1.20M RECTIFICADO, ANTIDESLIZANTE, COLOR A ELECCIÓN DE LA ENTIDAD, PARA PISO (INCLUYE BOQUILLA Y LIMPIEZA FINAL).	40 días	$ 499.748,13	mié 5/02/25	mar 1/04/25
19		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CUADRADA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE ANTI-OLORES.	15 días	$ 572.400,00	mié 12/02/25	mar 4/03/25
20		RESANE DE IMPERFECCIONES CON ESTUCO PLÁSTICO, LIJADO Y PINTADO DE MUROS CON PINTURA TIPO ACRÍLICA ALTA ASEPSIA. COLOR	20 días	$ 414.990,00	vie 7/02/25	jue 6/03/25
21		RESANE DE IMPERFECCIONES CON ESTUCO PLÁSTICO, LIJADO Y PINTADO DE CIELO RASO CON PINTURA TIPO ACRÍLICA ALTA ASEPSIA. COLOR	20 días	$ 2.268.058,68	vie 7/02/25	jue 6/03/25
22		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE 20 (INCLUYE DESMONTE PRELIMINAR DE LAS DIVISIONES EXISTENTES, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL A BOTADERO AUTORIZADO).	39 días	$ 44.299.514,70	mié 15/01/25	lun 10/03/25
23		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPISA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE 20 DE 0.25X0.50CM.	25 días	$ 877.680,00	mié 5/02/25	mar 11/03/25
24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 TERMINADA EN U DE 0.60CM (INCLUYE ANCLAJE Y FIJACIÓN MEDIANTE CHAZO Y	15 días	$ 496.080,00	mar 25/02/25	lun 17/03/25

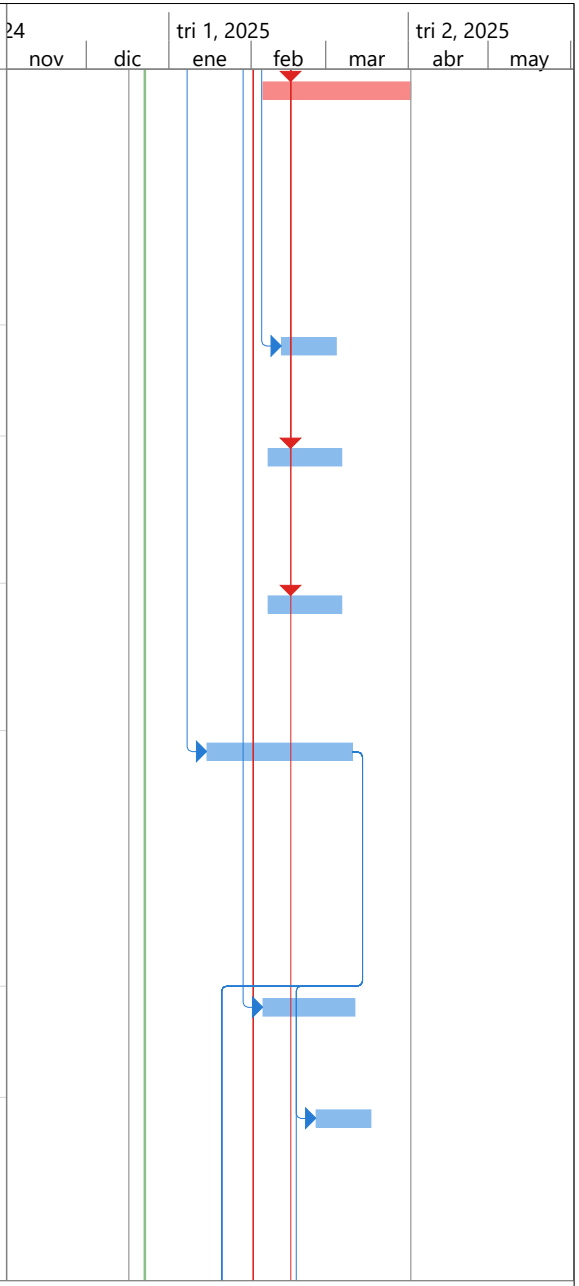

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin
25		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 36 PULGADAS (INCLUYE ANCLAJE Y FIJACIÓN MEDIANTE CHAZO	15 días	$ 381.600,00	mar 25/02/25	lun 17/03/25
26		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO NACIONAL ALONGADO A PISO TIPO INSTITUCIONAL, CON SISTEMA DE CONEXIÓN ANTIVANDÁLICA (ENTRADA POSTERIOR), CON ASIENTO DE ARO	40 días	$ 16.790.400,00	mar 28/01/25	lun 24/03/25
27		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO PARA SANITARIO DE SENSOR CON CAPACIDAD DE DESCARGA DE ALTA EFICIENCIA, CON ESCUDO CROMADO. (INCLUYE REGULADOR DE PRESIÓN, TRASFORMADOR PARA FUENTE DE ENERGÍA CABLEADA Y RESPALDO CON 4	40 días	$ 58.003.200,00	mar 28/01/25	lun 24/03/25
28		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO PARA ORINAL DE SENSOR CON CAPACIDAD DE DESCARGA DE ALTA EFICIENCIA, CON ESCUDO CROMADO. (INCLUYE REGULADOR DE PRESIÓN, TRASFORMADOR PARA FUENTE DE ENERGÍA CABLEADA Y RESPALDO CON 4	40 días	$ 4.579.200,00	mar 28/01/25	lun 24/03/25
29		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS NACIONAL TIPO INSTITUCIONAL PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS (INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE INFERIOR PARA ANCLAJE A MURO, SISTEMA DE DESAGÜE SENCILLO SIN REBOSE CON SIFÓN TIPO BOTELLA COMPLETO Y CONEXIÓN A PUNTO DE DESAGÜE).	40 días	$ 954.000,00	mar 28/01/25	lun 24/03/25

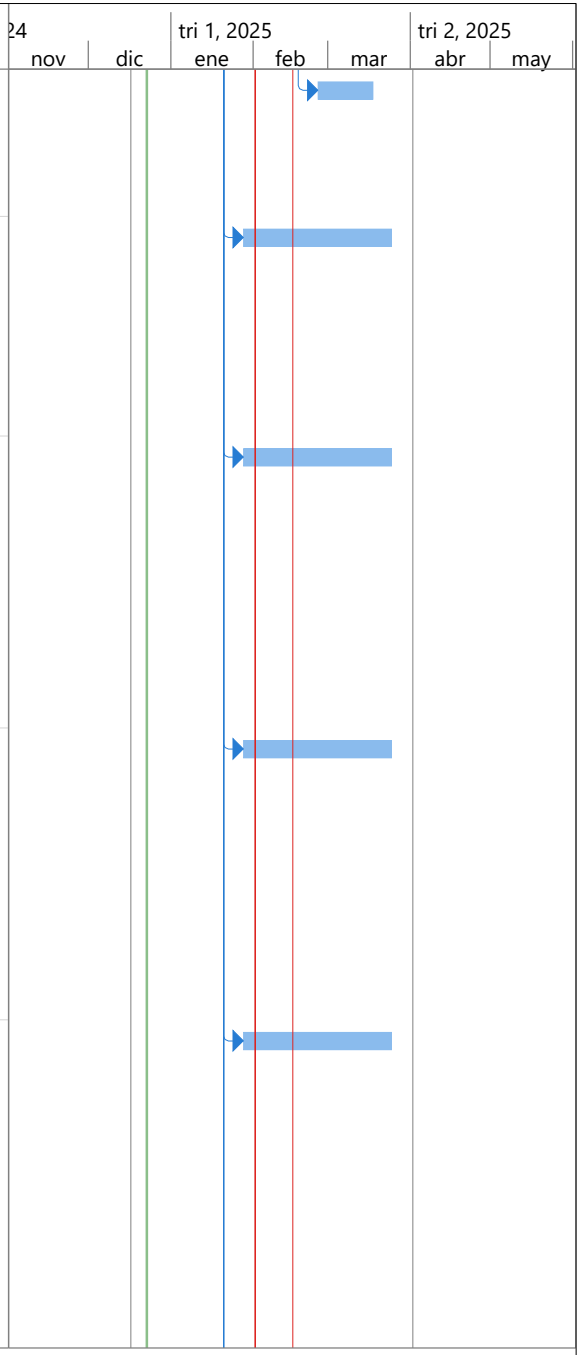

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin
30		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN GRANITO NEGRO SAN GABRIEL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE REFUERZOS INFERIORES EN ESTRUCTURA METÁLICA, PERFORACIONES PARA GRIFERÍAS Y DESAGÜES, SISTEMA DE DESAGÜE SENCILLO SIN REBOSE CON SIFÓN TIPO	20 días	$ 12.173.040,00	mié 12/02/25	mar 11/03/25
31		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE DE SENSOR (INCLUYE MANGUERA, CAJA DE CONTROL,	40 días	$ 14.882.400,00	mar 28/01/25	lun 24/03/25
32		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN PARA LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE CON SENSOR OPERADO POR BATERÍAS.	40 días	$ 7.357.248,00	mar 28/01/25	lun 24/03/25
33		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANOS AUTOMÁTICO EN ACERO INOXIDABLE CONECTADO A PUNTO ELÉCTRICO (INCLUYE SISTEMA DE FILTRO HEPA).	40 días	$ 4.770.000,00	mar 28/01/25	lun 24/03/25
34		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO FLOTADO DE 5MM BISELADO DE 2CM.	20 días	$ 4.023.208,80	mar 4/03/25	lun 31/03/25
35		SALIDA ELÉCTRICA PARA CONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS DESDE LA SALIDA ELÉCTRICA MÁS CERCANA. (INCLUYE CAJA, CABLE 3X12, TUBERÍA EMPOTRADA DE PVC, APERTURA Y SELLADO DE LA REGATA	30 días	$ 3.730.140,00	mié 29/01/25	mar 11/03/25
36		SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA DESDE LA SALIDA DE ILUMINACIÓN MÁS CERCANA. (INCLUYE CAJA, CABLE 3X12, TUBERÍA EMT DE 1/2" CON ANCLAJES Y TODOS LOS ELEMENTOS	30 días	$ 1.488.240,00	mié 29/01/25	mar 11/03/25

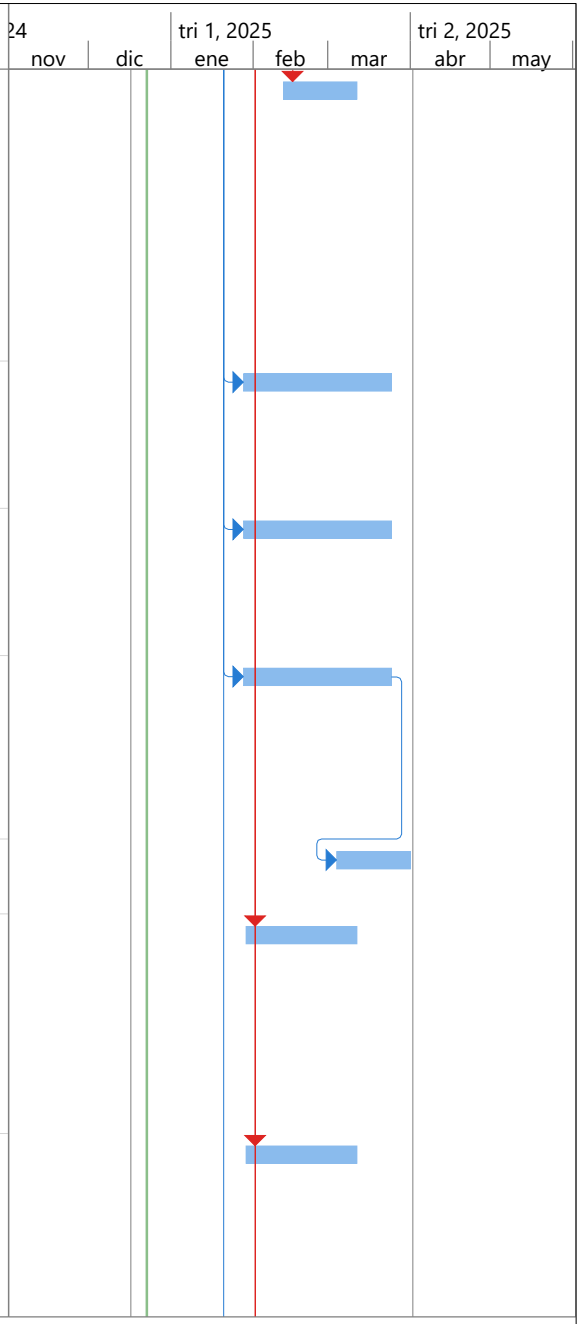

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin
37			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 12W LUZ BLANCA (DEBE CUMPLIR NORMA RETILAP)	30 días	$ 1.908.000,00	mié 29/01/25	mar 11/03/25
38			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE OLORES DE 22CM CON DAMPER (INCLUYE DESINSTALACIÓN, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL EXTRACTOR EXISTENTE A BOTADERO AUTORIZADO)	30 días	$ 973.080,00	mié 29/01/25	mar 11/03/25
39			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO AJUSTABLE PARA ENCENDIDO DE ILUMINACIÓN (DEBE CUMPLIR NORMA RETIE)	45 días	$ 1.297.440,00	mié 29/01/25	mar 1/04/25
40			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO GFCI (INCLUYE DESMONTE DE APARATO EXISTENTE, DEBE CUMPLIR NORMA RETIE)	30 días	$ 457.920,00	mié 29/01/25	mar 11/03/25
41			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO PARA ORINAL DE SENSOR CON CAPACIDAD DE DESCARGA DE ALTA EFICIENCIA, CON ESCUDO CROMADO. (INCLUYE REGULADOR DE PRESIÓN, TRASFORMADOR PARA FUENTE DE ENERGÍA CABLEADA Y RESPALDO CON 4	40 días	$ 14.119.200,00	mar 28/01/25	lun 24/03/25

