LIBRO #1
Bitacora de obra

Contratista de obra: Union temporal MR-6

Objeto: "Mantenimiento y mejoramiento de las Vias Rurales mediante la construcción de Placa huellas En el Municipio de chiquinquira, Boyacá, en el marco del Programa Colombia Rural"

Contrato de obra: Publica Nb. 2023-215

Contratante de Interventoria: Consorcio VT Boyacá

Objeto: "Interventoria técnica, administrativa, Financiera y Ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de las Vias Rurales mediante la construcción de placa Huellas en el Municipio de chiquinquira, Boyacá en el marco del programa colombia Rural"

EPP


Contrato de Interventoria: Nb. 1664 de 2022

Contratante: Municipio de chiquinquira.

Maria Alejandra Norato

Supervisora

Fecha de Inicio: 13/07/2023

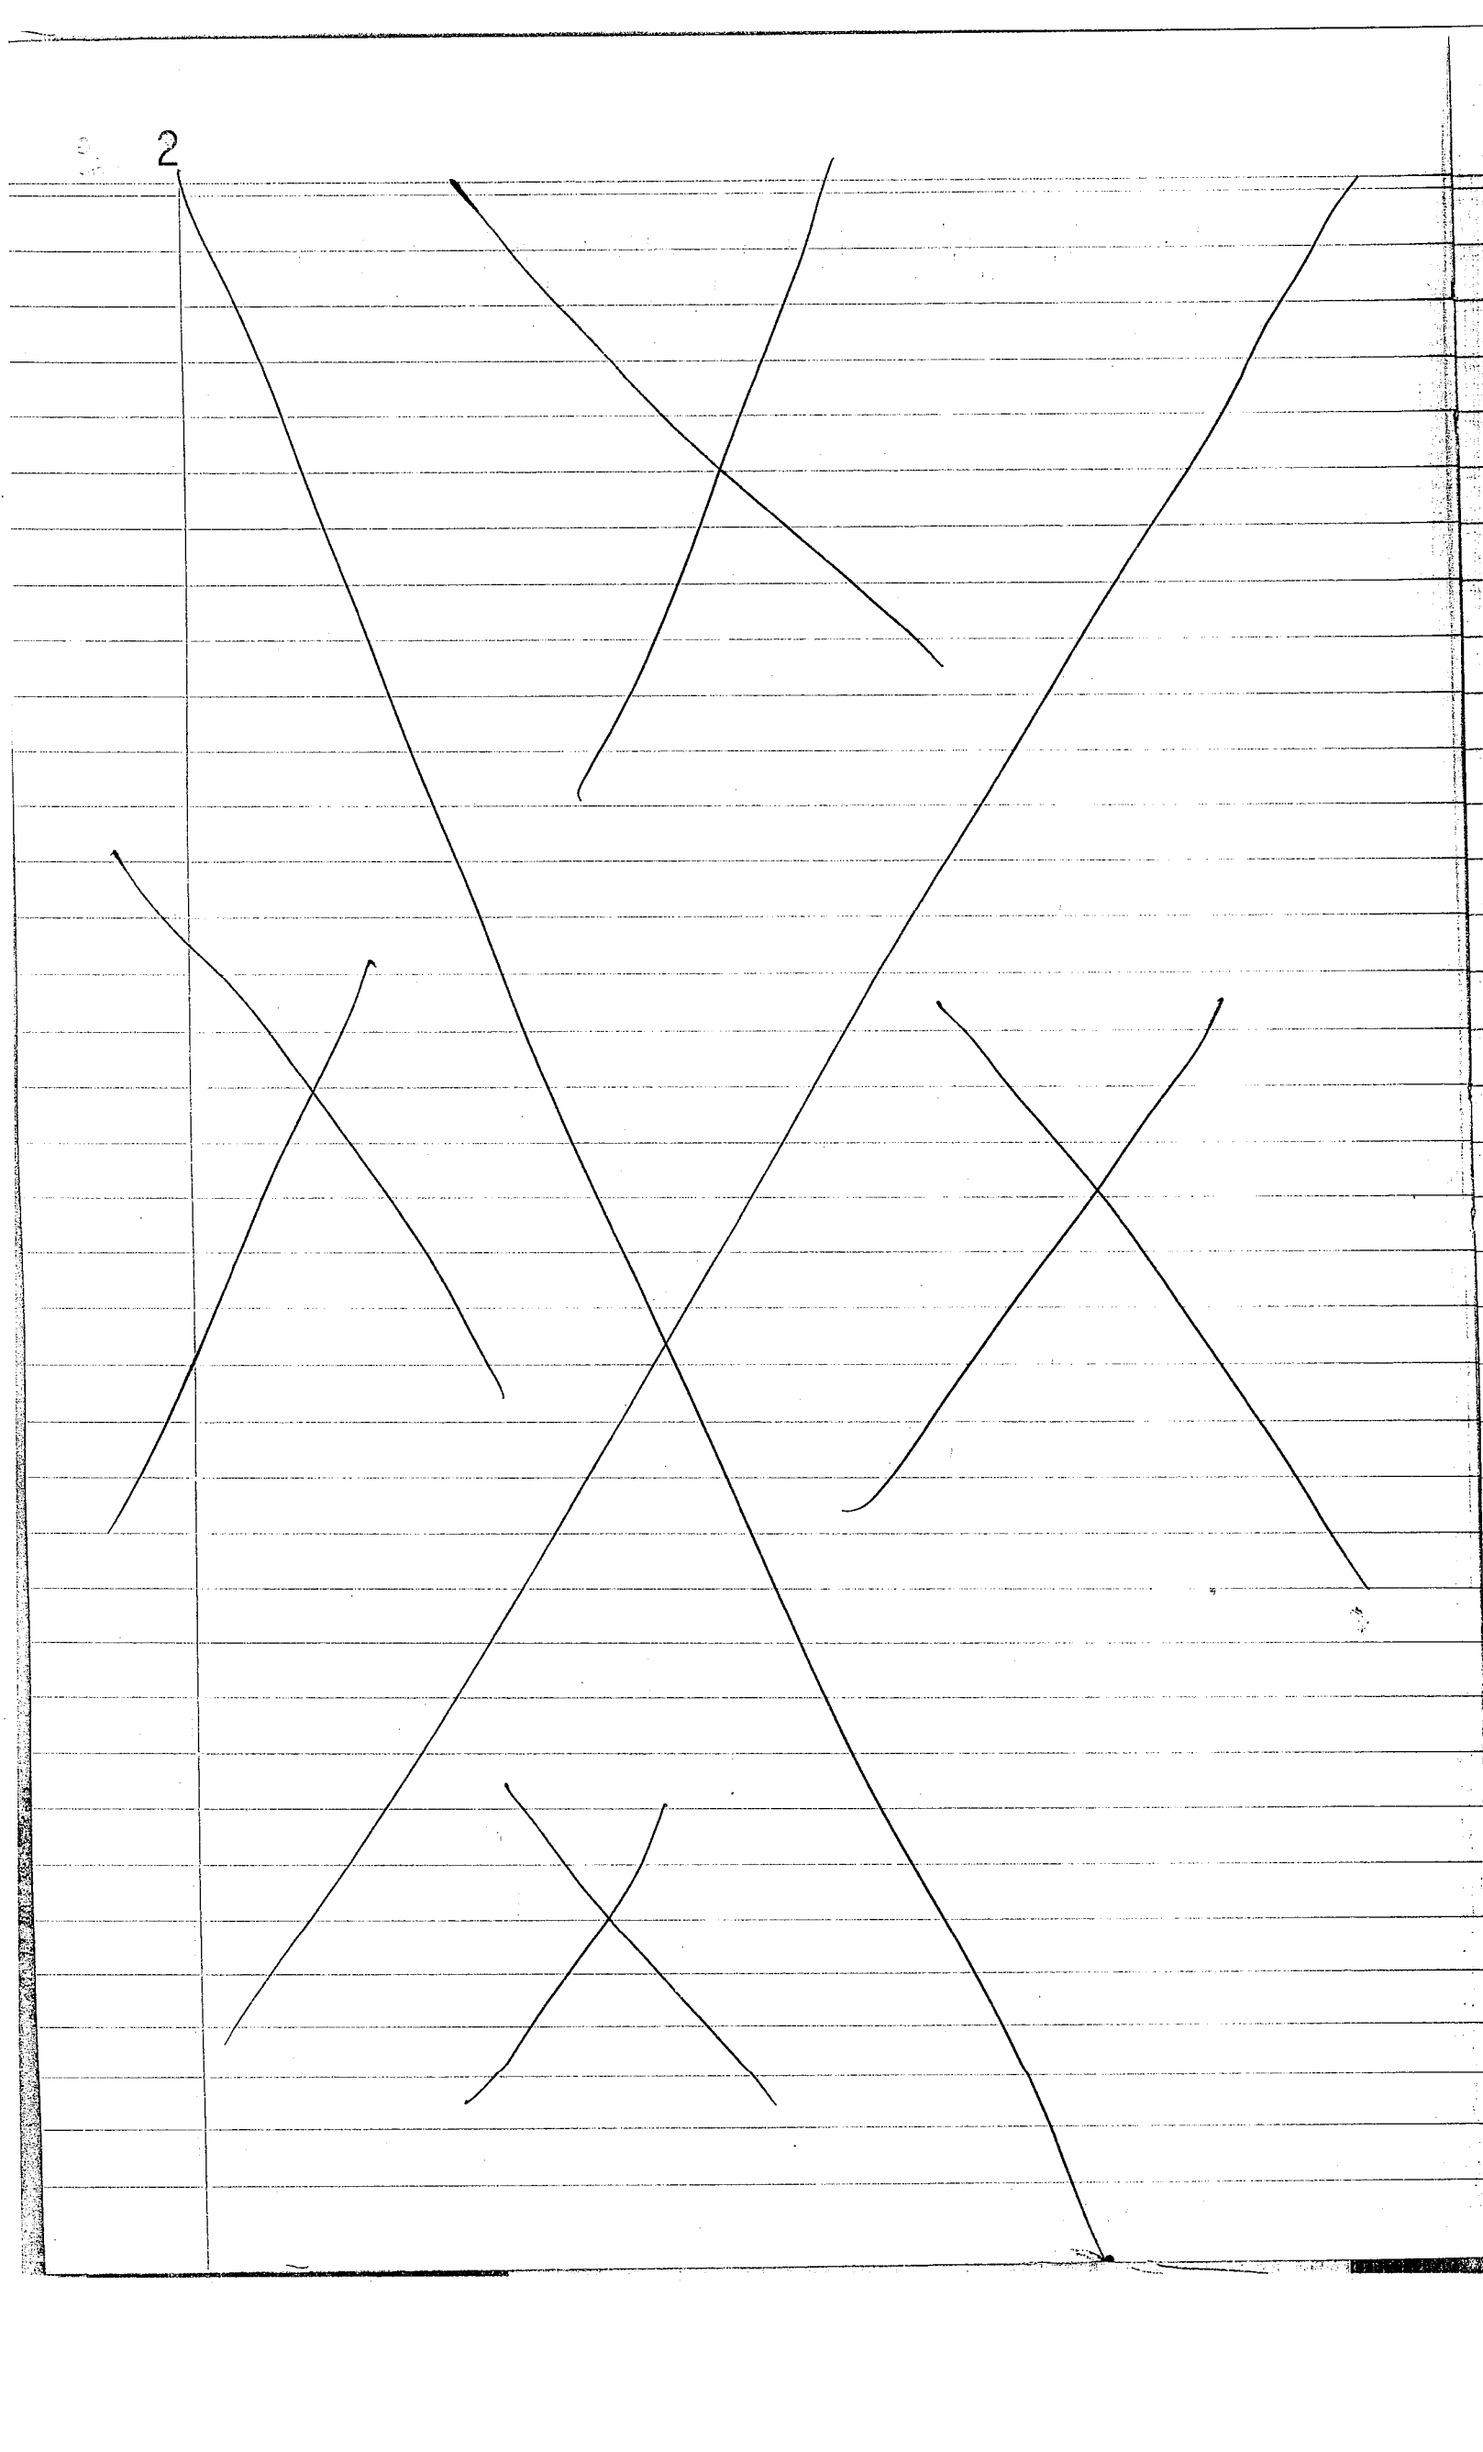

Mayo 23 de 2024 - Jueves
chiquinquira, Boyacá
tramo: Varela.
clima:
Personal de Interventoria: Residente, Profesional sst, Inspector de obra
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: Madera piedra filtro, tuberia perforada, geotextil.
Maquinaria: Retroexcavadora.
Actividades: Se realiza la localización y replanteo de la via a intervenir, con cotación topografica, de acuerdo a los diseños aprobados.
- Se inicia la construcción del filtro en las abscisas Kot000 - Kot085, con el apoyo de la retroexcavadora tipo Pajarita, se realiza excavación con una profundidad de un metro y ancho de 0,6m.
- Se instala geotextil tipo 2.500 no tejido, se instala la tuberia para filtro PVC perforada diametro 100mm y se rellena con material granular drenante de Acuerdo a las especificaciones tecnicas.
- Se inicia la excavación del gavian abscisa Kot192 - Kot210.
- La interventoria solicita al Contratista el uso de los EPP

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

- Mayo 24 de 2024.
chiquinquira - Boyacá
tramo: Varela
clima:
Personal de Interventoria: Residente, Profesional SST, Inspector de obra
Persona: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: Madera, piedra filtro, tuberia perforada, geotxil
Maquinaria: Retroexcavadora
Actividades: Se continua con la construcción del filtro en la abscisa Kot192 Kot210.
- Se inicia a realizar la construcción de los gaviones de acuerdo a los diseños, en malla de alambre de acero entrelazado, en modulos de 1mt x 1mt x 1mt.

- La interventoria Solicita al Contratista dotar de los EPP a los trabajadores vinculados al proyecto

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

- Mayo 25 de 2024.
Chiquinquira - Boyacá
tramo: Varela
Clima:
Personal de Interventoria: Residente, Profesional sst, Inspector de obra
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes.
Material: madera, piedra filtro, tuberia perforada, geotextil, malla gavión
Piedra rayon.
Maquinaria: Retroexcavadora.
Actividades: Se continua la construcción del filtro en la abscisa Kot144 Kot215, con apoyo de una retroexcavadora tipo pajanta y el maestro de obra.
-Se continua con la construcción de los gaviones acorde a los diseños ubicado en la abscisa Kot192 - Kot210.
- Se realiza la demolición de la alcantarilla No.1
- Se Inicia con el figurado y amarre de acero para la alcantarilla No.1.

- La interventoria Solicita al Contratista hacer dotación de los EPP al personal vinculado al proyecto

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

- Mayo 26 de 2024. / Domingo
chiquinquira, Boyacá
trama: Varela
Clima:
Personal Interventoria: Residente, Profesional sst, Inspector de obra
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes
material: madera, piedra filtro, tuberia perforada, geotextil, malla gavión
piedra rayon, cemento, arena, grava.

Actividades: Se continua con la construcción de filtro en la abscisa Kot215-Kot300.
-Se continua con la construcción de los gaviones acorde a los diseños Ubicados en la abscisa Kot192-Kot210.
-Se realiza replanteo de la alcantarilla 1 Ubicadaen la abscisa Kot006 y se excava y se realiza la instalación de tubería y el solado de limpieza.
-Se continua con el figurado y amarre de acero para la alcantarilla No.1.
- La interventoria le informa al Contratista que para los Concretos de cajas de cuneta y estructuras de salida debe tomar cilindros de muestra del concreto

CONTRATISTA
-Mayo 27 de 2024.
Chiquinquira, Boyacá
Tramo: Varela.
Clima:
Personal de Interventoria: Residente, Profesional sst, Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: madera, piedra filtro, tubería perforada, geotextil, malla gavion piedra rajon, cemento, arena, grava.
Maquinaria: Retroexcavadora.
Actividades: Se continua con la construcción del filtro en la abscisa Kot345-Kot280.
-Se continua la construcción de los gaviones acorde a los diseños Ubicado en la abscisa Kot192-Kot210.
-Se realiza excavación del encole y descole de la alcantarilla, así mismo se funde el solado de la alcantarilla 1 Ubicado en la abscisa Kot006.
-Se realiza el rellano y compactación de la alcantarilla 1.
-Se continua con el figurado y amarre de acero para alcantarilla No.1.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Mayo 28 de 2024. / Martes
Chiquinquira - Boyacá
tramo: Varda.
clima:
Personal de Interventoria: Residente, Profesional SST, Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: Madera, piedra filtro, tubería perforada, geotextil, malla gavion piedra rajón, cemento, arena, grava.
Maquinaria: Retroexcavadora.
Actividades: Se finaliza la construcción del filtro en la abscisa Km 415 Km 509, en total se realizó 519ml del filtro, de acuerdo a los diseños y especificaciones técnicas.
- Se aplica una capa de Subbase por encima del filtro.
- Se continua con la construcción de los gaviones acorde a los diseños ubicados en la abscisa Km 142 - Km 240.
- Se amarra acero y se funde poceta en el encole y descole de la alcantarilla 1 Ubicada en la abscisa Km 006 y se inicia amarre de acero trasversal.
- Se realiza el relleno y compactación de la alcantarilla 1.
- Se continua con el figurado y amarre de acero para la alcantarilla No. 1.

CONTRATISTA

Antoliano Roj
INTERVENTORIA

Mayo 29 de 2024. / Miercoles
Chiquinquira - Boyacá
tramo: Varda
Clima:
Personal de Interventoria: Residente, Profesional SST, Inspector de obra
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudante.
Material: madera, piedra filtro, tubería perforada, geotextil, malla gavión, piedra rajon, cemento, arena, grava.
Maquinaria: Retroexcavadora

Actividades: Se finaliza construcción de los 117 m³ de gaviones acorde a los diseños en ubicado en la abscisa Km+192- Km+210.
-Se funde cuerpo de la alcantarilla No. 1.
- La interventoría solicita al Contratista el uso de Vibrador de Concreto

CONTRATISTA
INTERVENTORA

-Junio 24 de 2024. / Lunes
Chiquinquirá, Boyacá
Tramo: Varela.
Clima:
Personal de Interventoria: Residente, Profesional SST, Inspector de obra
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Maestro y ayudantes.
Material: madera, piedra filtro, tubería perforada, geotextil.
Maquinaria: Retroexcavadora.
Actividades: Se Realiza replanteo de las alcantarillas No.2 Km+220 y No. 3 Km+336.
-Se Realiza la demolición de la alcantarilla No.2 ubicada en la abscisa Km+220.
-Se Inicia con la excavación de la alcantarilla nueva No.3 Ubicada en la abscisa Km+336.
-Se realiza la instalación del solado de limpieza de la alcantarilla No. 3.
- La interventoría solicita al Contratista realizar un buen embaquillado de los tubos de 36" de las alcantarillas.

CONTRATISTA
INTERVENTORA

-Junio 25 de 2024. / Martes
Chiquinquirá, Boyacá
Tramo: Varela.
Clima:
Personal de Interventoria: Residente, profesional SST, Inspector de obra.

Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: madera, piedra filtro, tubería perforada, geotextil.
Maquinaria: Retroexcavadora.
Actividades: Se continua con la demolición y excavación de la alcantarilla existente No. 2 ubicada en la abscisa K0+220.
- Se continua con la excavación de la alcantarilla nueva No. 3 ubicada en la abscisa K0+336.
- Se realiza la instalación de la tubería para alcantarilla No. 3.
- Se inicia con el figurado y amarre de acero para las alcantarillas.
- La interventoría reitera en solicitar al contratista el uso de los EPP para los trabajadores en la obra

CONTRATISTA

Antolinez

INTERVENTORIA

- Junio 26 de 2024. / Miercoles.
Chiquinquirá, Boyacá
tramo: Varda
clima:
Personal de Interventoria: Residente, Profesional sst., Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: madera, piedra filtro, tubería perforada, geotextil
Maquinaria: Retroexcavadora.
Actividades: Se realiza la instalación de la tubería, relleno y compactación para la alcantarilla No. 2 ubicada en la abscisa K0+220.
- Se realiza amarre de acero y construcción del solado para la poceta y descole de la alcantarilla No. 2.
- Se realiza relleno y compactación de alcantarillado nueva No. 3 ubicada en la abscisa K0+336.
- Se realiza el amarre de acero y construcción del solado para la pocta y descole de alcantarillado No. 3
- Se continua con el figurado y amarre para las alcantarillas.

CONTRATISTA

Antolinez

INTERVENTORIA

Junio 27 de 2024 / Jueves.
Chiquinquirá, Boyacá
tramo: Varela.
clima:
Personal interventoría: Residente, profesional SST, Inspector de obra
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: madera, piedra filtro, tubería perforada, geotextil
Maquinaria: Retroexcavadora.
Actividades: Se realiza amarre de acero y fundida de las aletas y la poceta de la alcantarilla No. 2 Ubicada en la abscisa K0+220.
- Se realizan alindros.
- La interventoría solicita al contratista mantener la obra limpia de todo pegote de elementos de concreto, ya que estos están regados en la obra

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

Junio 28 de 2024. / Viernes
Chiquinquirá, Boyacá
tramo: Varela
clima:
Personal Interventoría: Residente, Profesional SST, Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: madera, piedra filtro, tubería perforada, geotextil
Maquinaria: Retroexcavadora.
Actividades: Se realiza el amarre de acero y fundida de las aletas y la poceta de la alcantarilla No. 3. Ubicada en la abscisa K0+336.
- Se realiza el replanteo de la vía y se inicia con conformación, extendida y compactación de la subbase.
- La interventoría solicita al contratista el uso obligatorio de los EPP para todos los trabajadores vinculados a la obra

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

Junio 29 de 2024. / Sabado
Chiquinquirá, Boyacá
tramo: Varda
Clima:
Personal Interventoría: Residente, Profesional sst, Inspector de obra
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: Subbase
Maquinaria: Retroexcavadora, Vibrocompactador, motoniveladora
Actividades: Se continua con la conformación extendida y compactación de la Subbase, en una longitud de 440 ml.
- La Interventoría Solicita al Contratista colocar tacos para controlar los espesores en la colocación de la Subbase granular

CONTRATISTA.

Contratismo Ltda
INTERVENTORIA

Junio 30 de 2024. / Domingo
Chiquinquirá, Boyacá
tramo: Varda
Clima:
Personal de Interventoria: Residente, Profesional sst, Inspector de obra
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes
material: Subbase.
Maquinaria: Vibrocompactador, motoniveladora.
Actividades: Se continua con la conformación extendida y compactación de la Subbase, en longitud 440ml, con apoyo de motoniveladora y Vibrocompactador.
- Debido a que la fecha de finalización de las obras es el 23 de septiembre y la incidencia de las lluvias en el Sector, el Contratista se ha visto obligado a laborar los domingos en este tramo.
- La Interventoría Solicita al contratista Hacer aseo en la obra.

CONTRATISTA

Contratismo Ltda
INTERVENTORIA

Julio 2 de 2024
Chiquinquirá, Boyacá
tramo: Varela.
Clima:
Profesional de Interventoria: Residente, Profesiona sst, Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes.
Material: Subbase.
Maquinaria: Vibrocompactadora, motoniveladora.
Actividades: Se continua con la conformación extendida y compactación de la subbase con apoyo de motoniveladora y vibrocompactador.
La interventoría recuerda al contratista hacer entrega de EPP al personal y sensibilizar respecto a su uso.

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

-Julio 3 de 2024.
Chiquinquirá, Boyacá
tramo: Varela.
Clima:
Profesional de Interventoria: Residente, Profesional sst, Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudante.
Material: Subbase
Maquinaria: Vibrocompactador, motoniveladora.
Actividades: Se termina la conformación extendida y compactación de la subbase.
- Se toman densidades en las abscisas Km0+0, Km0+200, Km0+260, Km0+320.
- Se inicia el encofrado de los modelos de placa huella, para la fundida de las secciones de concreto ciclopeo, se funden cilindros
La interventoria solicita al contratista humectar y sellar la subbase antes de depositar el concreto de los cuellos

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

Julio 4 de 2024.
Chiquinquirá, Boyacá
tramo: Varela
Clima:
Personal de Interventoria: Residente, Profesional sst, Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudante.
Material: Subbase
Maquinaria: Vibrocompactador, motoniveladora
Actividades: Se Inicia la fundida de concreto ciclopeo, en la abscisa del Kot003 al Kot024.
Se realiza Cilindros.
La interventoría hace un llamado a garantizar el orden y aseo en el tramo, tarea que se ha de realizar a diario.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Julio 5 de 2024.
Chiquinquirá, Boyacá
tramo: Varela.
Clima:
Personal de Interventoria: Residente, Profesional sst, Inspector de obra
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes.
Material: Subbase.
Maquinaria: Vibro compactador, motoniveladora.
Actividades: Se continua con la fundida de 5 modulos de 4mt3 de concreto ciclopeo.
- Se Inicia con el amarre de acero de la huella.
La interventoría solicita al contratista señalizar el tramo en intervención dado que el transito de motos es constante.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Julio 6 de 2024.
Chiquinquirá, Boyacá
tramo: Varela.
Clima:
Personal de Interventoria: Residente, Profesional sst, Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudante.
Material: Subbase
Maquinaria: Vibrocompactadora, motoniveladora.
Actividades: Se continua con la fundida de 2,6 mt3, de concreto ciclopeo en las abscisas K0+089 al K0+078.
- Se Inicia construcción de 7 Riostras, se funden cilindros
- La interventoria solicita al Contratista cumplir con el diseño de concreto en todos sus componentes

CONTRATISTA.

INTERVENTORIA

Julio 8 de 2024
Chiquinquirá, Boyacá
tramo: Varela
Clima:
Personal de Interventoria: Residente, Profesional sst, Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: Subbase.
Maquinaria: Vibrocompactadora, motoniveladora.
Actividades: Se funde 21 mts de cuneta
- Se funden 18m de bordillo
- Se funden 4 mt3 de concreto ciclopeo
- Se funden 0,25 mt3 de concreto para Riostra.

La interventoria reitera la obligatoriedad de Uso de EPP del personal de obra.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Julio 9 de 2024.
Chiquinquirá, Boyacá
tramo: Varda.
Clima:
Personal de Interventoría: Residente, Profesional sst, Inspector de obra
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: Subbase.
Maquinaria: Vibrocompactador, motoniveladora.
Actividades: Se funde: Cilindros.
- Bordillo: se funde 27ml de bordillo.
- Rampa: Se funde 1,26 m3 de concreto de 3000psi, para rampa.
-Cuneta: Se funde 3 mt3 de concreto para Cunetas
-Riostras: Se funde 6 mt3 de concreto de 3000 psi para Riostra.
La interventoría a la fecha evidencia la NO implementación de Señalización adecuada y requerida en el tramo.

CONTRATISTA
INTERVENTORÍA

-Julio 10 de 2024
Chiquinquirá de Boyacá
tramo: Varda.
Personal de Interventoría.: Residente, Profesional sst, Inspector de obra
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: Subbase.
Maquinaria: Vibrocompactador, motoniveladora
Actividades: Se funde 6,8 mt3 de concreto ciclopeo para placa huella
-cuneta: Se funden 1,85 mt3 de concreto de 3000 psi para cuneta
- Riostra: Se funden 1 mt3 de concreto de 3000 psi para Riostra.
- Bordillo: Se funde 24 mt de bordillo.
- La Interventoría Solicita al Contratista la toma de muestras de concreto para los ensayos de la compresión

CONTRATISTA
INTERVENTORÍA

Julio 11 de 2024.
Chiquinquirá, Boyacá
tramo: Varela.
Clima:
Profesional de Interventoría: Residente, Profesional SST, Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudante.
Material: Subbase.
Maquinaria: Vibrocompactador, motoniveladora
Actividades: Se funde 6,8 m3 de concreto de 3000 psi para placa huella
- Se funden 1,62 m3 de concreto para Riostra.
- La interventoría solicita al Contratista las soportes de Afiliación a Salud - Pensión y ARL del personal.

CONTRATISTA
INTERVENTORÍA

Julio 12 de 2024
Chiquinquirá, Boyacá
tramo: Varela.
clima:
Personal de Interventoría: Residente, Profesional SST, Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: Subbase.
Maquinaria: Vibrocompactador, motoniveladora.
Actividades: Se funden 6,4 m3 de concreto de 300 psi para placa huella
- Se funden 1,50 m3 de concreto para Riostra, se funden cilindros
- La interventoría solicito al Contratista la toma de muestras de los concretos fundidos para Verificación de resistencia

CONTRATISTA
INTERVENTORÍA

Julio 13 de 2024.
Chiquinquira, Boyacá
Tramo: Varda
Personal de Interventoría. Residente, Profesional SST, Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes.
Material: H2O, arena, gravilla, cemento estructural, acero, madera, piedra rajon
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto, volquetas.
Actividades: Se funden 6,9 mt3 de concreto de 3000 psi para placa huella
- Se funde 4,5 mt3 de concreto para riostras
- Se funden cilindros.
La interventoría solicita al contratista sensibilizar al personal en torno al uso constante y responsable de EPP a través de la Profesional SST.

Contratista

Interventoría

- Julio 15 de 2024.
Chiquinquira, Boyacá
tramo: Varda.
Personal Interventoría: Residente, Profesional SST, Inspector de obra
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: H2O, arena, gravilla, cemento estructural, acero, madera, piedra rajon
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto, volquetas
Actividades: - Se amarra acero para Riostras
- Se amarra acero para las huellas y la cuneta
- Se instala formaleta
- Se funde 3 mt3 de huellas
- Se funden 2 mt3 de cuneta
- Se funden cilindros.
- La interventoría solicita al contratista completar los huecos de la vía que por lluvias se han aflojado.

Contratista

Interventoría

Julio 16 de 2024.
Chiquinquirá, Boyacá
tramo, Varda.
Personal de Interventoría: Residente, profesional sst, Inspector de obra
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: H2o, arena, gravilla, cemento estructural, acero, madera, piedra rajon
Actividades: -Se funden 5m3 de placa huella
-Se funden 3m3 de cuneta
-Se funden 3mt3 de bordillo
- Se funden 2mt3 de Riostras.
- La interventoría solicita al contratista la entrega oportuna de los resultados de los cilindros entregados

Contratista

Interventoría.

-Julio 17 de 2024.
Chiquinquirá, Boyacá
tramo: Varda.
Personal de Interventoría: Residente, profesional sst, Inspector de obra
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: H2o, arena, gravilla, cemento estructural, acero, madera, piedra rajon.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, Vibrador de concreto, Volquetas
Actividades: -Se funden 7,06 m3 de piedra pegada
- Se funden cilindros.
- La interventoría recuerda al contratista la responsabilidad y deber que tiene de realizar continuamente las brigadas de Orden y Aseo del tramo.
- La interventoría solicita al contratista ir haciendo aseo de todo material producto de la construcción en donde la obra está terminada

Contratista

Interventoría.

Julio 18 de 2024.
Chiquinquirá, Boyacá
Tramo: Varela.
Personal de Interventoría: Residente, profesional SST, Inspector de obra
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes
Materiales: H2O, arena, gravilla, cemento estructural, acero, madera, piedra rajon
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, Vibrador de concreto, Volquetas
Actividades: - Se funden 7,05 m3 de placa huella
- Se funden 1,80 m3 de Riostras
- Se funden cilindros.
- La Interventoría solicita al contratista realizar ensayos de los concretos fundidos a los 7, 14 y 28 días

Contratista

Interventoría

- Julio 19 de 2024.
Chiquinquirá, Boyacá
Tramo: Varela.
Personal de Interventoría: Residente, profesional SST, Inspector de obra
Personal: Residente de obra, inspector de obra, maestro y ayudantes.
Material: H2O, arena, gravilla, cemento estructural, acero, madera, piedra rajón
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, Vibrador de concreto, Volquetas.
Actividades: - Se funden 30m de bordillo, y cuneta de Km 0+60 - Km 0+100.
- Se funde concreto ciclopeo Km 0+060 - Km 0+100
- Se funden cilindros.
- La interventoría solicita al contratista dotar de los EPP a los trabajadores vinculados a la obra.

Contratista

Interventoría

Julio 20 de 2024.
Chiquinquira, Boyacá
Tramo: Varela.
Personal de Interventoría: Residente, Profesional sst, Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto, Volquetes.
Actividades:- Se funden huellas del Km 0+100 al Km 0+130.
- Se funden cilindros
- La Interventoría solicita al Contratista humectar el suelo de fundición antes de depositar el concreto de huellas

Contratista

Interventoría

Julio 22 de 2024.
Chiquinquira, Boyacá
Tramo: Varela.
Personal de Interventoría: Residente, profesional sst, Inspector de obra
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: H2o, arena, gravilla, cemento estructural, acero, madera, piedra rajon.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, Vibrador de concreto, Volquetes
Actividades:- Se funden 3,8 mt3 de piedra pegada.
- Se funden cilindros.
La interventoría recuerda al Contratista que la Profesional SST y Social deben realizar cubrimiento al tramo tanto en actividades con el personal como comunitarias, ya que a la fecha no se evidencia ni se cuentan actividades Educativas estipuladas en el PAGA, tales como: Inspecciones SST, Pausas activas, trabajo en equipo, buen trato, prevención de Consumo de SPA y bebidas alcoholicas.

Contratista

Interventoría

Julio 23 de 2024.
Chiquinquirá, Boyacá
Tramo: Varela.
Personal Interventoría: Residente, Inspector de obra, profesional sst.
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: H2O, arena, gravilla, cemento estructural, acero, madera, piedra rajon
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto, Volqueta
Actividades: - Se funden 1,44 m³ de Rastra
- Se funden 1,29 m3 de cuneta
- Se funden 0,68 m3 de bordillo
- Se funden cilindros.
- La Interventoría solicita al Contratista terminar el acero de refuerzo del Sardo

Contratista

Interventoría

-Julio 24 de 2024.
Chiquinquirá, Boyacá
Tramo: Varela
Personal Interventoria: Residente, Inspector de obra, profesional sst.
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: H2O, arena, gravilla, cemento estructural, acero, madera, piedra rajon.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, Vibrador de concreto, Volqueta
Actividades: - Se funden 7,41 m3 de placa huella
- Se funden 7,10 m3 de huellas
- Se funden 7,26 m3 de Rastras
- Se funden 3,70 m3 de Cuneta
- Se funden 2,88 m3 de bordillo
- Se funden cilindros.
La interventorra hace el llamado al contratista a realizar sensibilización al personal respecto al uso responsable y constante de Elementos

de Protección Personal acorde a las actividades.

Contratista

Interventoría

-Julio 25 de 2024

chiquinquira - Boyacá

Tramo: Varda.

Personal de Interventoria: Residente, Inspecter de obra, profesional sst.

personal: Residente de obra, Inspecter de obra, maestro y ayudantes

Material: H2O, arena, gravilla, cemento estructural, acero, madera, piedra rajon.

Maquinaria: Herramienta menor, Mezcladora, vibrador de concreto Volqueta.

Actividades: - Se funden 2,27 m3 de piedra pegada.

- Se funden 3,70 m3 de cuneta

- Se funden 2,88 m3 de bordillo.

- Se funden 0,44 m3 de Placas)

- Se funden cilindro.

• La interventoria solicita al Contratista compactar el suelo de fundación de las cunetas en los sitios en donde se ha aflojado por lluvias.

Contratista

Interventoría

-Julio 26 de 2024.

chiquinquira - Boyacá

Tramo: Varda

Personal de Interventoria: Residente, Profesional sst, Inspector de obra

Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes

Material: H2O, arena, gravilla, cemento estructural, acero, madera, piedra rajon.

Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto, volquetes

-Actividades: - Se funden 3,47 m3 de cuneta

- Se funden 2,70 m3 de bordillo

- Se funden cilindros.

- La interventoria Solicita al Contratista la entrega oportuna de los resultados de los concretos ensayados

Contratista

Interventoria.

-Julio 27 de 2024.

Chiquinquira - Boyacá

Tramo: Varda

Personal Interventoria: Residente, Profesional sst, Inspector de obra.

Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes

Material: H2o, arena, gravilla, cemento estructural, acero, madera, piedra rajon

Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, Vibrador de concreto, Volquetas.

Actividades: - Se funden 6,8 m3 de huella

- Se funden 1,8 m3 de Riostras

- Se funden cilindros.

- La interventoria Solicita al Contratista ir haciendo aseo de todo material producto de la construcción en los sectores en donde la placa Huella está terminada.

Contratista

Interventoria

- Julio 29 de 2024.

Chiquinquira - Boyacá

Tramo: Varda.

Personal Interventoria: Residente, Profesional sst, Inspector de obra.

Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes

Material: H2o, arena, gravilla, cemento estructural, acero, madera, piedra rajon

Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, Vibrador de concreto, Volquetes.

Actividades: - Se funden 4,54m3 de piedra pegada

- Se funden 1,39 m3 de cuneta.

- Se funden 1,08 m3 de bordillo

- Se funden 0,16 m3 de Riostras

- Se funden cilindros.

La interventoria recuerda al Contratista la importancia del Campamento

tanto para los trabajadores como para facilitar la actividad de orden.

Contratista

Interventoría

-Julio 30 de 2024.
Chiquinquira- Boyacá
Tramo: Varda.
Personal de Interventoría: Residente, profesional sst, Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: H2O, arena, gravilla, cemento estructural, acero, madera, piedra rajon
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, Vibrador de Concreto, Volquetas
Actividades: - Se funden 4,54m3 de piedra Pegada
- Se funden 1,34m3 de cuneta
- Se funden 1,08 m3 de bordillo
- Se funden 0,16 m3 de Riostra
- Se funden cilindros.
- La Interventoria solicita al Contratista dotar a los trabajadores de los EPP

Contratista

Interventoría

-Julio 31 de 2024.
Chiquinquira, Boyacá
tramo: Varda
Personal Interventoría: Residente, Profesional sst, Inspector de obra
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: H2O, arena, gravilla, cemento estructural, acero, madera, piedra rajon
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, Vibrador de Concreto, Volquetes
Actividades: - Se funden 0,07 m3 de losa
- Se funden 1,44m3 de Riostras.

- La Interventoria Solicito al Contratista humectar el suelo de Sebbase antes de colocar el concreto para los huellas y piedra pegada

Contratista

Interventoria

- Agosto 1 de 2024.
Chiquinquira - Boyacá
tramo: Varela.
Personal de Interventoria: Residente, profesional sst, Inspector de obra
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes
Materiál: H2O, arena, gravilla, cemento estructural, acero, madera, piedra región
Maquinaria: Herramienta menor, Mezcladora, Vibrador de concreto, Volqueta
Actividades: - Se funden 1,62 m3 de Cuneta
- Se funden 0,19 m3 de Riostra.
- Se funden 0,06 m3 bordillo de descole
- Se funden 0,10 m3 bordillo de descole.
- Se funden 0,05 m3 placa descole.
- Se funden 1,20 m3 bordillo
- Se funden 4,54 m3 huella
- Se funden 0,68 m3 Riostras
- Se funden cilindros.

- La Interventoria Solicito al contratista agilizar la Construcción de la placa huella para tratar de finalizar estos trabajos a finales del mes de agosto.

Contratista

Interventoria

- Agosto 2 de 2024
Chiquinquira - Boyacá
tramo: Varela.
Personal de Interventoria: Residente, profesional sst, Inspector de obra
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes

Material: H2O, arena, gravilla, Cemento estructural, acero, madera, piedra rajón
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, Vibrador de Concreto, Volquetas
Actividades: - Se funden 10,57 m3 de huella
- Se funden 1,62 m3 de Riostras
- Se funden cilindros

Contratista

Interventoría.

- Agosto 3 de 2024
Chiquinquira - Boyacá
Tramo: Varda.
Personal de Interventoría: Residente, Profesional SST, Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: H2O, arena, gravilla, cemento estructural, acero, madera, piedra rajón
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, Vibrador de concreto, Volquetas
Actividades: - Se fundan 4,90 m3 de ciclopeo
- Se funden cilindros.

Contratista

Interventoría

- Agosto 5 de 2024.
Chiquinquirá - Boyacá
Tramo: Varda.
Personal de Interventoría: Residente, Profesional SST, Inspector de obra
Personal: Residente de Obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: H2O, arena, gravilla, cemento estructural, acero, madera, piedra rajón

Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, Vibrador de concreto, Volqueeta
Actividades: - Se funden 4,39 m3 de corneta
-Se funden 0,52 m3 de Riostra.
-Se funden 3,42 m3 de bordillo-cuneta.
• Se interventmie Solicita al Contratista datos de los EPP de los trabajadores Vinculados a la obra

Contratista

Interventoria

- Agosto 6 de 2024.
Chiquinquirá - Boyacá
Tramo: Varela.
Personal de Interventoria: Residente, profesional sst, Inspector de obra
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: Hzo, arena, gravilla, cemento Estructural, acero, madera, piedra rajon
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, Vibrador de concreto, Volqueteo
Actividades: - Se funden 4,91 m3 de piedra pegada.
- Se funden cilindros
• Se interventmie Solicita al Contratista entregar oportunamente los resultados de los ensayos de los concretos fundidos

Contratista

Interventoria

- Agosto 7 de 2024.
Chiquinquira - Boyacá
Tramo: Varela.
Personal de Interventoria: Resident, profesional sst, Inspector de obra.
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: Hzo, arena, gravilla, cemento estructural, acero, madera, piedra rajon
Maquinaria: Herramienta Menor, mezcladora, Vibrador de concreto, Volqueta
Actividades: - Se funden 11,34 m3 de losa.
- Se funden 1,8 m3 de Riostra.
- Se funden cilindros.

- La interventoría solicita al contratista reemplazar los tramos de la viga que se han aflojado por lluvias

Contratista

Interventoría

- Agosto 8 de 2024.
Chiquinquira - Boyacá
Tramo: Varda.
Personal Interventoría: Residente, profesional SST, inspector de obra
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: H2O, arena, gravilla, cemento estructural, acero, madera, piedra rajon.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, Vibrador de concreto, Volquetes
Actividades: - Se funden 2,27 m3 de huella.
- Se funden 0,83 m3 de Riostras.
- Se funden 3,93 m3 de cuneta.
- Se funden 3,06 m3 de bordillo.
- Se Realizan cilindros.
La interventoría solicita al contratista realizar las jornadas de Aseo y limpieza en el tramo.

Contratista

Interventoría.

-

- Agosto 10 de 2024.
Chiquinquira - Boyacá
tramo: Varda.
Personal: Residente, profesional SST, Inspector de obra
Material: H2O, arena, gravilla, cemento estructural, acero, madera, Piedra rajón.
Personal de Interventoría: Residente de obra, Inspector, maestro y ayudantes
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, Vibrador de concreto, Volqueta

Actividades: - Se funden 5,25 m³ de bordillo
- Se funden 1,48 m³ de Riostras.
- La interventoria Solicita al Contratista humedecer el Suelo antes de colocar el Concreto fresco

Contratista

Antolinez hij
Interventor

- Agosto 12 de 2024
Chiquinquira - Boyacá
tramo Varda.
Personal Interventoria: Residente, profesional SST, e Inspector de obra
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: herramienta menor, mezcladora, Vibrador de concreto, Volqueta.
Actividades: - Se funden 6,24 m³ de concreto
- Se amarra acero y se instala formaleta.
Material: H2o, arena, grailla, cemento estructural, acero, madera, piedra rajón.
- La interventoria Solicita al Contratista realizar labores de limpieza de escombros y basuras en los predios en donde ya la placa huella este terminada

Contratista

Antolinez hij
Interventor

- Agosto 13 de 2024. — Martes
Chiquinquira - Boyacá
Tramo: Varda
Personal Interventoria: Residente, profesional SST, Inspector de obra
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: H2o, arena, grailla, cemento estructural, acero, madera, piedra rajón
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, Vibrador de concreto, Volquetas
Actividades: - Se funden 7,92 m³ de huella
- Se funden 1,00 m³ de Riostras
- Se Realizan Cilindros.

- La interventoría solicita al contratista dilatar las barandillas para evitar fisuramiento como adelante

Contratista

Interventor

- Agosto 14 de 2024. — Miercoles.

Chiquinquira - Boyacá

tramo: Varda.

Personal de Interventoría: Residente, profesional sst, Inspector de obra

Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestros, ayudantes

Material: H2o, arena, gravilla, cemento estructural, acero, madera, piedra rajón

Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, Vibrador de concreto, Volquetas

Actividades: - Se funden 3,02 m^3 de piedra pegada

- Se funden, 1,44 m^3 de bordillo

- Se funden 1,85 m^3 de cuneta.

- Se Realizaron cilindros.

La interventoría Hace el llamado al Contratista a que exija el uso constante y responsable de EPP. en el personal de obra.

Contratista

Interventor

- Agosto 15 de 2024 — Jueves

Chiquinquira - Boyacá

tramo: Varda

Profesional de Interventoría: Residente, profesional sst, Inspector de obra.

Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes

Material: H2o, arena, gravilla, cemento estructural, acero, madera, piedra rajón

Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, Vibradores de concreto, Volquetas

Actividades: - Se funden 9,83 m³ de huella

- Se amarra acero.

- Se Interventoria Solicita al contratista dotar de los EPP a todo el personal Vinculado a la obra.

Contratista

Interventor

- Agosto 16 de 2024.

Chiquinquira - Boyacá

Tramo: Varela

Personal de Interventoria: Residente, profesional sst, inspector de obra

Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes.

Material: H2O, arena, gravilla, cemento estructural, acero, madera, piedra rajón

Maquinaria: Herramienta menor, machadora, vibrador de concreto, volquetes

Actividades: - Se funden 6,67 m³ de huella

- Se funden 11,42 m³ de cuneta

- Se funden 5,00 m³ de bordillo

- Se realizaron cilindros.

- Se Interventoria Solicita al Contratista dar el curado a los cilindros de Concreto.

- Se Interventoria Solicita al contratista resanear los sectores de los cunetos que hayan perdido Compactación

Contratista

Interventor

- Agosto 17 de 2024

Chiquinquira - Boyacá

Tramo: Varela.

Personal de Interventoria: Residente, Profesional sst, Inspector de obra

Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes

Material: H2O, arena, gravilla, cemento estructural, acero, madera, piedra rajón

Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto, Volquetes
Actividades: - Se funden 4,54 m³ de piedra pegada
- Se funden 8,03 m³ de Riostra
- Se amarra acero
- se realizan cilindros.

- La interventoria recuerda necesidad y compromiso del contratista para la ejecución de Charlas Socio-educativas
- La interventoria solicita al Contratista Humectar el suelo antes de colocar el Concreto fresco

Contratista

Interventor

- Agosto 20 de 2024.
Chiquinquira - Boyacá
Tramo: Vereda.
Personal de Interventoria: Residente, profesional sst, Inspector de obra
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: H2O, arena, gravilla, cemento estructural, acero, madera, piedra rajón.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, Vibrador de concreto, Volquetes
Actividades: Se funden 7,56 m³ de huella
- Se funden 6,29 m³ de Riostra
- Se realizan cilindros.

- La interventoria solicita al contratista dilatar los bordillos para que estos no induzcan fisuras a cunetas, bloco huella y piedra pegada.

Contratista

Interventor

- Agosto 21 de 2024.
Chiquinquira - Boyacá
Tramo: Vereda
Personal Interventoria: Residente, profesional sst, Inspector de obra

de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes

Activ... 31

-Se ... gravilla, cemento estructural, acero, madera, piedra

...rramienta menor, mezcladora, Vibrador de concreto, Volqueta

...des: -Se funden 8,51 m³ de piedra pegada

se funden 1,74 m³ de ladrillo

-Se funden 2,39 m³ de cerramiento

-Se Realizan cilindros.

La interventoria hace el llamado al contratista el garantizar y trabajar en jornadas de Orden y Aseo.

- La interventoria solicita al Contratista dilatar los ladrillos para evitar fisuramiento mas adelante

Contratista

Interventor

- Agosto 22 de 2024

Chiquinquira - Boyacá

Tramo: Vereal

Personal Interventoria: Residente, profesional sst, Inspector de obra

Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes

Material: H2o, arena, gravilla, cemento, estructural, acero, madera

piedra rajón.

Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, Vibrador de concreto, volqueta

Actividades: Se funden 10,00 m³ de huella

- Se funden 1,26 m³ de Placa

- Se Realizan cilindros

- La interventoria solicita al Contratista recomplectar las areas que se han aflojado antes de colocar concreto y acero de refuerzo.

Contratista

Interventor

- Agosto 23 de 2024.
Chiquinquira - Boyacá
Tramo: Varela
Personal de Interventoría: Residente, profesional sst, Inspector de obra
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: H2O, arena, gravilla, cemento estructural, acero, madera, piedra rajón
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, Vibrador de concreto, Volquetes
Actividades: Se funden 5,51 m³ piedra Pegada
- Se funden 3,76 m³ de bordillo
- Se funden 2,56 m³ de cuneta
- Se Realizan cilindros.
La interventoría reitera al Contratista la necesidad y deber de desarrollo de las Charlas Socioeducativas en cumplimiento al Plan de Gestión Ambiental PAGA.
- La Interventoría Solicita al Contratista hacer el curado apropiado a los cilindros de concreto tomados

Contratista

Interventor

- Agosto 24 de 2024
Chiquinquira - Boyacá
Tramo: Varela
Personal de interventoría: Residente, Profesional sst, Inspector de obra
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, maestro y ayudantes
Material: H2O, arena, gravilla cemento estructural, acero, madera, piedra rajón
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, Vibrador de concreto, Volquetes
Actividades: - Se funden 6,76 m³ de cuneta
- Se funden 6,67 m³ de huella
- Se funden 2,88 m³ de bordillo
- Se funden 1,62 m³ de rampa
- Se realizan actividades de limpieza y aseo en la vía
- Se realizan cilindros.
- La Interventoría Solicita al Contratista proteger la placa huella para que no ingresen vehículos en el concreto sin la resistencia de diseño.

- La interventoría solicita al contratista hacer limpieza general en toda la placa huella para revisar detalles de figuras presentados

Contratista

Autorizado
Interventor

- Agosto 26 a 31 / 2024.
Chiquinquirá - Boyacá.
Tramo: Varela.
Personal interventoría: Residente, profesional SST, inspector
personal obra: Residente, inspector, maestro, ayudantes.
Material: H_2O, arena, gravilla, cemento estructural, acero, madera, rajon.
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, vibrador, volquetas
Actividades: Se realizan actividades de limpieza, subsanar requerimiento de interventoría, retro de madera, Alambre negro varillas, resanes a dilatacion, instalacion de señales verticales de transito (6 unidades), Rellenos detras del bordillo con material proveniente de excavacion.

Contratista

Interventor.

Septiembre 23- 2024
Chiquinquira- Boyaca- Colombia
Tramo: Varela
Personal: Interventoria, Residente, SST profesional social
Inspector, contratista
Material:
Actividad: Se realizo revision y Seguimiento del proyecto del Presente tramo de Placa huella Sector Vereda Varela dando cierre de este proyecto a satisfaccion ~~de~~ Tecnica- social y ambiental sin ninguno novedad dando cierre de esta bitacora.

Contratista

Interventoria.
