	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 20/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: **4041 de 2024**

OBJETO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA ACARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2971de 2024 **INTERVENTOR: SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTAS SAS**

PLAZO INICIAL: 2 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTF 1/11/2024 ATLANTICO (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A** $ **726.306.347,00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B** $ **764.999.700,00**

PLAZO ACUMULADO: 2 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/02/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) $ 38.693.353,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 nov-24	2 dic-24	3 ene-25	4 feb-25	5 mar-25	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…
I-DEMOLICIONES Y EXPLANACIONES	$ 2.047.500,00	0,27%	$ 1.331.850,00	% P	0,28%	0,00%	0,09%	0,00%						
				$ P	$ 2.047.500,00	$ -	$ 715.650,00	$ -						
				$ E	$ 1.331.850,00									
				% E	0,18%									
II-ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 607.257.641,00	79,96%	$ 169.682.658,00	% P	20,00%	64,22%	30,69%	26,93%						
				$ P	$ 144.207.505,40	$ 463.050.139,60	$ 233.050.135,00	$ 204.524.848,00						
				$ E	$ 169.682.658,00									
				% E	23,53%									
III-OBRAS NO PREVISTAS	$ 150.145.033,00	19,77%	$ 33.433.235,00	% P	7,00%	8,50%	7,30%							
				$ P	$ 50.472.626,89	$ 61.259.759,11	$ 55.452.038,00	$ 61.259.760,00						
				$ E	$ 33.433.235,00									
				% E	4,63%									
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
	$ 759.450.174,00	100%												

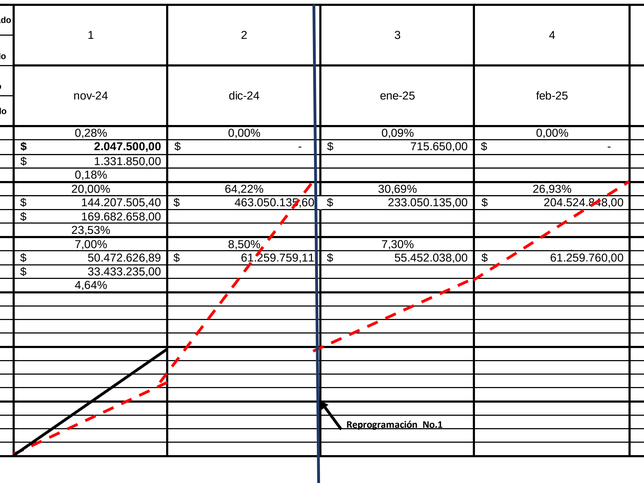

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		27,28%	72,72%	38,08%	35,00%						
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 196.727.632,29	$ 524.309.894,71	$ 289.217.823,00	$ 265.784.608,00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		27,28%	100,00%	65,00%	100,00%						
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 196.727.632,29	$ 721.037.527,00	$ 493.665.566,00	$ 759.450.174,00						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		28,35%									
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 204.447.743,00									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		28,35%									
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 204.447.743,00									

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*	$ -	$ -	%
	$ -		
*	$ -	$ -	%
	$ -		
*	$ -	$ -	%
	$ -		
*	$ -	$ -	%
	$ -		
*	$ -	$ -	%
	$ -		
*	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ -**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - - -	———

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: _____
Nombre: HECTOR BARRAGAN TORRES - Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25000-15719 CND

Aprueba Firma: _____
Nombre: JOSE DAVID BARBOSA OSORIO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 081037 - 0670192 COR

Revisó Firma:N.A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma N.A
Nombre:
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: _____
Nombre: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202090758 BLV

Revisó Firma: _____
Nombre: ARNULFO ARIAS SAENZ
Director Territorial Sucre (E)
Matrícula Profesional No.: 13202084468 BLV

Revisó Firma:N.A
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
