
Id	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin
1	**CONTRATO DEOBRA 2345 DE 2024 SEDE LETICIA**	**47 días**	**$ 62.657.431,22**	**lun 28/10/24**	**mar 31/12/24**
2	**FIRMA ACTA DE INICIO**	0 días	$ 0,00	lun 28/10/24	lun 28/10/24
3	**VISITA DE INSPECCIÓN**	1 día	$ 0,00	mar 5/11/24	mar 5/11/24
4	**INICIO DE OBRAS EN LA SEDE**	0 días	$ 0,00	mar 3/12/24	mar 3/12/24
5	**PRELIMINARES**	**8 días**	**$ 4.458.664,62**	**mar 3/12/24**	**jue 12/12/24**
6	DESMONTE DE CIELORRASO	3 días	$ 134.238,00	vie 6/12/24	mar 10/12/24
7	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	1 día	$ 154.896,00	lun 9/12/24	lun 9/12/24
8	DESMONTE DE PUERTA METÁLICA	1 día	$ 44.670,00	lun 9/12/24	lun 9/12/24
9	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	1 día	$ 52.395,00	lun 9/12/24	lun 9/12/24
10	DESMONTE DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA	1 día	$ 41.878,00	vie 6/12/24	vie 6/12/24
11	DESMONTE DE MARCO EN MADERA PARA PUERTA	1 día	$ 49.125,00	vie 6/12/24	vie 6/12/24
12	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	4 días	$ 315.645,33	mar 3/12/24	vie 6/12/24
13	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	5 días	$ 2.024.336,09	vie 6/12/24	jue 12/12/24
14	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	5 días	$ 1.169.011,20	mar 3/12/24	lun 9/12/24
15	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	3 días	$ 472.470,00	vie 6/12/24	mar 10/12/24
16	**CARPINTERÍA EN MADERA**	**4 días**	**$ 5.674.283,28**	**jue 26/12/24**	**mar 31/12/24**
17	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	2 días	$ 670.451,00	vie 27/12/24	lun 30/12/24
18	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	2 días	$ 1.572.061,00	vie 27/12/24	lun 30/12/24
19	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	4 días	$ 3.431.771,28	jue 26/12/24	mar 31/12/24
20	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**4 días**	**$ 8.814.818,00**	**jue 26/12/24**	**mar 31/12/24**
21	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10MM INCLUYE BISAGRA, MANIJA, CERRADURA Y PIVOTES	4 días	$ 8.359.986,00	jue 26/12/24	mar 31/12/24
22	ESPEJO BISELADO 5MM	1 día	$ 454.832,00	lun 30/12/24	lun 30/12/24
23	**CIELORASOS**	**2 días**	**$ 1.981.616,00**	**vie 20/12/24**	**lun 23/12/24**
24	CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	2 días	$ 1.981.616,00	vie 20/12/24	lun 23/12/24
25	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**	**4 días**	**$ 11.193.158,40**	**jue 26/12/24**	**mar 31/12/24**
26	PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]	4 días	$ 11.193.158,40	jue 26/12/24	mar 31/12/24
27	**PINTURAS**	**5 días**	**$ 6.166.671,36**	**mié 18/12/24**	**mar 24/12/24**
28	VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Pr	5 días	$ 6.166.671,36	mié 18/12/24	mar 24/12/24
29	**PISOS**	**5 días**	**$ 2.565.180,80**	**mié 11/12/24**	**mar 17/12/24**
30	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	3 días	$ 1.924.492,57	vie 13/12/24	mar 17/12/24
31	ALISTADO DE PISO 2CM	2 días	$ 640.688,23	mié 11/12/24	jue 12/12/24
32	**RED HIDRÁULICA**	**1 día**	**$ 2.188.731,00**	**vie 27/12/24**	**vie 27/12/24**
33	JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO	1 día	$ 351.051,00	vie 27/12/24	vie 27/12/24
34	LAVAMANOS DE COLGAR. Incluye Grifería	1 día	$ 499.448,00	vie 27/12/24	vie 27/12/24
35	LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS. Incluye G	1 día	$ 1.094.576,00	vie 27/12/24	vie 27/12/24
36	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE REGISTRO METÁLICA 1/2" ROSCADA -BOLA MANIJA	1 día	$ 243.656,00	vie 27/12/24	vie 27/12/24
37	**RED SANITARIA**	**9 días**	**$ 3.897.723,00**	**mar 17/12/24**	**vie 27/12/24**
38	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	4 días	$ 1.973.460,00	mar 17/12/24	vie 20/12/24
39	SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.	1 día	$ 982.131,00	vie 27/12/24	vie 27/12/24
40	SANITARIO TIPO AHORRADOR	1 día	$ 942.132,00	vie 27/12/24	vie 27/12/24
41	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**18 días**	**$ 2.226.357,81**	**vie 6/12/24**	**mar 31/12/24**
42	ASEO GENERAL DE OBRA	18 días	$ 403.080,00	vie 6/12/24	mar 31/12/24
43	PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.	3 días	$ 646.428,00	vie 27/12/24	mar 31/12/24
44	PODA CESPED	4 días	$ 1.176.849,81	jue 26/12/24	mar 31/12/24
45	**NO PREVISTAS**	**13 días**	**$ 13.490.226,95**	**mar 10/12/24**	**jue 26/12/24**
46	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	2 días	$ 145.191,00	mar 10/12/24	mié 11/12/24
47	MANTENIMIENTO REJA METALICA	3 días	$ 215.735,73	mar 10/12/24	jue 12/12/24
48	REJA TIPO BANCO	3 días	$ 976.873,50	vie 13/12/24	mar 17/12/24
49	PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16	4 días	$ 3.444.624,00	mar 17/12/24	vie 20/12/24
50	MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M	4 días	$ 888.124,00	mar 17/12/24	vie 20/12/24
51	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	5 días	$ 589.901,12	vie 13/12/24	jue 19/12/24
52	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	5 días	$ 7.229.777,60	vie 20/12/24	jue 26/12/24

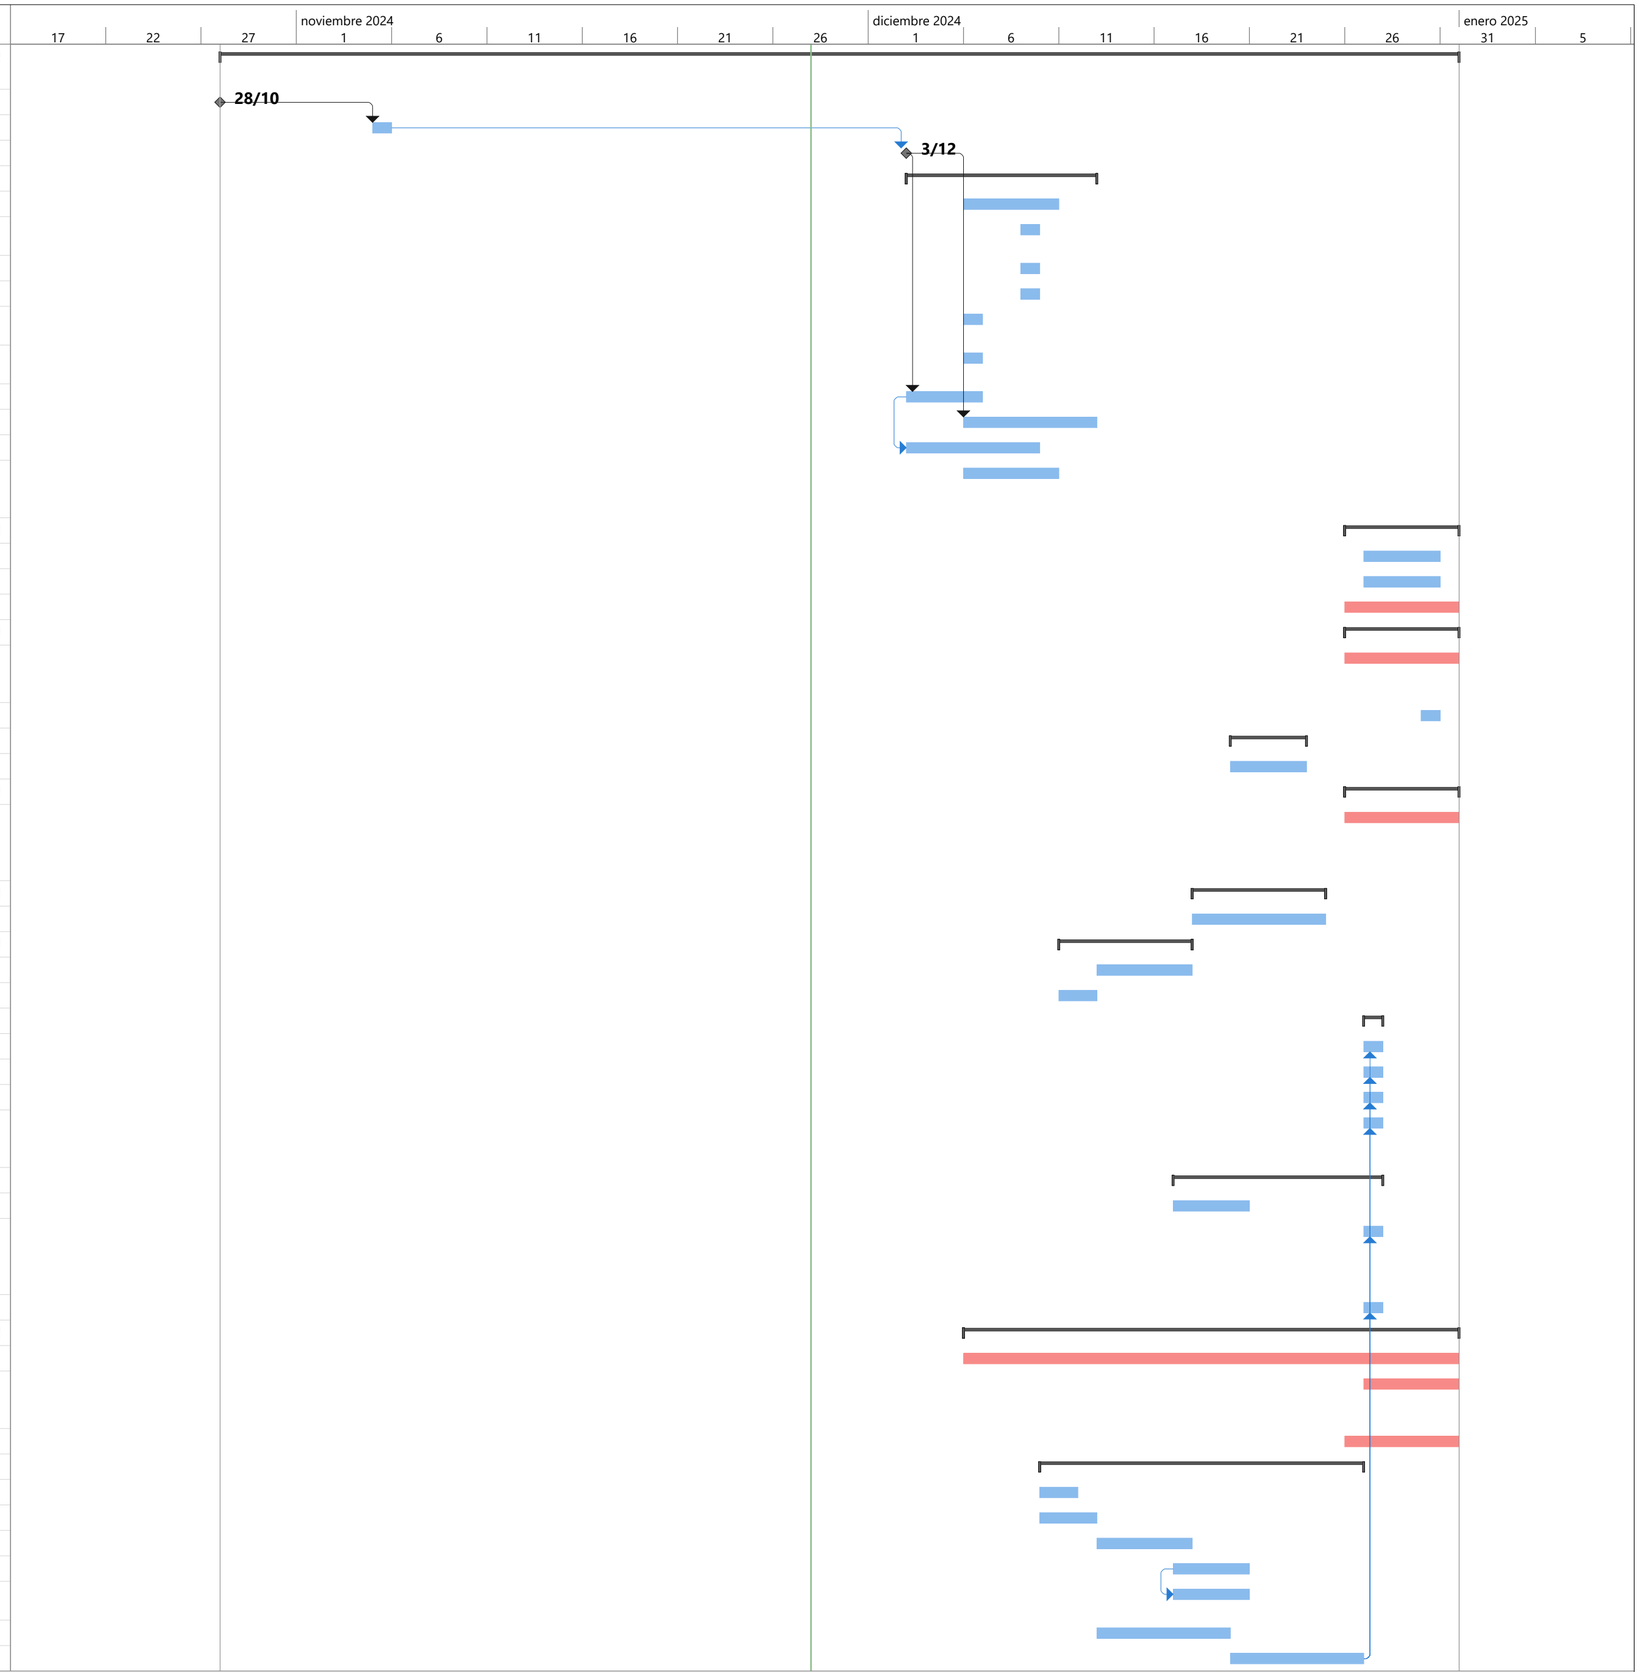

Proyecto: CRONOGRAMA DE O
Fecha: jue 28/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual
