

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**CONTRATO 2345 SEDE ROLDANILLO**	**58,88 días**	**lun 28/10/24**	**mar 31/12/24**
2	**ACTA DE INICIO DEL CONTRATO**	0 días	lun 28/10/24	lun 28/10/24
3	**VISITA DE INSPECCIÓN**	2 días	lun 28/10/24	mar 29/10/24
4	**INICIO DE OBRAS EN LA SEDE**	0 días	lun 2/12/24	lun 2/12/24
5	**PRELIMINARES**	**15 días**	**lun 2/12/24**	**mié 18/12/24**
6	DESMONTE DE CIELORRASO	8 días	lun 2/12/24	mar 10/12/24
7	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	2 días	mié 4/12/24	jue 5/12/24
8	DESMONTE DE CUBIERTA	5 días	lun 2/12/24	vie 6/12/24
9	DESMONTE VENTANA METÁLICA	1 día	jue 5/12/24	vie 6/12/24
10	DESMONTE DE PUERTA METÁLICA	2 días	jue 5/12/24	sáb 7/12/24
11	DESMONTE DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA	2 días	vie 6/12/24	lun 9/12/24
12	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	4 días	lun 2/12/24	jue 5/12/24
13	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	2 días	mié 4/12/24	jue 5/12/24
14	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO	1 día	jue 5/12/24	vie 6/12/24
15	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO (E=8-13CM)	3 días	vie 6/12/24	mar 10/12/24
16	DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)	4 días	mié 4/12/24	lun 9/12/24
17	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	6 días	lun 2/12/24	sáb 7/12/24
18	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	8 días	mié 4/12/24	vie 13/12/24
19	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	15 días	lun 2/12/24	mié 18/12/24
20	**CARPINTERÍA EN MADERA**	**3 días**	**jue 26/12/24**	**lun 30/12/24**
21	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	3 días	jue 26/12/24	lun 30/12/24
22	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	3 días	jue 26/12/24	lun 30/12/24
23	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**7,25 días**	**lun 23/12/24**	**lun 30/12/24**
24	PELÍCULA ANTIREFLEJO DE SEGURIDAD 4 MICRAS	4 días	lun 23/12/24	jue 26/12/24
25	ESPEJO BISELADO 5MM	0,88 días	lun 30/12/24	lun 30/12/24
26	**CIELORASOS**	**8 días**	**vie 20/12/24**	**sáb 28/12/24**
27	CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM Incluye acabado pintura Tipo 1	8 días	vie 20/12/24	sáb 28/12/24
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLANTE DE CALOR ANTI FUEGO PARA TECHOS HECHO DE ALUMINO 100% (lamina Antiblaze® o similar)	8 días	vie 20/12/24	sáb 28/12/24
29	**CUBIERTAS**	**6,88 días**	**lun 23/12/24**	**lun 30/12/24**
30	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	5 días	mar 24/12/24	lun 30/12/24
31	CANAL EN LÁMINA CAL 22 Desarrollo 90 cm	3 días	lun 23/12/24	mié 25/12/24
32	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	5 días	lun 23/12/24	vie 27/12/24
33	**ENCHAPE MUROS**	**16,38 días**	**jue 12/12/24**	**lun 30/12/24**
34	ESTUCO EXTERIOR	2 días	lun 16/12/24	mar 17/12/24
35	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	5 días	jue 12/12/24	mar 17/12/24
36	BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM	5 días	mié 25/12/24	lun 30/12/24
37	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	4 días	lun 23/12/24	jue 26/12/24
38	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**17 días**	**mar 10/12/24**	**sáb 28/12/24**
39	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 12X20CM	4 días	mié 18/12/24	lun 23/12/24
40	VIGUETA DE CONFINAMIENTO 12X20CM	4 días	mar 10/12/24	sáb 14/12/24
41	VIGACINTA DE AMARRE 12X20CM	4 días	mar 24/12/24	sáb 28/12/24
42	PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM. Incluye acero de Refuerzo	3 días	sáb 14/12/24	mié 18/12/24
43	MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACA	3 días	sáb 14/12/24	mié 18/12/24
44	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**	**11,38 días**	**lun 9/12/24**	**vie 20/12/24**
45	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	3 días	lun 9/12/24	mié 11/12/24
46	PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]	8 días	jue 12/12/24	vie 20/12/24
47	**PINTURAS**	**9,13 días**	**vie 20/12/24**	**lun 30/12/24**
48	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	5 días	vie 20/12/24	mié 25/12/24
49	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	5 días	vie 20/12/24	mié 25/12/24
50	VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	7,25 días	lun 23/12/24	lun 30/12/24
51	**PISOS**	**6 días**	**jue 19/12/24**	**mié 25/12/24**
52	PISO GRES 30,5X30,5CM	1 día	jue 19/12/24	vie 20/12/24
53	ALISTADO DE PISO 2CM	3 días	lun 23/12/24	mié 25/12/24
54	**RED ELÉCTRICA**	**20 días**	**lun 9/12/24**	**lun 30/12/24**
55	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	1 día	lun 30/12/24	lun 30/12/24
56	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	2 días	lun 9/12/24	mar 10/12/24
57	SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR BAÑO EXTRA SILENC BAJO CONSUMO SILENT100	3 días	jue 19/12/24	lun 23/12/24
58	**RED HIDRÁULICA**	**9,13 días**	**vie 20/12/24**	**lun 30/12/24**
59	PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS. Promedio 3 ml	2 días	vie 20/12/24	lun 23/12/24
60	JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO	1 día	lun 30/12/24	lun 30/12/24
61	LAVAMANOS DE PEDESTAL. Incluye Grifería	2 días	vie 27/12/24	lun 30/12/24
62	LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS. Incluye Grifería	1 día	vie 27/12/24	sáb 28/12/24
63	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	1 día	vie 27/12/24	sáb 28/12/24
64	MESON EN ACERO INOXIDABLE	5 días	lun 23/12/24	vie 27/12/24
65	PRUEBA HIDROSTÁTICA	0,88 días	lun 30/12/24	lun 30/12/24
66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	2 días	vie 27/12/24	lun 30/12/24
67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	1 día	lun 30/12/24	lun 30/12/24
68	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE REGISTRO METÁLICA 1/2" ROSCADA -BOLA MANIJA	0,88 días	lun 30/12/24	lun 30/12/24
69	**RED SANITARIA**	**10,5 días**	**mié 18/12/24**	**lun 30/12/24**
70	CAJA DE INSPECCIÓN 80X80CM	2 días	jue 26/12/24	vie 27/12/24
71	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	5 días	mié 18/12/24	lun 23/12/24
72	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	3 días	jue 26/12/24	lun 30/12/24
73	SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.	1 día	vie 27/12/24	sáb 28/12/24
74	SANITARIO TIPO AHORRADOR	1,63 días	vie 27/12/24	sáb 28/12/24
75	ORINAL TIPO GOTTA O SIMILAR, INCLEYE LLAVE DE PUSH Y DESAGUE.	1,63 días	vie 27/12/24	sáb 28/12/24
76	**URBANISMO**	**6 días**	**vie 20/12/24**	**jue 26/12/24**
77	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI E=8CM	2 días	vie 20/12/24	lun 23/12/24
78	RAMPA EN CONCRETO ESTRIADO E=14CM	2 días	lun 23/12/24	mié 25/12/24
79	SARDINEL EN CONCRETO 12X40CM	2 días	mié 25/12/24	jue 26/12/24
80	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**27 días**	**lun 2/12/24**	**mar 31/12/24**
81	ASEO GENERAL DE OBRA	27 días	lun 2/12/24	mar 31/12/24

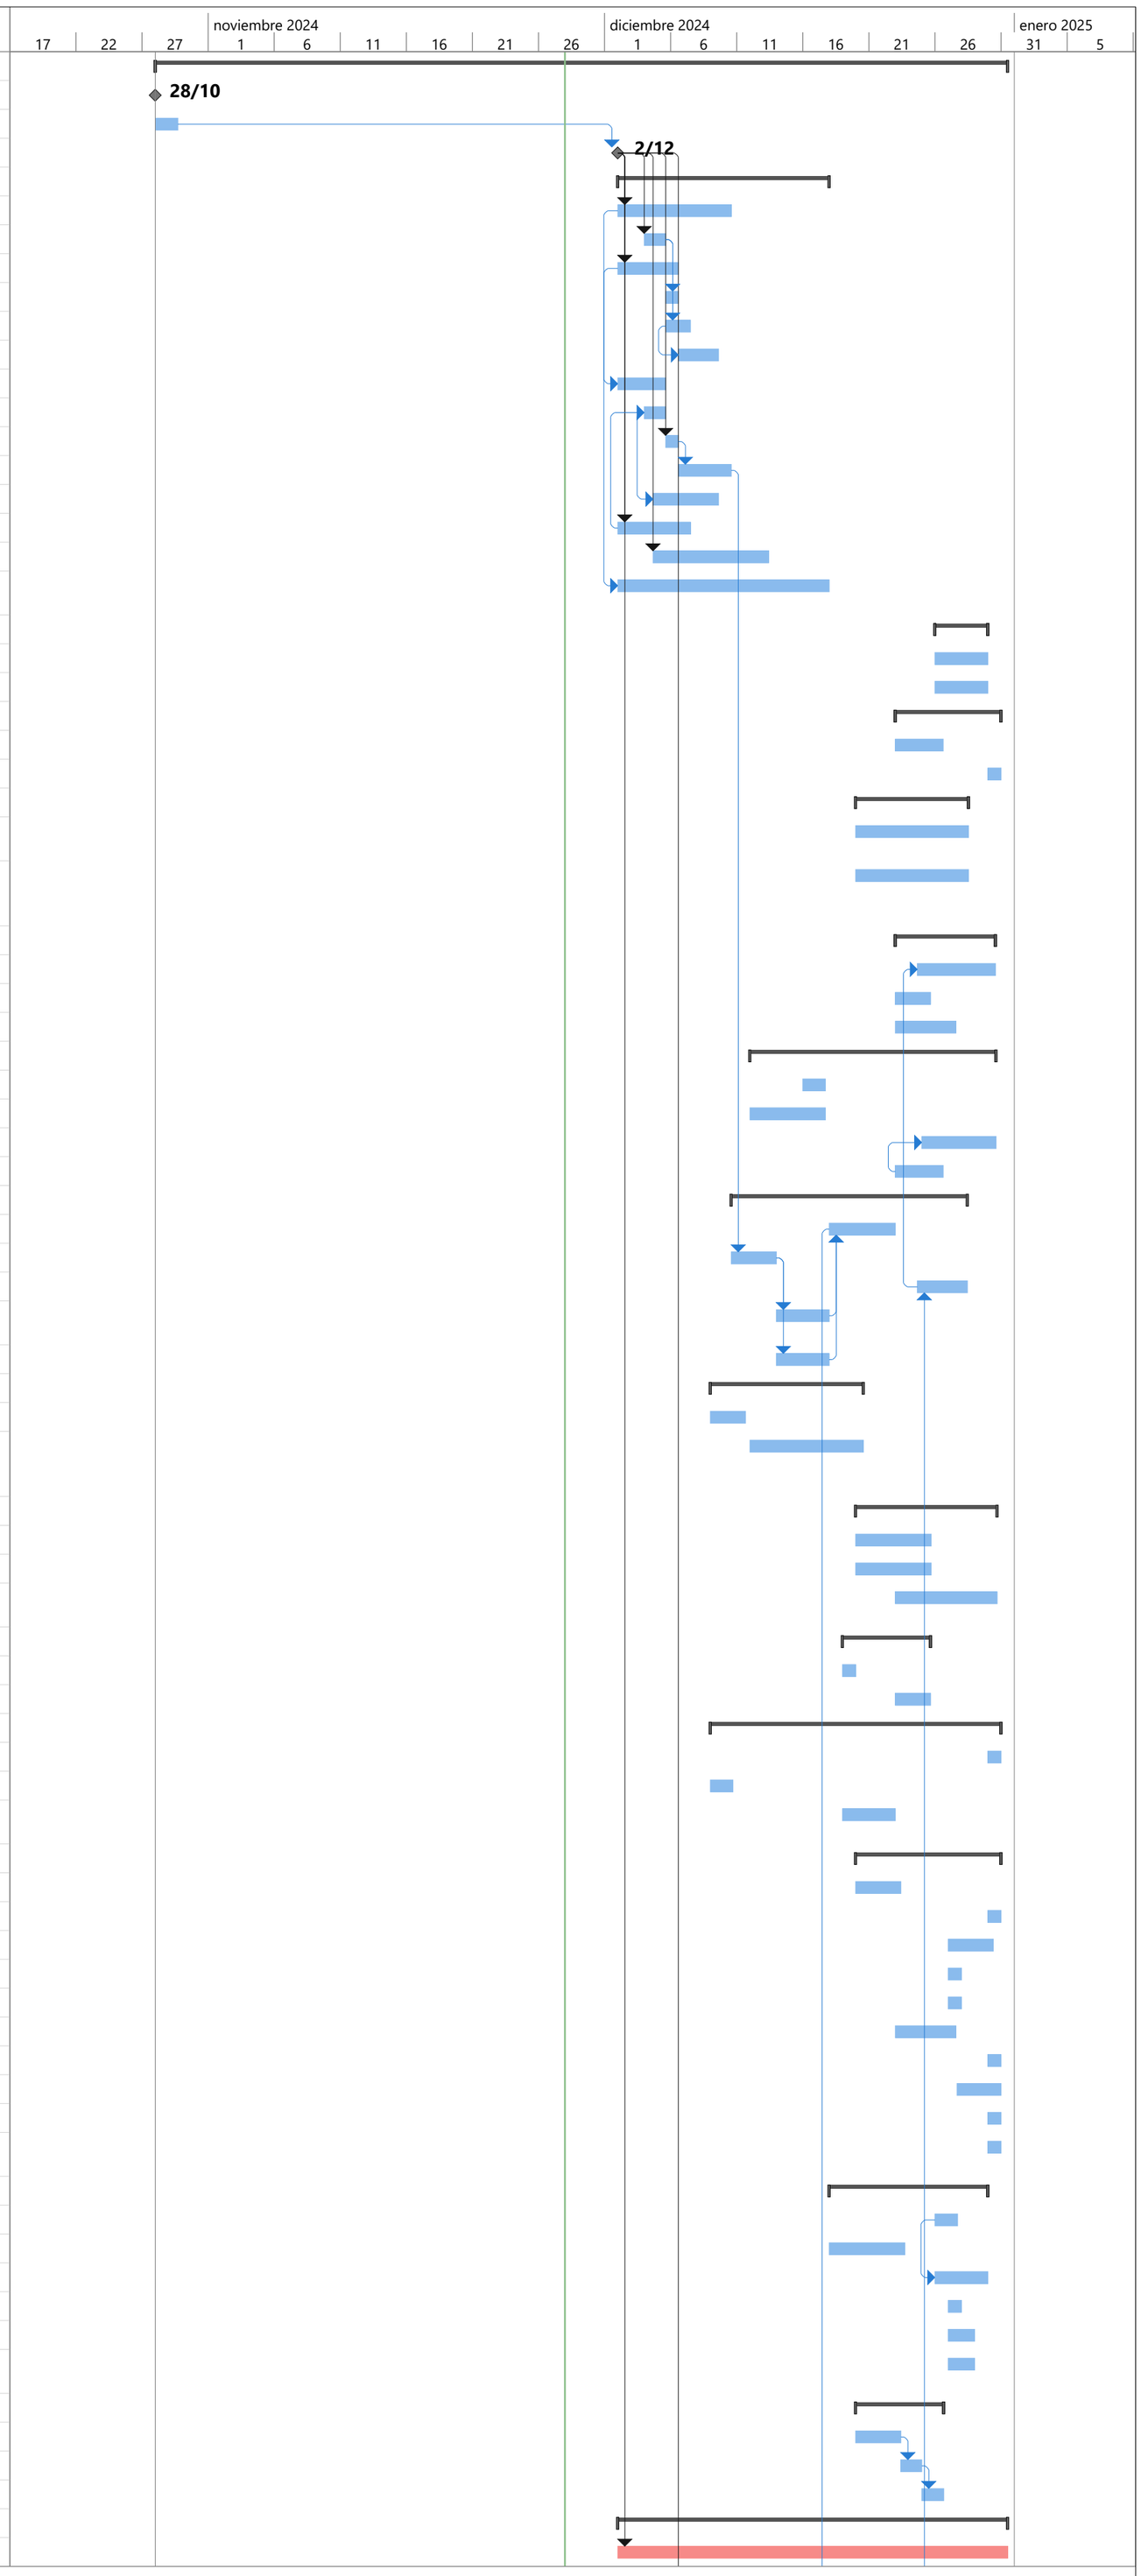

Proyecto: CONTRATO 2345 SED
Fecha: jue 28/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
82	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	2 días	vie 27/12/24	lun 30/12/24
83	PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.	2 días	vie 27/12/24	lun 30/12/24
84	**ADICIONALES**	**5 días**	**vie 20/12/24**	**mié 25/12/24**
85	MANTENIMIENTO REJA METALICA	5 días	vie 20/12/24	mié 25/12/24
86	**NO PREVISTAS**	**21,38 días**	**vie 6/12/24**	**lun 30/12/24**
87	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO (E=10-15CM)	4 días	vie 6/12/24	mié 11/12/24
88	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	5 días	vie 20/12/24	mié 25/12/24
89	PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS. Promedio 3 ml	2 días	mar 24/12/24	mié 25/12/24
90	SALIDA SANITARIA INODORO 4"	1 día	lun 23/12/24	mar 24/12/24
91	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"	1 día	lun 23/12/24	mar 24/12/24
92	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	1 día	lun 23/12/24	mar 24/12/24
93	SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT	2 días	lun 23/12/24	mar 24/12/24
94	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC	2 días	lun 23/12/24	mar 24/12/24
95	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO EMT	1 día	lun 23/12/24	mar 24/12/24
96	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO NO.5	4 días	vie 20/12/24	mar 24/12/24
97	CAJA DE INSPECCIÓN 60X60CM	3 días	mié 18/12/24	vie 20/12/24
98	TUBERÍA PVCS 2"	1 día	vie 20/12/24	sáb 21/12/24
99	TUBERÍA PVCS 4"	1 día	vie 20/12/24	sáb 21/12/24
100	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3"	1 día	sáb 21/12/24	lun 23/12/24
101	PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO. Promedio 3 ml	1 día	sáb 21/12/24	lun 23/12/24
102	PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS. Promedio 3 ml	1 día	lun 23/12/24	mar 24/12/24
103	BARRA DE SEGURIDAD 60CM	1 día	sáb 28/12/24	lun 30/12/24
104	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE	1,63 días	sáb 28/12/24	lun 30/12/24
105	TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM	3 días	jue 26/12/24	lun 30/12/24

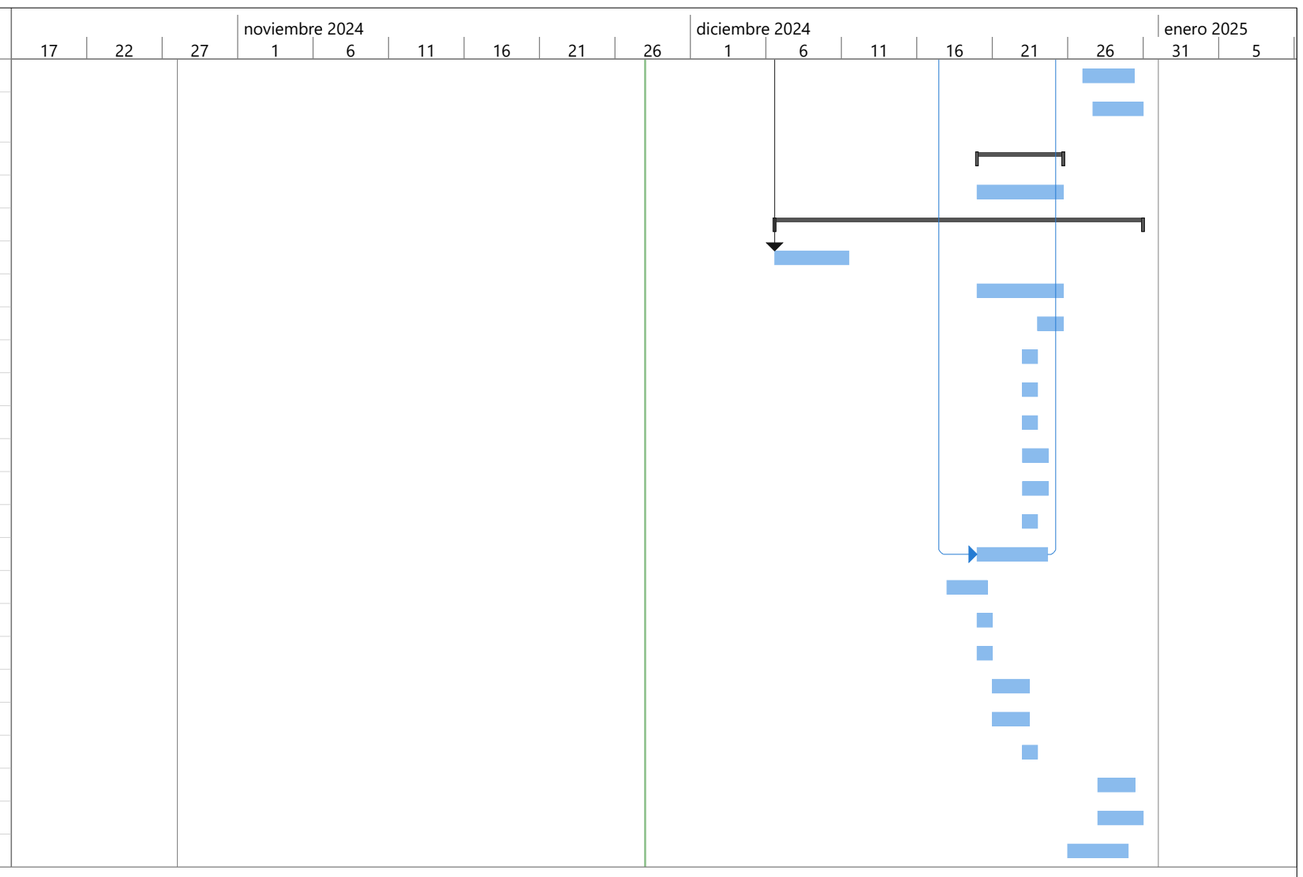

Proyecto: CONTRATO 2345 SED
Fecha: jue 28/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual
