INFORME TECNICO CONTRATO No 08003322024 DEL ICBF ATLÁNTICO

OBJETO: : Contratar la adecuación de los cuartos de almacenamiento de sustancias químicas Sede Regional Atlántico

Fecha: Junio 26 de 2024

Información técnica de los trabajos realizados de acuerdo al contrato de la referencia:

Contrato Principal

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL
Localización y replanteo	M2	18
Encerramiento y su desmonte en polisombra, incluye soportes de sujeción, para disminuir polvo y sucieza en el area intervenida.	M2	10
Demolición enchape existente con retiro y disposición final	M2	9
Construir entrepaño en concreto con su respectivo refuerzo, espesor de 6cms, con profundidad de 45 cm. Cuarto 1: 28,12 mts lineales.	ML	28
Construir entrepaño en concreto con su respectivo refuerzo, espesor de 6cms, con profundidad de 45 cm. Cuarto 2: 10 mts lineales.	ML	10
Suministro e Instalación de enchape de las paredes y entrepaños de los cuartos de almacenamiento de químico (Descripción a convenir con el contratista)	M2	40
Suministro e instalación de Panel Led Sobre Circular 1350 Lúmenes 18W Luz Fría.	UN	2
Suministro e instalación de cielo raso en pvc, cuarto de almacenamiento 2	M2	3
Suministro e instalación sifon rejira de aluminio para cuarto No 2.	UN	1
Revisión y habilitación de Punto eléctrico para iluminación del Cuarto No 2.	GL	1
Reparación de daños locativos puntuales (en paredes y piso)	GB	1
Aseo general durante toda la obra y al final, incluye cargue de escombros y sobrantes, retiro y disposición final.	UN	1
Demolición de piso Cuarto No 2.	M2	9
Suministro y enchape de piso Cuarto No 2.	M2	9

Contrato Adicional

DESCRIPCION	UND	CANT.
DEMOLICION ENCHAPE EXISTENTE CON RETIRO Y DISPOSICION FINAL. CUARTO No.1	M2	22
ASEO GENERAL DURANTE TODA LA OBRA Y AL FINAL INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS Y SOBRANTES, RETIRO Y DISPOSICION FINAL.	UN	1
RESTAURACION DE PUERTA DE ALUMINIO EN CUARTO No-2. RESTAURACION DE LA PERSIANA. CAMBIO DE EMPAQUES , NIVELACIÓN Y LIMPIEZA.	UND	1

SUMISERVICIOS INTEGRALES SAS, cumplió cada una de las actividades contractuales exitosamente:


Con referencia a la actividad de LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, se realizó lo requerido sin ningún imprevisto, en cuanto a la actividad de ENCERRAMIENTO DE POLIZOMBRA, se cumplió lo requerido protegiendo las oficinas cercanas al sitio de trabajo disminuyendo el polvo y piedras en dichas áreas.

En cuanto a lo referente demolición e instalación de ENCHAPE, se realizó esta actividad, con el color requerido, los cálculos y mediciones exigidas para esta actividad. Con relación a los ENTREPAÑOS, se cumplió exitosamente con la fabricación y puesta de éstos, quedando los cuartos funcionales para el almacenamiento de los productos.



Nuestra empresa, cumplió con el suministro e instalación de LAMPARAS LED, mejorando la iluminación de los cuartos. Con relación al suministro e instalación de LAMINAS PVC, se cumplió con esta actividad mejorando la infraestructura física del cuarto. En referencia al SIFÓN, éste fue suministrado e instalado. Con referencia, a los PUNTOS ELÉCTRICOS, se revisó y se habilitó la energía en ese cuarto, cumpliendo con lo requerido.

De acuerdo al contrato, SUMISERVICIOS INTEGRALES SAS, reparó la PUERTA de uno de los cuartos, poniéndola en óptimas condiciones de funcionamiento. Para terminar, se realizó el aseo respectivo y su evacuación de las instalaciones del ICBF. Anexamos las siguientes ilustraciones de los trabajos realizados.

sumiservicios integrales sas
SERVICIOS TÉCNICOS Y DE INGENIERÍA ESPECIALIZADOS
NIT: 900.337.379-8

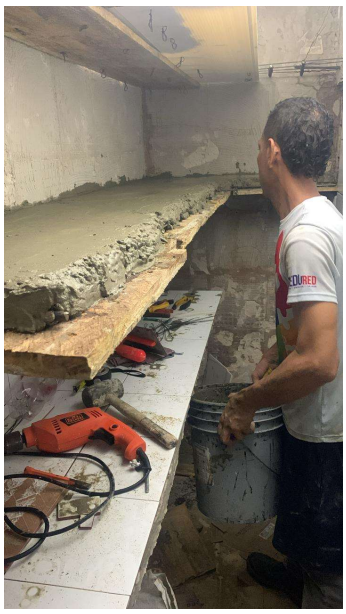



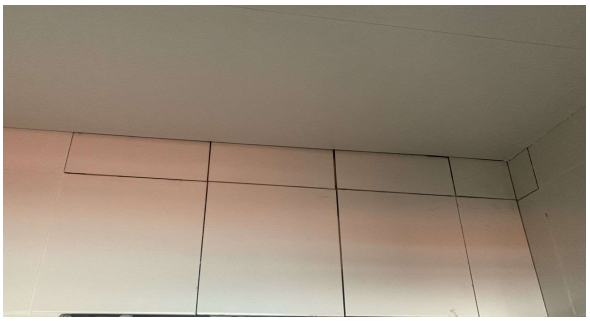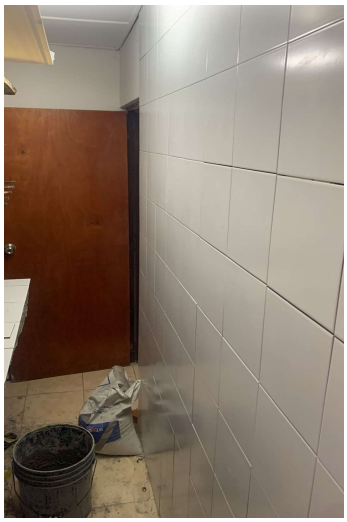




Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,

Sumiservicios Integrales S.A.S.
NIT. 900.337.379-8

LUIS SANTRICH
Gerencia Administrativa

Direccion: Calle 70 No 59-72 Lc 2 *** Movil: 3114214242 *** Email: sumiservicios12@gmail.com
Barranquilla - Colombia
