
Prog Monte. Inversión 5925 millones desde septiembre 01 hasta 31 Mayo 2025

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	% completado
1		**PROGRAMA DE OBRA CONTRATO 1904 DE 2021 MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR**	**194 días**	**lun 4/11/24**	**sáb 31/05/25**	**$ 5.925.067.522**	**0%**
2		**SECTOR ARMENIA - MONTENEGRO PR 0+000 - 2+540**	**194 días**	**lun 4/11/24**	**sáb 31/05/25**	**$ 5.925.067.522**	**0%**
3		**Obras a ejecutar Margen derecha PR 0+000 - PR 2+540**	**194 días**	**lun 4/11/24**	**sáb 31/05/25**	**$ 857.813.562**	**0%**
4		**Pr 0+000 - 0+500 MD**	**53 días**	**jue 6/02/25**	**jue 3/04/25**	**$ 72.067.156**	**0%**
5		Traslado de redes (tiempo estimado y depende de legalizacion de convenio)	53 días	jue 6/02/25	jue 3/04/25	$ 72.067.156	0%
6		**Pr 0+500 - 1+152 MD**	**85 días**	**lun 10/02/25**	**lun 12/05/25**	**$ 71.701.963**	**0%**
7		Traslado de redes (tiempo estimado y depende de legalizacion de convenio)	85 días	lun 10/02/25	lun 12/05/25	$ 44.000.000	0%
8		Instalación de tuberia de 36"	20 días	mié 15/01/25	mié 5/02/25	$ 12.067.013	0%
9		Instalación de subbase granular	11,5 días	lun 3/02/25	vie 14/02/25	$ 3.083.300	0%
10		Instalación de base granular	11,5 días	sáb 15/02/25	jue 27/02/25	$ 2.884.167	0%
11		Instalación de asfalto 7cms Primera capa	3 días	mar 25/02/25	jue 27/02/25	$ 9.667.483	0%
12		**PR 1+152 - 1+300 MD**	**62 días**	**lun 10/02/25**	**jue 17/04/25**	**$ 233.331.461**	**0%**
13		Traslado de redes	85 días	lun 10/02/25	lun 12/05/25	$ 20.973.000	0%
14		Excavaciones para conformación de estructura de vía	10 días	lun 31/03/25	jue 10/04/25	$ 3.569.760	0%
15		Instalación de tuberia de 36"	5 días	mié 26/03/25	lun 31/03/25	$ 39.579.510	0%
16		Instalación de subbase granular	3 días	lun 31/03/25	jue 3/04/25	$ 45.500.000	0%
17		Instalación de base granular	10 días	jue 3/04/25	lun 14/04/25	$ 58.673.396	0%
18		Instalación de asfalto 7cms Primera capa	3 días	lun 14/04/25	jue 17/04/25	$ 65.035.795	0%
19		**PR 1+300 - 1+565 MD**	**35 días**	**jue 7/11/24**	**sáb 14/12/24**	**$ 138.557.836**	**0%**
20		Traslado de redes	25 días	lun 18/11/24	sáb 14/12/24	$ 13.539.143	0%
21		Instalación de tuberia de 36"	15 días	mar 26/11/24	mié 11/12/24	$ 28.034.264	0%
22		Instalación de asfalto 7cms Primera capa	2 días	jue 7/11/24	vie 8/11/24	$ 96.984.429	0%
23		**PR 1+565 - 1+894 MD**	**76 días**	**vie 1/11/24**	**mar 21/01/25**	**$ 104.038.893**	**0%**
24		Traslado de redes	40 días	vie 1/11/24	vie 13/12/24	$ 9.000.000	0%
25		Instalación de tuberia de 36"	6 días	sáb 30/11/24	vie 6/12/24	$ 18.858.000	0%
26		Instalación de asfalto 7cms Primera capa	3 días	jue 14/11/24	dom 17/11/24	$ 72.866.547	0%
27		Suministro e instalación de sardinel	2 días	lun 20/01/25	mar 21/01/25	$ 3.314.346	0%
28		**PR 1+894 - 2+350 (Sector Retorno 02 doble Armenia - Montengro) MD**	**121 días**	**lun 4/11/24**	**jue 13/03/25**	**$ 36.715.735**	**0%**
29		Traslado de redes	55 días	mar 14/01/25	jue 13/03/25	$ 17.600.000	0%
30		Instalación de tuberia de 36"	10 días	lun 25/11/24	jue 5/12/24	$ 15.065.735	0%
31		Suministro e instalación de sardinel	5 días	lun 4/11/24	vie 8/11/24	$ 4.050.000	0%
32		**Transición doble calzada PR 2+350 - 2+540 MD**	**68 días**	**lun 27/01/25**	**mié 9/04/25**	**$ 201.400.517**	**0%**
33		Traslado de redes	20 días	lun 27/01/25	lun 17/02/25	$ 6.500.000	0%
34		Excavaciones para conformación de estructura de vía	15 días	sáb 8/02/25	lun 24/02/25	$ 2.666.568	0%
35		Mejoramiento de subrasante	5 días	vie 14/02/25	mié 19/02/25	$ 3.971.015	0%
36		Instalación de tuberia de 36"	10 días	lun 2/12/24	jue 12/12/24	$ 83.250.000	0%
37		Instalación de subbase granular	20 días	lun 3/02/25	lun 24/02/25	$ 17.053.452	0%
38		Instalación de base granular	20 días	sáb 8/02/25	sáb 1/03/25	$ 15.952.066	0%
39		Instalación de asfalto 7cms Primera capa	6 días	sáb 1/03/25	vie 7/03/25	$ 16.373.317	0%
40		Suministro e instalación de sardinel	30 días	sáb 8/03/25	mié 9/04/25	$ 55.634.100	0%
41		**Obras a ejecutar Margen Izquierda PR 0+000 - PR 2+500**	**112 días**	**dom 1/09/24**	**lun 30/12/24**	**$ 1.494.958.940**	**0%**
42		**Pr 0+000 - 0+633 MI**	**160,7 días**	**jue 1/05/25**	**mar 21/10/25**	**$ 7.596.740**	**0%**
43		Demarcación horizontal y señalización	19,5 días	jue 1/05/25	mié 21/05/25	$ 7.596.740	0%
44		**Pr 0+633 - 1+036 MI**	**69,5 días**	**jue 2/01/25**	**lun 17/03/25**	**$ 405.096.770**	**0%**
45		Traslado de redes	25 días	jue 2/01/25	mar 28/01/25	$ 9.293.400	0%
46		Instalación tuberia de acueducto 12"	15 días	lun 3/02/25	mar 18/02/25	$ 197.979.173	0%
47		Excavaciones para conformación de estructura de vía	5 días	jue 13/02/25	mar 18/02/25	$ 6.715.008	0%
48		Instalación de subbase granular	15 días	mié 19/02/25	jue 6/03/25	$ 39.017.760	0%
49		Instalación de base granular	15 días	mié 26/02/25	vie 14/03/25	$ 36.497.822	0%
50		Instalación de asfalto 7cms Primera capa	3 días	vie 14/03/25	lun 17/03/25	$ 50.974.002	0%
51		Construcción de anden	25 días	mar 18/03/25	dom 13/04/25	$ 64.619.605	0%
52		**PR 1+036 -1+290 MI**	**68,5 días**	**vie 8/11/24**	**lun 20/01/25**	**$ 308.409.177**	**0%**
53		Traslado de redes	20 días	lun 18/11/24	lun 9/12/24	$ 21.400.000	0%
54		Excavaciones para conformación de estructura de vía	20 días	lun 11/11/24	lun 2/12/24	$ 17.154.144	0%
55		Rellenos de estructuras de contención y filtros	20 días	lun 16/12/24	lun 6/01/25	$ 10.799.712	0%
56		Instalación de subbase granular	20 días	lun 18/11/24	lun 9/12/24	$ 76.179.934	0%
57		Instalación de base granular	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	$ 71.259.901	0%
58		Instalación de asfalto 7cms Primera capa	4 días	jue 16/01/25	lun 20/01/25	$ 111.615.487	0%
59		**PR 1+290 -1+503 MI**	**60 días**	**mié 15/01/25**	**jue 20/03/25**	**$ 198.246.171**	**0%**
60		Traslado de redes	60 días	mié 15/01/25	jue 20/03/25	$ 36.497.242	0%
61		Excavaciones para conformación de estructura de vía	8 días	lun 20/01/25	mar 28/01/25	$ 4.829.306	0%
62		Instalación de filtro	5 días	sáb 1/02/25	jue 6/02/25	$ 9.011.434	0%
63		Instalación de subbase granular	12 días	vie 7/02/25	mié 19/02/25	$ 28.060.833	0%
64		Instalación de base granular	12 días	vie 14/02/25	jue 27/02/25	$ 26.248.542	0%
65		Instalación de asfalto 7cms Primera capa	4 días	jue 27/02/25	lun 3/03/25	$ 93.598.814	0%
66		**PR 1+503 -1+858 MI**	**86,5 días**	**lun 13/01/25**	**mar 15/04/25**	**$ 477.513.070**	**0%**
67		Traslado de redes	60 días	lun 13/01/25	mar 18/03/25	$ 31.126.565	0%
68		Excavaciones para conformación de estructura de vía	20 días	lun 3/02/25	lun 24/02/25	$ 21.577.752	0%
69		Mejoramiento de subrasante	15 días	lun 24/02/25	mié 12/03/25	$ 17.405.280	0%
70		Instalación de filtro	5 días	mié 12/03/25	lun 17/03/25	$ 19.485.240	0%
71		Instalación de subbase granular	20 días	mar 4/03/25	mar 25/03/25	$ 125.378.190	0%
72		Instalación de base granular	20 días	jue 20/03/25	jue 10/04/25	$ 102.530.000	0%
73		Instalación de asfalto 7cms Primera capa	5 días	jue 10/04/25	mar 15/04/25	$ 160.010.043	0%
74		**PR 1+858 - transición 2+500 MI**	**25,5 días**	**lun 4/11/24**	**sáb 30/11/24**	**$ 98.097.012**	**0%**
75		Traslado de redes	89 días	jue 2/01/25	lun 7/04/25	$ 12.097.012	0%
76		Instalación de subbase granular	15 días	lun 4/11/24	mar 19/11/24	$ 2.000.000	0%
77		Instalación de base granular	15 días	sáb 9/11/24	lun 25/11/24	$ 1.500.000	0%
78		Instalación de asfalto 7cms Primera capa	5 días	lun 25/11/24	sáb 30/11/24	$ 82.500.000	0%
79		**Contrucción Paso ferreo PR 1+300**	**181,5 días**	**lun 18/11/24**	**sáb 31/05/25**	**$ 2.475.558.705**	**0%**
80		Excavaciones para contrucción de muros y prolongación box	10 días	lun 18/11/24	jue 28/11/24	$ 95.223.719	0%
81		Construcción de estribos, rampas y muros de acompañamiento	85 días	dom 24/11/24	dom 23/02/25	$ 1.858.303.740	0%
82		Construcción BOX COLVERT FERREO 6,30mx7,10m epesor muros 0,40m L=33,00 m	105 días	mié 22/01/25	jue 15/05/25	$ 479.849.646	0%
83		Barandas de protección peatonal	5 días	lun 26/05/25	sáb 31/05/25	$ 42.181.600	0%
84		**Instalación segunda capa de asfalto**	**15 días**	**lun 16/12/24**	**mar 31/12/24**	**$ 975.052.672**	**0%**
85		Instalación de segunda capa de asfalto PR 1+000 - 2+500 (6cms)	149 días	lun 16/12/24	dom 25/05/25	$ 975.052.672	0%
86		**Señalización**	**28 días**	**vie 2/05/25**	**sáb 31/05/25**	**$ 121.683.643**	**0%**
87		Instalación de señalización Horizontal y vertical PR 0+000 - 1+000	25 días	vie 2/05/25	mié 28/05/25	$ 37.388.200	0%
88		Instalación de señalización Horizontal y vertical PR 1+000 - 2+500	26 días	dom 4/05/25	sáb 31/05/25	$ 48.645.840	0%
89		Instalación de señalización Horizontal y vertical PR 0+000 - 1+000 cicloruta	70,8 días	lun 17/03/25	sáb 31/05/25	$ 10.331.740	0%
90		Instalación de señalización Horizontal y vertical PR 1+000 - 1+500 MD cicloruta	64,3 días	lun 24/03/25	sáb 31/05/25	$ 25.317.863	0%
91							
92		**Nota: Las fechas de inicio dependen de la disponibilidad de los predios, sea por permiso de intervención por parte de los vendedores o por culminación de la expropiación administrtiva o judicial.**					

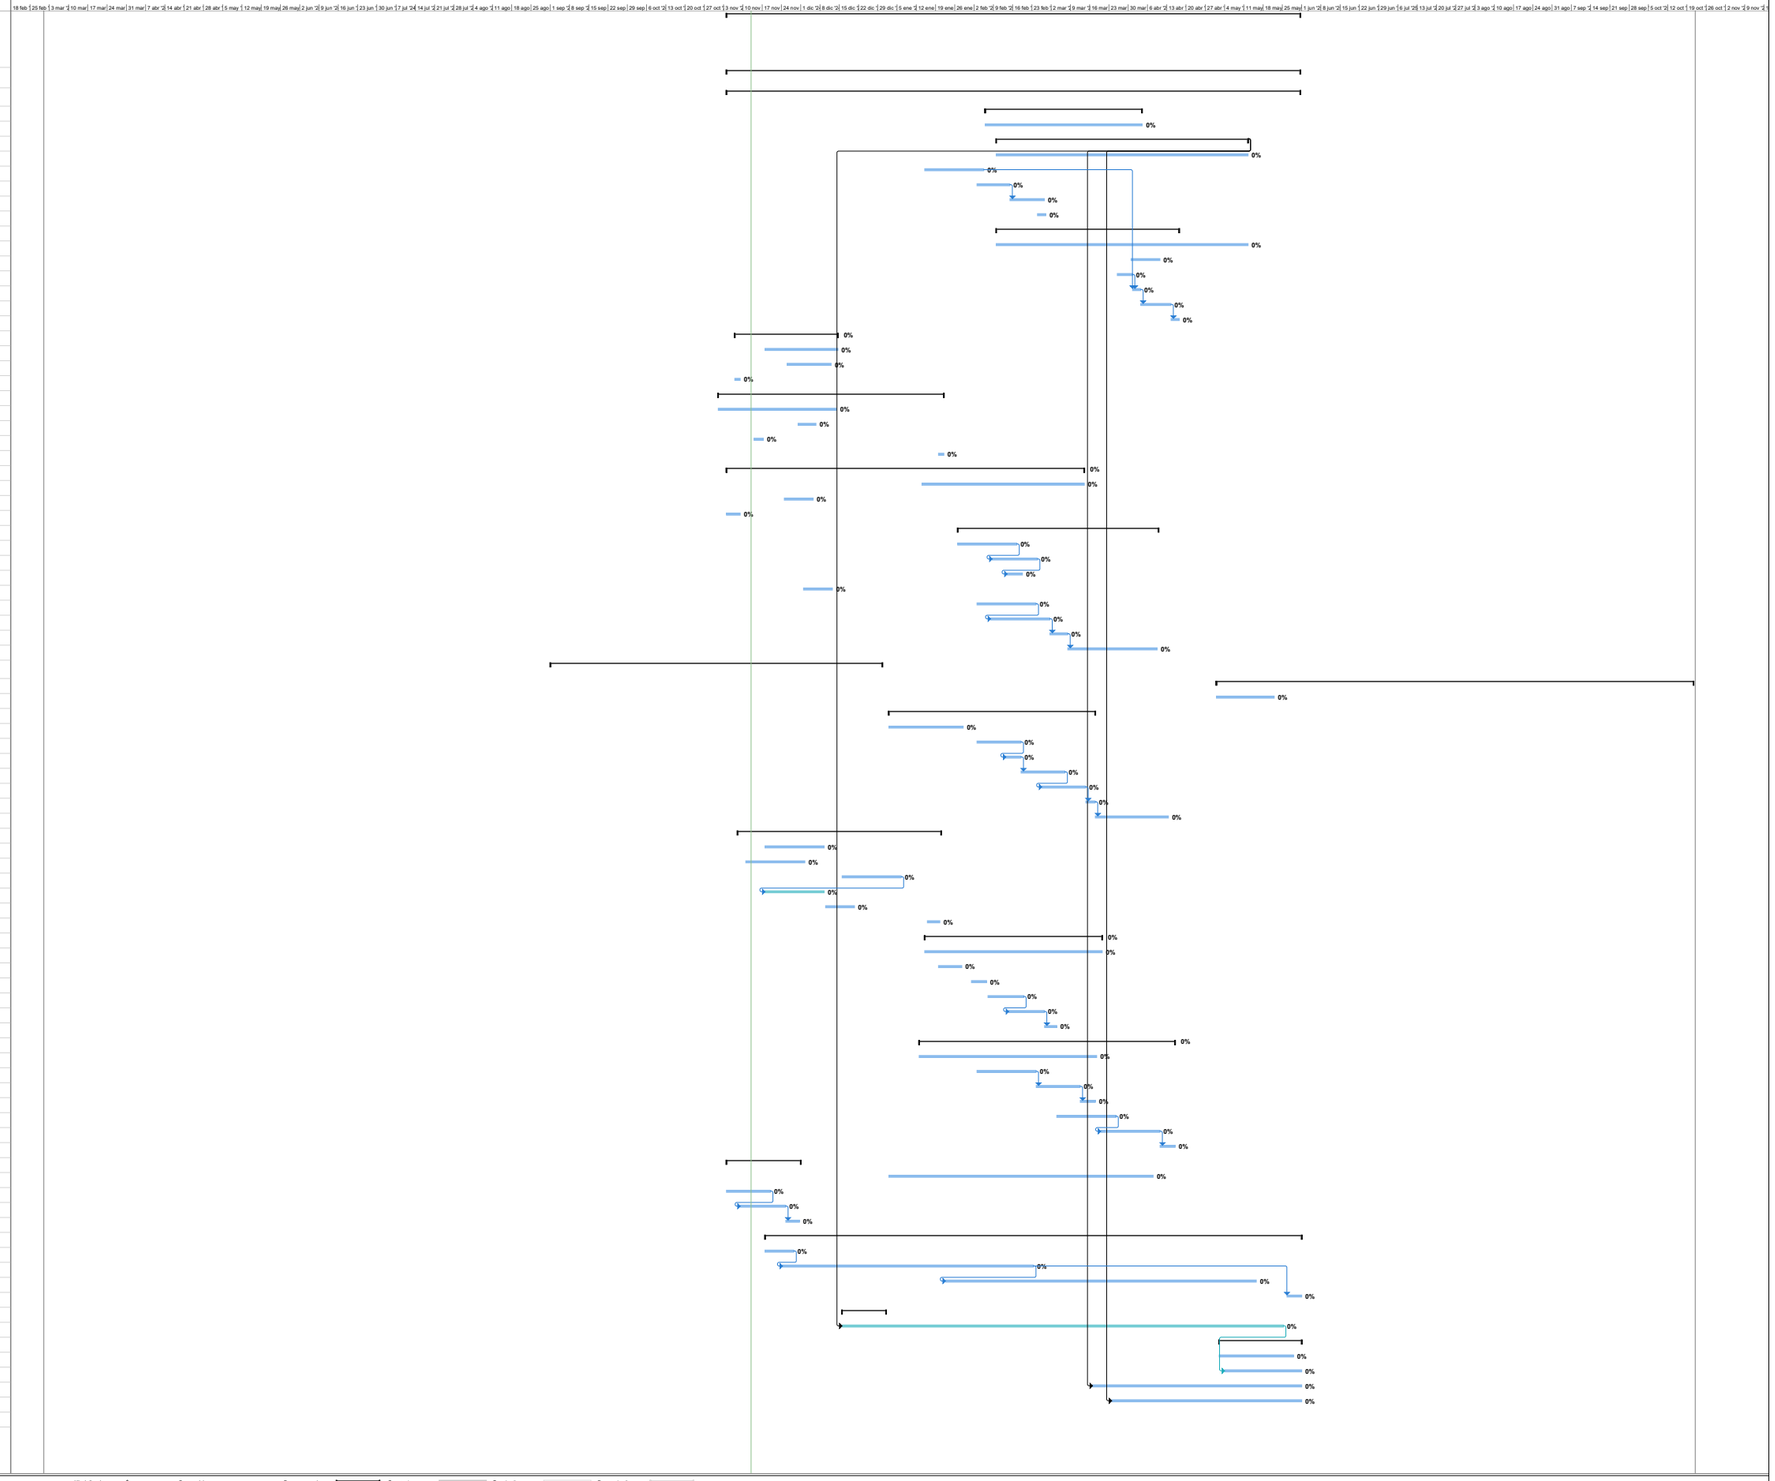

Tareas criticas | Progreso de tarea crítica | División | Tarea manual | solo fin | Línea base | Hito de línea base | Progreso del resumen | Resumen manual | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo
División crítica | Tarea | Progreso de tarea | solo el comienzo | solo duración | División de la línea base | Hito | Resumen | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Fecha límite
