Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

Informe Parcial de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0961-2024 y No. Interno 1471 de 2024-08-12 cuyo Objeto: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA VERIFICACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SGR ASÍ COMO EN EL PROCESO DE REGISTRO, AJUSTES Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS A PROYECTOS DE LOS SECTORES DEPORTE Y RECREACIÓN - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.

Yopal, 18 de Diciembre del 2024.

Doctor(a)
GONZALO JIMENEZ UVA
DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) BANCO PROGRAMAS Y PROYECTOS
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1471 - CAS-OAJ-CDPSP-0961-2024 de 2024-08-12.

Cordial Saludo

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 13/11/2024 hasta 12/12/2024.

A. ANTECEDENTES:

1. OBJETO: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA VERIFICACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SGR ASÍ COMO EN EL PROCESO DE REGISTRO, AJUSTES Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS A PROYECTOS DE LOS SECTORES DEPORTE Y RECREACIÓN - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: Cuatro (4) MESES Y Quince (15) DIAS

3. FECHA DE INICIO: 2024-08-13

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2024-12-27

5. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

Acta No.	Fecha Reinicio
-	-

6. PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

7. NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2024-12-27

8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $19.678.981,50 M.L.C.

9. ADICIONES: $0,00 M.L.C.

10. VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $19.678.981,50 M.L.C.

B. ESTADO FÍSICO:

Informe Parcial de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0961-2024 y No. Interno 1471 de 2024-08-12 cuyo Objeto: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA VERIFICACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SGR ASÍ COMO EN EL PROCESO DE REGISTRO, AJUSTES Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS A PROYECTOS DE LOS SECTORES DEPORTE Y RECREACIÓN - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.

Hasta la fecha 12/12/2024, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1471 presenta una ejecución del 88.88% contra una programada del 100%.

C. ESTADO FINANCIERO:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$19.678.981,50	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$19.678.981,50	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$4.373.107,00	$0,00	$4.373.107,00
VALOR INFORME No. 2	$4.373.107,00	$0,00	$4.373.107,00
VALOR INFORME No. 3	$4.373.107,00	$0,00	$4.373.107,00
PRESENTE INFORME	$4.373.107,00	$4.373.107,00	$0,00
POR EJECUTAR	$2.186.553,50		
TOTAL	$19.678.981,50	$4.373.107,00	$13.119.321,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 4: $0,00 M.L.C.

D. ACTIVIDADES:

Para el cumplimiento del objeto, el contratista deberá realizar las siguientes actividades: 1. Realizar verificación en sitio a la ejecución física y financiera de cuatro (4) proyectos de inversión aprobados por la Gobernación de Casanare, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), de los sectores Deporte y recreación - Vivienda, Ciudad y Territorio y/o otros, documentando con evidencias los avances, logros y/o dificultades en su ejecución. 2. Realizar la verificación documental a un (1) proyecto de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías, de los sectores Deporte y recreación - Vivienda, Ciudad y Territorio y/o otros, en los procesos de viabilización, y/o requisitos previos al inicio de ejecución y/o ajustes. 3. Realizar la verificación, conveniencia, oportunidad y pertinencia de diez (10) estudios vinculados a proyectos de inversión de los sectores Deporte y recreación - Vivienda, Ciudad y Territorio y/o otros, para dar cumplimiento al plan de desarrollo 2024-2027 "Oportunidades para Casanare". 4. Realizar la verificación técnica y documental a tres (3) actualizaciones a proyectos de inversión financiados con recursos propios y/o SGP, de los sectores Deporte y recreación - Vivienda, Ciudad y Territorio.

E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Actividad Realizada	Porcentaje(%)	Referencia
En cumplimiento de la actividad Numero 1. Para el periodo comprendido entre el trece (13) de noviembre y el doce de (12) de Diciembre de 2024, en cuanto a realizar verificación en sitio a la ejecución física y financiera de cuatro (4) proyectos financiados con recursos del sgr así como en el proceso de registro, ajustes y cumplimiento de requisitos a proyectos de los sectores deporte y recreación - vivienda, ciudad y territorio: El día 05 de Diciembre realicé la visita de seguimiento al avance físico y financiero del proyecto financiado con los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) denominado "CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA 345 KV AGUACLARA VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA EN LOS MUNICIPIOS SABANALARGA Y VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CASANARE" con código BPIN 2021005850031. Luego, realicé el informe de visita seguimiento de proyectos SGR en formato FO-PDD-60 con fecha del 05 de Diciembre, en el que se concluye que el avance físico del proyecto es del 80 %, inferior al 99.76% reportado en	100	1

Informe Parcial de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0961-2024 y No. Interno 1471 de 2024-08-12 cuyo Objeto: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA VERIFICACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SGR ASÍ COMO EN EL PROCESO DE REGISTRO, AJUSTES Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS A PROYECTOS DE LOS SECTORES DEPORTE Y RECREACIÓN - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.

GESPROY, debido a retrasos en actividades críticas. De igual forma en la subestación Villanueva falta la instalación y configuración del transformador de potencia para su finalización y la subestación Aguaclara presenta falta de conexión de las redes doble circuito al pórtico de entrada. Finalmente, se evidencia el hurto de 1 km de res de media tensión y separadores averiados, lo que afecta el avance del proyecto. Se relaciona en el Anexo de la Actividad 1, los siguientes documentos: 1.1 Se anexa a este informe FO-PDD- 60 INFORME VISITA SEGUIMIENTO PROYECTO SGR, acta resumen y listado de asistencia y registro fotográfico. nota: el informe físico original reposa en el archivo del departamento administrativo de planeación		
En cumplimiento a la actividad No. 2: Para el periodo comprendido entre el trece (13) de noviembre y el doce de (12) de diciembre de 2024, en cuanto a realizar la verificación documental a un (1) proyecto de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías, de los sectores Deporte y recreación - Vivienda, Ciudad y Territorio y/o otros, en los procesos de viabilización, y/o requisitos previos al inicio de ejecución y/o ajustes En el presente periodo, el día 13 de Noviembre realicé la revisión documental del proyecto de inversión con recursos del sistema general de regalías, denominado "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA EL CONTADERO, VEREDA DE RODRIGOQUE, MUNICIPIO LA SALINA DEPARTAMENTO, CASANARE" con radicado No 20240813-0057. Donde conceptualice lista negativa de verificación de requisitos para proyectos de inversión y remití el proyecto a la secretaría de infraestructura solicitando certificación de precios de referencia, concepto de viabilidad técnica, ambiental, financiera, jurídica y social. En el presente periodo, el día 12 de Diciembre realicé la revisión documental del proyecto de inversión con recursos del sistema general de regalías, denominado "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA EL CONTADERO, VEREDA DE RODRIGOQUE, MUNICIPIO LA SALINA DEPARTAMENTO, CASANARE" con radicado No 20240813-0057. Donde conceptualice lista negativa de verificación de requisitos para proyectos de inversión y devolví el concepto de viabilidad jurídica, técnica, financiera, ambiental y social para proyectos de inversión emitida por la secretaría de infraestructura para correcciones. En el presente periodo, el día 28 de noviembre realicé la revisión documental del proyecto de inversión con recursos del sistema general de regalías, denominado "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA A 34,5 KV AGUACLARA MONTERREY DERIVACIÓN EN 34,5 KV A LA VEREDA EL PORVENIR MUNICIPIO DE MONTERREY DEPARTAMENTO DE CASANARE" con código BPIN No 20210421-3754. Donde conceptualice lista negativa de verificación de requisitos para proyectos de inversión y devolví el concepto de viabilidad jurídica, técnica, financiera, ambiental y social para proyectos de inversión emitida por la secretaría de infraestructura para correcciones. Se relaciona en el Anexo de la Actividad 2, el siguiente documento: 2.1Se anexa FO-PDD-23 lista verificación requisitos proyectos de inversión, formato FO-PDD-23 y oficio de devolución de proyecto con radicado 20240813-0057. 2.2.Se anexa FO-PDD-23 lista verificación requisitos proyectos de inversión, formato FO-PDD-23 y oficio de devolución de proyecto con radicado 20240813-0057. 2.3 Se anexa FO-PDD-23 lista verificación requisitos proyectos de inversión, formato FO-PDD-23 y oficio de devolución de proyecto con radicado 20210421-3754. Nota: los documentos originales reposan en el archivo del Banco de Programas y Proyectos- Departamento Administrativo de Planeación.	100	2
ACTIVIDAD COMPLETADA EN UN 100 %	100	3
ACTIVIDAD COMPLETADA EN UN 100 %	100	4

F. OBSERVACIONES:
se anexan soportes en medio impreso y los mismos forman parte integral del presente informe

Atentamente,

DANIELA ALEJANDRA SANCHEZ IBARRA
Contratista

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE ACTIVIDADES

FO-AB-19
2016-05-10
V.03

Informe Parcial de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0961-2024 y No. Interno 1471 de 2024-08-12 cuyo Objeto: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA VERIFICACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SGR ASÍ COMO EN EL PROCESO DE REGISTRO, AJUSTES Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS A PROYECTOS DE LOS SECTORES DEPORTE Y RECREACIÓN - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.

CONSTANCIA: El(La) suscrito(a) Supervisor(a) hace constar que verificada las actividades relacionadas en el presente informe y las pactadas en el contrato, se concluye que el Contratista ha cumplido con las actividades adquiridas en virtud del mismo.

Aprobó:

GONZALO JIMENEZ JUVA
Supervisor(a)

V.°B.°:

Yopal, 18 de Diciembre de 2024

INFORME DE ACTIVIDADES No. 4 de 5

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

No DEL CONTRATO Y FECHA	CAS-OAJ-CDPSP-0961- 2024 y No. interno 01471 del 2024-08-12
VALOR DEL CONTRATO	$ 19.678.981,50
CONTRATISTA	DANIELA ALEJANDRA SÁNCHEZ IBARRA
No. DE IDENTIFICACIÓN	1.018.501.856
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
SUPERVISOR	GONZALO JIMENEZ UVA
FECHA DE INICIO	13 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE DICIEMBRE DE 2024
PERIODO DEL INFORME	13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	"BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA VERIFICACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SGR ASÍ COMO EN EL PROCESO DE REGISTRO, AJUSTES Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS A PROYECTOS DE LOS SECTORES DEPORTE Y RECREACIÓN - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO."

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDAD No	EJECUCIÓN	EVIDENCIAS Y/O SOPORTES
1. Realizar verificación en sitio a la ejecución física y financiera de cuatro (4) proyectos financiados con recursos del sgr así como en el proceso de registro, ajustes y cumplimiento de requisitos a proyectos de los sectores deporte y recreación - vivienda, ciudad y territorio.	Como parte de la asistencia técnica en la verificación del avance físico y financiero de proyectos financiados con recursos del SGR, así como en el proceso de registro, ajustes y cumplimiento de requisitos a proyectos de los sectores deporte y recreación - vivienda, ciudad y territorio: El día 05 de Diciembre realicé la visita de seguimiento al avance físico y financiero del proyecto financiado con los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) denominado "CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA 345 KV AGUACLARA VILLANUEVA Y AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA EN LOS MUNICIPIOS SABANALARGA Y VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CASANARE" con código BPIN	1.1 Se anexa a este informe FO-PDD-60 INFORME VISITA SEGUIMIENTO PROYECTO SGR, acta resumen y listado de asistencia y registro fotográfico. nota: el informe físico original reposa en el archivo del departamento administrativo de planeación

ACTIVIDAD No	EJECUCIÓN	EVIDENCIAS Y/O SOPORTES
.	2021005850031. Luego, realicé el informe de visita seguimiento de proyectos SGR en formato FO-PDD-60 con fecha del 05 de Diciembre, en el que se concluye que el avance físico del proyecto es del 80 %, inferior al 99.76% reportado en GESPROY, debido a retrasos en actividades críticas. De igual forma en la subestación Villanueva falta la instalación y configuración del transformador de potencia para su finalización y la subestación Aguaclara presenta falta de conexión de las redes doble circuito al pórtico de entrada. Finalmente, se evidencia el hurto de 1 km de res de media tensión y separadores averiados, lo que afecta el avance del proyecto.	
Realizar la verificación documental a un (1) proyecto de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías, de los sectores Deporte y recreación - Vivienda, Ciudad y Territorio y/o otros, en los procesos de viabilización, y/o requisitos previos al inicio de ejecución y/o ajustes	En cumplimiento de Realizar la verificación documental a un (1) proyecto de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías, de los sectores Deporte y recreación - Vivienda, Ciudad y Territorio y/o otros, en los procesos de viabilización, y/o requisitos previos al inicio de ejecución y/o ajustes: En el presente periodo, el día 13 de Noviembre realicé la revisión documental del proyecto de inversión con recursos del sistema general de regalías, denominado "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA EL CONTADERO, VEREDA DE RODRIGOQUE, MUNICIPIO LA SALINA DEPARTAMENTO, CASANARE" con radicado No 20240813-0057. Donde conceptualice lista negativa de verificación de requisitos para proyectos de inversión y remití el proyecto a la secretaría de infraestructura solicitando certificación de precios de referencia, concepto de viabilidad técnica, ambiental, financiera, jurídica y social. En el presente periodo, el día 12 de Diciembre realicé la revisión documental del proyecto de inversión con recursos del sistema general de regalías, denominado "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA	2.1 Se anexa a este informe, la imagen de la lista de verificación de requisitos para proyectos de inversión, formato FO-PDD-23 y oficio de devolución de proyecto con radicado 20240813-0057. 2.2 Se anexa FO-PDD-23 lista verificación requisitos proyectos de inversión, formato FO-PDD-23 y oficio de devolución de proyecto con radicado 20240813-0057. Nota: los documentos originales reposan en el archivo del Banco de Programas y Proyectos-Departamento Administrativo de Planeación. 2.3 Se anexa FO-PDD-23 lista verificación requisitos proyectos de inversión, formato FO-PDD-23 y oficio de devolución de proyecto con radicado 20210421-3754.

ACTIVIDAD No	EJECUCIÓN	EVIDENCIAS Y/O SOPORTES
	EL CONTADERO, VEREDA DE RODRIGOQUE, MUNICIPIO LA SALINA DEPARTAMENTO, CASANARE" con radicado No 20240813-0057. Donde conceptualice lista negativa de verificación de requisitos para proyectos de inversión y devolví el concepto de viabilidad jurídica, técnica, financiera, ambiental y social para proyectos de inversión emitida por la secretaría de infraestructura para correcciones. En el presente periodo, el día 28 de noviembre realicé la revisión documental del proyecto de inversión con recursos del sistema general de regalías, denominado "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA A 34,5 KV AGUACLARA MONTERREY DERIVACIÓN EN 34,5 KV A LA VEREDA EL PORVENIR MUNICIPIO DE MONTERREY DEPARTAMENTO DE CASANARE" con código BPIN No 20210421-3754. Donde conceptualice lista negativa de verificación de requisitos para proyectos de inversión y devolví el concepto de viabilidad jurídica, técnica, financiera, ambiental y social para proyectos de inversión emitida por la secretaría de infraestructura para correcciones.	
Realizar la verificación, conveniencia, oportunidad y pertinencia de diez (10) estudios vinculados a proyectos de inversión de los sectores Deporte y recreación - Vivienda, Ciudad y Territorio y/o otros, para dar cumplimiento al plan de desarrollo 2024-2027 "Oportunidades para Casanare".	ACTIVIDAD COMPLETADA (100% COMPLETADA)	ACTIVIDAD COMPLETADA (100% COMPLETADA) .
4. Realizar la verificación técnica y documental a tres (3) actualizaciones a proyectos de inversión financiados	ACTIVIDAD COMPLETADA (100% COMPLETADA)	ACTIVIDAD COMPLETADA (100% COMPLETADA)

ACTIVIDAD No	EJECUCIÓN	EVIDENCIAS Y/O SOPORTES
con recursos propios y/o SGP, de los sectores Deporte y recreación - Vivienda, Ciudad y Territorio.		

Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

Anexo evidencias y soportes al informe, así como la planilla de pago no. 9477854959 de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) del mes de Agosto con fecha de pago del 03 de Diciembre de 2024.

Atentamente,

Daniela Alejandra Sánchez Ibarra
Contratista

Aprobó:

Gonzalo Jiménez Uva
Supervisor

Vanessa Gabriela Contreras Urrea
VoBo. Profesional Contratado
Banco de Programas y proyectos

Autoriza:

Alfonso Cárdenas Silva
Director del Departamento Administrativo de Planeación

Esteban Felipe Silva Guerra
VoBo. Profesional Contratado
Departamento Administrativo de Planeación

ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SECOP II
CAS-OAJ-CDPSP-000961-2024 Y No. INTERNO 01471 de 2024 de fecha 12/02/2024

ACTIVIDAD 1

1.1. Se anexa a este informe FO-PDD- 60 INFORME VISITA SEGUIMIENTO PROYECTO SGR

INFORME VISITA SEGUIMIENTO PROYECTO SGR
FO-PDD-60
02/09/2024
V 01

1 INFORMACIÓN BASICA DEL PROYECTO

Sector	MINAS Y ENERGIA	Fase del proyecto	Fase III - Factibilidad	Fecha inicio visita	5 de diciembre de 2024
				Fecha final visita	5 de diciembre de 2024
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA LINEA 24SKV AGUACLARA VILLANUEVA Y AMPLIACION Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN VILLANUEVA EN LOS MUNICIPIOS DE SABANALARGA Y VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CASANARE.			Código BPIN	2021570010001
Objetivo del proyecto	MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CASANARE			No. de beneficiarios	36017
Acuerdo/Decreto aprobatorio	No.	Fecha	Vigencia recursos SGR	Entidad Ejecutora	
	210	9 de septiembre de 2021	2021	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A.E.S.P.	
Localización	Departamento	Municipio(s)	Localización específica		
	Casanare	Villanueva	Casco urbano		
Valor total proyecto	Valor SGR	Fuentes financiadoras SGR	Valor otras fuentes	Otras fuentes	
$ 13.594.329.638,00	$ 13.594.329.638,00	SGR - Asignaciones Directas			
Tiempo de ejecución	Financiero: 12 meses	Físico: 12 meses	% Avance	SEGPRO	Visita
			Físico	99,79%	85%
			Financiero	99,34%	85,79%

2 ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto tiene como alcance la construcción de 18,3 km de redes de subestación requeridas para los municipios de Sabanalarga - Villanueva Departamento de Casanare, el cual fue presentado por los equipos de contratación y ejecución de la prestación del servicio de energía eléctrica. Para lo anterior, es necesario la construcción de redes eléctricas para la repotenciación de la línea 24 kV Aguaclara - Villanueva y ampliación y normalización de la subestación Villanueva en los municipios de Sabanalarga y Villanueva Departamento de Casanare. Las entregables, actividades contempladas y el presupuesto estimados, para cada capítulo de proyecto son los siguientes:

Aparatos Sumbarios: Instalación de elementos como: Pararrayos, seccionadores y cuchillas, necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de las bahía y líneas sumbarias con un presupuesto asignado de $ 1.434.865,00.

Automatización e Integración de la Subestación Villanueva al Centro de Control de ENERCA: Implementación de sistemas de control y monitoreo remoto para la subestación, con el objetivo de integrarla al Centro de Control de ENERCA, permitiendo su supervisión y operación en tiempo real, con un presupuesto asignado de $ 1.221.261,00.

Cerramientos y Casetas en Concreto: Construcción de estructuras en concreto reforzado y bloque requeridas para el control y funcionamiento adecuado de la subestación, con un presupuesto asignado de $ 6.161.221,00.

Cuarteria: Instalación y adecuación de elementos en madera y materiales similares, como puertas, marcos y acabados, necesarios para el mantenimiento y funcionalidad de las áreas civiles, con un presupuesto asignado de $ 92.720.260,00.

Certificación RETIE Obras Eléctricas: Proceso de verificación y cumplimiento de los normas técnicas establecidas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) para garantizar la seguridad y calidad de las obras eléctricas ejecutadas, con un presupuesto asignado de $ 47.511.782,00.

Cimentación: Construcción de la base estructural en concreto que garantiza la estabilidad, solidez y distribución de cargas de las estructuras y equipos instalados en el proyecto, con un presupuesto asignado de $ 107.594.344,00.

Compensador Terminal: Implementación de equipos para controlar y mejorar la eficiencia energética durante la ejecución del proyecto, asegurando que las condiciones ambientales estables, con un presupuesto asignado de $ 11.508.447,00.

Cubierta: Instalación de la estructura superior que protege las edificaciones y áreas de equipos de las condiciones climáticas, garantizando la durabilidad y funcionalidad de las obras, con un presupuesto asignado de $ 94.376.721,00.


Determinación de Cambio de Evaluación Previas Ambiental: Estudios y análisis de los posibles impactos ambientales durante la ejecución del proyecto, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente, con un presupuesto asignado de $ 63.500.000.

Equipos de Maniobra: Instalación de sistemas de control y protección de circuitos, incluyendo relés, fusibles y seccionadores, para la operación segura y eficiente de la subestación, con un presupuesto asignado de $ 1.084.694,00.

Fabricación Montaje y Construcción de soportes metálicos y Servicios: Diseño, fabricación e instalación de estructuras metálicas para soportar equipos eléctricos y líneas de transmisión, asegurando su estabilidad y durabilidad, con un presupuesto asignado de $ 271.287.431,00.

Excavación de Redes: Realización de zanjas y movimiento de tierra necesarios para la instalación de redes eléctricas y otros componentes subterráneos del sistema, con un presupuesto asignado de $ 1.264.758,00.

ACTIVIDAD 2

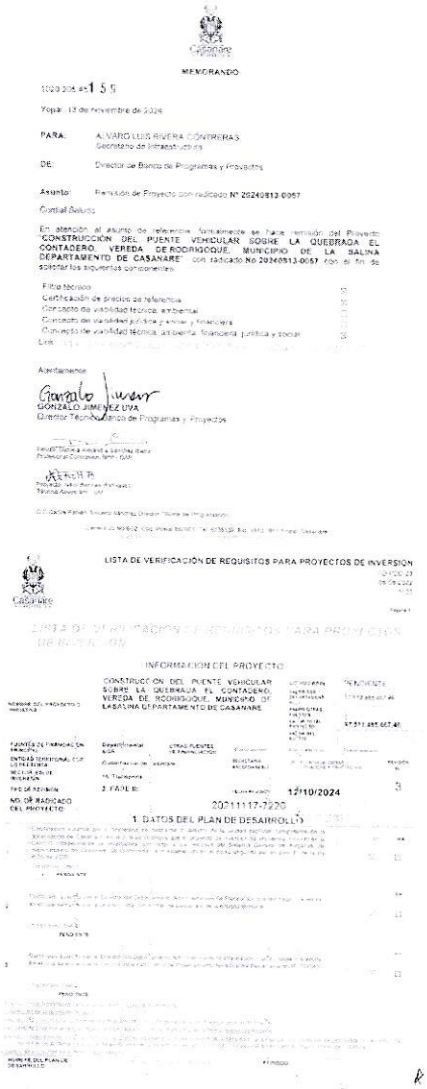

MEMORANDO

1020206451515

Yopal, 13 de noviembre de 2024

PARA: ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
Secretario de Infraestructura

DE: Director de Banco de Programas y Proyectos

Asunto: Remisión de Proyecto con radicado Nº 20240813-0057

Cordial Saludo,

En atención al asunto de referencia, comedidamente se hace remisión del Proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA EL CONTADERO, VEREDA DE RODRIGOQUE, MUNICIPIO DE LA SALINA DEPARTAMENTO DE CASANARE" con radicado No 20240813-0057 con el fin de solicitar los siguientes componentes:

Ficha técnica
Certificación de precios de referencia
Concepto de viabilidad técnica, ambiental
Concepto de viabilidad jurídica y sector financiero
Concepto de viabilidad técnica, ambiental, financiera, jurídica y social

Link:

Atentamente,

GONZALO JIMENEZ UYA
Director Técnico Banco de Programas y Proyectos

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA PROYECTOS DE INVERSION

INFORMACION DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA EL CONTADERO, VEREDA DE RODRIGOQUE, MUNICIPIO DE LA SALINA DEPARTAMENTO DE CASANARE

$7.531.885.667,40

2. FASE III

12/10/2024

20211117-0220

1. DATOS DEL PLAN DE DESARROLLO

2.1 Se anexa a este informe, la imagen de la lista de verificación de requisitos para proyectos de inversión, formato FO-PDD-23 y oficio de devolución de proyecto con radicado 20240813-0057.

CASANARE

MEMORANDO
FO-GD-02
10-09-2024
V.02

MEMORANDO No 180

1020.205.45

Yopal, 12 de diciembre de 2024

PARA: Álvaro Luis Rivera Contreras, Secretario de Infraestructura

DE: Director Técnico Banco de Programas y Proyectos

Asunto: Devolución Remisión de Proyecto con radicado **Nº 20240813-0057**

Con agrado la saludo e informo que, en atención al asunto de referencia, formalmente se hace devolución de remisión del Proyecto: "**CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA EL CONTADERO, VEREDA DE RODRIGOQUE, MUNICIPIO DE LA SALINA DEPARTAMENTO DE CASANARE**", con radicado **No 20240813-0057** con el fin de solicitar los siguientes componentes

Filtro técnico	☒
Certificación de precios de referencia	☒
Concepto de viabilidad técnica, ambiental	☐
Concepto de viabilidad jurídica y social y financiera	☐
Concepto de viabilidad técnica, ambiental, financiera, jurídica y social	☒

Se requiere revisión, verificación y modificación nuevamente, debido a que los documentos emitidos el 06 de diciembre de 2024 presentan errores contundentes.

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1RVBpVQQjt_i2bE4RdQpw-TQSdaHlyV2U
Anexo: Lista de verificación de requisitos para proyectos de inversión de la dirección técnica de banco de programas y proyectos.

Atentamente

GONZALO JIMENEZ UVA
Director Técnico Banco de Programas y Proyectos

Revisó: Daniela Alejandra Sánchez Ibarra
Profesional Contratado BPP - DAP

Proyectó: Nikol Barrios Rodríguez
Técnico de Apoyo BPP, DAP

C.C. Carlos Fabián Salcedo Sánchez Director Oficina de Programación

Casanare

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA PROYECTOS DE INVERSION
FO-PDD-23
09-06-2022
V.05

Página 1

LISTA DE VERIFICACION DE REQUISITOS PARA PROYECTOS DE INVERSION.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO


NOMBRE DEL PROYECTO O INICIATIVA	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA EL CONTADERO, VEREDA DE RODRIGOQUE, MUNICIPIO DE LA SALINA DEPARTAMENTO DE CASANARE
CODIGO BPIN	2024000850153
VALOR SGR DEPARTAMENTAL	$7.100.688.352,88
VALOR OTRAS FUENTES	
VALOR TOTAL PROYECTO	$7.100.688.352,88
VALOR DEL AJUSTE	
FUENTE DE FINANCIACIÓN	SGR
ENTIDAD TERRITORIAL QUE LO PRESENTA	Gobernación de Casanare
SECTOR DESTINO PRINCIPAL	3. FASE III
NO. DE RADICADO DEL PROYECTO:	20211117-7220
SECTOR RESPONSABLE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE
REVISIÓN No.	4
FECHA REVISIÓN	12/12/2024

1. DATOS DEL PLAN DE DESARROLLO

1	Certificación suscrita por el Secretario de Infraestructura y Asesor de la unidad sectorial correspondiente de la gobernación de Casanare, en la que se certifique que el proyecto de inversión se encuentra en el plan indicativo independiente de Infraestructura vial cargado en el aplicativo de recursos del Sistema General de Regalías del departamento de Casanare, de conformidad a lo señalado en el parágrafo segundo del artículo 34 de la ley 2056 de 2020.	☒	☐	☐
2	Certificado suscrito por el Director del Departamento Administrativo de Planeación y quien haga sus veces, en el cual se evidencie la concordancia con el Plan de Desarrollo departamental vigente.	☒	☐	☐
3	Certificado suscrito por el Director del Departamento Administrativo de Planeación y quien haga sus veces, en el cual se evidencie la concordancia con el Plan de Ordenamiento territorial del Departamento POTDCAS	☒	☐	☐

Observaciones Consecutivas de la Oficina de Programación de Inversión
Acuerdo 81 de 2014 Concejo de Aguazul
Ordenanza 1021 de 2020 Asamblea Departamental de Casanare por la cual se crea el Departamento de Rentas y Gestión de Impuestos
Ley 1454 de 2011 Por la cual se dictan normas orgánicas para el ordenamiento territorial

2.2 Se anexa a este informe, la imagen de la lista de verificación de requisitos para proyectos de inversión, formato FO-PDD-23 y oficio de devolución de proyecto con radicado 20240813-0057.

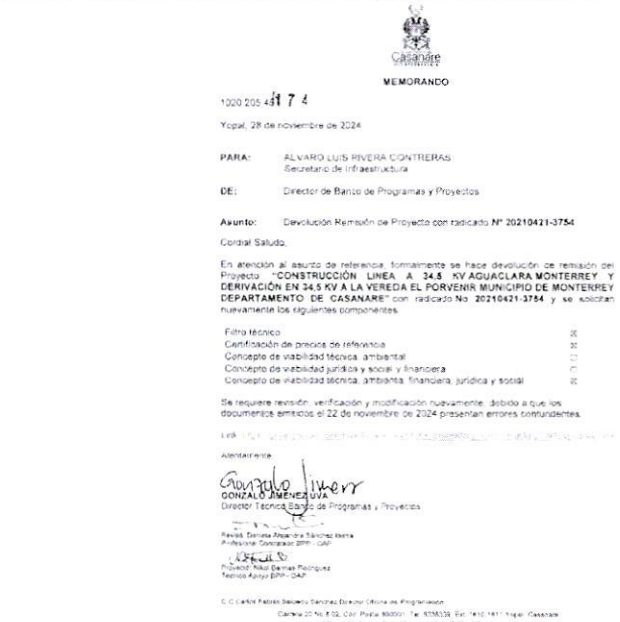

MEMORANDO

1020 205 45 1 7 4

Yopal, 28 de noviembre de 2024

PARA: ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
Secretario de Infraestructura

DE: Director de Banco de Programas y Proyectos

Asunto: Devolución Remisión de Proyecto con radicado Nº 20210421-3754

Cordial Saludo,

En atención al asunto de referencia, formalmente se hace devolución de remisión del Proyecto "**CONSTRUCCIÓN LINEA A 34.5 KV AGUACLARA MONTERREY Y DERIVACIÓN EN 34.5 KV A LA VEREDA EL PORVENIR MUNICIPIO DE MONTERREY DEPARTAMENTO DE CASANARE**" con radicado No. **20210421-3754** y se solicitan nuevamente los siguientes componentes.

Filtro técnico	X
Certificación de precios de referencia	X
Concepto de viabilidad técnica, ambiental	
Concepto de viabilidad jurídica y social, y financiera	
Concepto de viabilidad técnica, ambiental, financiera, jurídica y social	X

Se requiere revisión, verificación y modificación nuevamente, debido a que los documentos arribados el 22 de noviembre de 2024 presentan errores contundentes.

Cordialmente,

GONZALO JIMENEZ UVA
Director Técnico Banco de Programas y Proyectos

Revisó: Tatiana Alejandra Sánchez Ibarra
Profesional Contratista BPP- DAP

Proyectó: Nilsi Damaris Rodríguez
Técnico Apoyo BPP- DAP

C.C. Carlos Fabián Salcedo Sánchez Director Oficina de Programación

Carrera 20 No. 8-02, Cdr. Porta 85000 - Tel. 6358339, Ext. 1410,1411 Yopal - Casanare



CONCEPTO DE VIABILIDAD JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA PROYECTOS DE INVERSION

FO-PDD-23
04-03-2021
V.05

Yopal, Noviembre 21 de 2024

1. INFORMACIÓN BASICA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN LINEA A 34.5KV AGUA CLARA MONTERREY Y DERIVACIÓN EN 34.5 KV A LA VEREDA EL PORVENIR MUNICIPIO DE MONTERREY DEPARTAMENTO DE CASANARE"

1.1 CODIGO BPIN: 20740053500[illegible]

1.2 META: 213 Construir, Repotenciar, mantener y adecuar

- Redes del sistema de transmisión regional nuevas 29,7 Km.

1.3 INDICADOR: Redes del Sistema de transmisión regional mejorada.

- Utilización De La Capacidad De Red.

1.4 OBJETIVO DEL PROYECTO:

Mejorar la calidad de la prestación del servicio de energía eléctrica en los municipios de Sabanalarga y Monterrey del departamento de Casanare

1.5 PRODUCTOS DEL PROYECTO:

- Redes del sistema de transmisión regional nuevas (Producto principal que desarrolla)
- Otra (electrica o industrial)
- Red de media tensión (31,5 kV)
- Apantallamiento red 34,5 Kv
- Red de media tensión (13,2 Kv)
- Red de fibra optica

29,7 kilometros de redes del sistema de transmisión regional mejorado

1.7 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO:

16.157 habitantes/usuarios


Las acciones propias en el Proyecto beneficien a una población objetivo de aproximadamente 2.043 habitantes que corresponden a los habitantes de la cabecera de Monterrey y Sabanalarga Casanare.

1.8 VALOR DEL PROYECTO: (incluyendo los recursos propios y costos indirectos cuando aplique y que no incluyan costos asociados a otros proyectos. M/Cte ($19.344.192.855,00)

Aportante	Fuente de financiación	Valor por fuente de financiación	Vigencia

Carrera 20 No. 8-02, Cdr. Porta 85000 - Cel. Fax: 6358339, Ext. 1410, 1411 Yopal, Casanare
www.casanare.gov.co - programacion@casanare.gov.co

Fdo 23

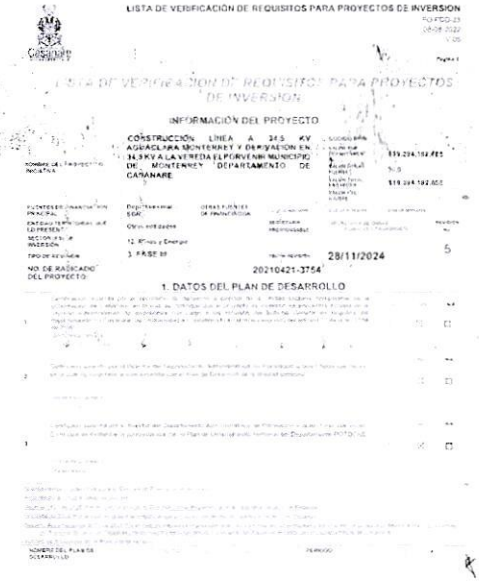

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA PROYECTOS DE INVERSION

FO-PDD-23
04-03-2021
V.05

Página 1

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA PROYECTOS DE INVERSION

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO/ INICIATIVA	CONSTRUCCIÓN LINEA A 34.5 KV AGUACLARA MONTERREY Y DERIVACION EN 34.5KV A LA VEREDA EL PORVENIR MUNICIPIO DE MONTERREY DEPARTAMENTO DE CASANARE
CODIGO BPIN	20740053500[illegible]
VALOR TOTAL	$19.344.192.855
VALOR FUENTES DE FINANCIACIÓN	$19.344.192.855
FUENTES DE FINANCIACIÓN PRINCIPAL	Departamental SGR
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN	
ENTIDAD QUE LO PRESENTA	Otra entidad pública
SECTOR DE LA INVERSIÓN	12. Minas y Energía
TIPO DE INVERSIÓN	3. FASE III
FECHA RADICADO	28/11/2024
NO. DE RADICADO DEL PROYECTO	20210421-3754

1. DATOS DEL PLAN DE DESARROLLO

1		SI / NO
2		SI / NO
3		SI / NO

NOMBRE DEL PLAN DE DESARROLLO

PERIODO

2.3 Se anexa a este informe, la imagen de la lista de verificación de requisitos para proyectos de inversión, formato FO-PDD-23 y oficio de devolución de proyecto con radicado 20210421-3754.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018501856		SANCHEZ IBARRA DANIELA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 28#20-32	YOPAL-CASANARE	3148265504	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1097595732	9477854959	I	2024/12/12	2024/12/03	BANCOLOMBIA	0	$518,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,000	$0	$0	$280,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,000	$0	$0	$280,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0	$0	$10,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$10,500	$0	$0	$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,800	$0	$0	$218,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,800	$0	$0	$218,800
TOTAL				1	$518,500	$0	$0	$518,500
