1. FECHA ELABORACIÓN:	16 12 24	2. No. INFORME	1	3. SEMANA No.	1
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	GRUPO 4	5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	BOSA - CIUDAD BOLIVAR - TUNJUELITO		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19 11 24	8. VALOR CONTRATO:	$ 2,354,314,500
9. FECHA ACTA INICIO:	9 12 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31 12 24	11. PLAZO:	22 Días
12. PRORROGAS:		13. SUSPENSIONES:	Meses/días	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.				
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL				
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26 11 24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284,682,402
20. FECHA ACTA INICIO:	9 12 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15 1 25	22. PLAZO:	37 Días
23. PRORROGAS:		24. SUSPENSIONES:	Meses/días	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC				
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA				

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
DIAGNÓSTICO	2%	2%	**Se realizaron las respectivas visitas a las sedes**	
PRELIMINARES	0%	0%		
ESTRUCTURA	0%	0%		
MAMPOSTERÍA	0%	0%		
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	0%	0%		
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0%	0%		
ACABADO PISOS	0%	0%		
ACABADO MUROS	0%	0%		
CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE	0%	0%		
CARPINTERÍA DE MADERA	0%	0%		
CIELORRASOS	0%	0%		
VENTANERIA, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%		
PUERTAS	0%	0%		
CUBIERTAS	0%	0%		
OBRAS EXTERIORES	0%	0%		
CERRAMIENTO	0%	0%		
ASEO GENERAL	0%	0%		
TOTAL	2%	2%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

Durante el periodo	2%	2%	0%
Acumulado Actual	2%	2%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	-	-
Valor de la Obra Programada	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	-	-
Valor de la Obra Ejecutada	0%	0%

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA


35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	-			LUNES	N/A
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	-			MARTES	N/A
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	-			MIERCOLES	N/A
MAESTRO	-			JUEVES	N/A
OFICIAL	-			VIERNES	N/A
AYUDANTE	-			SÁBADO	N/A
RESIDENTE	-			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la semana comprendida desde el 16/12/2024 hasta el 22/12/2024 la interventoría adelantará las respectivas revisiones y aprobaciones según corresponda y en medida que el contratista realice la entrega respectiva de los requerimientos.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante la semana comprendida desde el 09/12/2024 hasta el 15/12/2024 se adelantaron las visitas correspondientes a las 13 sedes que comprenden el grupo 4 con el fin de elaborar los diagnósticos.



Nombre Residente: Luis Oswaldo Campaña
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	16 12 24	No. INFORME	1	SEMANA No.	1
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.				
CONTRATO OBRA No:	9198-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9221-2024	INTEVENTORÍA	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA FOTO: 10/12/2024
DESCRIPCIÓN: Visita Jardín Infantil Torito Feliz



FECHA FOTO: 10/12/2024
DESCRIPCIÓN: Visita Centro de Desarrollo Comunitario Porvenir



FECHA FOTO: 10/12/2024
DESCRIPCIÓN: Visita Jardín Social Ojos de Perdiz

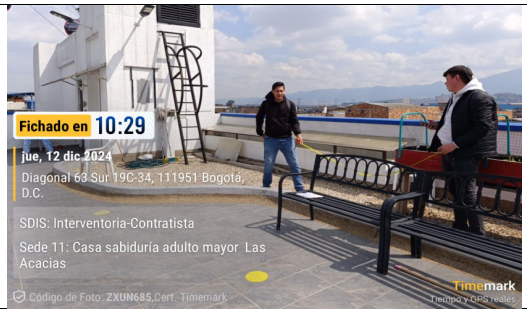

FECHA FOTO: 12/12/024
DESCRIPCIÓN: Visita Casa Sabiduria Adulto Mayor Las Acacias



FECHA FOTO: 12/12/2024
DESCRIPCIÓN: Visita Casa Sabiduria Adulto Mayor Sierra Morena



FECHA FOTO: 12/12/2024
DESCRIPCIÓN: Visita Jardín Infantil Rincón Ardillitas
