LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 4643-2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON

Contrato de Interventoría No. 4297-2023 **Interventoría:** PROYECTO SANABRIA SAS

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 4 **MES O PERIODO:** Febrero

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	13
1	**INTRODUCCIÓN**		14
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		14
2.1	Localización		14
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		15
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		15
2.4	Características técnicas del proyecto		16
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		18
3.1	Información general del contrato		18
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		19
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		19
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		19
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		19
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	19
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	24
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	24
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	24
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	24
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	24
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	24
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N/A
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		26
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	26
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	26
	• Seguimiento Programa de Obra		26
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	26
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	26
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	27
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	27
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		27
5.1	Información general del contrato		27
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		27
5.3	Informes especialistas y profesionales		N/A
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		27
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	28
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	28
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	30
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	30
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	32
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		32
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	32
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	32
7	**Conclusiones y recomendaciones**		32
8	**Anexos**		32
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		32
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		32
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		32

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 049 **de fecha** 27 DE NOVIEMBRE DE 2023

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 4053-2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA

Contrato de Interventoría No. 4297-2023 **Interventoría:** PROYECTO SANABRIA SAS

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 4 **MES O PERIODO:** Febrero

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	35
1	**INTRODUCCIÓN**		36
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		36
2.1	Localización		36
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		37
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		37
2.4	Características técnicas del proyecto		38
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		40
3.1	Información general del contrato		40
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		41
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		41
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		41
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		41
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	41
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	46
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	46
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	47
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	47
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	47
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	47
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N/A
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		49
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra		N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	50
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		50
5.1	Información general del contrato		50
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		50
5.3	Informes especialistas y profesionales		N/A
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	50
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	52
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	53
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	53
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N/A
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	54
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	**Conclusiones y recomendaciones**		55
8	**Anexos**		55
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		55
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		55
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		55
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		55

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 049 **de fecha** 27 DE NOVIEMBRE DE 2023

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3809-2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA

Contrato de Interventoría No. 4297-2023 **Interventoría:** PROYECTO SANABRIA SAS

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN ELDEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 4 **MES O PERIODO:** Febrero

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	3
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	58
1	**INTRODUCCIÓN**		59
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		59
2.1	Localización		59
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		60
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		60
2.4	Características técnicas del proyecto		61
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		63
3.1	Información general del contrato		63
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		64
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		64
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		64
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		64
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	64
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	69
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	69
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	69
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	69
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	69
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	69
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	72
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		72
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra		N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	72
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		72
5.1	Información general del contrato		72
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		72
5.3	Informes especialistas y profesionales		N/A
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		73
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	73
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	75
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	76
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	77
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N/A
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	77
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	**Conclusiones y recomendaciones**		77
8	**Anexos**		77
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		N/A
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		77
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N/A

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 049 **de fecha** 27 DE NOVIEMBRE DE 2023

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3980-2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HABANA

Contrato de Interventoría No. 4297-2023 **Interventoría:** PROYECTO SANABRIA SAS

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 4 **MES O PERIODO:** Febrero

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	4
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	80
1	**INTRODUCCIÓN**		81
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		81
2.1	Localización		81
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		82
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		82
2.4	Características técnicas del proyecto		82
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		85
3.1	Información general del contrato		85
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		86
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		86
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		86
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		86
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	86
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	91
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	91
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N/A
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N/A
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N/A
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	91
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N/A
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		94
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	94
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	94
	• Seguimiento Programa de Obra		N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	94
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		94
5.1	Información general del contrato		94
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		95
5.3	Informes especialistas y profesionales		95
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		95
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	95
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	95
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	97
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	98
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N/A
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	99
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	**Conclusiones y recomendaciones**		99
8	**Anexos**		99
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		99
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		99
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		99
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		99

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 049 **de fecha** 27 DE NOVIEMBRE DE 2023

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

PROYECTO SANABRIA SAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA

N.º 4297-2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA.

CONVENIO N.º 4643-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL EL JAPON

CONVENIO N.º 4053-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA

CONVENIO N.º 3809-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL LA ATARRAYA

CONVENIO N.º 3980-2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL LA HABANA

INFORME MENSUAL N.º 04

PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Contenido

I. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL 12

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-1 12

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO - MEPI-MN1-IN-15-FR-2 13

1. INTRODUCCION 14

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 14

2.1. LOCALIZACION 14

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 15

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA 15

2.4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 16

3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA 18

3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO 18

3.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 19

3.2.1. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 19

3.2.2. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL 19

3.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS 19

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA 19

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA 19

4.1. INFORME SEMANAL 19

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 24

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 24

4.4. ACTA MENSUAL DE PAGOS CONVENIO 24

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 24

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 24

4.7. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 24

4.8. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 26

4.8.1. INFORME INVERSIÓN BUEN MANEJO DESEMBOLSO 26

4.8.2. PLAN INVERSIÓN DESEMBOLSO MENSUAL 26

4.8.3. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 27

4.8.4. ACTAS DE REUNION 27

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 27

5.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 27

5.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 27

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES 27

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 27

6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 28

6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 28

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 30

6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 30
6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 32
6.5.1. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO 32
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 32
8. ANEXOS 32
8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO 32
8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS 32
8.3. COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE 32
II. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL 34
LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-1 34
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO - MEPI-MN1-IN-15-FR-2 35
1. INTRODUCCION 36
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 36
2.1. LOCALIZACION 36
2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 37
2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA 37
2.4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 38
3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA 40
3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO 40
3.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 41
3.2.1. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 41
3.2.2. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL 41
3.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS 41
3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA 41
4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA 41
4.1. INFORME SEMANAL 41
4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 46
4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 46
4.4. ACTA MENSUAL DE PAGOS CONVENIO 47
4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 47
4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 47
4.7. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 47
4.8. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 49
4.8.1. INFORME INVERSIÓN BUEN MANEJO DESEMBOLSO 49
4.8.2. PLAN INVERSIÓN DESEMBOLSO MENSUAL 49
4.8.3. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 49
4.8.4. ACTAS DE REUNION 50
5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 50

5.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 50
5.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 50
5.3. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES 50
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 50
6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 50
6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 52
6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 53
6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 53
6.4.1. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO 55
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 55
8. ANEXOS 55
8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO 55
8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS 55
8.3. COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE 55
III. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN ELDEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL 57
LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-1 57
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO - MEPI-MN1-IN-15-FR-2 58
1. INTRODUCCION 59
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 59
2.1. LOCALIZACION 59
2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 60
2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA 60
2.4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 61
3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA 63
3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO 63
3.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 64
3.2.1. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 64
3.2.2. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL 64
3.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS 64
3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA 64
4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA 64
4.1. INFORME SEMANAL 64
4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 69
4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 69
4.4. ACTA MENSUAL DE PAGOS CONVENIO 69
4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 69
4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 69
4.7. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 69

4.8. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 72
4.8.1. INFORME INVERSIÓN BUEN MANEJO DESEMBOLSO 72
4.8.2. PLAN INVERSIÓN DESEMBOLSO MENSUAL 72
4.8.3. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 72
4.8.4. ACTAS DE REUNION 72
5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 72
5.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 72
5.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 72
5.3. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES 73
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 73
6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 73
6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 73
6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 75
6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 76
6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 77
6.5.1. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO 77
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 77
8. ANEXOS 77
8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO 77
8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS 77
8.3. COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE 77
IV. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN ELDEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL 79
LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-1 79
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO - MEPI-MN1-IN-15-FR-2 80
1. INTRODUCCION 81
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 81
2.1. LOCALIZACION 81
2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 82
2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA 82
2.4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 83
3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA 85
3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO 85
3.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 86
3.2.1. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 86
3.2.2. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL 86
3.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS 86
3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA 86
4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA 86

4.1. INFORME SEMANAL 86
4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 91
4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 91
4.4. ACTA MENSUAL DE PAGOS CONVENIO 91
4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 91
4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 91
4.7. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 91
4.8. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 94
4.8.1. INFORME INVERSIÓN BUEN MANEJO DESEMBOLSO 94
4.8.2. PLAN INVERSIÓN DESEMBOLSO MENSUAL 94
4.8.3. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 94
4.8.4. ACTAS DE REUNION 94
5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 94
5.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 94
5.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 94
5.3. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES 95
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 95
6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 95
6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 95
6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 97
6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 98
6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 99
6.5.1. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO 99
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 99
8. ANEXOS 99
8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO 99
8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS 99
8.3. COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE 99

CONVENIO N.º 4643-2023
JUNTA DE ACCION COMUNAL EL JAPON

I. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 4643-2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON

Contrato de Interventoría No. 4297-2023 **Interventoría:** PROYECTO SANABRIA SAS

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 4 **MES O PERIODO:** Febrero

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	13
1	**INTRODUCCIÓN**		14
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		14
2.1	Localización		14
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		15
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		15
2.4	Características técnicas del proyecto		16
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		18
3.1	Información general del contrato		18
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		19
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		19
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		19
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		19
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	19
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	24
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	24
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	24
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	24
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	24
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	24
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N/A
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		26
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	26
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	26
	• Seguimiento Programa de Obra		26
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	26
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	26
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	27
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	27
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		27
5.1	Información general del contrato		27
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		27
5.3	Informes especialistas y profesionales		N/A
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		27
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	28
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	28
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	30
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	30
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	32
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		32
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	32
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	32
7	**Conclusiones y recomendaciones**		32
8	**Anexos**		32
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		32
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		32
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		32

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO - MEPI-MN1-IN-15-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	
FECHA (Día / Mes / Año)	6/03/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** FEBRERO

CONVENIO No.: 4643-2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 19/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024
PLAZO ACUMULADO: 4 MESES

VALOR INICIAL : $ 194.052.521,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
DE SEMBOLSO CONCEDIDO: $ 193.052.521,00
DE SEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4297-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTO SANABRIA SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** SANTIAGO HERNANDEZ RENDON

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento		
Estructuras	Alcantarillas	UND	6
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento			
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 145.302.830,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.359.085,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.390.606,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 194.052.521,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 9.296.794,00	$ 9.296.794,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 4.318.999,00	$ 6.297.023,00
VALOR EJECUTADO	$ 13.615.793,00	$ 15.593.817,00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoria al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 6.672.903,50
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 8

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Junta de Accion Comunal, Entrega de dotacion

Foto 3

Indicar la localización y actividad.

Foto 5

Indicar la localización y actividad.



Vereda el Japon, Entrega de Dotacion al personal

Foto 4

Indicar la localización y actividad.

Foto 6

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

A LA FECHA NO SE PRESENTAN MULTAS O SANCIONES AL CONVENIO

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCION

El proyecto **"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA"** entre el Instituto Nacional De Vías y las juntas de acción comunal beneficiadas del Municipio de La Dorada, del cual se ejecuta en el SECOP mediante proceso SPSC-CD-CS-1015-2023, se celebra el convenio 4643-2023 que tiene por objeto "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**" tiene como objetivo fundamental lo siguiente:

Ejecutar donde sea necesario el contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

Con lo cual se brinde una infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transitabilidad para los usuarios de las vías, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente, cómoda y segura; por lo tanto, con la ejecución de este proyecto, el Instituto busca el cumplimiento de uno de los fines constitucionales del estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte terrestre y apoyar al desarrollo de la política de intermodalidad del transporte para de esta manera apoyar y contribuir con el Desarrollo Económico de la región.

La firma **PROYECTO SANABRIA SAS**, presenta a consideración del **INVIAS, EL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Nº 04** correspondiente al periodo comprendido entre el **01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**, en este se detallan las actividades realizadas por el Contratista y la Interventoría en el mes.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en la Vereda El Japón, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.537000, longitud -74.683556 y punto de referencia final el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.744600 y longitud -74.676130 y punto de referencia final el PR 2+600 con coordenadas latitud 5.765760 y longitud -74.675210, de la vía Buenavista - El Japón de La Dorada, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

2.1. LOCALIZACION

El municipio de La Dorada se encuentra localizado en la zona Oriente del departamento de Caldas, dista 175 kilómetros de la ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con la ganadería, le sigue la agricultura, la minería del oro, el comercio, la pequeña industria y la pesca, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 574 Km cuadrados de los cuales solo 29.30 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de La Dorada se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 5.4538 - Longitud: -74.6646

El tramo a intervenir en la vereda El Japón se localiza en las siguientes coordenadas:

Punto Inicial: Latitud 5.537000 - Longitud -74.683556
Punto Final: Latitud 5.534694 - Longitud -74.684819

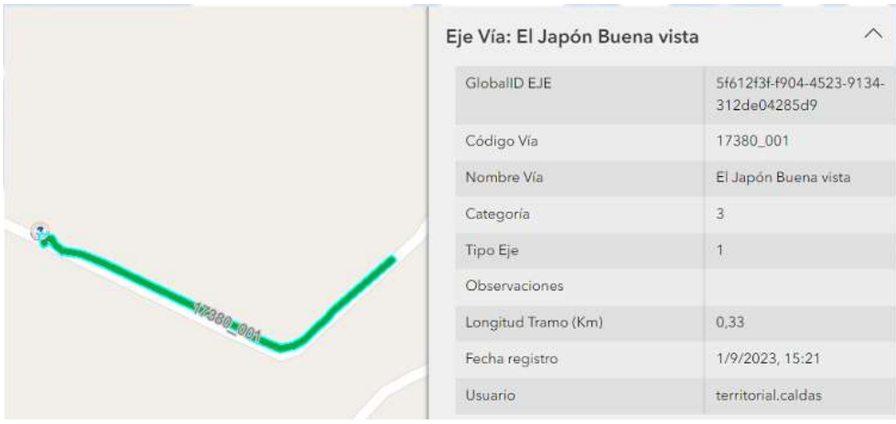


Ilustración 1 - Localización del tramo a intervenir en la vereda El Japón
Fuente. ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS JAC EL JAPON

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Los municipios directamente influenciados por el proyecto son Norcasia y La Dorada en sus veredas El Japón, Buenavista, La Atarraya, el Tigre, Brisas y La Agustina. Adicionalmente, con la atención de dichas vías se pretende entregar a la comunidad una vía en óptimas condiciones de transitabilidad y seguridad, con lo cual sería una alternativa más económica para el transporte de pasajeros y de carga en el departamento.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA

El convenio cuyo objeto es el **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL,** el cual comprende un tramo de 330 metros lineales a intervenir, tiene existente una batea, la cual ha perdido su funcionalidad con el paso del tiempo, puesto que en las épocas de invierno que afronta el municipio, el cauce del río sobrepasa el nivel de la via en más de 1.2m de altura lo cual impide el paso vehicular y deja incomunicadas las veredas en la zona de influencia.

El tramo a intervenir en la vereda El Japón se localiza en las siguientes coordenadas:

Punto Inicial: Latitud 5.537000 - Longitud -74.683556
Punto Final: Latitud 5.534694 - Longitud -74.684819



Ilustración 2 – Estado actual de la vía a intervenir en La Vereda El Japón

2.4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la importancia del mejoramiento de la vía en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total del municipio de La Dorada en la vereda El Japón, se realizarán las siguientes actividades:

- Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías.

- Mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

El alcance del convenio 4643-2023 que tiene por objeto **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, corresponde a todas y cada una de las obras y actividades contenidas en los documentos contractuales del contrato de obra.

La vía rural de la vereda El Japon a intervenir será objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en el marco de la ejecución del contrato No. 4297 DE 2023 entre Proyecto Sanabria SAS y el INVIAS, como parte del programa Caminos comunitarios de la paz total.

Para la ejecución de las obras se utilizará como guía la cartilla **OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL.**

Para la construcción de las alcantarillas se cita de dicha cartilla en su numeral 4. ALCANTARILLAS, del cual se copia textualmente:

"La alcantarilla circular, como elemento de drenaje transversal, es un tubo de dimensión mínima de 36" (0.90 m), siguiendo los lineamientos del Manual de Drenaje Para Carreteras, la cual tiene dos tipos de configuración. La primera es tipo poceta-aleta, la cual es apta para recolectar y evacuar a través de la estructura de vía, la escorrentía de origen superficial y subsuperficial, aportante por las cunetas y/o filtros. La segunda configuración tipo aleta-aleta permite, además de recibir y evacuar la escorrentía aportante por las cunetas y filtros, dar continuidad a cauces con flujos intermitentes o efímeros.

La profundidad de instalación de la tubería deberá satisfacer los requerimientos geotécnicos de la cimentación y estructurales del tipo de tubería seleccionada durante y después de la construcción. En el numeral 4.4 del Manual de Drenaje para Carreteras se desarrolla todos los aspectos a ser considerados para su diseño. Desde el punto de vista seguridad de ser posible por las condiciones locales de la topografía del terreno, los muros cabezales en el caso de la configuración aleta - aleta y/ o poceta - aleta, se podrían localizar lo más lejanos del borde externo de la calzada, siempre y cuando no se excedan los límites del derecho de vía ni que esta prolongación afecte el presupuesto de la obra. La longitud del ancho sugerido para la poceta es de 1.80 m, sin embargo, si las condiciones constructivas y económicas no lo permite, se podrá disminuir hasta 1.50 m, el cual es el mínimo sugerido por Manual de Drenaje para carreteras (2009).


Durante la etapa de construcción de las alcantarillas se deben considerar en un todo las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVÍAS, 2013 y de manera particular los artículos 600-13, 610-13, 630-13, 640-13 y los relacionados con el tipo de tubería artículos 661-13 y 663-13. Considerando los anteriores elementos como los más esenciales para el drenaje de una vía terciaria, en los siguientes planos se presenta los esquemas típicos para una alcantarilla tipo poceta-aleta, tubería en concreto reforzado, tubería plástica, cuneta y filtro.


Las dimensiones que se señalan toman en consideración los valores mínimos que en materia de diseño geométrico e hidráulico han sido establecidos en los diferentes Manuales del Instituto Nacional de Vías, por tal razón corresponden a modelos que pueden ser modificados dependiendo de las particularidades de cada proyecto y de las condiciones locales asociadas a la topografía, estabilidad del suelo, volúmenes de escorrentía a evacuar, tipo de encole o de descole, criterios de seguridad vial, cimentación del tipo de tubería seleccionada, etc.


Este capítulo presenta los esquemas típicos de las obras de drenaje tipo alcantarilla circular sencilla, obra que como mínimo se deben considerar durante el diseño de la corona de la calzada de una carretera de la red terciaria a cargo del Instituto Nacional de Vías de tal manera que con adecuado manejo de la escorrentía superficial y el flujo subsuperficial se asegure la vida útil y el estado de conservación de la misma.


Si la pendiente en el descole de la alcantarilla es mayor al 6%, se recomienda el diseño de un descole en aliviadero o disipador de energía, tal como está descrito en la sección 4.1.4.2 del Manual de Drenaje para carreteras del INVIAS (2009).”


Se presentan las secciones y detalles según la cartilla **OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL.**

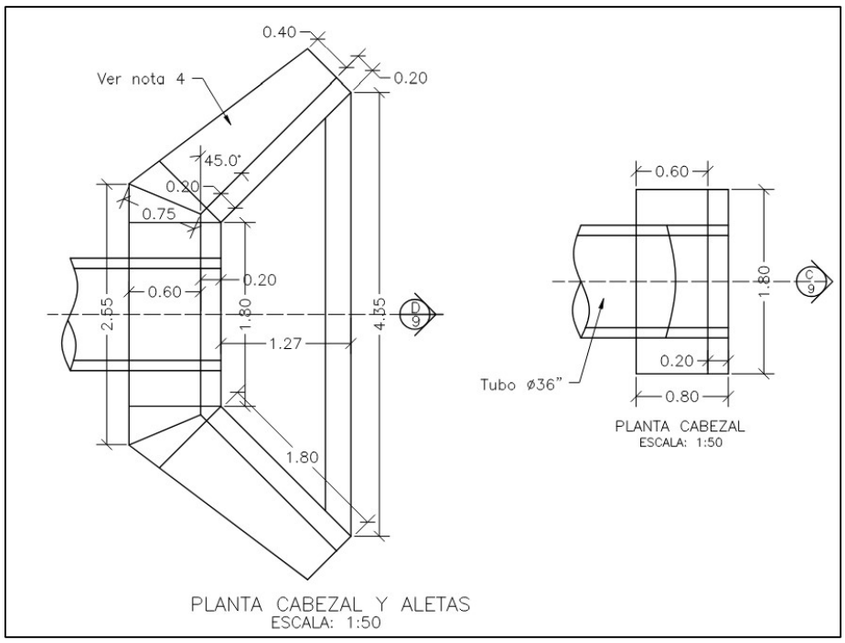

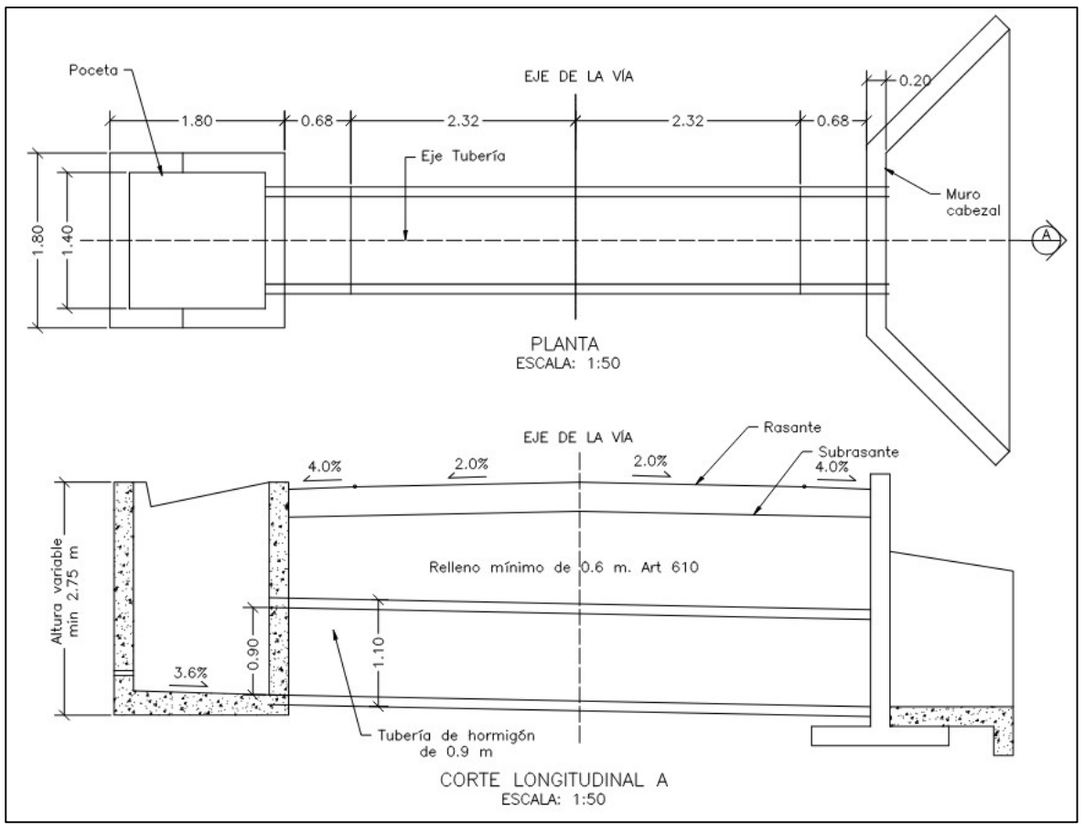

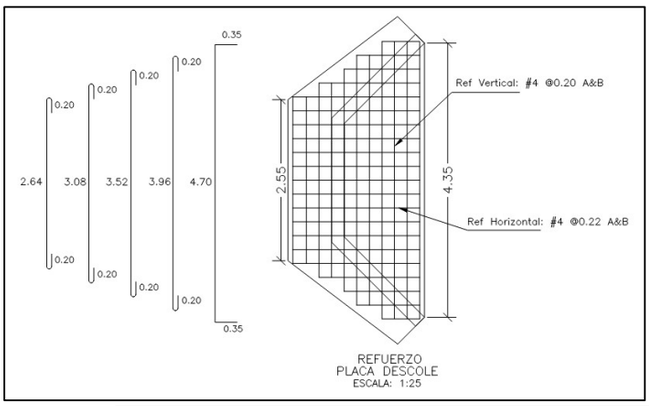

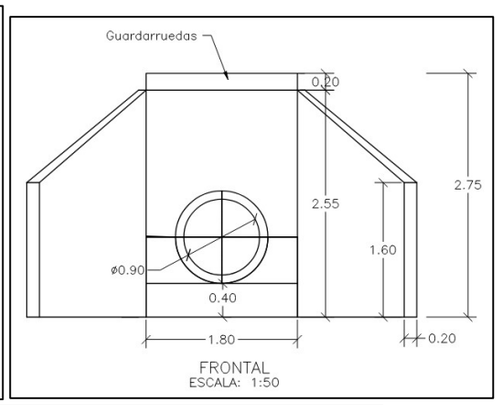

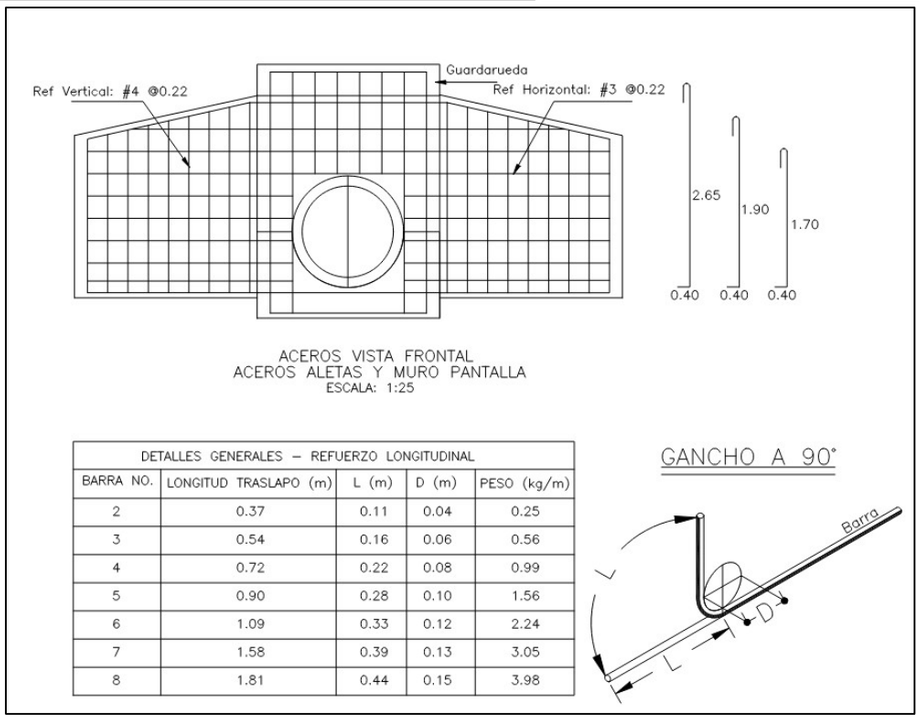

3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

Tabla 1. Informacion general del Convenio

INFORMACION GENERAL	
Contrato No.:	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4643 DE 2023
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON
NIT:	900.867.709-9
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Longitud aproximada:	330 metros lineales
Valor inicial:	$ 194.052.521,00
Adiciones:	$0,00
Valor total	$ 194.052.521,00
Plazo inicial:	TRES (03) MESES
Etapa de ejecución de las obras:	TRES (03) MESES
Fecha orden de Iniciación:	19/12/2023
Fecha de Terminación inicial:	31/12/2023

Fecha de terminación prorroga 01:	30/04/2024

Fuente: Documentos oficiales del convenio

3.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, el conveniente no ha iniciado actividades de obra, se realizaron actividades de contratación y afiliaciones del personal, la toma de topografía inicial del proyecto, se encuentran a la espera de la recepción de EPP para el inicio de las actividades, se realizó segundo comité operativo con el fin de realizar la aprobación de compras necesarias para iniciar actividades.

3.2.1. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Durante el PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, se realizó el seguimiento del plan de gestión ambiental y formatos sugeridos por INVIAS, en colaboración con la Junta de Acción.

3.2.2. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL

Durante el PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, se realizó el seguimiento al cronograma del plan de gestión social el cual se avaló y contempla todas las áreas de influencia directa de la obra, normativas de la documentación inicial y específica de la junta de acción comunal.

3.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

Durante este periodo no se presentaron items no previstos en la ejecución del convenio.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

La interventoria no evidencia un estado de avance en la obra de igual manera tomo las siguientes acciones:

- Se aprobó el cronograma de obra presentado por el contratista.
- El 19 de febrero se realiza el segundo comité operativo con la JAC, donde se aprueba la compra de materiales preliminares y dotación de personal, asi como el transporte para materiales pétreos y el pago de las polizas y sus anexos.
- Se realizo la verificación de contratos de personal de obra y administrativo.

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. INFORME SEMANAL

Para el presente mes, el contratista no ha iniciado actividades de obra, se ha realizado un cronograma por parte del contratista de obra el cual se aprobó, por otro lado, desde la interventoria se ha iniciado con el diligenciamiento de los informes semanales desde la orden de inicio del contrato de interventoria Nº 4297-2023

Adjunto se encuentran los informes semanales correspondiente al mes de febrero 2024, formato técnico MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

1. Informe semanal 11 - 01- 08 feb 2024
2. Informe semanal 12 - 08 al 15 feb 2024
3. Informe semanal 13 - 15 al 22 feb 2024
4. Informe semanal 14 - 22 al 29 feb 2024

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 04

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CODIGO	
		VERSION	
		PAGINA	

FECHA: 12/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CALDAS** SEMANA No.: **11** del **1/02/2024** al **8/02/2024** Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **Santiago Hernández Rendón** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de la Dorada del departamento de Caldas, en la vereda El Japón, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.537000, longitud -74.683556 y punto de referencia final el PR 0+330 con coordenadas latitud 5.534694, longitud 74.684819, de la vía Vereda El Japón de La Dorada conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON			INTERVENTOR:	PROYECTOS SANABRIA SAS.		
				INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	4643- 2023	VALOR INICIAL:	$ 194.052.521,00	CONTRATO No.	4297-2023	VALOR INICIAL:	$ 79.541.151,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ 36.326.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 194.052.521,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 115.868.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 194.052.521,00	$ 194.052.521		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 194.052.521,00	$ 194.052.521		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 194.052.521,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1.978.023,72	1,02%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 6.614.557,00	3,41%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.978.023,72	1,02%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (4.636.533,28)	-2,39%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 927.306,60	0,48%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: A la fecha se aprobaron las polizas del convenio por un valore de 1,978.023,72

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 115.868.149,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.910.720,00	7,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.970.240,00	2,56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.970.240,00	2,56%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajeria instantanea

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 0% Avance o Atraso Físico %: 0%

Meta Física Ejecutada %: 0%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*		
*		
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoria, se realiza la socializacion del proyecto el dia 27 de enero y se ha realizado el acompañamiento desde el plan de gestion social.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua con el seguimiento y apoyo conjunto a los presidentes de las JAC, con el fin de resolver dudas y aclarar temas pertinentes con respecto al proyecto en marcha para su comunidad.
Se realiza la socializacion en conjunto con el personal de la JAC y la Interventoria el dia 27 de enero de 2024.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Programacion de comité operativo para aprobacion de compras de dotacion, materiales, EPP y demas que se presente por el contratista

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se ha brindado acompañamiento al contratista mediante llamadas y mensajes con el fin de agilizar el inicio de las actividades

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Paula A. Ramirez

NOMBRE: PAULA A. RAMIREZ

Matrícula Profesional No.: 25202-402196 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 04

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CODIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	

FECHA: 20/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS — SEMANA No.: 12 del 8/02/2024 al 15/02/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Santiago Hernández Rendón — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vias, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de la Dorada del departamento de Caldas, en la vereda El Japón, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.537000, longitud -74.683556 y punto de referencia final el PR 0+330 con coordenadas latitud 5.534694, longitud 74.684819, de la vía Vereda El Japón de La Dorada conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON			INTERVENTOR:	PROYECTOS SANABRIA SAS.		
				INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	4643- 2023	VALOR INICIAL:	$ 194.052.521,00	CONTRATO No.	4297-2023	VALOR INICIAL:	$ 79.541.151,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ 36.326.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 194.052.521,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 115.868.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 194.052.521,00	$ 194.052.521		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 194.052.521,00	$ 194.052.521		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO		
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 194.052.521,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.631.887,25	0,84%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.631.887,25)	-0,84%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1.978.023,72	1,02%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 9.751.270,46	5,03%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.978.023,72	1,02%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (7.773.246,74)	-4,01%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.136.713,46	1,62%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: A la fecha se aprobaron las polizas del convenio por un valore de 1.978.023,72

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 115.868.149,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.910.720,00	7,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.970.240,00	2,56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.970.240,00	2,56%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajeria instantanea

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 1,12% — Avance o Atraso Físico %: -1,12%
Meta Física Ejecutada %: 0,00%

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Excavaciones varias sin calificar	m3	67,43

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	67,43			67,43	1,1%
Ejec	0			0	0,0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Sector Batea — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoria, se realizo la socializacion del proyecto el dia 27 de enero

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se solicito la suspension del convenio puesto que no se habia realizado el desembolso del dinero para iniciar la respectiva ejecucion, la cual no se aprobo puesto que ya se realizo el dia 14 de febrero.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se remitiran las cotizaciones actualizadas pendientes para aprobacion en el plan de compras

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Se ha brindado acompañamiento al contratista mediante llamadas y mensajes con el fin de agilizar el inicio de las actividades.	FIRMA: Paula A. Ramirez NOMBRE: PAULA A. RAMIREZ Matrícula Profesional No.: 25202-402196 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 04

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CODIGO	
	VERSIÓN	
	PAGINA	

FECHA: (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

SEMANA No.: 13 del 15/02/2024 al 22/02/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Santiago Hernández Rendón — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vias, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de la Dorada del departamento de Caldas, en la vereda El Japón, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.537000, longitud -74.683556 y punto de referencia final el PR 0+330 con coordenadas latitud 5.534694, longitud 74.684819, de la via Vereda El Japón de La Dorada conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON		INTERVENTOR:	PROYECTOS SANABRIA SAS.	
			INTEGRANTES:		
CONVENIO No.	4643- 2023	VALOR INICIAL: $ 194.052.521,00	CONTRATO No.	4297-2023	VALOR INICIAL: $ 79.541.151,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES: $ 36.326.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 194.052.521,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 115.868.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
					VALOR AMORTIZADO: $ -
					SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 194.052.521,00	$ 194.052.521		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 194.052.521,00	$ 194.052.521		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 194.052.521,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 4.074.832,17	2,10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (4.074.832,17)	-2,10%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 1.978.023,72	1,02%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 14.702.259,07	7,58%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.978.023,72	1,02%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (12.724.235,35)	-6,56%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.950.988,61	2,55%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: A la fecha se aprobaron las polizas del convenio por un valore de 1.978.023,72, se encuentra en revision el plan de compras Nº 1

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 115.868.149,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.910.720,00	7,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.970.240,00	2,56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.970.240,00	2,56%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajeria instantanea

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 2,80% — Avance o Atraso Físico %: 0%

Meta Física Ejecutada %: 0%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Excavaciones varias sin calificar	m3	157,33
Rellenos para estructuras con material de la excavación	m3	12,18

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	157,33			157,33	2,62%
Ejec	0			0	0,00%
Prog	12,18			12,18	0,18%
Ejec	0			0	0,00%
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Sector Balsa — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ..... NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ..... NO .....
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ..... NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ..... NO .....

OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitidomateriales al frente de obra

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual):	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12 — Tienda Paola

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoria, se realizo la socializacion del proyecto el dia 27 de enero

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realiza el segundo comité operativo donde se aprueba la compra de EPP, y materiales para dar inicio a las actividades preliminares

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Verificacion en campo de actividades tras entrega de estudio topografico

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se ha brindado acompañamiento al contratista mediante llamadas y mensajes con el fin de agilizar el inicio de las actividades.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Paula A. Ramirez

NOMBRE: PAULA A. RAMIREZ

Matrícula Profesional No.: 25202-402198 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 04

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CODIGO	
		VERSION	
		PAGINA	
		FECHA	9/03/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CALDAS** — SEMANA No.: **14** del **22/02/2024** al **29/02/2024** Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **Santiago Hernández Rendón** — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de la Dorada del departamento de Caldas, en la vereda El Japón, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5,537000, longitud -74.683556 y punto de referencia final el PR 0+330 con coordenadas latitud 5.534694, longitud 74.684819, de la via Vereda El Japón de La Dorada conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON		INTERVENTOR:	PROYECTOS SANABRIA S.A.S.	
			INTEGRANTES:		
CONVENIO No.	4643- 2023	VALOR INICIAL: $ 194.052.521,00	CONTRATO No.	4297-2023	VALOR INICIAL: $ 79.541.151,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES: $ 36.326.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 194.052.521,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 115.868.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
					VALOR AMORTIZADO: $ -
					SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 194.052.521,00	$ 194.052.521		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 194.052.521,00	$ 194.052.521		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 194.052.521,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 23.484.980,55	12,10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 9.290.794,00	4,79%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 14.188.186,55	7,31%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 6.297.022,72	3,25%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.142.779,92	10,38%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15.593.816,72	8,04%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 4.548.963,20	2,34%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.443.520,85	2,80%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.615.793,00	7,02%

Observaciones: A la fecha se aprobaron las polizas del convenio por un valor de 1.978.023,72, se encuentra en revisión y aprobacion el plan de compras N° 1

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 115.868.149,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.910.720,00	7,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.970.240,00	2,56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.970.240,00	2,56%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajeria instantanea

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 4,59% — Avance o Atraso Físico %: 5%
Meta Física Ejecutada %: 0%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Excavaciones varias sin calificar	m3	247,23
Rellenos para estructuras con material de la excavación	m3	28,43
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	m3	0,13

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	247,2			247,23	4,12%
Ejec	0,0			0,00	0,00%
Prog	28,4			28,43	0,74%
Ejec	0,0			0,00	1,12%
Prog	0,1			0,13	0,0%
Ejec	0,0			0,00	0,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Sector Batea — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: Tienda Paola

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoria, se realiza la socializacion del proyecto el dia 27 de enero

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo la compra de elementos de proteccion personal.
Se adelanto el pago de transporte de materiales petreos.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Comité operativo para aprobacion de compra de insumos de construccion.
Inicio de obra.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS META S FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vereda el Japon sector Batea, entrega de elementos EPP

FOTO 2

Indicar localización y actividad

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se ha brindado acompañamiento al contratista mediante llamadas y mensajes con el fin de agilizar el inicio de las actividades.
Se realiza la aprobacion del plan de compras una vez verificado las facturas y cotizaciones

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Paula A. Ramirez
NOMBRE: PAULA A. RAMIREZ
Matrícula Profesional No.: 25202-402196 CND

Original: Informe mensual de Interventoria, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Durante este periodo no se han iniciado obras, por lo tanto, no se cuenta con maquinaria ni equipo en el momento.

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo correspondiente al presente informe el contratista cuenta con personal contratado.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MAN-IN-15-FRI-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	1/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE OBRA No: 4643-2023 — CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL JAPON
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1/02/2024 — PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4297-2023 — INTERVENTOR: PROYECTO SANABRIA SAS
NOMBRE ARL: POSITIVA — NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CONFA - CALDAS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JAIRO DIAZ	10172524	MAESTRO DE OBRA	$ 2.320.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC EL JAPON	40%	$ 45.300	V	EPS FAMISANAR S.AS.	9465476391	$ 81.300	COLPENSIONES	9465476391	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	Ingreso
2	HELMAN FELIPE IBARRA	71184824	OBRERO	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC EL JAPON	40%	$ 45.300	V	NUEVA EPS S.A. -CM	9465476391	$ 81.300	PORVENIR S.A	9465476391	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	Ingreso
3	DANIEL FELIPE LAGUNA RUBIO	1054560939	OBRERO	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC EL JAPON	40%	$ 45.300	V	NUEVA EPS S.A.	9465476391	$ 81.300	PORVENIR S.A	9465476391	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	Ingreso
4	BENJAMIN LEAL RIAÑO	10168421	OBRERO	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC EL JAPON	40%	$ 45.300	V	NUEVA EPS S.A -CM	9465476391	$ 81.300	COLPENSIONES	9465476391	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	Ingreso
5	VICTOR ESTEBAN MENDEZ LOPEZ	1007140114	OBRERO	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC EL JAPON	40%	$ 45.300	V	EPS FAMISANAR S.AS.	9465476391	$ 81.300	PORVENIR S.A	9465476391	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	Ingreso
6	OSORIO JOSE	10170606	OBRERO	$ 1.300.000	x R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	JAC EL JAPON	40%	$ 3.100	V	EPS FAMISANAR S.AS.	9465476391	$ 5.500	PORVENIR S.A	9465476391	$ 7.000	$ 1.800	$ 1.000	$ 1.300	Ingreso-Retiro
N																			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 15/03/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (") a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: FABIAN ANDRES MACHADO MARIN
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 011037-05111784INT

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.4. ACTA MENSUAL DE PAGOS CONVENIO

Durante este periodo no se han realizado actas parciales de obra.

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante el periodo correspondiente al presente informe, el contratista de obra no dio inicio a las actividades contractuales, por lo tanto, no se anexa informacion del estado general del tiempo.

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante este periodo no se ha dado inicio a las obras, por lo tanto, no se cuenta con la realización de ensayos de laboratorio.

4.7. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Durante este periodo no se realizó ningún cambio en las polizas del convenio.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 04

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No. 4643-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 19/12/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 194.052.521,00

VALOR ACUMULADO: $ 194.052.521,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4297 **INTERVENTOR:** PROYECTO SANABRIA SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 38.810.504	27	11	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.702.626,1	27	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 58.215.756	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100296680

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 232.000.000	27	11	2023	31	12	2024
Otros	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100073321 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 19/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 0 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 0 **SUSPENSIÓN No.:** 0

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	36%	$ 38.810.504	27	11	2023	1	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	9%	$ 9.702.626,1	27	11	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	55%	$ 58.215.756	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100296680

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 0 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 0 **SUSPENSIÓN No.:** 0

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 232.000.000	27	11	2023	30	4	2024
Otros	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100073321 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

No se identifica en la plataforma del SECOP II la aprobacion de polizas de la prorroga 01.

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JUAN CARALOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.8. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.8.1. INFORME INVERSIÓN BUEN MANEJO DESEMBOLSO

Durante este periodo no se realizó el informe de buen manejo de desembolso de la JAC

4.8.2. PLAN INVERSIÓN DESEMBOLSO MENSUAL

Durante este periodo no se presentó un plan de inversión de desembolsos por parte de la JAC puesto que se encuentra en revisión y adquisición de facturas del plan de compras Nº1

4.8.3. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Durante este periodo no se dio inicio a las obras, no se realizaron comités de obra

4.8.4. ACTAS DE REUNION

Durante este periodo se realizó el segundo comité operativo con el fin de dar aprobación a las compras preliminares para inicio de obras, se anexa acta en formato PDF.

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 2. Informacion general del contrato de interventoria N.º 4297-2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)
CONTRATO NO:	4297 DE 2023
CONTRATISTA:	PROYECTO SANABRIA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIELA SALGADO PINILLA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA.
VALOR TOTAL:	$ 79.541.151,00
PLAZO INICIAL:	3 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ORDEN DE INICIACIÓN:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE TERMINACIÓN INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA NO. 1	DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE ABRIL DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADO:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.
PERIODO DEL INFORME	DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO	ING. SANTIAGO HERNÁNDEZ

5.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

La interventoria realizo las siguientes actividades:

- Se realizo el 19 de febrero el segundo comité operativo con el fin de dar aprobación al plan de compras Nº1.
- Se realizo el acompañamiento continuo a la JAC, mediante llamadas para verificar el proceso de selección y contratación de personal para la ejecución de actividades.
- Se verifico la afiliación y contratos del personal que se contrató en la obra

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Durante este periodo la interventoria no cuenta con personal especialista toda vez que no se han iniciado actividades de obra.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Relación de vehículos

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — **DIRECCION TERRITORIAL:** CALDAS

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: FEBRERO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4297-2023

INTERVENTORÍA: PROYECTOS SANABRIA SAS.

CONTRATO DE OBRA No. 4643-2023, 4053-2023, 3809-2023, 3980-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON; JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL VEREDA BUENAVISTA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HABANA

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Motocicleta	Motocicleta 500 TRX Modelo 2023 Placa FIF85G	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:
Certificado de revision tecnomecanica desde 10/10/2023 hasta 10/10/2024
Soat desde 03/10/2023 hasra 02/10/2024

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430 CND

Firma
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 17202-125676 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INTERVENTORIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4297-2023

INTERVENTOR: PROYECTO SANABIA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-24

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA.

CONTRATO DE OBRA No.: 4643-2023 El Japon; 3809-2023 La Atarraya; 3908-2023 La Habana; 4053-2023 Buenavista

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA EL JAPON; JAC DE LA VEREDA LA HABANA; JAC DE LA VEREDA ATARRAYA; JAC DE LA VEREDA BUENAVISTA

NOMBRE ARL: POSITIVA SEGUROS

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: Comp Fliar Caldas

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Dias del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	GIRALDO RIOS STEPHANIA	1,053,817,326	Profesional social	$ 1,120,000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	40%	proyecto sanabria	$ 1,300,000	$ 90,500	V	EPS Sura	75845514	$ 52,000	Porvenir	75845514	$ 208,000	$ 22,400	N/A	N/A	EXIMIDO POR PYME
2	RAMIREZ GUERRERO PAULA ANDREA	1,013,760,290	Residente Interventoria	$ 2,600,000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	proyecto sanabria	$ 2,600,000	$ 181,000	V	Compesar EPS	75845514	$ 104,000	Colpensiones	75845514	$ 416,000	$ 104,000	N/A	N/A	EXIMIDO POR PYME
3	CADENA RAMOS DIANA PAOLA	1,018,451,763	Profesional Ambiental	$ 560,000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	20%	proyecto sanabria	$ 1,300,000	$ 90,500	V	EPS Sura	75845514	$ 52,000	Porvenir	75845514	$ 208,000	$ 22,400	N/A	N/A	EXIMIDO POR PYME
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 4,280,000																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 29/02/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:2520237430CND

Firma
Nombre: SANTIAGO HERNÁNDEZ RENDÓN
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-125676 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INF FIN Y PRESUPUESTAL INT

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 29/2/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4297 DE 2023 — **INTERVENTOR:** PROYECTO SANABRIA S.A.S

MES INFORME MENSUAL: feb-24 — **PROYECTO:** "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARAEL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA"

CONVENIOS: 4643-2023, 3809-2023, 3980-2023, 4053-2023 — **CONTRATISTA:** JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE CALDAS : MUNICIPIO LA DORADA, VEREDA JAPON 4643-2023; MUNICIPIO LA DORADA , VEREDA ATARRAYA 3809-2023; MUNICIPIO LA DORADA, VEREDA LA HABANA 3980-2023; MUNICIPIO LA DORADA, VEREDA LA BUENAVISTA 4053-2023

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1260123	C-2402-0800-14-0-2402041-02	10	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 79,541,151.00	$ -
2023	1260123	C-2402-0800-14-0-2402041-02	10	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 36,326,998.00	
				TOTAL		$ 115,868,149.00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 115,868,149.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	nov-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 115,868,149.00	$ 115,868,149.00		
2	dic-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 115,868,149.00	$ 115,868,149.00		
3	ene-24	$ 10,701,800.00	$ 2,033,342.00	$ 12,735,142.00	$ -		$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 103,133,007.00	$ 103,133,007.00		
4	feb-24	$ 8,306,000.00	$ 1,578,140.00	$ 9,884,140.00	$ -	$ -	$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 93,248,867.00	$ 93,248,867.00		
	TOTALES	$ 19,007,800.00	$ 3,611,482.00	$ 22,619,282.00	$ -	$ -	$ -					

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	$ 19,007,800.00	$ 3,611,482.00	$ 22,619,282.00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)	$ -		$ -
IVA = 19% * (E) = (F)	$ -		$ -
VALOR TOTAL	$ 19,007,800.00	$ 3,611,482.00	**$ 22,619,282.00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430 CND

Firma
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.17202-125676CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante este periodo no se presentaron cambios en las polizas actualizadas en el periodo pasado.

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 04

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4297-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTO SANABRIA SAS

OBJETO DEL CONTRATO:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA."

FECHA DE INICIO: 23/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 79.541.150,93

VALOR ACUMULADO: $ 115.868.149,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Santiago Hernández Rendón

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 7.954.115,10	8	11	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 15.908.230,2	8	11	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 23.862.345,3	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 430-47-994000063674

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 15/112023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 11.586.814,80	8	11	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 23.173.629,6	8	11	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 34.760.444,4	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 430-47-994000063674

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 8/02/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Juan Carlos Sanabria
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520237430CND

Firma
Nombre:
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

6.5.1. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

Durante este periodo no re realizaron modificaciones o reprogramación al plan de cargas.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realizo la revisión de contratación de personal de obra, el cual cuenta con su respectiva afiliación a seguridad social y ARL.

- Se recomienda Iniciar las actividades lo antes posible puesto que ya se encuentra la obra con recursos y personal para dar inicio a las actividades.

8. ANEXOS

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

Durante este periodo no se remitió correspondencia oficial directamente al contratista.

8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

Durante este periodo no se iniciaron obras, por lo tanto, no se identifica un registro fotográfico de avance de las obras.

8.3. COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Durante este periodo no se iniciaron obras, por lo tanto, no se cuenta con bitácora de obra.

CONVENIO N.º 4053-2023
JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL
CORREGIMIENTO BUENAVISTA

II. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 4053-2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA

Contrato de Interventoría No. 4297-2023 **Interventoría:** PROYECTO SANABRIA SAS

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 4 **MES O PERIODO:** Febrero

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	35
1	**INTRODUCCIÓN**		36
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		36
2.1	Localización		36
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		37
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		37
2.4	Características técnicas del proyecto		38
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		40
3.1	Información general del contrato		40
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		41
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		41
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		41
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		41
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	41
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	46
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	46
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	47
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	47
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	47
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	47
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N/A
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		49
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra		N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	50
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		50
5.1	Información general del contrato		50
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		50
5.3	Informes especialistas y profesionales		N/A
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		50
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	50
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	52
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	53
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	53
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N/A
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	54
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	**Conclusiones y recomendaciones**		55
8	**Anexos**		55
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		55
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		55
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		55
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		55

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO - MEPI-MN1-IN-15-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO VERSION PÁGINA

FECHA: 6/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÒN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** FEBRERO

CONVENIO No.: 4053-2023

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 24/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024
PLAZO ACUMULADO: 4 MESES

VALOR INICIAL : $ 200.929.132,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ 199.929.132,00
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4297-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTO SANABRIA SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** SANTIAGO HERNANDEZ RENDON

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placahuella	mi	168
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Placahuella	ML	0	0
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 150.371.172,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.511.135,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 46.046.825,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 200.929.132,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 19.158.723,00	$ 19.158.723,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 5.288.749,00	$ 7.359.923,00
VALOR EJECUTADO	$ 24.447.472,00	$ 26.518.646,00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoria al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 23.484.993,55
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 19.158.723,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 81,58%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **11**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	**Foto 2**
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**
Foto 3	**Foto 4**
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**
Foto 5	**Foto 6**
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

A LA FECHA NO SE PRESENTAN MULTAS O SANCIONES AL CONVENIO

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

1. INTRODUCCION

El proyecto **"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA"** entre el Instituto Nacional De Vías y las juntas de acción comunal beneficiadas del Municipio de La Dorada, del cual se ejecuta en el SECOP mediante proceso SPSC-CD-CS-653-2023, se celebra el convenio 4053-2023 que tiene por objeto "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**" tiene como objetivo fundamental lo siguiente:

Ejecutar donde sea necesario el contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

Con lo cual se brinde una infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transitabilidad para los usuarios de las vías, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente, cómoda y segura; por lo tanto, con la ejecución de este proyecto, el Instituto busca el cumplimiento de uno de los fines constitucionales del estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte terrestre y apoyar al desarrollo de la política de intermodalidad del transporte para de esta manera apoyar y contribuir con el Desarrollo Económico de la región.

La firma **PROYECTO SANABRIA SAS**, presenta a consideración del **INVIAS, EL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N.º 04** correspondiente al periodo comprendido entre el **01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**, en este se detallan las actividades realizadas por el Contratista y la Interventoría en el mes.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en el corregimiento Buenavista, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.673648 y longitud -75.427575 y punto de referencia final el PR 2+700 con coordenadas latitud 5.667733 y longitud -75.428956, de la vía Buenavista – Japon, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

2.1. LOCALIZACION

El municipio de La Dorada se encuentra localizado en la zona Oriente del departamento de Caldas, dista 175 kilómetros de la ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con la ganadería, le sigue la agricultura, la minería del oro, el comercio, la pequeña industria y la pesca, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 574 Km cuadrados de los cuales solo 29.30 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de La Dorada se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 5.4538 - Longitud: -74.6646

El tramo a intervenir en la vereda Buenavista se localiza en las siguientes coordenadas:

Punto Inicial: Latitud 5.744600 - Longitud -74.676130
Punto Final: Latitud 5.765760 - Longitud -74.675210



Ilustración 1 - Localización del tramo a intervenir en el corregimiento de Buenavista
Fuente. ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS JAC BUENAVISTA

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Los municipios directamente influenciados por el proyecto son Norcasia y La Dorada en sus veredas El Japón, Buenavista, La Atarraya, el Tigre, Brisas y La Agustina. Adicionalmente, con la atención de dichas vías se pretende entregar a la comunidad una vía en óptimas condiciones de transitabilidad y seguridad, con lo cual sería una alternativa más económica para el transporte de pasajeros y de carga en el departamento.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA

El convenio cuyo objeto es el **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL,** el cual comprende un tramo de aproximadamente 2600 metros lineales, el cual se ve afectado durante el invierno en diferentes tramos los cuales son señalados por la comunidad que transita a diario por esta via.

El tramo a intervenir en la vereda Buenavista se localiza en las siguientes coordenadas:

Punto Inicial: Latitud 5.744600 - Longitud -74.676130
Punto Final: Latitud 5.765760 - Longitud -74.675210



Ilustración 2 – Estado actual de la vía a intervenir en el corregimiento Buenavista.

2.4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la importancia del mejoramiento de la vía en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total del municipio de La Dorada en el Corregimiento de Buenavista, se realizarán las siguientes actividades:

- Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías.

- Mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

El alcance del convenio 4053-2023 que tiene por objeto **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, corresponde a todas y cada una de las obras y actividades contenidas en los documentos contractuales del contrato de obra.

La vía rural del Corregimiento de Buenavista a intervenir será objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en el marco de la ejecución del contrato No. 4297 DE 2023 entre Proyecto Sanabria SAS y el INVIAS, como parte del programa Caminos comunitarios de la paz total.

Para la ejecución de las obras se utilizará como guía la cartilla **OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL.**


Para la construcción de las alcantarillas se cita de dicha cartilla en su numeral 8.1.3 ESTRUCTURA TIPO PLACA HUELLA, del cual se copia textualmente:


"La placa huella es un sistema orientado a generar condiciones de transitabilidad adecuadas para vehículos, animales y personas en tramos críticos de vías rurales. El sistema consiste en la colocación de franjas delgadas de placas de concreto separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una, entre las cuales se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada, manteniendo unos sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras y lateralmente por berma cunetas.


Dadas sus características estructurales, el sistema placa huella presentado en esta cartilla es un sistema para vías con bajos niveles de tránsito, que permitan su canalización sobre los rieles de concreto reforzado. Por tanto, debe emplearse en secciones viales existentes con espacio para un solo carril de circulación, estableciéndose nichos específicos con el ancho suficiente, y una superficie distinta de rodado, que permita el paso simultáneo de vehículos en direcciones opuestas. Poder garantizar que el tránsito vehicular se canalice sobre los rieles de concreto reforzado implica que la velocidad de la vía sea baja y los tramos de la placa huella sean discontinuos. Por lo anterior, se recomienda que, el Sistema Placa Huella de esta cartilla sólo se use en vías con ancho de calzada inferior a 5.5 m, velocidad de operación inferior a 30 km/h y que los tramos no superen 500 m de longitud. Así las cosas, en vías predominantemente bidireccionales como las de nuestro país, se sugiere que sólo se utilice este sistema en vías donde las restricciones y ancho de vía originen velocidades de circulación inferiores a 30 km/h y garanticen condiciones efectivas de comodidad y seguridad. Caso contrario, el sistema podría convertirse en una solución menos segura para los usuarios y deberá considerarse otra alternativa como las técnicas presentadas en los capítulos 8.1.1 y 8.1.2.


En el desarrollo de esta cartilla, se evaluaron diversas combinaciones de espesores de placa, cargas vehiculares y tipos de suelo de subrasante. Se realizaron modelos numéricos considerando vehículos tipo C3, C2 y vehículos ligeros (camionetas y automóviles). También se consideró que la placa estuviera en contacto directo con suelo de bajas especificaciones y sobre una capa de material granular compactado. Se evaluaron igualmente diferentes longitudes de placa para identificar la mejor combinación posible. En el plano 125 se presentan los espesores y el refuerzo requerido para vehículos livianos, y en el plano 126 para vehículos C2 y C3.


Se presentan las secciones y detalles según la cartilla **OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL.**




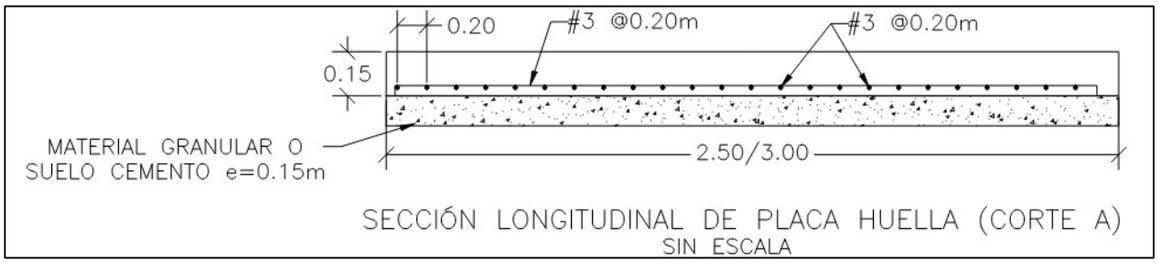




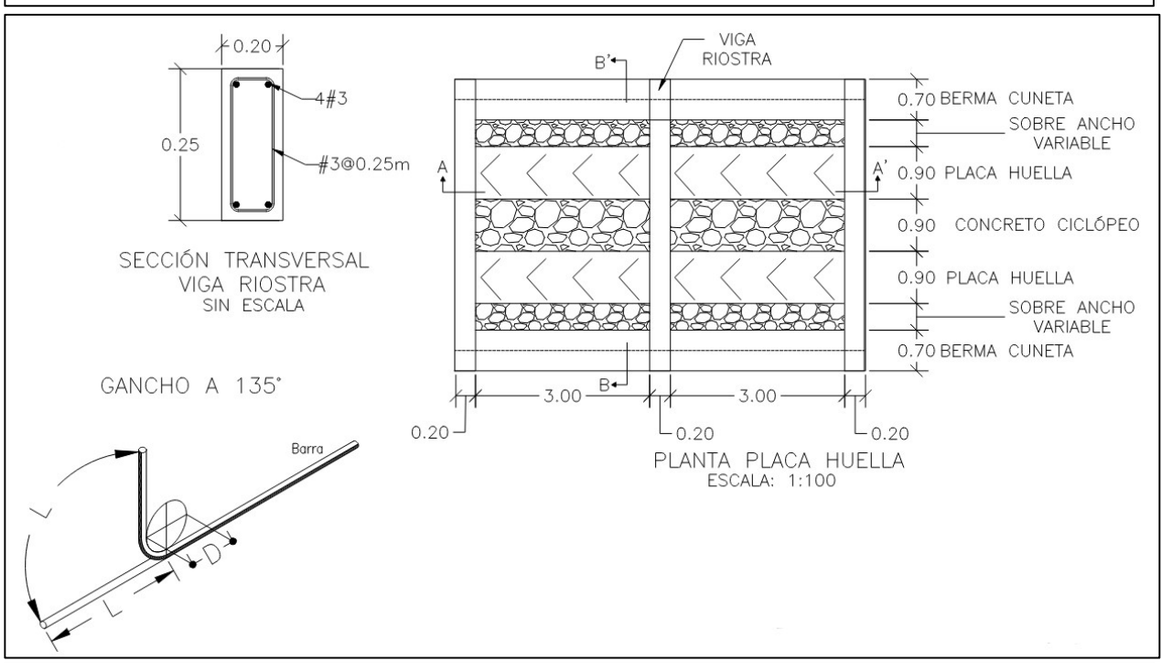

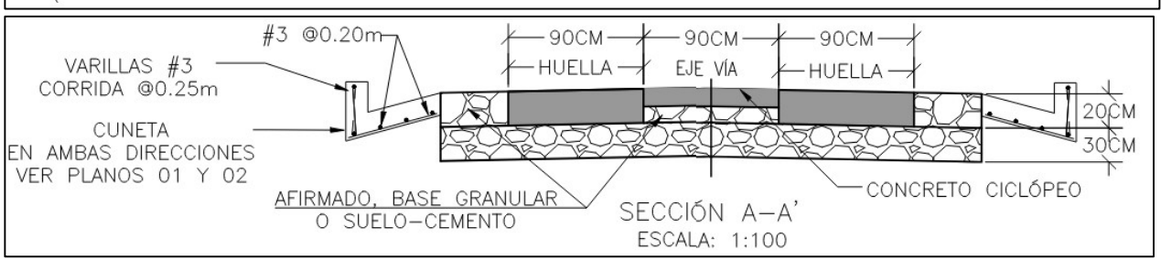

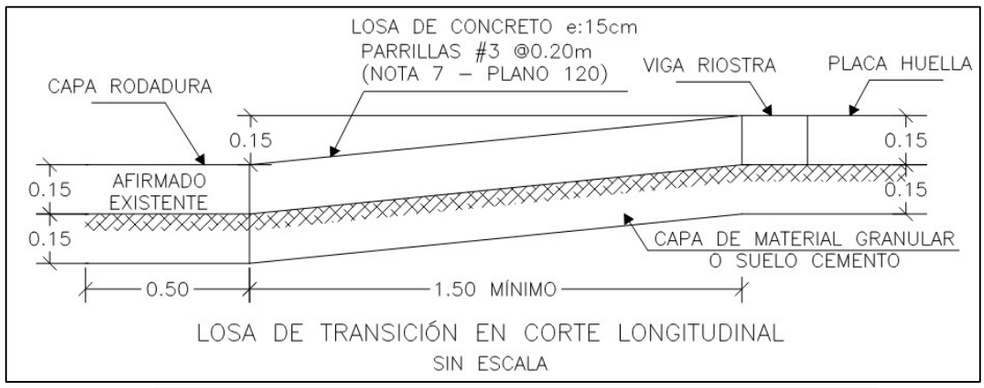

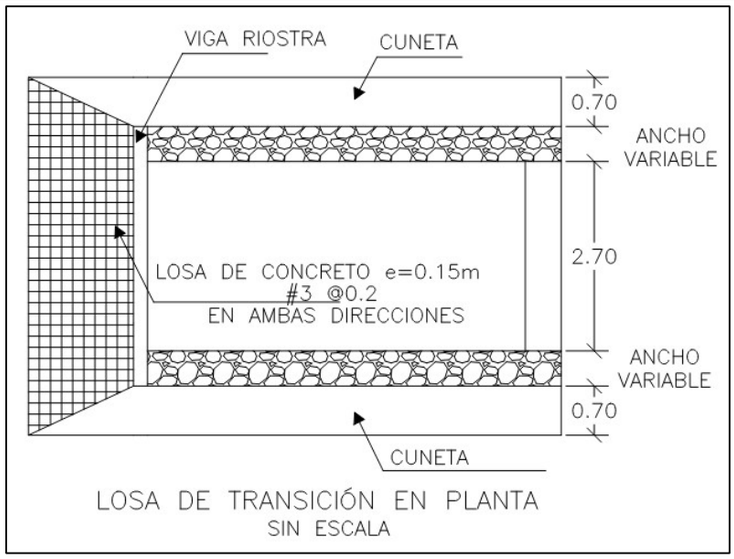

3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

Tabla 1. Informacion general del Convenio

INFORMACION GENERAL	
Contrato No.:	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4053 DE 2023
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA
NIT:	810.005.838-6
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Longitud aproximada:	2630 metros lineales
Valor inicial:	$ 200.929.132,00
Adiciones:	$0,00
Valor total	$ 200.929.132,00
Plazo inicial:	TRES (03) MESES
Etapa de ejecución de las obras:	TRES (03) MESES
Fecha orden de Iniciación:	24/11/2023
Fecha de Terminación inicial:	31/12/2023
Fecha de terminación prorroga 01:	30/04/2024

Fuente: Documentos oficiales del convenio

3.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, el conveniente no ha iniciado actividades de obra, se realizaron actividades de contratación y afiliaciones del personal, la toma de topografía inicial del proyecto, se encuentran a la espera de la recepción de EPP para el inicio de las actividades, se realizó segundo comité operativo con el fin de realizar la aprobación de compras necesarias para iniciar actividades.

3.2.1. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Durante el PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, se realizó el seguimiento del plan de gestión ambiental y formatos sugeridos por INVIAS, en colaboración con la Junta de Acción.

3.2.2. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL

Durante el PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, se realizó el seguimiento al cronograma del plan de gestión social el cual se avaló y contempla todas las áreas de influencia directa de la obra, normativas de la documentación inicial y específica de la junta de acción comunal.

3.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

Durante este periodo no se presentaron items no previstos en la ejecución del convenio.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

La interventoria no evidencia un estado de avance en la obra de igual manera tomo las siguientes acciones:

- Se aprobó el cronograma de obra presentado por el contratista.
- El 19 de febrero se realiza el segundo comité operativo con la JAC, donde se aprueba la compra de materiales preliminares y dotación de personal, asi como el transporte para materiales pétreos y el pago de las polizas y sus anexos.
- Se realizo la verificación de contratos de personal de obra y administrativo.

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. INFORME SEMANAL

Para el presente mes, el contratista no ha iniciado actividades de obra, se aprobó el cronograma remitido por el contratista de obra, desde la interventoria se ha iniciado con el diligenciamiento de los informes semanales desde la orden de inicio del contrato de interventoria Nº 4297-2023

Adjunto se encuentran los informes semanales correspondiente al mes de febrero 2024, formato técnico MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

1. Informe semanal 11 - 01- 08 feb 2024
2. Informe semanal 12 - 08 al 15 feb 2024
3. Informe semanal 13 - 15 al 22 feb 2024
4. Informe semanal 14 - 22 al 29 feb 2024

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 04

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA: 12/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CALDAS** — SEMANA No.: **11** del **1/02/2024** al **8/02/2024** Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **Santiago Hernández Rendón** — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: **ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vias, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en el corregimiento Buenavista, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.744600 y longitud -74.676130 y punto de referencia final el PR 2+600 con coordenadas latitud 5.765760 y longitud -74.675210, de la via Buenavista - El Japón de La Dorada, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA			INTERVENTOR:	PROYECTOS SANABRIA SAS.		
				INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	4053- 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.929.132,00	CONTRATO No.	4257-2023	VALOR INICIAL:	$ 79.541.151,00
FECHA DE INICIO:	24/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ 36.326.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.929.132,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 115.868.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.929.132,00	$ 200.929.132		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.929.132,00	$ 200.929.132		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO		
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.929.132,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 24.199,88	0,01%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (24.199,88)	-0,01%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 2.071.174,00	1,03%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 10.471.093,42	5,21%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (10.471.093,42)	-5,21%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.184.954,53	0,59%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%

Observaciones: A la fecha se aprobaron las polizas del convenio por un valor de $2,071,174

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 115.868.149,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.910.720,00	7,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.970.240,00	2,56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.970.240,00	2,56%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajeria instantanea

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 0,02% — Avance o Atraso Físico %: -0,02%

Meta Física Ejecutada %: 0,00%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Excavaciones varias sin Clasificar	m3	1,28
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1,28			1,28	0,01%
Ejec				-	
Prog				-	
Ejec				-	
Prog				-	
Ejec				-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total propuesto
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO .....
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO .....

OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	1	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoria, se realizo la socializacion del proyecto el dia 26 de enero, se ha realizado el acompañamiento desde el plan de gestion social.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua con el seguimiento y apoyo conjunto a los presidentes de las JAC, con el fin de resolver dudas y aclarar temas pertinentes con respecto al proyecto en marcha para su comunidad.
Se realizo la socializacion en conjunto con el personal de la JAC y la Interventoria el dia 26 de enero de 2024.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Programacion de comité operativo para aprobacion de compras de dotacion, materiales, EPP y demas que se presente por el contratista

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se ha brindado acompañamiento al contratista mediante llamadas y mensajes con el fin de agilizar el inicio de las actividades

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Paula A. Ramirez

NOMBRE: PAULA A. RAMIREZ

Matrícula Profesional No.: 25202-402196 CND

Original: Informe mensual de Interventoria, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 04

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CODIGO	
		VERSION	
		PAGINA	
		FECHA	20/02/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CALDAS** — SEMANA No.: **12** del **8/02/2024** al **15/02/2024** Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **Santiago Hernández Rendón** — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en el corregimiento Buenavista, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.744600 y longitud -74.676130 y punto de referencia final el PR 2+600 con coordenadas latitud 5.765760 y longitud -74.675210, de la vía Buenavista – El Japón de La Dorada, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA			INTERVENTOR:	PROYECTOS SANABRIA SAS.		
				INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	4053- 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.929.132,00	CONTRATO No.	4297-2023	VALOR INICIAL:	$ 79.541.151,00
FECHA DE INICIO:	24/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ 36.326.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.929.132,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 115.868.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.929.132,00	$ 200.929.132		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.929.132,00	$ 200.929.132		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO			
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	200.929.132,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	36.028,38	0,02%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	-	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(36.028,38)	-0,02%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	2.071.174,00	1,03%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	11.856.423,27	5,90%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	2.071.174,00	1,03%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(9.785.249,27)	-4,87%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	1.177.857,92	0,59%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	0,00%

Observaciones: A la fecha se aprobaron las polizas del convenio por un valor de $2,071,174

INTERVENTORÍA			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	115.868.149,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	8.910.720,00	7,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	2.970.240,00	2,56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	2.970.240,00	2,56%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajeria instantanea

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 0,03% — Avance o Atraso Físico %: -0,03%
Meta Física Ejecutada %: 0,00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Excavaciones varias sin Clasificar	m3	2,02

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	2,02			2,02	0,01%
Ejec				-	
Prog				-	
Ejec				-	
Prog				-	
Ejec				-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO .....
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO .....

OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI	NO	N/A:	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A:	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A:	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A:	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A:	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A:	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A:	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A:	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra active personal de la interventoria, se realizo la socializacion del proyecto el dia 26 de enero

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua con el seguimiento y apoyo conjunto a los presidentes de las JAC, con el fin de resolver dudas y aclarar temas pertinentes con respecto al proyecto en marcha para su comunidad.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Verificacion de las cotizaciones actualizadas por la JAC.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada ve meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LA S OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se ha brindado acompañamiento al contratista mediante llamadas y mensajes con el fin de agilizar el inicio de las actividades, asi como la realizacion del comité operativo

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Paula A. Ramírez
NOMBRE: PAULA A. RAMIREZ
Matrícula Profesional No.: 25202-402198 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 04

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CODIGO	
	VERSIÓN	
	PAGINA	
	FECHA	(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CALDAS** — SEMANA No.: 13 del 15/02/2024 al 22/02/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **Santiago Hernández Rendón** — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vias, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en el corregimiento Buenavista, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.744600 y longitud -74.676130 y punto de referencia final el PR 2+600 con coordenadas latitud 5.765760 y longitud -74.675216, de la via Buenavista - El Japón De La Dorada, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA			INTERVENTOR:	PROYECTOS SANABRIA SAS.		
				INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	4053- 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.929.132,00	CONTRATO No.	4257-2023	VALOR INICIAL:	$ 79.541.151,00
FECHA DE INICIO:	24/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ 36.326.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.929.132,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 115.868.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.929.132,00	$ 200.929.132		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.929.132,00	$ 200.929.132		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.929.132,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 4.093.369,63	2,04%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (4.093.369,63)	-2,04%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 2.071.174,00	1,03%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 17.953.254,38	8,94%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	0,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (17.953.254,38)	-8,94%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ 6.094.112,65	3,03%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	$ -	0,00%

Observaciones: A la fecha se aprobaron las polizas del convenio por un valor de $2.071.174, se encuentra en revision el plan de compras N 1

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 115.868.149,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.910.720,00	7,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ 2.970.240,00	2,56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	$ 2.970.240,00	2,56%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajeria instantanea

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 2,72% — Avance o Atraso Físico %: -2,72%

Meta Física Ejecutada %: 0,00%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Excavaciones varias sin Clasificar	m3	2,75
*	Subbase Granular Clase C	m3	20,08
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	2,75			2,75	0,01%
Ejec				-	
Prog	20,08			20,08	2,69%
Ejec				-	
Prog				-	
Ejec				-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ..... NO .....
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ..... NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ..... NO

OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A .....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A .....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A .....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A .....

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
Salon de la Junta de accion Comunal del Corregimiento de buena vista	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoria, se realizo la socializacion del proyecto el dia 28 de enero

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua con el seguimiento y apoyo conjunto a los presidentes de las JAC, con el fin de resolver dudas y aclarar temas pertinentes con respecto al proyecto en marcha para su comunidad.
Se solicito la relacion del personal afiliado para dar inicio a las obras.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Verificacion en campo de actividades tras entrega de estudio topografico y torres CBR

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se ha brindado acompañamiento al contratista mediante llamadas y mensajes con el fin de agilizar el inicio de las actividades.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Paula A. Ramirez

NOMBRE: PAULA A. RAMIREZ

Matrícula Profesional No.: 25202-402196 CND

Original: Informe mensual de interventoria, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 04

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CALDAS** — SEMANA No.: **14** del **22/02/2024** al **29/02/2024** (Último Informe Semanal SI) (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **Santiago Hernández Rendón** — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en el corregimiento Buenavista, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.744600 y longitud -74.676130 y punto de referencia final el PR 2+600 con coordenadas latitud 5.765760 y longitud -74.675210, de la vía Buenavista - El Japón de La Dorada, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA			INTERVENTOR:	PROYECTOS SANABRIA SAS		
				INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	4053- 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.929.132,00	CONTRATO No.	4297-2023	VALOR INICIAL:	$ 79.541.151,00
FECHA DE INICIO:	24/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ 36.326.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.929.132,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 115.868.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.929.132,00	$ 200.929.132		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.929.132,00	$ 200.929.132		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.929.132,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 23.484.960,55	11,69%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 19.158.723,00	9,54%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 4.326.270,55	2,15%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7.359.923,00	3,66%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 41.755.313,38	20,78%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 26.518.646,00	13,20%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 15.236.667,38	7,58%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.092.382,73	3,03%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.447.472,00	12,17%

Observaciones: A la fecha se aprobaron las polizas del convenio por un valor de $2,071,174, se encuentra en revision y aprobacion el plan de compras Nº 1

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 115.868.149,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.910.720,00	7,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.970.240,00	2,56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.970.240,00	2,56%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajeria instantanea

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 2,72% — Avance o Atraso Físico %: -2,72%
Meta Física Ejecutada %: 0,00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Excavaciones varias sin Clasificar	m3	3,48
Subbase Granular Clase C	m3	60,25
Concreto reforzado resistencia 21 MPA	m3	9,58

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	3,48			3,48	0,04%
Ejec				-	
Prog	60,25			60,25	8,06%
Ejec				-	
Prog	9,58			9,58	5,33%
Ejec				-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Salon de la Junta de accion Comunal del Corregimiento de buena vista

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoría, se realizo la socialización del proyecto el día 26 de enero


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua con el seguimiento y apoyo conjunto a los presidentes de las JAC, con el fin de resolver dudas y aclarar temas pertinentes con respecto al proyecto en marcha para su comunidad.
Se solicito la relacion del personal afiliado para dar inicio a las obras.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Comité operativo para aprobacion de compra de insumos de construccion.
Inicio de obra.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se ha brindado acompañamiento al contratista mediante llamadas y mensajes con el fin de agilizar el inicio de las actividades.
Se realiza la aprobacion del plan de compras una vez verificado las facturas y cotizaciones

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Paula A. Ramirez
NOMBRE: PAULA A. RAMIREZ
Matrícula Profesional No.: 25202-402198 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Durante este periodo no se han iniciado obras, por lo tanto, no se cuenta con maquinaria ni equipo en el momento.

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo correspondiente al presente informe el contratista cuenta con personal contratado.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	1/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE OBRA No: 4543-2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1/02/2024 — **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4053-2023 — **INTERVENTOR:** PROYECTO SANARIA SAS

NOMBRE ARL: POSITIVA — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CONFA - CALDAS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	BOCANEGRA JHON	1054543623	MAESTRO DE OBRA	$ 2.320.000	x x x x x x x x x x x x x x x	JAC BUENAVISTA	40%	$ 45.300	V	EPS FAMISANAR S.A.S.	9465451529	$ 81.300	PROTECCION SA	9465451529	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	Ingreso
2	ESMERAL SERGIO	1005188043	OBRERO	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x	JAC BUENAVISTA	40%	$ 45.300	V	NUEVA EPS S.A. -CM	9465451529	$ 81.300	PROTECCION SA	9465451529	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	Ingreso
3	GAITAN JORGE	1064639606	OBRERO	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x	JAC BUENAVISTA	40%	$ 45.300	V	NUEVA EPS S.A.	9465451529	$ 81.300	PROTECCION SA	9465451529	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	Ingreso
4	JIMENEZ JUAN	1054860340	OBRERO	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x	JAC BUENAVISTA	40%	$ 45.300	V	NUEVA EPS S.A	9465451529	$ 81.300	PROTECCION SA	9465451529	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	Ingreso
5	MURILLO JHON	1054540168	OBRERO	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x	JAC BUENAVISTA	40%	$ 45.300	V	NUEVA EPS S.A. -CM	9465451529	$ 81.300	PROTECCION SA	9465451529	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	Ingreso
6	POSADA FREDIS	4437737	MAESTRO DE OBRA	$ 2.320.000	x x x x x x x x x x x x x x x	JAC BUENAVISTA	40%	$ 16.200	V	NUEVA EPS S.A	9465451529	$ 29.000	PROTECCION SA	9465451529	$ 37.200	$ 9.300	$ 4.700	$ 7.000	Ingreso
7	ROMERO JHON	1054538155	OBRERO	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x	JAC BUENAVISTA	40%	$ 45.300	V	EPS FAMISANAR S.A.S.	9465451529	$ 81.300	PROTECCION SA	9465451529	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	Ingreso
8	SALAS JOSE	1073320102	OBRERO	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x	JAC BUENAVISTA	40%	$ 45.300	V	EPS FAMISANAR S.A.S.	9465451529	$ 81.300	PROTECCION SA	9465451529	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	Ingreso
9	TORRES ALEJANDRO	1073328616	OBRERO	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x	JAC BUENAVISTA	40%	$ 45.300	V	NUEVA EPS S.A	9465451529	$ 81.300	PROTECCION SA	9465451529	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	Ingreso
10																			
N																			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 14/04/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional sea debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: EFREN FERNANDO MORENO ZAMORA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202131489 CND

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.4. ACTA MENSUAL DE PAGOS CONVENIO

Durante este periodo no se han realizado actas parciales de obra

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante el periodo correspondiente al presente informe, el contratista de obra no dio inicio a las actividades contractuales, por lo tanto, no se anexa informacion del estado general del tiempo.

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante este periodo se realizó el ensayo de CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada I.N.V-E 148.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA: 15/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No.: 4053-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL FEBRERO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4297-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTO SANARIA SAS.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Dia/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
1	16/02/2024	CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada	I.N.V-E 148	Excavacion en sitio de la obra, Vereda Buenavista	1	3% ≥	4,90%	si	Se considera apto el suelo para dar inicio a las actividades de obra
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:
Durante este periodo no se realizaron ensayor por parte de la Interventoria

NOTAS:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Durante este periodo no se realizó ningún cambio en las polizas del convenio.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 04

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No. 4053-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL CORREGIMIENTO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 24/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.929.132,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.929.132,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4297 **INTERVENTOR:** PROYECTO SANABRIA SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.185.826	24	10	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.046.457	24	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.278.739	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100290063

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 232.000.000	24	10	2023	31	12	2024
Otros	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100071102 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 14/11/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 0 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 0 **SUSPENSIÓN No.:** 0

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.185.826	24	10	2023	1	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.046.457	24	10	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.278.739	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100290063

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 0 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 0 **SUSPENSIÓN No.:** 0

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 232.000.000	27	11	2023	30	4	2024
Otros	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100071102 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

No se identifica en la plataforma del SECOP II la aprobacion de polizas de la prorroga 01.

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JUAN CARALOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.8. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.8.1. INFORME INVERSIÓN BUEN MANEJO DESEMBOLSO

Durante este periodo no se han realizado movimientos en la cuenta

4.8.2. PLAN INVERSIÓN DESEMBOLSO MENSUAL

Durante este periodo no se presentó un plan de inversión de desembolsos por parte de la JAC

4.8.3. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Durante este periodo no se dio inicio a las obras, no se realizaron comités

4.8.4. ACTAS DE REUNION

Durante este periodo se realizó el segundo comité operativo con el fin de aprobar el plan de compras Nº1 y dar inicio a las obras, se anexa acta en formato PDF.

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 2. Informacion general del contrato de interventoria N.º 4297-2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)
CONTRATO NO:	4297 DE 2023
CONTRATISTA:	PROYECTO SANABRIA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIELA SALGADO PINILLA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA.
VALOR TOTAL:	$ 79.541.151,00
PLAZO INICIAL:	3 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ORDEN DE INICIACIÓN:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE TERMINACIÓN INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA NO. 1	DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE ABRIL DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADO:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.
PERIODO DEL INFORME	DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO	ING. SANTIAGO HERNÁNDEZ

5.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

La interventoria realizo las siguientes actividades:

- Se realizo el 19 de febrero el segundo comité operativo con el fin de dar aprobación al plan de compras Nº1.
- Se realizo el acompañamiento continuo a la JAC, mediante llamadas para verificar el proceso de selección y contratación de personal para la ejecución de actividades.
- Se verifico la afiliación y contratos del personal que se contrató en la obra

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Durante este periodo la interventoria no cuenta con personal especialista toda vez que no se han iniciado actividades de obra.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Relacion de equipos o vehículos

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 04

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: FEBRERO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4297-2023

INTERVENTORÍA: PROYECTOS SANABRIA SAS.

CONTRATO DE OBRA No. 4643-2023, 4053-2023, 3809-2023, 3980-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON; JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL VEREDA BUENAVISTA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HABANA

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Motocicleta	Motocicleta 500 TRX Modelo 2023 Placa FIF85G	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:
Certificado de revision tecnomecanica desde 10/10/2023 hasta 10/10/2024
Soat desde 03/10/2023 hasra 02/10/2024

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430 CND

Firma
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 17202-125676 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INTERVENTORIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4297-2023

INTERVENTOR: PROYECTO SANABIA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-24

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA.

CONTRATO DE OBRA No.: 4643-2023 El Japon; 3809-2023 La Atarraya; 3908-2023 La Habana; 4053-2023 Buenavista

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA EL JAPON; JAC DE LA VEREDA LA HABANA; JAC DE LA VEREDA ATARRAYA; JAC DE LA VEREDA BUENAVISTA

NOMBRE ARL: POSITIVA SEGUROS

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: Comp Filiar Caldas

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Dias del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	GIRALDO RIOS STEPHANIA	1,053,817,326	Profesional social	$ 1,120,000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	40%	proyecto sanabria	$ 1,300,000	$ 90,500	V	EPS Sura	75845514	$ 52,000	Porvenir	75845514	$ 208,000	$ 22,400	N/A	N/A	EXIMIDO POR PYME
2	RAMIREZ GUERRERO PAULA ANDREA	1,013,760,290	Residente Interventoria	$ 2,600,000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	proyecto sanabria	$ 2,600,000	$ 181,000	V	Compesar EPS	75845514	$ 104,000	Colpensiones	75845514	$ 416,000	$ 104,000	N/A	N/A	EXIMIDO POR PYME
3	CADENA RAMOS DIANA PAOLA	1,018,451,763	Profesional Ambiental	$ 560,000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	20%	proyecto sanabria	$ 1,300,000	$ 90,500	V	EPS Sura	75845514	$ 52,000	Porvenir	75845514	$ 208,000	$ 22,400	N/A	N/A	EXIMIDO POR PYME
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 4,280,000																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 29/02/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:2520237430CND

Firma
Nombre: SANTIAGO HERNÁNDEZ RENDÓN
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-125676 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INF FIN Y PRESUPUESTAL INT

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-9 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: 29/2/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4297 DE 2023 — **INTERVENTOR:** PROYECTO SANABRIA S.A.S

MES INFORME MENSUAL: feb-24 — **PROYECTO:** "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARAEL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA"

CONVENIOS: 4643-2023, 3809-2023, 3980-2023, 4053-2023 — **CONTRATISTA:** JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE CALDAS : MUNICIPIO LA DORADA, VEREDA JAPON 4643-2023; MUNICIPIO LA DORADA , VEREDA ATARRAYA 3809-2023; MUNICIPIO LA DORADA, VEREDA LA HABANA 3980-2023; MUNICIPIO LA DORADA, VEREDA LA BUENAVISTA 4053-2023

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1260123	C-2402-0800-14-0-2402041-02	10	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 79,541,151.00	$ -
2023	1260123	C-2402-0800-14-0-2402041-02	10	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 36,326,998.00	$ -
				TOTAL		$ 115,868,149.00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 115,868,149.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	nov-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 115,868,149.00	$ 115,868,149.00		
2	dic-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 115,868,149.00	$ 115,868,149.00		
3	ene-24	$ 10,701,800.00	$ 2,033,342.00	$ 12,735,142.00	$ -		$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 103,133,007.00	$ 103,133,007.00		
4	feb-24	$ 8,306,000.00	$ 1,578,140.00	$ 9,884,140.00	$ -	$ -	$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 93,248,867.00	$ 93,248,867.00		
TOTALES		$ 19,007,800.00	$ 3,611,482.00	$ 22,619,282.00	$ -	$ -	$ -					

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	$ 19,007,800.00	$ 3,611,482.00	$ 22,619,282.00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)	$ -		$ -
IVA = 19% * (E) = (F)	$ -		$ -
VALOR TOTAL	$ 19,007,800.00	$ 3,611,482.00	**$ 22,619,282.00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430 CND

Firma
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.17202-129676CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante este periodo no se presentaron cambios en las polizas actualizadas en el periodo pasado.

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 04

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4297-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTO SANABRIA SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA."

FECHA DE INICIO: 23/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 79.541.150,93

VALOR ACUMULADO: $ 115.868.149,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Santiago Hernández Rendón

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 7.954.115,10	8	11	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 15.908.230,2	8	11	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 23.862.345,3	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 430-47-994000063674

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 15/112023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 11.586.814,80	8	11	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 23.173.629,6	8	11	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 34.760.444,4	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 430-47-994000063674

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 8/02/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Juan Carlos Sanabria
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520237430CND

Firma
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL
6.4.1. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

Durante este periodo no re realizaron modificaciones o reprogramación al plan de cargas.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realizo la verificación de los contratos del personal, los cuales cuentan con sus respectivas afiliaciones de seguridad social.

- Se debe iniciar con las correspondientes actividades preliminares puesto que ya se cuenta con recursos y personal para la obra

8. ANEXOS

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

Durante este periodo no se remitió correspondencia oficial directamente al contratista.

8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

Durante este periodo no se iniciaron obras, por lo tanto, no se identifica un registro fotográfico de avance de las obras.

8.3. COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Durante este periodo no se iniciaron obras, por lo tanto, no se cuenta con bitácora de obra.

CONVENIO N.º 3809-2023
JUNTA DE ACCION COMUNAL LA ATARRAYA

III. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN ELDEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3809-2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA

Contrato de Interventoría No. 4297-2023 **Interventoría:** PROYECTO SANABRIA SAS

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN ELDEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 4 **MES O PERIODO:** Febrero

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	3
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	58
1	**INTRODUCCIÓN**		59
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		59
2.1	Localización		59
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		60
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		60
2.4	Características técnicas del proyecto		61
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		63
3.1	Información general del contrato		63
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		64
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		64
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		64
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		64
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	64
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	69
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	69
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	69
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	69
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	69
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	69
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	72
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		72
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra		N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	72
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		72
5.1	Información general del contrato		72
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		72
5.3	Informes especialistas y profesionales		N/A
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		73
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	73
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	75
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	76
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	77
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N/A
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	77
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	**Conclusiones y recomendaciones**		77
8	**Anexos**		77
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		N/A
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		77
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N/A

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO - MEPI-MN1-IN-15-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 6/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** FEBRERO

CONVENIO No.: 3809-2023

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN ELDEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 29/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024
PLAZO ACUMULADO: 4 MESES

VALOR INICIAL : $ 200.779.147,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ 199.779.147,00
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4297-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTO SANABRIA SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** SANTIAGO HERNANDEZ RENDON

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placahuella	mt	170
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Placahuella	Mejoramiento	ML	0	0
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 150.473.039,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.514.191,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 45.791.917,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 200.779.147,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 18.164.129,00	$ 18.164.129,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 9.450.745,00	$ 11.554.807,00
VALOR EJECUTADO	$ 27.614.874,00	$ 29.718.936,00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoria al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 23.347.058,40
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 18.164.129,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 77,80%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **2**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	**Foto 2**
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**
Foto 3	**Foto 4**
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**
Foto 5	**Foto 6**
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

A LA FECHA NO SE PRESENTAN MULTAS O SANCIONES AL CONVENIO

Firma

Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCION

El proyecto **"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA"** entre el Instituto Nacional De Vías y las juntas de acción comunal beneficiadas del Municipio de La Dorada, del cual se ejecuta en el SECOP mediante proceso SPSC-CD-CS-507-2023, se celebra el convenio 3809-2023 que tiene por objeto "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN ELDEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**" tiene como objetivo fundamental lo siguiente:

Ejecutar donde sea necesario el contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

Con lo cual se brinde una infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transitabilidad para los usuarios de las vías, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente, cómoda y segura; por lo tanto, con la ejecución de este proyecto, el Instituto busca el cumplimiento de uno de los fines constitucionales del estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte terrestre y apoyar al desarrollo de la política de intermodalidad del transporte para de esta manera apoyar y contribuir con el Desarrollo Económico de la región.

La firma **PROYECTO SANABRIA SAS**, presenta a consideración del **INVIAS, EL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N.º 04** correspondiente al periodo comprendido entre el **01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**, en este se detallan las actividades realizadas por el Contratista y la Interventoría en el mes.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en la Vereda La Atarraya, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.719000, y longitud -74.725000 y punto de referencia final el PR 0+550 con coordenadas latitud 5.723000, y longitud -74.724000, de la vía Vereda La Atarraya de La Dorada conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

2.1. LOCALIZACION

El municipio de La Dorada se encuentra localizado en la zona Oriente del departamento de Caldas, dista 175 kilómetros de la ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con la ganadería, le sigue la agricultura, la minería del oro, el comercio, la pequeña industria y la pesca, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 574 Km cuadrados de los cuales solo 29.30 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de La Dorada se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 5.4538 - Longitud: -74.6646

El tramo a intervenir en la vereda La Atarraya se localiza en las siguientes coordenadas:

Punto Inicial: Latitud 5.719000 Longitud -74.725000
Punto Final: Latitud 5.723000 Longitud -74.724000



Ilustración 1 - Localización del tramo a intervenir en el corregimiento de La Atarraya
Fuente. ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LA ATARRAYA

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Los municipios directamente influenciados por el proyecto son Norcasia y La Dorada en sus veredas El Japón, Buenavista, La Atarraya, el Tigre, Brisas y La Agustina. Adicionalmente, con la atención de dichas vías se pretende entregar a la comunidad una vía en óptimas condiciones de transitabilidad y seguridad, con lo cual sería una alternativa más económica para el transporte de pasajeros y de carga en el departamento.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA

El convenio cuyo objeto es el **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN ELDEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL,** el cual comprende un tramo de aproximadamente 1180 metros lineales, el cual se ve afectado durante el invierno en diferentes tramos los cuales son señalados por la comunidad que transita a diario por esta via.

El tramo a intervenir en la vereda La Atarraya se localiza en las siguientes coordenadas:

Punto Inicial: Latitud 5.719000 Longitud -74.725000
Punto Final: Latitud 5.723000 Longitud -74.724000



Ilustración 2 – Estado actual de la vía a intervenir en la vereda La Atarraya.

2.4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la importancia del mejoramiento de la vía en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total del municipio de La Dorada en la vereda La atarraya, se realizarán las siguientes actividades:

- Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías.

- Mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

El alcance del convenio 3809-2023 que tiene por objeto **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN ELDEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, corresponde a todas y cada una de las obras y actividades contenidas en los documentos contractuales del contrato de obra.

La vía rural de la vereda La Atarraya a intervenir será objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en el marco de la ejecución del contrato No. 4297 DE 2023 entre Proyecto Sanabria SAS y el INVIAS, como parte del programa Caminos comunitarios de la paz total.

Para la ejecución de las obras se utilizará como guía la cartilla **OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL.**


Para la construcción de las alcantarillas se cita de dicha cartilla en su numeral 8.1.3 ESTRUCTURA TIPO PLACA HUELLA, del cual se copia textualmente:


"La placa huella es un sistema orientado a generar condiciones de transitabilidad adecuadas para vehículos, animales y personas en tramos críticos de vías rurales. El sistema consiste en la colocación de franjas delgadas de placas de concreto separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una, entre las cuales se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada, manteniendo unos sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras y lateralmente por berma cunetas.


Dadas sus características estructurales, el sistema placa huella presentado en esta cartilla es un sistema para vías con bajos niveles de tránsito, que permitan su canalización sobre los rieles de concreto reforzado. Por tanto, debe emplearse en secciones viales existentes con espacio para un solo carril de circulación, estableciéndose nichos específicos con el ancho suficiente, y una superficie distinta de rodado, que permita el paso simultáneo de vehículos en direcciones opuestas. Poder garantizar que el tránsito vehicular se canalice sobre los rieles de concreto reforzado implica que la velocidad de la vía sea baja y los tramos de la placa huella sean discontinuos. Por lo anterior, se recomienda que, el Sistema Placa Huella de esta cartilla sólo se use en vías con ancho de calzada inferior a 5.5 m, velocidad de operación inferior a 30 km/h y que los tramos no superen 500 m de longitud. Así las cosas, en vías predominantemente bidireccionales como las de nuestro país, se sugiere que sólo se utilice este sistema en vías donde las restricciones y ancho de vía originen velocidades de circulación inferiores a 30 km/h y garanticen condiciones efectivas de comodidad y seguridad. Caso contrario, el sistema podría convertirse en una solución menos segura para los usuarios y deberá considerarse otra alternativa como las técnicas presentadas en los capítulos 8.1.1 y 8.1.2.


En el desarrollo de esta cartilla, se evaluaron diversas combinaciones de espesores de placa, cargas vehiculares y tipos de suelo de subrasante. Se realizaron modelos numéricos considerando vehículos tipo C3, C2 y vehículos ligeros (camionetas y automóviles). También se consideró que la placa estuviera en contacto directo con suelo de bajas especificaciones y sobre una capa de material granular compactado. Se evaluaron igualmente diferentes longitudes de placa para identificar la mejor combinación posible. En el plano 125 se presentan los espesores y el refuerzo requerido para vehículos livianos, y en el plano 126 para vehículos C2 y C3.


Se presentan las secciones y detalles según la cartilla **OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL.**




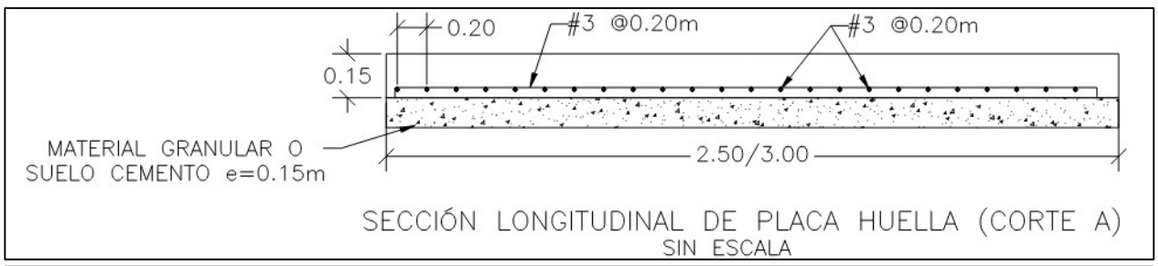




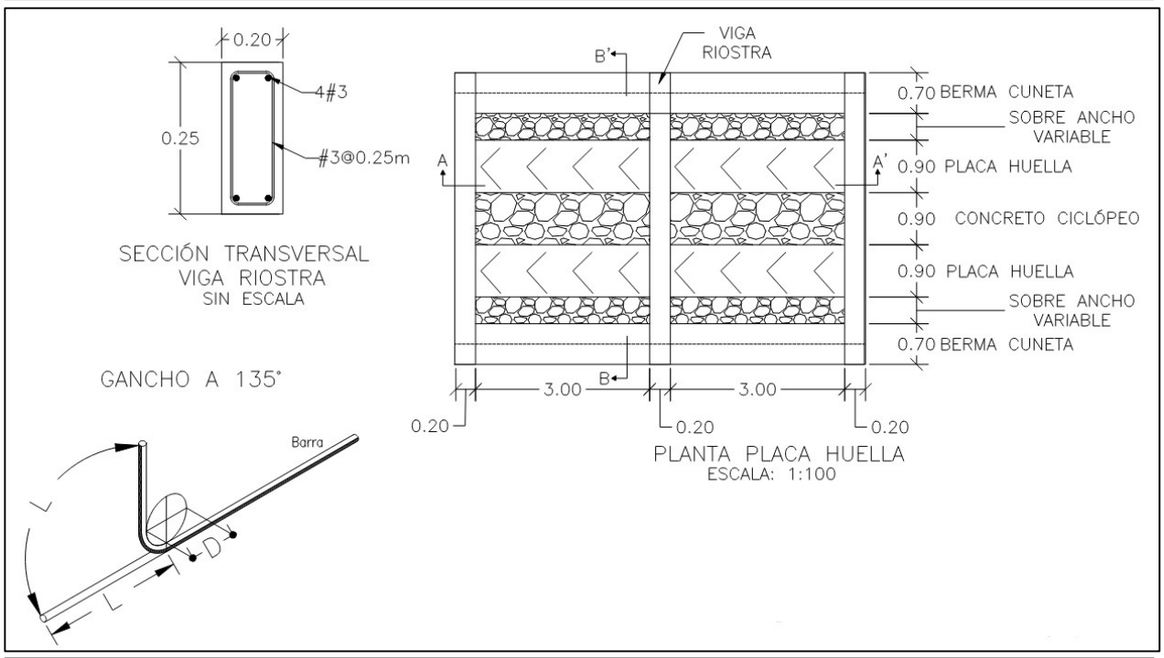

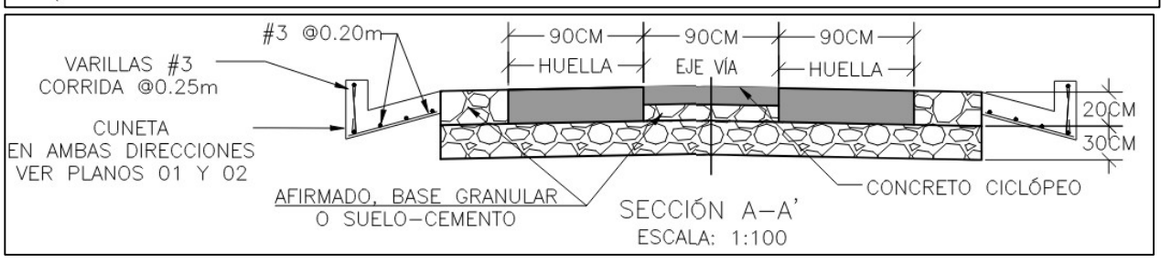

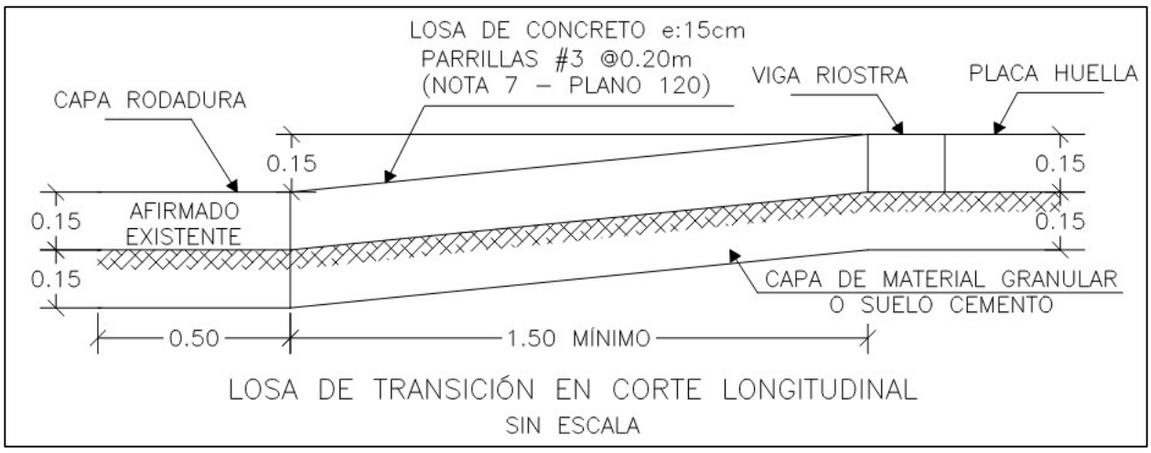

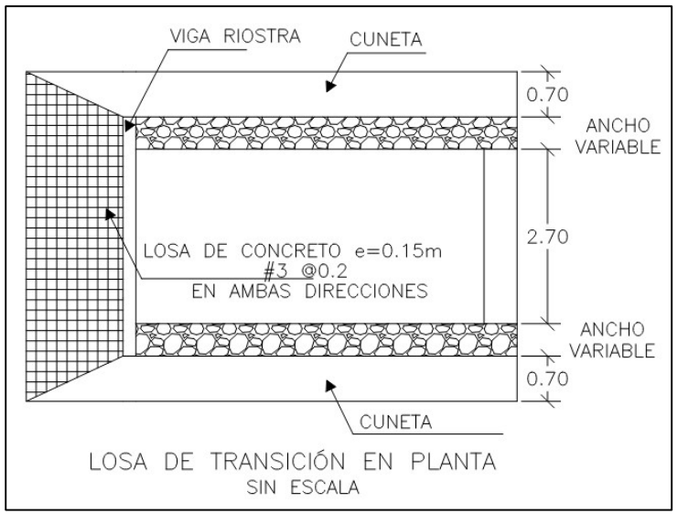

3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

Tabla 1. Informacion general del Convenio

INFORMACION GENERAL	
Contrato No.:	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3809 DE 2023
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA
NIT:	901.022.262
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN ELDEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Longitud aproximada:	550 metros lineales
Valor inicial:	$ 200.779.147,00
Adiciones:	$0,00
Valor total	$ 200.779.147,00
Plazo inicial:	TRES (03) MESES
Etapa de ejecución de las obras:	TRES (03) MESES
Fecha orden de Iniciación:	29/11/2023
Fecha de Terminación inicial:	31/12/2023
Fecha de terminación prorroga 01:	30/04/2024

Fuente: Documentos oficiales del convenio

3.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, el conveniente no realizo actividades de obra, sin embargo, se encuentra en actividades de contratación de personal puesto que se aceptó el plan de compras donde se aprobó la compra de EPP, pago de polizas y demás para dar inicio a las actividades de obra.

Se realizo la toma de topografía inicial del proyecto asi como el ensayo CBR.

3.2.1. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Durante el PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, se realizó el seguimiento del plan de gestión ambiental y formatos sugeridos por INVIAS, en colaboración con la Junta de Acción.

3.2.2. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL

Durante el PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, se realizó el seguimiento al cronograma del plan de gestión social el cual se avaló y contempla todas las áreas de influencia directa de la obra, normativas de la documentación inicial y específica de la junta de acción comunal.

3.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

Durante este periodo no se presentaron items no previstos en la ejecución del convenio.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

La interventoria no evidencia un estado de avance en la obra de igual manera tomo las siguientes acciones:

- Se aprobó el cronograma de obra presentado por el contratista.
- El 19 de febrero se realiza el segundo comité operativo con la JAC, donde se aprueba la compra de materiales preliminares y dotación de personal, asi como el transporte para materiales pétreos y el pago de las polizas y sus anexos.

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. INFORME SEMANAL

Para el presente mes, el contratista no ha iniciado actividades de obra, se aprobó el cronograma remitido por el contratista de obra, desde la interventoria se ha iniciado con el diligenciamiento de los informes semanales desde la orden de inicio del contrato de interventoria Nº 4297-2023,

Adjunto se encuentran los informes semanales correspondiente al mes de febrero 2024, formato técnico MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

1. Informe semanal 11 - 01- 08 feb 2024
2. Informe semanal 12 - 08 al 15 feb 2024
3. Informe semanal 13 - 15 al 22 feb 2024
4. Informe semanal 14 - 22 al 29 feb 2024

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 04

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CODIGO	
		VERSION	
		PAGINA	
		FECHA	12/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CALDAS** — SEMANA No.: **11** del **1/02/2024** al **8/02/2024** Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **Santiago Hernández Rendón** — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en la Vereda La Atarraya, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.719000, y longitud -74.725000 y punto de referencia final el PR 0+550 con coordenadas latitud 5.723000, y longitud -74.724000, de la vía Vereda La Atarraya de La Dorada conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA			INTERVENTOR:	PROYECTOS SANABRIA SAS.		
				INTEGRANTES:			
CONVENIO No:	3809- 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.779.147,00	CONTRATO No.	4297-2023	VALOR INICIAL:	$ 79.541.151,00
FECHA DE INICIO:	29/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ 36.326.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.779.147,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 115.868.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.779.147,00	$ 200.779.147		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.779.147,00	$ 200.779.147		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.779.147,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 30.225,13	0,02%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (30.225,13)	-0,02%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 2.104.061,99	1,05%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 10.565.240,74	5,26%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.104.061,99	1,05%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (8.461.178,7)	-4,21%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.162.099,31	0,58%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	%

Observaciones: A la fecha se aprobaron las polizas del convenio por un valor de 2,104,061.99

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 115.868.149,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.910.720,00	7,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.970.240,00	2,56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.970.240,00	2,56%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajeria instantanea

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 0,02% — Avance o Atraso Físico %: -0,02%
Meta Física Ejecutada %: 0%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Excavaciones varias sin Clasificar	m3	1,28

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1,28			1,28	0,00
Ejec	0,00			0,00	0,00
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoría, se realizo la socializacion del proyecto el dia 28 de enero, se ha realizado el acompañamiento desde el plan de gestion social.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua con el seguimiento y apoyo conjunto a los presidentes de las JAC, con el fin de resolver dudas y aclarar temas pertinentes con respecto al proyecto en marcha para su comunidad.
Se realizo la socializacion en conjunto con el personal de la JAC y la Interventoria el dia 28 de enero de 2024.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Programacion de comité operativo para aprobacion de compras de dotacion, materiales, EPP y demas que se presente por el contratista

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se ha brindado acompañamiento al contratista mediante llamadas y mensajes con el fin de agilizar el inicio de las actividades

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Paola A. Ramirez
NOMBRE: PAULA A. RAMIREZ
Matrícula Profesional No.: 25202-402196 CND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 04

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CODIGO	
	VERSION	
	PAGINA	
	FECHA	20/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CALDAS** — SEMANA No.: **12** del **8/02/2024** al **15/02/2024** Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **Santiago Hernández Rendón** — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en la Vereda La Atarraya, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.719000, y longitud -74.725000 y punto de referencia final el PR 0+550 con coordenadas latitud 5.723000, y longitud -74.724000, de la vía Vereda La Atarraya de La Dorada conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA**

CONVENIO No.	3809- 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.779.147,00
FECHA DE INICIO:	29/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.779.147,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: **PROYECTOS SANABRIA SAS**

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	4297-2023	VALOR INICIAL:	$ 79.541.151,00
FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ 36.326.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 115.868.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.779.147,00	$ 200.779.147		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.779.147,00	$ 200.779.147		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.779.147,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 47.496,63	0,02%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (47.496,63)	-0,02%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 2.104.061,99	1,05%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 11.743.712,01	5,85%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.104.061,99	1,05%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (9.639.650,0)	-4,80%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.178.471,28	0,59%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	%

Observaciones: A la fecha se aprobaron las polizas del convenio por un valor de 2,104.061,99

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 115.868.149,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.910.720,00	7,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.970.240,00	2,56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.970.240,00	2,56%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajeria instantanea

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 0,03% — Avance o Atraso Físico %: -0,03%

Meta Física Ejecutada %: 0%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
-	Excavaciones varias sin Clasificar	m3	2,02
-			
-			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	2,02			2,02	0,00%
Ejec	0,00			0,00	0,00%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoria, se realizo la socializacion del proyecto el dia 26 de enero


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua con el seguimiento y apoyo conjunto a los presidentes de las JAC, con el fin de resolver dudas y aclarar temas pertinentes con respecto al proyecto en marcha para su comunidad.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Verificacion de las cotizaciones actualizadas por la JAC.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se ha brindado acompañamiento al contratista mediante llamadas y mensajes con el fin de agilizar el inicio de las actividades, asi como la realizacion del comité operativo

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Paula A. Ramirez

NOMBRE: PAULA A. RAMIREZ

Matrícula Profesional No.: 25202-402196 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 04

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CALDAS** — SEMANA No.: **13** del **15/02/2024** al **22/02/2024** (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **Santiago Hernández Rendón** — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL JAPÓN DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vias, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en la Vereda La Atarraya, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.719000, y longitud -74.725000 y punto de referencia final el PR 0+550 con coordenadas latitud 5.723000, y longitud -74.724000, de la vía Vereda La Atarraya de La Dorada conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA			INTERVENTOR:	PROYECTOS SANABRIA SAS.		
				INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	3809- 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.779.147,00	CONTRATO No.	4297-2023	VALOR INICIAL:	$ 79.541.151,00
FECHA DE INICIO:	29/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ 36.326.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.779.147,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 115.868.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.779.147,00	$ 200.779.147		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.779.147,00	$ 200.779.147		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.779.147,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 4.016.022,13	2,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (4.016.022,13)	-2,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 2.104.061,99	1,05%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 17.744.337,13	8,84%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.104.061,99	1,05%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (15.640.275,1)	-7,79%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ 6.000.625,11	2,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	$ -	%

Observaciones: Se encuentra en revision el plan de compras Nº 1 suministrado por el contratista

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 115.868.149,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.910.720,00	7,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.970.240,00	2,56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.970.240,00	2,56%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajeria instantanea

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 2,67% — Avance o Atraso Físico %: -2,67%
Meta Física Ejecutada %: 0%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Excavaciones varias sin Clasificar	m3	2,75
Subbase Granular Clase C	m3	20,38

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	2,75			2,75	0,01%
Ejec	0,00			0,00	0,00%
Prog	20,38			20,38	2,63%
Ejec	0,00			0,00	0,00%
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DISPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
Salon de la Junta de accion Comunal Vereda la Atarraya	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoria, se realizo la socializacion del proyecto el dia 28 de enero


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua con el seguimiento y apoyo conjunto a los presidentes de las JAC, con el fin de resolver dudas y aclarar temas pertinentes con respecto al proyecto en marcha para su comunidad.
Se solicito la relacion del personal afiliado para dar inicio a las obras.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Verificacion en campo de actividades tras entrega de estudio topografico y tomas CBR

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS V S METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs. meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se ha brindado acompañamiento al contratista mediante llamadas y mensajes con el fin de agilizar el inicio de las actividades.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Paula A. Ramirez
NOMBRE: PAULA A. RAMIREZ
Matrícula Profesional No.: 25202-402198 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 04

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CODIGO	
		VERSION	
		PAGINA	
		FECHA	(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CALDAS** — SEMANA No.: **14** del **22/02/2024** al **29/02/2024** Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **Santiago Hernández Rendón** — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: **ALNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en la Vereda La Atarraya, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.719000, y longitud -74.725000 y punto de referencia final el PR 0+550 con coordenadas latitud 5.723000, y longitud -74.724000, de la vía Vereda La Atarraya de La Dorada conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA			INTERVENTOR:	PROYECTOS SANABRIA SAS.		
				INTEGRANTES:			
CONVENIO No:	3809- 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.779.147,00	CONTRATO No.	4297-2023	VALOR INICIAL:	$ 79.541.151,00
FECHA DE INICIO:	29/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ 36.326.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.779.147,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 115.868.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.779.147,00	$ 200.779.147		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.779.147,00	$ 200.779.147		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.779.147,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 23.347.058,40	11,63%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 18.164.129,00	9,05%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 5.182.929,40	2,58%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 11.554.805,99	5,75%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 41.471.343,98	20,66%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 29.718.935,99	14,80%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 11.752.408,0	5,85%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ 6.000.625,11	2,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	$ 27.614.874,00	13,75%

Observaciones: Se encuentra en revision y aprobacion el plan de compras Nº 1

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 115.868.149,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.910.720,00	7,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.970.240,00	2,56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.970.240,00	2,56%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajeria instantanea

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 15,52% — Avance o Atraso Físico %: 15,52%
Meta Física Ejecutada %: 0%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Excavaciones varias sin Clasificar	m3	3,48
Subbase Granular Clase C	m3	61,14
Concreto reforzado resistencia 21 MPA	m3	9,60

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Fisico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	3,48			3,48	0,05%
Ejec	0,00			0,00	0,00%
Prog	61,14			61,14	7,88%
Ejec	0,00			0,00	0,00%
Prog	9,60			9,60	5,30%
Ejec	0,00			0,00	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Salon de la Junta de accion Comunal Vereda la Atarraya

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoria, se realizo la socializacion del proyecto el dia 28 de enero


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua con el seguimiento y apoyo conjunto a los presidentes de las JAC, con el fin de resolver dudas y aclarar temas pertinentes con respecto al proyecto en marcha para su comunidad.
Se solicito la relacion del personal afiliado para dar inicio a las obras.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Comité operativo para aprobacion de compra de insumos de construccion.
Inicio de obra.

VII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE META S FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se ha brindado acompañamiento al contratista mediante llamadas y mensajes con el fin de agilizar el inicio de las actividades.
Se realiza la aprobacion del plan de compras una vez verificado las facturas y cotizaciones

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Paula A. Ramirez
NOMBRE: PAULA A. RAMIREZ
Matrícula Profesional No.: 25202-402196 CND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Durante este periodo no se han iniciado obras, por lo tanto, no se cuenta con maquinaria ni equipo en el momento.

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo correspondiente al presente informe el contratista de obra no dio inicio a las actividades contractuales, y tampoco cuenta con personal contratado.

4.4. ACTA MENSUAL DE PAGOS CONVENIO

Durante este periodo no se han realizado actas parciales de obra

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante el periodo correspondiente al presente informe, el contratista de obra no dio inicio a las actividades contractuales, por lo tanto, no se anexa informacion del estado general del tiempo.

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante este periodo se realizó el ensayo de CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada I.N.V-E 148.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PAGINA	

FECHA: 15/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No.: 3809-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL FEBRERO **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4297-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTO SANARIA SAS.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Dia/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
1	16/02/2024	CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada	I.N.V-E 148	Excavacion en sitio de la obra, Vereda La Atarraya	1	3% ≥	9,30%	Si	Se considera apto el suelo para dar inicio a las actividades de obra
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:
Durante este periodo no se realizaron ensayor por parte de la Interventoria

NOTAS:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: Juan Carlos Portela
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 252020-91402 CND

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Durante este periodo no se realizó ningún cambio en las polizas del convenio.

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 04

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No. 3809-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ATRRAYA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ATARRAYA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN ELDEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 29/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.779.147,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.779.147,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4297 **INTERVENTOR:** PROYECTO SANABRIA SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.155.829	12	10	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.038.957	12	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.233.744	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100291857

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 232.000.000	12	10	2023	31	12	2024
Otros	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100071722 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 14/11/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 0 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 0 **SUSPENSIÓN No.:** 0

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.185.826	12	10	2023	1	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.046.457	12	10	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.278.739	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100291857

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 0 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 0 **SUSPENSIÓN No.:** 0

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 232.000.000	12	10	2023	30	4	2024
Otros	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100071722 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

No se identifica en la plataforma del SECOP II la aprobacion de polizas de la prorroga 01.

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JUAN CARALOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.8. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.8.1. INFORME INVERSIÓN BUEN MANEJO DESEMBOLSO

Durante este periodo no se han realizado movimientos en la cuenta

4.8.2. PLAN INVERSIÓN DESEMBOLSO MENSUAL

Durante este periodo no se presentó un plan de inversión de desembolsos por parte de la JAC

4.8.3. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Durante este periodo no se dio inicio a las obras, no se realizaron comités

4.8.4. ACTAS DE REUNION

Durante este periodo se realizó el segundo comité operativo con el fin de aprobar el plan de compras Nº1 y dar inicio a las obras, se anexa acta en formato PDF.

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 2. Informacion general del contrato de interventoria N.º 4297-2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)
CONTRATO NO:	4297 DE 2023
CONTRATISTA:	PROYECTO SANABRIA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIELA SALGADO PINILLA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA.
VALOR TOTAL:	$ 79.541.151,00
PLAZO INICIAL:	3 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ORDEN DE INICIACIÓN:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE TERMINACIÓN INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA NO. 1	DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE ABRIL DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADO:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.
PERIODO DEL INFORME	DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO	ING. SANTIAGO HERNÁNDEZ

5.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

La interventoria realizo las siguientes actividades:

- Se realizo el 19 de febrero el segundo comité operativo con el fin de dar aprobación al plan de compras Nº1.
- Se realizo el acompañamiento continuo a la JAC, mediante llamadas para verificar el proceso de selección y contratación de personal para la ejecución de actividades.

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Durante este periodo la interventoria no cuenta con personal especialista toda vez que no se han iniciado actividades de obra.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se relacionan equipos o vehículos

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** CALDAS

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: FEBRERO
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4297-2023
INTERVENTORÍA: PROYECTOS SANABRIA SAS.

CONTRATO DE OBRA No. 4643-2023, 4053-2023, 3809-2023, 3980-2023
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON; JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL VEREDA BUENAVISTA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HABANA

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Motocicleta	Motocicleta 500 TRX Modelo 2023 Placa FIF85G	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:
Certificado de revision tecnomecanica desde 10/10/2023 hasta 10/10/2024
Soat desde 03/10/2023 hasra 02/10/2024

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430 CND

Firma
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 17202-125676 CLD

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INTERVENTORIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4297-2023

INTERVENTOR: PROYECTO SANABIA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-24

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA.

CONTRATO DE OBRA No.: 4643-2023 El Japon; 3809-2023 La Atarraya; 3908-2023 La Habana; 4053-2023 Buenavista

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA EL JAPON; JAC DE LA VEREDA LA HABANA; JAC DE LA VEREDA ATARRAYA; JAC DE LA VEREDA BUENAVISTA

NOMBRE ARL: POSITIVA SEGUROS

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: Comp Fliar Caldas

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	GIRALDO RIOS STEPHANIA	1,053,817,326	Profesional social	$ 1,120,000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	40%	proyecto sanabria	$ 1,300,000	$ 90,500	V	EPS Sura	75845514	$ 52,000	Porvenir	75845514	$ 208,000	$ 22,400	N/A	N/A	EXIMIDO POR PYME
2	RAMIREZ GUERRERO PAULA ANDREA	1,013,760,290	Residente Interventoria	$ 2,600,000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	proyecto sanabria	$ 2,600,000	$ 181,000	V	Compesar EPS	75845514	$ 104,000	Colpensiones	75845514	$ 416,000	$ 104,000	N/A	N/A	EXIMIDO POR PYME
3	CADENA RAMOS DIANA PAOLA	1,018,451,763	Profesional Ambiental	$ 560,000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	20%	proyecto sanabria	$ 1,300,000	$ 90,500	V	EPS Sura	75845514	$ 52,000	Porvenir	75845514	$ 208,000	$ 22,400	N/A	N/A	EXIMIDO POR PYME
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 4,280,000																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 29/02/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:2520237430CND

Firma
Nombre: SANTIAGO HERNÁNDEZ RENDÓN
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-125676 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INF FIN Y PRESUPUESTAL INT

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/2/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4297 DE 2023 — **INTERVENTOR:** PROYECTO SANABRIA S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: feb-24 — **PROYECTO:** "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARAEL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA"

CONVENIOS: 4643-2023, 3809-2023, 3980-2023, 4053-2023 — **CONTRATISTA:** JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE CALDAS : MUNICIPIO LA DORADA, VEREDA JAPON 4643-2023; MUNICIPIO LA DORADA , VEREDA ATARRAYA 3809-2023; MUNICIPIO LA DORADA, VEREDA LA HABANA 3980-2023; MUNICIPIO LA DORADA, VEREDA LA BUENAVISTA 4053-2023

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1260123	C-2402-0800-14-0-2402041-02	10	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 79,541,151.00	$ -
2023	1260123	C-2402-0800-14-0-2402041-02	10	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 36,326,998.00	
				TOTAL		$ 115,868,149.00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 115,868,149.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	nov-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 115,868,149.00	$ 115,868,149.00		
2	dic-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 115,868,149.00	$ 115,868,149.00		
3	ene-24	$ 10,701,800.00	$ 2,033,342.00	$ 12,735,142.00	$ -		$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 103,133,007.00	$ 103,133,007.00		
4	feb-24	$ 8,306,000.00	$ 1,578,140.00	$ 9,884,140.00	$ -	$ -	$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 93,248,867.00	$ 93,248,867.00		
	TOTALES	$ 19,007,800.00	$ 3,611,482.00	$ 22,619,282.00	$ -	$ -	$ -					

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	$ 19,007,800.00	$ 3,611,482.00	$ 22,619,282.00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)	$ -		$ -
IVA = 19% * (E) = (F)	$ -		$ -
VALOR TOTAL	$ 19,007,800.00	$ 3,611,482.00	**$ 22,619,282.00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS ISANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430 CND

Firma
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.17202-125676CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante este periodo no se presentaron cambios en las polizas actualizadas en el periodo pasado.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4297-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTO SANABRIA SAS

OBJETO DEL CONTRATO:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA."

FECHA DE INICIO: 23/11/2023
PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 79.541.150,93
VALOR ACUMULADO: $ 115.868.149,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Santiago Hernández Rendón

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 7.954.115,10	8	11	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 15.908.230,2	8	11	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 23.862.345,3	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 430-47-994000063674
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 15/112023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 11.586.814,80	8	11	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 23.173.629,6	8	11	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 34.760.444,4	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 430-47-994000063674
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 8/02/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Juan Carlos Sanabria
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520237430CND

Firma
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

6.5.1. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

Durante este periodo no re realizaron modificaciones o reprogramación al plan de cargas.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realizo la aprobación del personal técnico y administrativo del convenio, se está a la espera de la entrega de contratos del personal de obra y las correspondientes afiliaciones de seguridad social.

- Se debe iniciar con la contratación de personal lo más pronto posible para dar inicio a las actividades de obra

8. ANEXOS

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

Durante este periodo no se remitió correspondencia oficial directamente al contratista.

8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

Durante este periodo no se iniciaron obras, por lo tanto, no se identifica un registro fotográfico de avance de las obras.

8.3. COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Durante este periodo no se iniciaron obras, por lo tanto, no se cuenta con bitácora de obra.

CONVENIO N.º 3980-2023
JUNTA DE ACCION COMUNAL LA HABANA

IV. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN ELDEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - MEPI-MN1-IN-15-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3980-2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HABANA

Contrato de Interventoría No. 4297-2023 **Interventoría:** PROYECTO SANABRIA SAS

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 4 **MES O PERIODO:** Febrero

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	4
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	80
1	**INTRODUCCIÓN**		81
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		81
2.1	Localización		81
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		82
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		82
2.4	Características técnicas del proyecto		82
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		85
3.1	Información general del contrato		85
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		86
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		86
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		86
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		86
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	86
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	91
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	91
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	N/A
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	N/A
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N/A
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	91
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N/A
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		94
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	94
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	94
	• Seguimiento Programa de Obra		N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N/A
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	94
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		94
5.1	Información general del contrato		94
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		95
5.3	Informes especialistas y profesionales		95
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		95
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	95
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	95
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	97
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	98
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N/A
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	99
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	**Conclusiones y recomendaciones**		99
8	**Anexos**		99
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		99
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		99
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		99
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		99

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO - MEPI-MN1-IN-15-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 6/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **PERIODO MES:** FEBRERO

CONVENIO No.: 3980-2023

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HABANA

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 29/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024
PLAZO ACUMULADO: 4 MESES

VALOR INICIAL : $ 200.765.816,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ 199.765.816,00
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4297-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTO SANABRIA SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** SANTIAGO HERNANDEZ RENDON

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placahuella	ml	166
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Placahuella	Mejoramiento	M.L	0	0
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 150.527.845,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.515.835,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 45.722.136,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 200.765.816,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 19.092.518,00	$ 19.092.518,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 6.281.744,00	$ 8.365.803,84
VALOR EJECUTADO	$ 25.374.262,00	$ 27.458.321,84

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 23.744.312,38
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 19.092.518,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 80,41%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	**Foto 2**
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**
Foto 3	**Foto 4**
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**
Foto 5	**Foto 6**
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

A LA FECHA NO SE PRESENTAN MULTAS O SANCIONES AL CONVENIO

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCION

El proyecto **"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA"** entre el Instituto Nacional De Vías y las juntas de acción comunal beneficiadas del Municipio de La Dorada, del cual se ejecuta en el SECOP mediante proceso SPSC-CD-CS-613-2023, se celebra el convenio 3809-2023 que tiene por objeto "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**" tiene como objetivo fundamental lo siguiente:

Ejecutar donde sea necesario el contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

Con lo cual se brinde una infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transitabilidad para los usuarios de las vías, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente, cómoda y segura; por lo tanto, con la ejecución de este proyecto, el Instituto busca el cumplimiento de uno de los fines constitucionales del estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte terrestre y apoyar al desarrollo de la política de intermodalidad del transporte para de esta manera apoyar y contribuir con el Desarrollo Económico de la región.

La firma **PROYECTO SANABRIA SAS**, presenta a consideración del **INVIAS, EL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N.º 04** correspondiente al periodo comprendido entre el **01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**, en este se detallan las actividades realizadas por el Contratista y la Interventoría en el mes.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en la Vereda La Habana, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.632200 y longitud -74.783800 y punto de referencia final el PR 1+200 con coordenadas latitud 5.641743 y longitud -74.782085, de la vía El Tigre - La Habana de La Dorada, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

2.1. LOCALIZACION

El municipio de La Dorada se encuentra localizado en la zona Oriente del departamento de Caldas, dista 175 kilómetros de la ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con la ganadería, le sigue la agricultura, la minería del oro, el comercio, la pequeña industria y la pesca, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 574 Km cuadrados de los cuales solo 29.30 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de La Dorada se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 5.4538 - Longitud: -74.6646

El tramo a intervenir en la vereda La Habana se localiza en las siguientes coordenadas:

Punto Inicial: Latitud 5.632200 Longitud -74.783800
Punto Final: Latitud 5.641743 Longitud -74.782085



GlobalID EJE	ee6d9f75-0913-4bc5-9f50-5a07f6a226a0
Código Vía	17380_001
Nombre Vía	Vía el tigre- vereda la habana
Categoría	3
Tipo Eje	1
Observaciones	Necesitan muro
Longitud Tramo (Km)	1,18
Fecha registro	2/9/2023, 15:26
Usuario	territorial.caldas

Ilustración 1 - Localización del tramo a intervenir en el corregimiento de La Habana
Fuente. ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LA HABANA

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Directamente se afecta el municipio de la Dorada en el departamento de Caldas, el cual se compone el 10% de población rural, y este tipo de obras crean beneficios de movilidad, transitabilidad, en general mejora las condiciones actuales de comunicación entre veredas, principalmente al ejecutar placas huellas y obras complementarias, que garanticen mayor tiempo de obras realizadas con calidad.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA

El convenio cuyo objeto es el **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA EN ELDEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL,** el cual comprende un tramo de aproximadamente 1180 metros lineales, el cual se ve afectado durante el invierno en diferentes tramos los cuales son señalados por la comunidad que transita a diario por esta via.

El tramo a intervenir en la vereda La Habana se localiza en las siguientes coordenadas:

Punto Inicial: Latitud 5.632200 Longitud -74.783800
Punto Final: Latitud 5.641743 Longitud -74.782085



Ilustración 2 – Estado actual de la vía a intervenir en la vereda La Habana.

2.4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la importancia del mejoramiento de la vía en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total del municipio de La Dorada en la vereda La Habana, se realizarán las siguientes actividades:

- Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías.

- Mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

El alcance del convenio 3980-2023 que tiene por objeto **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, corresponde a todas y cada una de las obras y actividades contenidas en los documentos contractuales del contrato de obra.

La vía rural de la vereda La Habana a intervenir será objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en el marco de la ejecución del contrato No. 4297 DE 2023 entre Proyecto Sanabria SAS y el INVIAS, como parte del programa Caminos comunitarios de la paz total.

Para la ejecución de las obras se utilizará como guía la cartilla **OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL.**


Para la construcción de las alcantarillas se cita de dicha cartilla en su numeral 8.1.3 ESTRUCTURA TIPO PLACA HUELLA, del cual se copia textualmente:


"La placa huella es un sistema orientado a generar condiciones de transitabilidad adecuadas para vehículos, animales y personas en tramos críticos de vías rurales. El sistema consiste en la colocación de franjas delgadas de placas de concreto separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una, entre las cuales se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada, manteniendo unos sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras y lateralmente por berma cunetas.

Dadas sus características estructurales, el sistema placa huella presentado en esta cartilla es un sistema para vías con bajos niveles de tránsito, que permitan su canalización sobre los rieles de concreto reforzado. Por tanto, debe emplearse en secciones viales existentes con espacio para un solo carril de circulación, estableciéndose nichos específicos con el ancho suficiente, y una superficie distinta de rodado, que permita el paso simultáneo de vehículos en direcciones opuestas. Poder garantizar que el tránsito vehicular se canalice sobre los rieles de concreto reforzado implica que la velocidad de la vía sea baja y los tramos de la placa huella sean discontinuos. Por lo anterior, se recomienda que, el Sistema Placa Huella de esta cartilla sólo se use en vías con ancho de calzada inferior a 5.5 m, velocidad de operación inferior a 30 km/h y que los tramos no superen 500 m de longitud. Así las cosas, en vías predominantemente bidireccionales como las de nuestro país, se sugiere que sólo se utilice este sistema en vías donde las restricciones y ancho de vía originen velocidades de circulación inferiores a 30 km/h y garanticen condiciones efectivas de comodidad y seguridad. Caso contrario, el sistema podría convertirse en una solución menos segura para los usuarios y deberá considerarse otra alternativa como las técnicas presentadas en los capítulos 8.1.1 y 8.1.2.


En el desarrollo de esta cartilla, se evaluaron diversas combinaciones de espesores de placa, cargas vehiculares y tipos de suelo de subrasante. Se realizaron modelos numéricos considerando vehículos tipo C3, C2 y vehículos ligeros (camionetas y automóviles). También se consideró que la placa estuviera en contacto directo con suelo de bajas especificaciones y sobre una capa de material granular compactado. Se evaluaron igualmente diferentes longitudes de placa para identificar la mejor combinación posible. En el plano 125 se presentan los espesores y el refuerzo requerido para vehículos livianos, y en el plano 126 para vehículos C2 y C3.


Se presentan las secciones y detalles según la cartilla **OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL.**



#3 @0.20m AMBAS DIRECCIONES
SOBRE ANCHO VARIABLE
#3 @0.20m
SOBRE ANCHO VARIABLE
VARILLAS #3 CORRIDA @0.25m
0.15
0.55
0.90
0.90
0.90
0.55
0.15
0.12
0.30
0.20
MATERIAL GRANULAR O SUELO CEMENTO e=0.15 m
CUNETA EN AMBAS DIRECCIONES VER PLANOS 01 Y 02
SECCIÓN TRANSVERSAL DE PLACA HUELLA (CORTE B–B)
SIN ESCALA

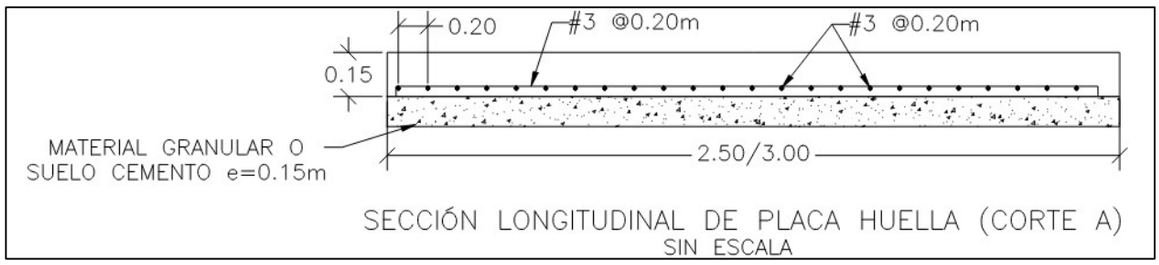

0.20
#3 @0.20m
#3 @0.20m
0.15
MATERIAL GRANULAR O SUELO CEMENTO e=0.15m
2.50/3.00
SECCIÓN LONGITUDINAL DE PLACA HUELLA (CORTE A)
SIN ESCALA


0.15
0.55
4 #3
#3 @0.25m
ANCHO DE VÍA
0.25
SECCIÓN LONGITUDINAL VIGA RIOSTRA
SIN ESCALA

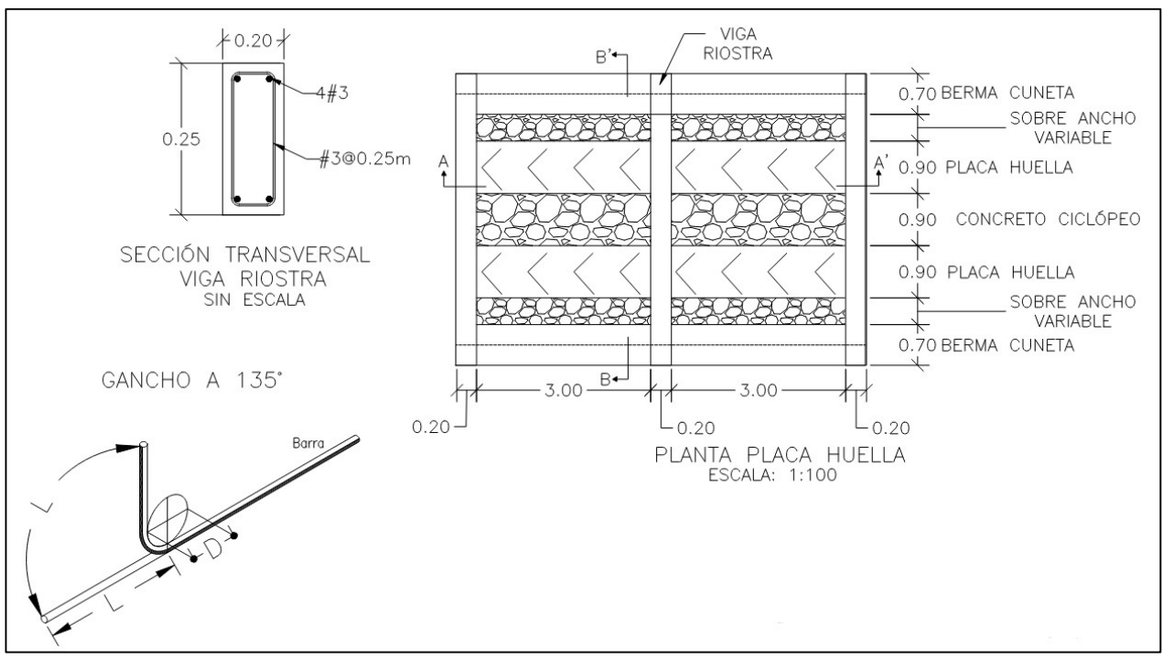
0.20
4#3
0.25
#3@0.25m
SECCIÓN TRANSVERSAL VIGA RIOSTRA
SIN ESCALA
GANCHO A 135°
Barra
L
D
L
VIGA RIOSTRA
B'
A
A'
B
0.70 BERMA CUNETA
SOBRE ANCHO VARIABLE
0.90 PLACA HUELLA
0.90 CONCRETO CICLÓPEO
0.90 PLACA HUELLA
SOBRE ANCHO VARIABLE
0.70 BERMA CUNETA
3.00
3.00
0.20
0.20
0.20
PLANTA PLACA HUELLA
ESCALA: 1:100

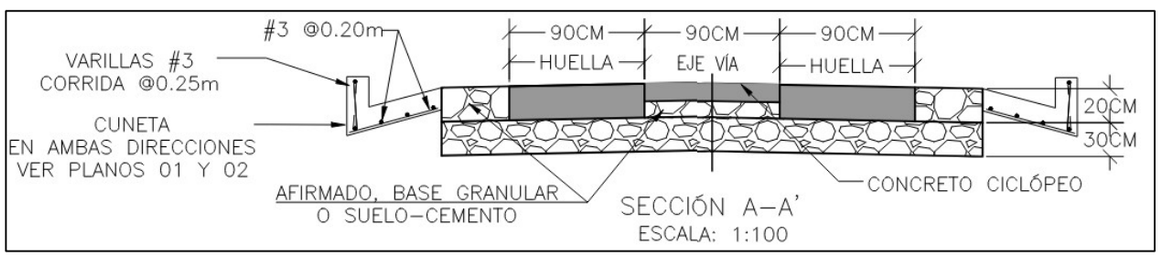
#3 @0.20m
90CM
90CM
90CM
HUELLA
EJE VÍA
HUELLA
VARILLAS #3 CORRIDA @0.25m
CUNETA EN AMBAS DIRECCIONES VER PLANOS 01 Y 02
20CM
30CM
AFIRMADO, BASE GRANULAR O SUELO–CEMENTO
CONCRETO CICLÓPEO
SECCIÓN A–A'
ESCALA: 1:100

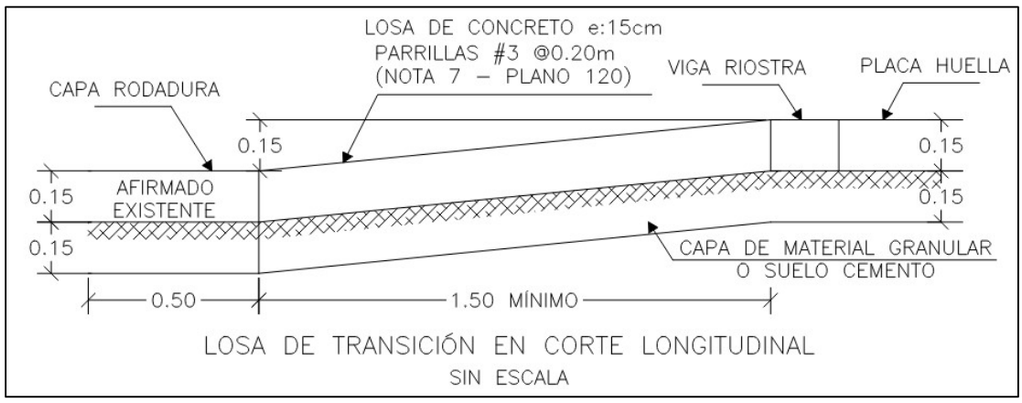

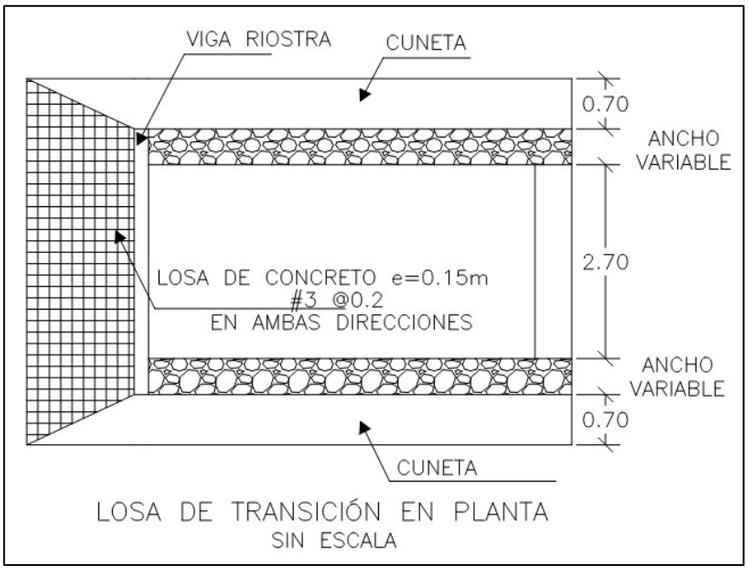

3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

Tabla 1. Informacion general del Convenio

INFORMACION GENERAL	
Contrato No.:	CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3980 DE 2023
Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HABANA
NIT:	810.005.741-0
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Longitud aproximada:	1180 metros lineales
Valor inicial:	$ 200.765.816,00
Adiciones:	$0,00
Valor total	$ 200.765.816,00
Plazo inicial:	TRES (03) MESES
Etapa de ejecución de las obras:	TRES (03) MESES
Fecha orden de Iniciación:	29/11/2023
Fecha de Terminación inicial:	31/12/2023
Fecha de terminación prorroga 01:	30/04/2024

Fuente: Documentos oficiales del convenio

3.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, el conveniente no realizo actividades de obra puesto que no se ha aprobado un plan de compras, no obstante, se realizó el primer comité operativo con el fin de realizar la aprobación de compras necesarias para iniciar actividades de obra.

Se realizo la toma de topografía inicial del proyecto asi como el ensayo CBR.

3.2.1. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Durante el PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, se realizó el seguimiento del plan de gestión ambiental y formatos sugeridos por INVIAS, en colaboración con la Junta de Acción.

3.2.2. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL

Durante el PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, se realizó el seguimiento al cronograma del plan de gestión social el cual se avaló y contempla todas las áreas de influencia directa de la obra, normativas de la documentación iniciales específicas para cada junta de acción comunal.

3.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

Durante este periodo no se presentaron items no previstos en la ejecución del convenio.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

La interventoria no evidencia un estado de avance en la obra de igual manera tomo las siguientes acciones:

- Se aprobó el cronograma de obra presentado por el contratista.
- El 19 de febrero se realiza el segundo comité operativo con la JAC, donde se aprueba la compra de materiales preliminares y dotación de personal, asi como el transporte para materiales pétreos y el pago de las polizas y sus anexos.

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. INFORME SEMANAL

Para el presente mes, el contratista no ha iniciado actividades de obra, se aprobó el cronograma remitido por el contratista de obra, desde la interventoria se ha iniciado con el diligenciamiento de los informes semanales desde la orden de inicio del contrato de interventoria Nº 4297-2023.

Adjunto se encuentran los informes semanales correspondiente al mes de febrero 2024, formato técnico MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

1. Informe semanal 11 - 01- 08 feb 2024
2. Informe semanal 12 - 08 al 15 feb 2024
3. Informe semanal 13 - 15 al 22 feb 2024
4. Informe semanal 14 - 22 al 29 feb 2024

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 04

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CODIGO	
		VERSION	
		PAGINA	
		FECHA	12/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CALDAS** — SEMANA No.: **11** del **1/02/2024** al **8/02/2024** Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **Santiago Hernández Rendón** — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en la Vereda La Habana, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.632200 y longitud -74.783800 y punto de referencia final el PR 1+200 con coordenadas latitud 5.641743 y longitud -74.782085, de la vía El Tigre - La Habana de La Dorada, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HABANA			INTERVENTOR:	PROYECTOS SANABRIA SAS.		
				INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	3980- 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.765.816,00	CONTRATO No.	4297-2023	VALOR INICIAL:	$ 79.541.151,00
FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ 36.326.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.765.816,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 115.868.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.765.816,00	$ 200.765.816		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.765.816,00	$ 200.765.816		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.765.816,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 29.822,92	0,01%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (29.822,92)	-0,01%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 2.084.059,84	1,04%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 10.497.922,01	5,23%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.084.059,84	1,04%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (8.413.862,17)	-4,19%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.178.205,81	0,59%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%

Observaciones: A la fecha se aprobaron las polizas del convenio por un valor de $2.084.059,84

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 115.868.149,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.910.720,00	7,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.970.240,00	2,56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.970.240,00	2,56%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajeria instantanea

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 0,02% — Avance o Atraso Físico %: -0,02%
Meta Física Ejecutada %: 0,00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Excavaciones varias sin Clasificar	m3	1,26

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1,26			1,26	0,01%
Ejec	0			-	0,00%
Prog				-	
Ejec				-	
Prog				-	
Ejec				-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

De scripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ..... NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ..... NO .....
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI	NO	N/A: .....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A: .....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A: .....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A: .....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A: .....

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	1	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoria, se realizo la socializacion del proyecto el dia 26 de enero, se ha realizado el acompañamiento desde el plan de gestion social.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua con el seguimiento y apoyo conjunto a los presidentes de las JAC, con el fin de resolver dudas y aclarar temas pertinentes con respecto al proyecto en marcha para su comunidad.
Se realizo la socializacion en conjunto con el personal de la JAC y la Interventoria el dia 26 de enero de 2024.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Programacion de comité operativo para aprobacion de compras de dotacion, materiales, EPP y demas que se presente por el contratista

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Vereda La Hanana - Socializacion del proyecto	Vereda La Hanana - Socializacion del proyecto	

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se ha brindado acompañamiento al contratista mediante llamadas y mensajes con el fin de agilizar el inicio de las actividades

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Paula A. Ramirez
NOMBRE: PAULA A. RAMIREZ
Matricula Profesional No.: 25202-402196 CND

Original: Informe mensual de Interventoria, Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 04

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CODIGO	
		VERSION	
		PAGINA	

FECHA: 20/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CALDAS** — SEMANA No.: **12** del **8/02/2024** al **15/02/2024** Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **Santiago Hernández Rendón** — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vias, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en la Vereda La Habana, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.632200 y longitud -74.783800 y punto de referencia final el PR 1+200 con coordenadas latitud 5.641743 y longitud -74.782085, de la vía El Tigre - La Habana de La Dorada, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HABANA**

CONVENIO No.	3980- 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.765.816,00
FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.765.816,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: **PROYECTOS SANABRIA SAS.**

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	4297-2023	VALOR INICIAL:	$ 79.541.151,00
FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ 36.326.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 115.868.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.765.816,00	$ 200.765.816		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.765.816,00	$ 200.765.816		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	200.765.816,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	46.864,58	0,02%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	-	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(46.864,58)	-0,02%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	2.084.059,84	1,04%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	12.020.300,41	5,99%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	2.084.059,84	1,04%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(9.936.240,57)	-4,95%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	1.167.854,75	0,58%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	0,00%

Observaciones: A la fecha se aprobaron las polizas del convenio por un valor de $2.084.059,84

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	115.868.149,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	8.910.720,00	7,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	2.970.240,00	2,56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	2.970.240,00	2,56%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajeria instantanea

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 0,03% — Avance o Atraso Físico %: -0,03%

Meta Física Ejecutada %: 0,00%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Excavaciones varias sin Clasificar	m3	1,98
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1,98			1,98	0,01%
Ejec	0			-	0,00%
Prog				-	
Ejec				-	
Prog				-	
Ejec				-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	1	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoría, se realizo la socializacion del proyecto el dia 26 de enero


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua con el seguimiento y apoyo conjunto a los presidentes de las JAC, con el fin de resolver dudas y aclarar temas pertinentes con respecto al proyecto en marcha para su comunidad.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Verificacion de las cotizaciones actualizadas por la JAC.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

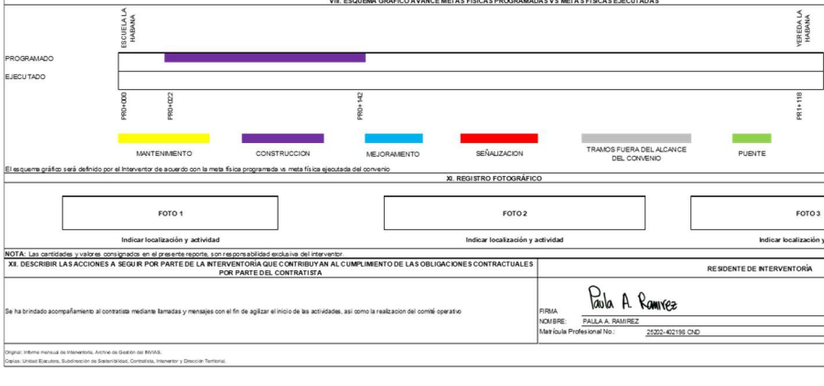

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se ha brindado acompañamiento al contratista mediante llamadas y mensajes con el fin de agilizar el inicio de las actividades, asi como la realizacion del comité operativo

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Paula A. Ramirez

NOMBRE: PAULA A. RAMIREZ

Matrícula Profesional No.: 25202-402196 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 04

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CODIGO VERSION PAGINA

FECHA (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CALDAS** — SEMANA No.: **13** del **15/02/2024** al **22/02/2024** Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **Santiago Hernández Rendón** — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN ELDEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en la Vereda La Habana, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.632200 y longitud -74.783800 y punto de referencia final el PR 1+200 con coordenadas latitud 5.641743 y longitud -74.782085, de la vía El Tigre - La Habana de La Dorada, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HABANA			INTERVENTOR:	PROYECTOS SANABRIA SAS.		
				INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	3980- 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.765.816,00	CONTRATO No.	4297-2023	VALOR INICIAL:	$ 79.541.151,00
FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ 36.326.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.765.816,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 115.868.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.765.816,00	$ 200.765.816		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.765.816,00	$ 200.765.816		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	200.765.816,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	4.213.012,50	2,10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	-	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(4.213.012,50)	-2,10%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	2.084.059,84	1,04%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	18.200.371,24	9,07%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	2.084.059,84	1,04%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(16.116.311,40)	-8,03%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	6.180.070,82	3,08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	0,00%

Observaciones: A la fecha se aprobaron las polizas del convenio por un valor de $2.084.059,84, se encuentra en revision el plan de compras entregado por el contratista

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	115.868.149,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	8.910.720,00	7,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	2.970.240,00	2,56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	2.970.240,00	2,56%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajeria instantanea

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 2,80% — Avance o Atraso Físico %: -2,80%

Meta Física Ejecutada %: 0,00%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Excavaciones varias sin Clasificar	m3	2,70
*	Subbase Granular Clase C	m3	19,91
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Fisico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	2,70			2,70	0,04%
Ejec	0			-	0,00%
Prog	19,91			19,91	2,76%
Ejec				-	
Prog				-	
Ejec				-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo tecnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	1	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la Interventoría, se realizo la socializacion del proyecto el dia 26 de enero


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua con el seguimiento y apoyo conjunto a los presidentes de las JAC, con el fin de resolver dudas y aclarar temas pertinentes con respecto al proyecto en marcha para su comunidad.
Se solicito la relacion del personal afiliado para dar inicio a las obras.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Verificacion en campo de actividades tras entrega de estudio topografico y tomas CBR

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se ha brindado acompañamiento al contratista mediante llamadas y mensajes con el fin de agilizar el inicio de las actividades.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Paula A. Ramirez

NOMBRE: PAULA A. RAMIREZ

Matrícula Profesional No.: 25202-402196 CND

Original: Informe mensual de interventoria, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 04

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CODIGO	
	VERSION	
	PAGINA	
	FECHA	7/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CALDAS** — SEMANA No.: **14** del **22/02/2024** al **29/02/2024** Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **Santiago Hernández Rendón** — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HABANA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Dorada del departamento de Caldas, en la Vereda La Habana, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 5.632200 y longitud -74.783800 y punto de referencia final el PR 1+200 con coordenadas latitud 5.641743 y longitud -74.782085, de la vía El Tigre - La Habana de La Dorada, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caldas del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HABANA			INTERVENTOR:	PROYECTOS SANABRIA SAS.		
				INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	3980- 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.765.816,00	CONTRATO No.	4297-2023	VALOR INICIAL:	$ 79.541.151,00
FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	23/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ 36.326.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.765.816,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 115.868.149,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.765.816,00	$ 200.765.816		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.765.816,00	$ 200.765.816		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 115.868.149,00	$ 115.868.149		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO			
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	200.765.816,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	23.744.312,38	11,83%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	19.092.518,00	9,51%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	4.651.794,38	2,32%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	8.365.803,84	4,17%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	42.088.320,66	20,96%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	27.458.321,84	13,68%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	14.629.998,8	7,29%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	23.887.949,43	11,90%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	25.374.262,00	12,64%

Observaciones: A la fecha se aprobaron las polizas del convenio por un valor de $2.084.059,84, se enquentra en revision y aprobacion el plan de compras Nº 1

INTERVENTORÍA			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	115.868.149,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	8.910.720,00	7,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	2.970.240,00	2,56%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	2.970.240,00	2,56%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: a la fecha el contratista no ha iniciado actividades de obra, el seguimiento se ha realizado mediante llamadas y mensajeria instantanea

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 15,77% — Avance o Atraso Físico %: 15,77%
Meta Física Ejecutada %: 0,00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* Excavaciones varias sin Clasificar	m3	3,42
* Subbase Granular Clase C	m3	59,73
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA	m3	9,41

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	3,42			3,42	0,05%
Ejec	0			-	0,00%
Prog	59,73			59,73	8,27%
Ejec				-	
Prog	9,41			9,41	5,30%
Ejec				-	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: A la fecha no se han remitido materiales al frente de obra

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI	.....	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	.....	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI	.....	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	.....	NO	N/A	.....

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades de obra

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se han realizado actividades

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	1	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se han iniciado actividades constructivas, por lo tanto solo se encuentra activo personal de la interventoria, se realizo la socializacion del proyecto el dia 26 de enero

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua con el seguimiento y apoyo conjunto a los presidentes de las JAC, con el fin de resolver dudas y aclarar temas pertinentes con respecto al proyecto en marcha para su comunidad.
Se solicito la relacion del personal afiliado para dar inicio a las obras.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Comité operativo para aprobacion de compra de insumos de construccion.
Inicio de obra.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se ha brindado acompañamiento al contratista mediante llamadas y mensajes con el fin de agilizar el inicio de las actividades.
Se realiza la aprobacion del plan de compras una vez verificado las facturas y cotizaciones

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Paula A. Ramirez
NOMBRE: PAULA A. RAMIREZ
Matrícula Profesional No.: 25202-402198 CND

Original: Informe mensual de Interventoria, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Durante este periodo no se han iniciado obras, por lo tanto, no se cuenta con maquinaria ni equipo en el momento.

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo correspondiente al presente informe el contratista de obra no dio inicio a las actividades contractuales, y tampoco cuenta con personal contratado.

4.4. ACTA MENSUAL DE PAGOS CONVENIO

Durante este periodo no se han realizado actas parciales de obra

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante el periodo correspondiente al presente informe, el contratista de obra no dio inicio a las actividades contractuales, por lo tanto, no se anexa informacion del estado general del tiempo.

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante este periodo se realizó el ensayo de CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada I.N.V-E 148.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PAGINA	

FECHA: 15/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONVENIO No.: 3980-2023
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HABANA
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL FEBRERO
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4297-2023
INTERVENTOR: PROYECTO SANARIA SAS.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Dia/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
1	16/02/2024	CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada	I.N.V-E 148	Excavacion en sitio de la obra, Vereda La Atarraya	1	3% ≥	10,60%	si	Se considera apto el suelo para dar inicio a las actividades de obra
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:
Durante este periodo no se realizaron ensayor por parte de la Interventoria.

NOTAS:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: Andrea Cecilia Restrepo
Representante Legal, JAC La Habana
Contratista

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Durante este periodo no se realizó ningún cambio en las polizas del convenio.

PROYECTO SANABRIA SAS
NIT: 901.633.148-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 04

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONVENIO No. 3809-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA HABANA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA HABANA DEL MUNICIPIO LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 23/11/2023
PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 200.765.816,00
VALOR ACUMULADO: $ 200.765.816,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4297 **INTERVENTOR:** PROYECTO SANABRIA SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.153.163	19	10	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.038.291	19	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.229.745	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100290003

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 232.000.000	19	10	2023	31	12	2024
Otros	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100071093 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 0/01/1900

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 04

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 0 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 0 **SUSPENSIÓN No.:** 0

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.185.826	19	10	2023	1	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.046.457	19	10	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.278.739	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100290003

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 0 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 0 **SUSPENSIÓN No.:** 0

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 232.000.000	12	10	2023	30	4	2024
Otros	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100071093 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

No se identifica en la plataforma del SECOP II la aprobacion de polizas.

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JUAN CARALOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.8. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.8.1. INFORME INVERSIÓN BUEN MANEJO DESEMBOLSO

Durante este periodo no se han realizado movimientos en la cuenta

4.8.2. PLAN INVERSIÓN DESEMBOLSO MENSUAL

Durante este periodo no se presentó un plan de inversión de desembolsos por parte de la JAC

4.8.3. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Durante este periodo no se dio inicio a las obras, no se realizaron comités

4.8.4. ACTAS DE REUNION

Durante este periodo se realizó el segundo comité operativo con el fin de aprobar el plan de compras Nº1 y dar inicio a las obras, se anexa acta en formato PDF.

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 2. Informacion general del contrato de interventoria N.º 4297-2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)
CONTRATO NO:	4297 DE 2023
CONTRATISTA:	PROYECTO SANABRIA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIELA SALGADO PINILLA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA.
VALOR TOTAL:	$ 79.541.151,00
PLAZO INICIAL:	3 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ORDEN DE INICIACIÓN:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE TERMINACIÓN INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA NO. 1	DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE ABRIL DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADO:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.
PERIODO DEL INFORME	DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO	ING. SANTIAGO HERNÁNDEZ

5.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

La interventoria realizo las siguientes actividades:

- Se realizo el 19 de febrero el segundo comité operativo con el fin de dar aprobación al plan de compras Nº1.
- Se realizo el acompañamiento continuo a la JAC, mediante llamadas para verificar el proceso de selección y contratación de personal para la ejecución de actividades.

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Durante este periodo la interventoria no cuenta con personal especialista toda vez que no se han iniciado actividades de obra.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se relacionan equipos o vehículos

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — **DIRECCION TERRITORIAL:** CALDAS

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: FEBRERO
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4297-2023
INTERVENTORÍA: PROYECTOS SANABRIA SAS.

CONTRATO DE OBRA No. 4643-2023, 4053-2023, 3809-2023, 3980-2023
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL JAPON; JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL VEREDA BUENAVISTA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ATARRAYA; JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA HABANA

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Motocicleta	Motocicleta 500 TRX Modelo 2023 Placa FIF85G	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:
Certificado de revision tecnomecanica desde 10/10/2023 hasta 10/10/2024
Soat desde 03/10/2023 hasra 02/10/2024

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430 CND

Firma
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 17202-125676 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INTERVENTORIA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N.º 04

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4297-2023

INTERVENTOR: PROYECTO SANABIA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-24

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA.

CONTRATO DE OBRA No.: 4643-2023 El Japon; 3809-2023 La Atarraya; 3908-2023 La Habana; 4053-2023 Buenavista

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA EL JAPON; JAC DE LA VEREDA LA HABANA; JAC DE LA VEREDA ATARRAYA; JAC DE LA VEREDA BUENAVISTA

NOMBRE ARL: POSITIVA SEGUROS

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: Comp Fliar Caldas

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	GIRALDO RIOS STEPHANIA	1,053,817,326	Profesional social	$ 1,120,000				x	x		x			x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x							40%	proyecto sanabria	$ 1,300,000	$ 90,500	V	EPS Sura	75845514	$ 52,000	Porvenir	75845514	$ 208,000	$ 22,400	N/A	N/A	EXIMIDO POR PYME
2	RAMIREZ GUERRERO PAULA ANDREA	1,013,760,290	Residente Interventoria	$ 2,600,000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100%	proyecto sanabria	$ 2,600,000	$ 181,000	V	Compesar EPS	75845514	$ 104,000	Colpensiones	75845514	$ 416,000	$ 104,000	N/A	N/A	EXIMIDO POR PYME
3	CADENA RAMOS DIANA PAOLA	1,018,451,763	Profesional Ambiental	$ 560,000					x					x	x			x		x	x					x								20%	proyecto sanabria	$ 1,300,000	$ 90,500	V	EPS Sura	75845514	$ 52,000	Porvenir	75845514	$ 208,000	$ 22,400	N/A	N/A	EXIMIDO POR PYME
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 4,280,000																																									

El Interventor adjunta la certificación de fecha 29/02/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:2520237430CND

Firma

Nombre: SANTIAGO HERNÁNDEZ RENDÓN
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-125676 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INF FIN Y PRESUPUESTAL INT

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 29/2/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4297 DE 2023

INTERVENTOR: PROYECTO SANABRIA S.A.S

MES INFORME MENSUAL: feb-24

PROYECTO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARAEL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA""

CONVENIOS: 4643-2023, 3809-2023, 3980-2023, 4053-2023

CONTRATISTA: JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE CALDAS :
MUNICIPIO LA DORADA, VEREDA JAPON 4643-2023
MUNICIPIO LA DORADA , VEREDA ATARRAYA 3809-2023
MUNICIPIO LA DORADA, VEREDA LA HABANA 3980-2023
MUNICIPIO LA DORADA, VEREDA LA BUENAVISTA 4053-2023

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1260123	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 79,541,151.00	$ -
2023	1260123	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 36,326,998.00	
				TOTAL		$ 115,868,149.00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 115,868,149.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	nov-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 115,868,149.00	$ 115,868,149.00		
2	dic-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 115,868,149.00	$ 115,868,149.00		
3	ene-24	$ 10,701,800.00	$ 2,033,342.00	$ 12,735,142.00	$ -		$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 103,133,007.00	$ 103,133,007.00		
4	feb-24	$ 8,306,000.00	$ 1,578,140.00	$ 9,884,140.00	$ -	$ -	$ -	1260123 de 15 de noviembre de 2023	$ 93,248,867.00	$ 93,248,867.00		
	TOTALES	$ 19,007,800.00	$ 3,611,482.00	$ 22,619,282.00	$ -	$ -	$ -					

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	$ 19,007,800.00	$ 3,611,482.00	$ 22,619,282.00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)	$ -		$ -
IVA = 19% * (E) = (F)	$ -		$ -
VALOR TOTAL	$ 19,007,800.00	$ 3,611,482.00	**$ 22,619,282.00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-37430 CND

Firma
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.17202-125676CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante este periodo no se presentaron cambios en las polizas actualizadas en el periodo pasado

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/02/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4297-2023 **INTERVENTOR:** PROYECTO SANABRIA SAS

OBJETO DEL CONTRATO:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL MUNICIPIO DE LA DORADA."

FECHA DE INICIO: 23/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 79.541.150,93

VALOR ACUMULADO: $ 115.868.149,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Santiago Hernández Rendón

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 7.954.115,10	8	11	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 15.908.230,2	8	11	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 23.862.345,3	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 430-47-994000063674

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 15/112023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 11.586.814,80	8	11	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 23.173.629,6	8	11	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 34.760.444,4	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 430-47-994000063674

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 8/02/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Juan Carlos Sanabria
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 2520237430CND

Firma
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

6.5.1. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

Durante este periodo no re realizaron modificaciones o reprogramación al plan de cargas.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realizo la aprobación del personal administrativo del convenio, se está a la espera de la contratación del personal de obra.

- Se recomienda realizar la contratación del personal lo mas pronto posible, puesto que ya se cuenta con aprobación de compras para actividades preliminares

8. ANEXOS

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

Durante este periodo no se remitió la siguiente correspondencia oficial directamente al contratista.

8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

Durante este periodo no se iniciaron obras, por lo tanto, no se identifica un registro fotográfico de avance de las obras.

8.3. COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Durante este periodo no se iniciaron obras, por lo tanto, no se cuenta con bitácora de obra



_____

Ing. Juan Carlos Sanabria
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520237430CND
