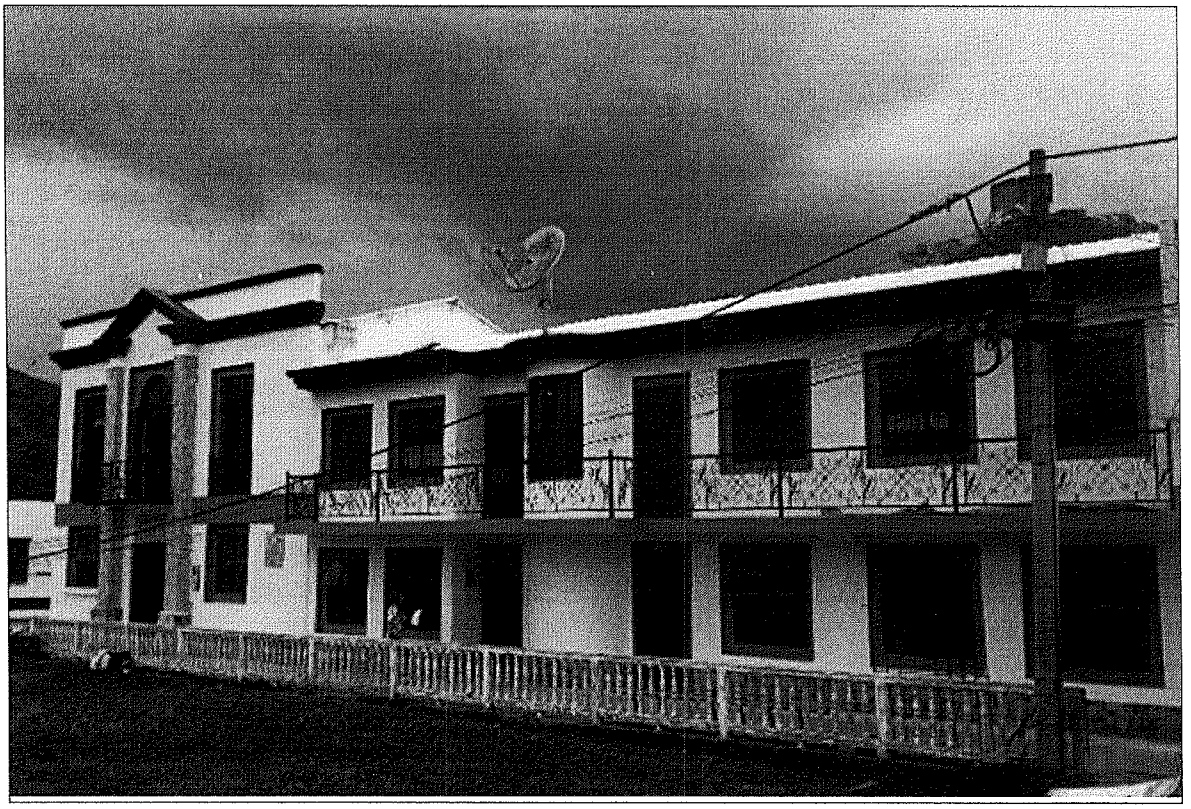
INFORME EJECUTIVO DE ACTIVIDADES

"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES A LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y EL EDIFICIO DE EMPLEADOS, DEL MUNICIPIO DE PAUNA."



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 002 DE 2024 – MUNICIPIO DE PAUNA BOYACÁ

VERSIÓN	FECHA	OBJETO	ELABORADO
01	27/12/24	Informe Final	Residente de obra

Email: consorcio.konstrucor@gmail.com
Cel: 321 268 4870 – 300 797 6983

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 9
2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 10
3 DATOS GENERALES DEL CONTRATO 11
4 ASPECTOS JURÍDICOS 12
4.1 PÓLIZAS DEL CONTRATO 12
4.2 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO 13
5 ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES 13
5.1 FORMA DE PAGO 13
5.2 CORTES DE OBRA 14
6 ASPECTOS TÉCNICOS 15
6.1 GRÁFICA DE AVANCE DEL PROYECTO 15
6.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS 16
6.2.1 Preparación y Lavado de Superficie 16
6.2.2 Desmonte cielo raso 16
6.2.3 Desmonte cubiertas teja de asbesto y/o asbesto cemento 17
6.2.4 Demolición Muros en Ladrillo. 17
6.2.5 Desmonte Marcos, Puertas y Ventanas 18
6.2.6 Desmonte de Tanque Aéreo de Fibrocemento 18
6.2.7 Desmonte y retiro de apartos sanitarios 19
6.2.8 Demolición de Pañetes 19
6.2.9 Demolición Placa Maciza E. Max: 20 cm 20
6.2.10 Demolición columna concreto 20
6.2.11 Limpieza De Viga Canal Y Placa De Tanque 21
6.2.12 Muro En Bloque No.5 E=0.12 Mts 21
6.2.13 Columnas En Concreto 21 Mpa (3000 Psi), Altura Mayor A 3 Mts-Formaleta Madera 22
6.2.14 Placa Maciza 21 Mpa – (3000 Psi) E = 0.12 Mts 22
6.2.15 Pañete Liso Muros 1:4 23
6.2.16 Pañete Impermeabilizado 1:3 23
6.2.17 Estuco Muros 24

6.2.18 Vinilo Tipo II sobre pañete dos manos en muros 24

6.2.19 Suministro e Instalación Ventana Lámina Cal. 18 Con Vidrio Inc. Anticorrosivo 25

6.2.20 Suministro e Instalación Sanitario Avanti Plus Blanco Lavamanos con Pedestal, Sanitario, Grifería e Incrustaciones. 25

6.2.21 Suministro e Instalación kit de accesorios para baño aluvia x6 piezas. 26

6.2.22 Espejo 4 mm Sin Bicel 26

6.2.23 Suministro E Instalación Impermeabilización En Manto Asfaltico Para Canales Y Viga canales 27

6.2.24 Suministro E Instalación Perfilería Metálica (Inc. Anticorrosivo) Para Estructura De Cubierta 27

6.2.25 Suministro E Instalación Tanque Elevado PVC 500 Lts, Inc. Accesorios 28

6.2.26 Suministro E Instalación De Cubierta Arquitectónica Tipo Upvc Termoacústica 2.0 Mm. Incluye Tornilleria 28

6.2.27 Suministro E Instalación Caballete Para Cubierta Arquitectónica en Upvc 29

6.2.28 Suministro E Instalación Flanche en Lámina 29

6.2.29 Suministro E Instalación Estructura En Aluminio Para Cielo Raso 30

6.2.30 Suministro E Instalación Cielo Raso Bóvedas Drywall O Pvc 30

6.2.31 Retiro Y Acarreo De Material Sobrante 31

6.2.32 Suministro E Instalación De Salida Completa Para Tomacorriente Monofásico Tipo Gfci, En Calibre 12 Awg (F, N, T) Y Ducto Pvc De 1/2". (Incluye Aparato) 31

6.2.33 Suministro E Instalación De Salida Completa Para Interruptor Sencillo En Calibre Awg 12 Y Ducto Pvc 1/2 " (Incluye Aparato) 32

6.2.34 Suministro E Instalación De Salida Completa Para Interruptor Doble En Calibre Awg 12 Y Ducto Pvc 1/2 " (Incluye Aparato) 32

6.2.35 Suministro E Instalación De Panel Led Redondo de Incrustar De 12 W 33

6.2.36 Preparación Y Lavado De Superficie De Fachada, Altura Mayor A 3 Mts (Incluye Rinse Restaurador, Equipo De Presión A 3500 Psi Y Reparación De Fisuras) 33

6.2.37 Limpieza De Viga Canal 34

6.2.38 Estuco Muros 34
6.2.39 Pintura Intemperie Para Fachada Tipo Koraza Para Exteriores A 3 Manos 35
6.2.40 Esmalte Marcos Lamina 3 Manos 35
6.2.41 Suministro e Instalación Rejilla De Ventilación En Lamina Cal. 18 Inc. Anticorrosivo 36
6.2.42 Vinilo Tipo II Sobre Pañete Dos Manos En Muros 36
6.2.43 Vinilo Desmonte 37
6.2.44 Reparación Ventana (Incluye Bisagras Y Otros Necesarios) 37
6.2.45 Reparación Y Mantenimiento Baranda Metálica (Inc. Pintura) 38
6.2.46 Mantenimiento Y Pintura De Puertas Y Ventanas (Incluye Marcos) 38
6.2.47 Suministro E Instalación Cielo Raso Bóvedas Drywall O Pvc 39
6.2.48 Placa Base En Concreto E = 10 CM 2500 PSI 39
6.2.49 Demolición Enchape Cerámico 40
6.2.50 Alistado Piso E = 4 CM 1:5 40
6.2.51 Remate Bocel Aluminio "WINS" 41
6.2.52 Suministro e Instalación de Enchape Porcelanato Cosmo Blue 60*60cm 41
6.2.53 Suministro e Instalación de Enchape Tableta Piso Alfa Marsella Gold 61 x 61 42
6.2.54 Suministro e Instalación de Guarda escoba Baldosín 42
6.2.55 Dinteles en Bloque E = 0,15 MTS 43
6.2.56 Filos y Dilataciones en Pañetes 43
6.2.57 Boca Puerta en Granito Sin Pulir 44
6.2.58 Suministro e Instalación a Todo Costo de Aire Acondicionado Mini Split Inverter 12000 0 BTU 44
6.2.59 Suministro e Instalación puerta ventana en lamina Cal 18 inc. Anticorrosivo. 45
6.2.60 Suministro e Instalación ducha eléctrica 45
6.2.61 Suministro e Instalación grifería lavaplatos metal 46
6.2.62 Vinilo Tipo II Sobre Pañete Dos Manos Bajo Placa 46
6.2.63 Muro Cara Doble En Eterboard 10 MM 47
6.2.64 Marco Puerta Madera Pino Entablado Triplex 70-90*200 cm 47

6.2.65 Esmalte Marcos Lámina 3 Manos 48

6.2.66 Suministro e Instalación de Tablero de Distribución Bifásico de 12 circuitos 48

6.2.67 Divisiones Para Baño en Aluminio y Vidrio Templado de 0.05 mm. 49

6.2.68 Suministro e Instalación de breaker termomagnético monopolar enchufable de 1 x 20 amp. 49

6.2.69 Suministro e instalación de gabinete para equipo de medida bifásico empotrado. Incluye contador de energía electrónico bifásico 5 a 100 AMP. ..50

6.2.70 Suministro, instalación y conexionado de cable concéntrico no. 2 x 8 +8 awg en cobre (acometida bifásica) 50

6.2.71 Suministro e instalación de tubería EMT de ½" 51

6.2.72 Suministro e instalación de salida sencilla para tv. Incluye aparato 51

6.2.73 Suministro e instalación de roseta tipo plafón 52

6.2.74 División para espacios abiertos en madera tipo mdp cedra 15 mm 52

6.2.75 Aseo General Entrega 53

6.2.76 Reparación y mantenimiento de ascensor 54

6.2.77 Esmalte madera llena 3 manos 55

7 ASPECTOS SOCIALES 56

7.1 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 56

8 ASPECTOS SG SST 56

8.1 PERSONAL DE OBRA 56

8.2 DOTACIONES Y (EPP) 57

8.3 SEGURIDAD SOCIAL 57

9 CONCLUSIONES 58

ASPECTOS TÉCNICOS 58

ASPECTOS AMBIENTALES 58

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización Geográfica del proyecto 10
Ilustración 2. Programado Vs Ejecutado Consorcio Konstrucor 15

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Datos contrato No. 002 de 2024 11
Tabla 2 Relación profesionales del Contrato No. 002 de 2024 11
Tabla 3 Pólizas iniciales contrato 002 de 2024. 12
Tabla 4 Pólizas acta de inicio contrato 002 de 2024 12
Tabla 5 Pólizas prorroga No. 1 contrato 002 de 2024 12
Tabla 6 Documentos legales contrato de obra 13
Tabla 7 Forma de pago del contrato de obra 002 de 2024 13
Tabla 8 Cortes de obra Consorcio Konstrucor 14
Tabla 9 Programado VS Ejecutado Consorcio Konstrucor 15
Tabla 10. Preparación y lavado de superficie 16
Tabla 11. Desmonte de cielo raso 16
Tabla 12. Desmonte cubiertas teja de asbesto y/o asbesto cemento 17
Tabla 13. Demolición Muros en Ladrillo 17
Tabla 14. Desmonte de marcos, puertas y ventanas 18
Tabla 15. Relleno para Estructuras con Suelo 18
Tabla 16. Desmonte y retiro de aparatos sanitarios 19
Tabla 17. Demolición de pañetes 19
Tabla 18. Demolición de placa maciza E. Max: 20 cm 20
Tabla 19. Demolición de columna en concreto 20
Tabla 20. Limpieza de viga canal y placa de tanque 21
Tabla 21. Muro En Bloque No.5 E=0.12 Mts 21
Tabla 22. Columnas En Concreto 21 Mpa (3000 Psi). 22
Tabla 23. Placa Maciza 21 Mpa. 22
Tabla 24. Pañete Liso Muros 1:4 23
Tabla 25.Pañete Impermeabilizado 1:3 23
Tabla 26.Estuco Muros 24
Tabla 27.Vinilo tipo II sobre pañete dos manos en muros 24
Tabla 28.Suministro e Instalación de Ventana Lámina Cal. 18 25
Tabla 29. Suministro e Instalación Sanitario Avanti Plus Blanco Lavamanos con Pedestal, Sanitario, Grifería e Incrustaciones 25
Tabla 30. Suministro e Instalación kit de accesorios para baño aluvia x6 piezas 26
Tabla 31. Espejo 4 mm sin bicel 26
Tabla 32. Suministro e Instalación Impermeabilización en Manto Asfaltico Para Canales 27
Tabla 33. Suministro E Instalación Perfilería Metálica (Inc. Anticorrosivo) Para Estructura De Cubierta 27
Tabla 34. Suministro e Instalación Tanque Elevado PVC 500 Lts, Inc. Accesorios 28
Tabla 35. Suministro E Instalación De Cubierta Arquitectónica Tipo Upvc Termoacústica 2.0 Mm. 28

Tabla 36. Suministro E Instalación Caballete Para Cubierta Arquitectónica En Upvc 29
Tabla 37. Suministro E Instalación De Flanche en Lámina 29
Tabla 38. Suministro E Instalación Estructura En Aluminio Para Cielo Raso 30
Tabla 39. Suministro E Instalación Cielo Raso Bóvedas Drywall O Pvc 30
Tabla 40. Retiro Y Acarreo De Material Sobrante 31
Tabla 41. Suministro e instalación de salida completa para tomacorriente monofásico tipo gfci, en calibre 12 awg (f, n, t) y ducto pvc de 1/2 31
Tabla 42. Suministro e instalación de salida completa para interruptor sencillo en calibre awg 12 y ducto PVC 1/2 " (incluye aparato) 32
Tabla 43. Suministro e instalación de salida completa para interruptor doble en calibre awg 12 y ducto PVC 1/2 " (incluye aparato) 32
Tabla 44. Suministro e instalación de panel led redondo de incrustar de 12 w 33
Tabla 45. Preparación Y Lavado De Superficie De Fachada, Altura Mayor A 3 Mts 33
Tabla 46. Limpieza De Viga Canal 34
Tabla 47. Estuco Muros 34
Tabla 48. Pintura Intemperie Para Fachada Tipo Koraza Para Exteriores A 3 Manos 35
Tabla 49. Esmalte Marcos Lamina 3 Manos 35
Tabla 50. Suministro e instalación rejilla de ventilación en lamina cal. 18 inc. Anticorrosivo 36
Tabla 51. Vinilo Tipo II Sobre Pañete Dos Manos En Muros 36
Tabla 52. Vinilo Tipo II Sobre Pañete Dos Manos En Muros 37
Tabla 53. Reparación ventana (incluye bisagras y otros necesarios) 37
Tabla 54. Reparación Y Mantenimiento Baranda Metálica (Inc. Pintura) 38
Tabla 55. Mantenimiento y pintura de puertas y ventanas (incluye marcos) 38
Tabla 56. Suministro E Instalación Cielo Raso Bóvedas Drywall O Pvc 39
Tabla 57. Placa Base en Concreto E = 10 CM 2500 PSI 39
Tabla 58. Demolición enchape cerámico 40
Tabla 59. Alistado Piso E = 4 cm 1:5 40
Tabla 60. Remate Bocel Aluminio "WINS" 41
Tabla 61. Suministro e Instalación de enchape porcelanato cosmo blue 60 * 60 41
Tabla 62. Suministro e Instalación de enchape tableta piso alfa Marsella Gold 61 x 61 42
Tabla 63. Suministro e Instalación de guarda escoba Baldosín 42
Tabla 64. Suministro e Instalación de dinteles en bloque 43
Tabla 65. Filos y Dilataciones en Pañetes 43
Tabla 66. Boca Puerta en Granito Sin Pulir 44
Tabla 67. Suministro e Instalación a todo costo de aire acondicionado Mini Split Inverter 12000 0 BTU 44

Tabla 68. Suministro e Instalar puerta ventana en lámina Cal 18 Inc. anticorrosivo 45
Tabla 69. Suministro e Instalació de ducha eléctrica 45
Tabla 70. Suministro e Instalación grifería lavaplatos metal 46
Tabla 71. Suministro e Instalación Vinilo Tipo II Sobre Pañete Dos Manos Bajo Placa 46
Tabla 72. Muro Cara Doble En Eterboard 10 MM 47
Tabla 73. Marco Puerta Pino Entablado Triplex 47
Tabla 74. Esmalte Marcos Lámina 3 manos 48
Tabla 75. Suministro e instalación de tablero de distribución bifásico de 12 Circuitos. 48
Tabla 76. Divisiones para baño en aluminio y vidrio templado de 0,05 mm 49
Tabla 77. Suministro e instalación de breaker termomagnético monopolar enchufable de 1 x 20 amp. 49
Tabla 78. Suministro e instalación de gabinete para equipo de medida bifásico empotrado. Incluye contador de energía electrónico bifásico 5 a 100 amp 50
Tabla 79. Suministro, instalación y conexionado de cable concéntrico no. 2 x 8 +8 awg en cobre (acometida bifásica) 50
Tabla 80. Suministro, instalación de tubería EMT de ½" 51
Tabla 81. Suministro, instalación de salida sencilla para tv. incluye aparato 51
Tabla 82. Suministro, instalación de roseta tipo plafón 52
Tabla 83. División para espacios abiertos en madera tipo MDP CEDRA 15 mm .52
Tabla 84. Aseo General Entrega 53
Tabla 85. Reparación y mantenimiento de ascensor 54
Tabla 86. Esmalte madera llena 3 manos 55
Tabla 87. Plan de atención a la comunidad 56
Tabla 88. Relación de personal de obra 56

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a las labores realizadas por el Consorcio Konstrucor, en el periodo comprendido desde el **25 de octubre de 2024 al 30 de noviembre de 2024**, para el contrato de obra cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES A LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y EL EDIFICIO DE EMPLEADOS, DEL MUNICIPIO DE PAUNA"**, de acuerdo con los respectivos términos de referencia con base al contrato de obra pública No. 002 de 2024.

Siendo una de las obligaciones del Consorcio suministrar información sobre el proyecto con base al avance del mismo, en el presente documento se muestra el control de las actividades que se realizan durante el período especificado anteriormente, para lo cual se incluirán informes técnicos, administrativos y legales, además del control y avance de obra durante la ejecución de todas las actividades de desarrollo, enfatizando en la calidad, estudios técnicos y especificaciones del desempeño de las operaciones actuales.

Al final, se realiza conclusiones y observaciones sobre las actividades ejecutadas hasta el periodo mencionado y se realiza entrega del presente informe a la supervisión del proyecto, para su revisión y aprobación.

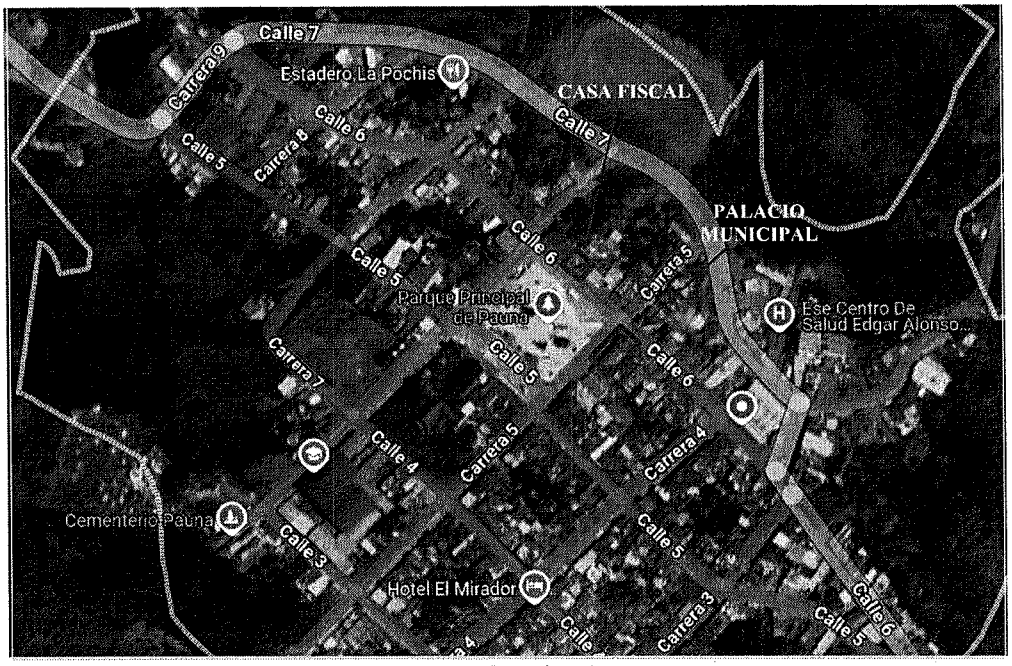
2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Pauna es un municipio de Boyacá (Colombia), ubicado en la provincia de Occidente. Limita a nivel regional por el norte con el municipio de Florián (Santander); al oriente con Briceño y Tununguá; al occidente con el municipio de San Pablo de Borbur y Otanche y finalmente al Sur con Caldas y Maripí.

Pauna se encuentra ubicado a 149 km de Tunja la capital del departamento y tiene una altitud en la cabecera municipal de 1215 metros sobre el nivel del mar, presentando una temperatura media de 23.5 °C sin embargo, su diversidad de pisos térmicos genera temperaturas más altas y bajas.

Las edificaciones a intervenir se encuentran dentro del casco urbano del municipio, el cual cuenta con una extensión territorial de 259 km2.

Ilustración 1 Localización Geográfica del proyecto



Fuente: Google Maps

3 DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Se hace la presentación detallada de la parte contractual y administrativa del contrato. Se describen a continuación los datos del contrato indicando los tiempos y valores contractuales y el personal solicitado en las especificaciones.

Tabla 1 Datos contrato No. 002 de 2024

CONTRATISTA	
NÚMERO DE CONTRATO	002 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
OBJETO	"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES A LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y EL EDIFICIO DE EMPLEADOS, DEL MUNICIPIO DE PAUNA BOYACÁ."
CONTRATISTA	KONSTRUCOR CONSORCIO
NIT	901872697-2
REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO ALEXANDER IBÁÑEZ GUERRERO
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	DOSCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS M/CTE ($ 212.963.431,21)
VALOR DE ADICIONAL No. 01	CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 57.883.046,94)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	DOS (2) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA PRORROGA No. 01	29 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO DE PRORROGA No. 01	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
TERMINACIÓN ACTUAL	14 DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR	ANDRÉS FELIPE ARIAS VARGAS SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Fuente: Consorcio Konstrucor

Tabla 2 Relación profesionales del Contrato No. 002 de 2024

PROFESIONAL	**CARGO**
Diego Alexander Ibáñez Guerrero	Representante Legal
Paola del Pilar López Rojas	Director de Obra
Luis Alfredo Cely Moreno	Residente de Obra
Rubén Darío Rojas Niño	Residente Eléctrico
Pablo Armando Rozo González	Maestro de Obra

Fuente: Consorcio Konstrucor

4 ASPECTOS JURÍDICOS

A continuación, se relacionan las pólizas del contrato expedidas por la "Compañía Mundial de Seguros S.A", con sus respectivas actualizaciones, así mismo la relación del seguimiento jurídico y legal del contrato bajo las siguientes consideraciones:

4.1 PÓLIZAS DEL CONTRATO

Tabla 3 Pólizas iniciales contrato 002 de 2024.

No. Póliza	Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Valor asegurado
100088440	Cumplimiento contrato (RCE contratos)	25/09/2024	25/11/2024	$ 260.000.000,00
100347004	Cumplimiento entidad estatal	25/09/2024	25/11/2029	$ 21.696.343,10

Fuente: Consorcio Konstrucor

Tabla 4 Pólizas acta de inicio contrato 002 de 2024

No. Póliza	Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Valor asegurado
100088440	Cumplimiento contrato (RCE contratos)	30/09/2024	30/11/2024	$ 260.000.000,00
100347004	Cumplimiento entidad estatal	30/09/2024	30/11/2029	$ 21.696.343,10

Fuente: Consorcio Konstrucor

Tabla 5 Pólizas prorroga No. 1 contrato 002 de 2024

No. Póliza	Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Valor asegurado
100088440	Cumplimiento contrato (RCE contratos)	30/09/2024	14/12/2024	$ 260.000.000,00
100347004	Cumplimiento entidad estatal	30/09/2024	14/12/2029	$ 21.696.343,10

Fuente: Consorcio Konstrucor

4.2 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

Se realiza la relación correspondiente a las diferentes modificaciones y/o actualizaciones legales que se han realizado al contrato de obra tales como actas de inicio:

Tabla 6 Documentos legales contrato de obra

No.	Objeto	Fecha de Firma
1	Contrato	25/09/2024
2	Acta de inicio	30/09/2024
3	Prorroga No. 1	29/11/2024

Fuente: Consorcio Konstrucor

5 ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES

5.1 FORMA DE PAGO

Para el presente contrato de obra No. 002 de 2024, se establecieron, los siguientes parámetros de forma de pago, con su respectiva documentación de formalización de pago:

Tabla 7 Forma de pago del contrato de obra 002 de 2024

No. Pago	Forma de pago	Documentación general para pagos
1	El municipio pagara mediante actas parciales contra actividades de obra ejecutadas. Un primer pago una vez se obtenga un porcentaje de ejecución de obra superior 30 % avalado por la supervisión y los siguientes pagos mediante actas parciales por avance de obra, de acuerdo a lo ejecutado, recibido y avalado por la supervisión, teniendo en cuenta los requisitos establecidos por la entidad, hasta completar un máximo del 90%.	**1.** Presentar la Factura original y/o Cuenta de Cobro que debe corresponder con el valor del acta parcial. **2.** Informe pormenorizado de las actividades **3.** Actas sobre el avance del contrato discriminando las cantidades de obra ejecutadas. **4.** Memorias de cantidades ejecutadas, firmadas por el contratista de oba y aprobadas el supervisor técnico del contrato de obra. **5.** Registro fotográfico y soportes que constaten la ejecución material del proyecto.

		6. Certificación de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral **7.** Copia Certificación bancaria para los giros diferentes al anticipo, solo para el primer pago parcial. **8.** Oficio de radicación. **9.** Copia de Bitácora de Obra
2	Un pago final correspondiente al 10% como pago contra liquidación.	**A)** Acta de liquidación del contrato de obra **B)** Informe final avalado por interventoría incluyendo la información solicitada en el manual de supervisión e interventoría de obra **C)** Respectiva factura **D)** Certificación de aportes parafiscales y de seguridad integral.

Fuente: Consorcio Konstrucor

5.2 CORTES DE OBRA

Los cortes de obra se realizarán de acuerdo con el avance de las actividades ejecutadas, actividades que deben corresponder con los diseños, ítems aprobados y especificaciones técnicas del proyecto, previo recibo a satisfacción por parte de la Interventoría. A la fecha no se han presentado cortes de obra.

Tabla 8 Cortes de obra Consorcio Konstrucor

No.	Objeto	Valor
1	Contrato	$ 212.963.431,21
2	Acta parcial 1	$ 99.695.094,45
3	Adicional No. 01	$ 57.883.046,94
4	Acta parcial 2	$ 85.226.565,20
5	Acta de Liquidaciòn	$ 84.208.702,87

Fuente: Consorcio Konstrucor

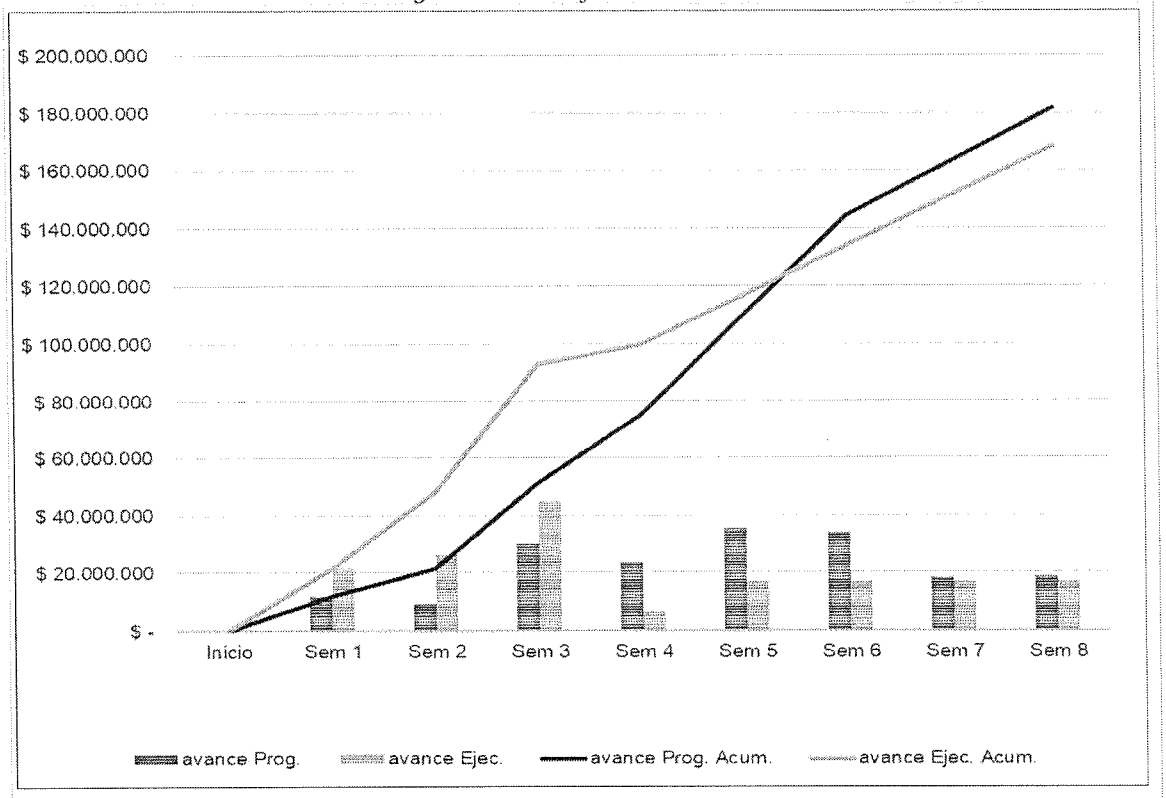
6 ASPECTOS TÉCNICOS

A la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades contractuales en obra:

6.1 GRÁFICA DE AVANCE DEL PROYECTO

Se evidencia el avance de ejecución de obra de las actividades realizadas hasta la fecha:

Ilustración 2. Programado Vs Ejecutado Consorcio Konstrucor



Fuente: Consorcio Konstrucor

Tabla 9 Programado VS Ejecutado Consorcio Konstrucor

FECHA	PROGRAMADO	EJECUTADO
27/12/2024	100 %	100%

Fuente: Consorcio Konstrucor

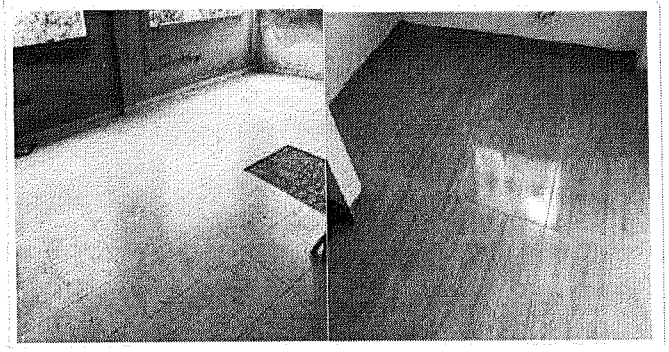
6.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS

A la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades en obra, según la programación de obra establecida y aprobada para el proyecto.

6.2.1 Preparación y Lavado de Superficie

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de preparación y lavado de superficie en la casa fiscal y en oficinas en el municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 10. Preparación y lavado de superficie

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Preparación y Lavado de superficie (Ítem 1.01 y 3.01)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.2 Desmonte cielo raso

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de desmonte de cielo raso en la casa fiscal en el municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 11. Desmonte de cielo raso

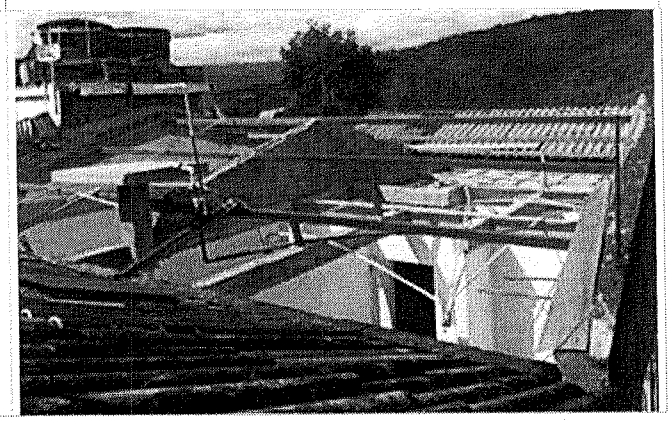
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Desmonte de cielo raso (Ítem 1.02 y 4.03)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.3 Desmonte cubiertas teja de asbesto y/o asbesto cemento

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de desmonte de cubiertas en teja de asbesto cemento en la casa fiscal y en el palacio municipal del municipio de Pauna, Boyacá

Tabla 12. Desmonte cubiertas teja de asbesto y/o asbesto cemento

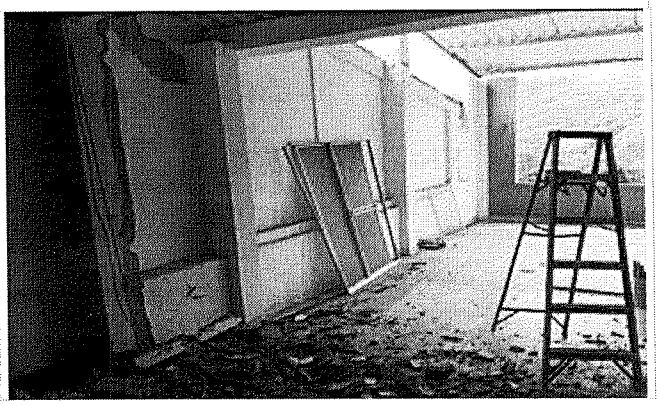
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Desmonte cubiertas teja de asbesto y/o asbesto cemento (Ítem 1.03 y 4.02)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.4 Demolición Muros en Ladrillo.

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de demolición de muros en ladrillo en la casa fiscal en el municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 13. Demolición Muros en Ladrillo

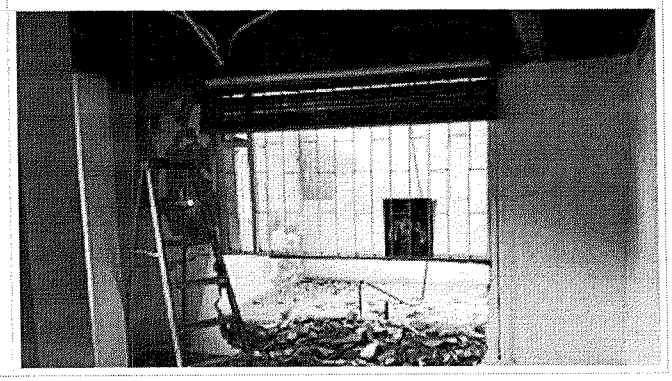
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Demolición muros en ladrillo (Ítem 1.05)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.5 Desmonte Marcos, Puertas y Ventanas

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de desmonte de marcos, puertas y ventanas en la casa fiscal del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 14. Desmonte de marcos, puertas y ventanas

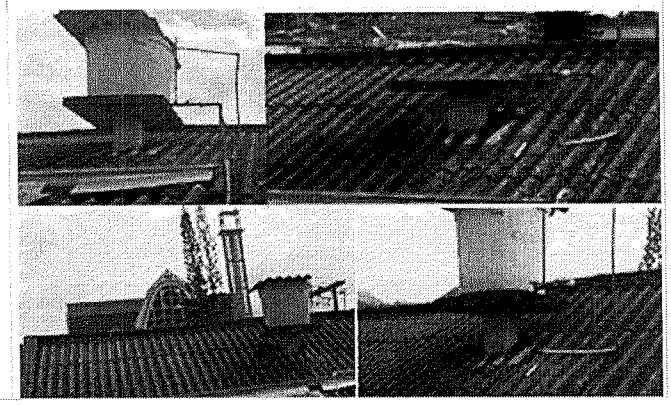
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Desmonte Marcos, Puertas y Ventanas (Ítem 1.06 y 4.05)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.6 Desmonte de Tanque Aéreo de Fibrocemento

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de desmonte de ranque aéreo de fibrocemento en la casa fiscal del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 15. Relleno para Estructuras con Suelo

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Desmonte de Tanque Aéreo de Fibrocemento (Ítem 1.07)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.7 Desmonte y retiro de apartos sanitarios

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de desmonte y retiro de aparatos sanitarios en la casa fiscal y en la comisaría de familia del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 16. Desmonte y retiro de aparatos sanitarios

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Desmonte y Retiro de Aparatos Sanitarios (Ítem 1.08 y 3.02)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.8 Demolición de Pañetes

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de demolición de pañetes en la casa fiscal del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 17. Demolición de pañetes

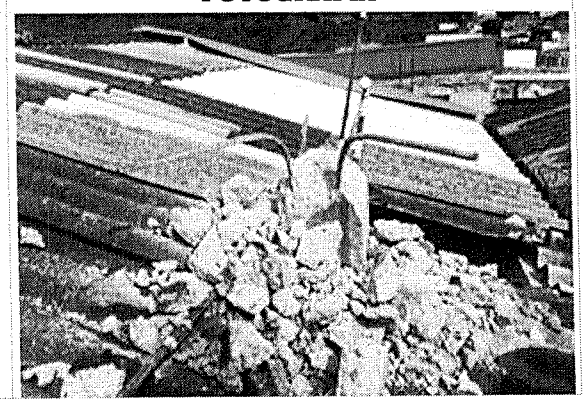
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Demolición de Pañetes (Ítem 1.09)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.9 Demolición Placa Maciza E. Max: 20 cm

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de demolición de placa maciza en la casa fiscal del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 18. Demolición de placa maciza E. Max: 20 cm

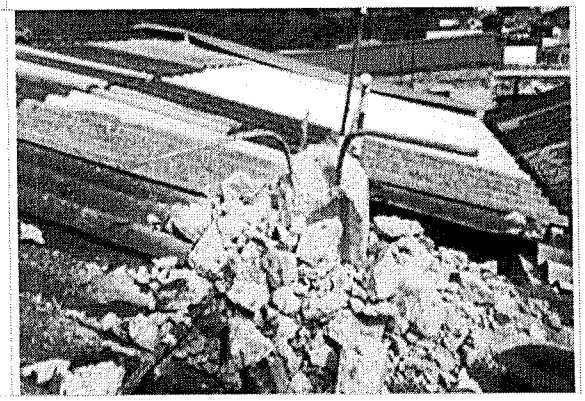
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Demolición de Placa Maciza E. Máx.: 20 cm (Ítem 1.10)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.10 Demolición columna concreto

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de demolición de columna en concreto en la casa fiscal del municipio de Pauna, Boyacá

Tabla 19. Demolición de columna en concreto

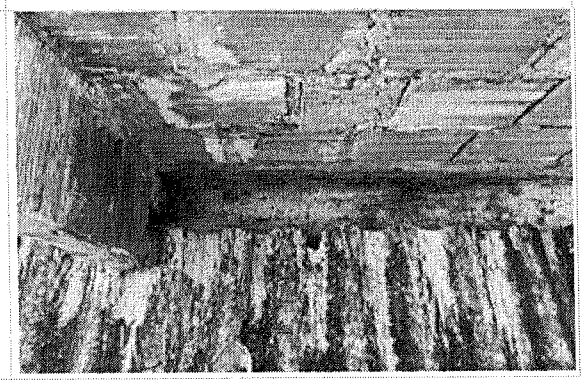
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Demolición de Columna en Concreto (Ítem 1.11)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.11 Limpieza De Viga Canal Y Placa De Tanque

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de limpieza de viga canal y placa de tanque en la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 20. Limpieza de viga canal y placa de tanque

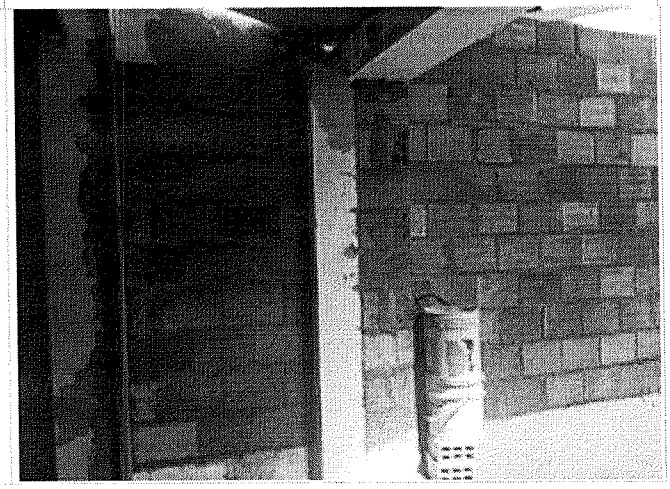
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Limpieza De Viga Canal Y Placa De Tanque (Ítem 1.12)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.12 Muro En Bloque No.5 E=0.12 Mts

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de muro en bloque No. 5 en la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 21. Muro En Bloque No.5 E=0.12 Mts

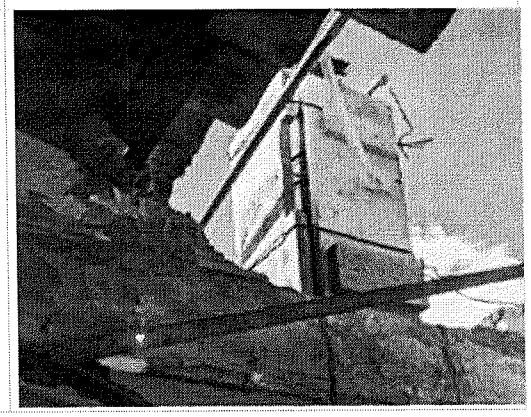
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Muro En Bloque No.5 E=0.12 Mts (Ítem 1.13)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.13 Columnas En Concreto 21 Mpa (3000 Psi), Altura Mayor A 3 Mts-Formaleta Madera

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de columnas en concreto 21 Mpa (3000 psi), en la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 22. Columnas En Concreto 21 Mpa (3000 Psi).

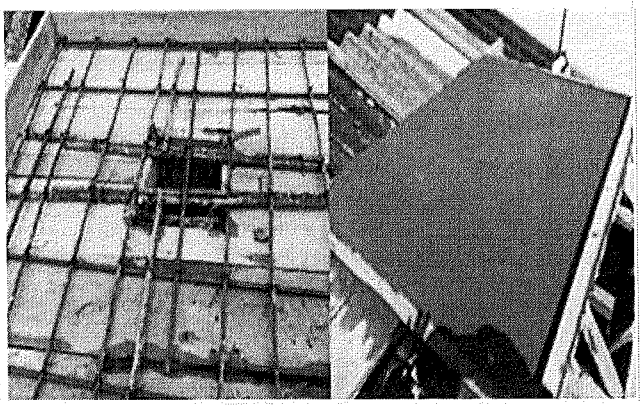
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Columnas En Concreto 21 Mpa (3000 Psi), Altura Mayor A 3 MTS-Formaleta Madera (Ítem 1.14)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.14 Placa Maciza 21 Mpa – (3000 Psi) E = 0.12 Mts

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de placa maciza 21 Mpa, en la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 23. Placa Maciza 21 Mpa.

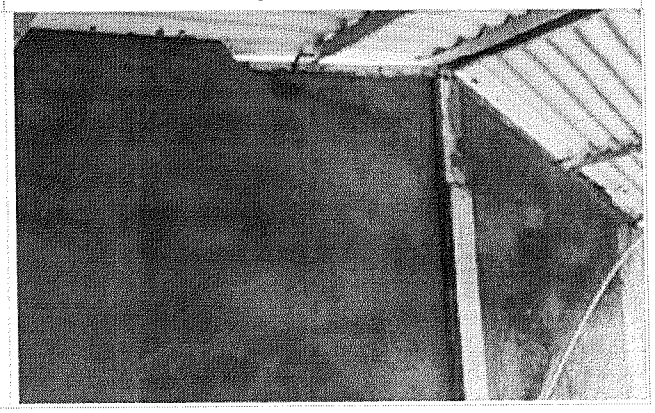
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Placa Maciza 21 Mpa – (3000 Psi) E=0.2 mts (Ítem 1.15)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.15 Pañete Liso Muros 1:4

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de pañete liso en muros de la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 24. Pañete Liso Muros 1:4

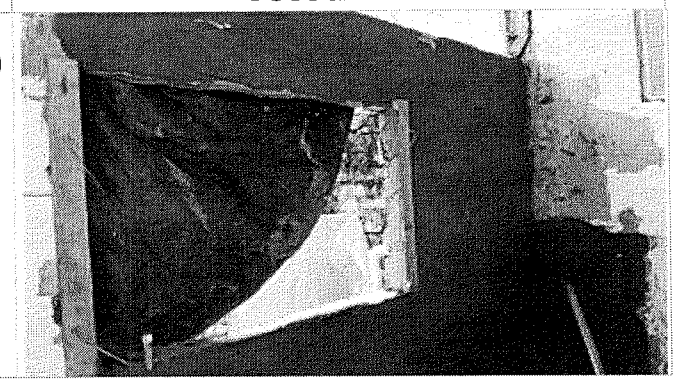
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Pañete Liso Muros 1:4 (Ítem 1.16)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.16 Pañete Impermeabilizado 1:3

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de pañete impermeabilizado en la casa fiscal del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 25.Pañete Impermeabilizado 1:3

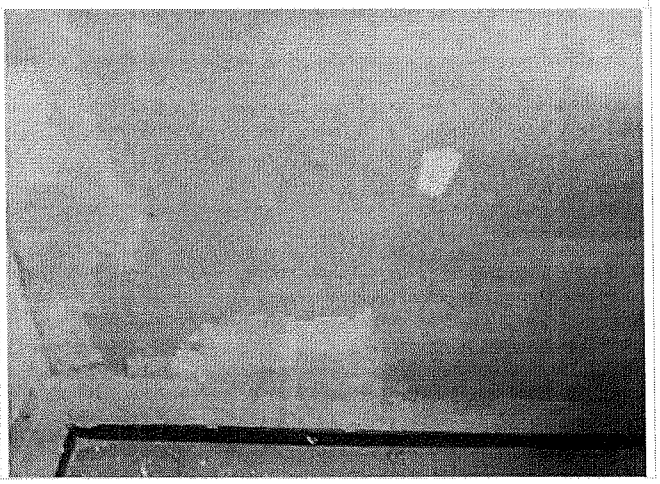
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Pañete Impermeabilizado 1:3 (Ítem 1.17)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.17 Estuco Muros

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de estuco muros en la casa fiscal del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 26.Estuco Muros

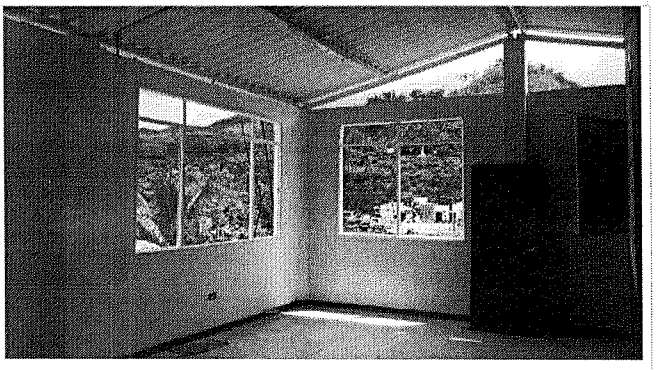
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Estuco Muros (Ítem 1.18 y 4.20)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.18 Vinilo Tipo II sobre pañete dos manos en muros

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de Vinilo tipo II sobre pañete en la casa fiscal del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 27.Vinilo tipo II sobre pañete dos manos en muros

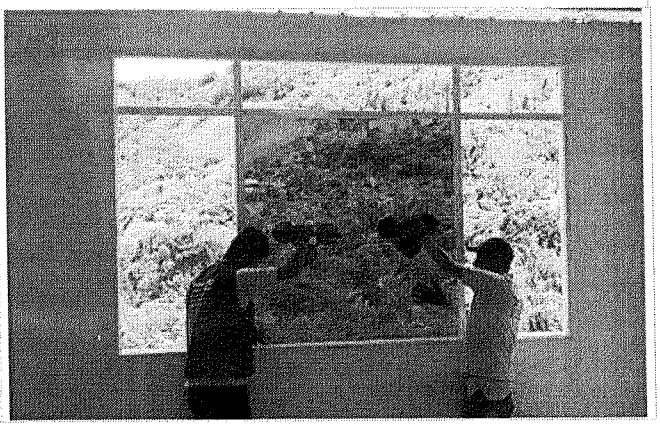
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Vinilo Tipo II sobre pañete dos manos en muros (Ítem 1.19)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.19 Suministro e Instalación Ventana Lámina Cal. 18 Con Vidrio Inc. Anticorrosivo

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de suministro e instalación ventana lámina Cal. 18 con vidrio en la casa fiscal del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 28.Suministro e Instalación de Ventana Lámina Cal. 18

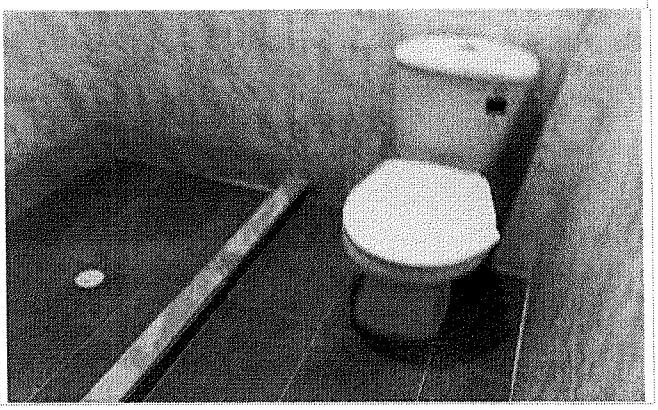
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Suministro e Instalación Ventana Lámina Cal. 18 Con Vidrio Inc. Anticorrosivo (Ítem 1.22 y 2.08)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.20 Suministro e Instalación Sanitario Avanti Plus Blanco Lavamanos con Pedestal, Sanitario, Grifería e Incrustaciones.

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de suministro e Instalación Sanitario Avanti Plus Blanco Lavamanos con Pedestal, Sanitario, Grifería e Incrustaciones en la casa fiscal del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 29. Suministro e Instalación Sanitario Avanti Plus Blanco Lavamanos con Pedestal, Sanitario, Grifería e Incrustaciones

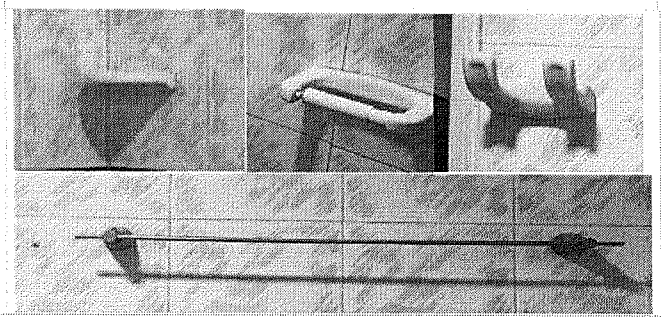
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Suministro e Instalación Sanitario Avanti Plus Blanco Lavamanos con Pedestal, Sanitario, Grifería e Incrustaciones (Ítem 1.24)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.21 Suministro e Instalación kit de accesorios para baño aluvia x6 piezas.

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de suministro e Instalación de kit de accesorios para baño en la casa fiscal del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 30. Suministro e Instalación kit de accesorios para baño aluvia x6 piezas

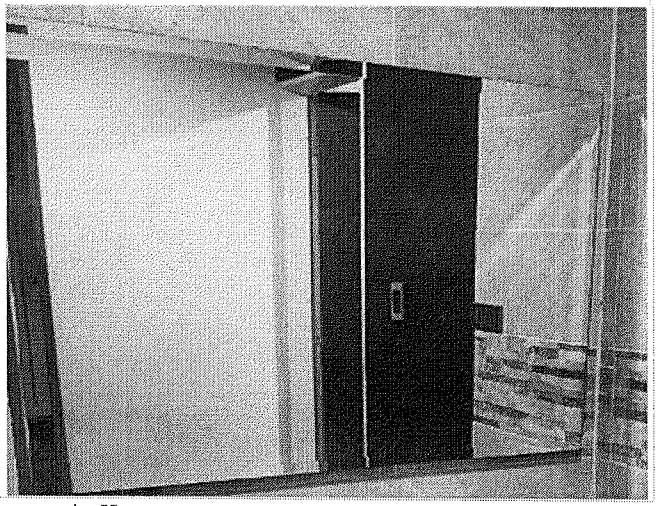
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Suministro e Instalación Kit de accesorios para baño aluvia X6 piezas (Ítem 1.25)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.22 Espejo 4 mm Sin Bicel

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de espejo 4 mm sin bicel en la casa fiscal del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 31. Espejo 4 mm sin bicel

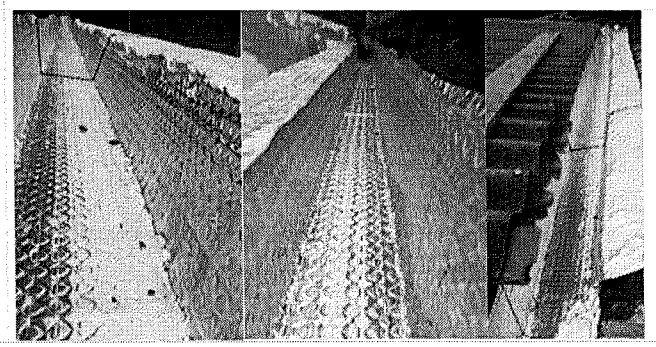
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Espejo 4 mm sin bicel (Item 1.26)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.23 Suministro E Instalación Impermeabilización En Manto Asfaltico Para Canales Y Viga canales

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de suministro e instalación impermeabilización en manto asfaltico para canales y viga canales de la casa fiscal del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 32. Suministro e Instalación Impermeabilización en Manto Asfaltico Para Canales

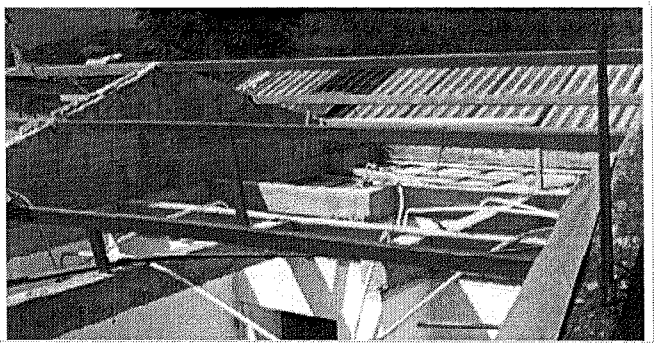
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Suministro E Instalación Impermeabilización En Manto Asfaltico Para Canales Y Viga canales (Ítem 1.27)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.24 Suministro E Instalación Perfilería Metálica (Inc. Anticorrosivo) Para Estructura De Cubierta

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de suministro e instalación perfilería metálica (inc. anticorrosivo) para estructura de cubierta en la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 33. Suministro E Instalación Perfilería Metálica (Inc. Anticorrosivo) Para Estructura De Cubierta

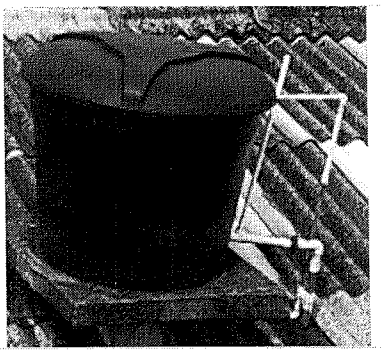
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Suministro E Instalación Perfilería Metálica (Inc. Anticorrosivo) Para Estructura De Cubierta (Ítem 1.28)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.25 Suministro E Instalación Tanque Elevado PVC 500 Lts, Inc. Accesorios

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de suministro e instalación de tanque elevado PVC 500 litros en la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 34. Suministro e Instalación Tanque Elevado PVC 500 Lts, Inc. Accesorios

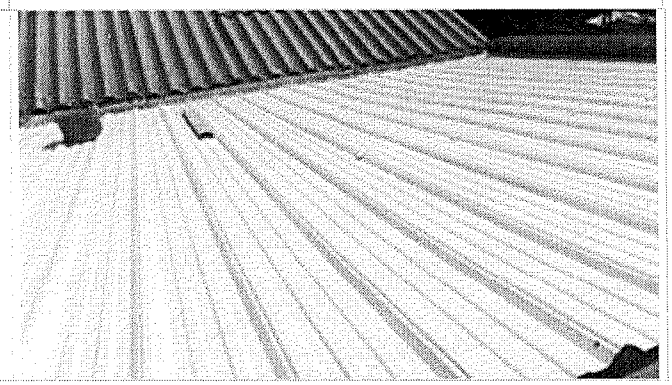
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Suministro E Instalación Tanque Elevado PVC 500 Lts, Inc. Accesorios (Ítem 1.30)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.26 Suministro E Instalación De Cubierta Arquitectónica Tipo Upvc Termoacústica 2.0 Mm. Incluye Tornilleria

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de suministro e instalación de cubierta arquitectónica tipo upvc termoacústica 2.0 mm. en la casa fiscal y el palacio municipal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 35. Suministro E Instalación De Cubierta Arquitectónica Tipo Upvc Termoacústica 2.0 Mm. Incluye Tornillería

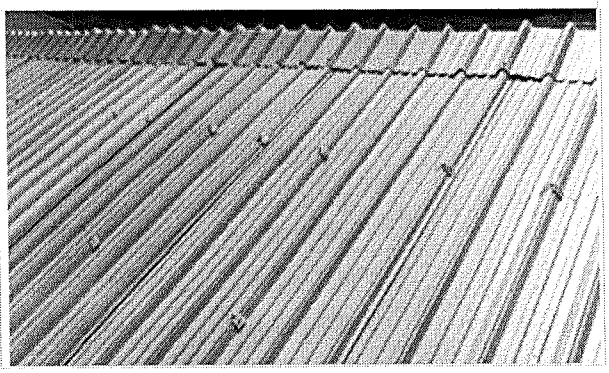
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Suministro E Instalación De Cubierta Arquitectónica Tipo Upvc Termoacústica 2.0 Mm. Incluye Tornillería (ítem 1.32 y 4.24)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.27 Suministro E Instalación Caballete Para Cubierta Arquitectónica en Upvc

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de suministro e instalación caballete para cubierta arquitectónica en upvc en la casa fiscal y el palacio municipal, del municipio de Pauna, Boyacá

Tabla 36. Suministro E Instalación Caballete Para Cubierta Arquitectónica En Upvc

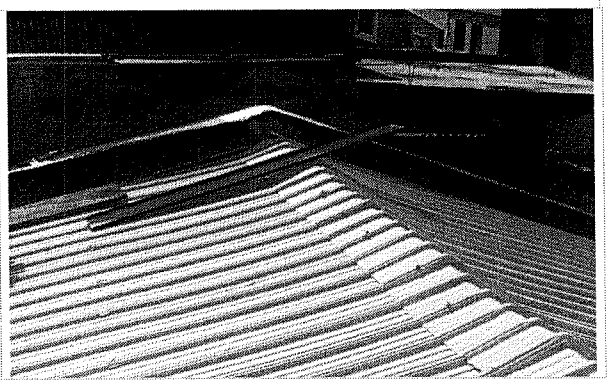
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Suministro E Instalación Caballete Para Cubierta Arquitectónica En Upvc (Ítem 1.33 y 4.15)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.28 Suministro E Instalación Flanche en Lámina

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de suministro e instalación de flanche en lámina en la casa fiscal y el palacio municipal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 37. Suministro E Instalación De Flanche en Lámina

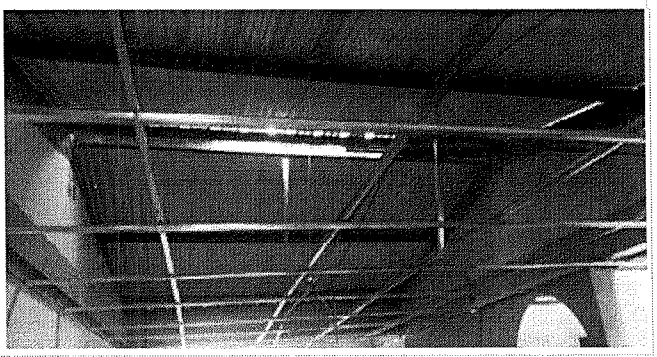
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Suministro E Instalación De Flanche en Lámina (Ítem 1.34 y 4.18)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.29 Suministro E Instalación Estructura En Aluminio Para Cielo Raso

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de suministro e instalación estructura en aluminio para cielo raso en la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 38. Suministro E Instalación Estructura En Aluminio Para Cielo Raso

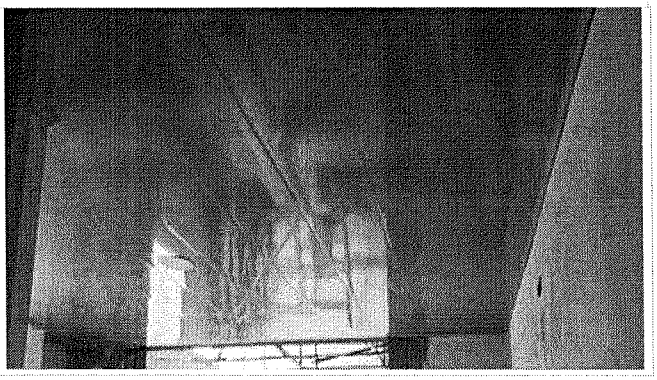
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Suministro E Instalación Estructura En Aluminio Para Cielo Raso (ítem 1.35)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.30 Suministro E Instalación Cielo Raso Bóvedas Drywall O Pvc

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de Suministro E Instalación Cielo Raso Bóvedas Drywall O Pvc en la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 39. Suministro E Instalación Cielo Raso Bóvedas Drywall O Pvc

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Suministro E Instalación Cielo Raso Bóvedas Drywall O Pvc (Ítem 1.36)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.31 Retiro Y Acarreo De Material Sobrante

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de retiro y acarreo de material sobrante en la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 40. Retiro Y Acarreo De Material Sobrante

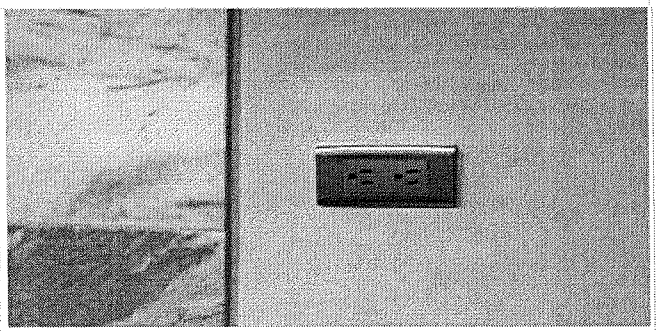
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Retiro Y Acarreo De Material Sobrante (Ítem 1.38)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.32 Suministro E Instalación De Salida Completa Para Tomacorriente Monofásico Tipo Gfci, En Calibre 12 Awg (F, N, T) Y Ducto Pvc De 1/2". (Incluye Aparato).

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de suministro e instalación de salida completa para tomacorriente monofásico tipo gfci, en calibre 12 awg (f, n, t) y ducto pvc de 1/2". (incluye aparato) en la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 41. Suministro e instalación de salida completa para tomacorriente monofásico tipo gfci, en calibre 12 awg (f, n, t) y ducto pvc de 1/2

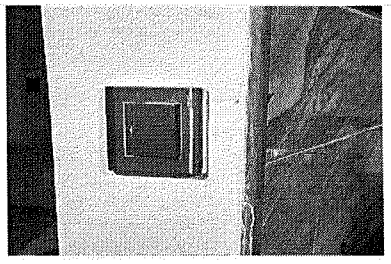
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Suministro E Instalación De Salida Completa Para Tomacorriente Monofásico Tipo Gfci, En Calibre 12 Awg (F, N, T) Y Ducto Pvc De 1/2". (Incluye Aparato). (Ítem 1.40)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.33 Suministro E Instalación De Salida Completa Para Interruptor Sencillo En Calibre Awg 12 Y Ducto Pvc 1/2 " (Incluye Aparato)

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de suministro e instalación de salida completa para interruptor sencillo en calibre awg 12 y ducto pvc 1/2 " (incluye aparato) en la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 42. Suministro e instalación de salida completa para interruptor sencillo en calibre awg 12 y ducto PVC 1/2 " (incluye aparato)

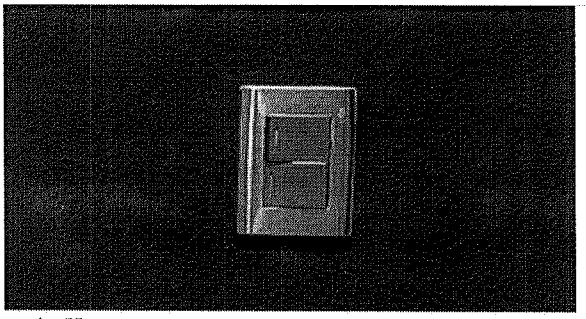
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Suministro E Instalación De Salida Completa Para Interruptor Sencillo En Calibre Awg 12 Y Ducto Pvc 1/2 " (Incluye Aparato) (Ítem 1.42)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.34 Suministro E Instalación De Salida Completa Para Interruptor Doble En Calibre Awg 12 Y Ducto Pvc 1/2 " (Incluye Aparato)

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de suministro e instalación de salida completa para interruptor doble en calibre awg 12 y ducto pvc 1/2 " (incluye aparato) en la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 43. Suministro e instalación de salida completa para interruptor doble en calibre awg 12 y ducto PVC 1/2 " (incluye aparato)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Suministro E Instalación De Salida Completa Para Interruptor Doble En Calibre Awg 12 Y Ducto Pvc 1/2 " (Incluye Aparato) (Ítem 1.43)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.35 Suministro E Instalación De Panel Led Redondo de Incrustar De 12 W

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de Suministro E Instalación De Panel Led Redondo de Incrustar De 12 W en la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 44. Suministro e instalación de panel led redondo de incrustar de 12 w

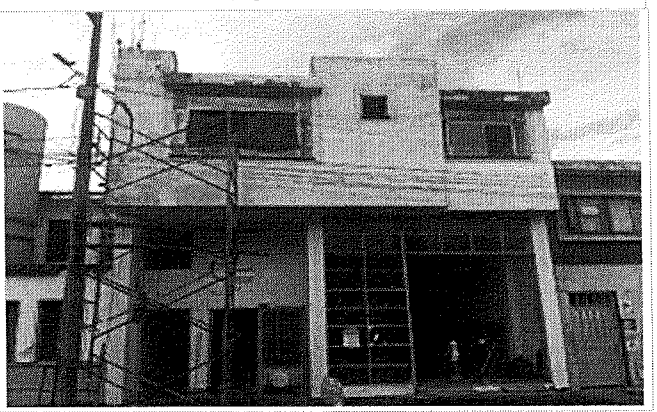
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Suministro E Instalación De Panel Led Redondo de Incrustar De 12 W (Ítem 1.47)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.36 Preparación Y Lavado De Superficie De Fachada, Altura Mayor A 3 Mts (Incluye Rinse Restaurador, Equipo De Presión A 3500 Psi Y Reparación De Fisuras)

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de preparación y lavado de superficie de fachada, altura mayor a 3 mts en la comisaría de familia y el palacio municipal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 45. Preparación Y Lavado De Superficie De Fachada, Altura Mayor A 3 Mts

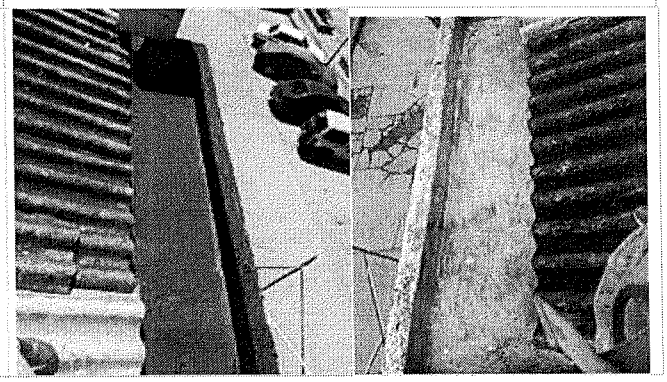
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Preparación Y Lavado De Superficie De Fachada, Altura Mayor A 3 Mts (Incluye Rinse Restaurador, Equipo De Presión A 3500 Psi Y Reparación De Fisuras) (Ítem 2.01 y 4.01)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.37 Limpieza De Viga Canal

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de limpieza de viga canal en la comisaría de familia, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 46. Limpieza De Viga Canal

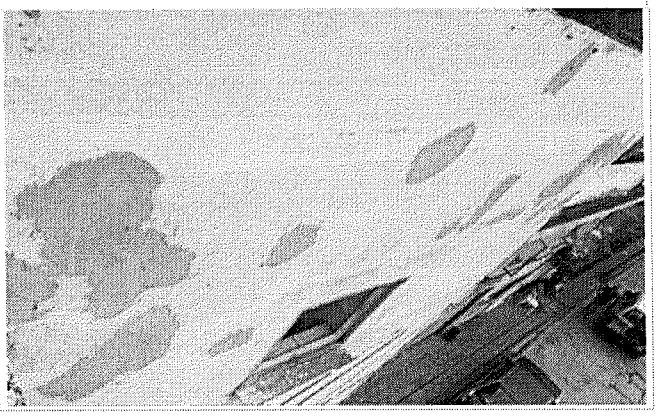
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Limpieza De Viga Canal (Ítem 2.02)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.38 Estuco Muros

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de estuco muros en la comisaría de familia y oficinas, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 47. Estuco Muros

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Estuco Muros (Ítem 2.03 y 3.04)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.39 Pintura Intemperie Para Fachada Tipo Koraza Para Exteriores A 3 Manos

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de pintura intemperie para fachada tipo koraza para exteriores a 3 manos en la comisaría de familia, oficinas y palacio municipal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 48. Pintura Intemperie Para Fachada Tipo Koraza Para Exteriores A 3 Manos

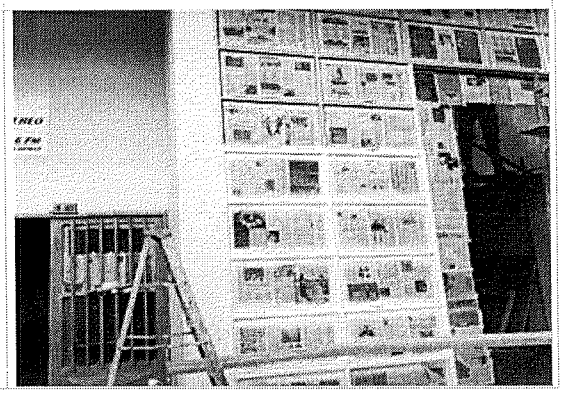
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Pintura Intemperie Para Fachada Tipo Koraza Para Exteriores A 3 Manos (Ítem 2.04 y 4.21)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.40 Esmalte Marcos Lamina 3 Manos

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de esmalte marcos lamina 3 manos en la comisaría de familia, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 49. Esmalte Marcos Lamina 3 Manos

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Esmalte Marcos Lamina 3 Manos (Ítem 2.06)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.41 Suministro e Instalación Rejilla De Ventilación En Lamina Cal. 18 Inc. Anticorrosivo

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de rejilla de ventilación en lamina cal. 18 inc. anticorrosivo en la comisaría de familia y el palacio municipal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 50. Suministro e instalación rejilla de ventilación en lamina cal. 18 inc. Anticorrosivo


DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Suministro e instalación rejilla de ventilación en lamina cal. 18 inc. Anticorrosivo (Ítem 2.09 y 3.07)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.42 Vinilo Tipo II Sobre Pañete Dos Manos En Muros

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de vinilo tipo II sobre pañete dos manos en muros en la comisaría de familia, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 51. Vinilo Tipo II Sobre Pañete Dos Manos En Muros

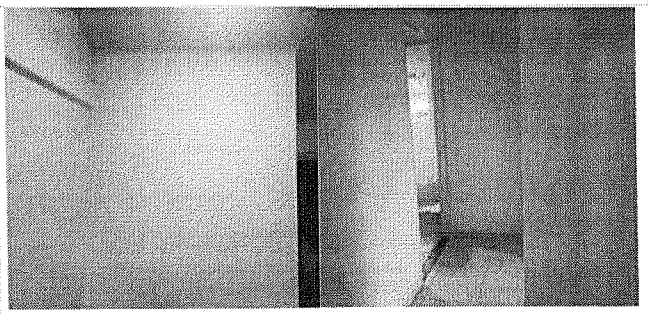
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Vinilo Tipo II Sobre Pañete Dos Manos En Muros (Ítem 3.05)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.43 Vinilo Desmonte

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de vinilo tipo II sobre pañete dos manos en muros en la comisaría de familia, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 52. Vinilo Tipo II Sobre Pañete Dos Manos En Muros

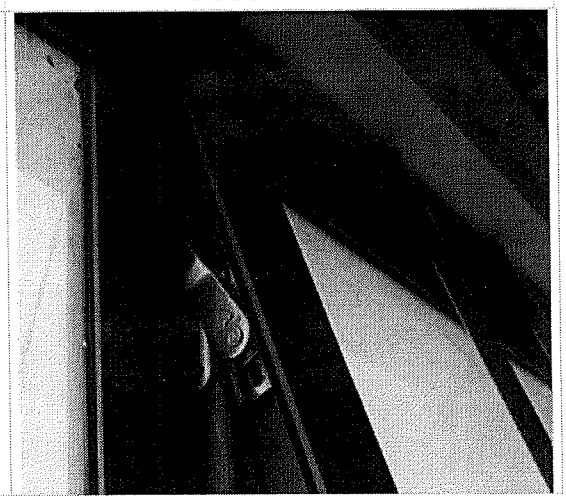
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Vinilo Tipo II Sobre Pañete Dos Manos En Muros (Ítem 3.05)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.44 Reparación Ventana (Incluye Bisagras Y Otros Necesarios)

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de reparación ventana (incluye bisagras y otros necesarios) en el palacio municipal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 53. Reparación ventana (incluye bisagras y otros necesarios)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Reparación Ventana (Incluye Bisagras Y Otros Necesarios) (Ítem 4.08)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.45 Reparación Y Mantenimiento Baranda Metálica (Inc. Pintura)

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de reparación y mantenimiento baranda metálica (inc. pintura) en el palacio municipal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 54. Reparación Y Mantenimiento Baranda Metálica (Inc. Pintura)

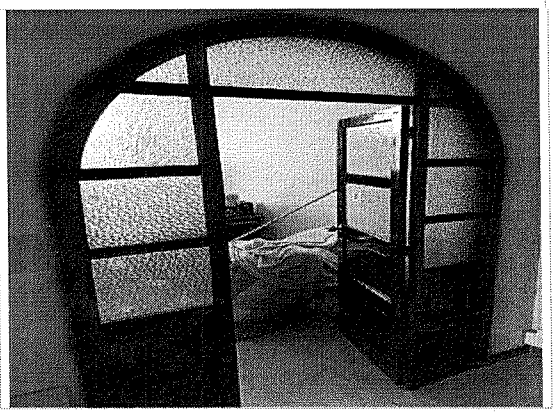
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Reparación y mantenimiento baranda metálica (inc. Pintura) (Ítem 4.10)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.46 Mantenimiento Y Pintura De Puertas Y Ventanas (Incluye Marcos)

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de mantenimiento y pintura de puertas y ventanas (incluye marcos) en el palacio municipal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 55. Mantenimiento y pintura de puertas y ventanas (incluye marcos)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Mantenimiento Y Pintura De Puertas Y Ventanas (Incluye Marcos) (Ítem 4.11)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.47 Suministro E Instalación Cielo Raso Bóvedas Drywall O Pvc

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de suministro e instalación cielo raso bóvedas drywall o PVC en el palacio municipal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 56. Suministro E Instalación Cielo Raso Bóvedas Drywall O Pvc

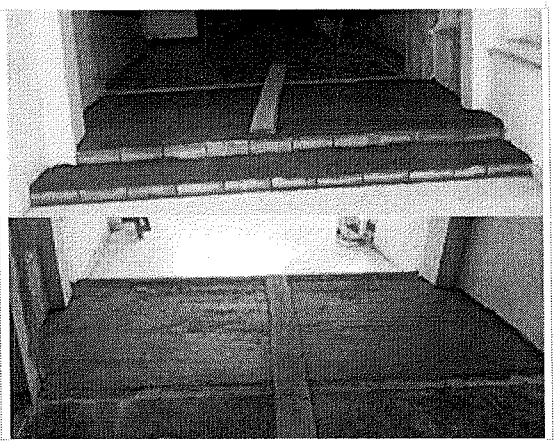
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Suministro E Instalación Cielo Raso Bóvedas Drywall O Pvc (Ítem 4.19)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.48 Placa Base En Concreto E = 10 CM 2500 PSI

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de placa base en concreto E = 10 cm en la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 57. Placa Base en Concreto E = 10 CM 2500 PSI

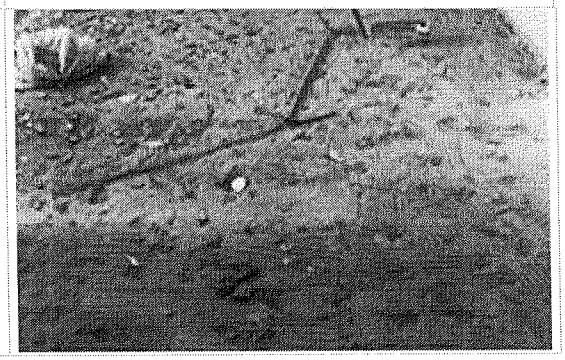
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Placa Base En Concreto E = 10 CM 2500 PSI (NP)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.49 Demolición Enchape Cerámico

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de demolición de enchape cerámico en la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 58. Demolición enchape cerámico

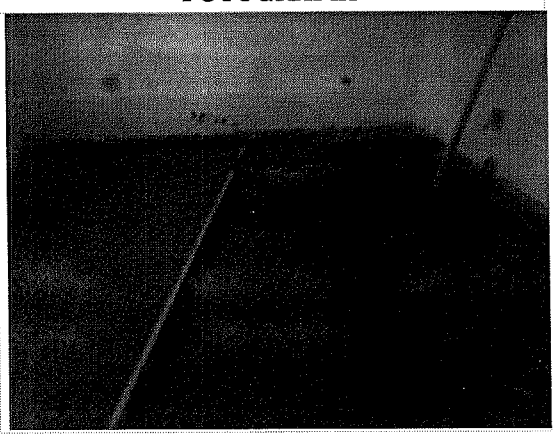
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Demolición Enchape Cerámico (NP)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.50 Alistado Piso E = 4 CM 1:5

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de alistado piso en la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 59. Alistado Piso E = 4 cm 1:5

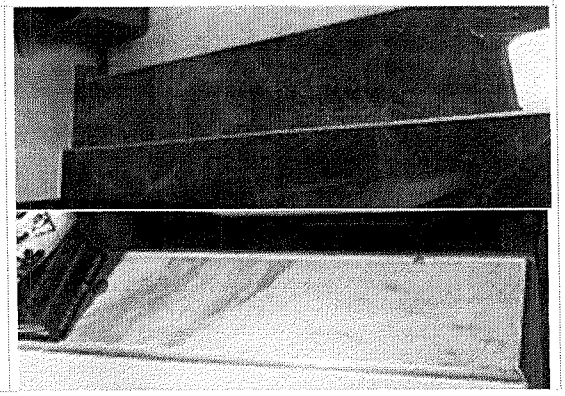
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Alistado Piso E = 4 CM 1:5 (NP)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.51 Remate Bocel Aluminio "WINS"

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de remate bocel aluminio en la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 60. Remate Bocel Aluminio "WINS"

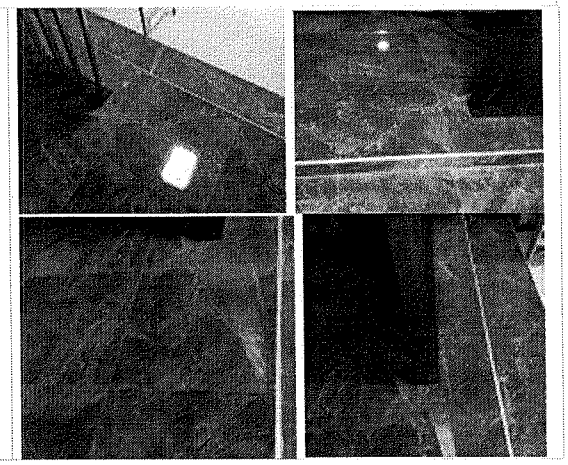
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Remate Bocel Aluminio "WINS" (NP)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.52 Suministro e Instalación de Enchape Porcelanato Cosmo Blue 60*60cm

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de suministro e instalación de enchape en la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

*Tabla 61. Suministro e Instalación de enchape porcelanato cosmo blue 60 * 60*

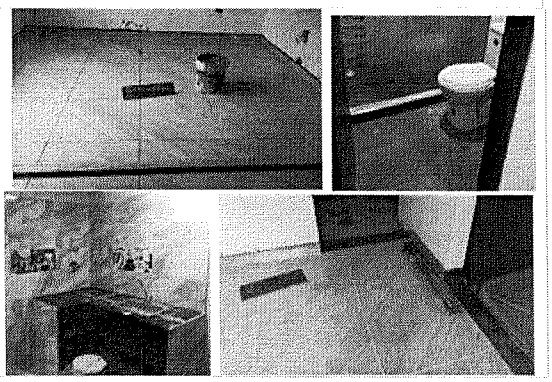
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Suministro e Instalación de Enchape Porcelanato Cosmo Blue 60*60cm (NP)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.53 Suministro e Instalación de Enchape Tableta Piso Alfa Marsella Gold 61 x 61

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de suministro e instalación de enchape en la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 62. Suministro e Instalación de enchape tableta piso alfa Marsella Gold 61 x 61

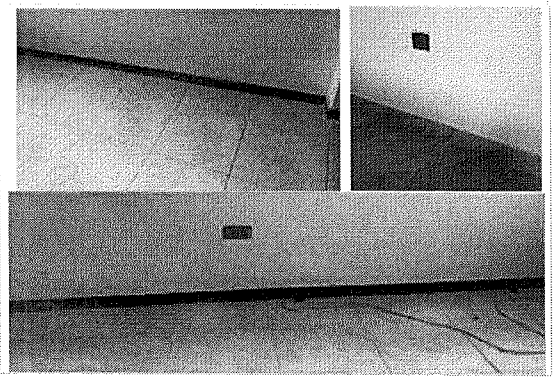
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Suministro e Instalación de Enchape Tableta Piso Alfa Marsella Gold 61 x 61 (NP)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.54 Suministro e Instalación de Guarda escoba Baldosín

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de suministro e instalación de guarda escoba en la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 63. Suministro e Instalación de guarda escoba Baldosín

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Suministro e Instalación de guarda escoba Baldosín (NP)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.55 Dinteles en Bloque E = 0,15 MTS

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de suministro e instalación de dinteles en bloque en la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 64. Suministro e Instalación de dinteles en bloque

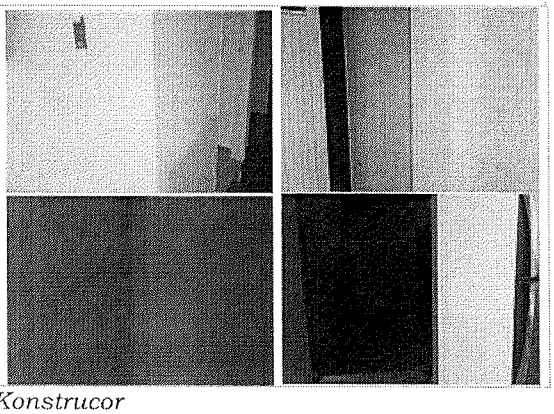
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Suministro e Instalación de dinteles en bloque (NP)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.56 Filos y Dilataciones en Pañetes

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de suministro e instalación de filos y dilataciones en la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 65. Filos y Dilataciones en Pañetes

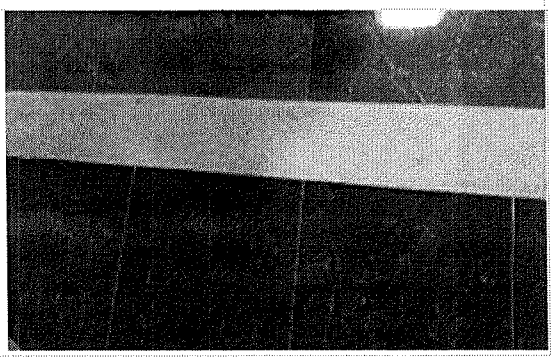
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Filos y dilataciones en pañetes (NP)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.57 Boca Puerta en Granito Sin Pulir

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de boca puerta en granito sin pulir en la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 66. Boca Puerta en Granito Sin Pulir

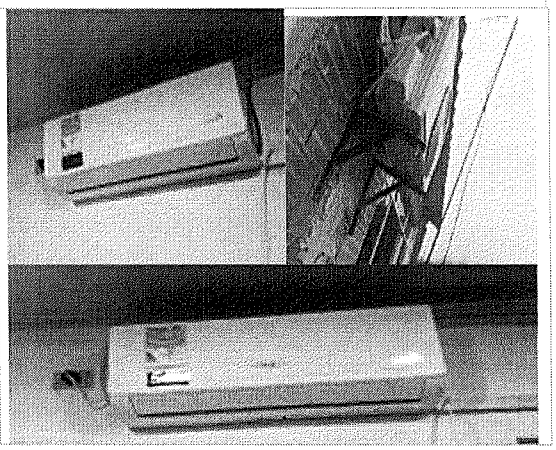
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Boca Puerta en Granito Sin Pulir (NP)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.58 Suministro e Instalación a Todo Costo de Aire Acondicionado Mini Split Inverter 12000 0 BTU

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad suministro e instalación de aire acondicionado en la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 67. Suministro e Instalación a todo costo de aire acondicionado Mini Split Inverter 12000 0 BTU

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Suministro e Instalación a todo costo de aire acondicionado Mini Split Inverter 12000 0 BTU (NP)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.59 Suministro e Instalación puerta ventana en lamina Cal 18 inc. Anticorrosivo.

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad suministro e instalación de puerta ventana en lámina en la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 68. Suministro e Instalar puerta ventana en lámina Cal 18 Inc. anticorrosivo

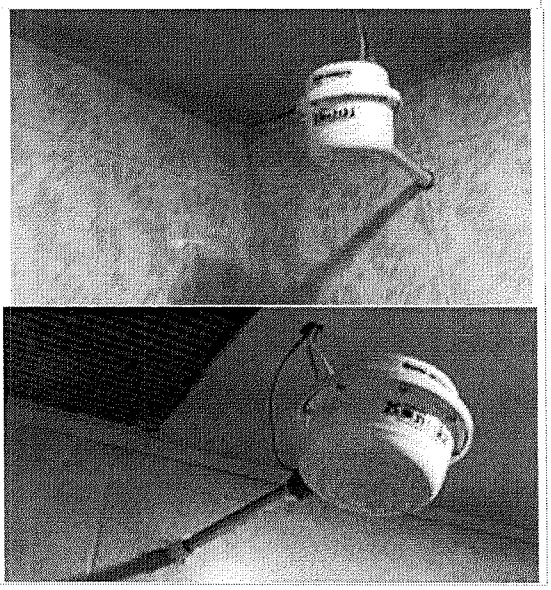
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Suministro e instalación puerta ventana en lámina Cal 18 inc. anticorrosivo	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.60 Suministro e Instalación ducha eléctrica

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad suministro e instalación de ducha eléctrica en la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 69. Suministro e Instalació de ducha eléctrica

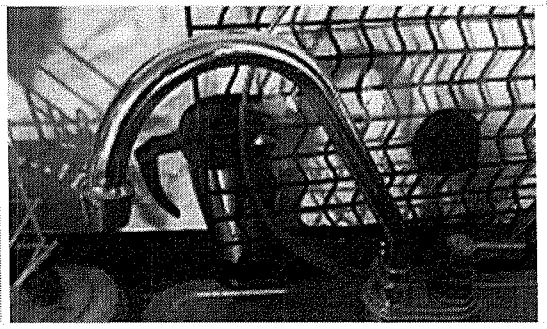
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Suministro e instalación ducha eléctrica	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.61 Suministro e Instalación grifería lavaplatos metal

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad suministro e instalación de grifería lavaplatos en la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 70. Suministro e Instalación grifería lavaplatos metal

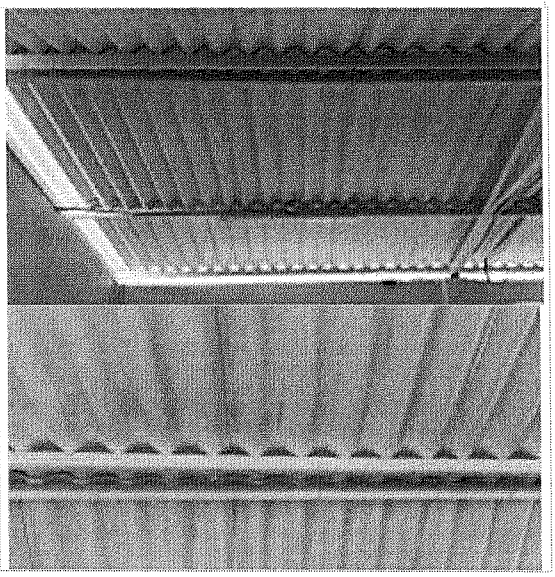
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Suministro e instalación grifería lavaplatos metal	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.62 Vinilo Tipo II Sobre Pañete Dos Manos Bajo Placa

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de vinilo tipo II bajo placa en la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 71. Suministro e Instalación Vinilo Tipo II Sobre Pañete Dos Manos Bajo Placa

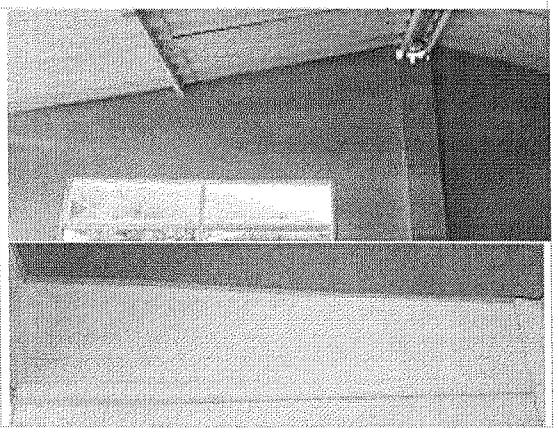
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Suministro e instalación vinilo tipo II sobre pañete dos manos bajo placa	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.63 Muro Cara Doble En Eterboard 10 MM

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de muro cara doble en eterboard la casa fiscal y comisaría de familia, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 72. Muro Cara Doble En Eterboard 10 MM

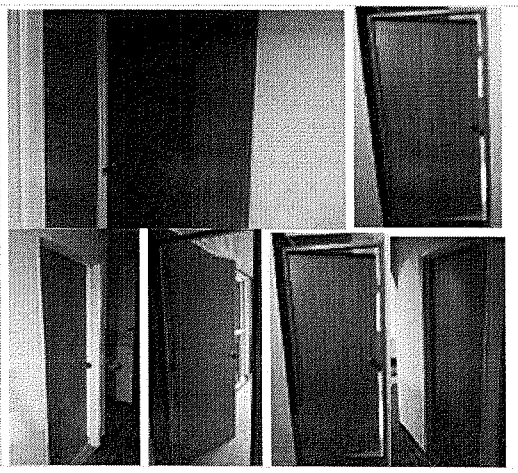
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Muro Cara Doble En Eterboard 10 MM	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.64 Marco Puerta Madera Pino Entablado Triplex 70-90*200 cm

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de marco puerta madera en la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 73. Marco Puerta Pino Entablado Triplex

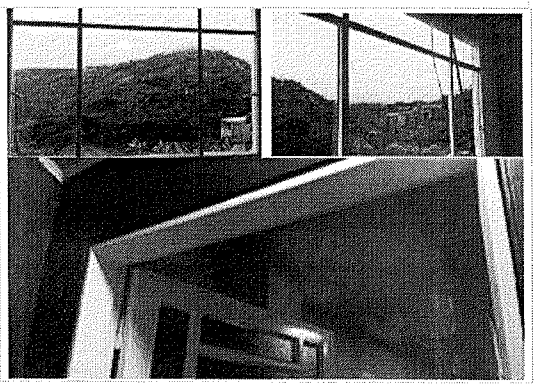
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Marco Puerta Madera Pino Entablado Triplex 70-90*200 cm	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.65 Esmalte Marcos Lámina 3 Manos

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de esmalte marcos lámina 3 manos en la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 74. Esmalte Marcos Lámina 3 manos

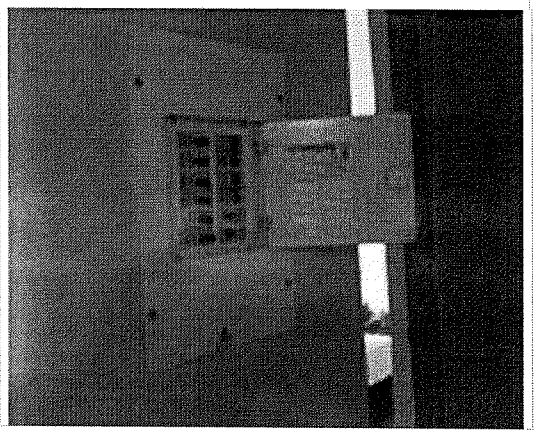
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Esmalte Marcos Lámina 3 Manos.	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.66 Suministro e Instalación de Tablero de Distribución Bifásico de 12 circuitos

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de suministro e instalación de tablero bifásico en la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 75. Suministro e instalación de tablero de distribución bifásico de 12 Circuitos.

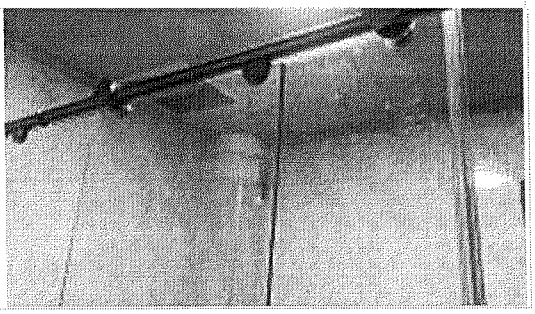
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Suministro e instalación de tablero De distribución bifásico de 12 Circuitos.	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.67 Divisiones Para Baño en Aluminio y Vidrio Templado de 0.05 mm

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de suministro e instalación de divisiones para baño en vidrio en la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 76. Divisiones para baño en aluminio y vidrio templado de 0,05 mm

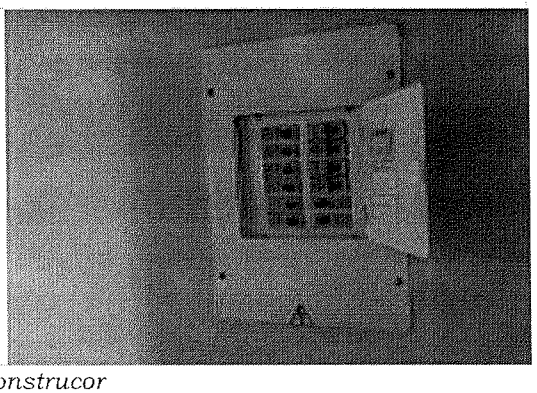
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Divisiones para baño en aluminio y vidrio templado de 0,05 mm	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.68 Suministro e Instalación de breaker termomagnético monopolar enchufable de 1 x 20 amp.

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de instalación de brakers en la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 77. Suministro e instalación de breaker termomagnético monopolar enchufable de 1 x 20 amp.

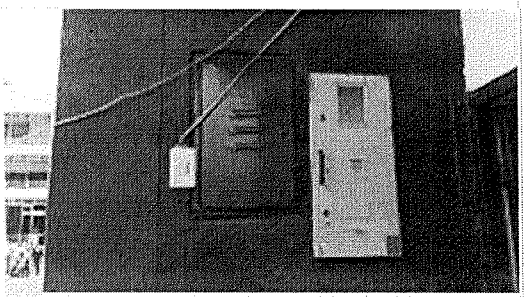
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Suministro e instalación de breaker Termomagnético monopolar Enchufable de 1 x 20 amp.	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.69 Suministro e instalación de gabinete para equipo de medida bifásico empotrado. Incluye contador de energía electrónico bifásico 5 a 100 AMP.

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de gabinete para equipo de medida bifásico en la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 78. Suministro e instalación de gabinete para equipo de medida bifásico empotrado. Incluye contador de energía electrónico bifásico 5 a 100 amp

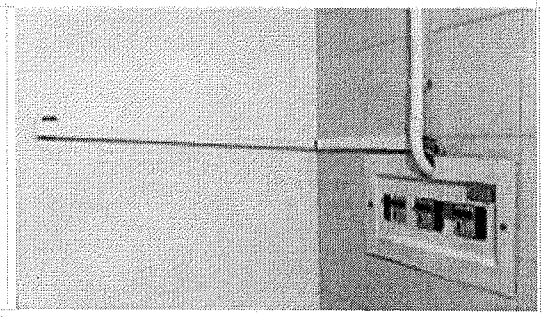
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Suministro e instalación de Gabinete para equipo de medida Bifásico empotrado. Incluye Contado de energía electrónico Bifásico 5 a 100 amp	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.70 Suministro, instalación y conexionado de cable concéntrico no. 2 x 8 +8 awg en cobre (acometida bifásica)

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de conexionado de cable concéntrico No. 2 * 8 + 8 en la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 79. Suministro, instalación y conexionado de cable concéntrico no. 2 x 8 +8 awg en cobre (acometida bifásica)

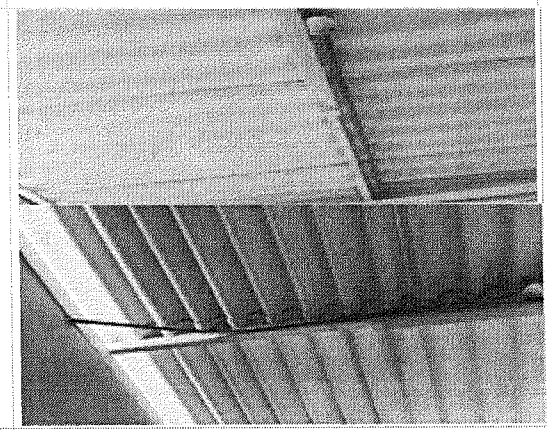
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Suministro, instalación y conexionado de cable concéntrico no. 2 x 8 +8 awg en cobre (acometida bifásica)	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.71 Suministro e instalación de tubería EMT de ½"

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de suministro e instalación de tubería en la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 80. Suministro, instalación de tubería EMT de ½"

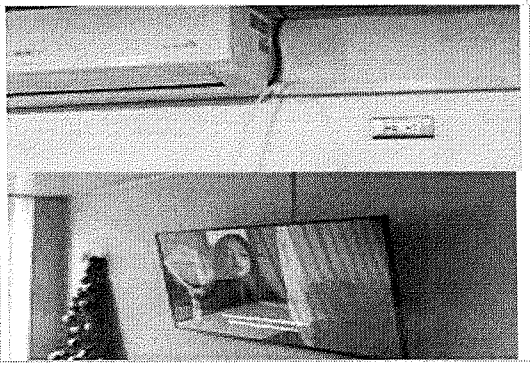
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Suministro, instalación de tubería EMT de ½"	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.72 Suministro e instalación de salida sencilla para tv. Incluye aparato

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de suministro e instalación de salida sencilla para tv en la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 81. Suministro, instalación de salida sencilla para tv. incluye aparato

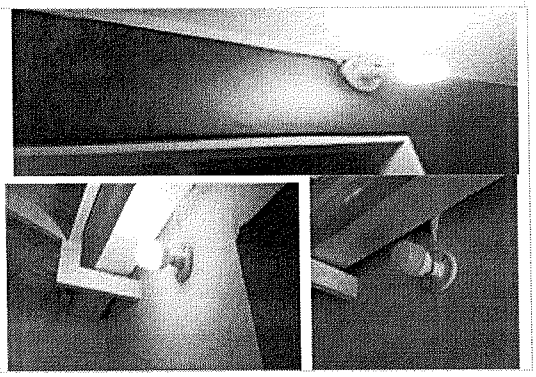
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Suministro, instalación de salida sencilla para tv. incluye aparato	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.73 Suministro e instalación de roseta tipo plafón

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de suministro e instalación de roseta tipo plafón la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 82. Suministro, instalación de roseta tipo plafón

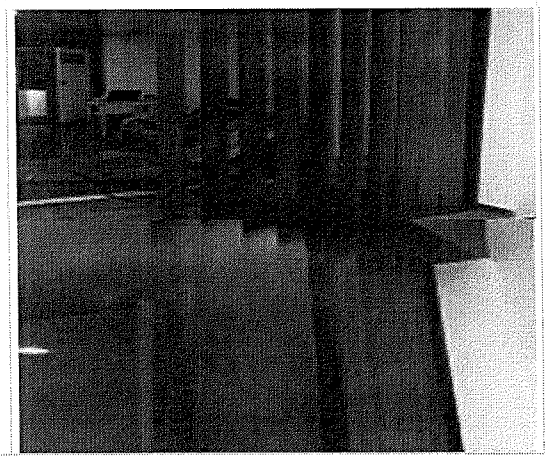
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Suministro, instalación de roseta tipo plafón	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.74 División para espacios abiertos en madera tipo mdp cedra 15 mm

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de división para espacios abiertos tipo mdp la casa fiscal, del municipio de Pauna, Boyacá.

Tabla 83. División para espacios abiertos en madera tipo MDP CEDRA 15 mm

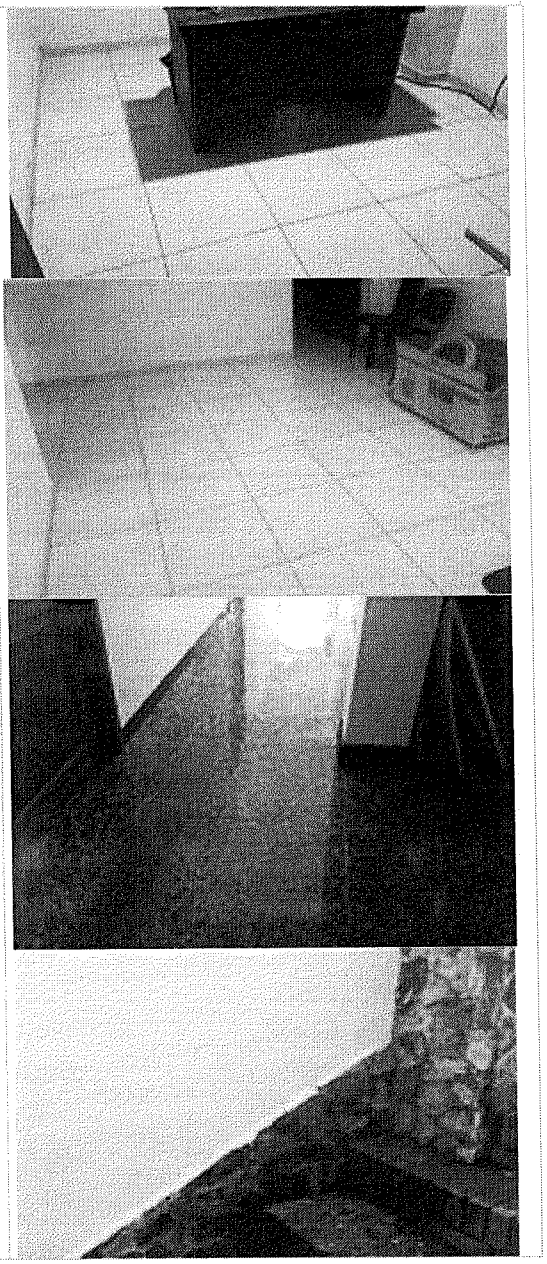
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
División para espacios abiertos en madera tipo MDP CEDRA 15 mm	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.75 Aseo General Entrega

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de aseo general entrega.

Tabla 84. Aseo General Entrega

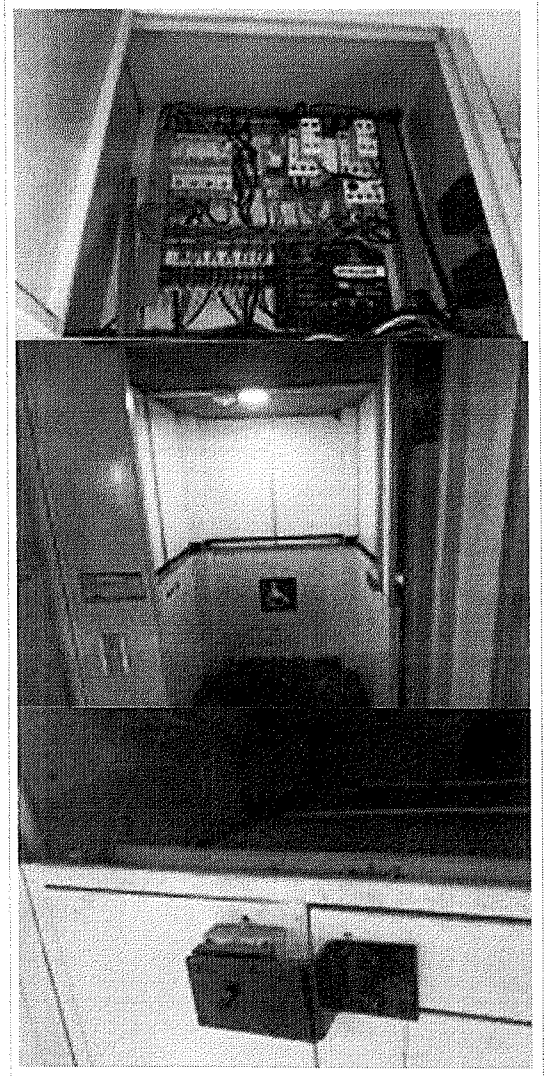
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Aseo General Entrega	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.76 Reparación y mantenimiento de ascensor

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de reparación y mantenimiento de ascensor del palacio municipal.

Tabla 85. Reparación y mantenimiento de ascensor

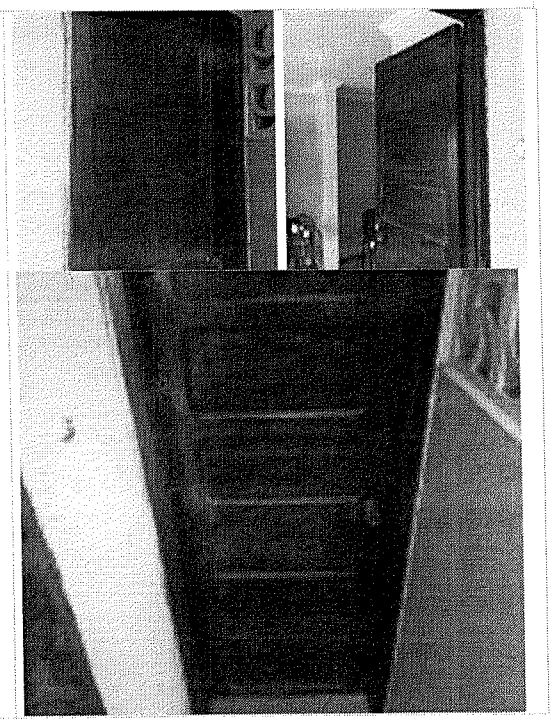
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Reparación y mantenimiento de ascensor	

Fuente: Consorcio Konstrucor

6.2.77 Esmalte madera llena 3 manos

El consorcio Konstrucor en cumplimiento a sus obligaciones contractuales, realizó la actividad de esmalte madera llena 3 manos en puertas del palacio municipal.

Tabla 86. Esmalte madera llena 3 manos

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FOTOGRAFÍA
Esmalte madera llena 3 manos	

Fuente: Consorcio Konstrucor

7 ASPECTOS SOCIALES

7.1 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Con el objetivo de brindar atención y participación a la comunidad en el proyecto que se está ejecutando, se encuentra disponibilidad en la obra para recibir cualquier petición, queja y/o reclamos (PQR'S) con relación a la obra en ejecución. Este programa se implementa dado que, para el Consocio Konstrucor, es muy importante la participación de la comunidad para la cual se está ejecutando el proyecto.

Tabla 87. Plan de atención a la comunidad

ACTIVIDADES	OBJETIVO	OBSERVACIONES
Buzón de sugerencias	Recepcionar peticiones, quejas y reclamos relacionados con la obra y dar su respectiva solución, para así no tener contratiempos en obra.	Se cuenta con disponibilidad de buzón de PQRS.

Fuente: Consorcio Konstrucor

Dentro de la gestión social realizada por el consorcio Konstrucor se resalta la vinculación laboral de personas habitantes del municipio de Pauna.

8 ASPECTOS SG SST

Aspectos de sistema de seguridad y salud en el trabajo dentro del proyecto:

8.1 PERSONAL DE OBRA

Se realizó afiliación al sistema de seguridad social de los profesionales y trabajadores y se anexa al presente informe soportes de las afiliaciones del personal que ha ingresado hasta la fecha a la obra.

Tabla 88. Relación de personal de obra

LISTADO DE PERSONAL MANO DE OBRA	
Nombre de Trabajador	**Cargo**
Paola del Pilar López Rojas	Director de Obra
Luis Alfredo Cely Moreno	Residente de Obra
Rubén Darío Rojas Niño	Residente Eléctrico
Pablo Armando Rozo González	Maestro de Obra
Anderson Estiven Pineda Bautista	Ayudante de Obra
Roger David Pineda Barrera	Ayudante de Obra

Fuente: Consorcio Konstrucor

8.2 DOTACIONES Y (EPP)

Al inicio de la obra el Consorcio Konstrucor entrega dotación y elementos de protección personal (EPP) a todo el personal que ingresó a trabajar en la obra; de igual manera a medida que nuevo personal ingresa a trabajar, se hará entrega de todos sus elementos de protección. En momento, los trabajadores cuentas con los siguientes elementos de protección personal: Casco amarillo, Botas de seguridad, gafas de seguridad, tapa oídos de inserción, guantes de carnaza.

8.3 SEGURIDAD SOCIAL

Durante el periodo del presente informe el contratista entregará a la supervisión los soportes de pago al Sistema de Seguridad Social y ARL, es de aclarar que no se permitió el ingreso a la obra de ninguna persona sin la documentación antes mencionada.

9 CONCLUSIONES

ASPECTOS TÉCNICOS

- A la fecha el avance de obra es de un 100% ejecutado frente a un 100% programado representado en la ejecución de actividades contractuales.

- A la fecha se han adelantado la totalidad de los procesos constructivos correspondientes a las adecuaciones y reparaciones a las instalaciones del palacio municipal y el edificio de empleados del municipio de Pauna, Boyacá siguiendo todos los lineamientos técnicos y de calidad.

- El clima presentado en el transcurso del proyecto ha interferido negativamente, debido a las lluvias, lo que ha generado dificultades y contratiempos.

ASPECTOS SG-SST

- Durante este periodo de ejecución de actividades se mantuvo el personal afiliado al sistema de seguridad (Arl, Eps y pensión), de igual modo el personal contó con su respectiva dotación de elementos de protección personal.

- Se continuará con las medidas de contención de propagación de COVID-19 y mantener el indicador de accidentes en ceros.

ASPECTOS AMBIENTALES

- Se supervisaron las actividades diarias, con el fin de generar el menor impacto de contaminación posible, control de desechos orgánicos e inorgánicos y contaminación visual, además de mitigar del impacto frente a los vecinos colindantes dando cumplimiento a los programas de la empresa.

- Se realizaron dos capacitaciones ambientales respecto al manejo de materiales de construcción y concreto, atención a derrames y contaminación del aire y ruido y a manejo de ahorro de recursos naturales.

Ing. Luis Alfredo Cely
Residente de Obra

Email: consorcio.konstrucor@gmail.com
Cel: 321 268 4870 – 300 797 6983
