	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/09/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VIA CORREGIMIENTO DE SIETE VUELTAS Y SUS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 50 del 5/09/2024 al 12/09/2024 Último Informe Semanal ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: CLAUDIA CECILIA LÓPEZ PALACIOS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la vía corregimiento de siete vueltas y sus veredas en el Municipio de San Juan de Urabá -Departamento de Antioquia-Programa Rural."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

De acuerdo al alcance del contrato se van a construir un puente en estructura metalica de 36 metros lineales.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las características técnicas de la vía propuesta se enmarca en la construcción de un puente vehicular metalico de una luz libre de 36,0 m, 295 metros cúbicos de concreto clase D (280 kg/cm2 o 28MPa) para zapatas, estribos y aletas losa, 80 metros linales de pilotes tipo caisson vaciados en sitio, 72 metros lineales de barandas en concreto resistencia 28 MPa. Igualmente se proyecta la fabricacion e instalacion de 36.500 Kg de estructura metalica en acero estructural A-588 FY=350 MPa. Entre otras actividades de mejoramiento que aparecen consignadas en la propuesta económica.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JUAN 2023 con NIT 901.744.542-1			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL 23 NIT 901.737.077-9		
INTEGRANTES:	RHINO INFRAESTRUCTURE S.A.S NIT 900.837.886 participacion 30%, PEZZOTTI ING S.A.S NIT 901.228.129 participacion 60%, INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S NIT 901.035.720 participacion 10%.			INTEGRANTES:	INGENIERIA Y CONSULTORIA GHE S.A.S NIT 901.647.575-9 con participacion 10% y JOSE MANUEL GUARDO POLO C.C. 9.063.517 con participacion de 90%.		
CONTRATO No.	OP-001-2023	VALOR INICIAL:	$ 3.598.806.270,84	CONTRATO No.	2930 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 1.899.999.999,00
FECHA DE INICIO:	3/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	2/03/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.598.806.270,84	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1.899.999.999,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	12/06/2024	VALOR ANTICIPO	$ 1.079.641.881,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ 798.319.327,50
FECHA INICIAL DE PRORROGA No2	13/06/2024	VALOR AMORTIZADO	$ 782.410.674,70	FECHA DE VENCIMIENTO FINAL	31/10/2024	VALOR AMORTIZADO	$ 606.585.183,00
FECHA DE VENCIMIENTO PRORROGA No2	12/09/2024	ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ 297.231.206,52			ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ 191.734.144,50

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 3.600.000.000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 979.452.945			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.620.547.055			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.899.999.999,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.447.046.583			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 452.953.416,00			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 3.277.275.928,84**	**91,07%**
OTRAS INVERSIONES	**$ 321.550.342,00**	**8,93%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 3.598.826.270,84**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	**$ 3.598.826.270,84**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	**$ 3.582.513.996,33**	**99,55%**
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (16.302.309,69)	-0,45%
OTRAS INVERSIONES PROGRAMADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 321.550.341,91	8,93%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 321.550.341,91	9,81%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.598.816.306,22	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.582.513.996,33	99,55%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (16.302.309,69)	-0,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 102.206.666,09	2,84%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 28.313.171,25	0,79%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:	ABRIL	JUNIO	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL PERIODOS FACTURADOO
VALOR FACTURA:	**$ 685.617.061,17**	**$ 473.371.156,83**	**$ 666.636.689,10**	**$ 315.356.580,81**	**$ 133.138.487,88**	**$ 2.274.119.975,79**

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.754.127.299,36	92,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.754.127.299,36	92,32%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 27.285.121,82	1,44%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 27.285.121,82	1,44%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:	28/08/2024
PERIODO FACTURADO:	JULIO DE 2024
VALOR FACTURA:	$ 118.217.804,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado	**$ 1.079.641.881,00**
Amortizado	**$ 971.677.693,10**
Saldo	**$ 107.964.187,90**

INDICADOR I/C	
En el mes:	5,85
Acumulado:	2,52

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 798.319.327,50
Amortizado $	$ 606.585.183,00
Saldo $	$ 191.734.144,50

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 100% — Avance o Atraso Físico % 0,45%

Meta Física Ejecutada % 99,55%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Global	1			Prog	1				3,47%
					Ejec	1				2,43%
* Desmonte y limpieza	ha	1			Prog	1				0,03%
					Ejec	1				0,03%
* Demolición de Estructuras	m3	10			Prog	10				0,03%
					Ejec	10				0,03%
* Excavación en roca de la explaneación	m3	120			Prog	-				-
					Ejec	-				
* Excavación en material común de la explaneación y canales	m3	800			Prog	2.643,63				1,24%
					Ejec	2.505,82				1,17%
Terraplanes	m3	850			Prog	850,6				0,41%
					Ejec	500				0,24%
Subbase granular clase c	m3	75			Prog	75				0,69%
					Ejec					
Relleno para estructuras con suelo	m3	250			Prog	734,23				2,11%
					Ejec	4,8				0,654%
Prueba de carga tipo	U	1			Prog	1				2,09%
					Ejec	1				2,09%
* Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28mpa	m	80			Prog	67,50				5,10%
					Ejec	67,50				5,10%
* Concreto resistencia 28MPA-para zapata, estribos, aletas	m3	295			Prog	295				9,27%
					Ejec	173,64				5,46%
* Concreto resistencia 14MPA (F)	m3	25			Prog	25				0,48%
					Ejec	13,618				0,26%
* Concreto resistencia 14MPA ciclópeo	m3	80			Prog	80				1,31%
					Ejec	52,2				0,85%
Baranda de concreto de 28 MPA	m	72			Prog	-				-
					Ejec					
* Acero de refuerzo fy 4200 MPA	kg	28500			Prog	36.322,47				9,17%
					Ejec	29.877,22				7,54%
* Malla de refuerzo fy 4200 mpa	Kg	3800			Prog	-				-
					Ejec					
Apoyo elastomerico reforzado	m	4			Prog	4				0,12%
					Ejec					
Sello para juntas de puentes-cinta	m	46			Prog	46				0,09%
					Ejec					
Sello para juntas de puentes-sello de compresion	m	22			Prog	22				1,22%
					Ejec	9,24				0,51%
* Fabricacion de estructura metalica en acero estructural A-588 fy= 350 mpa	kg	36500			Prog	38.030,00				17,93%
					Ejec	38.030,00				17,93%
* Pendolones de acero estructural a 588 grado B	kg	10600			Prog	10.600,00				5,88%
					Ejec	9.481,47				5,262%
* Transporte de estructura metalica	kg	47000			Prog	49.259,62				1,67%
					Ejec	49.259,62				1,67%
Montaje y pintura de estructura metalica	Kg	47100			Prog	47.100,00				7,27%
					Ejec	47.100,00				7,27%
* Baranda metalica en acero A36	kg	4464			Prog	4.464,00				1,57%
					Ejec	4.464,00				1,572%
* Geotextil tipo tejido con resistencia a la tencion grab minima de 1400 m	m2	250			Prog	-				-
					Ejec					
* Material granular drenante	m3	75			Prog	75				0,55%
					Ejec					
Material de cobertura tipo sub-Base clase c sbg-50	m3	60			Prog	60				0,49%
					Ejec					
* Geotextil de refuerzo tipo para muros de tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2	850			Prog	850				0,34%
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de concreto de dos bultos diesel 10 HP 3600 RPM	1	2
Compresor de aire 40kw 50 HP 0.7MPa-1.0MPa motor Diesel	1	5
Equipo de soldadura	1	3
Pulidora		
Planta Electrica	1	1
Retroexcavadora de Orugas	1	1
Retrocargador de llantas		
Teleferico	1	1

	Relleno tipo para muros de tierra estabilizada mecanicamente estabilizada con geosinteticos	m3	215			Prog	215				0,69%
						Ejec	120				0,382%
*	Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explaneacion, canales y prestamos para distancias mayores de 1000 metros (1.000m9 medida a partir de cien metros (100 m)	m3/km	42500			Prog	-				-
						Ejec					
	Provisión para Obras Complementarias y Adicionales	Global	1			Prog	21,30%				21,30%
						Ejec	0,97%				20,33%

Total	**6**	**13**

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o

TRAMO Y/O SECTOR 1: .....
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....
TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO		
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO		
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES: La Interventoría envía observaciones del PAGA el día 14 de febrero de 2024. A la fecha el Contratista no ha subsanado las observaciones.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	22	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 22

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA

El día 5 de septiembre de 2024 siendo las 2 pm se realizó reunión técnica de obra vía virtual con la participación del Invías Bogotá Supervisora del Proyecto Ing. Claudia López, Invías Regional Antioquia Supervisión de Apoyo el Ing. Luis Montoya, Ing. Municipio de San Juan de Urabá el Dr. Jorge Lozano, Contratista de Obra Consorcio San Juan 2023 RL Ing. Juan Guillermo Giraldo Pizzotte, Ing. Lorena Sarria y la Interventoría Consorcio Vial 23 Director Ing. Edgar Polo y la Residente Ing. Claudeth Incer, Ing. Ambiental Jorge Atencio, Social Jahira Gómez, Siso Tatiana Valenzuela. El día 9 de septiembre se hizo en obra visita previa con la participación de la Interventoría de la residente Ing. Claudeth Incer y el Contratista de Obra RL Ing. Juan Guillermo Giraldo Pizzotti para recibir la primera y entragar el segundo las actividades que se derivan del contrato de Obra y las actividades faltantes por ejecutar que se ejecutaran en la proxima semana para llegar al 100 % del Valor del Contrato.

ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA

En la presente semana el contratista de obra Consorcio San Juan 2023 RL Ing. Juan Guillermo Giraldo Pezzotti relizó las siguientes actividades:
1.Aproche Vía San Juan de Urabá
1.1. Humedecimiento con agua de la placa de concreto cumpliendo con el curado del concreto
1.2 Encofrado y fundidada de concreto de 28 Mpal en bordillos
2.Aproche vía Siete Vueltas
2.1 .Relleno con material de suelo hemedecido con agua y compactado con canguro y rana
2.2. Refuerzo con varillas de ecaro de 5/8" y con estrivos de 3/8" para vigas tensoras
2.3 Terraplen en material de suelo compactado para el empalme de la placa de concreto del aproche con la placa huella
3. Obras Complementarias
3.1 Construcción de muro de bolsacreto margen Izaquierda del Río aguas arriba con volumen 22 M3
4. Llenos con material de suelo compactado en los espaldares de los muros de bolsacretos margen Izaquierda del Río aguas arriba
5.Baranda metalica longitud de 2 M sobre los muros de los aproches Vía San Juan y Siete Vueltas.

ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA
La Intervntoría en la presente semana realizó toma de 5 densidades en la aproximación o aproche vía a Siete Vueltas

IX ACTIVIDADES DE LA PROXIMA SEMANA

Para la proxima semana el contratista de obra Consorcio San Juan 2023 RL Ing. Juan Guillermo Giraldo Pezzotti continura con las siguientes actividades:
1 Obras Complementarias
1.1 Construcción de muro de bolsacreto margen Izaquierda del Río aguas arriba
1.2 Enmasillado y pulida, pintura anticorrosiva y pintura de esmalte de Baranda metalica longitud de 2 M sobre los muros de los bordillos del las aproximaciones o aproches Vía San Juan y Siete Vueltas.
1.3 Llenos con material de suelo compactado en los espaldares de los muros de bolsacretos margen Izaquierda del Río aguas arriba
1.4 Continución con del terraplen en material seleccionado del aproche vía Siete Vueltas a la placa huella


X AVANCE DE OBRA

1.AVANCE DE OBRA

La Interventoría Informa que el Proyecto presenta un avance programado acumulado del 100% versus avance ejecutado acumulado del 99,55% con el 0,45% de atraso de avance ejecutado acumulado. Faltando por ejecutar el 0,45 % del proyecto.

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

AVANCE DE OBRA Y/O ATRASOS (Corte al 12 de septiembre de 2024)		
	Semana Anterior	Semana Actual
Avance Programado Acumulado (%):	**97,16%**	**100,00%**
Avance Ejecutado Acumulado (%):	**98,76%**	**99,55%**
Desviación %	1,60%	**-0,45%**



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA PREVIA



UBICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN MURO DE BOLSACRETO MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO AGUAS ARRIBA



HUMEDECIMIENTO CON AGUA DE PLACA DE CONCRETO Y ENCOFRADO DE BORDILLO Y FUNDIDA EN CONCRETO DE 28 MPA EN LOS MUROS DEL APROCHE VÍA SIETE VUELTAS



DEMARCACIÓN DE LA LINEA CENTRAL COLOR AMARILLA DEL PUENTE



CONFORMACIÓN DEL TERRAPLAN APROCHE VIA SIETE VUELTAS CON LA PLACA HUELLA



BARANDA METALICA LONGITUD DE 2 M A CADA LADO SOBRE LOS MUROS DE LOS APROCHES VÍA SAN JUAN



BARANDA METALICA LONGITUD DE 2 M A CADA LADO SOBRE LOS MUROS DEL APROCHES VIA SIETE VUELTAS

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES DE LA PRESENTE SEMANA



PANORÁMICA DEL PUENTE



BORDILLOS EN CONCRETO DE 28MPA APROCHE VÍA SAN JUAN DE URABÁ



CONSTRUCCIÓN MURO DE BOLSACRETO MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO AGUAS ARRIBA




PASAMANOS METÁLICOS EN AMOS LADOS DE LOS BORDILLOS DEL APROCHE VÍA SAN JUAN CON UNA LONGITUD DE 2 M EN AMBOS LADOS.



INICIO DE LA CONFORMACIÓN DEL TERRAPLAN APROCHE VIA SIETE VUELTAS CON LA PLACA HUELLA




ENCOFRADO Y FUNDIDA DE LOS BORDILLOS EN CONCRETO DE 28 MPA APROCHE VÍA SIETE VUELTAS.

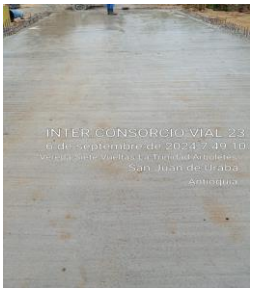

HUMEDECIMIENTO CON AGUA DE LA PLACA DEL APROCHE VIA SAN JUAN CUMPLIENDO CON EL CURADO DEL CONCRETO



TOMA DE DENSIDADES DE LA INTAREVENTORIA APROCHE VIA SIETE VUELTAS No.1 DE LAS 5 MUESTRAS TOMADAS

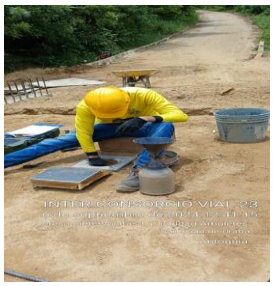

TOMA DE DENSIDADES DE LA INTERVENTORIA APROCHE VIA SIETE VUELTAS No.4 DE LAS 5 MUESTRAS TOMADAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Se celebrará comité de obra semanal, para el seguimiento del avance respectivo de ejecución de obra, y entrega total de los documentos solicitados iniciales del proyecto, además de las respuestas a las observaciones solicitadas a la Revisión /y o Ajustes a diseños.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: EDGAR EDUARDO POLO RODRIGUEZ
Matrícula Profesional No.: 08202-54653 ATL
