| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE REUNIÓN** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 12/09/2024
(Día / Mes / Año)

**(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)**

ACTA DE REUNIÓN No. 2
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

**CONTRATO DE OBRA No.** OP-001-2023
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN JUAN 2023

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la vía corregimiento de siete vueltas y sus veredas en el Municipio de San Juan de Urabá -Departamento de Antioquia-Programa Rural."

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 2930 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL 23

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

SEGUIMIENTO AL AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO 0P 001 - 2023

**TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN**

1.Verificación Compromisos de reunión anterior
2.Informe de Avance del Proyecto
3.Actividades Tecnicas de Obra
3.1.Actividades de la Presente Semana
3.2.Actividades para la próxima Semana
4.Observaciónes
5.Compromisos
6.Compromisos pactados

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

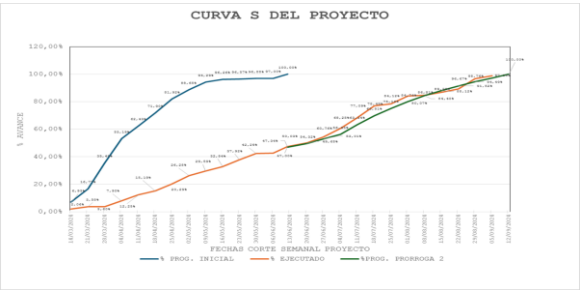
**1.VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS REUNIÓN ANTERIOR**

En el acta de reunión anterior de 5 de septiembre de 2024
1.El Contrstita de Obra se compromete a tomar las densidades del material de relleno y la sub base en el area del aproche de San Juan de Urabá para la semana del 5 de septiembre de 2024 y enviar los resultados a la interventoría para la aprobación en continuar con el armado del refurzo de la placa de concreto de 28 Mpal, y del aproche vía a Siete Vueltas, éste compromiso fué cumplido en la semana del 12 de septiembre de 2024 2. El Contratista de Obra debe enviarle a la Interventoría los resultados de la prueba de carga documentados en la semana del 12 de septiembre, éste compromiso fue cumplido en la presente semana.
3.El Contratista de Obra debe envíar la caracterización Vial a la Interventoría en la semana del 12 de septiembre, ete compromiso se encuantra en proceso para la semana del 19 de septiembre de 2024

**2.INFORME DE AVANCE DEL PROYETO**

La Interventoría Informa que el Proyecto presenta un avance programado acumulado del 100 % versus avance ejecutado acumulado del 99,55 % con el 0,45% de atraso de avance ejecutado acumulado. Faltando por ejecutar el 0,45% del proyecto.

| (Corte al 12 de septiembre de 2024) | | |
|---|---|---|
| | Semana Anterior | Semana Actual |
| **Avance Programado Acumulado (%):** | **97,16%** | **100,00%** |
| **Avance Ejecutado Acumulado (%):** | **98,76%** | **99,55%** |
| **Desviación (%):** | **1,60%** | **-0,45%** |




**3.ACTIVIDADES TECNICAS DE OBRA**

**3.1. ACTIVIDADES DE LA PRESENTE SEMANA**

En la presente semana el contratista de obra Consorcio San Juan 2023 RL Juan Guillermo Giraldo Pezzotti relizó las siguientes actividades:
3.2.Aproche Vía San Juan de Urabá
3.2.1Humedecimiento con agua de la placa de concreto cumpliendo con el curado del concreto
3.2.2 Encofrado y fundidada de concreto de 28 Mpal en bordillos

3.2.2 Encofrado y fundidada de concreto de 28 Mpal en bordillos
3.3.Aproche vía Siete Vueltas
3.3.1 .Relleno con material de suelo hemedecido con agua y compactado con canguro y rana
3.3.2 Refuerzo con varillas de ecaro de 5/8" y con estrivos de 3/8" para vigas tensoras
3.3.3Terraplen en material de suelo compactado para el empalme de la placa de concreto del aproche con la placa huella
3..4 Obras Complementarias
3.4.1 Construcción de muro de bolsacreto margen Izaquierda del Río aguas arriba con volumen 22 M3
3.4.2. Llenos con material de suelo compactado en los espaldares de los muros de bolsacretos margen Izaquierda del Río aguas arriba
3.4.3.Baranda metalica longitud de 2 M sobre los muros de los aproches Vía San Juan y Siete Vueltas.

**3.2 ACTIVIDADES PARA LA PROXIMA SEMANA**

Para la próxima semana el contratista de obra Consorcio San Juan 2023 RL Ing. Juan Guillermo Giraldo Pezzotti continuará con:
3.2.1 Obras Complementarias
3.2.1.1. Construcción de muro de bolsacreto margen Izaquierda del Río aguas arriba
3.2.2.Enmasillado y pulida, pintura anticorrosiva y pintura de esmalte de Baranda metalica longitud de 2 M sobre los muros de los bordillos del las aproximaciones o aproches Vía San Juan y Siete Vueltas.
3.3 Llenos con material de suelo compactado en los espaldares de los muros de bolsacretos margen Izaquierda del Río aguas arriba
3.3.1 Continución con del terraplen en material seleccionado del aproche vía Siete Vueltas a la placa huella

**4.OBSERVACIONES**

El Director de Interventoría el Ing. Edgar Polo manifiesta que el Contratista de Obra hizo el requerimiento de una prorroga hasta el 25 de septiembre de 2024, la cual fue aprobada por el Municipio de San Juan de Urabá. La supervisora del proyecto Invias Bogotá Ing. Claudia López manifiesta sobre los cierres de los componentes ambientales y sociales; responde el Ambientalista de la Interventoría que el componente ambiental dice que se va a realizar una siembra de planta vetiver y especies frutales nativas de la región como son:(guayaba ,cedro balsa y mango) la Ing. Claudia López también dice que sea prioridad la siembra de ellas para que se peguen y se le haga riego permanente para que se vea la sostenibilidad, el Director de Interventoría pregunta sobre las obras con participación comunitaria cuando se estaría realizando y la inauguración del puente, el Contratista de Obra dice que para la inauguración está programando una fecha para que puedan asistir la Alcaldesa del Municipio, el Gobernador de Antioquia, el Secretario de infraestructura de Antioquia, el Director de Invias Territorial Ing. Mauricio Hoyos, una vez que el Ing. Juan Guillermo tenga la fecha de inauguración la hace llegar a todo se le va hacer llegar al (equipo del Proyecto) y a todas la personalidades en mención. Lugo llegron las Palabras de la supervisora del proyecto Invias Bogotá Ing. Claudia López donde dio palabras de agradecimiento a todo el del equipo de trabajo excelente Contratista de Obra, la Alcaldía con su representante del proyecto el Dr. Jorge Lozano, agradecimientos a la Interventoría RL el Ing. Juan Manuel Guardo, al Director de la Interventoría Ing. Edgar Polo, la Residente Ing. Claudeth Incer y a todo el equipo de la Interventoría por su gran trabajo y compromiso, en la realización del proyecto ya que traerá gran impacto social y desarrollo en la zona donde se construyó el puente.

**5.COMPROMISOS**

5.1. La Ingeniera Claudia López la supervisora del proyecto Invias Bogotá se comprometió, a conseguir que en el día del 13 de septimbre de 2024 a conseguir en el Invias el borrador de la aprobación del traslado de un valor de los recursos del paga a actividades de obras.

| **6.COMPROMISOS PACTADOS** | **FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)** | **RESPONSABLES** |
|---|---|---|
| El Contratista de Obra debe enviarle a la Interventoría los resultados de la prueba de carga documentados en la semana del 12 de septiembre. | **12/09/2024 CUMPLIDO** | **CONTRATISTA** |
| El Contrstita de Obra se compromete a tomar las densidades del material de relleno y la base en el area del aproche Vía a San Juan de Urabá para la semana del 5 de septiembre de 2024 y enviar los resultados a la interventoría para la aprobación y continuar con el armado del refurzo de la placa de concreto de 28 Mpal, este compromiso ya se encuentra en proceso se inicíio el dia 2 de septimebre en espera de los resultados semana del 12 de septiembre. | **12/09/2024 CUMPLIDO** | **CONTRATISTA** |
| El Contratista de Obra debe envíar la caracterización a la Interventoría en la semana del 12 de septiembre, éste compromiso no fue cumplido pero se encuentra en proceso | **19/09/2024 EN PORCESO** | **CONTRATISTA** |
| El Contratista de Obra debe definir el valor de los recursos que se va a trasladar del paga a obra para darle funcionalidad al puente con su terraplen de empalme a la placa huella vía Siete Vueltas y continuar con la construcción de los muros de protección en bolsacreto del lado izquierdo aguas arriba del Río, para proteger el talud adyacente al muro en concreto en la aproximación al puente vía a San Juan de Urabá acta de reunión semana del 29 de agosto de 2024.éste compromiso nu fue cumplido pero se | **19/09/2024 EN PROCESO** | **CONTRATISTA** |

**FECHA PRÓXIMA REUNIÓN** 19/09/2024
(Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.



2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE REUNIÓN** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 12/09/2024

(Día / Mes / Año)

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| LUIS BERNARDO MONTOYA | INGENIERO APOYO A LA SUPERVISIÓN | INVIAS TERRITORIAL | |
| CLAUDIA CECILIA LOPEZ P | INGENIERA SUPERVISORA | INVIAS BOGOTÁ | |
| YIMI | ADMINISTRADORA | CONSORCIO SAN JUAN 2023 | |
| JUAN GUILLERMO GIRALDO PEZZOTTI | REPRESENTANTE LEGAL | CONSORCIO SAN JUAN 2023 |  |
| JUAN MANUEL GUARDO GARCIA | REPRESENTANTE LEGAL | CONSORCIO VIAL 23 |  |
| EDGAR POLO RODRIGUEZ | DIRECTOR INTERVENTORÍA | CONSORCIO VIAL 23 |  |
| CLAUDETH INCER COVO | RESIDENTE INTERVENTORIA | CONSORCIO VIAL 23 |  |
| JORGE LOZANO | SECRETARIO DE PLANEACION | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA | |
| DANIEL SUAREZ | TECNICO OPERATIVO DE SECRATARIA DE OBRAS PUBLICAS | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA | |
| TATIANA VALENZUELA | SISO INTERVENTORIA | CONSORCIO VIAL 23 | |
| JORGE ATENCIO | AMBIENTAL INTERVENTORIA | CONSORCIO VIAL 23 | |
| JAHIRA GOMEZ | SOCIAL INTERVENTORIA | CONSORCIO VIAL 23 | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial
