DATOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN			
Fecha de presentación: 24/12/2024	**Nombre del Contratista**: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S - NIT: 901.205.913-9		**No Contrato**: CONTRATO No. 139 DE 2024
Periodo del informe: 16 DE DICIEMBRE AL 24 DICIEMBRE DE 2024	**Correo electrónico:** proyectosproanincol@gmail.com		

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATISTA			
Nit ó C.C. número	901.205.913-9		
Dirección	CARRERA 7 # 14-61 INTERIOR 1101-BARBOSA SANTANDER		
Telefono	3204778768		
Clase, Tipo y Número de cuenta	AHORROS No. 03000013063 SE AUTORIZA GIRO POR CHEQUE A TERCEPO	Banco	BANCOLOMBIA
Fecha de suscripción	16 DE DICIEMBRE DE 2024	Fecha de inicio	16 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha de Terminación	30 DE DICIEMBRE DE 2024	Plazo (DIAS)	15
Fecha de Terminación Anticipada	N.A		
Valor Inicial del Contrato	$ 242,485,481.00		
Prórrogas	Prórroga 1: 0	Prórroga 2: 0	Prórroga 3: 0
Adiciones	Adición 1: $ 0.00	Adición 2: $ 0.00	Adición 3: $ 0.00
Suspensiones		En dias y/o Meses:	0

AVANCE DEL CONTRATO		
	Financiero:	$ 135,574,156.00
	Tiempo de Ejecución (DIAS):	8
	Porcentaje de cobro en acta parcial No. 01:	55.91%
	Porcentaje de Ejecución en tiempo:	53.33%

ESTADO FINANCIERO		
	Valor inicial total Contrato de obra No. 139-2024, incluido A.I.U.	$ 242,485,481.00
	Adicion No.1	$ -
	Valor total ejecutado del Contrato de obra No.139-2024, incluido A.I.U.	$ 135,574,156.00
	Valor a pagar en letras	CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE. ($ 135.574.156,00 ,00) INCLUIDO A.I.U.
	Periodo a pagar del Contrato	16 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2024
	Valor PAGO No. 1 - Incluido A.I.U.	$ 135,574,156.00
	Saldo del contrato de obra incluido A.I.U.	$ 106,911,325.00
	Valor PAGO No.1 incluido A.I.U.	$ 135,574,156.00

OBSERVACION: El contratista PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S - NIT: 901205913-9, realizará el cobro del acta parcial No. 01 con corte al 24 de diciembre de 2024, correspondientes a **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE. ($ 135.574.156,00 ,00) INCLUIDO A.I.U.** Los pagos se realizarán por los siguientes rubros:

RUBRO: 2.3.2.02.02.009.22.2201.2201052.11
FUENTE: 391-1.2.4.1.03 SGP-EC$ 39.339.707,00
RUBRO: 2.3.2.02.02.009.45.4599.4599008.222
FUENTE: 357-1.2.4.3.04 SGP LD.$ 50.000.000,00
RUBRO: 2.3.2.02.02.009.45.4599.4599008.222
FUENTE: 339-1.2.1.0.00 SGP LCLD$ 46.234.449,00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			Aportes de Seguridad Social
	Póliza No.	30-44-101061337 ANEXO:2	
	Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6		
	Fecha de aprobación:	16 DE DICIEMBRE DE 2024	
	VALOR ASEGURADO TOTAL	$ 121,242,740.50	
	Cumplimiento del contrato (DD-MM-AA)	DESDE 16-12-2024 HASTA 01-05-2025	
	Estabilidad y Calidad de Obra (DD-MM-AA)	DESDE 30-12-2024 HASTA 31-12-2026	
	Pago de salarios prestaciones salarios logales e indemnizaciones laborales (DD-MM-AA)	DESDE 16-12-2024 HASTA 31-12-2027	
	Póliza No.	30-40-101022807 ANEXO:2	
	Fecha de aprobación:	16 DE DICIEMBRE DE 2024	
	VALOR ASEGURADO TOTAL	$ 260,000,000.00	
	Responsabilidad Civil Extracontractual (DD-MM-AA)	DESDE 16-12-2024 HASTA 31-12-2024	
	CDP No. 2024000533	Fecha (DD-MM-AA): 08/11/2024	
	RP No. 2024000715	Fecha (DD-MM-AA): 16/12/2024	

NOTA: SE ADJUNTA CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y REVISORA FISCAL

DOCUMENTO SOPORTES ADMINISTRATIVOS	
	1. Acta de Inicio 2. Factura 3. RUT 4. Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL cuando aplique) y Certificación 5. Informe de actividades del contratista de obra, por acta parcial No. 01 6. Acta de pago parcial No. 01

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
	El Supervisor hace constar que el CONTRATISTA cumplió con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato de obra, previa constitución, junto con el cronograma de actividades y su ejecución. Así mismo certifico que el CONTRATISTA cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que esta obligado a aportar de acuerdo con la certificación aportada. Con el presente informe se avala el pago total correspondiente a la suma de **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE. ($ 135.574.156,00 ,00) INCLUIDO A.I.U.**

OBSERVACIONES	
	El Contratista ha cumplido con los requisitos establecidos en el Contrato de obra No.139 de 2024

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Firma SUPERVISOR

Nombre: KARENT DAYANA PINZON

Cargo: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS

DATOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha de presentación: 24/12/2024	**Nombre del Contratista**: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S - NIT: 901.205.913-9	No Contrato: CONTRATO No. 139 DE 2024
Periodo del informe: 16 DE DICIEMBRE AL 24 DICIEMBRE DE 2024	**Correo electrónico:** proyectosproanincol@gmail.com	

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATISTA

Nit ó C.C. número	901.205.913-9		
Dirección	CARRERA 7 # 14-61 INTERIOR 1101-BARBOSA SANTANDER		
Teléfono	3204778768		
Clase, Tipo y Número de cuenta	AHORROS No. 03000013063 SE AUTORIZA GIRO POR CHEQUE A TERCERO	**Banco**	BANCOLOMBIA
Fecha de suscripción	16 DE DICIEMBRE DE 2024	**Fecha de inicio**	16 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha de Terminación	30 DE DICIEMBRE DE 2024	**Plazo (DIAS)**	15
Fecha de Terminación Anticipada	N.A.		
Valor Inicial del Contrato	$ 242,485,481.00		

Prórrogas	**Prórroga 1**	**Prórroga 2**	**Prórroga 3**
	0	0	0
Adiciones	**Adición 1**	**Adición 2**	**Adición 3**
	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Suspensiones		**En dias y/o Meses:**	0

AVANCE DEL CONTRATO	**Financiero:**	$ 135,574,156.00
	Tiempo de Ejecución (DIAS):	8
	Porcentaje de cobro en acta parcial No. 01:	55.91%
	Porcentaje de Ejecución en tiempo:	53.33%

ESTADO FINANCIERO	**Valor inicial total Contrato de obra No. 139-2024, incluido A.I.U.**		$ 242,485,481.00
	Adicion No.1		$ -
	Valor total ejecutado del Contrato de obra No.139-2024, incluido A.I.U.		$ 135,574,156.00
	Valor a pagar en letras	**CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE. ($ 135.574.156,00 ,00) INCLUIDO A.I.U.**	
	Periodo a pagar del Contrato		16 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2024
	Valor PAGO No. 1 - Incluido A.I.U.		$ 135,574,156.00
	Saldo del contrato de obra incluido A.I.U.		$ 106,911,325.00
	Valor PAGO No.1 incluido A.I.U.		$ 135,574,156.00

OBSERVACION: El contratista PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S - NIT: 901205913-9, realizará el cobro del acta parcial No. 01 con corte al 24 de diciembre de 2024, correspondientes a **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE. ($ 135.574.156,00 ,00) INCLUIDO A.I.U.** Los pagos se realizarán por los siguientes rubros:

RUBRO: 2.3.2.02.02.009.22.2201.2201052.11
FUENTE: 391-1.2.4.1.03 SGP-EC$ 39.339.707,00
RUBRO: 2.3.2.02.02.009.45.4599.4599008.222
FUENTE: 357-1.2.4.3.04 SGP LD $ 50.000.000,00
RUBRO: 2.3.2.02.02.009 45.4599 4599008.222
FUENTE: 339-1.2.1.0.00 SGP LCLD$ 46.234.449,00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	**Póliza No.**	30-44-101061337 ANEXO:2	**Aportes de Seguridad Social**
	Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6		NOTA: SE ADJUNTA CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y REVISORA FISCAL
	Fecha de aprobación:	16 DE DICIEMBRE DE 2024	
	VALOR ASEGURADO TOTAL	$ 121,242,740.50	
	Cumplimiento del contrato (DD-MM-AA)	DESDE 16-12-2024 HASTA 01-05-2025	
	Estabilidad y Calidad de Obra (DD-MM-AA)	DESDE 30-12-2024 HASTA 31-12-2026	
	Pago de salarios prestaciones salarios legales e indemnizaciones laborales (DD-MM-AA)	DESDE 16-12-2024 HASTA 31-12-2027	
	Póliza No.	30-40-101022807 ANEXO:2	
	Fecha de aprobación:	16 DE DICIEMBRE DE 2024	
	VALOR ASEGURADO TOTAL	$ 260,000,000.00	
	Responsabilidad Civil Extracontractual (DD-MM-AA)	DESDE 16-12-2024 HASTA 31-12-2024	
	CDP No. 2024000533	Fecha (DD-MM-AA): 08/11/2024	
	RP No. 2024000715	Fecha (DD-MM-AA): 16/12/2024	

DOCUMENTO SOPORTES ADMINISTRATIVOS	1. Acta de Inicio 2. Factura 3. RUT 4. Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL cuando aplique) y Certificación 5. Informe de actividades del contratista de obra, por acta parcial No. 01 6. Acta de pago parcial No. 01
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	El Supervisor hace constar que el CONTRATISTA cumplió con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato de obra, previa constitución, junto con el cronograma de actividades y su ejecución. Asi mismo certifico que el CONTRATISTA cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que esta obligado a aportar de acuerdo con la certificación aportada. Con el presente informe se avala el pago total correspondiente a la suma de **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE. ($ 135.574.156,00 ,00) INCLUIDO A.I.U.**
OBSERVACIONES	El Contratista ha cumplido con los requisitos establecidos en el Contrato de obra No.139 de 2024

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Firma SUPERVISOR	
Nombre	KAREN DAYANA PINZON
Cargo	OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

ACTA DE PAGO No.01
CONTRATO DE OBRA No. 139-2024

CONTRATO DE OBRA No.	139 - 2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO BARBOSA - SANTANDER
CONTRATISTA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S. NIT: 901.205.913-9
SUPERVISOR	OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
OBJETO	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE. ($ 242.485.481,00)
PLAZO	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:	CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE. ($ 135.574.156,00 ,00) INCLUIDO A.I.U. Los pagos se realizarán por los siguientes rubros:

RUBRO: 2.3.2.02.02.009.22.2201.2201052.11 FUENTE: 391-1.2.4.1.03 SGP-EC	$ 39.339.707,00
RUBRO: 2.3.2.02.02.009.45.4599.4599008.222 FUENTE: 357-1.2.4.3.04 SGP LD.	$ 50.000.000,00
RUBRO: 2.3.2.02.02.009.45.4599.4599008.222 FUENTE: 339-1.2.1.0.00 SGP LCLD	$ 46.234.449,00

PERIODO DE COBRO	16 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2024

En Barbosa Santander, a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre de 2024, en las instalaciones de la OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS se reunieron, MARCO ALIRIO CORTES TORRES, en calidad de Alcalde Municipal, KARENT DAYANA PINZON, en calidad de Supervisora del CONTRATO DE OBRA No. 139-2024, y el señor RONALD FABIAN ARDILA TELLEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 91.517.375, Representante Legal de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S., con NIT: 901.205.913-9, con el fin de aprobar el valor del ACTA DE PAGO PARCIAL No.01 del CONTRATO DE OBRA No. 139-2024.

EL ALCALDE MUNICIPAL

MARCO ALIRIO CORTES TORRES
ALCALDE MUNICIPAL

LA SUPERVISORA	EL CONTRATISTA
KARENT DAYANA PINZON PARDO OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S.** NIT 901.205.913-9 R.L. RONALD FABIAN ARDILA TELLEZ

ACTA DE PAGO No.01
CONTRATO DE OBRA No. 139-2024

CONTRATO DE OBRA No.	139 - 2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO BARBOSA - SANTANDER
CONTRATISTA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S. NIT: 901.205.913-9
SUPERVISOR	OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
OBJETO	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE. ($ 242.485.481,00)
PLAZO	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:	CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE. ($ 135.574.156,00 ,00) INCLUIDO A.I.U. Los pagos se realizarán por los siguientes rubros:

RUBRO: 2.3.2.02.02.009.22.2201.2201052.11 FUENTE: 391-1.2.4.1.03 SGP-EC	$ 39.339.707,00
RUBRO: 2.3.2.02.02.009.45.4599.4599008.222 FUENTE: 357-1.2.4.3.04 SGP LD.	$ 50.000.000,00
RUBRO: 2.3.2.02.02.009.45.4599.4599008.222 FUENTE: 339-1.2.1.0.00 SGP LCLD	$ 46.234.449,00

PERIODO DE COBRO	16 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2024

En Barbosa Santander, a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre de 2024, en las instalaciones de la OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS se reunieron, MARCO ALÍRIO CORTES TORRES, en calidad de Alcalde Municipal, KARENT DAYANA PINZON, en calidad de Supervisora del CONTRATO DE OBRA No. 139-2024, y el señor RONALD FABIAN ARDILA TELLEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 91.517.375, Representante Legal de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S., con NIT: 901.205.913-9, con el fin de aprobar el valor del ACTA DE PAGO PARCIAL No.01 del CONTRATO DE OBRA No. 139-2024.

EL ALCALDE MUNICIPAL

MARCO ALIRIO CORTES TORRES
ALCALDE MUNICIPAL

LA SUPERVISORA	EL CONTRATISTA
KARENT DAYANA PINZON PARDO OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S.** NIT 901.205.913-9 R.L. RONALD FABIAN ARDILA TELLEZ

Barbosa Santander, diciembre 24 de 2024

Señores
MUNICIPIO BARBOSA SANTANDER
OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISION
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 139 de 2024 CUYO OBJETO ES *"REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER"*

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE INFORME PARCIAL No. 01 DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO No. 139 -2024.

Cordial saludo

El suscrito PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S., actuando en calidad de Contratista, a continuación, se presenta el informe parcial No. 01 de las actividades ejecutadas para su respectiva ACTA DE PAGO No. 1

INFORME PARCIAL DE EJECUCION – CONTRATO No. 139-2024

"REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER"

INFORME PARCIAL No. 01 DEL CONTRATISTA
PERIODO: 16 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO No. 139 DE 2024
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S.
NIT: 901.205.913-9

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO DE OBRA No. 139-2024	
1. DATOS GENERALES	
CONTRATO No.	139 DE 2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER
CONTRATISTA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S. NIT: 901.205.913-9 REPRESENTANTE LEGAL: ARDILA TELLEZ RONALD FABIAN CC: 91.517.375 DIRECCIÓN: CARRERA 7 # 14-61 INTERIOR 1101-BARBOSA SANTANDER CELULAR: 3204778768 EMAIL: proyectosproanincol@gmail.com
SUPERVISIÓN	OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
OBJETO	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE. ($ 242.485.481,00) INCLUIDO A.I.U.
PLAZO	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR EJECUTADO PARCIALMENTE DEL CONTRATO	CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE. ($ 135.574.156,00 ,00) INCLUIDO A.I.U.
VALOR POR EJECUTAR	CIENTO SEIS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTI CINCO PESOS MCTE. ($ 106.911.325,00 ,00) INCLUIDO A.I.U.

1. CUADRO GENERAL DE PRESUPUESTO DE OBRA DE EJECUCION – ACTA PARCIAL No. 01


ACTA PARCIAL No. 01

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUB TOTAL	CANTIDAD ACTA PARCIAL No. 01	VR. ACTA PARCIAL No. 01
1	**CAPITULO 1 - ADECUACIONES C.I.C.**				**$ 21.490.016,00**		
1.1	NIVELACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	280,00	$ 4.525,00	$ 1.267.000,00	0,00	$ -
1.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	140,00	$ 53.200,00	$ 7.448.000,00	0,00	$ -
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO PVC 6".	ML	70,00	$ 73.844,00	$ 5.169.080,00	0,00	$ -
1.4	RELLENO COMPACTADO EN MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION	M3	63,00	$ 73.844,00	$ 4.652.172,00	0,00	$ -
1.5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN LADRILLO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO.	UND	4,00	$ 738.441,00	$ 2.953.764,00	0,00	$ -
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. SUB TOTAL**	**CANTIDAD ACTA PARCIAL No. 01**	
2	**CAPITULO 2 - CASAS FISCALES**				**$ 36.895.705,00**		
2.1	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTAS (TEJA DE FIBROCEMENTO)	M2	80,00	$ 14.277,00	$ 1.142.160,00	80,00	$ 1.142.160,00
2.2	DESMONTE Y RETIRO DE PUERTA	UND	1,00	$ 49.229,00	$ 49.229,00	1,00	$ 49.229,00
2.3	DEMOLICION Y RETIRO DE ENCHAPES DE PISO	M2	50,00	$ 14.769,00	$ 738.450,00	50,00	$ 738.450,00
2.4	LIMPIEZA Y DESMONTE DE ZONA VERDE POSTERIOR (INCLUYE CORTE Y RETIRO DE ARBOLES)	UND	2,00	$ 246.147,00	$ 492.294,00	2,00	$ 492.294,00
2.5	MANTENIMIENTO GENERAL DE BAÑOS INCLUYE CAMBIO DE ENCHAPES Y ARREGLO DE APARATOS SANITARIOS	UND	5,00	$ 639.982,00	$ 3.199.910,00	5,00	$ 3.199.910,00
2.6	MANTENIMIENTO DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, (INCLUYE RESANES, ESTUCO Y PINTUTA TIPO LAVABLE TIPO I COLOR BLANCO - 2 MANOS)	M2	720,00	$ 29.903,00	$ 21.530.160,00	720,00	$ 21.530.160,00
2.7	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS	ML	50,00	$ 14.769,00	$ 738.450,00	50,00	$ 738.450,00
2.8	FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METÁLICA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, INCLUYE REFUERZO METALICO EN ANGULO DE 1" X 1/4, CON DESDOBLE DE 60 CMS.	ML	14,00	$ 63.998,00	$ 895.972,00	14,00	$ 895.972,00
2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VENTANA METALICA	M2	2,00	$ 162.457,00	$ 324.914,00	2,00	$ 324.914,00
2.10	MANTENIMIENTO DE MUROS EN MUROS DE FACHADA. (LAVADO CON HIDROLAVADORA)	M2	18,00	$ 17.230,00	$ 310.140,00	18,00	$ 310.140,00
2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	70,00	$ 47.556,00	$ 3.328.920,00	70,00	$ 3.328.920,00
2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLASTICA No. 6	M2	10,00	$ 52.675,00	$ 526.750,00	10,00	$ 526.750,00
2.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA EN CERAMICA	M2	10,00	$ 86.151,00	$ 861.510,00	10,00	$ 861.510,00
2.14	MANTENIMIENTO DE COCINA (INCLUYE CAMBIO DE ENCHAPES DETERIORADOS, CAMBIO DE GRIFERIA)	UND	2,00	$ 147.688,00	$ 295.376,00	2,00	$ 295.376,00
2.15	MANTENIMIENTO GENERAL DE REDES ELECTRICAS (INCLUYE CAMBIO O REPOSICION DE ACCESORIOS (APAGADORES O INTERRUPTORES O PLAFONES Y BOMBILLOS, REPOSICIÓN DE CABLEADO EN MAL ESTADO Y CAMBIO DE TACOS ELECTRICOS)	GLB	2,00	$ 1.230.735,00	$ 2.461.470,00	2,00	$ 2.461.470,00
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. SUB TOTAL**	**CANTIDAD ACTA PARCIAL No. 01**	
3	**CAPITULO 3 - ANTIGUA ALCALDIA MUNICIPAL**				**$ 40.543.416,00**		
3.1	DEMOLICION Y RETIRO DE ENCHAPES DE PISO	M2	68,00	$ 14.769,00	$ 1.004.292,00	0,00	$ -
3.2	DEMOLICION Y RETIRO DE PISOS EN CONCRETO	M2	96,30	$ 16.738,00	$ 1.611.869,00	0,00	$ -
3.3	DEMOLICION Y RETIRO DE CONCRETO CICLOPEO	M2	1,00	$ 18.707,00	$ 18.707,00	0,00	$ -
3.4	DEMOLICION Y RETIRO DE TANQUE DE 1000 LTS.	UND	1,00	$ 59.075,00	$ 59.075,00	0,00	$ -
3.5	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS	UND	4,00	$ 24.615,00	$ 98.460,00	0,00	$ -
3.6	REGATAS EN MUROS DE BLOQUE - INCLUYE RETIRO	ML	26,00	$ 4.923,00	$ 127.998,00	0,00	$ -
3.7	REGATAS EN MUROS DE LADRILLO - INCLUYE RETIRO	ML	19,00	$ 7.384,00	$ 140.296,00	0,00	$ -
3.8	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	0,60	$ 53.200,00	$ 32.175,00	0,00	$ -
3.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO PVC 1/2"	ML	21,00	$ 20.676,00	$ 434.196,00	0,00	$ -
3.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO PVC 3"	ML	36,00	$ 31.817,00	$ 1.145.412,00	0,00	$ -
3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO PVC 4"	ML	1,00	$ 34.461,00	$ 34.461,00	0,00	$ -
3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO PVC 3" PARA BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS - INCLUYE ABRAZADERAS Y FIJACION A MURO	ML	9,00	$ 34.461,00	$ 310.149,00	0,00	$ -
3.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA ARAÑAS EN BAÑOS	UND	1,00	$ 118.151,00	$ 118.151,00	0,00	$ -
3.14	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN LADRILLO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO.	UN	5,00	$ 738.441,00	$ 3.692.205,00	0,00	$ -
3.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFONES DE 2"	UN	4,00	$ 31.507,00	$ 126.028,00	0,00	$ -
3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFONES DE 3"	UN	7,00	$ 34.461,00	$ 241.227,00	0,00	$ -
3.17	SALIDA PARA PUNTO DE AGUA DE 1/2"	UN	2,00	$ 31.957,00	$ 63.914,00	0,00	$ -
3.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIO (INCLUYE ACCESORIOS DE PARED)	UN	5,00	$ 738.441,00	$ 3.692.205,00	0,00	$ -
3.19	CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,60	$ 1.235.234,00	$ 1.976.374,00	0,00	$ -
3.20	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	112,00	$ 12.440,00	$ 1.393.280,00	0,00	$ -
3.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCE METÁLICO CALIBRE 18	ML	8,00	$ 17.723,00	$ 141.784,00	0,00	$ -
3.22	FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METÁLICA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, INCLUYE REFUERZO METALICO EN ANGULO DE 1" X 1/4, CON DESDOBLE DE 80 CMS.	ML	30,00	$ 83.690,00	$ 2.510.700,00	0,00	$ -
3.23	MARCO VENTANA EN MADERA - INCLUYE VIDRIO DE 5MM.	M2	2,85	$ 95.997,00	$ 273.591,00	0,00	$ -
3.24	MANTENIMIENTO DE MARCO DE VENTANA EN MADERA	M2	4,00	$ 61.340,00	$ 245.360,00	0,00	$ -
3.25	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	56,00	$ 39.828,00	$ 2.230.368,00	0,00	$ -
3.26	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	10,00	$ 44.996,00	$ 449.960,00	10,00	$ 449.960,00
3.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACION	M2	117,00	$ 13.292,00	$ 1.555.164,00	0,00	$ -
3.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO	M2	150,00	$ 15.753,00	$ 2.362.950,00	100,00	$ 1.575.300,00
3.29	PINTURA TIPO ESMALTE ANTI HONGO	M2	80,00	$ 36.676,00	$ 2.934.080,00	80,00	$ 2.934.080,00
3.30	PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	M2	535,00	$ 21.169,00	$ 11.325.415,00	535,00	$ 11.325.415,00
3.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA EN CERAMICA	M2	2,00	$ 96.785,00	$ 193.570,00	0,00	$ -
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. SUB TOTAL**	**CANTIDAD ACTA PARCIAL No. 01**	
4	**CAPITULO 4 - ESCUELA FRANCISCO DE PAULA S.**				**$ 41.280.884,00**		
4.1	DEMOLICION, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	6,00	$ 93.536,00	$ 561.216,00	0,00	$ -
4.2	DEMOLICION, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS (KIOSKO)	M2	25,00	$ 93.536,00	$ 2.338.400,00	0,00	$ -
4.4	CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA TAPA DE ALCANTARILLA	M3	0,60	$ 1.235.233,00	$ 741.140,00	0,00	$ -
4.5	CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	7,31	$ 1.235.234,00	$ 9.027.090,00	4,92	$ 6.077.351,00
4.6	CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA RAMPA	M2	3,00	$ 162.457,00	$ 487.371,00	0,00	$ -
4.7	CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA PISO	M2	25,00	$ 162.457,00	$ 4.061.425,00	0,00	$ -
4.8	CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA PLACA	M2	86,00	$ 182.149,00	$ 15.664.814,00	0,00	$ -
4.9	CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN PARA COLUMNAS Y VIGAS EN KIOSKO INCLUYE ACABADO RUSTICO, INCLUYE REFUERZO EN VARILLA CORRUGADA DE 1/2".	ML	25,00	$ 73.844,00	$ 1.846.100,00	0,00	$ -
4.10	MURO EN BLOQUE No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO 1:3)	M2	20,00	$ 67.444,00	$ 1.348.880,00	0,00	$ -
4.11	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO VISTA TIPO STA FE O SIMILAR (INCLUYE MORTERO TIPO 1:4)	M2	16,00	$ 155.073,00	$ 2.481.168,00	6,00	$ 930.438,00
4.12	FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON DE ACCESO	M2	6,00	$ 147.688,00	$ 886.128,00	0,00	$ -
4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA ESLABONADA, INCLUYE MARCO O REFUERZO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" Y REFUERZO EN ANGULO METALICO Y PLATINA, CON TAPAS PLASTICAS	M2	2,00	$ 118.601,00	$ 237.202,00	2,00	$ 237.202,00
4.14	FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METÁLICA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, INCLUYE REFUERZO METALICO EN ANGULO DE 1" X 1/4, CON DESDOBLE DE 60 CMS.	ML	25,00	$ 63.998,00	$ 1.599.950,00	0,00	$ -
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. SUB TOTAL**	**CANTIDAD ACTA PARCIAL No. 01**	
5	**CAPITULO 5 - INSCOMERCIO**				**$ 22.113.000,00**		
5.1	FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA EN PERFIL TIPO CAJON DE 40MM X 80MM CALIBRE 18, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA TIPO ESMALTE.	ML	273,00	$ 81.000,00	$ 22.113.000,00	273,00	$ 22.113.000,00
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. SUB TOTAL**	**CANTIDAD ACTA PARCIAL No. 01**	
6	**CAPITULO 6 - AIRE ACONDICIONADO**				**$ 18.636.293,00**		
6.1	DEMOLICION, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	0,50	$ 93.536,00	$ 46.768,00	0,50	$ 46.768,00
6.2	SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS DE INSTALACION Y CONEXIÓN A RED ELECTRICA	UND	1,00	$ 18.589.525,00	$ 18.589.525,00	1,00	$ 18.589.525,00
		VALOR COSTO DIRECTO CONTRATADO			**$ 180.959.314,00**	**VALOR COSTO DIRECTO - ACTA PARCIAL No. 01**	**$ 101.174.744,00**
		Administración	28,00%		$ 50.668.608,00	28,00%	**$ 28.328.928,00**
		Imprevistos	1,00%		$ 1.809.593,00	1,00%	**$ 1.011.747,00**
		Utilidad	5,00%		$ 9.047.966,00	5,00%	**$ 5.058.737,00**
		VALOR TOTAL CONTRATADO			**$ 242.485.481,00**	**VALOR TOTAL ACTA PARCIAL No. 01**	**$ 135.574.156,00**

VALOR EN LETRAS ACTA PARCIAL No. 01: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE. ($ 135.574.156,00 ,00) INCLUIDO A.I.U.

2. ACTIVIDADES

2.1. CRONOGRAMA

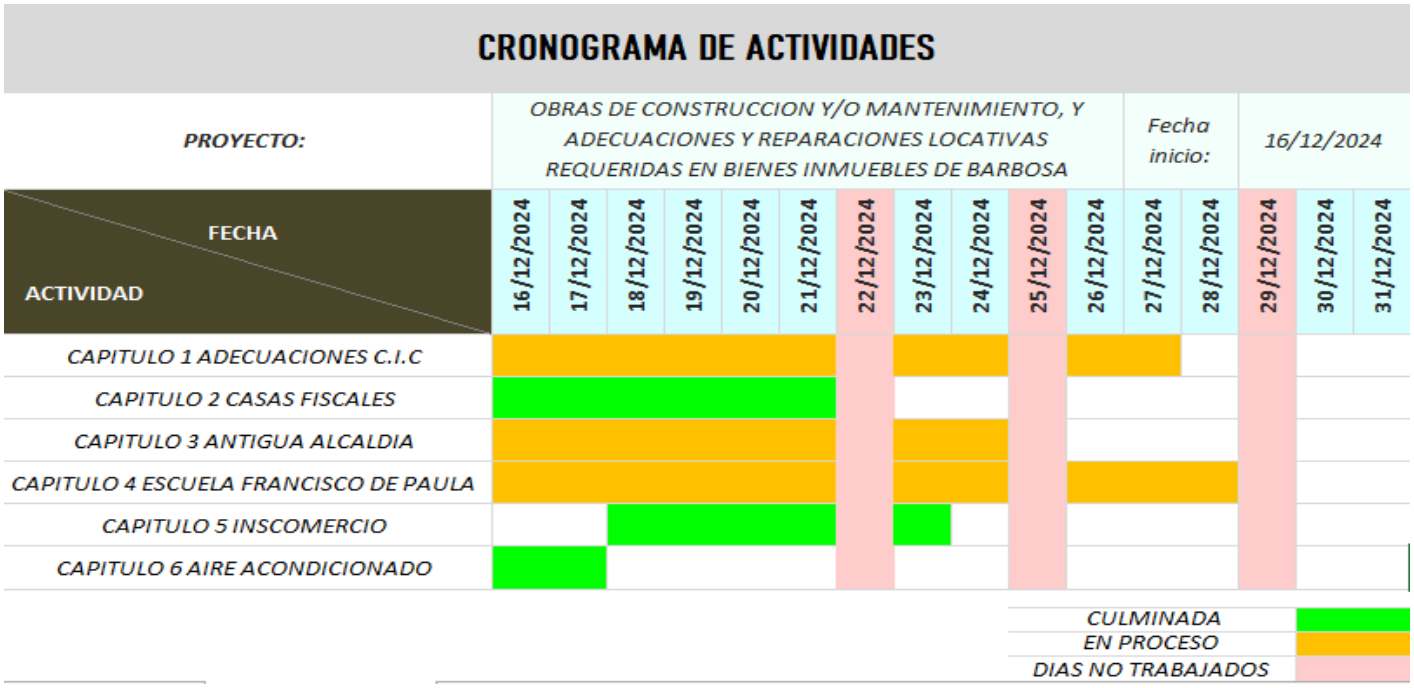

2.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

CAPITULO 2 - CASAS FISCALES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUB TOTAL	CANTIDAD ACTA PARCIAL No. 01	VR. ACTA PARCIAL No. 01
2	CAPITULO 2 - CASAS FISCALES				$ 36.895.705,00		
2.1	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTAS (TEJA DE FIBROCEMENTO)	M2	80,00	$ 14.277,00	$ 1.142.160,00	80,00	$ 1.142.160,00
2.2	DESMONTE Y RETIRO DE PUERTA	UND	1,00	$ 49.229,00	$ 49.229,00	1,00	$ 49.229,00
2.3	DEMOLICION Y RETIRO DE ENCHAPES DE PISO	M2	50,00	$ 14.769,00	$ 738.450,00	50,00	$ 738.450,00
2.4	LIMPIEZA Y DESMONTE DE ZONA VERDE POSTERIOR (INCLUYE CORTE Y RETIRO DE ARBOLES)	UND	2,00	$ 246.147,00	$ 492.294,00	2,00	$ 492.294,00
2.5	MANTENIMIENTO GENERAL DE BAÑOS INCLUYE CAMBIO DE ENCHAPES Y ARREGLO DE APARATOS SANITARIOS	UND	5,00	$ 639.982,00	$ 3.199.910,00	5,00	$ 3.199.910,00
2.6	MANTENIMIENTO DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, (INCLUYE RESANES, ESTUCO Y PINTUTA TIPO LAVABLE TIPO I COLOR BLANCO - 2 MANOS)	M2	720,00	$ 29.903,00	$ 21.530.160,00	720,00	$ 21.530.160,00
2.7	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS	ML	50,00	$ 14.769,00	$ 738.450,00	50,00	$ 738.450,00
2.8	FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METÁLICA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, INCLUYE REFUERZO METALICO EN ANGULO DE 1" X 1/4, CON DESDOBLE DE 60 CMS.	ML	14,00	$ 63.998,00	$ 895.972,00	14,00	$ 895.972,00
2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VENTANA METALICA	M2	2,00	$ 162.457,00	$ 324.914,00	2,00	$ 324.914,00
2.10	MANTENIMIENTO DE MUROS EN MUROS DE FACHADA. (LAVADO CON HIDROLAVADORA)	M2	18,00	$ 17.230,00	$ 310.140,00	18,00	$ 310.140,00
2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	70,00	$ 47.556,00	$ 3.328.920,00	70,00	$ 3.328.920,00
2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLASTICA No. 6	M2	10,00	$ 52.675,00	$ 526.750,00	10,00	$ 526.750,00
2.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA EN CERAMICA	M2	10,00	$ 86.151,00	$ 861.510,00	10,00	$ 861.510,00
2.14	MANTENIMIENTO DE COCINA (INCLUYE CAMBIO DE ENCHAPES DETERIORADOS, CAMBIO DE GRIFERIA)	UND	2,00	$ 147.688,00	$ 295.376,00	2,00	$ 295.376,00
2.15	MANTENIMIENTO GENERAL DE REDES ELECTRICAS (INCLUYE CAMBIO O REPOSICION DE ACCESORIOS (APAGADORES O INTERRUPTORES O PLAFONES Y BOMBILLOS, REPOSICIÓN DE CABLEADO EN MAL ESTADO Y CAMBIO DE TACOS ELECTRICOS)	GLB	2,00	$ 1.230.735,00	$ 2.461.470,00	2,00	$ 2.461.470,00

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O OBSERVACIÓN
2.1 DESMONTE RETIRO DE CUBIERTA	16 de Diciembre de 2024	17 de Diciembre de 2024	Se realiza el desmonte de tejas en fibrocemento en mal estado, para posteriormente, se ejecutó toda la cantidad establecida en el presupuesto y se da cumplimiento al presente ítem, así mismo, es revisada y aprobada por la supervisión.

MEMORIA DE CÁLCULO

L: 20,00 m
H: 8,00 m
Área: L * H = 80,00 m2

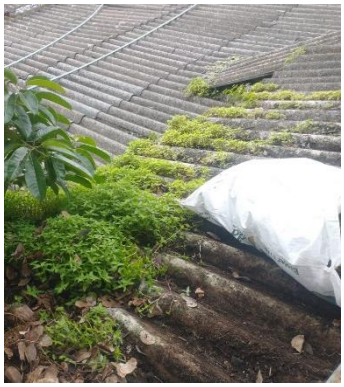


Imagen 1. Desmonte Retiro de Cubierta



Imagen 2. Desmonte Retiro de Cubierta

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O OBSERVACIÓN
2.2 DESMONTE Y RETIRO DE PUERTA	16 de Diciembre de 2024	17 de Diciembre de 2024	Se realiza el desmonte de puerta y marco metálico, se ejecutó toda la cantidad establecida en el presupuesto y se da cumplimiento al presente ítem, así mismo, es revisada y aprobada por la supervisión.



Imagen 3. Desmonte y Retiro de Puerta Metálica

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O OBSERVACIÓN
2.3 DEMOLICION Y RETIRO DE ENCHAPE DE PISO	16 de Diciembre de 2024	17 de Diciembre de 2024	Se realiza la demolición y el retiro de enchape, se ejecutó toda la cantidad establecida en el presupuesto y se da cumplimiento al presente ítem, así mismo, es revisada y aprobada por la supervisión.

MEMORIA DE CÁLCULO

L: 10,00 m
H: 5,00 m
Área: L * H = 50,00 m2

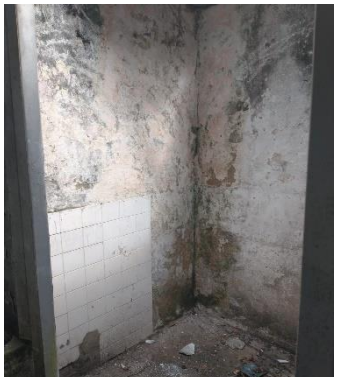


Imagen 4. Demolición y Retiro de Enchapes de Piso

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O OBSERVACIÓN
2.4 LIMPIEZA Y DESMONTE DE ZONA VERDE POSTERIOR (INCLUYE CORTE Y RETIRO DE ARBOLES)	16 de Diciembre de 2024	17 de Diciembre de 2024	Se realiza limpieza y desmonte en la parte posterior de la casa, quitando maleza y árboles, que contribuían al deterioro, se ejecutó toda la cantidad establecida en el presupuesto y se da cumplimiento al presente ítem, así mismo, es revisada y aprobada por la supervisión.

MEMORIA DE CÁLCULO – 2.6.

L: 240,00 m
H: 3,00 m
Área: L * H = 720,00 m2



Imagen 5. Limpieza y Desmonte



Imagen 6. Limpieza y Desmonte



Imagen 7. Limpieza y Desmonte



Imagen 8. Limpieza y Desmonte

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O OBSERVACIÓN
2.5. MANTENIMIENTO GENERAL DE BAÑOS INCLUYE CAMBIO DE ENCHAPES Y ARREGLO DE APARATOS SANITARIOS	16 de Diciembre de 2024	17 de Diciembre de 2024	Se realiza cambio de 5 aparatos sanitarios, se ejecutó toda la cantidad establecida en el presupuesto y se da cumplimiento al presente ítem, así mismo, es revisada y aprobada por la supervisión.

MEMORIA DE CÁLCULO – 2.5.

Total = 5 un



Imagen 9. Mantenimiento General de Baños

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O OBSERVACIÓN
2.6. MANTENIMIENTO DE MUROS EN MAMPOSTERIA (INCLUYE RESANES, ESTUCO Y PINTURA TIPO LAVABLE TIPO I COLO BLANCO 2 MANOS)	16 de Diciembre de 2024	18 de Diciembre de 2024	Se realiza mantenimiento de paredes existentes, se resana, estuca y se pintan, se ejecutó toda la cantidad establecida en el presupuesto y se da cumplimiento al presente ítem, así mismo, es revisada y aprobada por la supervisión.

MEMORIA DE CÁLCULO 2.6.

L: 240,00 m
H: 3,00 m
Área: L * H = 720,00 m2



Imagen 10. Mantenimiento de Mampostería



Imagen 11. Mantenimiento de Mampostería

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O OBSERVACIÓN
2.7 MANTENIMIENTO, LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS	16 de Diciembre de 2024	17 de Diciembre de 2024	Se realiza la limpieza de canaletas existentes, se ejecutó toda la cantidad establecida en el presupuesto y se da cumplimiento al presente ítem, así mismo, es revisada y aprobada por la supervisión.

MEMORIA DE CÁLCULO 2.7.

Total: 50,00 ml



Imagen 12. Mantenimiento limpieza e impermeabilización de canales de aguas lluvias



Imagen 13. Mantenimiento limpieza e impermeabilización de canales de aguas lluvias



Imagen 14. Mantenimiento limpieza e impermeabilización de canales de aguas lluvias



Imagen 15.. Mantenimiento limpieza e impermeabilización de canales de aguas lluvias

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O OBSERVACIÓN
2.8 FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METÁLICA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, INCLUYE REFUERZO METALICO EN ANGULO DE 1" X 1/4, CON DESDOBLE DE 60 CMS.	16 de Diciembre de 2024	17 de Diciembre de 2024	Se realiza el suministro e instalación de canaleta metálica según especificaciones, se ejecutó toda la cantidad establecida en el presupuesto y se da cumplimiento al presente ítem, así mismo, es revisada y aprobada por la supervisión.

MEMORIA DE CÁLCULO 2.8

Total: 14,00 ml



Imagen 16. Canaleta Lámina Galvanizada



Imagen 17. Canaleta Lámina Galvanizada

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O OBSERVACIÓN
2.9. SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VENTANA METALICA	16 de Diciembre de 2024	17 de Diciembre de 2024	Se realiza el suministro e instalación de puerta ventana metálica, se ejecutó toda la cantidad establecida en el presupuesto y se da cumplimiento al presente ítem, así mismo, es revisada y aprobada por la supervisión.

MEMORIA DE CÁLCULO 2.9

Total = 1un



Imagen 18. Puerta Ventana Metálica

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O OBSERVACIÓN
2.10. MANTENIMIENTO DE MUROS EN MUROS DE FACHADA. (LAVADO CON HIDROLAVADORA	17 de Diciembre de 2024	18 de Diciembre de 2024	Se realiza el suministro e instalación de puerta ventana metálica, se ejecutó toda la cantidad establecida en el presupuesto y se da cumplimiento al presente ítem, así mismo, es revisada y aprobada por la supervisión.

MEMORIA DE CÁLCULO 2.10

L: 6,00 m
H: 3,00 m
Total = 18,00 m2



Imagen 19. Lavado de Fachada

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O OBSERVACIÓN
2.11. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO No. 6	17 de Diciembre de 2024	18 de Diciembre de 2024	Se realiza el suministro e instalación de tejas en fibrocemento número 6, se ejecutó toda la cantidad establecida en el presupuesto y se da cumplimiento al presente ítem, así mismo, es revisada y aprobada por la supervisión.

MEMORIA DE CÁLCULO 2.11

L: 7,00 m
H: 10,00 m
Área: L * H = 70,00 m2



Imagen 20. Suministro e Instalación de teja fibrocemento No. 6



Imagen 21. Suministro e Instalación de teja fibrocemento No. 6

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O OBSERVACIÓN
2.12. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLASTICA No. 6	17 de Diciembre de 2024	18 de Diciembre de 2024	Se realiza el suministro e instalación de teja plástica número 6 , se ejecutó toda la cantidad establecida en el presupuesto y se da cumplimiento al presente ítem, así mismo, es revisada y aprobada por la supervisión.

MEMORIA DE CÁLCULO 2.12

L: 5,00 m
H: 2,00 m
Área: L * H = 10,00 m2



Imagen 22. Suministro e Instalación de teja plástica No. 6

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O OBSERVACIÓN
2.13. SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA EN CERAMICA	17 de Diciembre de 2024	18 de Diciembre de 2024	Se realiza el suministro e instalación de tableta cerámica, se ejecutó toda la cantidad establecida en el presupuesto y se da cumplimiento al presente ítem, así mismo, es revisada y aprobada por la supervisión.

MEMORIA DE CÁLCULO 2.13

L: 5,00 m
H: 2,00 m
Área: L * H = 10,00 m2



Imagen 23. Suministro e tableta en Cerámica



Imagen 24. Suministro e tableta en Cerámica

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O OBSERVACIÓN
2.14. MANTENIMIENTO DE COCINA (INCLUYE CAMBIO DE ENCHAPES DETERIORADOS, CAMBIO DE GRIFERIA)	17 de Diciembre de 2024	18 de Diciembre de 2024	Se realiza el cambio de grifería, además de mantenimiento en tubería puntualmente, se ejecutó toda la cantidad establecida en el presupuesto y se da cumplimiento al presente ítem, así mismo, es revisada y aprobada por la supervisión.

MEMORIA DE CÁLCULO 2.14

Total = 2un



Imagen 25. Mantenimiento de Cocina

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O OBSERVACIÓN
2.15. MANTENIMIENTO GENERAL DE REDES ELECTRICAS (INCLUYE CAMBIO O REPOSICION DE ACCESORIOS (APAGADORES O INTERRUPTORES O PLAFONES Y BOMBILLOS, REPOSICIÓN DE CABLEADO EN MAL ESTADO Y CAMBIO DE TACOS ELECTRICOS)	17 de Diciembre de 2024	18 de Diciembre de 2024	Se realiza el cambio de dos interruptores y rosetas, se ejecutó toda la cantidad establecida en el presupuesto y se da cumplimiento al presente ítem, así mismo, es revisada y aprobada por la supervisión.

MEMORIA DE CÁLCULO 2.14

Total = 2un



Imagen 24. Mantenimiento redes Eléctricas

CAPITULO 3 ANTIGUA ALCALDIA MUNICIPAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUB TOTAL	CANTIDAD ACTA PARCIAL No. 01	VR. ACTA PARCIAL No. 01
3	CAPITULO 3 - ANTIGUA ALCALDIA MUNICIPAL						
3.26	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	10,00	$ 44.996,00	$ 449.960,00	10,00	$ 449.960,00
3.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO	M2	150,00	$ 15.753,00	$ 2.362.950,00	100,00	$ 1.575.300,00
3.29	PINTURA TIPO ESMALTE ANTI HONGO	M2	80,00	$ 36.676,00	$ 2.934.080,00	80,00	$ 2.934.080,00
3.30	PINTURA TIPO VINILO (3 MANOS)	M2	535,00	$ 21.169,00	$ 11.325.415,00	535,00	$ 11.325.415,00

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O OBSERVACIÓN
3.26. PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	16 de Diciembre de 2024	23 de Diciembre de 2024	Se realiza pañete en muros interiores en los que se hicieron las regatas, y otros por encontrarse deteriorados, se ejecutó toda la cantidad relacionada en este corte de presupuesto y se da cumplimiento al presente ítem, así mismo, es revisada y aprobada por la supervisión.

MEMORIA DE CÁLCULO – 3.26.

L=5,00 m

H: 2,00 m

Área: L * H = 10,00 m2





Imagen 1. Pañete en corte de muro *Imagen 1. Pañete para en corte de muro*

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O OBSERVACIÓN
3.28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO	16 de Diciembre de 2024	23 de Diciembre de 2024	Se realiza aplicación de estuco en muros deteriorados por la humedad, y posterior a ello se pinta, se ejecutó la cantidad establecida en el presupuesto del presente corte y se da cumplimiento al presente ítem, así mismo, es revisada y aprobada por la supervisión.


MEMORIA DE CÁLCULO – 3.26.

L=40,00 m
H: 2,50 m
Área: L * H = 100,00 m2





Imagen 1. Aplicación de Estuco plástico *Imagen 2. Aplicación de Estuco plástico*

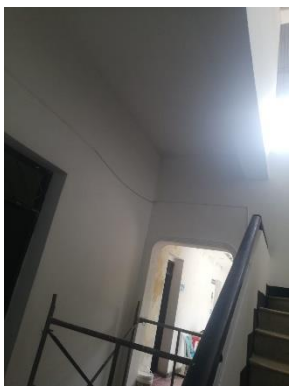

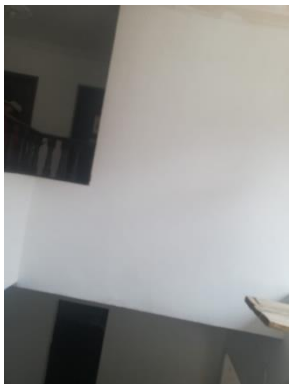


Imagen 3. Aplicación de Estuco plástico *Imagen 4. Aplicación de Estuco plástico*

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O OBSERVACIÓN
3.29. PINTURA TIPO ESMALTE ANTI HONGO	16 de Diciembre de 2024	23 de Diciembre de 2024	Se realiza aplicación de pintura anti hongos color negro, en zócalos de veinte centímetros de altura, Se ejecutó la cantidad establecida en el presupuesto del presente corrte y se da cumplimiento al presente ítem, así mismo, es revisada y aprobada por la supervisión.

MEMORIA DE CÁLCULO – 3.29.

L=400,00 m
H: 0,20 m
Área: L * H = 80,00 m2

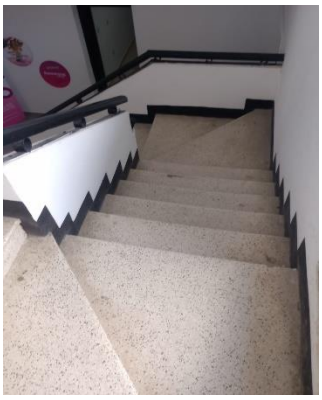




Imagen 1. Aplicación esmalte anti hongo *Imagen 2. Aplicación esmalte anti hongo*

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O OBSERVACIÓN
3.30. PINTURA TIPO VINILO A TRES MANOS	16 de Diciembre de 2024	23 de Diciembre de 2024	Se realiza la aplicación de pintura tipo vinilo color blanco tipo 1, se aplicó 3 manos de pintura, luego de haber aplicado estuco plástico donde se requería, Se ejecutó la cantidad establecida en el corte de este presupuesto y se da cumplimiento al presente ítem, así mismo, es revisada y aprobada por la supervisión.

MEMORIA DE CÁLCULO – 3.30.

L= 198,00 m
H: 2,70 m
Área: L * H = 535,00 m2



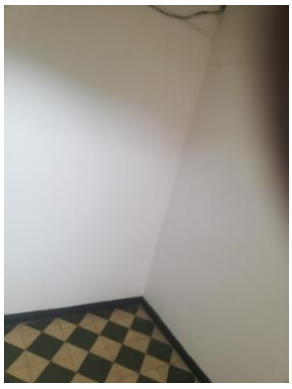


Imagen 1. Pintura tipo Esmalte tres manos *Imagen 2. Pintura tipo Esmalte tres manos*



Imagen 3. Pintura tipo Esmalte tres manos

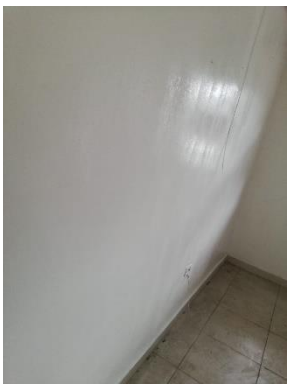


Imagen 4. Pintura tipo Esmalte tres manos



Imagen 5. Pintura tipo Esmalte tres manos



Imagen 6. Pintura tipo Esmalte tres manos

CAPITULO 4 – ESCUELA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUB TOTAL	CANTIDAD ACTA PARCIAL No. 01	VR. ACTA PARCIAL No. 01
4	CAPITULO 4 - ESCUELA FRANCISCO DE PAULA S.				$ 41.280.884,00		
4.5	CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	7,31	$ 1.235.234,00	$ 9.027.090,00	4,92	$ 6.077.351,00
4.11	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO VISTA TIPO STA FE O SIMILAR (INCLUYE MORTERO TIPO 1:4)	M2	16,00	$ 155.073,00	$ 2.481.168,00	6,00	$ 930.438,00
4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA ESLABONADA, INCLUYE MARCO O REFUERZO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" Y REFUERZO EN ANGULO METALICO Y PLATINA, CON TAPAS PLASTICAS	M2	2,00	$ 118.601,00	$ 237.202,00	2,00	$ 237.202,00

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O OBSERVACIÓN
4.5 CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	16 de Diciembre de 2024	23 de Diciembre de 2024	Se realiza fundidas para zapatas, columnas y vigas para amarrar un muro en bloque de altura de 1.70. Además de Columna y Zapata, para plancha, en concreto y viga y zapatas para columnas de entrada principal, Se ejecutó la cantidad establecida en el presente corte en el presupuesto y se da cumplimiento al presente ítem, así mismo, es revisada y aprobada por la supervisión.

MEMORIA DE CÁLCULO – 4.50.

Zapatas muro

0*6m*0.6m*0.6m=0.21m3 0.21m3*3un=0.6

Zapata Columnas

0*8m*0.8m*0.8m=0.51m3 0.51m3*3un=1.51m3

Vigas para muro
4.40m*0.19m*0.25m=0.20m3 0.75m3*2un=0.48m3
Vigas para entrada
5.00m*0.5m*0.4m=1m3
Columnas para muro
1.70m*0.34m*0.12m=0.069m3 0.069m3*3un=0.20m3
Columnas para placa tanque
2.45m*0.3m*0.3m=0.22m3
Asientos en Concreto
7.87m*0.28m*0.05m=0.11m3
Columnas para acceso
2.50m*0.4m*0.4m=0.40m3 2.50m*0.4m*0.4m=0.40m3
TOTAL: 4.92m3



Imagen 1. Concreto para zapatas y columnas



Imagen 2. Concreto para zapatas y columnas



Imagen 3. Concreto para zapatas y columnas



Imagen 4. Concreto para zapatas y columnas



Imagen 5. Concreto para asientos



Imagen 6. Concreto para zapatas y columnas

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O OBSERVACIÓN
4.11. MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO VISTA TIPO STA FE O SIMILAR (INCLUYE MORTERO TIPO 1:4)	16 de Diciembre de 2024	23 de Diciembre de 2024	Se realiza muro en ladrillo macizo, para completar el cerramiento, luego del desmonte para posterior cambio de entrada.Se ejecutó toda la cantidad establecida en el presupuesto y se da cumplimiento al presente ítem, así mismo, es revisada y aprobada por la supervisión.

MEMORIA DE CÁLCULO – 4.11.

L=4,18 m

H: 1.44 m

Área: L * H = 6,00 m2



Imagen 1. Muro en ladrillo prensado

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O OBSERVACIÓN
4.13. SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA ESLABONADA, INCLUYE MARCO O REFUERZO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" Y REFUERZO EN ANGULO METALICO Y PLATINA, CON TAPAS PLASTICAS	16 de Diciembre de 2024	23 de Diciembre de 2024	Se realiza el suministro e instalación de malla eslabonada para completar cerramiento.Se ejecutó toda la cantidad establecida en el presupuesto y se da cumplimiento al presente ítem, así mismo, es revisada y aprobada por la supervisión.

MEMORIA DE CÁLCULO – 4.13.

L= 1,70 m

H: 1.20 m

Área: L * H = 2,00 m2



Imagen 1. Suministro e instalación de malla eslabonada

CAPITULO 5 - INSCOMERCIO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUB TOTAL	CANTIDAD ACTA PARCIAL No. 01	VR. ACTA PARCIAL No. 01
5	CAPITULO 5 - INSCOMERCIO				$ 22.113.000,00		
5.1	FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA EN PERFIL TIPO CAJON DE 40MM X 80MM CALIBRE 18, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA TIPO ESMALTE.	ML	273,00	$ 81.000,00	$ 22.113.000,00	273,00	$ 22.113.000,00

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O OBSERVACIÓN
5.1.FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA EN PERFIL TIPO CAJON DE 40MM X 80MM CALIBRE 18, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA TIPO ESMALTE.	17 de Diciembre de 2024	23 de Diciembre de 2024	Se realiza la fabricación de la estructura metálica para cubierta, correas y cerchas y posterior pintura e instalación, se ejecutó toda la cantidad establecida en el presupuesto y se da cumplimiento al presente ítem, así mismo, es revisada y aprobada por la supervisión.

MEMORIA DE CÁLCULO 5.1

Total = 273 ml

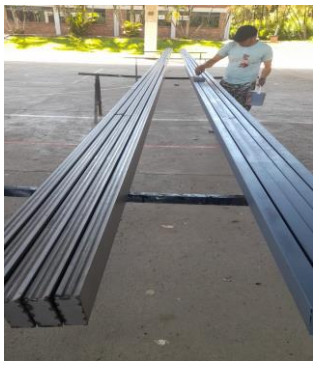


Imagen 1. Fabricación de estructura metálica



Imagen 2. Instalación de estructura metálica



Imagen 3. Fabricación de estructura metálica



Imagen 4. Instalación de estructura metálica



Imagen 5. Fabricación de estructura metálica



Imagen 6. Instalación de estructura metálica

ACTIVIDADES EJECUTADAS CAPITULO No. 6

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUB TOTAL	CANTIDAD ACTA PARCIAL No. 01	VR. ACTA PARCIAL No. 01
6	CAPITULO 6 - AIRE ACONDICIONADO				$ 18.636.293,00		
6.1	DEMOLICION, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	0,50	$ 93.536,00	$ 46.768,00	0,50	$ 46.768,00
6.2	SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS DE INSTALACION Y CONEXIÓN A RED ELECTRICA	UND	1,00	$ 18.589.525,00	$ 18.589.525,00	1,00	$ 18.589.525,00

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O OBSERVACIÓN
6.1 DEMOLICION, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS	16 de Diciembre de 2024	16 de Diciembre de 2024	Se realiza demolición de parte de muro para instalación del aire acondicionado, está actividad se ve reflejada en el balance anteriormente adjuntado, por otro lado, es revisada y aprobada por la supervisión.

MEMORIA DE CÁLCULO 6.1

L: 1,00 m
H: 0.50 m
Área: L * H = 0.50 m2



Imagen 1. Demolición

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O OBSERVACIÓN
6.2 SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS DE INSTALACION Y CONEXIÓN A RED ELECTRICA	16 de Diciembre de 2024	18 de Diciembre de 2024	Se realiza el suministro e instalación de un aire acondicionado, dejándolo en funcionamiento, esta actividad se ve reflejada en el balance anteriormente adjuntado, por otro lado, es revisada y aprobada por la supervisión.

MEMORIA DE CÁLCULO 6.1

Total = 1un



Imagen 1, Montaje



Imagen 2. Montaje Equipo

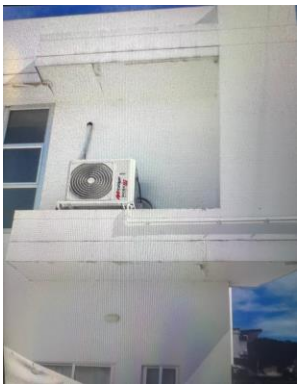


Imagen 3. Equipo Instalado

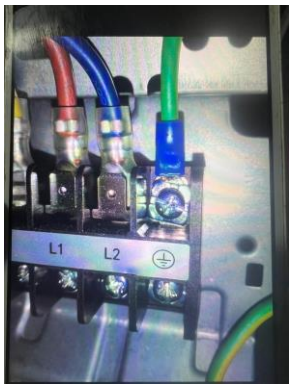


Imagen 4. Conexión a Red Eléctrica



Imagen 5. Conexión a Red Eléctrica

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OBRA

1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

DETALLE	VALOR
Valor del Contrato de obra No.139-2024	$ 242.485.481,00
Valor parcial ejecutado del contrato de obra No.139-2024	$ 135.574.156,00
Saldo por ejecutar	$ 106.911.325,00
Valor PAGO ACTA PARCIAL No. 1	$ 135.574.156,00

2. VALOR FACTURADO

FACTURA No.	01
FECHA DE PAGO	26/12/2024
VALOR TOTAL FACTURADO INCLUDIO A.I.U.	$ 135.574.156,00

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS - POLIZAS

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6**
NO. DE PÓLIZA	30-44-101061337 ANEXO:2
FECHA DE EXPEDICIÓN	**11 DE DICIEMBRE DE 2024**
CARACTERÍSTICAS PÓLIZA	
TOMADOR	**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S.**
ASEGURADO	**MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER**

AMPAROS CONSTITUIDOS

AMPARO	**VIGENCIA**		**CUANTIA**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/12/2024	01/05/2025	$ 48,497,096.20=
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRAS	A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL	2 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL	$ 48,497,096.20=
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/12/2024	31/12/2027	$ 24,248,548.10=

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6**
NO. DE PÓLIZA	30-40-101022807 ANEXO:2
FECHA DE EXPEDICIÓN	**12 DE DICIEMBRE DE 2024**
CARACTERÍSTICAS PÓLIZA	
TOMADOR	**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S.**
ASEGURADO BENEFICIARIO	**MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER**

AMPAROS QUE EXIGIÓ LA ENTIDAD

AMPARO	**SUFICIENCIA**	**VIGENCIA**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	DOSCIENTOS (200) SMMLV	DURACIÓN DEL CONTRATO

AMPAROS QUE CONSTITUYÓ EL CONTRATISTA

AMPARO	**VIGENCIA**		**CUANTIA**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	16/12/2024	31/12/2024	$260.000.000,00

4. CUMPLIMIENTOS PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

5. CONCLUSIONES INFORME DE ACTA PARCIAL No. 01

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Teniendo en cuenta las actividades a ejecutar establecidas en el Anexo 2 - Especificaciones Técnicas del Contrato No.139-2024, se elaboró un cronograma de las actividades que permitirá visualizar el rendimiento de la obra y su avance a lo largo del periodo del contrato. Este cronograma sirvió como herramienta de seguimiento y control, facilitando la medición del progreso de la obra.

En el aspecto contractual, como contratista encargado de realizar, las obras de construcción y/o mantenimiento, y adecuaciones y reparaciones locativas requeridas en bienes inmuebles en el municipio de Barbosa, Santander, en este primer informe se data que se concluyen las adecuaciones en Las Casas Fiscales, en área del Instituto Integrado de Comercio y en el CAM., las obras fueron ejecutadas conforme a los estándares establecidos y dentro del plazo previsto.


Durante el proceso, se cumplió con todas las especificaciones técnicas y normativas exigidas, garantizando la calidad de las obras y el adecuado funcionamiento de las instalaciones para el beneficio de la población.

Se cuenta desde el inicio con cinco (5) frentes de trabajo, en áreas de CASAS FISCALES, CAM, INSCOMERCIO, ANTIGUA ALCALDIA y C.I.C. y ESCUELA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

En la ejecución de las obras se priorizó que se cumpliera de acuerdo con el sistema de precios unitarios, adecuando los espacios de manera eficiente para facilitar su rehabilitación y mantenimiento. Además, se mantuvo un estricto control sobre el presupuesto, los materiales utilizados y el cumplimiento de los plazos, lo que permitió que las obras se llevaran a cabo sin contratiempos.

El personal empleado cuenta con la seguridad social requerida para este tipo de obras.

ANEXOS:
FACTURA
CERTIFICACION DE SEGURIDAD SOCIAL – PLANILLAS MES DE DICIEMBRE
CERTIFICACION BANCARIA

EL CONTRATISTA
 **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S** **NIT: 901.205.913-9** R.L. RONALD FABIAN ARDILA TELLEZ

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901205913
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS PROAINCOL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 16 # 4-25 OF 601	TELÉFONO:	7047103
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades profesionales, científicas y té
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	88 - SANTANDER
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7954043031**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/26		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1151454227	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	6	$ 249.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.600	$ 0	$ 249.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 83.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.200	$ 0	$ 83.200
230201	230201- PROTECCION	1	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.600	$ 0	$ 41.600
SUBTOTALES:										**$ 374.400**	**$ 0**	**$ 374.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 20.800
EPS041	NUEVA EPS CM	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 31.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.200	$ 0	$ 0	$ 31.200
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 10.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.400	$ 0	$ 0	$ 10.400
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 10.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.400	$ 0	$ 0	$ 10.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 20.800
SUBTOTALES:													**$ 93.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 93.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	9		$ 0	$ 0		$ 0	$ 162.900	$ 162.900	$ 0	$ 0	$ 162.900
SUBTOTALES:									**$ 162.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	9	$ 93.600	$ 0	$ 93.600
SUBTOTALES:			**$ 93.600**	**$ 0**	**$ 93.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP																	
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																			CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1099213743	GUTIERREZ MORENO JAIRO ALONSO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	25	30															230301-PORVENIR	6	$ 260.000	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 41.600	NUEVA EPS CM	6	$ 260.000	$ 10.400	$ 0	$ 10.400	14-11 - ARL SURA	6	$ 260.000	901205913	$ 18.100	6	$ 260.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 10.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 91012511	ARIZA CARDENAS HILDEBRANDO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	25	30															230301-PORVENIR	6	$ 260.000	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 41.600	EPS037-NUEVA EPS	6	$ 260.000	$ 10.400	$ 0	$ 10.400	14-11 - ARL SURA	6	$ 260.000	901205913	$ 18.100	6	$ 260.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 10.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 91013249	VARGAS SUAREZ CIBEL	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	25	30															230301-PORVENIR	6	$ 260.000	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 41.600	NUEVA EPS CM	6	$ 260.000	$ 10.400	$ 0	$ 10.400	14-11 - ARL SURA	6	$ 260.000	901205913	$ 18.100	6	$ 260.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 10.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 91014742	OYOLA SERRANO CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	25	30															230301-PORVENIR	6	$ 260.000	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 41.600	EPS037-NUEVA EPS	6	$ 260.000	$ 10.400	$ 0	$ 10.400	14-11 - ARL SURA	6	$ 260.000	901205913	$ 18.100	6	$ 260.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 10.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 91016443	RODRIGUEZ HERREÑO EDWIN GIOVANI	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	25	30															25-14 COLPENSIONES	6	$ 260.000	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 41.600	ESSC24-COOSALUD ESS	6	$ 260.000	$ 10.400	$ 0	$ 10.400	14-11 - ARL SURA	6	$ 260.000	901205913	$ 18.100	6	$ 260.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 10.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 91016706	CAMARGO SERRANO JAVIER FERNANDO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	25	30															25-14 COLPENSIONES	6	$ 260.000	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 41.600	EPS002-SALUD TOTAL	6	$ 260.000	$ 10.400	$ 0	$ 10.400	14-11 - ARL SURA	6	$ 260.000	901205913	$ 18.100	6	$ 260.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 10.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 91018187	VELASCO ARIZA HEIDER	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	25	30															230301-PORVENIR	6	$ 260.000	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 41.600	EPS017-FAMISANAR	6	$ 260.000	$ 10.400	$ 0	$ 10.400	14-11 - ARL SURA	6	$ 260.000	901205913	$ 18.100	6	$ 260.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 10.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901205913
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS PROAINCOL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 16 # 4-25 OF 601	TELÉFONO:	7047103
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades profesionales, científicas y té
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	88 - SANTANDER
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7954043031**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2024			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/26			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1151454227

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																	
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
8	CC 91018604	ARIZA HERREÑO YEISON	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	25	30															230201-PROTECCION	6	$ 260.000	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 41.600	NUEVA EPS CM	6	$ 260.000	$ 10.400	$ 0	$ 10.400	14-11 - ARL SURA	6	$ 260.000	901205913	$ 18.100	6	$ 260.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 10.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 9658110	MARTINEZ TORRES HENRY RAUL	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	25	30															230301-PORVENIR	6	$ 260.000	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 41.600	ESSC24-COOSALUD ESS	6	$ 260.000	$ 10.400	$ 0	$ 10.400	14-11 - ARL SURA	6	$ 260.000	901205913	$ 18.100	6	$ 260.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 10.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 724.500**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901205913
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS PROAINCOL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 16 # 4-25 OF 601	TELÉFONO:	7047103
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades profesionales, científicas y té
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	010 - PLANTA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7951146220**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1092633933		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 0	$ 416.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 624.000**	**$ 0**	**$ 624.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:													**$ 156.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 156.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 104.100	$ 104.100	$ 0	$ 0	$ 104.100
SUBTOTALES:									**$ 104.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 104.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 52.000	$ 0	$ 52.000
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 52.000	$ 0	$ 52.000
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 52.000	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:			**$ 156.000**	**$ 0**	**$ 156.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																			
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1023007525	PIZA RODRIGUEZ DIANA CAROLINA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	901205913	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1030676903	BONILLA PARRA ANDREA LIZETH	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	901205913	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF24-COMPENSAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1098693987	GARCIA ARDILA DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	901205913	$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.040.100**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901205913
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS PROAINCOL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 16 # 4-25 OF 601	TELÉFONO:	7047103
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades profesionales, científicas y té
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	100 - OPERARIOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7953366856**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	15						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/19			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1138808824		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 0	$ 208.000	$ 2.100	$ 210.100
230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 0	$ 208.000	$ 2.100	$ 210.100
SUBTOTALES:										**$ 416.000**	**$ 4.200**	**$ 420.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 600	$ 0	$ 52.000	$ 600	$ 0	$ 52.600
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 600	$ 0	$ 52.000	$ 600	$ 0	$ 52.600
SUBTOTALES:													**$ 104.000**	**$ 1.200**	**$ 0**	**$ 105.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 181.000	$ 181.000	$ 1.900	$ 0	$ 182.900
SUBTOTALES:									**$ 181.000**	**$ 1.900**	**$ 0**	**$ 182.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	2	$ 104.000	$ 1.100	$ 105.100
SUBTOTALES:			**$ 104.000**	**$ 1.100**	**$ 105.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	91517375
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RONALD FABIAN ARDILA TELLEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 162 55 C 80	TELÉFONO:	4718026
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7951145038**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/12/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1139408030

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000	$ 0	$ 480.000
SUBTOTALES:										**$ 480.000**	**$ 0**	**$ 480.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 375.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.000	$ 0	$ 0	$ 375.000
SUBTOTALES:													**$ 375.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 375.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 15.700	$ 15.700	$ 0	$ 0	$ 15.700
SUBTOTALES:									**$ 15.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 15.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 91517375	ARDILA TELLEZ RONALD FABIAN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 3.000.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.000.000	$ 375.000	$ 0	$ 375.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.000.000	91517375	$ 15.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 870.700**

Medellín, 24 de Diciembre de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA COLOMBIANA SAS PROAINCOL, en el centro de trabajo 0000000088 - SANTANDER, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C91012511	ARIZA CARDENAS HILDEBRANDO	25/12/2024	30/12/2024	JO46172v	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C91018604	ARIZA HERREÑO YEISON	25/12/2024	30/12/2024	26q23724	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C91016706	CAMARGO SERRANO JAVIER FERNANDO	25/12/2024	30/12/2024	24619G25	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C1099213743	GUTIERREZ MORENO JAIRO ALONSO	25/12/2024	30/12/2024	42230d24	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C9658110	MARTINEZ TORRES HENRY RAUL	25/12/2024	30/12/2024	14914713	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C91014742	OYOLA SERRANO CARLOS ALBERTO	25/12/2024	30/12/2024	r2461351	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C91016443	RODRIGUEZ HERREÑO EDWIN GIOVANI	25/12/2024	30/12/2024	130y241x	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C91013249	VARGAS SUAREZ CIBEL	25/12/2024	30/12/2024	124210A1	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C91018187	VELASCO ARIZA HEIDER	25/12/2024	30/12/2024	m1371743	DEPENDIENTE	POR INICIAR

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C633912732435948279

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/12/2024 13:24:39 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.57.86.136, 198.143.41.37, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 24 de Diciembre de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA COLOMBIANA SAS PROAINCOL, en el centro de trabajo 0000000002 - PERSONAL ADMINISTRATIVO, Clase de riesgo 1, Porcentaje de cotización 0.522%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1030676903	BONILLA PARRA ANDREA LIZETH	12/01/2022		25024111	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C1023007525	PIZA RODRIGUEZ DIANA CAROLINA	04/12/2018		20913116	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C633912732435950515

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/12/2024 14:01:55 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.57.86.136, 198.143.41.37, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 24 de Diciembre de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA COLOMBIANA SAS PROAINCOL, en el centro de trabajo 0000000016 - 016-PTAR SANTIAGO, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C5660236	CADENA CEPEDA WILLIAM	01/10/2021		33724132	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C633912732435950589

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/12/2024 14:03:09 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.57.86.136, 198.143.41.37, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 24 de Diciembre de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA COLOMBIANA SAS PROAINCOL, en el centro de trabajo 0000000015 - INV-0015- MALECON PUERTO TRIUNFO, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C79349785	TRASLAVIÑA PENAGOS SEDULFO	25/03/2022		39190240	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C633912732435950648

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/12/2024 14:04:08 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.57.86.136, 198.143.41.37, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S

NIT: 901205913-9

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 16 4 25 OF 307, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3118507869

Email. proyectosproaincol@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764085422001 válida desde 2024-12-16 hasta 2025-12-16 rango desde FVE97 hasta FVE500.

Cliente: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT : 890206033
Dirección:
Teléfono:
Email: tesoreria@barbosa-santander.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 30/12/2024
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FVE99**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **11:44:18-05:00**
FECHA FIRMADO: **26/12/2024 11:44:21**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	12	2024	30	12	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	Mano de Obra COBRO DE ACTA PARCIAL No. 01 DEL CONTRATO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER CON OBJETO: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y ADECUACION Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER	WSD	1,00	$100.462.509,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$100.462.509,00
2	7	Adminstracion Administracion 28%	WSD	1,00	$28.129.503,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$28.129.503,00
3	9	Imprevistos Imprevistos 1%	WSD	1,00	$1.004.625,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$1.004.625,00
4	8	Utilidad Utilidad 5%	WSD	1,00	$5.023.125,00	IVA	19%	$954,394.00	0,00	$5.023.125,00

Notas:
SE AUTORIZA EN LA PRESENTE FACTURA GIRAR MEDIANTE CHEQUE A NOMBREDE HILDEBRADO ARIZA CARDENAS CON C.C.91.012.511 DE BARBOSA SANTANDER.

SON: (ciento treinta y cinco millones quinientos setenta y cuatro mil ciento cincuenta y seis pesos)
CUFE: 4df4b41bd52c0ed4049ae9dda5596361bd88f0f8e9565e57d24f61a5cc81eba5a17668eea359d398a1746fed9ae2d40b

Subtotal:	$134.619.762,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$954.394,00
Total:	$135.574.156,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$129.596.637,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$5.023.125,00	19,00%	$954.394,00

Firma Digital: YYQMDUidrP10ZTPiEmz1vBD832IrTZl9cvySmUc/Yk8ZMSaiCqENKYxLSIRk6A0J
L8TkIIcf7Bw3A3WFJ30xUipW0jEbaEA9YntKHkuHjkZ5cGi1Py
0XlcfoN9m/yA9t d2PrZ0HyZJz6Qf5kMba5ZYok8Twp4Begrn9jgCDS3czJWBpHC5++6QTmMYZaLMSX dE5+fRUX9Cn4TtjImaLL3r8906BYg08RpH5
pcGjw2jW5DumlXkg8c0ytZahj3+Px i0lnLsz60WyHwRN3VOioAlhHuhT467ck5INgnGrr6TH7M9Zj44ig1NnNRv41D+uM 7yeAs43xE7t8+qZpWqSD
Xw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
