Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		

Radicado GEPOL Nro. GS-2024-031082-DILOF

Teniente
Winny Bustamante Córrdoba
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 023 INV

No. SISCO:	481521	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-6-10310-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	8-Oct-24
VALOR PAGO:	$ 1,411,511,862.95	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	448824
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	CONSORCIO URBA FASE 1
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FASE 10	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901.765.247-3

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI ___	NO X	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI ___	NO X	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI ___	NO X	
CESIÓN A:	**CUENTA BANCARIA:**		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 5824			
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)			X
6. FACTURA ORIGINAL:			X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	30/09/2024		X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300192806		
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN :	No aplica		
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP			X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP			X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.			N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP			N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.			N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,			N/A

OBSERVACIONES :
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ___

FIRMA
CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA CONTRACTUAL - DILOF

CPS: 1104524
510 1695

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO. REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

08-10-2024

17:43
pp. Luis Calderón

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		**Sociedad**	: **DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA**	Ejercicio	:2024
N° documento	:1500100786	NIT	: 800141397-5	Período	:10
Fe. documento	:18.10.2024	Fe.contab.	: 18.10.2024	Moneda doc.	:COP
Referencia	:GASTOS GENERALES				
Texto cab. Doc.	:OB-1104524 OP-380280024				

ACREEDOR NIT :9017652473 NOMBRE : CONSORCIO URBA FASE 1

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion		7000007301		1.283.846.985,95
002	25	2401020010	CONSORCIO URBA FASE	9017652473		1.283.846.985,95	
					TOTALES:	1283846.985,95	1283846.985,95

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

CONCEPTO: CT-06-6-10310-23 DT 23 CONSORCIO URBA FASE 1

Elaboró: PRO03. SEBASTIAN GAMBOBZUS COH **Revisó:**

Ordenador del gasto:

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnebonill	NORMA EMILCE BONILLA ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	9/10/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1104524	Fecha Registro:	2024-10-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	5824
Valor Inicial:	1.411.511.862,95	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.411.511.862,95	Saldo x Ordenar:	1.411.511.862,95
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	127.664.877,00	Valor Neto:	1.283.846.985,95			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	12224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	496455

TERCERO

Identificacion:	901765247	Razon Social:	CONSORCIO URBA FASE 1	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	31237067	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	448824	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	factura FASE10 02-10-2024	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-20105C-1501019-02 ADQUIS. DE BYS - COMANDOS DE POLICÍA CONSTRUIDOS	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.411.511.862,95	0,00	1.411.511.862,95	1.411.511.862,95

Objeto:	FACTURA FASE10 02-10-2024, CONTRATO 06-6-10310-23, TURNO 023 INVERSIÓN

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-30	Generada	1.411.511.862,95

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.401.031.704,00	2,000 %	28.020.634,00	28.020.634,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.480.158,00	15,000 %	1.572.024,00	1.572.024,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	1.401.031.704,00	5,000 %	70.051.585,00	70.051.585,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.401.031.704,00	2,000 %	28.020.634,00	28.020.634,00

Brigadier General **OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ**
DIRECTORA LOGÍSTICA Y FINANCIERA

OP. 3802800024

ELABORÓ: CPS 04 NORMA EMILCE BONILLA ROJAS
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: SI LEONEL ANDRÉS CARDENAS POLO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

REVISÓ: TC JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISÒ: CPS-XIMENA ARAUJO NIÑO
REVISORÍA TRIBUTARIA

Ciudad y fecha:	BOGOTÁ DC, 04 de octubre de 2024
Unidad Contratante:	DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
Contrato No.	PN DIRAF No 06-6-10310-23
Fecha suscripción contrato:	31 de octubre de 2023
Objeto del contrato:	CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
Lugar de ejecución de la obra:	Lote Trapichito Nuevo 3 – Km 3 – vía al sur – Neiva - Huila
Constancia de recibo No.	09
Contratista:	CONSORCIO URBA FASE 1
NIT del contratista:	901.765.247-3
Fecha del acta de inicio:	12 de diciembre de 2023.
Plazo de ejecución:	**Principal:** El plazo de ejecución según programación entregada resultado de la consultoría, será de MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE (1.157) días calendario, para los cuales se adelantarán obras durante las vigencias 2023, 2024, 2025 y 2026, contados a partir de la aprobación de la garantía única, (fecha en la cual se suscribirá el acta de inicio con la Interventoría). **Modificatorio No 1:** El plazo de ejecución para el presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2026, para los cuales se adelantarán actividades de obra durante las vigencias 2023, 2024, 2025 y 2026, contados a partir de la aprobación de la garantía única (fecha en la cual se suscribirá el acta de inicio con el contratista de interventoría)
Nombre del Interventor del contrato:	GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON Representante Legal interventoría CONSORCIO INTEROCCIDENTE
Nombre del supervisor del contrato y cargo que desempeña:	GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON Representante Legal interventoría CONSORCIO INTEROCCIDENTE Supervisión contrato PN DIRAF No 06-6-10332-23 Comunicación oficial GS-2023-016877-DILOF del 24/11/2023
Valor del contrato:	$ 47.436.336.117,61 Incluido AIU e IVA
Adición No. 1	No Aplica
Fecha de Suspensión del contrato:	No Aplica
Fecha de Reiniciación:	No Aplica
Valor total del contrato:	$ 47.436.336.117,61 Incluido AIU e IVA
Indicar si corresponde a la entrega parcial o total del contrato:	Entrega parcial SI _X_ Entrega Total: Si____

1=23 Inversión RP 5824 8800 481521 SIIF 448824 08/10/2024

Periodo de entrega certificado:	Período certificado	Acta de corte *
	01-septiembre-2024 hasta el 30-septiembre-2024	9

Forma de Pago:

La Policía Nacional -Dirección Logística y Financiera cancelará el valor del contrato de la siguiente forma:

PAGOS PARCIALES:

Se realizarán pagos parciales de acuerdo al avance porcentual de ejecución de la obra; las actas deben corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitarán una vez la interventoría y Contratista hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias de cantidades y que la interventoría haya certificado la ejecución y el recibo a satisfacción de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar el día veinte (20) del mes a facturar.

Cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación. Previo a la presentación de las actas parciales y a su ejecución, deberá estar aprobado por la Dirección Logística y Financiera, el balance de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos si los hay, consolidado por el contratista de obra con los soportes documentales (y fotográficos de ser necesario), proyectado y avalado por la interventoría, igual condición para el acta final, si hay modificaciones al balance aprobado.

Para cada una de las actas parciales, el pago se realizará dentro de los sesenta (60) días hábiles, una vez aprobada la siguiente documentación presentada, de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), así:

- Acta de recibo parcial. (suscrita entre los contratistas de obra e interventoría)
- Factura de venta.
- Balance de cantidades ejecutadas.
- Certificación de pagos parafiscales y seguridad social.
- Certificación pagos FIC.
- Memoria de cantidades ejecutadas.

Y los demás documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos con son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, se reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el tramite documental dentro del plazo indicado u de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del plan anual de caja (PAC).

Nota 1: Para el caso puntual de elementos de dotación y/o equipos, se deberá discriminar cada ítem dentro de la factura de venta.c
Nota 2: Para efectuar el pago, el contratista deberá cumplir con lo establecido en la resolución No. 00004 de 2020, en materia de facturación electrónica.
Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: CONSORCIO URBA FASE 1
NIT: 901.765.247-3
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE BOGOTÁ
TIPO CUENTA: CUENTA AHORROS
NÚMERO DE CUENTA: 131237067

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibo a satisfacción de la vigencia y acta de corte parcial (2024).	R.P 5824

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DILOF	11	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VÍAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA.	$ 1.411.511.862,95	$ 1.411.511.862,95	$ 0,00	$ 1.411.511.862,95
TOTAL			$ 1.411.511.862,95	$ 1.411.511.862,95	$ 0,00	$ 1.411.511.862,95

Observaciones:	Valor correspondiente para vigencia 2024

Avance acumulado anterior, para el presente corte y acumulado.	Acumulado anterior: $ 7.422.524.838,84 Avance parcial recibido: $ 1.411.511.862,95 Total Acumulado: $ 8.834.036.701,79
Acta de avance parcial o acta final de obra.	Acta de avance parcial de obra Nro. 9 del 30/09/2024 ingresada en el SECOP II el 04/10/2024.
Memorias de cálculo.	Memorias de cantidades de obra realizadas del periodo 01-septiembre-2024 hasta el 30-septiembre-2024. Ingresada en el SECOP II el 04/10/2024.
En el corte se presentaron mayores y/o menores cantidades de obra:	NO ___SI _X__ . siendo aprobado el balance de mayores y menores cantidades por parte del ordenador del gasto el 09/09/2024.
En el presente corte se presentaron ítems no previstos:	NO ___SI __X___ Autorizado Mediante modificatorio No. 1 de fecha 09/09/2024 .
Documentos requeridos para el trámite de pago:	• Acta de avance parcial. (suscrita entre los contratistas de obra e interventoría). • Facturas de venta (SECOP) II el 02/10/2024. • Certificación de pagos parafiscales y seguridad social (SECOP) II el 02/10/2024. • Certificación pagos FIC (SECOP) II el 02/10/2024. • Memoria de cantidades ejecutadas (SECOP) II el 02/10/2024.
Documento de entrada de bienes en SAP, cuando el contrato los incluya y hayan sido recepcionados:	N/A.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X___.	N/A.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
Pago del Acta Parcial de Obra No. 9	$ 1.411.511.862,95	El valor cancelado se encuentra soportado en los documentos que se anexan y está de acuerdo a lo estipulado en la forma de pago establecida en el contrato.

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FASE 10	02/10/2024	$ 1.411.511.862,95	$0,00	$ 1.411.511.862,95
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 1.411.511.862,95	$0,00	$ 1.411.511.862,95

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: En Bogotá D.C. a los cuatro (04) días del mes de octubre de 2024, se reunieron el señor Arquitecto PRO-03 NELSON ANTONIO CURTIDOR PÁEZ supervisor del contrato de interventoría en representación de la Policía Nacional, el Ingeniero GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO INTEROCCIDENTE y el Ingeniero ALEXANDER CASTILLO PINILLA, en calidad de Representante Legal de la firma CONSORCIO URBA FASE 1.

Lo anterior, en cumplimiento de los términos, características y condiciones establecidas en el Contrato de obra PN DIRAF 06-6-10310-23, CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO – Según se evidencia en el corte de obra del periodo comprendido entre el 01/09/2024 y el 30/09/2024 (ACTA PARCIAL No. 9), en el cual se recibieron las obras realizadas a entera satisfacción cumpliendo con todas las especificaciones técnicas a lo estipulado en el contrato, el cual establece lo siguiente:

PAGOS PARCIALES: Se realizarán pagos parciales de acuerdo al avance porcentual de ejecución de la obra; las actas deben corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitarán una vez la Interventoría y Contratista hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias de cantidades y que la Interventoría haya certificado la ejecución y el recibo a satisfacción de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar el día veinte (20) del mes a facturar.

Es de anotar que la interventoría ejerció el control necesario para verificar el cumplimiento de las presentes obligaciones aplicables y descritas para el contratista de obra y aplicará para si las que competen a su contrato de acuerdo a la indicación de la supervisión, dando aval para el trámite de la presente cuenta.

Nota 1: Se aclara que el ítem 4 de la factura Fase 10 correspondiente a la utilidad, el valor registrado corresponde al 5% de utilidad por valor de $ 55.158.728,52 más el 19% de IVA por valor de $ 10.480.158,42 lo anterior obedece a la parametrización del software utilizado para la facturación electrónica de venta del CONSORCIO URBA FASE 1.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de interventor acredito el cumplimiento parcial de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados en el acta parcial de obra No. 9 cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

En Constancia, firman:

PRO-03 ARQ. NELSON ANTONIO CURTIDOR PAÉZ.
Supervisión contrato de interventoría PN DIRAF No 06-3-10332-23
Comunicación oficial GS-2023-011774-DILOF del 05/12/2023

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
Representante Legal Interventoría
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

ALEXANDER CASTILLO PINILLA
Representante Legal obra
CONSORCIO URBA FASE 1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
GRUPO TECNICO Y SUPERVISION DE PROYECTOS

CEA.3.0-07
16-ECD-003

ARGEP-GUTEP - 3.1

Bogotá D.C., 04 de octubre de 2024

Señora brigadier general
OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ
Directora Logística y Financiera
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: certificación proyecto construcción comando MENEV - DEUIL FASE 1 - C

Teniendo a la comunicación oficial Nro. GS-2024-021931-DILOF del 19/07/2024, al concepto de SEGEN emitido mediante comunicado GS-2024-023185-SEGEN y de acuerdo a las funciones asignadas al señor PRO-03 Arq. NELSON ANTONIO CURTIDOR PÁEZ como supervisor del contrato de interventoría No. 06-3-10332-23, y respecto al contrato de obra No. 06-6-10310-23, se certifica que, en el informe de supervisión No. 10 y trámite de cuenta de la constancia No. 09 correspondiente al periodo de entrega certificado del 01/09/2024 al 30/09/2024, se ajusta a las obligaciones del proceso contractual y al contenido adecuado correspondiente para el respectivo pago, así:

NRO. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	NOMBRAMIENTO SUPERVISOR	ÚLTIMO INFORME SUPERVISIÓN	PERIODICIDAD DEL INFORME DE SUPERVISION
06-3-10332-23	*""INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VÍAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"."*	CONSORCIO INTEROCCIDENTE	GS-2023-01774-DILOF del 05/12/2023	GS-2024-006824-DIFRA del 03/10/2024	Mensual No 10 ejecución del 01/09/2024 al 30/09/2024

No obstante, se realiza la revisión bajo las siguientes consideraciones:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia "Principio de buena fé", se asume que los documentos contenidos están sujetos a este principio y que han contado con la revisión y concepto favorable de la interventoría del proceso y contratista.

Es de anotar que debido a las capacidades técnicas de la Dirección de Infraestructura, a las responsabilidades de cada funcionario y a la imposibilidad de estar presente en el lugar de la obra, en todo momento del desarrollo del proyecto, no es posible la verificación de las cantidades de obra por parte del suscrito, así como realizar el seguimiento día a día de la ejecución y cumplimiento de

compromisos contractuales, es por ello que se contrata una firma especializada para realizar la interventoría del proyecto; dicha ejecución fue supervisada por funcionarios idóneos de la interventoría y adelantada por un contratista que se presume cumple con las condiciones mínimas del proceso, por tal razón, se indica que el contenido del trámite de este periodo son responsabilidad de los profesionales encargados; asumiéndose que estos han sido desarrollados de acuerdo con su conocimiento, experiencia y perfil profesional.

Atentamente,

...

Firmado digitalmente por:
Nombre: Luis Enrique Perez Paez
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Area Gestion De Proyectos
Cédula: 91516508
Dependencia: Grupo Estudios Y Diseños
Unidad: Direccion De Infraestructura
Correo: enrique.perez3436@correo.policia.gov.co
4/10/2024 8:29:49 a. m.

Anexo: no

Carrera 59 26-21 CAN
Teléfono: 5159000
diraf.arinf-secre@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO URBA FASE 1
NIT 901.765.247-3
CR 7 127 48 OF 401
Tel: (601) 79000033
Bogotá - Colombia
urbaingenieria@yahoo.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FASE 10

Señores	POLICIA NACIONAL – DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA		
NIT	800.141.397-5	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 59 No. 26-21 SEGUNDO PISO – DIRECCIÓN DE INFRAESTRCUTURA EXT 9154	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/10/2024, 07:50
Expedición	02/10/2024, 07:50
Vencimiento	02/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL No. 9 2024 CONT 16-01-01-000;06-6-10310-23	1.00	1,103,174,570.50
2	ADMINISTRACION 21%	1.00	231,666,659.80
3	IMPREVISTOS 1%	1.00	11,031,745.71
4	UTILIDAD 5%	1.00	65,638,886.94

Total items: 4

Valor en Letras:
Mil cuatrocientos once millones quinientos once mil ochocientos sesenta y dos pesos m/cte con noventa y cinco cent.

Total Bruto	1,401,031,704.53
IVA 19%	10,480,158.42
Total a Pagar	1,411,511,862.95

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,411,511,862.95

Observaciones:
#$16-01-01-000;06-6-10310-23;nelson.curtidor1012@correo.policia.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764060408687 aprobado en 20231121 prefijo FASE desde el número 1 al 200 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 7,60
CUFE: 1e03c1c3f522b6dcc1de03405e97256edd46ea8aa059c41eda2a0bf459b6ab3144eb00e8c2cd4bf98c915a07668f3f40

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ANEXO DE FACTURACIÓN

ACTA PARCIAL No. 9 - CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA No. 9 DEL CONTRATO No. 06-6-10310-23 CUYO OBJETO ECONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

ACTA PARCIAL No. 9-2024		
CAPITULO		**VALOR**
RELLENOS Y EXCAVACIONES		6.707.049,43
ESTRUCTURAS EN CONCRETOS		325.437.048,85
PAÑETES, AFINADOS E IMPERMEABILIZACIONES		9.552.016,78
REDES HIDROSANITARIAS		16.069.120,50
RED CONTRA INCENDIOS		12.264.486,00
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - ALUMBRADO PÚBLICO		93.139.123,58
URBANISMO		96.384.650,34
NO PREVISTOS		543.621.075,02
TOTAL COSTOS DIRECTOS		**1.103.174.570,50**
ADMINISTRACION	21,00%	**231.666.659,80**
IMPREVISTOS	1,00%	**11.031.745,71**
UTILIDAD	5,00%	**55.158.728,52**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	**10.480.158,42**
VALOR TOTAL		**1.411.511.862,95**

ALEXANDER CASTILLO PINILLA
Rep Legal
CONSORCIO URBA FASE 1

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764060408687

(415)7707212489984(8020) 001876406040868 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901765247	3				

11. Razón social
CONSORCIO URBA FASE 1

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 32

24. Dirección
CR 7 127 48 OF 401

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-11-22 / 03:04:35 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

1001. Apellidos y nombres CASTILLO PINILLA ALEXANDER
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 79574942 1004. DV 3
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO URBA FASE 1

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2023-11-22/15:04:35

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764060408687

(415)7707212489984(8020) 001876406040868 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901765247	3				

11. Razón social
CONSORCIO URBA FASE 1

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO URBA FASE 1 CR 7 127 48 OF 401	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FASE	1	200	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO URBA FASE 1 identificado(a) con NITPJ 9017652473 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 131237067 desde el 20 de octubre de 2023, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 20 de octubre de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14978478077

(415)7707212489984(8020) 000001497847807 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 5 2 4 7	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO URBA FASE 1

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 7 127 48 OF 401

Correo electrónico urbaingenieria@yahoo.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 9 0 0 0 3 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 9 0	2 0 2 3 1 0 1 3	4 2 9 0	2 0 2 3 1 0 1 3	4 1 1 2	4 3 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 4 8 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 02 - 05 / 12 : 52: 36

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión o cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14978478077

(415)7707212489984(8020) 000001497847807 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 5 2 4 7	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 9 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		

Vigencia	
80. Desde	2 0 2 3 0 9 1 5
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14978478077

(415)7707212489984(8020) 000001497847807 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 5 2 4 7	3	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 9 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	7 9 5 7 4 9 4 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASTILLO	PINILLA	ALEXANDER	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 9 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 5 3 8 6 5 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASTILLO	PINILLA	WILLIAM	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 9 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 6 4 7 2 6 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASTILLO	PINILLA	VLADIMIR	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14978478077

(415)7707212489984(8020) 000001497847807 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 5 2 4 7	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 5 4 6 4 4 2	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: URBAINGENIERIA S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	9 8	2 0 2 3 0 9 1 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 0 8 2 3 3	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: URBANISCOM S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	2	2 0 2 3 0 9 1 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICACIÓN DE APORTES

En mi condición de Representante Legal, de URBAINGENIERIA SAS, identificada con Nit 901.5456.442-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito certificar que la compañía ha efectuado el pago por los conceptos de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

FIRMA_____

ALEXANDER CASTILLO PINILLA

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA (REPRESENTANTE LEGAL)

Fecha: Septiembre 30 de 2024

CARRERA 7 No. 127-48 OF. 401
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
PBX: 722 0258
URBAINGENIERIA@YAHOO.COM

CERTIFICACIÓN DE APORTES

En mi condición de Revisor Fiscal, de URBANISCOM S.A.S., identificada con Nit 830.008.233-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito certificar o auditar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por los conceptos de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

FIRMA_____
MANUEL J. MONSOA
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA (REVISOR FISCAL)
TARJETA PROFESIONAL: No. 46199-T

Fecha: Septiembre 30 de 2024

CARRERA 7 No. 127-48 OF. 401
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
PBX: 722 0258
URBAINGENIERIA@YAHOO.COM

CERTIFICACIÓN DE APORTES

En nuestra condición de Revisor Fiscal y Representante Legal respectivamente, del CONSORCIO URBA FASE 1, identificada con Nit 901.765.247-3, nos permitimos certificar o auditar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, se ha efectuado el pago por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

FIRMA_____
MANUEL J. MONGUA
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA (REVISOR FISCAL)
TARJETA PROFESIONAL: No. 46199-T

FIRMA_____
WILLIAM CASTILLO PINILLA
C.C. 79.538.659 DE BOGOTA

Fecha: Septiembre 30 de 2024

CARRERA 7 No. 127-48 OF. 401
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
PBX: 722 0255
URBAINGENIERIA@YAHOO.COM

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 628202

martes, 01 de octubre de 2024, 12:16:29 PM

Detalle

$4,494,747.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	A SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******7067
Descripción:	Pago Ordinario - FIC
Fecha y hora inicio transacción	2024-10-01 12:15:38
NIT del comercio	899999034
Número de factura	117812572
Código Único de Seguimiento	950361912
Dirección IP:	186.31.204.245
Referencia 1:	186.31.204.245
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	9015464424

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DE BOGOTA	117812572	950361912	01/10/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901765247**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.31.204.245**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 4,494,747.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 4,494,747.00	COP$ 4,494,747.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DE BOGOTA	117812572	950361912	01/10/2024

Número de Identificación
901765247

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO URBA FASE 1

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
3

Naturaleza Juridica
01

Departamento
BOGOTA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
cra 7 127 48 OF 401

Ciudad de Domicilio
BOGOTA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,7220258

Correo electrónico
CONTABILIDAD@URBAINGENIERIA.CO

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Huila

Regional Centros SIIF
36-02-00-041-000000

Número Licencia de Obra
10/20-278

Número Contrato de Obra
06-6-10310-23

Nombre Obra
POLICIA NEIVA

Fecha Inicio Obra
12/12/2023

Fecha Terminación Obra
12/02/2027

Ciudad de Ejecución de la Obra
NEIVA

Tipo FIC
Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
9

Costo Total de Obra a Todo Costo
124483045.00

Costo Total Mano de Obra
449474729.00

Número de Trabajadores en el Periodo
9

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
4494747.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
4494747.00

ecollect
Seguro para ti

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 226202

martes, 01 de octubre de 2024, 12:12:28 PM

Detalle

$311,208.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	A SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******7067
Descripción:	Pago Ordinario - FIC
Fecha y hora inicio transacción	2024-10-01 12:11:19
NIT del comercio	899999034
Número de factura	117812139
Código Único de Seguimiento	950345836
Dirección IP:	186.31.204.245
Referencia 1:	186.31.204.245
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	9015464424

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DE BOGOTA	117812139	950345836	01/10/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901765247**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.31.204.245**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 311,208.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 311,208.00	COP$ 311,208.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DE BOGOTA	117812139	950345836	01/10/2024

Número de Identificación
901765247

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO URBA FASE 1

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
3

Naturaleza Juridica
01

Departamento
BOGOTA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
cra 7 127 48 OF 401

Ciudad de Domicilio
BOGOTA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,7220258

Correo electrónico
CONTABILIDAD@URBAINGENIERIA.CO

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Huila

Regional Centros SIIF
36-02-00-041-000000

Número Licencia de Obra
10/20-278

Número Contrato de Obra
06-6-10310-23

Nombre Obra
POLICIA NEIVA

Fecha Inicio Obra
12/12/2023

Fecha Terminación Obra
12/02/2027

Ciudad de Ejecución de la Obra
neiva

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
9

Costo Total de Obra a Todo Costo
124483045.00

Costo Total Mano de Obra
449474729.00

Número de Trabajadores en el Periodo
9

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
311208.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
311208.00

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 732202

martes, 01 de octubre de 2024, 12:07:32 PM

Detalle

$292,500.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	A SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******7067
Descripción:	Pago Ordinario - FIC
Fecha y hora inicio transacción	2024-10-01 12:06:32
NIT del comercio	899999034
Número de factura	117811571
Código Único de Seguimiento	950326658
Dirección IP:	186.31.204.245
Referencia 1:	186.31.204.245
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	9015464424

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DE BOGOTA	117811571	950326658	01/10/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901765247**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.31.204.245**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 292,500.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 292,500.00	COP$ 292,500.00

ecollect
Pagos para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DE BOGOTA	117811571	950326658	01/10/2024

Número de Identificación
901765247

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO URBA FASE 1

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
3

Naturaleza Juridica
01

Departamento
BOGOTA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
cra 7 127 48 OF 401

Ciudad de Domicilio
BOGOTA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,7220258

Correo electrónico
CONTABILIDAD@URBAINGENIERIA.CO

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Huila

Regional Centros SIIF
36-02-00-041-000000

Número Licencia de Obra
10/20-278

Número Contrato de Obra
06-6-10310-23

Nombre Obra
POLICIA NEIVA

Fecha Inicio Obra
12/12/2023

Fecha Terminación Obra
12/02/2027

Ciudad de Ejecución de la Obra
NEIVA

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
9

Costo Total de Obra a Todo Costo
124483045.00

Costo Total Mano de Obra
449474729.00

Número de Trabajadores en el Periodo
9

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
292500.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
292500.00

ecollect
Seguro para ti

URBAINGENIERIA
CONSORCIO URBA FASE 1

CONSORCIO INTEROCCIDENTE

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 009

POLICIA NA

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA (MENEV) Y EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA (DEHUI).

1. Contratista de Obra:	CONSORCIO URBA FASE 1
2. Contratista de Interventoria:	CONSORCIO INTEROCCIDENTE
Periodo	Del 1 al 30 de septiembre de 2024

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO		12 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO		31 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	47.436.336.117,61
ADICION No. 1		
FECHA ADICIÓN No. 1		
ADICION No. 2		
FECHA ADICIÓN No. 2		
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$	47.436.336.117,61

30 SEP 2024

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA		ACUMULADOS			
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	ANTERIOR		PRESENTE	
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	DEUIL - BODEGAS - EXTERIORES										$ 6.360.607.085,82
1	PRELIMINARES										
1,1	Suministro e instalación de Cerramiento preliminar en polisombra o tela verde para cerramiento, h= 2 m y varas de corredor c/2.5 m incluye concreto 2000 psi para traque de varas	ML		$ 12.805,00	$ -						
1,2	Replanteo y localización	M2	10.838,31	$ 6.893,00	$ 74.708.470,83	284,93	$ 1.964.022,49	10.553,38	$ 72.744.448,34	10.838,31	$ 74.708.470,83
2	RELLENOS Y EXCAVACIONES				$ -						
2,1	Excavación mecánica según planos. Incluye cargue, transporte y disposición final de sobrantes a sitio autorizado por el ente ambiental encargado.	m3	11.022,59	$ 50.447,00	$ 556.056.597,73	94,02	$ 4.743.026,94	9.280,01	$ 468.148.664,47	9.374,03	$ 472.891.691,41
2,1	Excavación mecánica según planos. Incluye cargue, transporte y disposición final de sobrantes a sitio autorizado por el ente ambiental encargado. VIA 1	m3	2.712,15	$ 32.655,00	$ 88.565.258,25			2.696,66	$ 88.059.432,30	2.696,66	$ 88.059.432,30
2,2	Relleno en Recebo comun Compactado	m3	6.592,89	$ 101.103,00	$ 666.560.957,67			5.408,14	$ 546.779.178,42	5.408,14	$ 546.779.178,42
2,5	Excavación mecanica para tanque de 281m3	m3	700,00	$ 26.671,00	$ 18.669.700,00						
2,11	Relleno en Recebo comun Compactado para tanque de 281m3	m3	70,00	$ 30.125,00	$ 2.108.750,00						
2,14	Base granular norma INVIAS para pavimento rigido.Incluye suministro,extendida, nivelación, humedecimiento y compactacion con vibrocompactador VIA 0	m3		$ 83.972,00	$ -						
2,14	Base granular norma INVIAS para pavimento rigido.Incluye suministro,extendida, nivelación, humedecimiento y compactacion con vibrocompactador VIA 1	m3		$ 97.848,00	$ -						
2,15	Excavación mecanica para Losa de soporte Subestacion 5	m3	10,00	$ 50.447,00	$ 504.470,00						
2,16	Relleno en Recebo comun Compactado para Losa de soporte Subestacion 5	m3	10,00	$ 101.103,00	$ 1.011.030,00						
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETOS				$ -						
3,1	Acero para Elementos de cimentación, incluye vigas y zapatas fy=60000 PSI	kg	55.256,63	$ 5.800,00	$ 320.488.454,00			54.213,77	$ 314.439.866,00	54.213,77	$ 314.439.866,00
3,2	Concreto para Zapatas y Vigas de Cimentación f'c=5000PSI	m3	540,07	$ 864.015,00	$ 466.628.581,05	41,01	$ 35.433.255,15	466,65	$ 403.192.599,75	507,66	$ 438.625.854,90
3,3	Acero para Columnas fy=60000 PSI	kg	99.910,13	$ 5.800,00	$ 562.078.754,00	1.566,51	$ 9.085.758,00	95.339,03	$ 552.966.374,00	96.905,54	$ 562.052.132,00
3,4	Concreto para Columnas f'c=5000PSI	m3	439,98	$ 1.288.169,00	$ 566.768.596,62	25,89	$ 33.350.695,41	293,18	$ 377.665.387,42	319,07	$ 411.016.082,83
3,5	Malla electrosoldada para losa contrapiso	kg	9.732,10	$ 5.449,00	$ 53.030.212,90			7.363,25	$ 40.122.349,25	7.363,25	$ 40.122.349,25
3,6	Losa de contrapiso en concreto	m3	265,28	$ 576.911,00	$ 153.042.950,08	10,37	$ 5.982.567,07	198,59	$ 114.568.755,49	208,96	$ 120.551.322,56
3,7	Acero para placa en concreto de segundo piso. Incluye vigas, viguetas fy=60000 PSI	kg	49.777,86	$ 5.800,00	$ 288.711.588,00			49.720,83	$ 288.380.814,00	49.720,83	$ 288.380.814,00
3,8	Concreto para vigas aereas y losa de entrepiso segundo piso f'c=5000PSI	m3	379,05	$ 906.884,00	$ 343.754.380,20			301,51	$ 273.434.594,84	301,51	$ 273.434.594,84
3,9	Acero para placa en concreto de tercer piso. Incluye vigas, viguetas fy=60000 PSI	kg	27.548,04	$ 5.800,00	$ 159.778.632,00			23.386,22	$ 135.640.076,00	23.386,22	$ 135.640.076,00
3, 10	Concreto para vigas aereas y losa de entrepiso tercer piso f'c=5000PSI	m3	271,47	$ 906.884,00	$ 246.191.799,48	32,93	$ 29.863.690,12	197,25	$ 178.882.869,00	230,18	$ 208.746.559,12
3,13	Acero para placa en concreto de Cubierta. Incluye vigas, viguetas fy=60000 PSI	kg	50.581,88	$ 5.800,00	$ 293.374.904,00			44.870,05	$ 260.246.290,00	44.870,05	$ 260.246.290,00
3,14	Concreto para vigas aereas y losa de Cubierta f'c=5000PSI	m3	614,07	$ 906.884,00	$ 556.890.257,88			462,25	$ 419.207.129,00	462,25	$ 419.207.129,00
3,17	Escalera en concreto de dos tramos con descanso h=4.0m	un		$ 5.263.925,00	$ -						
3,18	Escalera en concreto de un tramo con descanso h=4.0m	un		$ 6.696.616,00	$ -						
3,19	Acero A-50 para cubierta metálica	kg		$ 13.500,00	$ -						
3, 20	Placa en concreto f'c=5000PSI para cubierta metálica	m3		$ 851.178,00	$ -						
3,25	Tanque en concreto f'c=28MPa para agua potable volumen 281m3. Impermeabilizado y revestido incluye pasamuros, tuberia, ventilación y tapa de acceso	un	1,00	$ 151.129.960,00	$ 151.129.960,00						

3,2.	Sardinel H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Inc. Sumin, Formalet. y Const.) VIA 0	Ml		$ 42.740,00	$ -							
3,28	Sardinel H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra. Inc. Sumin, Formalet. y Const.) VIA 1	ml		$ 32.683,00	$ -							
3,29	Losa de concreto MR43 para pavimento rigido. (Suministro, Formateteado, Colocación, Acabado, Incluye Acero, Curado y Sellado de Juntas con cordon de polietileno y material sellante) VIA 0	m3	1.131,94	$ 694.358,00	$ 785.971.594,52	298,05	$ 206.953.401,90	141,56	$ 98.293.318,46	439,61	$ 305.246.720,38	
3,29	Losa de concreto MR43 para pavimento rigido. (Suministro, Formateteado, Colocación, Acabado, Incluye Acero, Curado y sellado de Juntas con cordon de polietileno y material sellante) VIA 1	m3	313,66	$ 598.851,00	$ 187.835.604,66			203,42	$ 121.818.270,42	203,42	$ 121.818.270,42	
3,3	Acero para Losa de soporte Subestacion 5	kg	660,00	$ 5.576,00	$ 3.680.160,00							
3,31	Concreto para Losa de soporte Subestacion 5	m3	7,00	$ 576.911,00	$ 4.038.377,00							
4	MAMPOSTERIA				$ -							
4,1	Suministro e instalación de Mamposteria en ladrillo tolete Muros 25 cm.	M2		$ 118.300,00	$ -							
4,2	Suministro e instalación de Mamposteria en ladrillo tolete Muros 20 cm.	M2		$ 95.000,00	$ -							
4,3	Suministro e instalación de Mamposteria en ladrillo tolete Muros 12 cm.	M2		$ 81.600,00	$ -							
4,10	Suministro e instalación de Mamposteria en ladrillo tolete Muros 30 cm.	M2		$ 126.000,00	$ -							
4,16	Suministro e instalación de Bordillo ventanas h. 0.15 mts, en concreto 2500 psi 25 cm	ML	229,54	$ 90.698,00	$ 20.818.818,92							
4,20	Suministro e instalación de poyo ducha h. 0.10 mts, en concreto 2500 psi, esp. 10 cm	ML	10,61	$ 82.904,00	$ 879.611,44							
4,21	Suministro e instalación de bordillo Ventana h. 0.10 mts, en concreto 2500 psi, muro de 15 cm	ML	56,39	$ 86.622,00	$ 4.884.614,58							
4,22	Suministro e instalación de bordillo cubierta h. 0.20 mts, en concreto 2500 psi, muro de 20 cm	M2	15,20	$ 86.622,00	$ 1.316.654,40							
4,23	Suministro e instalación de bordillo cubierta h. 0.20 mts, en concreto 2500 psi, muro de 20 cm	ML	507,51	$ 90.698,00	$ 46.030.141,98							
4,27	Suministro e instalación de Poyos muebles h. 0.10 mts, en concreto 2500 psi, fondo 50 cm	ML	25,30	$ 117.175,00	$ 2.964.527,50							
4,30	Suministro e instalación de cañuela en concreto 2500 psi	ML	403,89	$ 82.469,00	$ 33.308.404,41			86,00	$ 7.092.334,00	86,00	$ 7.092.334,00	
4,31	Suministro e instalación de bordillo en concreto 2500 psi	ML	771,08	$ 86.873,00	$ 66.986.032,84							
4,32	Suministro e instalación de parapetos en concreto 2500 psi, altura y espesor de acuerdo al muro de cada edificio	ML	247,05	$ 182.407,00	$ 45.063.649,35							
4,35	Suministro e instalación de tapas para ductos, en concreto 2500 psi e=8 cm, tapa sin angio, ver detalle de planos	M2	60,07	$ 145.024,00	$ 8.711.591,68							
4,36	Suministro e instalación de dinteles h= 10 cm, en concreto 2500 psi 12 cm	ML	10,92	$ 112.623,00	$ 1.229.843,16							
4,37	Suministro e instalación de dinteles h= 10 cm, en concreto 2500 psi 20 cm	ML	39,66	$ 114.815,00	$ 4.553.562,90							
4,38	Suministro e instalación de dinteles h= 10 cm, en concreto 2500 psi 25 cm	ML	191,84	$ 117.008,00	$ 22.446.814,72							
4,42	Suministro e instalación de dinteles h= 10 cm, en concreto 2500 psi 45 cm	ML	8,00	$ 116.240,00	$ 929.920,00							
5	PAÑETES, AFINADOS E IMPERMEABILIZACIONES		1.287,51		$ -							
5,0	Suministro e instalacion de Pañete impermeabilizado liso interiores 1:3 incluye filos y dilataciones. Espesor de 2 cm	M2	1.287,51	$ 42.102,00	$ 54.206.746,02	107,65	$ 4.532.280,30			107,65	$ 4.532.280,30	
5,1	Suministro e instalación de Pañete impermeabilizado fachadas 1:3 incluye filos y dilataciones. Espesor de 2 cm, bordes de vanos	ML	2.050,10	$ 40.271,00	$ 82.559.577,10							
5,2	Suministro e instalación de Pañete liso muros interiores 1:3. Espesor de 2cm	M2	4.771,63	$ 41.240,00	$ 196.781.850,26			1.378,45	$ 56.847.278,00	1.378,45	$ 56.847.278,00	
5,3	Suministro e instalación de Pañete impermeabilizado liso fachadas 1:3 incluye filos y dilataciones. Espesor de 2 cm	M2	3.734,79	$ 42.569,00	$ 158.986.275,51	117,92	$ 5.019.736,48			117,92	$ 5.019.736,48	
5,4	Suministro e instalación de Pañete liso muros interiores 1:3 incluye filos y dilataciones e= 2cm, bordes de vanos	ML	2.015,55	$ 43.674,00	$ 88.430.240,70							
5,10	Suministro e instalación de afinado liso para pisos, escalera y cubierta	M2	7.096,41	$ 25.254,00	$ 179.212.738,14							
5,11	Suministro e instalación de manto Morter Plast al 80 para impermeabilizaciòn cubiertas	M2	2.203,14	$ 36.855,00	$ 81.196.724,70							
5,13	Suministro e instalación de aislamiento termico para muros y cubierta	M2	1.543,09	$ 69.654,00	$ 107.482.390,86							
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				$ -							
6,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P 4" RDE-13.5 TIPO 1, GRADO 1. (INCLUYE ACCESORIOS, ADITAMENTOS)	ML	152,41	$ 134.348,00	$ 20.475.978,68							

6,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P 3" RDE-13.5 TIPO 1, GRADO 1. (INCLUYE ACCESORIOS, ADITAMENTOS)	ML	391,60	$ 106.023,00	$ 41.518.606,80							
6,1,3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P RDE-21 2-1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS)	ML	202,78	$ 81.281,00	$ 16.482.161,18							
6,1,4	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P RDE-21 2" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS)	ML	86,18	$ 36.135,00	$ 3.114.114,30	14,50	$ 523.957,50			14,50	$ 523.957,50
6,1,5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P RDE-21 1-1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS)	ML	72,82	$ 28.560,00	$ 2.079.739,20	18,00	$ 514.080,00			18,00	$ 514.080,00
6,1,6	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P RDE-21 1-1/4" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS)	ML	109,38	$ 20.329,00	$ 2.223.586,02	20,40	$ 414.711,60			20,40	$ 414.711,60
6,1,8	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P RDE-13.5 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS)	ML	90,87	$ 12.930,00	$ 1.174.949,10	6,90	$ 89.217,00			6,90	$ 89.217,00
6,1,9	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P RDE-9 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS)	ML	150,51	$ 11.460,00	$ 1.724.844,60						
6,1,10	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO PVC-P DUCHA 1/2"	UN	2,00	$ 26.266,00	$ 52.532,00	1,00	$ 26.266,00			1,00	$ 26.266,00
6,1,11	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO PVC-P ORINAL / DUCHA / LAVAMANOS 3/4"	UN	36,00	$ 26.948,00	$ 970.128,00	2,00	$ 53.896,00			2,00	$ 53.896,00
6,1,12	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO PVC-P LAVAMANOS / LAVAPLATOS / POCETA / ASEO 1/2"	UN	17,00	$ 23.391,00	$ 397.647,00	7,00	$ 163.737,00			7,00	$ 163.737,00
6,1,13	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO PVC-P SANITARIO DE TANQUE 1/2"	UN	3,00	$ 20.553,00	$ 61.659,00						
6,1,14	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO PVC-P SANITARIO FLUXOMETRO 1-1/4"	UN	37,00	$ 43.717,00	$ 1.617.529,00	7,00	$ 306.019,00			7,00	$ 306.019,00
6,1,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PESADO CORTINA TIPO RED WHITE ROSCAR 2"	UN	7,00	$ 511.084,00	$ 3.577.588,00						
6,1,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PESADO CORTINA TIPO RED WHITE ROSCAR 1-1/2"	UN	6,00	$ 345.039,00	$ 2.070.234,00	3,00	$ 1.035.117,00			3,00	$ 1.035.117,00
6,1,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PESADO CORTINA TIPO RED WHITE ROSCAR 1-1/4"	UN	1,00	$ 280.502,00	$ 280.502,00	1,00	$ 280.502,00			1,00	$ 280.502,00
6,1,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PESADO CORTINA TIPO RED WHITE ROSCAR 1/2"	UN	15,00	$ 85.747,00	$ 1.286.205,00						
6,1,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE PURGA 3/4"	UN	4,00	$ 134.005,00	$ 536.020,00						
6,2	RED AGUAS RESIDUALES				$ -						
6,2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 4" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	ML	153,88	$ 58.623,00	$ 9.020.907,24	22,60	$ 1.324.879,80			22,60	$ 1.324.879,80
6,2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 3" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	ML	71,48	$ 45.606,00	$ 3.259.916,88	23,00	$ 1.048.938,00			23,00	$ 1.048.938,00
6,2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 2" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	ML	63,41	$ 36.190,00	$ 2.294.807,90	11,30	$ 408.947,00			11,30	$ 408.947,00
6,2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-VENT 2" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	ML	126,84	$ 27.229,00	$ 3.453.726,36						
6,2,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 4"	UN	40,00	$ 59.428,00	$ 2.377.120,00	13,00	$ 772.564,00			13,00	$ 772.564,00
6,2,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 3"	UN	10,00	$ 40.165,00	$ 401.650,00	8,00	$ 321.320,00			8,00	$ 321.320,00
6,2,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 2"	UN	37,00	$ 31.965,00	$ 1.182.705,00	13,00	$ 415.545,00			13,00	$ 415.545,00
6,2,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA SIFÓN 2"	UN	23,00	$ 49.514,00	$ 1.138.822,00	4,00	$ 198.056,00			4,00	$ 198.056,00
6,2,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA SIFÓN 3"	UN	32,00	$ 67.681,00	$ 2.165.792,00	32,00	$ 2.165.792,00			32,00	$ 2.165.792,00
6,2,12	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 110mm	ML	65,01	$ 48.120,00	$ 3.128.281,20			9,00	$ 433.080,00	9,00	$ 433.080,00
6,2,13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 160mm	ML	56,70	$ 73.661,00	$ 4.176.578,70			10,80	$ 795.538,80	10,80	$ 795.538,80
6,2,14	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 200mm	ML	144,77	$ 103.405,00	$ 14.969.941,85			135,00	$ 13.959.675,00	135,00	$ 13.959.675,00
6,2,15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 250mm	ML	443,10	$ 173.373,00	$ 76.821.576,30			95,45	$ 16.548.452,85	95,45	$ 16.548.452,85
6,2,16	CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCIÓN 60X60cm H máx:1.0m	UN	7,00	$ 502.824,00	$ 3.519.768,00						
6,2,17	CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCIÓN 80X80cm H máx:1.5m	UN	5,00	$ 671.863,00	$ 3.359.315,00						

6,2,19	POZO DE INSPECCION CILINDRICO DIAMETRO INTERNO 1.20M, PLACA DE FONDO Y TAPA SUPERIOR EN CONCRETO f'c=21MPa. MUROS EN MAMPOSTERIA TOLETE MACIZO. ALTURA VARIABLE ENTRE 1.20M Y 2.50M. CON ESCALERA DE GATO Y TAPA EN POLICONCRETO NO RECICLABLE HOMOLOGADAS	UN	9,00	$ 3.263.248,00	$ 29.369.232,00			7,00	$ 22.842.736,00	7,00	$ 22.842.736,00
6,2,20	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN SIN CLASIFICAR. INCLUYE TRASIEGO, REPALEO Y DISPOSICION FINAL	M3	1.561,52	$ 50.744,00	$ 79.237.770,88			965,84	$ 49.010.584,96	965,84	$ 49.010.584,96
6,2,21	RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. INCLUYE COMPACTACION	M3	780,00	$ 26.668,00	$ 20.801.040,00			776,31	$ 20.702.635,08	776,31	$ 20.702.635,08
6,2,22	RELLENO CON ARENA PARA TAPAR TUBERIAS ENTERRADAS. INCLUYE COMPACTACION MANUAL	M3	622,91	$ 104.114,00	$ 64.853.651,74			100,95	$ 10.510.308,30	100,95	$ 10.510.308,30
6,2,23	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P 6" RDE-13.5 TIPO 1, GRADO 1. (INCLUYE ACCESORIOS, ADITAMENTOS)	ML	473,70	$ 316.320,00	$ 149.840.784,00						
6,3,	**RED AGUAS LLUVIAS**				$ -						
6,3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PVC-S 4" COLECTORES Y BAJANTES (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	ML	381,80	$ 57.574,00	$ 21.970.238,40	182,80	$ 10.524.527,20			182,80	$ 10.524.527,20
6,3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PVC-S 3" COLECTORES Y BAJANTES (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	ML	223,19	$ 44.416,00	$ 9.913.207,04	5,60	$ 248.729,60			5,60	$ 248.729,60
6,3,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA SIFÓN 3" (INCLUYE TRAGANTE TIPO CUPULA)	UN	87,00	$ 59.426,00	$ 5.170.062,00						
6,3,6	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 110mm	ML	157,31	$ 48.718,00	$ 7.663.828,58						
6,3,8	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 200mm	ML	247,40	$ 112.187,00	$ 27.755.063,80			129,15	$ 14.488.951,05	129,15	$ 14.488.951,05
6,3,9	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 250mm	ML	63,60	$ 171.608,00	$ 10.914.268,80			18,00	$ 3.088.944,00	18,00	$ 3.088.944,00
6,3,10	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 315mm	ML	78,44	$ 248.414,00	$ 19.485.594,16			39,00	$ 9.688.146,00	39,00	$ 9.688.146,00
6,3,12	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 400mm	ML	36,60	$ 414.647,00	$ 15.176.080,20						
6,3,13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 450mm	ML	36,73	$ 513.298,00	$ 18.853.435,54						
6,3,14	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 500mm	ML	39,28	$ 559.816,00	$ 21.989.572,48						
6,3,15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 24"	ML	175,05	$ 807.534,00	$ 141.358.826,70			139,30	$ 112.489.486,20	139,30	$ 112.489.486,20
6,3,16	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 30"	ML	355,73	$ 1.262.021,00	$ 448.938.730,33			68,13	$ 85.981.490,73	68,13	$ 85.981.490,73
6,3,18	CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCIÓN 80X80cm H máx:1.5m	UN	12,00	$ 671.863,00	$ 8.062.356,00						
6,3,19	POZO DE INSPECCION CILINDRICO DIAMETRO INTERNO 1.20M, PLACA DE FONDO Y TAPA SUPERIOR EN CONCRETO f'c=21MPa. MUROS EN MAMPOSTERIA TOLETE MACIZO. ALTURA VARIABLE ENTRE 1.20M Y 2.50M. CON ESCALERA DE GATO Y TAPA EN POLICONCRETO NO RECICLABLE HOMOLOGADAS	UN	20,00	$ 3.263.248,00	$ 65.264.960,00			10,00	$ 32.632.480,00	10,00	$ 32.632.480,00
6,3,20	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-100 ALTURA HASTA 2,0, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA Y TAPA. INCLUYE EXCAVACION MANUAL	UN	29,00	$ 1.687.007,00	$ 48.923.203,00						
6,3,21	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN SIN CLASIFICAR. INCLUYE TRASIEGO, REPALEO Y DISPOSICION FINAL	M3	3.035,41	$ 31.462,00	$ 95.500.069,42			247,80	$ 7.796.283,60	247,80	$ 7.796.283,60
6,4,	**INSTALACION DE EQUIPOS AGUA POTABLE**				$ -						
6,4,2	INSTALACION DE EQUIPO DE PRESION CON CAUDAL=6,35 l/s, PRESION=78,99 PSI, POTENCIA=10,06 HP. INCLUYE TODOS LOS ADITAMENTOS NECESARIOS QUE SE REQUIERAN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE TODA LA TUBERIA AL INTERIOR DEL CUARTO DE BOMBAS HASTA ENTREGA	UN	1,00	$ 10.696.386,00	$ 10.696.386,00						
7	**INSTALACIONES RED CONTRA INCENDIO**				$ -						
7,2	**VÁLVULAS Y ELECTROVÁLVULAS HI-FOG**				$ -						
7,2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE CONTROL MODELO SBA - 40 CÓDIGO D06171 CON INDICADOR DE PASO DE AGUA, MANÓMETRO, TOMA DE PRUEBAS Y VÁLVULA SUPERVISADA DE CIERRE Y APERTURA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO Y ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERÍA DE 38 MM	UN	5,00	$ 1.022.372,00	$ 5.111.860,00						
7,2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE CONTROL MODELO SVA -20 CÓDIGO D00016 CON INDICADOR DE PASO DE AGUA, MANÓMETRO, TOMA DE PRUEBAS Y VÁLVULA SUPERVISADA DE CIERRE Y APERTURA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO CON ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERÍA DE 30 MM	UN	2,00	$ 6.948.710,00	$ 13.897.420,00						

7,2,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE BOLA DE RO INOXIDABLE PARA TUBERÍA DE 12 MM CON LIMIT CH, CÓDIGO D30005 PARA PURGA DE LA ALACIÓN	UN	7,00	$ 185.117,00	$ 10,00						
7,3	BOQUILLAS NEBULIZADORAS HI-FOG				$ -						
7,3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA 2000 MODELO C20-57C/0 PARA ALTA PRESIÓN, EQUIPADAS CON FILTRO EN SU ENTRADA CON UN FACTOR K DE 4.10, TARADA CON UNA AMPOLLA FUSIBLE A 57 °C, CON EL CORRESPONDIENTE CONECTOR (EQUIPADO CON OBÚS) A LA LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 12 MM CON EMBELLECEDOR PARA SER INSTALADO EN PLACA DE FALSO TECHO.	UN	323,00	$ 118.583,00	$ 38.302.309,00						
7,3,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA 2000 MODELO C30-57C/0 PARA ALTA PRESIÓN, EQUIPADAS CON FILTRO EN SU ENTRADA CON UN FACTOR K DE 4,10, TARADA CON UNA AMPOLLA FUSIBLE A 57 °C, CON EL CORRESPONDIENTE CONECTOR (EQUIPADO CON OBÚS) A LA LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 12 MM CON EMBELLECEDOR PARA SER INSTALADO EN PLACA DE FALSO TECHO.	UN	7,00	$ 309.828,00	$ 2.168.796,00						
7,3,2-	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA 2000 MODELO C30-57C/0 PARA ALTA PRESIÓN, EQUIPADAS CON FILTRO EN SU ENTRADA CON UN FACTOR K DE 4,10, TARADA CON UNA AMPOLLA FUSIBLE A 57 °C, CON EL CORRESPONDIENTE CONECTOR (EQUIPADO CON OBÚS) A LA LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 12 MM CON EMBELLECEDOR PARA SER INSTALADO EN PLACA DE FALSO TECHO. BODEGA	UN	26,00	$ 321.756,00	$ 8.365.656,00						
7,3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA MODELO 1N 1MC 6MC 10RA CÓDIGO C20034 PARA ALTA PRESIÓN, EQUIPADA CON UNA TOBERA CENTRAL Y SEIS TOBERAS EN EL CONO, TARADA CON UNA AMPOLLA FUSIBLE A 57 °C CON EL CORRESPONDIENTE CONECTOR A LA TUBERÍA DE 12 MM Y EMBELLECEDOR PARA SER INSTALADO EN PLACA DE FALSO TECHO.	UN	101,00	$ 678.197,00	$ 68.497.897,00						
7,3,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA MARCA HI-FOG MODELO 5N 1MC 8MC 10RA CÓDIGO C22145 PARA ALTA PRESIÓN, EQUIPADA CON UNA TOBERA CENTRAL Y OCHO TOBERAS EN EL CONO, TARADA CON UNA AMPOLLA FUSIBLE A 57 °C CON EL CORRESPONDIENTE CONECTOR A LA TUBERÍA DE 12 MM Y EMBELLECEDOR PARA SER INSTALADO EN PLACA DE FALSO TECHO.	UN	54,00	$ 555.675,00	$ 30.006.450,00						
7,4	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE				$ -						
7,4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 38 MM X 3,0 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF.	ML	382,75	$ 632.190,00	$ 241.970.722,50	19,40	$ 12.264.486,00			19,40	$ 12.264.486,00
7,4,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 30 MM X 2,5 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF.	ML	706,54	$ 568.005,00	$ 401.318.252,70						
7,4,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 16 MM X 1,5 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF.	ML	317,80	$ 337.202,00	$ 107.162.795,60						
7,4,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 12 MM X 1,2 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF.	ML	688,10	$ 250.467,00	$ 172.346.342,70						
7,5	GABINETES CONTRA INCENDIOS				$ -						
7,5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE DEVANADERA CÓDIGO A20500, CON 22 METROS DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DE 1/2" MONTADA SOBRE DEVANADERA AUTOMÁTICA, CON ENCHUFE RÁPIDO DE ACERO INOXIDABLE	UN	17,00	$ 11.014.295,00	$ 187.243.015,00						

7,5,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LANZA CÓDIGO [illegible]10,A CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE Y [illegible]ZAL HI-FOG DE CAUDAL REGULABLE [illegible]UALMENTE, CON ENCHUFE RÁPIDO.	UN	17,00	$ 791.986,00	$ [illegible]62,00							
7,5,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PROTECTORA PARA LA VÁLVULA EN CHAPA DE 1 MM DE ESPESOR DE 350 * 350 *120 MM CON TAPA Y PLÁSTICO POLIESTIRENO ACABADA EN PINTURA POLIESTER RAL 3002 SECADO AL HORNO	UN	17,00	$ 629.599,00	$ 10.703.183,00							
8	INSTALACIONES ELECTRICAS				$ -							
8,1	ALIMENTADORES BAJA TENSION Y CANALIZACION				$ -							
8,1,1	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N8 FASES + 1N8 NEUTRO + 1N8 TIERRA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	268,00	$ 52.465,00	$ 14.060.620,00							
8,1,4	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N6 FASES + 1N6 NEUTRO + 1N6 TIERRA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	1.270,00	$ 65.100,00	$ 82.677.000,00							
8,1,6	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE COBRE AWG 3N4 FASES + 1N4 NEUTRO + 1N8 TIERRA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	220,00	$ 83.672,00	$ 18.407.840,00							
8,1,7	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N2 FASES + 1N2 NEUTRO + 1N8 TIERRA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	505,00	$ 114.480,00	$ 57.812.400,00							
8,1,9	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE CABLE DE COBRE AWG 3N1/0 FASES + 1N1/0 NEUTRO + 1N6 TIERRA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	85,00	$ 164.448,00	$ 13.978.080,00							
8,1,14	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N(4/0) FASES + 1N(4/0) NEUTRO + 1N2 TIERRA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	215,00	$ 322.304,00	$ 69.295.360,00							
8,1,15	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N8 FASES + 1N4 NEUTRO + 1N8 TIERRA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	15,00	$ 88.521,00	$ 1.327.815,00							
8,1,17	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N2(250) KCMIL FASES + 1N2/0 TIERRA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	102,50	$ 540.671,00	$ 55.439.277,50							
8,1,22	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N2 FASES + 1N2/0 NEUTRO + 1N4 TIERRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	10,50	$ 163.020,00	$ 1.711.710,00							
8,1,24	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N2(1/0) FASES + 1N2(1/0) NEUTRO +1N2(6), TIERRA, INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	98,40	$ 299.547,00	$ 29.475.424,80							
8,1,25	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N2(250) KCMIL FASES + 1N2(250) KCMILNEUTRO + 1N2/0 TIERRA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	15,00	$ 696.149,00	$ 10.442.235,00							
8,1,28	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N11(500) KCMIL FASES + 1N11(500) KCMIL NEUTRO +1N11(1/0) TIERRA, INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	20,00	$ 7.393.549,00	$ 147.870.980,00							
8,1,31	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N2(2) FASES + 1N2(2) NEUTRO +1N2(8) TIERRA, INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	80,00	$ 212.072,00	$ 16.965.760,00							
8,1,36	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N3(1/0) FASES + 1N3(300) NEUTRO +1N3(2) TIERRA, INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	18,00	$ 666.068,00	$ 11.989.224,00							
8,1,38	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N1/0 FASES + 1N2/0 NEUTRO +1N6 TIERRA, INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	80,00	$ 171.598,00	$ 13.727.840,00							
8,1,39	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N2/0 FASES + 1N2/0 NEUTRO +1N4 TIERRA, INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	200,00	$ 197.418,00	$ 39.483.600,00							
8,1,40	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N2/0 FASES +1N4 TIERRA, INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	95,80	$ 160.449,00	$ 15.371.014,20							

8,1,43	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG (4/0) FASES + 1N2(4/0) NEUTRO +1N2(2) TIERRA, INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	20,00	$ 530.931,00	$ 320,00							
8,1,46	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N3(250) FASES + 1N3(250) NEUTRO +1N3(2) TIERRA, INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	86,00	$ 1.041.779,00	$ 89.592.994,00							
8,1,53	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N3(500) FASES + 1N3(500) NEUTRO +1N3(2/0) TIERRA, INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	170,00	$ 2.028.182,00	$ 344.790.940,00							
8,1,55	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N7(500) KCMIL FASES + 1N7(500) KCMIL NEUTRO +1N7(1/0) TIERRA, INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	40,00	$ 4.740.136,00	$ 189.605.440,00							
8,1,64	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC TDP Ø 6", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION	ML	50,00	$ 119.201,00	$ 5.960.050,00							
8,1,65	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC TDP Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION	ML	698,60	$ 114.468,00	$ 79.967.344,80							
8,1,66	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC TDP Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION	ML	50,00	$ 81.247,00	$ 4.062.350,00							
8,1,67	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SCH-40 Ø 1", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION	ML	253,20	$ 44.535,00	$ 11.276.262,00							
8,1,69	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SCH-40 Ø 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION	ML	15,00	$ 49.668,00	$ 745.020,00							
8,1,70	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SCH-40 Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION	ML	226,60	$ 58.750,00	$ 13.312.750,00							
8,1,71	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SCH-40 Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION	ML	85,00	$ 75.829,00	$ 6.445.465,00							
8,1,80	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT Ø 3/4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION	ML	2.100,00	$ 35.563,00	$ 74.682.300,00							
8,1,81	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT Ø 1", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION	ML	720,00	$ 51.228,00	$ 36.884.160,00							
8,1,82	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT Ø 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION	ML	1.250,00	$ 64.571,00	$ 80.713.750,00							
8,1,83	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION	ML	60,00	$ 85.269,00	$ 5.116.140,00							
8,1,84	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION	ML	28,00	$ 140.405,00	$ 3.931.340,00							
8,1,85	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA 12X5 cm, COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS PARA FIJACION	ML	220,00	$ 45.984,00	$ 10.116.480,00							
8,1,86	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION (CAJA DE HALADO)	UN	22,00	$ 134.090,00	$ 2.949.980,00							
8,1,87	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE 60 X 10,5 CM FIJACION EN TECHO	ML	359,00	$ 233.579,00	$ 83.854.861,00							
8,1,89	ALIMENTADOR INICIO DE CIRCUITOS ILUMINACIÓN-TOMACORRIENTE EN 3#12 HFFRLS POR TUBERIA EMT 3/4 CON ACCESORIOS	ML	4.610,00	$ 43.281,00	$ 199.525.410,00							
8,3	**TABLEROS ELÉCTRICOS Y PROTECCIONES**				$ -							
8,3,2	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO , DE DOCE (12) CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA AISLADA.	UN	8,00	$ 466.296,00	$ 3.730.368,00							
8,3,4	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO , DE DIECIOCHO (18) CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA AISLADA.	UN	5,00	$ 842.345,00	$ 4.211.725,00							
8,3,6	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO , DE VEINTICUATRO (24) CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA AISLADA.	UN	7,00	$ 913.866,00	$ 6.397.062,00							
8,3,9	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO , DE TREINTA Y SEIS (36) CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA AISLADA.	UN	9,00	$ 1.129.973,00	$ 10.169.757,00							
8,3,12	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO TIPO RIEL DIN , DE DOCE(12) CIRCUITOS, INCLUYE ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA AISLADA, CON PEINE DE COBRE PARA BREACKER.	UN	4,00	$ 498.607,00	$ 1.994.428,00							

8,3,13	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO TIPO RIEL DIN, DIECIOCHO (18) CIRCUITOS, INCLUYE ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA AISLADA, CON PEINE DE COBRE PARA BREACKER.	UN	2,00	$ 616.617,00	$ 634,00							
8,3,14	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO TIPO RIEL DIN, VEINTICUATRO (24) CIRCUITOS, INCLUYE ESPACIO PARA TOTALIZADOR , BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA AISLADA, CON PEINE DE COBRE PARA BREACKER.	UN	1,00	$ 679.770,00	$ 679.770,00							
8,3,16	TABLERO INDUSTRIAL TRIFASICO, CAPACIDAD DE BARRAJE 400-500 A CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA AISLADA	UN	3,00	$ 5.124.044,00	$ 15.372.132,00							
8,3,17	TABLERO INDUSTRIAL TRIFASICO, CAPACIDAD DEL BARRAJE 774,09 A, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA AISLADA	UN	1,00	$ 8.001.248,00	$ 8.001.248,00							
8,3,18	TABLERO INDUSTRIAL TRIFASICO, CAPACIDAD DEL BARRAJE 1663 A, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA AISLADA	UN	2,00	$ 14.721.398,00	$ 29.442.796,00							
8,3,19	TABLERO INDUSTRIAL TRIFASICO, CAPACIDAD DEL BARRAJE 2500 A, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA AISLADA	UN	1,00	$ 27.203.537,00	$ 27.203.537,00							
8,3,20	TABLERO INDUSTRIAL TRIFASICO, CAPACIDAD DEL BARRAJE 4000 A, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA AISLADA	UN	2,00	$ 35.729.634,00	$ 71.459.268,00							
8,3,22	PROTECCION TERMOMAGNETICA MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 20A /10KA	UN	552,00	$ 31.840,00	$ 17.575.680,00							
8,3,23	PROTECCION TERMOMAGNETICA BIPOLAR ENCHUFABLE DE 20A /10KA	UN	30,00	$ 55.992,00	$ 1.679.760,00							
8,3,24	PROTECCION TERMOMAGNETICA BIPOLAR ENCHUFABLE DE 30A /10KA	UN	12,00	$ 55.992,00	$ 671.904,00							
8,3,31	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR ENCHUFABLE 3X40A /10KA	UN	6,00	$ 111.294,00	$ 667.764,00							
8,3,33	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA 3X60A /25KA	UN	1,00	$ 254.744,00	$ 254.744,00							
8,3,39	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA 3X125A /25KA	UN	5,00	$ 587.004,00	$ 2.935.020,00							
8,3,40	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA 3X175A /35KA	UN	4,00	$ 587.004,00	$ 2.348.016,00							
8,3,41	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(12,8-16)/25KA 240V	UN	13,00	$ 291.176,00	$ 3.785.288,00							
8,3,43	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(20-25)/25KA 240V	UN	12,00	$ 291.176,00	$ 3.494.112,00							
8,3,44	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(32-40)/25KA 240V	UN	22,00	$ 306.389,00	$ 6.740.558,00							
8,3,47	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(50,4-63)/25KA 240V	UN	39,00	$ 318.049,00	$ 12.403.911,00							
8,3,48	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(64-80)/25KA 240V	UN	10,00	$ 318.049,00	$ 3.180.490,00							
8,3,49	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(80-100)/25KA 240V	UN	1,00	$ 318.049,00	$ 318.049,00							
8,3,52	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(128-160)/35KA 240V	UN	4,00	$ 753.387,00	$ 3.013.548,00							
8,3,56	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(160-200)/40KA 240V	UN	2,00	$ 755.240,00	$ 1.510.480,00							
8,3,59	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(256-320)/60 KA 240V	UN	9,00	$ 1.954.802,00	$ 17.593.218,00							
8,3,61	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(320-400)/35KA 240V	UN	2,00	$ 2.247.681,00	$ 4.495.362,00							
8,3,63	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(504-630)/65 KA 240V	UN	1,00	$ 3.499.883,00	$ 3.499.883,00							
8,3,64	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(500-1250)/65 KA 240V	UN	1,00	$ 4.742.274,00	$ 4.742.274,00							
8,3,66	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3X(640-800)/65 KA 240V	UN	4,00	$ 7.262.259,00	$ 29.049.036,00							
8,3,71	PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIPOLAR CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3 X(1250-3200)/100 KA 240V	UN	5,00	$ 8.984.817,00	$ 44.924.085,00							
8,3,72	PROTECCION TERMOMAGNETICA MONOPOLAR TIPO MINIBREACKER DE RIEL DE 20 / 10KA	UN	57,00	$ 57.124,00	$ 3.256.068,00							
8,3,73	OPS CLASE I+II	UN	9,00	$ 2.728.134,00	$ 24.553.206,00							
8,3,74	OPS CLASE III	UN	1,00	$ 425.828,00	$ 425.828,00							
8,3,75	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA	UN	2,00	$ 28.369.887,00	$ 56.739.774,00							
8,3,76	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA	UN	1,00	$ 16.770.665,00	$ 16.770.665,00							
8,3,78	TABLERO GENERAL RED REGULADA DEUIL CON ELEMENTOS	UN	1,00	$ 5.025.825,00	$ 5.025.825,00							

8,4	SALIDAS ELECTRICAS				$ -							
8,4,1	DA PARA ILUMINACION, INCLUYE DUCTERIA, EADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO ESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	729,00	$ 219.608,00	$ 32,00			111,00	$ 24.376.488,00	111,00	$ 488,00
8,4,2	SALIDA PARA INTERRUPTOR, INCLUYE DUCTERIA, CABLEADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	58,00	$ 151.332,00	$ 8.777.256,00						
8,4,3	SALIDA PARA TOMACORRIENTE INCLUYE DUCTERIA, CABLEADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	1.046,00	$ 191.579,00	$ 200.391.634,00						
8,4,4	SALIDA PARA TERMOSTATO EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS INCLUYE DUCTERIA, CABLEADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	138,00	$ 125.886,00	$ 17.372.268,00						
8,4,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/120V (1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	585,00	$ 25.056,00	$ 14.657.760,00			61,00	$ 1.528.416,00	61,00	$ 1.528.416,00
8,4,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	25,00	$ 85.308,00	$ 2.132.700,00			3,00	$ 255.924,00	3,00	$ 255.924,00
8,4,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/120V (1Ø+N+PT) (RED REGULADA), INCLUYE DUCTERIA, CABLEADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	457,00	$ 36.216,00	$ 16.550.712,00			43,00	$ 1.557.288,00	43,00	$ 1.557.288,00
8,4,22	SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 3x8 Cu + 1x10 T AA	ML	84,20	$ 50.533,00	$ 3.244.218,60						
8,4,23	SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 3x6 Cu + 1x10 T AA	ML	140,00	$ 61.968,00	$ 8.675.520,00						
8,4,24	SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 3x4 Cu + 1x10 T AA	ML	458,00	$ 88.443,00	$ 40.506.894,00						
8,4,25	SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 3x2 Cu + 1x8 T AA	ML	230,78	$ 111.160,00	$ 25.653.504,80						
8,4,26	SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 3x1/0 Cu + 1x8 T AA	ML	65,00	$ 145.896,00	$ 9.483.240,00						
8,4,27	SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 2x12 Cu + 1x12 T AA	ML	353,31	$ 34.478,00	$ 12.181.422,18						
8,4,29	SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 2x10 Cu + 1x12 T AA	ML	966,00	$ 37.891,00	$ 36.602.706,00						
8,4,32	SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 3x18 Cu BLINDADO CONTROL AA	ML	1.382,91	$ 40.104,00	$ 55.460.222,64						
8,4,33	SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 1X12 Cu + 1X12 +1X12 EXTRACTORES	ML	189,00	$ 39.482,00	$ 7.462.098,00						
8,4,34	SALIDA EN CONDUCTOR DE CALIBRE 1X12 Cu + 1X12 +1X12 DESHUMUFICADOR	ML	527,00	$ 39.482,00	$ 20.807.014,00						
8,4,35	SALIDA BIFASICA COMPLETA MANEJADORA	UN	141,00	$ 370.568,00	$ 52.250.088,00						
8,4,36	SALIDA COMPLETA MODULO CONTROL MANEJADORA-CONDENSADORA	UN	141,00	$ 398.083,00	$ 56.129.703,00						
8,4,37	SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA	UN	24,00	$ 204.781,00	$ 4.914.744,00						
8,5	LUMINARIAS Y SENSORES				$ -						
8,5,1	LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED MUEBLE 30X120, 40W INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN	UN	372,00	$ 185.587,00	$ 69.038.364,00						
8,5,2	LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED MUEBLE 30X30, 24W INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN	UN	186,00	$ 94.294,00	$ 17.538.684,00						
8,5,3	LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED HERMETICA 2X18W INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN	UN	66,00	$ 163.510,00	$ 10.791.660,00						
8,5,4	LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED SOBREPONER TORTUGA 12W, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	6,00	$ 139.445,00	$ 836.670,00						
8,5,5	LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED MUEBLE 60X60, 40W INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN	UN	75,00	$ 173.525,00	$ 13.014.375,00						
8,5,19	LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED DE EMERGENCIA 2.4 W, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	16,00	$ 145.853,00	$ 2.333.648,00						
8,6	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO				$ -						
8,6,1	PUNTAS CAPTADORAS DE 600 MM EN ALUMINIO DE 1XØ 5/8" PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, INCLUYE SOPORTE Y CONECTOR CON TORNILLO DE FIJACION , DE ACUERDO A PLANOS Y DETALLES.	UN	40,00	$ 100.687,00	$ 4.027.480,00						

8,6,2	CONDUCTOR EN ALUMINIO TIPO ALAMBRÓN DE 8 mm DE DIAMETRO EN ALUMINIO.	ML	510,00	$ 13.230,00	$ 7.300,00							
8,6,3	GRAPA UNIVERSAL CRUZ; CONECTOR BIMETALICO	UN	54,00	$ 30.171,00	$ 234,00							
8,6,4	PASACABLES TIPO DEXON, PARA SOPORTE DE CONDUCTOR	UN	510,00	$ 13.894,00	$ 7.085.940,00							
8,6,5	CABLE DESNUDO 7 HILOS AWG NO. 2/0 (PARA INTERCONEXIÓN ENTRE SPT DE PARARRAYOS CON EL SPT DE POTENCIA Y EQUIPO SENSIBLE), INCLUYE SOLDADURA EXOTÉRMICA Y TRATAMIENTO FISICOQUÍMICO DEL TERRENO.	ML	418,00	$ 73.044,00	$ 30.532.392,00							
8,6,6	ELECTRODO CERTIFICADO RETIE H=2,44 m Y 5/8 COBRE-COBRE 99%, PARA PUESTA A TIERRA	UN	8,00	$ 111.956,00	$ 895.648,00							
8,6,7	SISTEMA PUESTA A TIERRA DE PARARRAYOS INCLUYE: BAJANTE EMBEBIDA EN DUCTO TIPO EMT DE 1XØ 1", CAJAS DE INSPECCIÓN DE (0,30X0,30)M CON TAPA, SOLDADURA EXOTÉRMICA, TRATAMIENTO DEL TERRENO CON ELECTRIGEL (BOLSA 25 KG/7M), MEDIDAS Y DEMÁS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LA RPT DEBE SER MAX A 10 OHMIOS.	UN	7,00	$ 272.750,00	$ 1.909.250,00							
8,6,8	AISLADOR TIPO DEHN PARA ALAMBRON DE 8 MM DE DIAMETRO, INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACION	UN	15,00	$ 14.259,00	$ 213.885,00							
8,7	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS				$ -							
8,7,1	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO SIMPLEX DIRECCIONAL (TYCO), INCLUYE SOPORTE PARA DETECTOR TIPO BASE, TUBERÍA METÁLICA, CABLEADO PARA SISTEMA DE DETECCION Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	161,00	$ 568.501,00	$ 91.528.661,00							
8,7,2	DETECTOR TERMICO PUNTUAL SIMPLEX (TYCO), INCLUYE SOPORTE PARA INSTALACION , TUBERIA METALICA, CABLEADO PARA SISTEMA DE DETECCION Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	2,00	$ 615.741,00	$ 1.231.482,00							
8,7,3	DETECTOR MULTITECNOLOGIA SIMPLEX (TYCO), INCLUYE SOPORTE PARA INSTALACION, TUBERIA METALICA CABLEADO PARA SISTEMA DE DETECCION Y ACCERSORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	2,00	$ 574.091,00	$ 1.148.182,00							
8,7,4	SIRENA TIPO HORN/STROBE, MULTI CANDELA, SIMPLEX (TYCO).	UN	20,00	$ 580.421,00	$ 11.608.420,00							
8,7,5	ESTACION MANUAL TIPO PULL STATION, DUAL ACTION, SIMPLEX (TYCO)	UN	20,00	$ 726.999,00	$ 14.539.980,00							
8,7,6	INSTALACIÓN PANEL DE CONTROL CENTRAL DETECCIÓN DE INCENDIOS	UN	2,00	$ 929.696,00	$ 1.859.392,00							
8,7,8	REVISION, AJUSTE, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO	UN	2,00	$ 6.323.559,00	$ 12.647.118,00							
8,7,9	BASE PARA DETECTOR DE HUMO	UN	163,00	$ 204.408,00	$ 33.318.504,00							
8,7,10	STOPPER TRANSPARENTE ESTACIÓN MANUAL	UN	20,00	$ 284.159,00	$ 5.683.180,00							
8,7,11	MODULO DE AISLAMIENTO	UN	8,00	$ 422.355,00	$ 3.378.840,00							
8,7,12	MODULO DE MONITOREO	UN	5,00	$ 515.693,00	$ 2.578.465,00							
8,7,13	FUENTE DE ALIMENTACIÓN SECUNDARIA	UN	2,00	$ 1.969.995,00	$ 3.939.990,00							
8,7,14	MODULO RELEVO	UN	5,00	$ 574.307,00	$ 2.871.535,00							
8,7,15	CABINA ESTANDAR NORMALIZADA	UN	2,00	$ 854.479,00	$ 1.708.958,00							
8,7,16	TARJETA INTERFAZ ETHERNET	UN	2,00	$ 464.291,00	$ 928.582,00							
8,8	**INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - ALUMBRADO PÚBLICO**			$ -	$ -							
8,8,1	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE HALADO PARA BANCO DE DUCTOS CON TAPA TIPO AP CS274/AE243	UN	55,00	$ 901.141,00	$ 49.562.755,00			4,00	$ 3.604.564,00	4,00	$ 3.604.564,00	
8,8,2	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA ROY ALPHA RALED II 72W, INCLUYE REFRACTOR EN VIDRIO TEMPLADO, BANDEJA PORTAEQUIPOS EN ACERO GALVANIZADO, ALUMINIO INYECTADO, TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COREECTO FUNCIONAMIENTO	UN	37,00	$ 943.646,00	$ 34.914.902,00							
8,8,3	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA ROY ALPHA RALED I 36W, INCLUYE REFRACTOR EN VIDRIO TEMPLADO, BANDEJA PORTAEQUIPOS EN ACERO GALVANIZADO, ALUMINIO INYECTADO, TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COREECTO FUNCIONAMIENTO	UN	22,00	$ 1.079.343,00	$ 23.745.546,00							
8,8,4	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3" EN BANCO DE DUCTOS, INCLUYE CINTA INDICADORA DE PELIGRO.	ML	1.079,50	$ 115.546,00	$ 124.731.907,00							
8,8,5	EXCAVACIÓN MANUALSEGÚN PLANOS DE MATERIAL COMÚN, INCLUYE CARGUE,TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO POR EL ENTE EMBIENTAL AUTORIZADO	M3	362,71	$ 138.100,00	$ 50.090.251,00							
8,8,6	RELLENOS Y ATRAQUE DE TUBERÍA CON ATRAQUE DE ARENA DE RIO.	M3	77,72	$ 188.103,00	$ 14.619.365,16							

8,8,7	RELLENO CON RECEBO SELECCIONADO COMPACTADO: COMPACTADO AL 95%	M3	220,22	$ 130.993,00	$ 28.843,46							
8,8,8	SUMINISTRO Y MONTAJE POSTE METÁLICO H = 8M Y LB= 1,0M, SEGÚN NORMA ET-204	UN	37,00	$ 2.066.445,00	$ 76.458.465,00							
8,8,9	SUMINISTRO Y MONTAJE POSTE METÁLICO H = 4,5M Y LB= 0,5M SEGÚN NORMA ET-204	UN	22,00	$ 2.383.447,00	$ 52.436.834,00							
8,8,10	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 EN POSTE METÁLICO.	ML	422,40	$ 47.410,00	$ 20.025.984,00							
8,8,11	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE CALIBRE 1X NO 8 AWG EN BANCO DE DUCTOS 3".	ML	1.187,45	$ 31.696,00	$ 37.637.415,20							
8,8,12	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE CALIBRE 3X NO 4 AWG EN BANCO DE DUCTOS 3".	ML	1.187,45	$ 65.044,00	$ 77.236.497,80							
8,8,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO ENCHUFABLE CONTROL DE ILUMINACIÓN PÚBLICA.	UN	2,00	$ 5.088.790,00	$ 10.177.580,00							
8,8,14	SUMINISTRO Y MONTAJE DE VARILLA DE PUESTA DE TIERRA ANEXA A CAMARA CS274.	UN	23,00	$ 153.097,00	$ 3.521.231,00							
8,8,15	SUMINISTRO Y MONTAJE DE BREAKERS BIPOLARES 20 A EN TABLEROS ENCHUFABLE.	UN	15,00	$ 56.311,00	$ 844.665,00							
8,8,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVADOR EN GEL PARA CABLE NO. 12 Y 4 AWG	UN	177,00	$ 82.376,00	$ 14.580.552,00							
8,8,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA CADWELD DE 115 gm	UN	23,00	$ 269.559,00	$ 6.199.857,00							
8,9	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN				$ -							
8,9,1	EXCAVACIÓN MÉCANICA DE MATERIAL COMÚN SEGÚN PLANOS, INCLUYE CARGUE,TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO POR EL ENTE AMBIENTAL AUTORIZADO	M3	1.344,06	$ 89.296,00	$ 120.019.181,76	206,33	$ 18.424.443,68	395,88	$ 35.350.500,48	602,21	$ 53.774.944,16	
8,9,2	RELLENO CON BASE GRANULAR COMPACTADO B600 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO DE CAUERDO CON ESTUDIO DE SUELOS	M3	709,26	$ 117.389,00	$ 83.259.322,14							
8,9,3	RELLENOS Y ATRAQUES DE TUBERIA CON ARENA DE RIO	M3	614,47	$ 207.674,00	$ 127.609.442,78	24,23	$ 5.031.941,02	79,82	$ 16.576.538,68	104,05	$ 21.608.479,70	
8,9,4	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC TDP DE 4Φ4" EN BANCO DE DUCTOS	ML	801,00	$ 217.933,00	$ 174.564.333,00	190,92	$ 41.607.768,36			190,92	$ 41.607.768,36	
8,9,5	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC TDP DE 6Φ6" EN BANCO DE DUCTOS	ML	794,82	$ 356.004,00	$ 282.959.099,28	25,00	$ 8.900.100,00	512,65	$ 182.505.450,60	537,65	$ 191.405.550,60	
8,9,6	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC TDP DE 9Φ4" EN BANCOS DE DUCTOS	ML	46,00	$ 438.859,00	$ 20.085.514,00							
8,9,7	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC TDP DE 2Φ4" EN BANCOS DE DUCTOS	ML	140,00	$ 121.191,00	$ 16.966.740,00							
8,9,8	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC TDP DE 2Φ3" EN BANCOS DE DUCTOS	ML	190,00	$ 87.574,00	$ 16.639.060,00			60,40	$ 5.289.469,60	60,40	$ 5.289.469,60	
8,9,9	SUMINISTRO Y MARCACION CON CINTA CS 273	ML	1.979,32	$ 35.356,00	$ 69.980.837,92	215,92	$ 7.634.067,52	573,05	$ 20.260.755,80	788,97	$ 27.894.823,32	
8,9,10	CONSTRUCCION DE CAJA DE HALADO PARA BANCO DE DUCTOS CON TAPA EN CONCRETO TIPO SENCILLA CS275.	UN	26,00	$ 1.363.603,00	$ 35.453.678,00	1,00	$ 1.363.603,00	7,00	$ 9.545.221,00	8,00	$ 10.908.824,00	
8,9,11	CONSTRUCCION DE CAJA DE HALADO PARA BANCO DE DUCTOS CON TAPA EN CONCRETO TIPO DOBLE CS276.	UN	34,00	$ 2.544.300,00	$ 86.506.200,00	4,00	$ 10.177.200,00	11,00	$ 27.987.300,00	15,00	$ 38.164.500,00	
8,9,12	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N2/0 FASES XLPE @15kV, INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	760,00	$ 239.420,00	$ 181.959.200,00							
8,9,13	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE AWG 3N2/0 FASES XLPE @35kV, INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	632,52	$ 355.879,00	$ 225.100.585,08							
8,9,14	CÁRCAMOS EN CONCRETO REFORZADO, DEBIDAMENTE IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO FY=60,000 PSI, MANO DE OBRA, FORMALETAS, LAMINA ALFAJOR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. DIMENSIONES 0,40m X0.25m. ESPESOR DE MUROS Y PLACA 10 cm.	ML	5,00	$ 248.212,00	$ 1.241.060,00							
8,9,14	CÁRCAMOS EN CONCRETO REFORZADO, DEBIDAMENTE IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO FY=60,000 PSI, MANO DE OBRA, FORMALETAS, LAMINA ALFAJOR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. DIMENSIONES 0,40m X0.25m. ESPESOR DE MUROS Y PLACA 10 cm. SUBESTACION 5	ML	10,00	$ 234.810,00	$ 2.348.100,00							
8,9,16	CÁRCAMOS EN CONCRETO REFORZADO, DEBIDAMENTE IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO FY=60,000 PSI, MANO DE OBRA, FORMALETAS, LAMINA ALFAJOR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. DIMENSIONES 0,40m X0.35m. ESPESOR DE MUROS Y PLACA 10 cm.	ML	40,00	$ 283.191,00	$ 11.327.640,00							

8,9,20	NSTRUCCIÓN DE MALLA A TIERRA DE SUBESTACIÓN 2 N DISEÑO, INCLUYE VARILLA COPER WELL DE Ø 2.4 METROS COBRE-COBRE 99%, CABLE DESNUDO 8 WG, PUNTO DE SOLDADURA EXOTÉRMICA REQUERIDO, TRATAMIENTO DEL TERRENO, MEDIDA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PAR	UN	1,00	$ 9.130.113,00	$ 9.130.113,00						
8,9,23	CONSTRUCCIÓN DE MALLA A TIERRA DE SUBESTACIÓN 5 SEGUN DISEÑO, INCLUYE VARILLA COPER WELL DE Ø 5/8", 2.4 METROS COBRE-COBRE 99%, CABLE DESNUDO 2/0 AWG, PUNTO DE SOLDADURA EXOTÉRMICA REQUERIDO, TRATAMIENTO DEL TERRENO, MEDIDA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS P	UN	1,00	$ 4.530.016,00	$ 4.530.016,00						
8,9,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE ENTRADA, 35kV AISLAMIENTO EN GAS SF6	UN	2,00	$ 38.662.481,00	$ 77.324.962,00						
8,9,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE MEDICIÓN 35kV AISLAMIENTO EN GAS SF6, INCLUYE 3PT DE 34,5/0,12kV, 3CT DE 100/5A, CONEXIÓN, Y TRÁMITES ANTE EL OPERADOR DE RED PARA CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UN	1,00	$ 55.809.890,00	$ 55.809.890,00						
8,9,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE PROTECCIÓN CON FUSIBLE H-H 40A, 35kV AISLAMIENTO EN GAS SF6	UN	1,00	$ 39.306.206,00	$ 39.306.206,00						
8,9,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE TRANSFORMADOR 2MVA, 35/15kV SEGUN CTS 518-2	UN	1,00	$ 13.364.116,00	$ 13.364.116,00						
8,9,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO H 2MVA CONEXIÓN DYN5 TAPS: +1 -3 x 2.5%, 34,5/13,2kV INCLUYE DPS CLASE 30	UN	1,00	$ 229.264.856,00	$ 229.264.856,00						
8,9,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO H 800kVA, TAPS: +1 -3 X 2.5%, 13.2/0.208kV	UN	1,00	$ 77.350.289,00	$ 77.350.289,00						
8,9,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PAD-MOUNTED 13,2KV/208V, 45 KVA, TIPO RADIAL, CONEXIÓN DYN5, TAPS: +1 -3 X 2.5%, ACEITE, INCLUYE OBRA CIVIL SEGÚN NORMA Y CERRAMIENTO, CODOS DE ENTRADA Y PARARRAYOS TIPO CODO	UN	1,00	$ 39.845.788,00	$ 39.845.788,00						
8,9,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE TRANSFORMADOR 800kVA, 15/0.6kV SEGUN CTS 518-2	UN	1,00	$ 10.251.239,00	$ 10.251.239,00						
8,9,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE PROTECCIÓN, 15kV AISLAMIENTO EN GAS SF6	UN	1,00	$ 32.596.848,00	$ 32.596.848,00						
8,9,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE SALIDA, 15kV AISLAMIENTO EN GAS SF6	UN	3,00	$ 24.817.793,00	$ 74.453.379,00						
8,9,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE ENTRADA, 15kV AISLAMIENTO EN GAS SF6	UN	1,00	$ 24.095.989,00	$ 24.095.989,00						
8,9,40	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE CONDENSADORES 90KVAR, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	1,00	$ 17.178.009,00	$ 17.178.009,00						
8,9,43	INSTALACION DE UPS TECNOLOGIA ON-LINE, 10KVA, TRIFÁSICA 208/120 VAC A CINCO HILOS (TRES FASES +NEUTRO+GND), TIEMPO DE RESPALDO AJUSTABLE PARA DIFERENTES AUTONOMIAS	UN	1,00	$ 1.551.888,00	$ 1.551.888,00						
8,9,47	INSTALACION DE UPS TECNOLOGIA ON-LINE, 100KVA, TRIFÁSICA 208/120 VAC A CINCO HILOS (TRES FASES +NEUTRO+GND), TIEMPO DE RESPALDO AJUSTABLE PARA DIFERENTES AUTONOMIAS, CON FACTOR DE POTENCIA DE ENTRADA DE 0,99 Y SALIDA DE 0,97	UN	1,00	$ 2.403.968,00	$ 2.403.968,00						
8,9,50	INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO 600kVA, @0.22kV, INCLUYE CABINA INSONORIZADA, SISTEMA DE ESCAPE Y CAPACITACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL EN SITIO	UN	1,00	$ 4.086.952,00	$ 4.086.952,00						
8,9,52	INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO 60kVA, @0.22kV, INCLUYE CABINA INSONORIZADA, SISTEMA DE ESCAPE Y CAPACITACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL EN SITIO	UN	1,00	$ 2.946.939,00	$ 2.946.939,00						
8,9,54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA NORMALIZADA LOCAL SUBESTACIÓN	UN	4,00	$ 4.326.996,00	$ 17.307.984,00						
8,9,56	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN JUEGO TERMINAL 15kV USO INTERIOR	UN	4,00	$ 848.709,00	$ 3.394.836,00						
8,9,58	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN JUEGO TERMINAL 35kV USO EXTERIOR	UN	1,00	$ 1.736.159,00	$ 1.736.159,00						
8,9,59	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN JUEGO TERMINAL 35kV USO INTERIOR	UN	8,00	$ 1.640.429,00	$ 13.123.432,00						
8,9,60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO DE MEDIDA INDIRECTA CON MODEM DE COMUNICACIÓN PERFIL DE CARGA CLASE 0,5MT TRES ELEMENTOS INCLUYE MEDIDOR Y BORNERA PRINCIPAL, BORNERA AUXILIAR, MEDIDOR, BORNERA DE RESPALDO, CAJA PARA ALOJAR ESTOS ELEMENTOS, CONEXIÓN HASTA	UN	2,00	$ 6.560.663,00	$ 13.121.326,00						
8,9,61	ESTRUCTURA DE ARRANQUE	UN	1,00	$ 8.537.806,00	$ 8.537.806,00						

8,9,62	ESTRUCTURA DE AFLORAMIENTO	UN	1,00	$ 6.663.239,00	$ 6.663.239,00							
8,9,63	...EVA VL5	UN	2,00	$ 3.111.225,00	$ ...450,00							
8,9,65	...STRUCCIÓN DE MALLA A TIERRA DE SUBESTACIÓN 0 ...GUN DISEÑO, INCLUYE VARILLA COPER WELL DE Ø 5/8", 2.4 METROS COBRE-COBRE 99%, CABLE DESNUDO 2/0 AWG, PUNTO DE SOLDADURA EXOTÉRMICA REQUERIDO, TRATAMIENTO DEL TERRENO, MEDIDA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS P	UN	1,00	$ 11.725.792,00	$ 11.725.792,00							
8,9,66	ESTRUCTURA NORMALIZADA 34,5kV	UN	13,00	$ 9.451.446,00	$ 122.868.798,00							
8,9,67	RED 34,5kV TRIFASICA	ML	750,00	$ 50.965,00	$ 38.223.750,00							
8,9,80	Interruptor de potencia DE MEDIA TENSION	UN	1,00	$ 162.741.000,00	$ 162.741.000,00							
10	INSTALACIONES MECANICAS				$ -							
10,1	INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO				$ -							
10,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE TIPO K 1/4"	ML	280,00	$ 39.042,00	$ 10.931.760,00							
10,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE TIPO K 3/8"	ML	358,00	$ 43.353,00	$ 15.520.374,00							
10,1,3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE TIPO K 1/2"	ML	778,00	$ 55.039,00	$ 42.820.342,00							
10,1,4	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE TIPO K 5/8"	ML	554,00	$ 67.202,00	$ 37.229.908,00							
10,1,5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE TIPO K 3/4"	ML	533,00	$ 74.671,00	$ 39.799.643,00							
10,1,7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE TIPO K 1"	ML	40,00	$ 116.127,00	$ 4.645.080,00							
10,1,8	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE TIPO K 1 1/4"	ML	355,00	$ 136.428,00	$ 48.431.940,00							
10,1,9	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE TIPO K 1 1/2"	ML	163,00	$ 166.620,00	$ 27.159.060,00							
10,1,10	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO BRANCH ARBL 1621 O SIMILAR	UN	46,00	$ 260.954,00	$ 12.003.884,00							
10,1,11	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO BRANCH ARBL 3321 O SIMILAR	UN	30,00	$ 349.065,00	$ 10.471.950,00							
10,1,12	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO BRANCH ARBL 7121 O SIMILAR	UN	45,00	$ 476.299,00	$ 21.433.455,00							
10,1,13	SUMINISTRO REFRIGERANTE R 410A	LB	590,00	$ 22.244,00	$ 13.123.960,00							
10,1,14	SUMINISTRO CARGA NITROGENO	UN	9,00	$ 285.751,00	$ 2.571.759,00							
10,1,18	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO PVC SANITARIO DE 4"	ML	25,00	$ 130.081,00	$ 3.252.025,00							
10,1,19	SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO LAMINA GALVANIZADA CAL 24	M2	1.512,00	$ 135.158,00	$ 204.358.896,00							
10,1,20	SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO LAMINA FIBRA DE VIDRIO 1" ESPESOR	M2	1.504,00	$ 242.005,00	$ 363.975.520,00							
10,1,22	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE PVC-P RDE 21 DE 1"	ML	266,00	$ 44.902,00	$ 11.943.932,00							
10,1,23	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE PVC-P RDE 21 DE 1 1/4"	ML	42,00	$ 52.126,00	$ 2.189.292,00							
10,1,24	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE PVC-P RDE 21 DE 1 1/2"	ML	548,00	$ 60.040,00	$ 32.901.920,00							
10,1,25	INSTALACION CONDENSADORA VOLUMEN VARIABLE	UN	11,00	$ 4.318.868,00	$ 47.507.548,00							
10,1,26	INSTALACION FANCOIL DESNUDO	UN	26,00	$ 922.586,00	$ 23.987.236,00							
10,1,27	INSTALACION EVAPORADORAS	UN	112,00	$ 668.327,00	$ 74.852.624,00							
10,1,29	INSTALACION EQUIPOS SPLIT Y MINISPLIT	UN	2,00	$ 968.154,00	$ 1.936.308,00							
10,1,31	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO BRANCH ARBL 4521 O SIMILAR	UN	4,00	$ 778.192,00	$ 3.112.768,00							
10,1,32	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO BRANCH ARCN 21 O SIMILAR	UN	9,00	$ 489.768,00	$ 4.407.912,00							
10,1,33	INSTALACION CONDENSADORA MINI VOLUMEN VARIABLE	HR	3,00	$ 1.162.019,00	$ 3.486.057,00							
10,1,34	SUMINISTRO E INSTALACION CHAQUETA ALUMINIO CALIBRE 0,4 mm	M2	132,00	$ 245.284,00	$ 32.377.488,00							
10,2	INSTALACIONES VENTILACION MECANICA				$ -							
10,2,1	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE RETORNO TIPO CUBO 6" X 6"	UN	4,00	$ 84.640,00	$ 338.560,00							
10,2,9	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA RETORNO TIPO PERSIANA 44" X 16"	UN	18,00	$ 315.325,00	$ 5.675.850,00							
10,2,10	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA RETORNO TIPO PERSIANA 6" X 6"	UN	2,00	$ 77.235,00	$ 154.470,00							
10,2,11	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA RETORNO TIPO PERSIANA 10" X 10"	UN	6,00	$ 89.197,00	$ 535.182,00							
10,2,12	SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR 3 VIAS 6" X 6"	UN	1,00	$ 100.475,00	$ 100.475,00							
10,2,13	SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR 3 VIAS 8" X 8"	UN	12,00	$ 116.879,00	$ 1.402.548,00							
10,2,14	SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR 4 VIAS 10" X 10"	UN	19,00	$ 135.334,00	$ 2.571.346,00							
10,2,19	SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR 4 VIAS 12" X 12"	UN	3,00	$ 147.637,00	$ 442.911,00							
10,2,20	SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR 4 VIAS 14" X 14"	UN	36,00	$ 170.193,00	$ 6.126.948,00							
10,2,23	SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR 3 VIAS 10" X 10"	UN	9,00	$ 135.334,00	$ 1.218.006,00							
10,2,24	INSTALACION VENTILADORES BAÑOS	UN	22,00	$ 143.358,00	$ 3.153.876,00							
10,2,25	INSTALACION VENTILADORES CUBIERTA	UN	8,00	$ 2.136.248,00	$ 17.089.984,00							
10,2,27	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA RETORNO TIPO PERSIANA 24" X 14"	UN	6,00	$ 169.168,00	$ 1.015.008,00							

10,2,33	SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR 4 VIAS 6" X 6"	UN	24,00	$	116.679,00	$	2.800.296,00					
10,2,37	NISTRO E INSTALACION REJILLA RETORNO TIPO IANA 32" X 16"	UN	8,00	$	229.469,00	$	52,00					
10,2,38	MINISTRO E INSTALACION DIFUSOR 3 VIAS 9" X 9"	UN	18,00	$	124.056,00	$	3.008,00					
10,2,39	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE RETORNO TIPO CUBO 4" X 4"	UN	30,00	$	80.083,00	$	2.402.490,00					
10,3	CONTROL					$	-					
10,1,35	CABLE APANTALLADO 3X18	M2		$	11.927,00	$	-					
10,1,36	TUBERIA EMT DE 3/4"	M2		$	32.342,00	$	-					
11	INSTALACIONES VOZ Y DATOS					$	-					
11,1	TUBERIA Y BANDEJA					$	-					
11,1,1	Suministro e instalación de Bandeja portacables cf54/50 Electrozincada incluye accesorios de fijación en techo tipo AS, conectores de tierra, incluye cable desnudo No 8 durante el recorrido de la bandeja y demás accesorios necesarios	ML	22,00	$	68.235,00	$	1.501.170,00					
11,1,2	Suministro e instalación de Bandeja portacables cf54/100 Electrozincada incluye accesorios de fijación en techo tipo AS, conectores de tierra, incluye cable desnudo No 8 durante el recorrido de la bandeja y demás accesorios necesarios	ML	67,00	$	61.709,00	$	4.134.503,00					
11,1,3	Suministro e instalación de Bandeja portacables cf 105/100 Electrozincada incluye accesorios de fijación en techo tipo AS, conectores de tierra, incluye cable desnudo No 8 durante el recorrido de la bandeja y demás accesorios necesarios	ML	125,00	$	80.782,00	$	10.097.750,00					
11,1,4	Suministro e instalación de Bandeja portacables cf105/300 Electrozincada incluye accesorios de fijación en techo tipo AS, conectores de tierra, incluye cable desnudo No 8 durante el recorrido de la bandeja y demás accesorios necesarios	ML	77,00	$	104.554,00	$	8.050.658,00					
11,1,5	Suministro e instalación de Bandeja portacables cf105/800 Electrozincada incluye accesorios de fijación en techo tipo AS, conectores de tierra, incluye cable desnudo No 8 durante el recorrido de la bandeja y demás accesorios necesarios	ML	12,00	$	143.357,00	$	1.720.284,00					
11,1,6	Suministro e instalación de Bandeja portacables cf105/200 Electrozincada incluye accesorios de fijación en techo tipo AS, conectores de tierra, incluye cable desnudo No 8 durante el recorrido de la bandeja y demás accesorios necesarios	ML	118,00	$	88.774,00	$	10.475.332,00					
11,1,7	Suministro e instalacion de Bandeja portacables cf54/150 Electrozincada incluye accesorios de fijacion en techo tipo AS, conectores de tierra, incluye cable desnudo No 8 durante el recorrido de la bandeja y demas accesorios necesarios	ML	20,00	$	83.503,00	$	1.670.060,00					
11,1,8	Suministro e instalación de tuberia Conduit EMT 3/4" incluye curva, unión, terminal	ML	1.315,00	$	17.066,00	$	22.441.790,00					
11,1,9	Suministro e instalación de tuberia Conduit EMT 1" incluye curva, unión, terminal	ML	257,00	$	20.310,00	$	5.219.670,00					
11,1,10	Suministro e instalación de tuberia Conduit EMT 1"-1/4 incluye curva, unión, terminal	ML	128,50	$	28.543,00	$	3.667.775,50					
11,1,11	Suministro e instalación de tuberia Conduit EMT 1"-1/2 incluye curva, unión, terminal	ML	50,00	$	33.206,00	$	1.660.300,00					
11,1,12	Suministro e instalación de tuberia Conduit EMT 2" incluye curva, unión, terminal	ML	69,00	$	34.748,00	$	2.397.612,00					
11,1,13	Suministro e instalación de tuberia Conduit EMT 3" incluye curva, unión, terminal	ML	18,00	$	47.024,00	$	846.432,00					
11,1,14	Caja de Paso 20X20X10 Metálica	ML	13,00	$	35.628,00	$	463.136,00					
11,1,15	Caja de Paso 30X30X15 Metálica	UN	6,00	$	58.518,00	$	351.108,00					
11,1,18	BANCO DE DUCTO TIPO NORMA CODENSA CS 207 - Para Canalización de 2 Ø 2" Tipo TDP- ZONA VERDE (Incluye excavación, base en arena de peña, relleno con tierra de la excavación compactada en capas de 15 cm, con cinta de señalización y retiro de material sobr	ML	79,00	$	110.057,00	$	8.694.503,00					
11,1,20	CAJA DE INSPECCIÓN NORMA CS 274 (Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en Angulo 2 1/2 x 2 1/2 3/16" , tapa reforzada en platina de 2 1/2 3/16" y retiro de material sobrante de la excavación a botadero).	UN	4,00	$	272.659,00	$	1.090.636,00					
11,2	Cableado Estructurado					$	-					
11,2,1	Suministro e instalación de Salida HDMI, con Conector HDMI, tipo decora, caja 2400 con suplemento. Incluye Cable HDMI 20 metros.	UN	7,00	$	329.822,00	$	2.308.754,00					
11,2,2	Suministro e instalación CABLE U/UTP CATEGORIA 6A 1091B SL 4/23 W100, Ver Característica en Anexo de Especificación Técnica	ML	46.016,00	$	14.387,00	$	662.032.192,00					

11,2,3	Salida Voz/Datos o Datos/Datos Incluye Modulo de conexión MGS600 Categoría 6A, Faceplate angulados, marcación, ubicación, Caja plástica 5800 para salidas en pared o troquel rígido para salidas en mobiliario, Ver Característica en Anexo de Especificación Técnica	UN	440,00	$ 365.836,00	$ 160.967.840,00							
11,2,4	Suministro e instalación de Patchcord categoria 6A U/UTP CPCSSX2-03F010(de Color según aplicación). Ver Característica en Anexo de Especificación Técnica	UN	880,00	$ 158.767,00	$ 139.714.960,00							
11,2,5	Suministro e instalación de Patchcord categoria 6A U/UTPCP CSSX2-03F07(de Color según aplicación). Ver Característica en Anexo de Especificación Técnica	UN	880,00	$ 150.993,00	$ 132.873.840,00							
11,2,6	Suministro e instalación de Patch panel 1100 GS6 24P Categoria 6A. Ver Característica en Anexo de Especificación Técnica	UN	19,00	$ 3.686.962,00	$ 70.052.278,00							
11,2,7	Suministro e instalación de Rack abierto RK3-45A Incluye 2 Bandejas Ventiladas,1 Bandeja Para servidor, 4 Organizadores Horizontales, organizador vertical, 1 Multitoma Horizontal, 1 Multitoma Vertical, Ver Característica en Anexo de Especificación Técnica.	UN	6,00	$ 10.112.600,00	$ 60.675.600,00							
11,2,8	Instalación sistema de control de acceso (HASTA DISPOSITIVO DE ENTRADA Y SALIDA, ELECTROIMAN, BOTON DE EVACUACION, INTEGRACION SOFTWARE)	UN	15,00	$ 151.727,00	$ 2.275.905,00							
11,2,9	Instalación y configuración de cámaras de seguridad y NVR (HASTA DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INTEGRACION SOFTWARE)	UN	23,00	$ 185.033,00	$ 4.255.759,00							
11,2,10	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION SWITCHES DE 24 PUERTOS 10/100/1000 ADMINISTRADOS STAKING	UN	7,00	$ 740.131,00	$ 5.180.917,00							
11,2,11	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION SUMINISTRO DE SWITCHES DE 48 PUERTOS 10/100/1000 ADMINISTRADOS STAKING	UN	18,00	$ 841.058,00	$ 15.139.044,00							
11,2,12	Instalación y conexionado de Barraje de tierra de TBB con cable desnudo No. 6 AWG	UN	1,00	$ 667.339,00	$ 667.339,00							
11,2,13	Instalación y conexionado de Barraje de tierra de TMGB	UN	2,00	$ 702.396,00	$ 1.404.792,00							
11,2,14	Bandeja de fibra de 1U, Ver Característica en Anexo de Especificación Técnica	UN	6,00	$ 2.147.621,00	$ 12.885.726,00							
11,2,15	Modulo fibra para interior, Ver Característica en Anexo de Especificación Técnica	UN	16,00	$ 561.031,00	$ 8.976.496,00							
11,2,16	Adaptador de fibra LCR-09, Ver Característica en Anexo de Especificación Técnica	UN	4,00	$ 142.292,00	$ 569.168,00							
11,2,17	Panel acoplador ciego.	UN	13,00	$ 80.554,00	$ 1.047.202,00							
11,2,18	Patch cord de fibra LC, 1.6 mm Duplex, Ver Característica en Anexo de Especificación Técnica	UN	25,00	$ 323.540,00	$ 8.088.500,00							
11,2,19	Cable de fibra interna, para interconexión de fibra R-006-DS, Ver Característica en Anexo de Especificación Técnica	UN	12,00	$ 51.578,00	$ 618.936,00							
11,2,20	Suministro e instalación de Soporte de 10 regletas de 10 pares incluye 3 regletas de telefonia S66	UN	4,00	$ 213.966,00	$ 855.864,00							
11,2,21	Configuración y puesta en funcionamiento del sistema de Cableado Inteligente, incluye Software, Ver Característica en Anexo de Especificación Técnica	UN	2,00	$ 80.842.070,00	$ 161.684.140,00							
11,2,23	Suministro e instalación de Cable de Fibra Externa, Ver Característica en Anexo de Especificación Técnica	ML	514,00	$ 79.092,00	$ 40.653.288,00							
11,2,24	Suministro e instalación de Cable para interconexión de tierras TBB/BC en CU desnudo 2/0	ML	514,00	$ 32.492,00	$ 16.700.888,00							
11,2,25	Suministro e instalación de Cable Telefónico Multipara CALIBRE 18 awg	ML	514,00	$ 5.708,00	$ 2.933.912,00							
11,2,26	Suministro e instalación de salida para TV, incluye face plate de una salida coaxial, caja 5800, y conector de Compresión Tipo F.	UN	6,00	$ 45.996,00	$ 275.976,00							
11,2,27	Suministro e instalación de Cable Coaxial RG-6 Negro con un conector de Compresión Tipo F.	UN	163,00	$ 5.687,00	$ 926.981,00							
11,2,29	Suministro e instalación de Antena para canales analógicos.	UN	1,00	$ 196.991,00	$ 196.991,00							
11,2,31	Suministro e instalación de Amplificador de vivienda 1e/(2s+TV)110Vac, incluye un Mezclador de señales UHF-VHF.	UN	1,00	$ 395.856,00	$ 395.856,00							
11,2,32	Suministro e instalación Repartidor 4 salidas 1.000MHz	UN	1,00	$ 18.346,00	$ 18.346,00							
12	CARPINTERIA METALICA				$ -							
12,1	Suministro e instalacion de Baranda metálica, 3 transversales en 1/2" y pasamanos de 2" en acero inoxidable , según planos de detalle arquitectonicos. Incluye pintura en esmalte sobre base anticorrosivo y elementos de fijacion y anclaje	ML	77,81	$ 427.057,00	$ 33.229.305,17							
12,32	Suministro e instalación de Persiana para ventilacion natural antitormenta, modulo de 1 x 1 m , incluye perfil antitormenta en aluminio extruido cal 1/16 espaciado cada 60 cm color blanco mate, inlcuye elementos de instalacion y alfajia	M2	5,10	$ 270.205,00	$ 1.378.045,50							

12,36	Suministro e instalacion puerta metalica enrollable manual, ciego	M2	70,35	$ 815.247,00	$ 826,45							
12,45	Suministro e instalación de Escalera Metalica Tipo Marinera, incluye pernos y platinas. Incluye guarda hombre y puerta de escotilla	UN	2,00	$ 1.600.644,00	$ 3.201.288,00							
12,46	Suministro e instalación de Cortasol Quadrobrise 25/75 tipo Hunter Douglas o similar	M2	70,61	$ 249.838,00	$ 17.641.061,18							
12,47	Suministro e instalación de reja de seguridad para celda, incluye elementos de fijacion	M2	40,18	$ 241.142,00	$ 9.689.086,56							
12,48	Suministro e instalación de Cortasol Quadrobrise XL tipo Hunter Douglas	M2	1.044,88	$ 688.927,00	$ 719.846.043,76							
12.111	Suministro e instalacion de P-4 puerta lisa panel inyectada en poliuretano con sistema de engrafe, en lamina de acero galvanizada calibre 18, bisagras de aluminio y acabado en pintura electostatica color por definir + rejilla de aire inferior en aluminio, marco m120, ref zra, medidas 100 x 285,termocurado por definir, kit 2030 cerradura de embutir con manija sena y roseta, puertas bodegas	UN	7,00	$ 1.231.463,00	$ 8.620.241,00							
12.112	Suministro e instalacion de P-5 puerta tipo persiana con bastidor de 100*38 en lamina galvanizada calibre 18, con ensamble mecanico (sin soldadura), bisagras de aluminio y acabado en pintura electostatica color por definir, marco m120, ref zzp, medidas 150 x 285,termocurado por definir,kit 2030 cerradura de embutir con manija sena y roseta, puertas bodegas	UN	1,00	$ 1.493.491,00	$ 1.493.491,00							
12,113	Suministro e instalacion de P-3 puerta lisa panel inyectada en poliuretano con sistema de engrafe, en lamina de acero galvanizada calibre 18, bisagras de aluminio y acabado en pintura electostatica color por definir + rejilla de aire inferior en aluminio, marco m120, ref zra, medidas 100 x 295, termocurado por definir, kit 2030 cerradura de embutir con manija sena y roseta, puertas deuil	UN	7,00	$ 1.238.153,00	$ 8.667.071,00							
12,114	Suministro e instalacion de P-4 puerta lisa panel inyectada en poliuretano con sistema de engrafe, en lamina de acero galvanizada calibre 18, bisagras de aluminio y acabado en pintura electostatica color por definir + rejilla de aire inferior en aluminio, marco m120, ref zra, medidas 85 x 295, termocurado por definir, kit 2030 cerradura de embutir con manija sena y roseta, puertas deuil	UN	4,00	$ 1.195.263,00	$ 4.781.052,00							
12,115	Suministro e instalacion de P-5 puerta lisa panel inyectada en poliuretano con sistema de engrafe, en lamina de acero galvanizada calibre 18, bisagras de aluminio y acabado en pintura electostatica color por definir + rejilla de aire inferior en aluminio, marco m120, ref zra, medidas 75 x 295, termocurado por definir,kit 2030 cerradura de embutir con manija sena y roseta, puertas deuil	UN	10,00	$ 1.159.374,00	$ 11.593.740,00							
12,116	Suministro e instalacion de P-6 puerta lisa panel inyectada en poliuretano con sistema de engrafe, en lamina de acero galvanizada calibre 18, bisagras de aluminio y acabado en pintura electostatica color por definir + rejilla de aire inferior en aluminio, marco m120, ref zra, medidas 75 x 295, termocurado por definir kit 2030 cerradura de embutir con manija sena y roseta puertas deuil	UN	3,00	$ 1.159.374,00	$ 3.478.122,00							
12,117	Suministro e instalacion de P-7 puerta lisa panel inyectada en poliuretano con sistema de engrafe, en lamina de acero galvanizada calibre 18, bisagras de aluminio y acabado en pintura electostatica color por definir + rejilla de aire inferior en aluminio, marco m120, ref zra, medidas 85 x 295, termocurado por definir, kit 2030 cerradura de embutir con manija sena y roseta, puertas deuil	UN	1,00	$ 1.195.263,00	$ 1.195.263,00							
12,124	Suministro e instalacion de puerta metalica para cuarto de centro de transformacion, cuarto tecnico SUBESTACION 2	UN	7,00	$ 5.738.648,00	$ 40.170.536,00							
12,125	Suministro e instalacion de puerta metalica para cuarto de centro de transformacion, cuarto tecnico SUBESTACION 2	UN	1,00	$ 7.676.769,00	$ 7.676.769,00							
12,126	Suministro e instalacion de Cerramiento para cuarto de centro de transformacion de pedestal	ML	80,00	$ 496.790,00	$ 39.743.200,00							
12,127	VARILLA EN ACERO 1/2" DE DIAMETRO	ML	21,60	$ 2.310,00	$ 49.896,00							
13	CARPINTERIA MADERA				$ -							
13,15	Suministro e instalacion de Mueble tipo closet ,puertas, tapas, entrepaños, respaldos, cajoneras, en madera aglomerada tipo mdf o similar de 18 mm, recubrimiento parte superior e inferior en laminado melamínico decorativo de alta resistencia color wengue, recubrimiento perimetral canto rigido en pvc de 20 mm y 35 mm termofundido mismo color de la superficie. Incluye elementos de fijación, rieles, herrajes, visagras	M2	14,58	$ 605.128,00	$ 8.822.766,24							

13,16	Suministro e instalacion de mueble baño, Puertas, tapas, ...baños, respaldos, cajoneras, en madera aglomerada tipo ...o similar de 18mm, recubrimiento parte superior e inferior ...aminado melamínico decorativo de alta resistencia color wengue, recubrimiento perimetral canto rígido en pvc de 20 mm y 36 mmtermofundido mismo color de la superficie. Incluye elementos de fijación, rieles, herrajes, visagras, cerradura, tapajuntas, chazos, tornillos	UN	3,00	$ 591.412,00	$ 1.774.236,00							
15	PISOS				$ -							
15,1	Suministro e instalación de Piso esmaltado con endurecedor de quarzo y allanado manual, directamente sobre placa, juntas de dilatación cortadas con discos de pulidor E= 3mm (modulacion según diseño), acabado brillante y sellado. Trafico mediano	M2		$ 242.613,00	$ -							
15,2	Suministro e instalación de media caña fundida en sitio, grano de marmol color blanco huila	ML	33,81	$ 37.502,00	$ 1.267.942,62							
15,6	Suministro e instalación de Baldosa de grano de marmol pulido N°1 33x33 cm vibroprensada de espesor 15 mm, perlato claro fondo blanco granulada. Instalación con destroque y pulida juntas con boquilla con polvo del mismo grano, acabado brillante y sellado, diseño según planos de despiece en detalles de pisos.	M2		$ 92.178,00	$ -							
15,7	Suministro e instalación de Guardaescobas recto prefabricado en grano de marmol pulido 10x 33 cm referencia color perlato claro fondo blanco , acabado brillante	ML	951,74	$ 70.076,00	$ 66.694.132,24							
15,8	Suministro e instalacion de Guardaescobas en ceramica, de 10x120 cm referencia color Nature bizque, acabado brillante	ML	100,30	$ 70.076,00	$ 7.028.622,80							
15,9	Suministro e instalación de Boca puerta en grano de marmol No. 1, fundido, pulido y brillado, color blanco huila fondo blanco, diseño según despiece de pisos.	ML	3,06	$ 40.285,00	$ 123.272,10							
15,18	Suministro e instalación de cereamica Nature de Alfa, de 15 x 120 cm color Bizque,.	M2	363,58	$ 154.245,00	$ 56.077.084,06							
15,21	Suministro e instalacion de adoquin para área de circulacion	M2	44,46	$ 207.482,00	$ 9.224.649,72							
15,24	Suministro e instalación de piso en Mikones Ard tipo Corona Antideslizante blanco, 33.8 x 33.8 o similar	M2	28,55	$ 120.129,00	$ 3.429.682,95							
15,29	Suministro e instalacion de Guardaescobas en porcelanato Santorini de corona, 10x56.6 cm, boquilla	ML	17,74	$ 33.819,00	$ 599.949,06							
15,3	Suministro e instalacion de Piso en porcelanato Santorini de corona, 56.6x56.6 cm	M2	16,26	$ 114.052,00	$ 1.854.485,52							
15,31	Suministro e instalación de piso corona Fortaleza beige, 33.8 x 33.8	M2	84,93	$ 72.740,00	$ 6.177.808,20							
15,33	Suministro e instalación de Piso Corona Mikonos Beige 33.8 x 33.8	M2	118,73	$ 71.630,00	$ 8.504.629,90							
15,34	Suministro e instalacion de microcemento	M2	49,75	$ 153.538,00	$ 7.638.515,50							
15,36	Suministro e instalación de piso corona Mancora ard marfil, 33.8 x 33.8	M2	2,12	$ 68.628,00	$ 145.491,36							
15,39	Suministro e instalacion de Guardaescobas en Ceramica Corona Fortalez beige	ML	47,04	$ 29.856,00	$ 1.404.426,24							
15,41	Suministro e instalación de Boca puerta en grano de marmol No. 1, fundido, pulido y brillado, color beige, diseño según despiece de pisos.	ML	37,05	$ 44.067,00	$ 1.632.682,35							
15,42	Suministro e instalación de media caña fundida en sitio, grano de marmol color beige	ML	281,21	$ 37.376,00	$ 10.510.504,96							
16	ENCHAPE MUROS Y ACCESORIOS				$ -							
16,2	Suministro e instalación de ceramica Verona blanco referencia 606432001 corona o similar, para enchape de muro en formato de 30 x 60 cm, bordes rectificados. Remates acabados con win plastico color blanco. Incluye boquilla. (Baños y Cocinas)	M2	94,44	$ 93.055,00	$ 8.788.114,20							
16,4	Suministro e instalación de Meson con salpicadero en granito pulido color negro pettro 20 mm, apoyado sobre mueble de madera. Para baños	ML	2,70	$ 137.431,00	$ 371.063,70							
16,5	Suministro e instalación de Meson con salpicadero en granito pulido color negro pettro 20 mm, apoyado sobre mueble en estructura metalica. Para baños	ML	22,58	$ 146.469,00	$ 3.307.276,02							
16,8	Suministro e instación de Lavamanos de colgar en porcelana sanitaria, color blanco, dimensiones 47X36,5 cm, con agujeros insinuados, incluye juego de accesorios y elementos de fijación, no incluye griferia	UN	2,00	$ 120.601,00	$ 241.202,00							
16,9	Suministro e instalación de Orinal ADA en porcelana sanitaria color blanco de entrada posterior antivandálico con esmalte antibacterial, dimensiones 34 X 62 X 38,7 cms. Incluye juego de accesorios y elementos de fijación	UN	12,00	$ 241.880,00	$ 2.902.560,00							
16,12	Suministro e instalación de Sanitario alongado de una pieza en porcelana sanitaria color blanco de control azul y asiento de cierre suave, medidas 35,7 x x69,4 x x40,8 cms. Incluye juego de accesorios y elementos de fijación.	UN	3,00	$ 471.225,00	$ 1.413.675,00							

16,13	Suministro e instalacion de Juego de accesorios e instalaciones cromados de 6 unidades Corona Milán o similar. Incluye elementos de fijacion.	UN	3,00	$ 144.921,00	$ 763,00							
16,15	Suministro e Instalación de Lavamanos de sobreponer en porcelana cerámica color blanco 51 x 45 con agujeros insinuados . Incluye accesorios y elementos de fijación, no incluye grifería	UN	37,00	$ 173.145,00	$ 6.406.365,00							
16,16	Suministro e instalación de Taza alongada color blanco línea institucional 36,8 x 73 x 36,2 cms (altura tradicional). Incluye valvula de push antibandalica y asiento institucional. Incluye juego de accesorios y elementos de fijación.	UN	37,00	$ 387.173,00	$ 14.325.401,00							
16,17	Suministro e instalacion de Dispensador de jabón liquido, 1lts de capacidad, Fabricado en acero 304, con Llave y cerradura, trae contenedor plastico lo que permite que el jabón no tenga contacto con el acero cod 210797. Incluye elementos de fijación. Baños	UN	10,00	$ 135.617,00	$ 1.356.170,00							
16,18	Suministro e Instalacion de Dispensador de papel higienico para rollos de 400mts eje para soporte del rollo de 40mm, incluye suplemento para rollos con cono de 70mm, Fabricado en acero 430, con llave y cerradura. Cod. 40799. Incluye Juego de accesorios y elementos de fijación	UN	30,00	$ 160.722,00	$ 4.821.660,00							
16,24	Suministro e instalacion de Dispensador de toallas, Fabricado en acero 304 satinado, con llave y cerradura, para 450 toallas dobladas en "C" o 600 toallas dobladas en "Z" cod 210805 . Incluye juegos de accesorios y elementos de fijacion.	UN	5,00	$ 149.968,00	$ 749.840,00							
16,43	Suministro e instalacion de revestimiento prodema PRO - IN Panel Prodin Proligna 2440 x 1220 x 8 mm Lisa, Perfil Gamma x 4.0 m. Perfil Omega Para Prodema ProdIN x 3.0 m ml, Gancho de Cuelgue para Prodema ProdIN, Tornillo Fijación del Panel al Clip de Cuelgue, Hunter douglas o similar	M2	410,13	$ 512.661,00	$ 210.257.655,93							
16,77	Suministro e Instalacion de Ceramica para pared Almara beige 30 x 60	M2	1.075,57	$ 69.907,00	$ 75.189.871,99							
16,81	Suministro e instalacion de Griferia de pared para lavamanos, de push con valvula reguladora de caudal integrada, acabado metalico cromado, ref.947110001" o similar. Incluye juego de accesorios y elementos de fijacion, baterias	UN	30,00	$ 208.495,00	$ 6.254.850,00							
16,83	Suministro e instalacion de Regadera de seguridad antivandalica tipo push ref. 754000001 o similar. Incluye juego de accesorios y elementos de fijación, patrulleros	UN	3,00	$ 290.639,00	$ 871.917,00							
16,84	Suministro e instalacion de Griferia de push para pared, antivandálica, acabado metalico cromado, ref.701320001 o similar. Incluye juego de accesorios y elementos de fijacion, retenidos	UN	5,00	$ 226.774,00	$ 1.133.870,00							
16,85	Suministro e instalacion de Regadera de seguridad antivandalica tipo push ref. 704320001 o similar. Incluye juego de accesorios y elementos de fijacion, retenidos	UN	1,00	$ 262.421,00	$ 262.421,00							
16,88	Suministro e instalacion de Griferia de mesa para lavamanos monocontrol acabado metálico cromado, ref. Th1015551 o similar. Incluye juego de accesorios y elementos de fijación, apartamentos y casas fiscales	UN	3,00	$ 205.181,00	$ 615.543,00							
16,89	Suministro e instalacion de Griferia para ducha acabado metalico cromado mezcla de agua fria y caliente independiente, Ref. DR401551 o similar. Incluye juego de accesorios y elementos de fijación, apartamentos y casas fiscales	UN	1,00	$ 330.707,00	$ 330.707,00							
17	PINTURA		2.281,20		$ -							
17	Suministro e instalación de Koraza blanca sobre muro de fachada 3 manos Incluye filos, dilataciones y carteras vanos	ML	2.281,20	$ 22.082,00	$ 50.373.458,40							
17,1	Suministro e instalación de Koraza gris sobre muro de fachada 3 manos incluye filos,dilataciones y carteras vanos	M2	366,90	$ 32.691,00	$ 11.994.327,90							
17,2	Suministro e instalación de Koraza blanca sobre muro de fachada 3 manos Incluye filos, dilataciones y carteras vanos	M2	2.978,98	$ 32.625,00	$ 97.189.380,75							
17,3	Suministro e instalación de Estuco plastico y vinilo tipo 1 blanco sobre muro interior 3 manos Incluye filos, dilataciones y cartera vanos	M2	5.395,32	$ 23.501,00	$ 126.795.415,32							
17,5	Suministro e instalación de Estuco plastico y vinilo tipo 1 blanco sobre vanos	ML	979,93	$ 19.076,00	$ 18.695.104,54							
17,6	Suministro e instalación de Pintura Epoxica para pisos	M2		$ 27.800,00	$ -							
20	CIELO RASO				$ -							
20,1	Suministro e instalacion de Cielo raso en fibra mineral, texturizado, 61 x 61, color blanco, instalado sobre estructura de doble alma de acero electro galvanizado. Incluye todos los elementos de fijacion y anclaje para su nivelacion por debajo de la placa, asi como rejilla plastica de ventilacion de acuerdo los detalles en los planos arquitectonicos	M2	3.362,42	$ 90.218,00	$ 303.344.082,72							

20,2	Suministro e instalacion de Cielo raso en fibrocemento de 61 x [illegible], color blanco, instalado sobre estructura de doble alma en acero electro galvanizado, pre-pintado tipo T invertida de 24 cm de ancho. Incluye todos los elemento de anclaje y fijacion bajo placa	M2	216,46	$ 99.615,00	$ 662,90							
21	VIDRIOS Y ESPEJOS				$ -							
	VENTANAS				$ -							
21,2	Suministro e instalacion de ventaneria fija dilatada de muros con cuerpo lateral deslizable según detalle. En perfileria de aluminio, acabado anonizado blanco mate, dimensiones ventana variable cristal con camara low-e 24mm composicion (6mm-knt sep 12mm+6m-nc) bordes pulidos male (100*1000), incluye elementos de fijacion.	M2	1.001,60	$ 496.000,00	$ 496.793.600,00							
21,19	Suministro e instalacion de Espejo 4 mm borde liso y pulido. Incluye elementos de fijacion, en todos los baños	M2	21,88	$ 64.101,00	$ 1.402.529,88							
21,21	Suministro e instalacion Division de baño vidrio templado 8 mm chapetas cromadas incluye elementos de fijacion	M2	2,71	$ 760.960,00	$ 2.062.201,60							
21,24	suministro e instalacion de divisiones para orinales en lamina de acero inoxidable 430 cal.18e=3cm incluye accesorios y elementos de fijacion (dimensiones segundo planos).	UN	6,00	$ 653.443,00	$ 3.920.658,00							
21,25	Suministro e instalacion de divisiones para sanitarios en lamina de acero inoxidable 430 cal.18e=3cm incluye puerta accesorios y elementos de fijacion (dimensiones segundo planos).	UN	35,00	$ 849.514,00	$ 29.732.990,00							
21,29	Suministro e instalacion de Puerta en vidrio templado de 10mm (doble), incluye sandblasting, herrajes, topes, chapa y elementos de fijación y anclaje.	M2	154,88	$ 942.967,00	$ 146.046.728,96							
21,55	Suministro e instalacion de V-1 BODE persiana antiform perfil koncpt40 koncpt50 trat. anodizado A3, h=3.25, b=1.0, vidrio 6-12-6	UN	6,00	$ 576.970,00	$ 3.461.820,00							
21,56	Suministro e instalacion de V-2 BODE persiana antiform perfil koncpt40 koncpt50 trat. anodizado A3, h=3.25, b=1.50, vidrio 6-12-6	UN	10,00	$ 778.714,00	$ 7.787.140,00							
21,57	Suministro e instalacion de V-3 BODE persiana antiform perfil koncpt40 koncpt50 trat. anodizado A3, h= 3.25, b=3.0, vidrio 6- 12-6	UN	4,00	$ 1.364.914,00	$ 5.459.656,00							
21,58	Suministro e instalacion de V-4 BODE persiana antiform perfil koncpt40 koncpt50 trat. anodizado A3, h=0.60, b=2.15, vidrio 6- 12-6	UN	4,00	$ 280.796,00	$ 1.123.184,00							
21,59	Suministro e instalacion de V-5 BODE fijo o marco 0047 alfajia koncpt40 trat. anodizado A3, h=3.25, b=1.0. vidrio 6-12-6	UN	2,00	$ 1.484.676,00	$ 2.969.352,00							
21,60	Suministro e instalacion de V-6 bode puerta corrediza xo perfil komct100 tubular trat. anodizado A3, h=0.70, b= 3.10, vidrio 6-12- 6	UN	2,00	$ 1.403.602,00	$ 2.807.204,00							
21,61	Suministro e instalacion de V-7 BODE persiana antiform perfil koncpt40 koncpt50 trat. anodizado A3, h=0.70, b=3.0, vidrio 6-12-6	UN	2,00	$ 386.425,00	$ 772.850,00							
21,62	Suministro e instalacion de V-8 BODE persiana antiform perfil koncpt40 koncpt50 trat. anodizado A3, h=0.60, b=0.82, vidrio 6- 12-6	UN	1,00	$ 165.122,00	$ 165.122,00							
21,63	Suministro e instalacion de V-9 BODE persiana antiform perfil koncpt40 koncpt50 trat. anodizado A3, h=0.50, b=1.40, vidrio 6- 12-6	UN	2,00	$ 1.000.063,00	$ 2.000.126,00							
21,64	Suministro e instalacion de V-10 BODE persiana antiform perfil koncpt40 koncpt50 trat. anodizado A3, h= 2.75, b=1.0, vidrio 6- 12-6	UN	2,00	$ 504.368,00	$ 1.008.736,00							
21,117	Suministro e instalacion de V-1A DEUIL ventana proyectante vp S40X pisavidrio interior apertura vert alfajia koncpt40 trat. anodizado A3, h=1.0, b=1.0, vidio 6-12-6	UN	17,00	$ 771.314,00	$ 13.112.338,00							
21,118	Suministro e instalacion de V-1B DEUIL ventana proyectante vp s40x pisavidrio interior apertura vert alfajia koncpt40 trat. anodizado A3, h=1.0, b=1.0, vidrio 6-12-6, antepecho 1.45	UN	19,00	$ 771.314,00	$ 14.654.966,00							
21,119	Suministro e instalacion de V-1C DEUIL ventana proyectante vp s40x pisavidrio interior apertura vert alfajia koncpt40 trat. anodizado A3, h=1.0, b=1.0, vidrio 6-12-6, amtepecho 1.95	UN	8,00	$ 771.314,00	$ 6.170.512,00							
21,12	Suministro e instalacion de V-2A DEUIL puerta corrediza xox perfil komct100 tubular trat. anodizado A3, h=0.50, b=2.90, vidrio 6-12-6	UN	2,00	$ 1.822.166,00	$ 3.644.332,00							
21,121	Suministro e instalacion de V-2B DEUIL puerta corrediza xox perfil komct100 tubular trat. anodizado A3, h=0.50, b=4.70, vidrio 6-12-6	UN	4,00	$ 2.412.080,00	$ 9.648.320,00							
21,122	Suministro e instalacion de V-2C DEUIL ventana corrediza xoox perfil komct100 tubular trat. anodizado A3, h=0.50, b=5.45, vidrio 6-12-6	UN	2,00	$ 2.601.080,00	$ 5.202.160,00							
21,123	Suministro e instalacion de V-2D DEUIL ventana corrediza xoox perfil komct100 tubular trat. anodizado A3, h=0.50, b=5.70, vidrio 6-12-6	UN	1,00	$ 2.663.679,00	$ 2.663.679,00							

21,124	Suministro e instalacion de V-2E DEUIL ventana corrediza xoox; koncpt100 tubular trat. anodizado A3, h=0.50, b=0.20, 6-12-6	UN	6,00	$ 2.789.474,00	$ 44,00							
21,125	Suministro e instalacion de V-3A DEUIL ventana proyectante vp; s40x pisavidrio interior apertura vert alfajia koncpt40 trat. anodizado A3, h=1.50, b=0.75, vidrio 6-12-6	UN	10,00	$ 850.787,00	$ 8.507.870,00							
21,126	Suministro e instalacion de RV-3B DEUIL ventana proyectante vp s40x pisavidrio interior apertura vert alfajia koncpt40 trat. anodizado A3, h=1.50, b=1.50, vidrio 6-12-6	UN	8,00	$ 1.012.148,00	$ 8.097.184,00							
21,127	Suministro e instalacion de V-3C DEUIL ventana proyectante vp s40x pisavidrio interior apertura vert alfajia koncpt40 trat. anodizado A3, h=1.50, b=1.50, vidrio 6-12-6	UN	4,00	$ 1.340.728,00	$ 5.362.912,00							
21,128	Suministro e instalacion de V-4A DEUIL ventana proyectante vp; o-x-o alfajia koncpt40 trat. anodizado A3, h=2.95, b=0.75, vidrio 6-12-6	UN	46,00	$ 1.256.485,00	$ 57.798.310,00							
21,129	Suministro e instalacion de V-4B DEUIL ventana proyectante vp; o-x-o alfajia koncpt40 trat. anodizado A3, h=2.95, b=1.0, vidrio 6-12-6	UN	36,00	$ 1.564.368,00	$ 56.317.248,00							
21,13	Suministro e instalacion de V-4C DEUIL ventana proyectante vp o-x-o alfajia koncpt40 trat. anodizado A3, h=2.95, b=1.50, vidrio 6-12-6	UN	14,00	$ 2.189.333,00	$ 30.650.662,00							
21,131	Suministro e instalacion de V-5 DEUIL persiana antitorm perfil koncpt40 koncpt50 trat. anodizado A3, h=0.40, b=1.50, vidrio 6-12-6	UN	12,00	$ 182.390,00	$ 2.188.680,00							
21,132	Suministro e instalacion de V-6 DEUIL rejilla con corrediza ox; perfil koncpt40 koncpt100, tubular koncpt50 trat. anodizado A3, H=0.90, B=1.50, VIDRIO 6-12-6	UN	8,00	$ 1.152.929,00	$ 9.223.432,00							
22	URBANISMO				$ -							
22,3	Suministro e instalación de mortero 1:3 e = 2cm para Afinado	M2	3.427,38	$ 30.561,00	$ 104.744.160,18							
22,4	Suministro e instalacion Bordillo prefabricado en concreto de 3000PSI .15x.35x.80 tipo Titan o similar	ML	1.759,55	$ 42.897,00	$ 75.479.416,35							
22,5	Suministro e instalacion de adoquin en concreto rectangular 20 x 10 tipo Adop - A o similar para área de circulacion	M2	2.822,17	$ 115.057,00	$ 324.710.413,69							
22,7	Suministro e instalacion de Sardinel prefabricado en concreto 3000 psi .20 x .50 x .80 tipo titan o similar	ML	3.429,19	$ 72.609,00	$ 248.990.056,71	176,51	$ 12.816.214,59	682,01	$ 49.520.064,09	858,52	$ 62.336.278,68	
22,8	Suministro e instalacion de loseta en concretdo 40x40x6 cm tost-p -h-plana tipo indural o similar	M2	605,21	$ 113.516,00	$ 68.701.018,36							
22,12	Suministro e instalacion de sub base en recebo compactado	M3	2.918,98	$ 246.915,00	$ 720.739.946,70	331,16	$ 81.768.371,40	800,25	$ 197.593.728,75	1.131,41	$ 279.362.100,15	
22,13	Suministro e instalacion de pintura reflectiva para demarcacion de parqueaderos	ML	691,00	$ 11.558,00	$ 7.986.578,00							
22,15	Suministro e instalacion de arena de peña para base de pisos exteriores e=0.05	M2	2.822,17	$ 16.559,00	$ 46.732.313,03							
22,19	Suministro e instalacion de concreto ciclopeo 60% concreto de 3000 psi 40% piedra	M3	30,06	$ 571.449,00	$ 17.177.756,94	3,15	$ 1.800.064,35	9,91	$ 5.663.059,59	13,06	$ 7.463.123,94	
22,21	Suministro e instalacion de Arbol Almendro	UN		$ 89.218,00	$ -							
22,23	Suministro e instalacion de Arbol Carbonero	UN		$ 85.955,00	$ -							
22,26	Suministro e instalacion de Arbol Guayacan Amarillo	UN		$ 89.218,00	$ -							
22,27	Suministro e instalacion de Arbol limon	UN		$ 90.373,00	$ -							
22,28	Suministro e instalacion de Arbol Gualanday	UN		$ 85.955,00	$ -							
22,29	Suministro e instalacion de Arbol Igua	UN		$ 90.373,00	$ -							
22,3	Suministro e instalacion de Arbol Mango	UN		$ 90.373,00	$ -							
22,31	Suministro e instalacion de Palma Areca	UN		$ 87.682,00	$ -							
22,32	Suministro e instalacion de Palma botella	UN		$ 94.390,00	$ -							
22,33	Suministro e instalacion de Palma real	UN		$ 98.407,00	$ -							
22,34	Suministro e instalacion de arbol Patevaca	UN		$ 85.854,00	$ -							
22,37	Suministro e instalacion de planta sanseviera	M2		$ 115.378,00	$ -							
22,41	Suministro e instalacion de planta Tradescantua	M2		$ 111.361,00	$ -							
22,42	Suministro e instalacion de planta Anturio blanco	M2		$ 111.361,00	$ -							
22,43	Suministro e instalacion de planta Pennisetun	M2		$ 119.395,00	$ -							
22,45	Suministro e instalacion de planta Camaron amarillo	M2		$ 129.437,00	$ -							
22,46	Suministro e instalacion de planta Philodendron	M2		$ 115.378,00	$ -							
22,48	Suministro e instalacion de Mani forragero	M2		$ 84.247,00	$ -							
22,49	Suministro e instalacion de planta Calathea triostas	M2		$ 99.311,00	$ -							
22,5	Suministro e instalacion de planta Cardiolinea	M2		$ 109.353,00	$ -							
23	OBRAS EXTERIORES				$ -							
23,1	Suministro e instalacion talanquera vehicular manual	UN		$ 687.420,00	$ -							
23,3	Suministro e instalacion Letras en bronce	UN		$ 73.074,00	$ -							
23,4	Suministro e instalacion de Escudo institucional en bronce	UN		$ 2.540.622,00	$ -							
23,5	Suministro e instalacion de topellantas en concreto prefabricado	UN		$ 44.881,00	$ -							
23,6	Suministro e instalacion de juego de 3 canecas para basura en acero inoxidable M-121, con mecanismo pivotante antivandalico, acoplado a sus parales de soporte	UN		$ 1.889.164,00	$ -							
23,7	Suministro e instalacion Cerramiento (tubo metalico 2") cada 12 cm H= 2,5 m	ML	105,00	$ 283.173,00	$ 29.733.165,00							
23,8	Suministro e instalacion Cerramiento (muro en mamposteria bloque split) h=0.50, viga de cimentacion y bordillo	ML	105,00	$ 266.637,00	$ 27.996.885,00							

23,9	...tro e instalacion de Tubo aguas negras de 3", anclado al ... para banderas pintados para pabellón banderas altura de 5,50 Ml	UN	3,00	$	222.376,00	$	...126,00					
23,1	Suministro e instalacion Contenedor de árbol en concreto de 3000 PSI fundido en sitio e=15cm	M2		$	305.088,00	$	-					
30	INSPECTORIA Y TRAMITES					$	-					
30,1	INSPECTORIA RETIE Y RETILAP	UN	1,50	$	21.182.544,00	$	31.773.816,00					
30,2	TRAMITE DE CONEXIÓN ANTE EL OPERADOR DE RED	UN	1,00	$	20.396.234,00	$	20.396.234,00					
30,3	PROVISIONAL ELECTRICA	UN	1,00	$	27.724.148,00	$	27.724.148,00					
30,4	APROBACIÓN Y ENERGIZACIÓN PROYECTO 34,5kV	UN	1,00	$	49.779.600,00	$	49.779.600,00					

	COSTO DIRECTO		$ 24.870.730.727,73		$ 559.653.495,48		$ 5.801.113.590,34		$ 6.360.667.085,82
	ADMINISTRACIÓN	21,00%	$ 5.222.853.452,82		$ 117.506.234,05		$ 1.218.233.853,97		$ 1.335.740.088,02
	IMPREVISTOS	1,00%	$ 248.707.307,28		$ 5.596.534,96		$ 58.011.135,90		$ 63.606.670,86
	UTILIDAD	5,00%	$ 1.243.536.536,39		$ 27.977.674,77		$ 290.055.679,53		$ 318.033.354,30
	IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%	$ 236.271.941,91		$ 5.315.758,21		$ 55.110.579,10		$ 60.426.337,31

	COSTO TOTAL OBRA DEUIL		$ 31.822.099.966,13		$ 715.949.697,47		$ 7.422.524.838,84		$ 8.138.473.536,31
	NO PREVISTOS						$ -		$ -
NP-001	Concreto limpieza 2000Psi H=0,05	M2	824,94	$ 38.717,00	$ 31.939.201,98	544,15	$ 21.067.855,55	544,15	$ 21.067.855,55
NP-002	Suministro e instalación de Mamposteria en bloque Muros 12 cm.	M2	585,55	$ 56.433,00	$ 33.044.343,15				
NP-003	Suministro e instalación de Mamposteria en bloque Muros 20 cm.	M2	4.444,90	$ 112.472,00	$ 499.926.792,80	1.268,01	$ 142.615.620,72	1.268,01	$ 142.615.620,72
NP-004	Lleno entremuros con concreto de espesor de 10 cm	M2	215,82	$ 86.986,00	$ 18.773.318,52				
NP-005	Suministro e instalación columneta 20 *15	ML	5.458,30	$ 71.258,00	$ 388.947.541,40	1.467,03	$ 104.537.623,74	1.467,03	$ 104.537.623,74
NP-006	Suministro e instalación columneta 12*15	ML	155,70	$ 62.180,00	$ 9.681.426,00				
NP-007	Suministro e instalación de Geotextil Tejido 2400	M2	7.419,35	$ 13.384,00	$ 99.300.580,40	5.657,08	$ 75.714.358,72	5.657,08	$ 75.714.358,72
NP-008	Anclaje Epoxico 1/2" de 15cm	UN	6.007,00	$ 19.244,00	$ 115.598.708,00	1.684,00	$ 32.406.896,00	1.684,00	$ 32.406.896,00
NP-009	Suministro e instalación grafil de 4mm	ML	20.604,95	$ 1.126,00	$ 23.201.173,70	7.263,24	$ 8.178.408,24	7.263,24	$ 8.178.408,24
NP-010	Escalera en concreto 5.000 PSI	M3	14,67	$ 1.719.790,00	$ 25.229.319,30				
NP-011	Suministro e instalación de polietileno para losa de contrapiso	M2	2.602,90	$ 5.385,00	$ 14.016.616,50	2.017,61	$ 10.864.829,85	2.017,61	$ 10.864.829,85
NP-012	Suministro e instalación de media caña fundida en sitio, mortero 1:3 impermbealizado e=0.05M;H=0.10M	ML	709,45	$ 21.202,00	$ 15.041.758,90				
NP-013	Lleno con grava para zanja de tuberia	M3	464,27	$ 125.379,00	$ 58.209.708,33				
NP-014	Suministro e instalación de teja tipo sándwich para cubiertas, en lámina calibre 26 con relleno en poliestireno 38 cm	M2	156,17	$ 201.609,00	$ 31.485.277,53				
NP-015	Suministro e instalacion de Baldosa vibroprensada Grano Marmol Terrazo Bicapa espesor 2,2 cm, con mezcla de mortero espesor 3 cm incluye destroque, brillado y pulido.	M2	3.847,47	$ 153.224,00	$ 589.524.743,28	467,70	$ 71.662.864,80	467,70	$ 71.662.864,80
NP-016	Suministro e instalacion de estructura metalica en perfiles tubulares A500 GRADO C	KG	21.882,00	$ 19.600,00	$ 428.895.200,00				
NP-017	Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto portante color blanco, calibre 22.	M2	282,21	$ 261.019,00	$ 73.613.250,99				
NP-018	CABLE APANTALLADO 3X18	ML	1.938,00	$ 11.927,00	$ 23.114.526,00				
NP-019	TUBERIA EMT DE 3/4"	ML	1.616,00	$ 32.342,00	$ 52.264.672,00				
NP-020	Malla electrosoldada	KG	15.984,26	$ 5.449,00	$ 87.098.232,74	14.052,60	$ 76.572.617,40	14.052,60	$ 76.572.617,40
					$ -				

	COSTO DIRECTO		$ 2.618.506.391,52		$ 543.621.075,02				$ 543.621.075,02
	ADMINISTRACIÓN	21,00%	$ 549.886.341,22		$ 114.160.425,75				$ 114.160.425,75
	IMPREVISTOS	1,00%	$ 26.185.062,92		$ 5.436.210,75				$ 5.436.210,75
	UTILIDAD	5,00%	$ 130.925.319,58		$ 27.181.053,76				$ 27.181.053,76
	IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%	$ 24.875.810,01		$ 5.164.400,20				$ 5.164.400,20

	COSTO TOTAL NO PREVISTOS		$ 3.350.378.925,24		$ 695.563.165,48				$ 695.563.165,48
25	MOBILIARIO - DEUIL - BODEGAS Y EXTERIORES								
25,1	Suministro e instalacion de Comando - superficie comandante, incluye puente credenza aire vidrio/blanco htelo, almacenamiento inferior aire, escritorio direccional 2 x 0.9, retorno pata al vidrio aire, arch movil metalico, tipo Muma o similar	UN	1,00	$ 7.649.050,00	$ 7.649.050,00				
25,2	Suministro e instalacion silla giratoria alto wise, tipo Muma o similar	UN	1,00	$ 1.186.974,00	$ 1.186.974,00				
25,3	Suministro e instalacion de silla brazo tapizada movie, tipo Muma o similar	UN	100,00	$ 343.941,00	$ 34.394.100,00				
25,4	Suministro e instalacion subComando - superficie subc, incluye puente conector vidrio aire, almacenamiento inferior aire, escritorio direccional 1,8 x 0.7, arch movil metalico, tipo Muma o similar	UN	5,00	$ 6.077.465,00	$ 30.387.325,00				
25,5	Suministro e instalacion silla giratoria medio wise, tipo Muma o similar	UN	77,00	$ 1.009.229,00	$ 77.710.633,00				

25,6	Suministro e instalacion jefaturas, superficie jefatura 1,60 x) con elementos como: pata U sencilla, Superficie retorno, ficie 1,5 x 062 , Archivador movil metal, faldon 1,5, nte sencillo remate, tipo Muma o similar	UN	44,00	$ 2.081.220,00	$ 380,00							
25,7	Suministro e instalacion de puesto de trabajo en L 1,50 x 1,50, incluye elementos como:pata panel viva, perfil tapa canto lateral, complemento bajante viva,pantalla vidrio panel, poste cableado, panel 1 perfil, superficie tipo pata U basica viva, archivador metalico, tipo Muma o similar	UN	219,00	$ 4.525.892,00	$ 991.170.348,00							
25,8	Suministro e instalacion de puesto de trabajo en L 1,50 x 1,40 incluye elementos como:pata panel viva, perfil tapa canto lateral, complemento bajante viva,pantalla vidrio panel, poste cableado, panel 1 perfil, superficie tipo pata U basica viva, archivador metalico, tipo Muma o similar	UN	82,00	$ 4.525.892,00	$ 371.123.144,00							
25,9	Suministro e instalacion de puesto de trabajo en L 1,50 x 1,80 incluye elementos como:pata panel viva, perfil tapa canto lateral, complemento bajante viva,pantalla vidrio panel, poste cableado, panel 1 perfil, superficie tipo pata U basica viva, archivador metalico, tipo Muma o similar	UN	9,00	$ 4.898.878,00	$ 44.089.902,00							
25,1	Suministro e instalacion silla giratoria wise, tipo Muma o similar	UN	379,00	$ 560.348,00	$ 212.371.892,00							
25,11	Suministro e instalacion puesto operativo, superficie lineal 0.60 x 1.50, con elementos como:bandeja portacable, bandeja sencilla viga 1.5, soporte remate canaleta, pata U basica, Superficie rectangular, Archivador movl metal, tipo Muma o similar	UN	2,00	$ 2.488.578,00	$ 4.977.156,00							
25,12	Suministro e instalacion puesto operativo, superficie lineal 0.60 x 1.50 V, con elementos como: pata panel viva, perfil tapa canto, pantalla vidrio panel,pata U basica, Superficie rectangular, Archivador metal, tipo Muma o similar	UN	6,00	$ 2.488.578,00	$ 14.931.468,00							
25,13	Suministro e instalacion puesto operativo, superficie lineal 0,60 x 1,40 v, incluye elementos como:pata panel viva, perfil tapa canto lateral, complemento bajante viva,pantalla vidrio panel, poste cableado, panel 1 perfil, superficie tipo pata u basica viva, archivador metalico, tipo muma o similar	UN	1,00	$ 2.488.578,00	$ 2.488.578,00							
25,14	Suministro e instalacion puesto operativo, superficie lineal 0.60 x 1.40, con elementos como:bandeja portacable, bandeja sencilla viga 1.5, soporte remate canaleta, pata u basica, superficie rectangular, archivador movl metal, tipo muma o similar	UN	1,00	$ 1.553.007,00	$ 1.553.007,00							
25,16	Suministro e instalacion puesto operativo, superficie lineal 0,60 x 1,20, incluye elementos como: superficie 1,2 x 0,62, pata u basica, canaleta sencilla 1,2 flux, archivador metalico, tipo muma o similar	UN	3,00	$ 1.438.528,00	$ 4.315.584,00							
25,18	Suministro e instalacion puesto operativo, superficie lineal 0,60 x 1,00, incluye elementos como: superficie 1,2 x 0,62, pata u basica, canaleta sencilla 1,0 flux, archivador metalico, tipo muma o similar	UN	3,00	$ 1.438.530,00	$ 4.315.590,00							
25,19	Suministro e instalacion puesto operativo, puesto de trabajo superficie lineal 0,60 x 1,10 v, incluye elementos como:pata panel viva, perfil tapa canto lateral, complemento bajante viva,pantalla vidrio panel, poste cableado, panel 1 perfil, superficie tipo pata u basica viva, archivador metalico, tipo muma o similar	UN	2,00	$ 2.609.817,00	$ 5.219.634,00							
25,21	Suministro e instalacion de recepcion en L de 1,50 x 1,50, incluye elementos como:pata panel viva, perfil tapa canto lateral, complemento bajante viva, counter 1.5 pantalla vidrio panel, poste cableado, panel 1 perfil, superficie tipo pata u basica viva, archivador metalico, tipo muma o similar	UN	21,00	$ 4.331.015,00	$ 90.951.315,00							
25,22	Suministro e instalacion mueble de impresión 0.60 x 0.70, con elementos como: remate basico pixel, almacenamiento medio basico, almacenamiento basico arch, tipo muma o similar	UN	3,00	$ 695.916,00	$ 2.087.748,00							
25,23	Suministro e instalacion mueble de impresión 0.60 x 0.80, con elementos como: remate basico, almacenamiento medio basico, almacenamiento basico arch, tipo muma o similar	UN	10,00	$ 695.916,00	$ 6.959.160,00							
25,24	Suministro e instalacion mueble de impresión 0.60 x 0.90, con elementos como: remate basico pixel, almacenamiento medio basico, almacenamiento basico arch, tipo muma o similar	UN	18,00	$ 1.391.832,00	$ 25.052.976,00							
25,25	Suministro e instalacion mueble de impresión 0.60 x 01.0, con elementos como: remate basico pixel, almacenamiento medio basico, almacenamiento basico arch, tipo muma o similar	UN	11,00	$ 1.391.832,00	$ 15.310.152,00							
25,26	Suministro e instalacion mueble de impresión 0.60 x 1.10, con elementos como: remate basico, almacenamiento medio basico, almacenamiento basico arch, tipo muma o similar	UN	2,00	$ 1.391.832,00	$ 2.783.664,00							

25,27	Suministro e instalacion mueble de impresión 0.60 x 1.20, con elementos como: remate basico pixel, almacenamiento medio basico, almacenamiento basico arch, tipo muma o similar	UN	4,00	$ 1.391.832,00	$ 5.567.328,00							
25,28	Suministro e instalacion mueble de impresión 0.60 x 1.40, con elementos como: remate basico pixel, almacenamiento medio basico, almacenamiento basico arch, tipo muma o similar	UN	2,00	$ 2.087.748,00	$ 4.175.496,00							
25,29	Suministro e instalacion mueble de impresión 0.60 x 1.50, con elementos como: remate basico pixel, almacenamiento medio basico, almacenamiento basico arch, tipo muma o similar	UN	2,00	$ 2.087.748,00	$ 4.175.496,00							
25,31	Suministro e instalacionpuesto operatio, superficie 2,2 x 0,6 con elementos como: bandeja portacableado abierta, bajante sencillo, superficie 1.2x 0.62, suprficie 0,9 x 0,62, soporte remate canaleta, pata u sencilla, faldon 1.2, faldon 0,9, canafeta sencilla, tipo muma o similar	UN	1,00	$ 1.771.422,00	$ 1.771.422,00							
25,39	Suministro e instalacion puesto operativo, superficie 0,70 x 0,6 con elementos como:pata panel viva, perfil tapa canto, complemento bajante pantalla vidrio, poste cableado h: 1,35, panel 1 perfil , superficie rectangular, tipo muma o similar	UN	1,00	$ 1.903.634,00	$ 1.903.634,00							
25,41	Suministro e instalacion puesto operativo, superficie 0,50 x 0,6 con elementos como:pata panel viva, perfil tapa canto, complemento bajante pantalla vidrio, poste cableado h: 1,35, panel 1 perfil , superficie rectangular, tipo muma o similar	UN	1,00	$ 1.903.635,00	$ 1.903.635,00							
25,44	Suministro e instalacion mueble aux oficinas, mueble altura 2,20 x 2, contiene 4 almacenamiento vertical mixto, 4 remate basico pixel, 4 almacenamiento basico puerta, tipo muma o similar	UN	5,00	$ 4.000.763,00	$ 20.003.815,00							
25,45	Suministro e instalacion mueble aux oficinas, mueble altura 2,20 x 2, contiene 5 almacenamiento vertical mixto, 5 remate basico pixel, 5 almacenamiento basico puerta, tipo muma o similar	UN	4,00	$ 5.000.954,00	$ 20.003.816,00							
25,46	Suministro e instalacion mueble altura 2,20 x 2, contiene 6 almacenamiento vertical mixto, 6 remate basico pixel, 6 almacenamiento basico puerta, tipo muma o similar	UN	2,00	$ 6.001.145,00	$ 12.002.290,00							
25,47	Suministro e instalacion mueble altura 2,20 x 4, contiene 10 almacenamiento vertical mixto, 14 remate basico pixel, 10 almacenamiento basico puerta, tipo muma o similar	UN	2,00	$ 10.727.951,00	$ 21.455.902,00							
25,49	Suministro e instalacion mueble altura 1,20 x 1, contiene 3 almacenamiento vertical mixto, 3 remate basico pixel, 6 almacenamiento medio basico, tipo muma o similar	UN	2,00	$ 2.274.530,00	$ 4.549.060,00							
25,5	Suministro e instalacion mueble altura 1,20 x 1, contiene 2 almacenamiento vertical mixto, 2 remate basico pixel, 4 almacenamiento medio basico, tipo muma o similar	UN	4,00	$ 1.516.354,00	$ 6.065.416,00							
25,51	Suministro e instalacion archivador horizontal 3 cajones, tipo muma o similar	UN	9,00	$ 913.829,00	$ 8.224.461,00							
25,52	Suministro e instalacion mueble altura 0,8 x 1, contiene 2 almacenamiento basico arch, 2 remate basico pixel, 4 almacenamiento medio basico, tipo muma o similar	UN	4,00	$ 1.391.832,00	$ 5.567.328,00							
25,53	Suministro e instalacion mueble altura 0,8 x 1, contiene 3 almacenamiento basico arch,3 remate basico pixel, 6 almacenamiento medio basico, tipo muma o similar	UN	6,00	$ 2.087.748,00	$ 12.526.488,00							
25,55	Suministro e instalacion mueble altura 0,8 x 2, contiene 4 almacenamiento basico arch, 4 remate basico pixel, 8 almacenamiento medio basico, tipo muma o similar	UN	7,00	$ 2.783.664,00	$ 19.485.648,00							
25,56	Suministro e instalacion mueble altura 0,8 x 2, contiene 5 almacenamiento basico arch, 5 remate basico pixel, 10 almacenamiento medio basico, tipo muma o similar	UN	2,00	$ 3.479.580,00	$ 6.959.160,00							
25,58	Suministro e instalacion mueble aux oficinas, mueble altura 0,8 x 3, contiene 6 almacenamiento basico arch, 6 remate basico pixel, 12 almacenamiento medio basico, tipo muma o similar	UN	2,00	$ 4.175.496,00	$ 8.350.992,00							
25,59	Suministro e instalacion mueble aux oficinas, mueble altura 0,8 x 3, contiene 7 almacenamiento basico arch,7 remate basico pixel, 14 almacenamiento medio basico, tipo muma o similar	UN	2,00	$ 4.871.412,00	$ 9.742.824,00							
25,6	Suministro e instalacion mueble aux oficinas, mueble altura 0,8 x 3, contiene 8 almacenamiento basico arch, 8 remate basico pixel, 16 almacenamiento medio basico, tipo muma o similar	UN	1,00	$ 5.567.327,00	$ 5.567.327,00							
25,62	Suministro e instalacion mesa redonda 1 m, tipo muma o similar	UN	3,00	$ 532.511,00	$ 1.597.533,00							
25,63	Suministro e instalacion mesa juntas rectangular 6 p rango medio super, tipo muma o similar	UN	2,00	$ 2.694.289,00	$ 5.388.578,00							
25,64	Suministro e instalacion mesa juntas rectangular 8 prango medio super, tipo muma o similar	UN	1,00	$ 4.026.873,00	$ 4.026.873,00							
25,65	Suministro e instalacion mesa juntas ovalada 10 p rango medio super, tipo muma o similar	UN	2,00	$ 4.791.075,00	$ 9.582.150,00							

25,66	Suri e instalacion mesa juntas ovalada 10 p reigo alto tipc uma o similar	UN	1,00	$	4.791.075,00	$	4.791.0					
25,69	Sun e instalacion mesa juntas ovalada 16 p, rango alto tipo c, tipo muma o similar	UN	1,00	$	8.065.796,00	$	8.065.796,00					
25,7	Suministro e instalacion sala de juntas rango alto tipo c, modulo con espaldar, tipo muma o similar	UN	13,00	$	8.065.796,00	$	104.855.348,00					
25,71	Suministro e instalacion mesa baja cuadrada 0.7, tipo muma o similar	UN	8,00	$	676.836,00	$	5.414.688,00					
25,72	Suministro e instalacion poltrona basica mobel, tipo muma o similar	UN	31,00	$	1.087.557,00	$	33.714.267,00					
25,74	Suministro e instalacion tandem 4 puestos movie, tipo muma o similar	UN	2,00	$	827.467,00	$	1.654.934,00					
25,75	Suministro e instalacion tandem 2 puestos mas mesa, tipo muma o similar	UN	2,00	$	531.226,00	$	1.062.452,00					
25,77	Suministro e instalacion silla giratoria alta frode rueda, tipo muma o similar	UN	3,00	$	645.003,00	$	1.935.009,00					
25,93	Suministro e instalacion division mixta 1.65,incluye elementos como: fachada, refuerzo estructural, poste multiproposito, tipo muma o similar	UN	519,00	$	4.013.818,00	$	2.083.171.542,00					
25,94	Suministro e instalacion division pt llena, incluye elementos como: refuerzo estructural base, poste multiproposito,fachada alto, puerta alto, tipo muma o similar	UN	183,00	$	4.480.022,00	$	819.844.026,00					
25,95	Suministro e instalacion division pt mixta, incluye elementos como: fachada, refuerzo estructural, poste multiproposito, puerta, tipo muma o similar	UN	374,00	$	4.763.208,00	$	1.781.439.792,00					
25,96	Suministro e instalacion division pt vidrio, incluye elementos como: refuerzo estructural base, poste multiproposito,fachada alto, puerta alto, tipo muma o similar.	UN	199,00	$	4.630.653,00	$	921.499.947,00					
26	**EQUIPOS**			$	-	$	-					
26,1	Suministro, transporte e instalación de ascensor de pasajeros sin sala de máquinas 11 pasajeros, velocidad 60m/s, 3 paradas. Altura de cabina 2.10 mts. Entradas de 0.90 * 2.20 mts de altura con acabado en pintura. Acabado interno de cabina: -Paños en Formica, piso en vinisol, puertas en acero inoxidable e iluminacion led.	UN	2,00	$	126.363.600,00	$	252.727.200,00					
26,2	Suministro, transporte e instalación de ascensor de pasajeros sin sala de máquinas 11 pasajeros, velocidad 60m/s, 2 paradas. Altura de cabina 2.10 mts. Entradas de 0.90 * 2.20 mts de altura con acabado en pintura. Acabado interno de cabina: -Paños en Formica, piso en vinisol, puertas en acero inoxidable e iluminacion led.	UN	1,00	$	115.833.300,00	$	115.833.300,00					
26,2	SUMINISTRO DE UPS TECNOLOGIA ON-LINE, 10KVA, TRIFÁSICA 208/120 VAC A CINCO HILOS (TRES FASES +NEUTRO+GND), TIEMPO DE RESPALDO AJUSTABLE PARA DIFERENTES AUTONOMIAS BODEGAS	UN	1,00	$	29.222.779,00	$	29.222.779,00					
26	**EQUIPOS ELECTRICOS**			$	-	$	-					
26,6	SUMINISTRO DE UPS TECNOLOGIA ON-LINE, 100KVA, TRIFÁSICA 208/120 VAC A CINCO HILOS (TRES FASES +NEUTRO+GND), TIEMPO DE RESPALDO AJUSTABLE PARA DIFERENTES AUTONOMIAS, CON FACTOR DE POTENCIA DE ENTRADA DE 0,99 Y SALIDA DE 0,97	UN	1,00	$	189.461.253,00	$	189.461.253,00					
26,7	PANEL DE CONTROL CENTRAL DETECCIÓN DE INCENDIOS	UN	2,00	$	5.292.716,00	$	10.585.432,00					
26,23	SUMINISTRO DE GRUPO ELECTRÓGENO 600KVA, @0.22KV, INCLUYE CABINA INSONORIZADA, SISTEMA DE ESCAPE Y CAPACITACION AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL EN SITIO	UN	1,00	$	474.839.946,00	$	474.839.946,00					
27,1	**EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO**			$	-	$	-					
27,1,3	SUMINISTRO CONDENSADORA VOLUMEN VARIABLE 280000 BTU	UN	1,00	$	36.424.789,00	$	36.424.789,00					
27,1,4	SUMINISTRO CONDENSADORA VOLUMEN VARIABLE 260000 BTU	UN	2,00	$	24.775.801,00	$	49.551.602,00					
27,1,5	SUMINISTRO CONDENSADORA VOLUMEN VARIABLE 240000 BTU	UN	2,00	$	24.775.801,00	$	49.551.602,00					
27,1,7	SUMINISTRO CONDENSADORA VOLUMEN VARIABLE 180000 BTU	UN	1,00	$	22.652.740,00	$	22.652.740,00					
27,1,8	SUMINISTRO CONDENSADORA VOLUMEN VARIABLE 160000 BTU	UN	1,00	$	20.642.004,00	$	20.642.004,00					
27,1,13	SUMINISTRO CONDENSADORA MINI VOLUMEN VARIABLE 50000 BTU	UN	3,00	$	6.279.342,00	$	18.838.026,00					
27,1,15	SUMINISTRO FANCOIL DESNUDO 9000 BTU (HIGH STATIC DUCT)	UN	3,00	$	1.681.944,00	$	5.045.832,00					
27,1,16	SUMINISTRO FANCOIL DESNUDO 12000 BTU (HIGH STATIC DUCT)	UN	1,00	$	1.701.014,00	$	1.701.014,00					
27,1,17	SUMINISTRO FANCOIL DESNUDO 18000 BTU (HIGH STATIC DUCT)	UN	4,00	$	1.770.500,00	$	7.082.000,00					
27,1,18	SUMINISTRO FANCOIL DESNUDO 24000 BTU (HIGH STATIC DUCT)	UN	8,00	$	1.942.125,00	$	15.537.000,00					

27,1,19	SU[illegible]TRO FANCOIL DESNUDO 36000 BTU (HIGH STATIC DU	UN	10,00	$	2.761.675,00	$	27.616.7					
27,1,23	SUM[illegible]RO EVAPORADOR CASSETTE 1V INVERTER 12000 BTU CON PANEL	UN	7,00	$	1.717.144,00	$	12.020.008,00					
27,1,24	SUMINISTRO EVAPORADOR CASSETTE 1V INVERTER 18000 BTU CON PANEL	UN	3,00	$	1.945.503,00	$	5.836.509,00					
27,1,25	SUMINISTRO EVAPORADOR CASSETTE 2V INVERTER 18000 BTU CON PANEL	UN	1,00	$	2.208.458,00	$	2.208.458,00					
27,1,28	SUMINISTRO EVAPORADOR CASSETTE 4V INVERTER 12000 BTU CON PANEL	UN	7,00	$	1.935.490,00	$	13.548.430,00					
27,1,29	SUMINISTRO EVAPORADOR CASSETTE 4V INVERTER 18000 BTU CON PANEL	UN	86,00	$	2.055.827,00	$	176.801.122,00					
27,1,30	SUMINISTRO EVAPORADOR CASSETTE 4V INVERTER 24000 BTU CON PANEL	UN	6,00	$	2.397.764,00	$	14.386.584,00					
27,1,31	SUMINISTRO EVAPORADOR CASSETTE 4V INVERTER 36000 BTU CON PANEL	UN	2,00	$	3.147.393,00	$	6.294.786,00					
27,1,35	SUMINISTRO DESHUMIFICADOR PORTATIL 70 PINTAS	UN	7,00	$	2.361.700,00	$	16.531.900,00					
27,1,40	SUMINISTRO CASSETTE MINISPLIT 24000 BTU	UN	2,00	$	2.421.385,00	$	4.842.770,00					
27,1,41	SUMINISTRO CONDENSADORA MINISPLIT 24000 BTU	UN	2,00	$	1.775.828,00	$	3.551.656,00					
27,1,42	SUMINISTRO TERMOSTATO DE CONTROL CABLEADO	UN	100,00	$	348.801,00	$	34.880.100,00					
27,1,43	SUMINISTRO CONTROL REMOTO INALAMBRICO	UN	4,00	$	229.697,00	$	918.788,00					
27,1,44	SUMINISTRO CONTROL CENTRAL SISTEMA VOLUMEN VARIABLE	UN	5,00	$	1.761.049,00	$	8.805.245,00					
27,1,45	SUMINISTRO CONDENSADORA VOLUMEN VARIABLE 220000 BTU	UN	4,00	$	24.051.164,00	$	96.204.656,00					
27,1,47	UNIDAD FANCOIL PARA INYECCION AIRE EXTERIOR 76000 BTU	UN	15,00	$	3.896.822,00	$	58.452.330,00					
27,1,11	SUMINISTRO CONDENSADORA VOLUMEN VARIABLE 80000 BTU	UN	15,00	$	8.816.455,00	$	132.246.825,00					
27,2	**EQUIPOS VENTILACION MECANICA**			$	-	$	-					
27,2,8	SUMINISTRO UNIDAD DE VENTILACION CDAFH 12/12	UN	2,00	$	7.248.819,00	$	14.497.638,00					
27,2,12	SUMINISTRO UNIDAD DE VENTILACION CDAH 12/12	UN	2,00	$	4.771.602,00	$	9.543.204,00					
27,2,13	SUMINISTRO EXTRACTOR AXIAL DE PRESION FUTURE 120	UN	17,00	$	126.749,00	$	2.154.733,00					
27,2,14	SUMINISTRO EXTRACTOR AXIAL DE PRESION SILENT 200	UN	5,00	$	254.338,00	$	1.271.690,00					
27,2,17	SUMINISTRO EXTRACTOR CENTRIFUGO DE TEJADO	UN	3,00	$	4.652.592,00	$	13.957.776,00					
27,2,18	SUMINISTRO EXTRACTOR CENTRIFUGO DE TEJADO CRHD 15	UN	1,00	$	4.691.745,00	$	4.691.745,00					
28,1	**EQUIPOS VOZ Y DATOS**			$	-	$	-					
28,1,1	**Conectividad**			$	-	$	-					
28,1,1,1	SWITCHES DE 24 PUERTOS 10/100/1000 ADMINISTRADOS STAKING, incluye un conector SFP + , 10G , alta velocidad de conexión directa Cables, 1m , SFP + 20M,un adaptador de consola por cable RJ45 a DB9 de 3m, Y UN Transceptor óptico , SFP + de 10G Standard 9x5xNBD, Ver Caracteristica en Anexo de Especificación Técnica	UN	1,00	$	12.439.118,00	$	12.439.118,00					
28,1,1,2	SUMINISTRO DE SWITCHES DE 48 PUERTOS 10/100/1000 ADMINISTRADOS STAKING, incluye un conector SFP + , 10G , alta velocidad de conexión directa Cables, 1m , SFP + 20M,un adaptador de consola por cable RJ45 a DB9 de 3m, Y UN Transceptor óptico , SFP + de 10G Standard 9x5xNBD, Ver Caracteristica en Anexo de Especificación Técnica	UN	15,00	$	17.375.148,00	$	260.627.220,00					
28,1,1,6	Suministro e instalación de Televisor de Pulgadas:50 Medida Diagonal:127 cm, Sintonizador Digital DVB-T2, Resolución:UHD, Contraste: MEGA, Entradas:HDMI (4) USB (3) COMPONENTE(1), Vel. Respuesta:240 CMR, Smart Tv Tizen - Quad-Core	UN		$	3.331.780,00	$	-					
28,1,2	**Camaras de Seguridad**			$	-	$	-					
28,1,2,1	Suministro de camara de Seguridad WiseNet III Network IR Bullet Camera, 2MP, Full HD(1080p), Motorized Lens 2.8x. Ver Caracteristica en Anexo de Especificacion Tecnica	UN	3,00	$	2.505.350,00	$	7.516.050,00					
28,1,2,2	Suministro de camara de seguridad WiseNet III Network IR Dome Camera, 2MP, Full HD(1080p), Motorized Simple Focus Ver Caracteristica en Anexo de Especificacion Tecnica.	UN	6,00	$	2.210.129,00	$	13.260.774,00					
28,1,2,3	Suministro de camara de Seguridad Network PTZ Camera, 2MP, Full HD(1080p) 60fps, H.264/MJPEG, Optical Zoom Lens 32x (4.44-142.6mm), 120dB WDR, True D/N, Auto Tracking, 700°/sec Pan, SD/SDHC/SDXC, Incuye Soporte. Ver Caracteristica en Anexo de Especific	UN		$	10.792.885,00	$	-					
28,1,2,4	Samsung's intuitive Network Video Recorder allows you to continuously develop your new or existing security system into a scalable solution. The SRN-1000 is capable of recording 100Mbps of video bandwidth, it also supports a wide range of resolutions from	UN		$	20.350.580,00	$	-					
28,1,3	**Control de acceso**			$	-	$	-					
28,1,3,1	Suministro de Control de acceso, Biométrico dactilar mifare RFID, incluye Licencia SDK Ver Caracteristica en Anexo de Especificación Técnica	UN		$	2.934.354,00	$	-					

28,1,3,2	sum[illegible] de lector de huella USB enrolamiento Plus. Ver Ca[illegible]a en Anexo de Especificación Técnica	UN		$ 471.509,00	$						
28,1,3,3	Sun[illegible] Botón de enclavamiento para Emergencia, Ver Característica en Anexo de Especificación Técnica	UN		$ 197.759,00	$ -						
28,1,3,4	Suministro Botón de Sensor de proximidad no touch, Ver Característica en Anexo de Especificación Técnica	UN		$ 194.389,00	$ -						
28,1,3,5	Suministro electroimán de 600lbs para las puertas de control de acceso, incluye soporte especial, fuente de alimentación, batería de respaldo 12V7AH y caja metálica, Ver Característica en Anexo de Especificación Técnica	UN		$ 2.244.419,00	$ -						
28,1,3,6	Suministro de Servidor para control de acceso + Licencia Windows server 2012 R2. Ver características en Anexo de Especificación técnica.	UN		$ 7.464.632,00	$ -						
31	EQUIPOS HIDRAULICOS				$ -						
31,1	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PRESION AGUA POTABLE				$ -						
31,1,2	SUMINISTRO DE EQUIPO DE PRESION CON CAUDAL=8.35 l/s, PRESION=78.99 PSI, POTENCIA=10.06 HP. INCLUYE TODOS LOS ADITAMENTOS NECESARIOS QUE SE REQUIERAN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE TODA LA TUBERIA AL INTERIOR DEL CUARTO DE BOMBAS HASTA ENTREGA A RED. INCLUYE TABLERO DE CONTROL. BOMBA PARA TANQUE 2	UN	1,00	$ 40.310.363,00	$ 40.310.363,00						
	TOTAL COSTOS DIRECTOS EQUIPOS				$ 10.305.762.375,00						
	IVA			19,00%	$ 1.958.094.851,25						
	COSTO TOTAL				$ 12.263.857.226,25						

	TOTAL OBRA + EQUIPOS Y DOTACION DEUIL - BODEGAS - EXTERIORES				$ 12.263.857.226,24						

	TOTAL PROYECTO				$ 47.436.336.117,61		$ 1.411.511.882,95		$ 7.422.524.838,84		$ 8.834.036.701,79

TOTAL DEL CONTRATO

	COSTO TOTAL CONTRATO				$ 47.436.336.117,61		$ 1.411.511.882,95		$ 7.422.524.838,84		$ 8.834.036.701,79

ALEXANDER CASTILLO PINILLA
Rep Legal
CONSORCIO URBA FASE 1

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
Rep Legal
CONSORCIO INTEROCCIDENTE

URBAINGENIERIA


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA


"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1			
CAPITULO:	1	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE			
RELENOS Y EXCAVACIONES					
ITEM:	1,2	Replanteo y localización		UNIDAD:	M2
FRENTE:	EXTERIOR3ES			ACTA No.	9

DIAGRAMA:

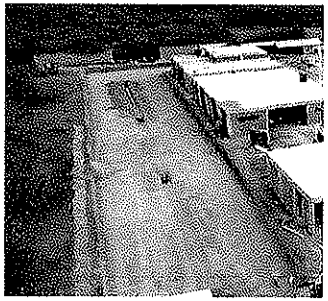

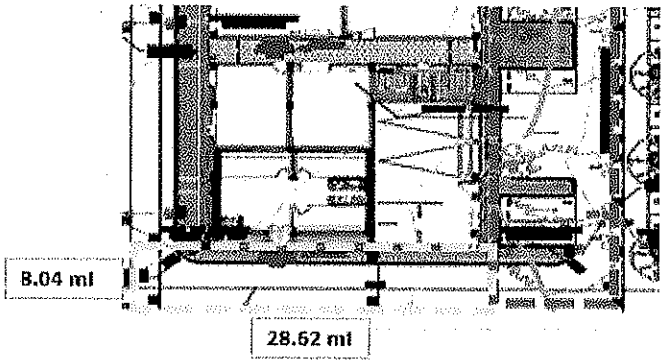

LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANT	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
EXTRIORES						
VIA FRENTE A PARQUEADERO	88,26	0,62			1,00	54,83
	28,62	8,04			1,00	230,10
TOTAL ITEM:						284,93
vienen						
TOTAL ITEM:						284,93

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE


CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	2	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
RELENOS Y EXCAVACIONES				
ITEM:	2.1	Excavacion mecanica según planos. Incluye cargue, transporte y disposicion final de sobrantes a sitio autorizado por el ente ambiental encargado.	UNIDAD:	M3
FRENTE:	EDIFICIO DEUIL		ACTA No.	9

DIAGRAMA:

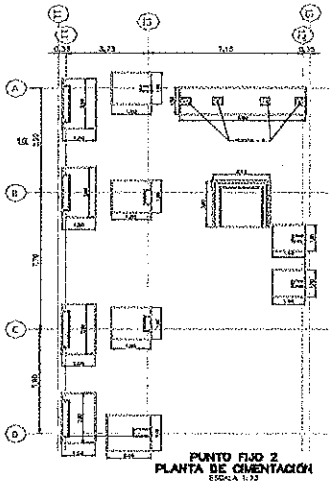





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
PUNTO FIJO 2						
ZAPATAS						
A12-B12-C12	1,80	1,80	1,65		3,00	16,04
D12	2,00	2,00	1,65		1,00	6,60
A11´-B11´-C11´-D11´	1,50	2,80	1,65		4,00	27,72
FOSO	2,60	2,60	2,50		1,00	16,90
12´C Y 12´B	1,50	1,50	2,35		2,00	10,58
A(12-12´)	5,80	1,50	1,86		1,00	16,18
				TOTAL ITEM:		94,02
				vienen		
				TOTAL ITEM:		94,02

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA


"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE


CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	3	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
RELLENOS Y EXCAVACIONES				
ITEM:	3,2	Concreto para Zapatas y Vigas de Cimentación f'c=5000PSI	UNIDAD:	M3
FRENTE:	DEUIL		ACTA No.	9

DIAGRAMA:

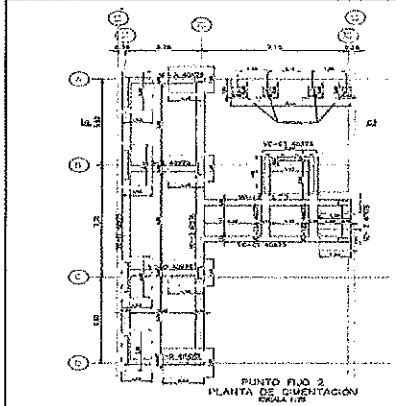





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
PUNTO FIJO 2						
ZAPATAS						
ZAPATAS						
A12-B12-C12	1,80	1,80	0,40		3,00	3,89
D12	2,00	2,00	0,45		1,00	1,80
A11'-B11'-C11'-D11'	1,50	2,80	0,45		4,00	7,56
FOSO	2,60	2,60	0,50		1,00	3,38
12'C Y 12'B	1,50	1,50	0,40		2,00	1,80
A(12-12')	5,80	1,50	0,35		1,00	3,05
VIGAS						
VC-A	4,05	0,40	0,75		1,00	1,22
VC-B	4,05	0,40	0,75		1,00	1,22
VC-C	4,05	0,40	0,75		1,00	1,22
VC-D	4,05	0,40	0,75		1,00	1,22
VC-11'	18,15	0,40	0,75		1,00	5,45
VC-12	18,15	0,40	0,75		1,00	5,45
VC-12A	5,20	0,40	0,75		1,00	1,56
VC-12B	5,20	0,40	0,75		1,00	1,56
VC-12'	2,11	0,40	0,75		1,00	0,63
TOTAL ITEM:						41,01
vienen						
TOTAL ITEM:						41,01

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE


CONTRATO No: 06-6-10310-23


FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	3	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
ESTRUCTURAS EN CONCRETOS			
ITEM:	3.4	Concreto para Columnas f'c=5000PSI	UNIDAD: M3
FRENTE:	DEUIL		ACTA No. 9

DIAGRAMA:

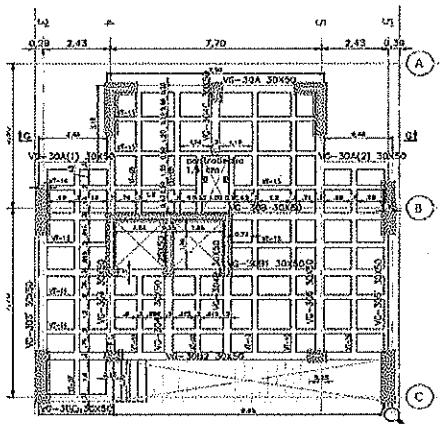

Concreto columnas 2do PISO Punto fijo 1

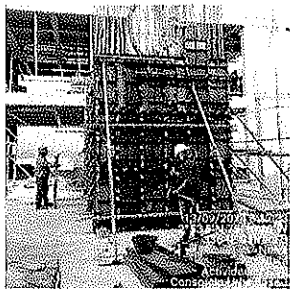



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
PUNTO FIJO 1						
2do PISO						
3´B	0,60		3,50		1,00	2,10
3´C	0,60		3,50		1,00	2,10
4A´	0,81		3,50		1,00	2,84
4B	2,89		3,50		1,00	10,12
C-PF1	0,15		3,50		1,00	0,53
C-PF3	0,18		3,50		1,00	0,63
5A´	0,81		3,50		1,00	2,84
C-PF2	0,15		3,50		1,00	0,53
5´B	0,60		3,50		1,00	2,10
5´C	0,60		3,50		1,00	2,10
TOTAL ITEM:						25,89
vienen						
TOTAL ITEM:						25,89

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA


"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23


FECHA:	30 de septiembre 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	3	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
CONCRETO				
ITEM:	3,3	Acero para Columnas fy=60000 PSI	UNIDAD:	KG
FRENTE:		DEUIL	ACTA	0

DIAGRAMA:

BOQUE 1

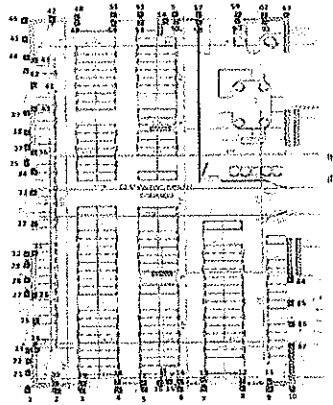

BOQUE 2

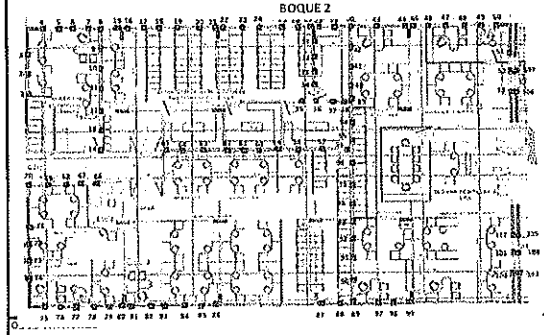

ACERO COLUMNETAS DEUIL

LOCALIZACION	DIMENSIONES DIAMETRO	KG/ML	LARGO	OTROS	CANT	TOTAL
BLOQUE 1						
#4	1/2	0,994	3,74		2	7,44
#2	1/4	0,249	0,26		26	1,68
				SUBTOTAL	59,00	838,08
#4	1/2	0,994	3,69		2	7,34
#2	1/4	0,249	0,26		24	1,55
				SUBTOTAL	6,00	53,34
#4	1/2	0,994	4,14		2	8,23
#2	1/4	0,249	0,26		30	1,94
				SUBTOTAL	2,00	20,34
BLOQUE 2						
#4	1/2	0,994	3,74		2	7,44
#2	1/4	0,249	0,26		26	1,68
				SUBTOTAL	40,00	364,80
#4	1/2	0,994	4,10		2	8,15
#2	1/4	0,249	0,26		30	1,94
				SUBTOTAL	13,00	131,17
#4	1/2	0,994	4,14		2	8,23
#2	1/4	0,249	0,26		30	1,94
				SUBTOTAL	14,00	142,38
#4	1/2	0,994	3,20		2	6,36
#2	1/4	0,249	0,26		24	1,55
				SUBTOTAL	40,00	316,40
				TOTAL ITEM:		1566,51

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024
CAPITULO:	3
ESTRUCTURAS EN CONCRETOS	
ITEM:	3,6
FRENTE:	DEUIL

CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1


INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE

Losa de contrapiso en concreto

UNIDAD: M3

ACTA No. 9

DIAGRAMA:

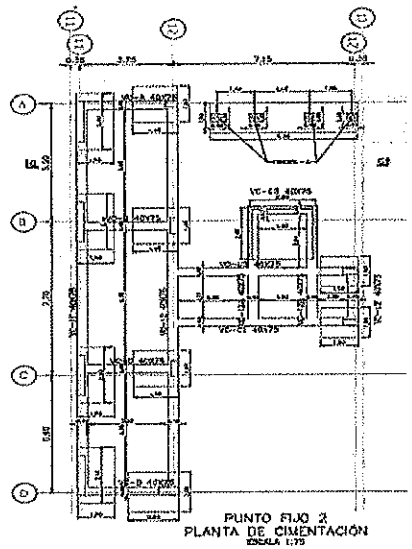

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
PUNTO FIJO 2						
	103,70		0,10			10,37
TOTAL ITEM:						10,37
vienen						
TOTAL ITEM:						10,37

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE


CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	3	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
ESTRUCTURAS EN CONCRETOS				
ITEM:	3,10	Concreto para vigas aereas y losa de entrepiso tercer piso f'c=5000PSI	UNIDAD:	M3
FRENTE:	DEUIL		ACTA No.	9

DIAGRAMA:

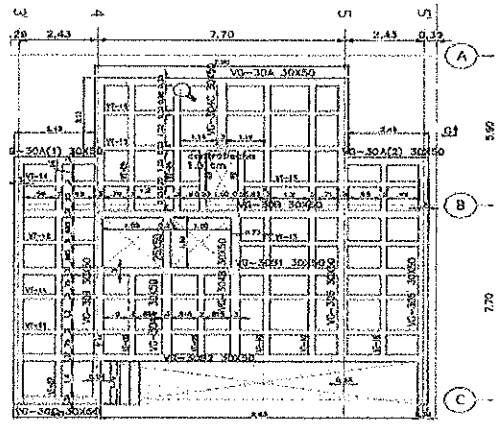

PUNTO FIJO 1
PLANTA PISO 3
ESCALA 1:75

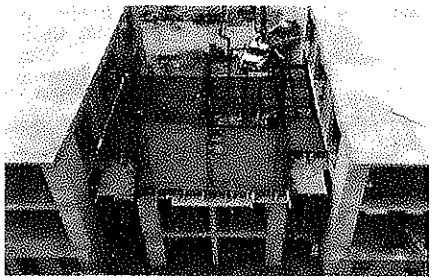

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
PUNTO FIJO 1						
AREA	127,91		0,10			12,79
VIGA 30A	7,80	0,30	0,40			0,94
VIGA 30B	12,26	0,30	0,40			1,47
VIGA 30B1	12,26	0,30	0,40			1,47
VIGA 30B2	12,26	0,30	0,40			1,47
VIGA 303'	9,77	0,30	0,40			1,17
VIGA 305'	9,77	0,30	0,40			1,17
VIGA 304	10,90	0,30	0,40			1,31
	1,70	0,25	0,40			0,17
VIGA 305	10,90	0,30	0,40			1,31
VIGA 30C	2,16	0,30	0,40			0,26
VIGA 304A	5,09	0,30	0,40			0,61
VIGA 304B	5,09	0,30	0,40			0,61
VIGA 30A1	2,18	0,30	0,40			0,26
VIGA 30A2	2,18	0,30	0,40			0,26
VIGA 304C	2,38	0,30	0,40			0,29
VT15	7,00	0,20	0,40		2,00	1,12
VT14	2,18	0,20	0,40			0,17
VT13	5,12	0,20	0,40		2,00	0,82
VT12	2,18	0,20	0,40			0,17
VT11	11,07	0,20	0,40		2,00	1,77
RB	2,33	0,20	0,40		2,00	0,37
VT11	6,07	0,20	0,40			0,49
VT7	7,47	0,20	0,40			0,60
VT8	2,79	0,20	0,40		2,00	0,45
VT10	8,80	0,20	0,40		2,00	1,41
TOTAL ITEM:						32,93
vienen						
TOTAL ITEM:						32,93

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA


"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE


CONTRATO No: 06-6-10310-23


FECHA:	30 de septiembre de 2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO URBA FASE 1
CAPITULO:	3
	RELLENOS Y EXCAVACIONES
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTEROCCIDENTE
ITEM:	3,29
	Losa de concreto MR43 para pavimento rigido. (Suministro, Formaleteado, Cojocación, Acabado, Incluye Acero, Curado y sellado de Juntas con cordon de polietilenoy material sellante) VIA 0
UNIDAD:	M3
FRENTE:	DEUIL
ACTA No.	9

DIAGRAMA:

VIA 0 (FRENTE A DEUIL

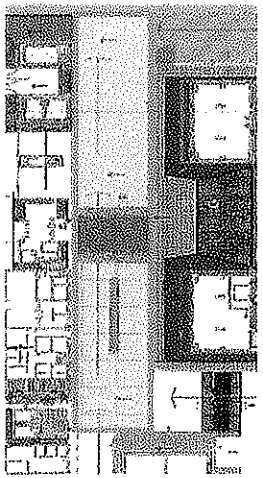



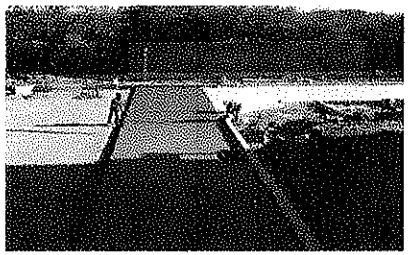

LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANT	TOTAL
	AREA	ANCHO	ALTO	OTROS		
VIA 0						
FRENTE A DEUIL	107,52	15,40	0,18			298,05
TOTAL ITEM:						298,05
vienen						
TOTAL ITEM:						298,05

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 05-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024
CAPITULO:	5
PAÑETES, AFINADOS E IMPERMEABILIZACIONES	
ITEM:	5,0
FRENTE:	BODEGAS

CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1


INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE


Suministro e instalacion de Pañete impermeabilizado liso interiores 1:3 incluye filos y dilataciones. Espesor de 2 cm

UNIDAD: M2

ACTA No. 9

DIAGRAMA:

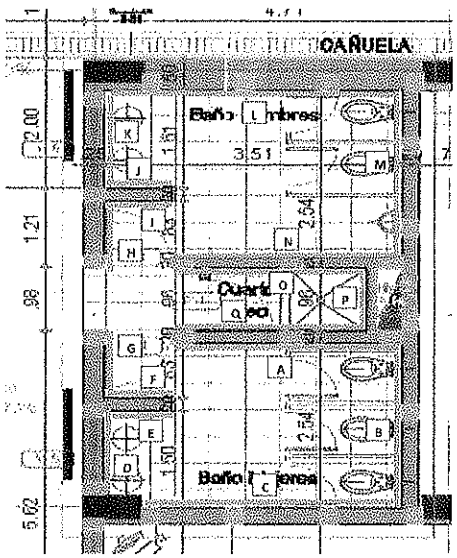



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
BLOQUE 1						
W.C MUJERES						
A	2,73		3,45			9,42
B	2,60		3,45			8,97
C	3,56		3,45			12,28
D	1,51		3,45			5,21
Descuento Ventana	0,76		-1,26			-0,96
E	0,79		3,45			2,73
F	0,78		3,45			2,69
G	1,15		3,45			3,97
W,C HOMBRES						
H	1,04		3,45			3,59
I	0,80		3,45			2,76
J	0,80		3,45			2,76
K	1,38		3,45			4,76
Descuento Ventana	0,76		-1,23			-0,93
L	3,67		3,45			12,66
M	2,56		3,45			8,83
N	2,73		3,45			9,42
CUARTO ASEO						
O	2,33		3,45			8,04
P	1,00		3,45			3,45
Q	2,32		3,45			8,00

OBSERVACIONES:

TOTAL ITEM:	107,65
vienen	
TOTAL ITEM:	107,65

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA


"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	NP			
PAÑETES, AFINADOS E IMPERMEABILIZACIONES		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
ITEM:	5,3	Suministro e instalación de Mampostería en bloque Muros 20 cm.	UNIDAD:	M2
FRENTE:	BODEGAS		ACTA No.	9

DIAGRAMA:

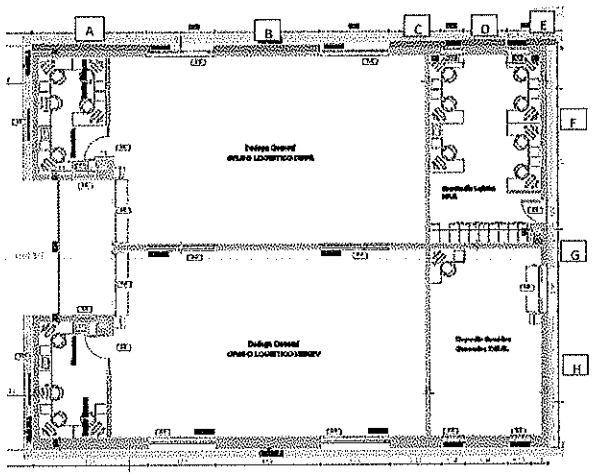

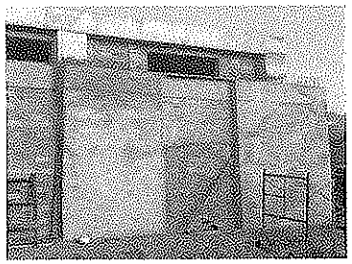

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
BLOQUE 2						
FACHADA POSTERIOR (EJE 1)						
A	5,01		4,00			20,04
B	4,63		4,00			18,52
C	2,33		4,00			9,32
D	1,93		4,00			7,72
E	0,79		4,00			3,16
FACHADA LATERAL (EJE F)						
F	6,90		4,00			27,60
G	1,91		4,00			7,64
H	5,98		4,00			23,92
TOTAL ITEM:						117,92
Vienen						
TOTAL ITEM:						117,92

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	6.1	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
RED DE SUMINISTRO				
ITEM:	6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P RDE-21 2" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS)	UNIDAD:	ML
FRENTE:	BODEGAS		ACTA No.	9

DIAGRAMA:

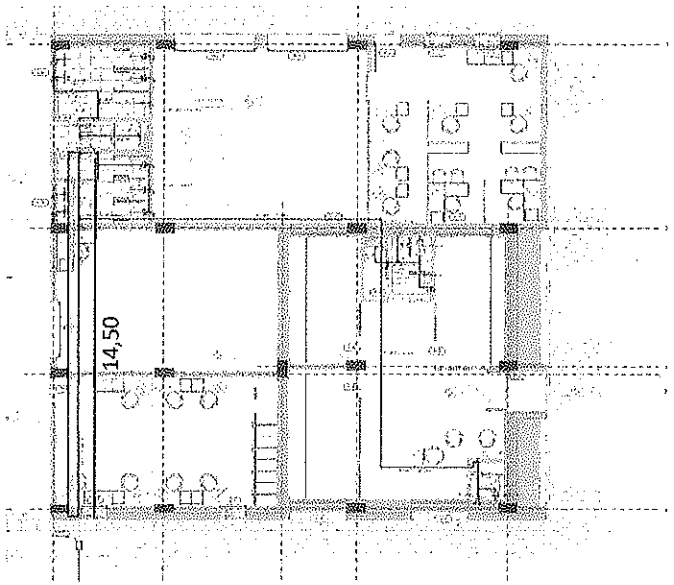

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
Red Tub Ppal 2" Ejes (4-2 entre G-H)	14,50				1,00	14,50

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA


URBAÍNGENIERIA


"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-8-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	6.1	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
RED DE SUMINISTRO				
ITEM:	6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P RDE-21 **1-1/2"** (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS)	UNIDAD:	ML
FRENTE:	BODEGAS		ACTA No.	9

DIAGRAMA:





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
Red Suministro 1-1/2" j Ejes (4-2 entre G-H) Registros Baño Hombres	1,10				2,00	2,20
Red Suministro 1-1/2" Ejes (2 entre G-J)	11,50				1,00	11,50
	1,80				1,00	1,80
	0,30				1,00	0,30
Red Suministro 1-1/2" j Ejes (4-2 entre G-H) Registros Baño Mujeres	1,10				2,00	2,20
TOTAL ITEM:						18,00
vienen						
TOTAL ITEM:						18,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1


REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE			CONTRATO No: 06-8-10310-23
FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	6.1	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
RED DE SUMINISTRO			
ITEM:	6.1.5 ✓	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P RDE-21 1-1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS)	UNIDAD: ML
FRENTE:	BODEGAS		ACTA No. 9 ✓

DIAGRAMA:	LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANT	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS		

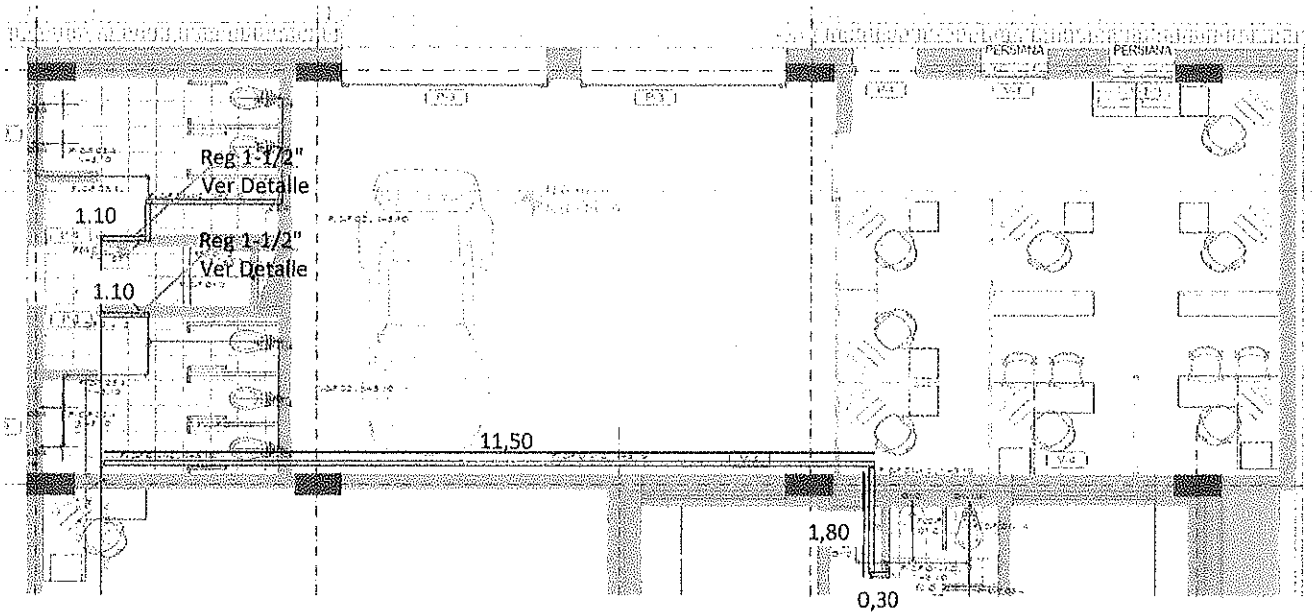

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE


CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1
CAPITULO:	6.1	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE
RED DE SUMINISTRO		
ITEM:	6.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P RDE-21 1-1/4" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS)
FRENTE:	BODEGAS	

UNIDAD: ML

ACTA No. 9

DIAGRAMA:

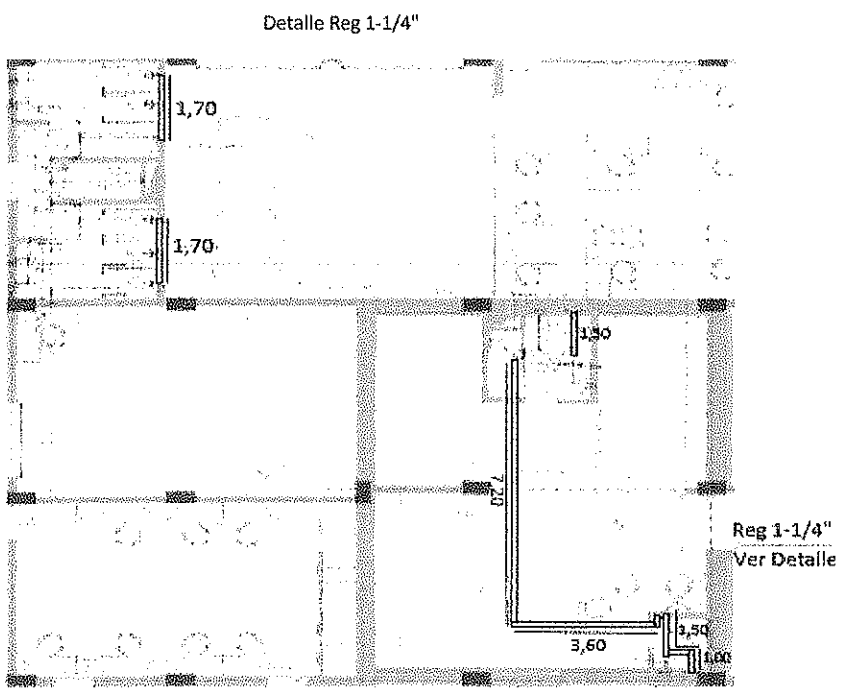

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
BLOQUE 1						
Red Suministro 1-1/4" baño mujeres y hombres Ejes (1-2 entre G-H)	1,70				1,00	1,70
	1,70				1,00	1,70
Red Suministro 1-1/4" baño mujeres y hombres Ejes (2-3' entre i-j)	1,50				1,00	1,50
	7,20				1,00	7,20
	3,60				1,00	3,60
Red Suministro 1-1/4" baño mujeres y hombres Ejes (4 - j)	1,50				1,00	1,50
	1,00				1,00	1,00
Detalle Tuberia 1-1/4" Reg Baño Ejes (4- j)	1,10				2,00	2,20
TOTAL ITEM:						20,40
vienen						
TOTAL ITEM:						20,40

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	6.1		
RED DE SUMINISTRO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
ITEM:	6.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P RDE-21 **1-1/4"** (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS)	UNIDAD: ML
FRENTE:	BODEGAS		ACTA No. 9

DIAGRAMA:	LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL

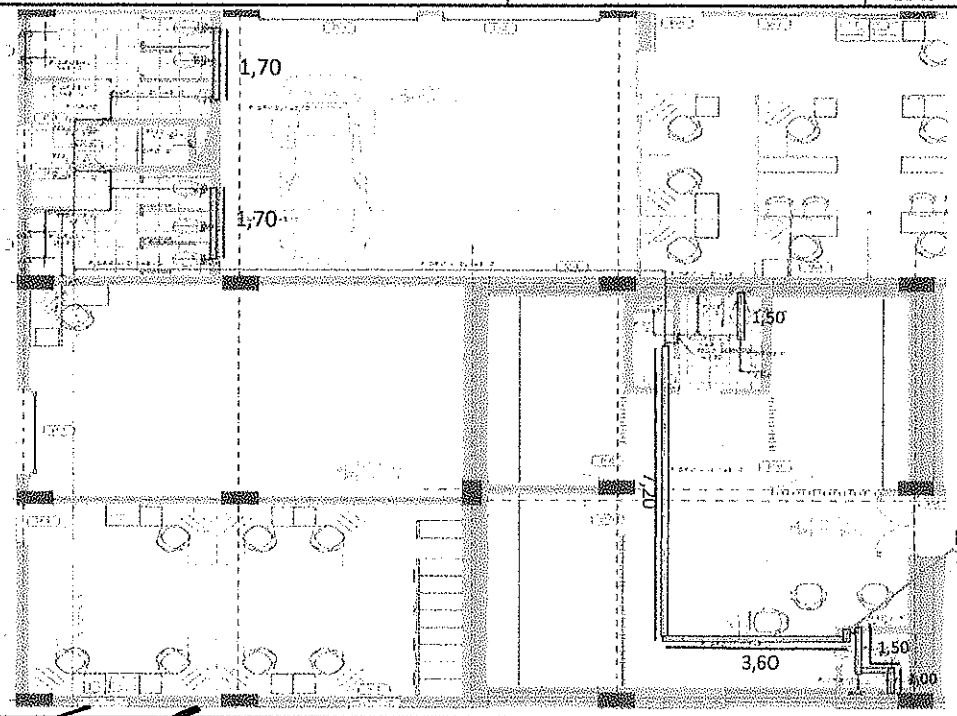

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	6.1		
RED DE SUMINISTRO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
ITEM:	6.1.8	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P RDE-13,5 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS)	UNIDAD: ML
FRENTE:	BODEGAS		ACTA No. 9

DIAGRAMA:

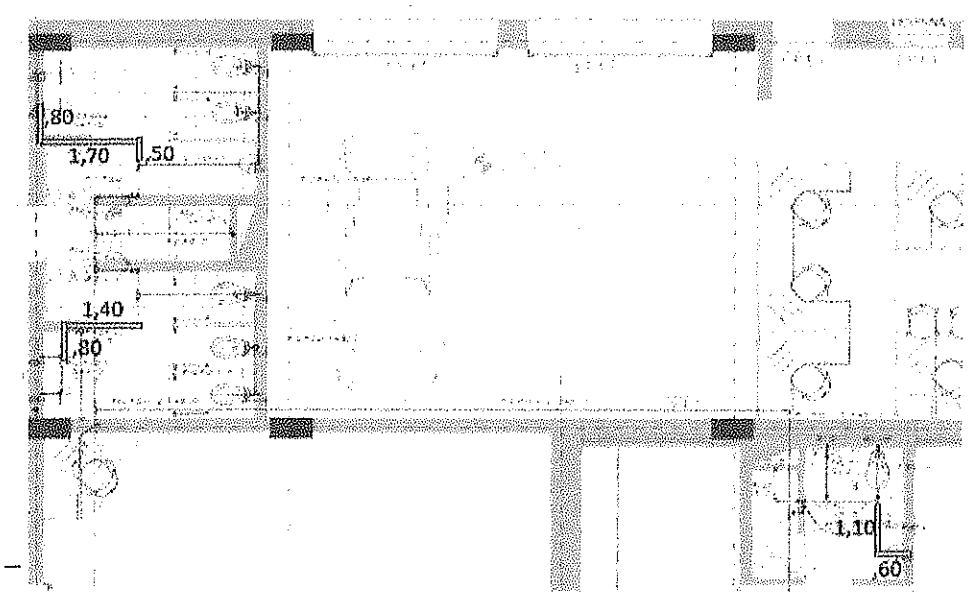

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
Red Suministro 1-1/4" baño mujeres y hombres Ejes (1-2 entre G-H)	0,80				1,00	0,80
	1,70				1,00	1,70
	0,50				1,00	0,50
Red Suministro 1-1/4" baño mujeres y hombres Ejes (2-3' entre i-j)	1,40				1,00	1,40
	0,80				1,00	0,80
Red Suministro 1-1/4" baño Ejes (2 entre i - j)	1,10				1,00	1,10
	0,60				1,00	0,60
TOTAL ITEM:						6,90
vienen						
TOTAL ITEM:						6,90

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1
CAPITULO:	6.1	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE
RED DE SUMINISTRO		
ITEM:	6.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO PVC-P DUCHA 1/2" — UNIDAD: UND
FRENTE:	BODEGAS	ACTA No. 9

DIAGRAMA:

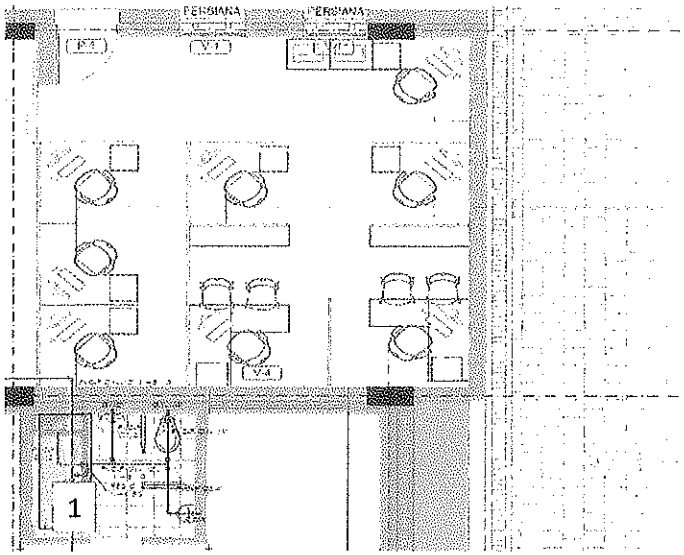

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
Punto Hidraulico para Ducha 1/2" Baño Capturados Ejes (2- i)					1,00	1,00
TOTAL ITEM:						1,00
vienen						
TOTAL ITEM:						1,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	6.1			
RED DE SUMINISTRO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
ITEM:	6.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO PVC-P ORINAL / DUCHA / LAVAMANOS 3/4"	UNIDAD:	UND
FRENTE:	BODEGAS		ACTA No.	9

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
(1) Baño hombres Ejes (1-2 Entre G-H)					1,00	1,00
(2) Baño Capturados Ejes (2 Entre i)					1,00	1,00


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	6.1			
RED DE SUMINISTRO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
ITEM:	6.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO PVC-P LAVAMANOS / LAVAPLATOS / POCETA / ASEO 1/2"	UNIDAD:	UND
FRENTE:	BODEGAS		ACTA No.	9

DIAGRAMA:

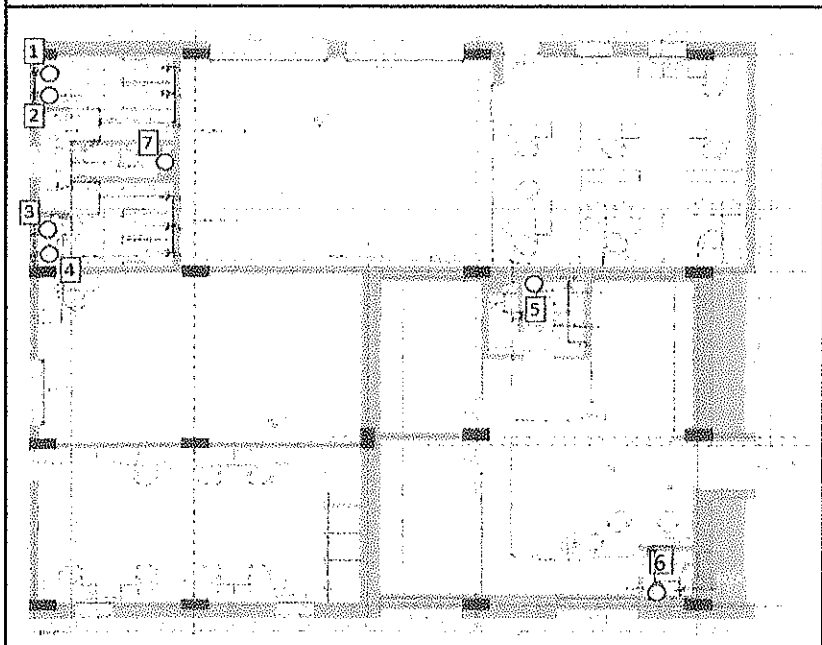

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
(1-2) Baño hombres Ejes (1-2 Entre G-H)					2,00	2,00
(3-4) Baño mujeres Ejes (1-2 Entre G-H)					2,00	2,00
(5) Baño Ejes (2 Entre I)					1,00	1,00
(6) Baño Ejes (4 Entre J)					1,00	1,00
(7) Poceta Aseo Ejes (1-2 Entre G-H)					1,00	1,00
TOTAL ITEM:						7,00
vienen						
TOTAL ITEM:						7,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	6.1			
RED DE SUMINISTRO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
ITEM:	6.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO PVC-P SANITARIO FLUXOMETRO 1-1/4"	UNIDAD:	UND
FRENTE:	BODEGAS		ACTA No.	9

DIAGRAMA:

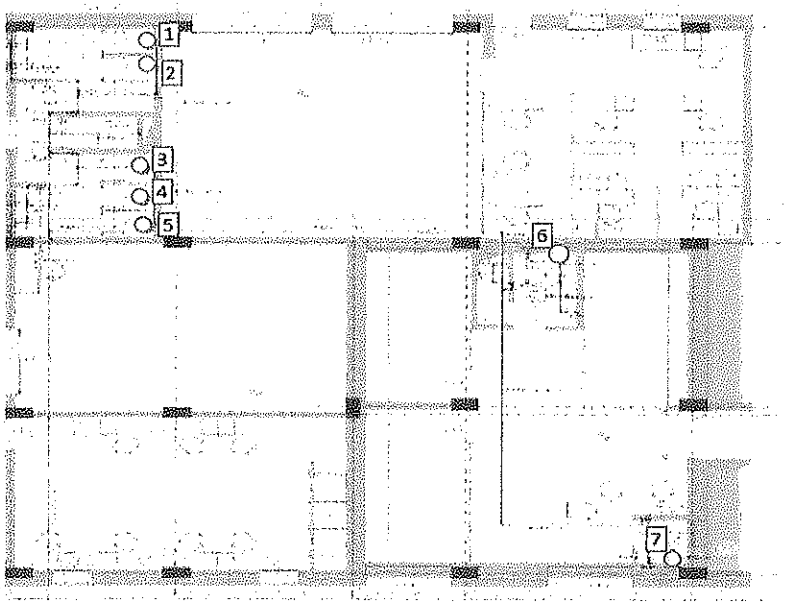

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
(1-2) Baño hombres Ejes (1-2 Entre G-H)					2,00	2,00
(3-4-5) Baño mujeres Ejes (1-2 Entre G-H)					3,00	3,00
(6) Baño Ejes (2 Entre i)					1,00	1,00
(7) Baño Ejes (4 Entre J)					1,00	1,00
TOTAL ITEM:						7,00
vienen						
TOTAL ITEM:						7,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 08-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1
CAPITULO:	6.1	
RED DE SUMINISTRO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE
ITEM:	6.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PESADO CORTINA TIPO RED WHITE ROSCAR 1-1/2"
FRENTE:	BODEGAS	

UNIDAD: UND

ACTA No. 9

DIAGRAMA:



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
(1) Baño hombres Ejes (1-2 Entre G-H)					1,00	1,00
(2) Baño mujeres Ejes (1-2 Entre G-H)					1,00	1,00
(3) Baño Sala de Capturados Ejes (2 Entre i)					1,00	1,00
TOTAL ITEM:						3,00
vienen						
TOTAL ITEM:						3,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-8-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	6.1	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
RED DE SUMINISTRO				
ITEM:	6.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PESADO CORTINA TIPO RED WHITE ROSCAR 1-1/4"	UNIDAD:	UND
FRENTE:	BODEGAS		ACTA No.	9

DIAGRAMA:

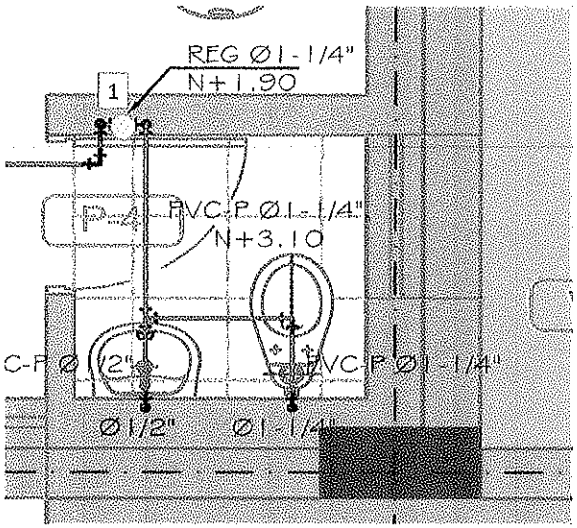

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
(1) Bloque 1 Baño Sala detenidos Ejes (2 Entre i)					1,00	1,00
TOTAL ITEM:						1,00
vienen						
TOTAL ITEM:						1,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE


CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1
CAPITULO:	6.2	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE
RED AGUAS RESIDUALES		
ITEM:	6.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 4" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)
FRENTE:	BODEGAS	

UNIDAD: ML

ACTA No. 9

DIAGRAMA:

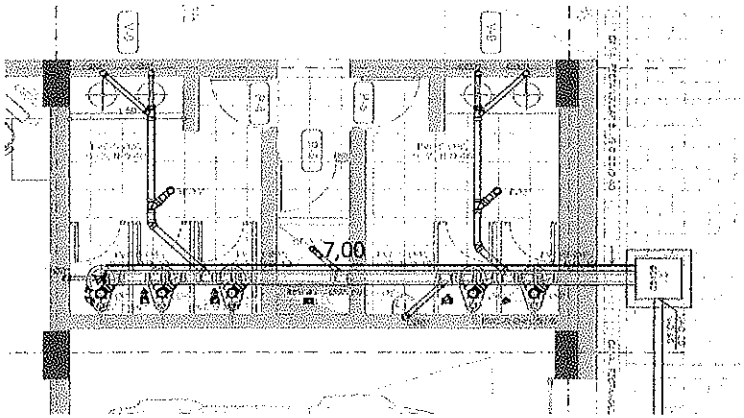

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
Red Tuberia Baño Hom y Muj Ejes (1-2 entre G-H)	7,00				1,00	7,00
TOTAL ITEM:						7,00
vienen						
TOTAL ITEM:						7,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	6.2			
RED AGUAS RESIDUALES		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
ITEM:	6.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 4" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	UNIDAD:	ML
FRENTE:	BODEGAS		ACTA No.	1

DIAGRAMA:

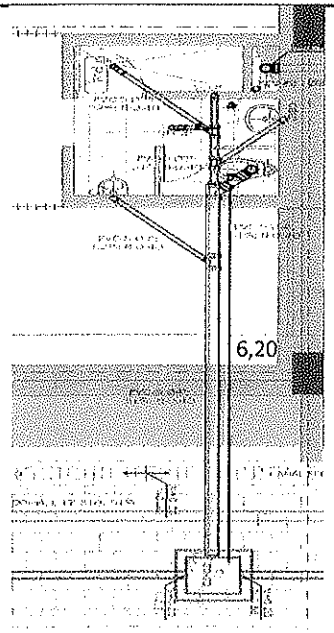


LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
Red Sanitario Baño Ejes (2- i)	6,20				1,00	6,20

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE			CONTRATO No: 06-6-10310-23
FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	6.2	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
RED AGUAS RESIDUALES			
ITEM:	6.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 4" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	UNIDAD: ML
FRENTE:	BODEGAS		ACTA No. 9

DIAGRAMA:

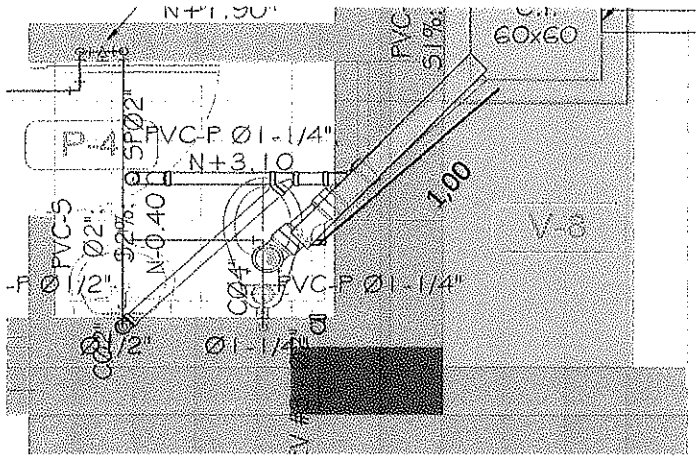

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
Red Sanitario Baño Capturados Ejes (4 -j)	1,00				1,00	1,00
TOTAL ITEM:						1,00
vienen						13,20
TOTAL ITEM:						14,20

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	6.2			
RED AGUAS RESIDUALES		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
ITEM:	6.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 4" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	UNIDAD:	ML
FRENTE:	DEUIL		ACTA No.	9

DIAGRAMA:

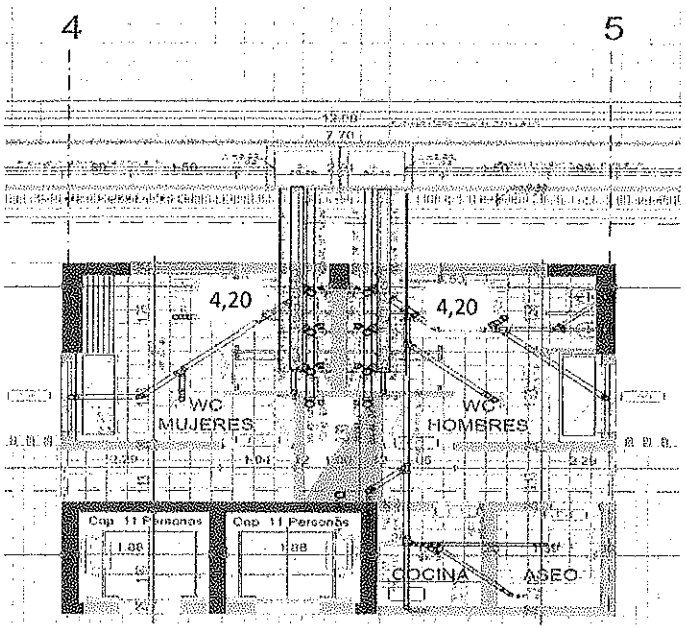

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
Red Sanitaria 4" Ejes (4-5) Baño Hombres					4,20	4,20
Red Sanitaria 4" Ejes (4-5) Baño Mujeres					4,20	4,20
TOTAL ITEM:						8,40
vienen						14,20
TOTAL ITEM:						22,60

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA


URBAINGENIERIA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	6.2	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
RED AGUAS RESIDUALES			
ITEM:	6.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 3" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	UNIDAD: ML
FRENTE:	BODEGAS		ACTA No. 9

DIAGRAMA:

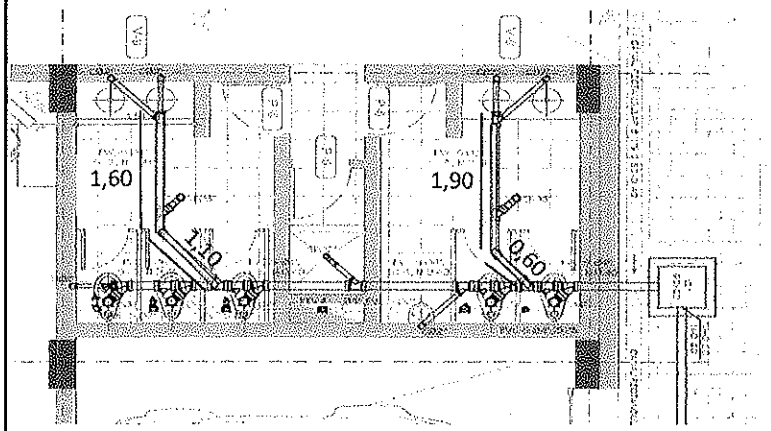

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
Red Tub Baño Hombres Ejes (1-2 entre G-H)	1,60				1,00	1,60
	1,10				1,00	1,10
Red Tub Baño Mujeres Ejes (1-2 entre G-H)	1,90				1,00	1,90
	0,60				1,00	0,60
TOTAL ITEM:						5,20
vienen						
TOTAL ITEM:						5,20

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	6.2	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
RED AGUAS RESIDUALES			
ITEM:	6.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 3" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	UNIDAD: ML
FRENTE:	DEUIL		ACTA No. 9

DIAGRAMA:

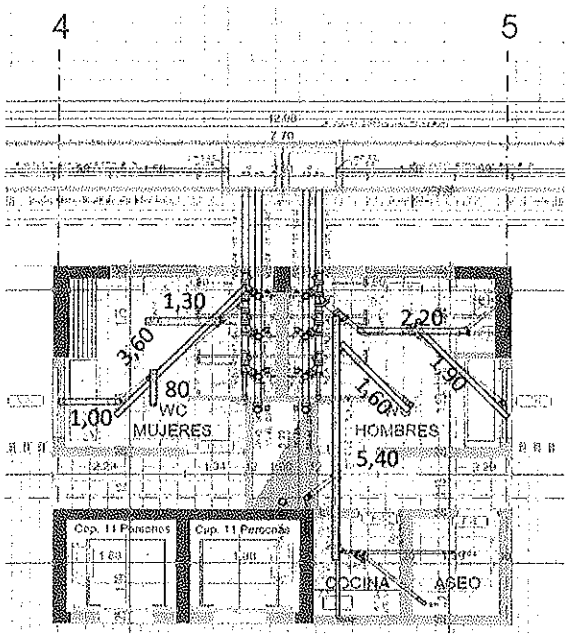

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
Red Sanitaria 4" Ejes (4-5) Baño Hombres	2,20				1,00	2,20
	1,90				1,00	1,90
	1,60				1,00	1,60
	5,40				1,00	5,40
Red Sanitaria 4" Ejes (4-5) Baño Mujeres	3,60				1,00	3,60
	0,80				1,00	0,80
	1,30				1,00	1,30
	1,00				1,00	1,00
TOTAL ITEM:						17,80
vienen						5,20
TOTAL ITEM:						23,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 08-8-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	6.2			
RED AGUAS RESIDUALES		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
ITEM:	6.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 2" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	UNIDAD:	ML
FRENTE:	BODEGAS		ACTA No.	9

DIAGRAMA:

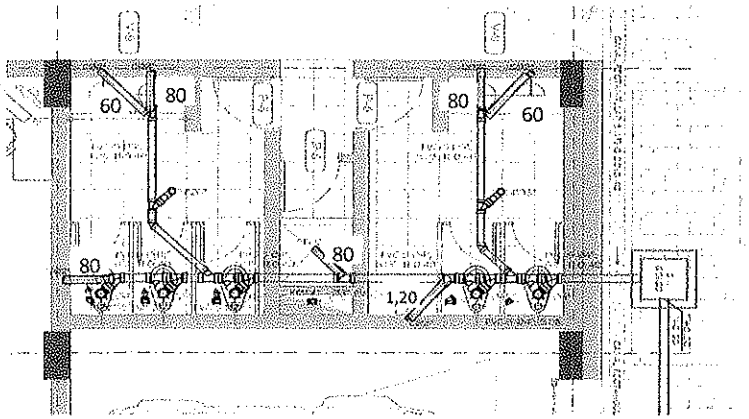

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
Red Tub Baño Hombres Ejes (1-2 entre G-H)	1,20				1,00	1,20
	0,8				1,00	0,80
	0,6				1,00	0,60
Red Tub Ducha Ejes (1-2 entre G-H)	0,80				1,00	0,80
Red Tub Baño Mujeres Ejes (1-2 entre G-H)	0,80				1,00	0,80
	0,60				1,00	0,60
	0,80				1,00	0,80
TOTAL ITEM:						5,60
vienen						
TOTAL ITEM:						5,60

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1


REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE			CONTRATO No: 06-6-10310-23
FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	6.2	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
RED AGUAS RESIDUALES			
ITEM:	6.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 2" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	UNIDAD: ML
FRENTE:		BODEGAS	ACTA No. 9

DIAGRAMA:

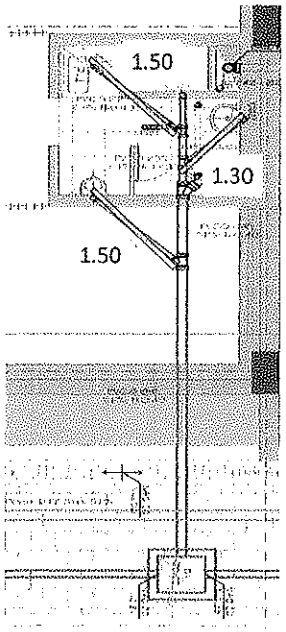

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
Red Lavamanos, Orinal y Ducha Baño Ejes (2- i)	1,50				1,00	1,50
	1,50				1,00	1,50
	1,30				1,00	1,30
TOTAL ITEM:						4,30
vienen						5,60
TOTAL ITEM:						9,90

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE


CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1
CAPITULO:	6.2	
RED AGUAS RESIDUALES		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE
ITEM:	6.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 2" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)
FRENTE:	BODEGAS	

UNIDAD: ML

ACTA No. 9

DIAGRAMA:

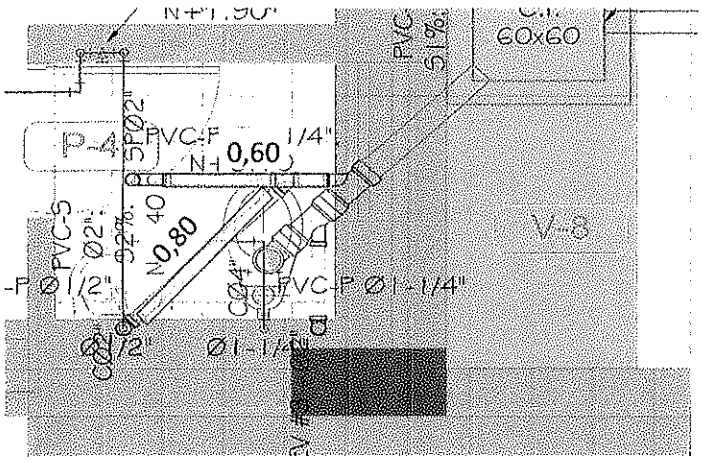

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
Red Sanitaria Lavamanos y Sifon piso Baño	0,80				1,00	0,80
capturados Ejes (4 -J)	0,60				1,00	0,60
TOTAL ITEM:						1,40
vienen						9,90
TOTAL ITEM:						11,30

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	6.2			
RED AGUAS RESIDUALES		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
ITEM:	6.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 4"	UNIDAD:	UND
FRENTE:	BODEGAS		ACTA No.	9

DIAGRAMA:

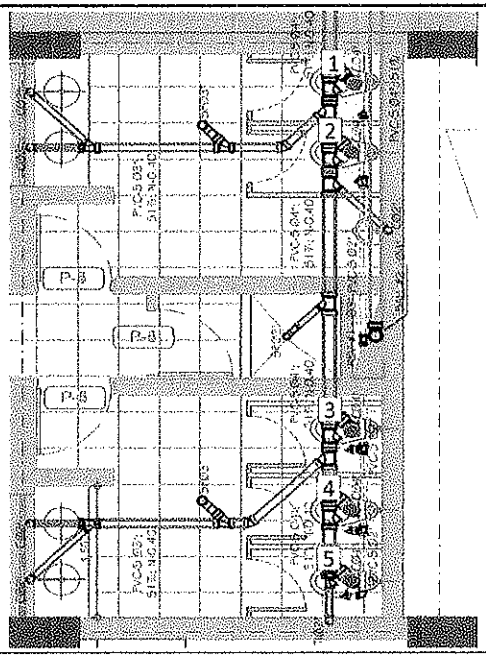

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
(1-2) Baño Hombres Ejes (1-2 entre G-H)					2,00	2,00
(3-5) Baño Mujeres Ejes (1-2 entre G-H)					3,00	3,00
TOTAL ITEM:						5,00
vienen						
TOTAL ITEM:						5,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	6.2	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
RED AGUAS RESIDUALES				
ITEM:	6.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 4"	UNIDAD:	UND
FRENTE:	BODEGAS		ACTA No.	9

DIAGRAMA:

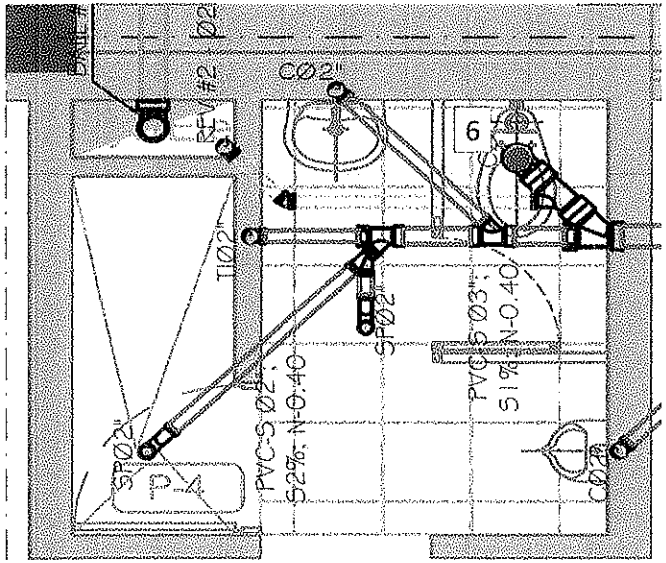

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
(6) Sanitario Baño Ejes (2- i)					1,00	1,00
TOTAL ITEM:						1,00
vienen						6,00
TOTAL ITEM:						6,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1


REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE			CONTRATO No: 06-6-10310-23
FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	6.2		
RED AGUAS RESIDUALES		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
ITEM:	6.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 4"	UNIDAD: UND
FRENTE:	BODEGAS		ACTA No. 9

DIAGRAMA:

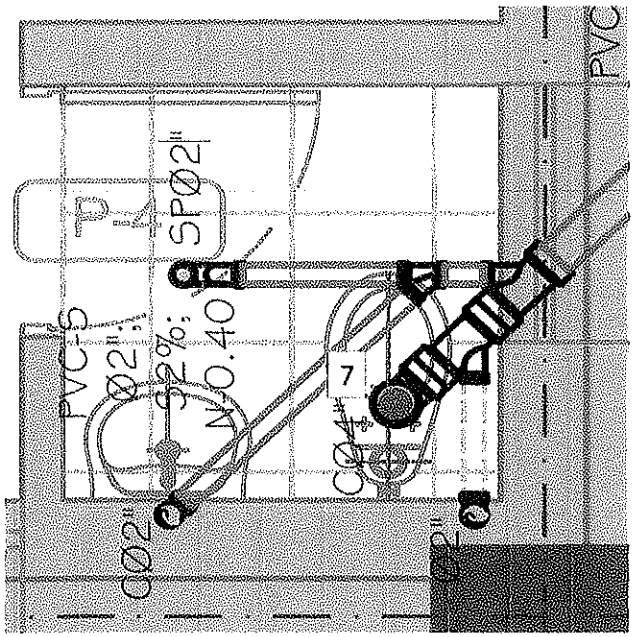

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
(7) Sanitario Baño capturados Ejes (4 -j)					1,00	1,00
TOTAL ITEM:						1,00
vienen						6,00
TOTAL ITEM:						7,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	6.2			
RED AGUAS RESIDUALES		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
ITEM:	6.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 4"	UNIDAD:	UND
FRENTE:	BODEGAS		ACTA No.	9

DIAGRAMA:

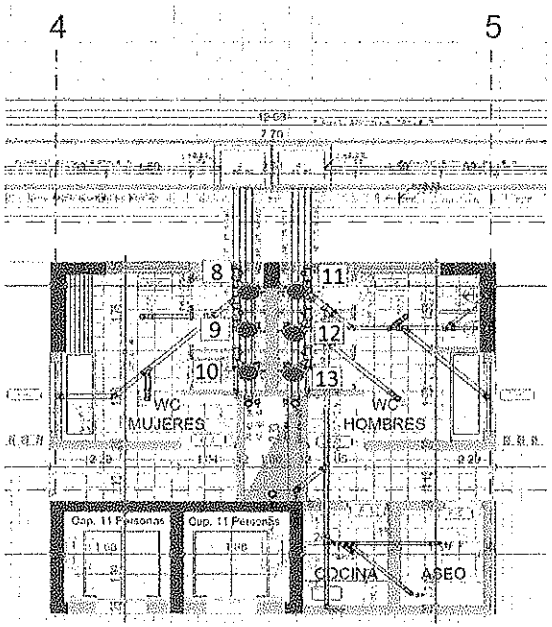

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
(8-10) Sanitario Baño Mujeres Ejes (4 -5)					3,00	3,00
(11-13) Sanitario Baño Mujeres Ejes (4 -5)					3,00	3,00
TOTAL ITEM:						6,00
vienen						7,00
TOTAL ITEM:						13,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	6.2		
RED AGUAS RESIDUALES		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
ITEM:	6.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 3"	UNIDAD: UND
FRENTE:	BODEGAS		ACTA No. 9

DIAGRAMA:

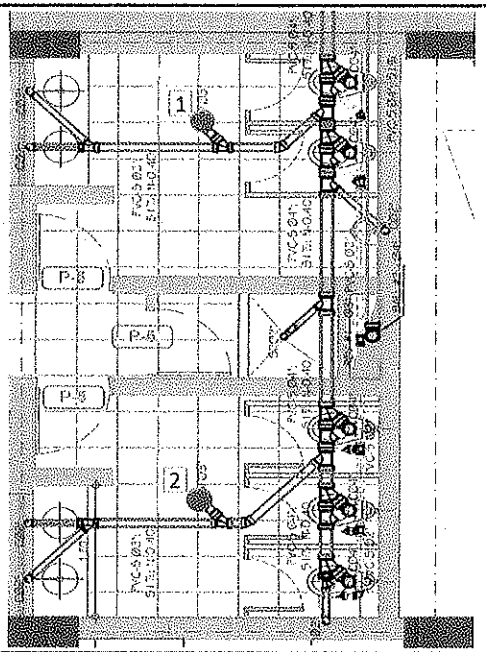

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
(1) Baño Hombres Ejes (1-2 entre G-H)					1,00	1,00
(2) Baño Mujeres Ejes (1-2 entre G-H)					1,00	1,00
TOTAL ITEM:						2,00
vienen						
TOTAL ITEM:						2,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA


URBAINGENIERIA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	6.2		
RED AGUAS RESIDUALES		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
ITEM:	6.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 3"	UNIDAD: UND
FRENTE:	DEUIL		ACTA No. 9

DIAGRAMA:

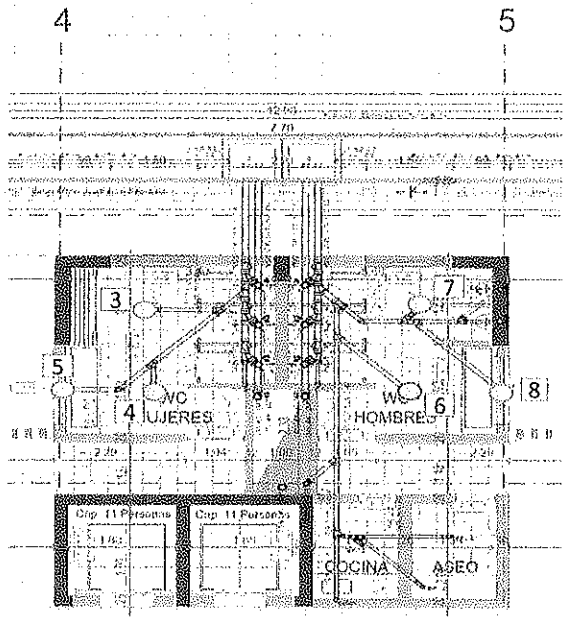

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
(3-5) Sifon Piso Baño Mujeres Ejes (4 -5)					3,00	3,00
(6-8) Sifon Piso Baño Hombres Ejes (4 -5)					3,00	3,00
TOTAL ITEM:						6,00
vienen						2,00
TOTAL ITEM:						8,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 08-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	6.2		
RED AGUAS RESIDUALES		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
ITEM:	6.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 2"	UNIDAD: UND
FRENTE:		BODEGAS	ACTA No. 9

DIAGRAMA:

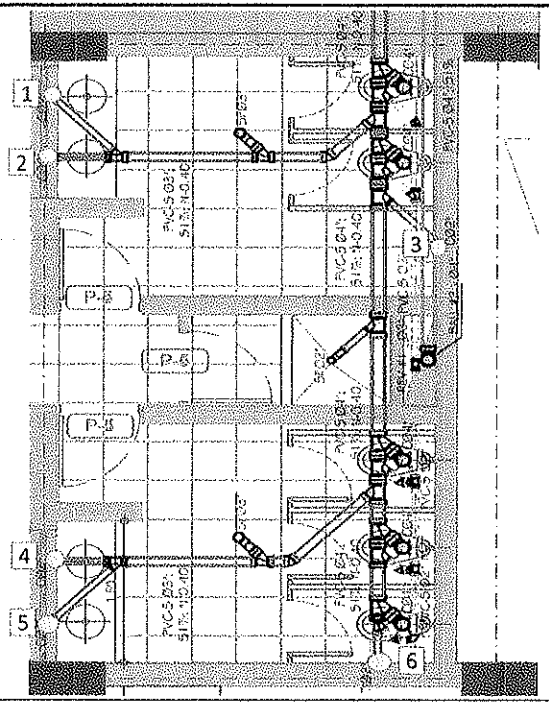

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
(1-2) Lavamanos Baño Hombres Ejes (1-2 entre G-H)					2,00	2,00
(3) Orinal Baño Hombres Ejes (1-2 entre G-H)					1,00	1,00
(4-5) Lavamanos Baño Mujeres Ejes (1-2 entre G-H)					2,00	2,00
(6) Tapon Inspeccion Baño Mujeres Ejes (1-2 entre G-H)					1,00	1,00
TOTAL ITEM:						6,00
vienen						
TOTAL ITEM:						6,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE


CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1
CAPITULO:	6.2	
RED AGUAS RESIDUALES		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE
ITEM:	6.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 2"
FRENTE:	BODEGAS	

UNIDAD: UND

ACTA No. 9

DIAGRAMA:

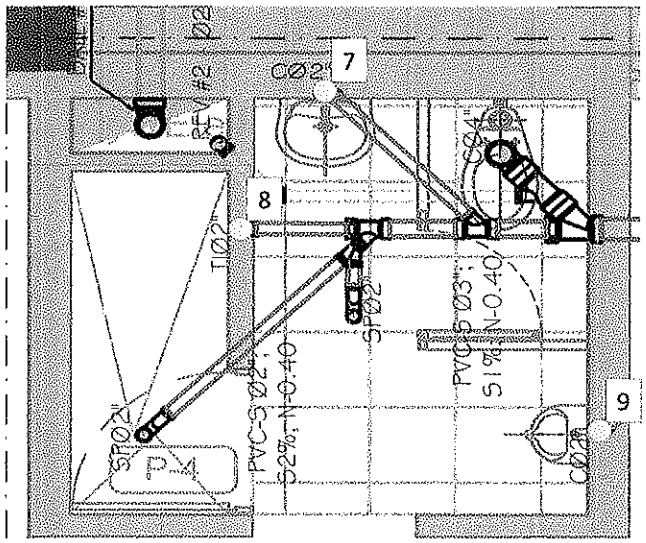

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
(7) Lavamanos Baño Ejes (2- i)					1,00	1,00
(8) Tapon Inspeccion Baño Ejes (2- i)					1,00	1,00
(9) Orinal Baño Ejes (2- i)					1,00	1,00
TOTAL ITEM:						3,00
vienen						6,00
TOTAL ITEM:						9,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 08-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	6.2	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
RED AGUAS RESIDUALES			
ITEM:	6.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 2"	UNIDAD: UND
FRENTE:	BODEGAS		ACTA No. 9

DIAGRAMA:

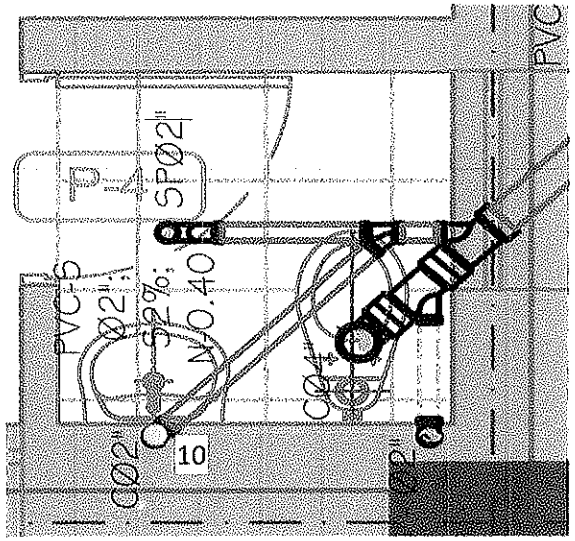

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
(10) Lavamanos Baño Ejes (4 -j)					1,00	1,00
TOTAL ITEM:						1,00
vienen						9,00
TOTAL ITEM:						10,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	6.2	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
RED AGUAS RESIDUALES				
ITEM:	6.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 2"	UNIDAD:	UND
FRENTE:		DEUIL	ACTA No.	9

DIAGRAMA:

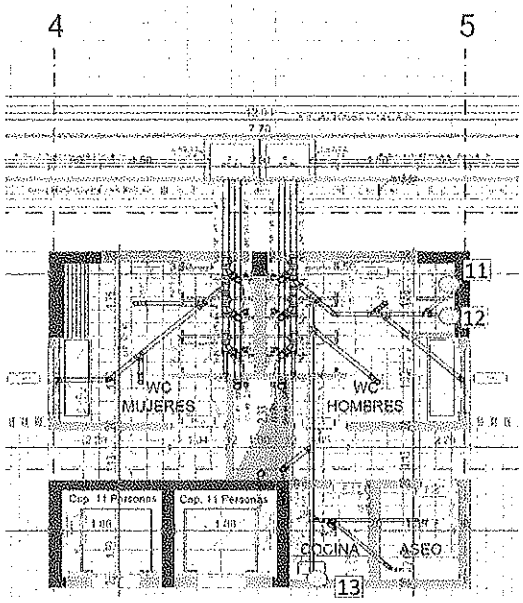

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
(11-12) Sanitario Baño Mujeres Ejes (4 -5)					2,00	2,00
(13) Cocina Ejes (4 -5)					1,00	1,00
TOTAL ITEM:						3,00
vienen						10,00
TOTAL ITEM:						13,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	6.2			
RED AGUAS RESIDUALES		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
ITEM:	6.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA SIFÓN 2"	UNIDAD:	UND
FRENTE:	BODEGAS		ACTA No.	9

DIAGRAMA:

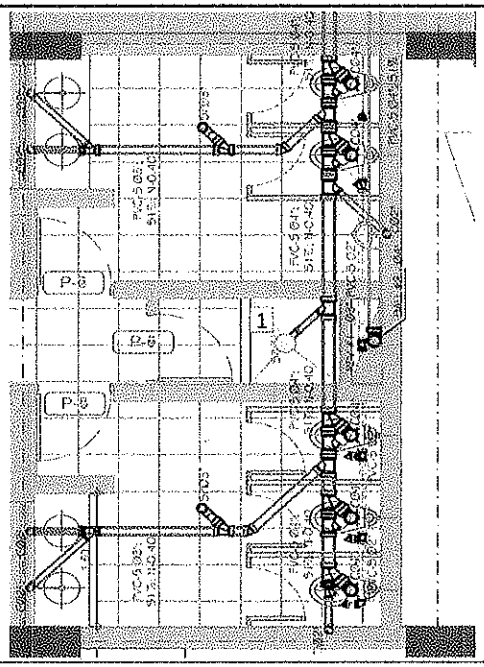

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
(1) Sifon Ducha Baño Hombres Ejes (1-2 entre G-H)					1,00	1,00
TOTAL ITEM:						1,00
vienen						
TOTAL ITEM:						1,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1


REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE			CONTRATO No: 06-6-10310-23
FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	6.2	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
RED AGUAS RESIDUALES			
ITEM:	6.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA SIFÓN 2"	UNIDAD: UND
FRENTE:	BODEGAS		ACTA No. 9

DIAGRAMA:

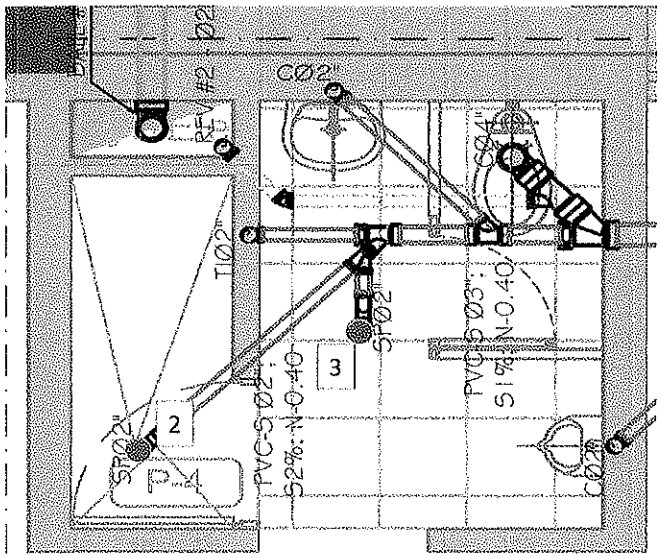

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
(2) Sifon ducha Baño Ejes (2- i)					1,00	1,00
(3) Sifon Piso Baño Ejes (2- i)					1,00	1,00
TOTAL ITEM:						2,00
vienen						1,00
TOTAL ITEM:						3,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE


CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1
CAPITULO:	6.2	
RED AGUAS RESIDUALES		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE
ITEM:	6.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA SIFÓN 2"
FRENTE:	BODEGAS	

UNIDAD: UND

ACTA No. 9

DIAGRAMA:

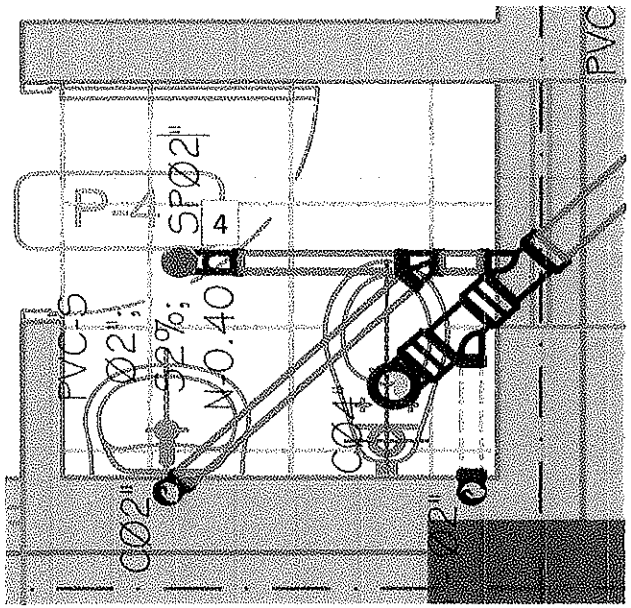

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
(4) Sifon Piso Baño capturados Ejes (4 -J)					1,00	1,00
TOTAL ITEM:						1,00
vienen						3,00
TOTAL ITEM:						4,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	6.2	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
RED AGUAS RESIDUALES			
ITEM:	6.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA SIFÓN 3"	UNIDAD: UND
FRENTE:	BODEGAS		ACTA No. 9

DIAGRAMA:

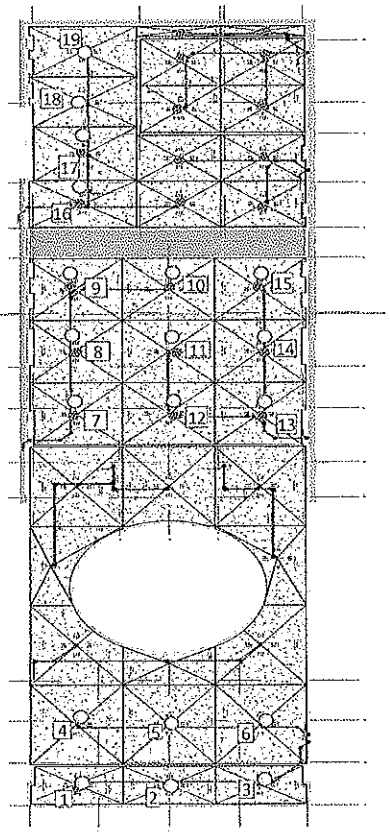

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
(1-6) Bodega Bloque 3 Eje (2-5 entre A-B)					6,00	6,00
(7-15) Bodega Bloque 2 Eje (1-5 entre C-F)					9,00	9,00
(16-19) Bodega Bloque 1 Eje (1-5 entre C-F)					14,00	14,00
TOTAL ITEM:						29,00
vienen						
TOTAL ITEM:						29,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 08-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	6.2	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
RED AGUAS RESIDUALES			
ITEM:	6.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA SIFÓN 3"	UNIDAD: UND
FRENTE:	DEUIL		ACTA No. 9

DIAGRAMA:

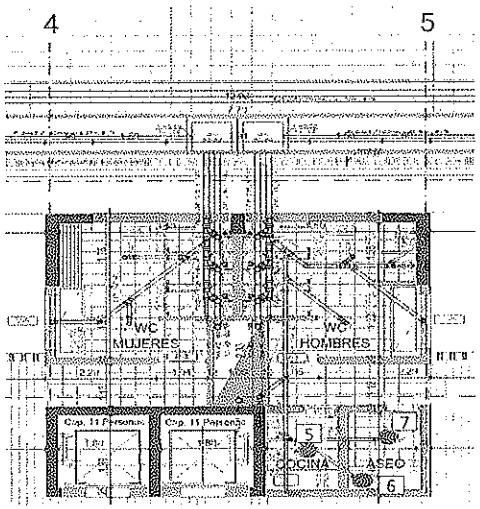

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
(5) Sifon Piso Cocina Ejes (4 -5)					1,00	1,00
(6) Sifon Poceta Aseo Ejes (4 -5)					1,00	1,00
(7) Sifon PisoPoceta Aseo Ejes (4 -5)					1,00	1,00
TOTAL ITEM:						3,00
vienen						29,00
TOTAL ITEM:						32,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY GURUBADA GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	6.2	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
RED AGUAS RESIDUALES			
ITEM:	6.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PVC-S 4" COLECTORES Y BAJANTES (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	UNIDAD: ML
FRENTE:	BODEGAS		ACTA No. 9

DIAGRAMA:

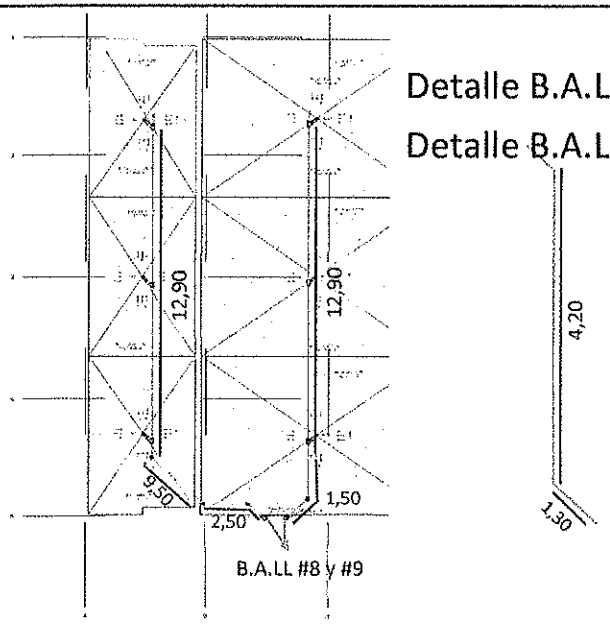

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
BLOQUE 3						
Tuberia descolgada bajo placa Bodega Ejes (1-5) Entre (A-B)	12,90				2,00	25,80
	9,5				1,00	9,50
	2,5				1,00	2,50
	1,50				1,00	1,50
Tuberia 4" B.A.LL #8 y B.A.LL #9	4,20				2,00	8,40
	1,30				2,00	2,60
TOTAL ITEM:						50,30
vienen						
TOTAL ITEM:						50,30

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 08-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	6.2		
RED AGUAS RESIDUALES		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
ITEM:	6.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PVC-S 4" COLECTORES Y BAJANTES (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	UNIDAD: ML
FRENTE:	BODEGAS		ACTA No. 9

DIAGRAMA:

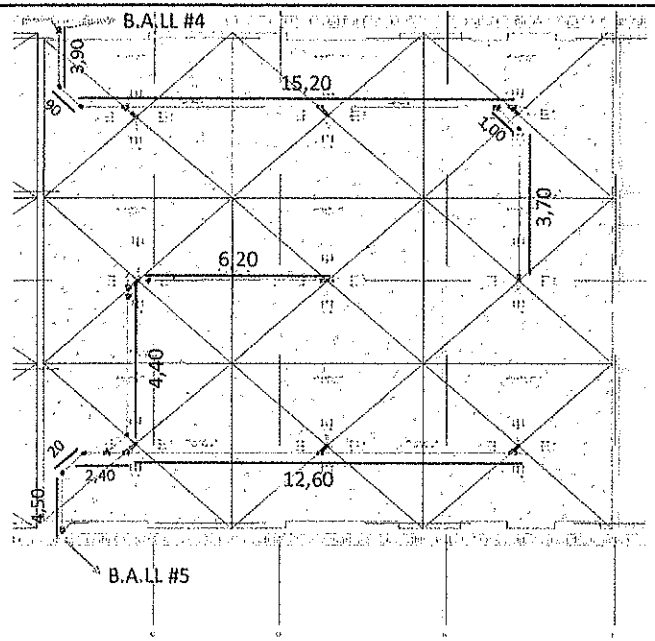

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
BLOQUE 2						
Tuberia descolgada bajo placa Bodega Ejes (1-3) Entre (B-F)	3,90				1,00	3,9
	0,90				1,00	0,9
	15,20				1,00	15,2
	1,00				1,00	1
	3,70				1,00	3,7
Tuberia 4" B.A.LL #4	4,20				1,00	4,2
Tuberia descolgada bajo placa Bodega Ejes (3-5) Entre (B-F)	6,20				1,00	6,20
	4,40				1,00	4,40
	12,60				1,00	12,6
	2,40				1,00	2,4
	0,20				1,00	0,2
	4,50				1,00	4,5
Tuberia 4" B.A.LL #5	4,20				1,00	4,2
	0,20				1,00	0,2
TOTAL ITEM:						63,60
vienen						50,30
TOTAL ITEM:						113,90

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 08-8-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	6.2		
RED AGUAS RESIDUALES		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
ITEM:	6.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PVC-S 4" COLECTORES Y BAJANTES (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	UNIDAD: ML
FRENTE:	BODEGAS		ACTA No. 9

DIAGRAMA:

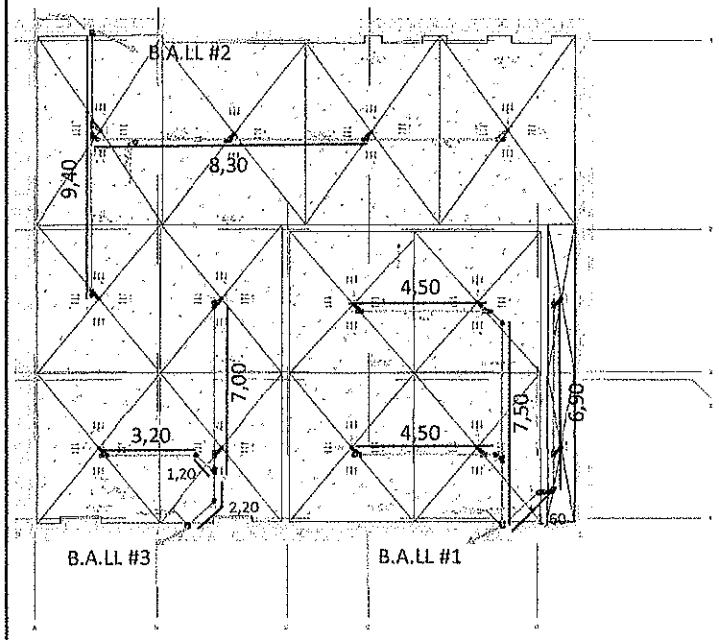

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
BLOQUE 1						
Tuberia descolgada bajo placa Bodega Ejes (1-2) Entre (A-C)	9,40				1,00	9,4
	8,30				1,00	8,3
Tuberia 4" B.A.LL #2	4,20				1,00	4,2
Tuberia descolgada bajo placa Bodega Ejes (3-4) Entre (A-B)	7,00				1,00	7
	3,20				1,00	3,2
	1,20				1,00	1,2
	2,20				1,00	2,2
Tuberia 4" B.A.LL #3	4,20				1,00	4,2
Tuberia descolgada bajo placa Bodega Ejes (3-4) Entre (C-D)	4,50				2,00	9
	7,50				1,00	7,5
Tuberia 4" B.A.LL #1	4,20				1,00	4,2
Tuberia descolgada bajo placa Exterior Bodega Ejes (2-4) Entre (D)	6,90				1,00	6,9
	1,60				1,00	1,6
TOTAL ITEM:						68,90
vienen						113,90
TOTAL ITEM:						182,80

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	6.2	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
RED AGUAS RESIDUALES				
ITEM:	6.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PVC-S 3" COLECTORES Y BAJANTES (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)	UNIDAD:	ML
FRENTE:	BODEGAS		ACTA No.	9

DIAGRAMA:

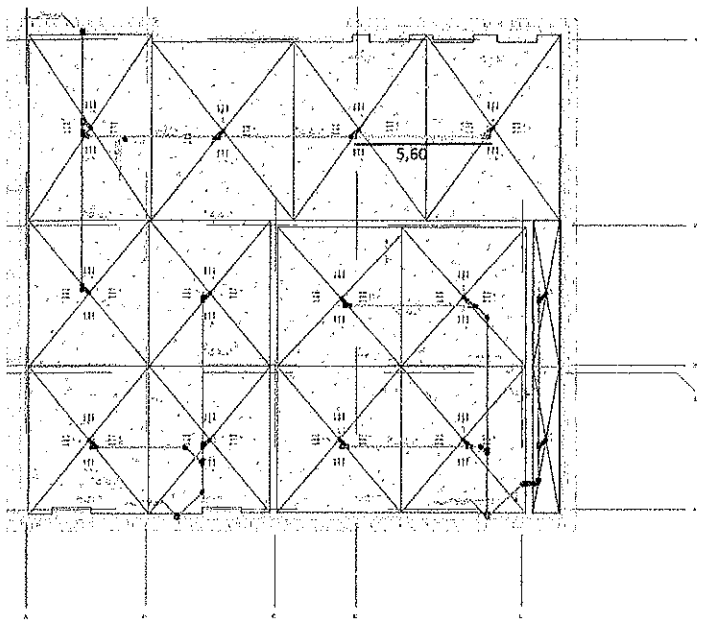

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
BLOQUE 1						
Tuberia descolgada bajo placa Bodega Ejes (1-2) Entre (D-C)	5,60				1,00	5,60
TOTAL ITEM:						5,60
vienen						
TOTAL ITEM:						5,60

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1
CAPITULO:	7,4	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE
RED AGUAS RESIDUALES		
ITEM:	7.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO EXTERIOR 38 MM X 3,0 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE INSTALACIÓN DE MARIOFF.
UNIDAD:	ML	
FRENTE:	BODEGAS	
ACTA No.	9	

DIAGRAMA:

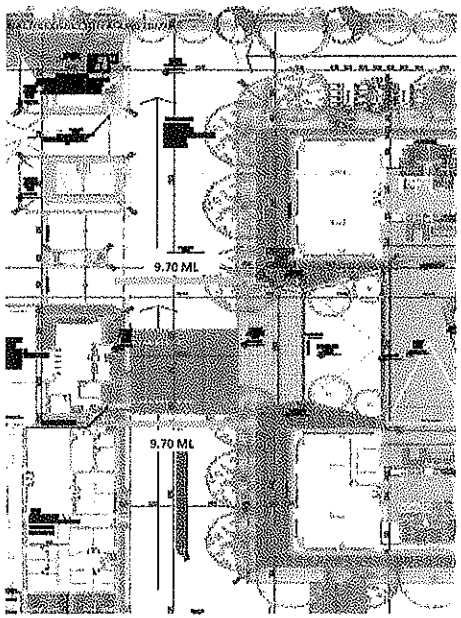

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
VIA O						
FRENTE A DEUIL						
TRAMO 1	9,70				1,00	9,70
TRAMO 2	9,70				1,00	9,70
TOTAL ITEM:						19,40
vienen						
TOTAL ITEM:						19,40

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 05-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1
CAPITULO:	8	
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE
ITEM:	8.9.1	EXCAVACIÓN MÉCANICA DE MATERIAL COMÚN SEGÚN PLANOS, INCLUYE CARGUE,TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO POR EL ENTE AMBIENTAL AUTORIZADO — UNIDAD: M3
FRENTE:	EXTERIORES	ACTA No. 9

DIAGRAMA:

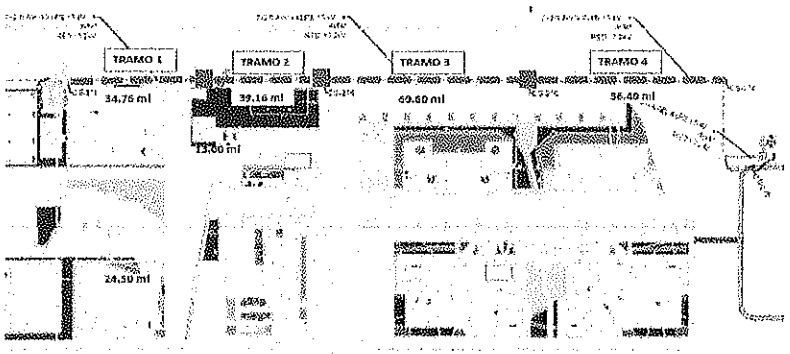





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
VIA 1						
DESDE SUBESTACION DEUIL						
Tuberia 4 / 4"						
TRAMO 1	34,76	1,50	0,55		1,00	28,68
TRAMO 2	39,16	1,50	0,55		1,00	32,31
TRAMO 3	60,00	1,50	0,55		1,00	50,00
TRAMO 4	56,40	1,30	0,85		1,00	62,32
						-
Tuberia 6/6"						
TRAMO 1	6,00	1,05	0,85		1,00	5,36
Pase de via bodegas	19,00	1,05	0,85		1,00	16,96
CAJAS						-
Caja 275 Tramo 1	1,70	1,40	0,90		1,00	2,14
Caja 276 Tramo 2	1,70	1,80	1,40		1,00	4,28
Caja 276 Tramo 3	1,70	1,80	1,40		1,00	4,28
						-
TOTAL ITEM:						206,33
vienen						
TOTAL ITEM:						206,33

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA


"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	8		
INFRAESTRUCTURA ELECTRJCA - MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
ITEM:	8.9.3	RELLENOS Y ATRAQUES DE TUBERIA CON ARENA DE RIO	UNIDAD: M3
FRENTE:	EXTERIORES		ACTA No. 9

DIAGRAMA:



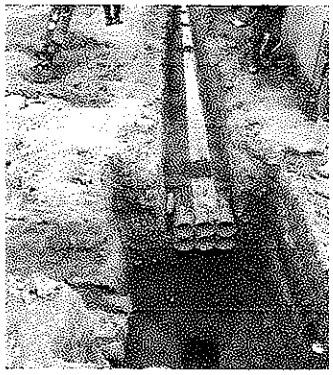

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
VIA 1						
SUBESTACION DEUIL Tuberia 4"						
TRAMO 1	34,76	0,20	0,55		1,00	3,82
TRAMO 2	39,16	0,20	0,55		1,00	4,31
TRAMO 3	60,60	0,20	0,55		1,00	6,67
TRAMO 4	56,40	0,20	0,85		1,00	9,59
Descuento tuberia 4"	190,92	0,0078			-4,00	-5,96
Paralelo a cerramiento Tuberia 6"						0,00
TRAMO 1	6,00	0,40	0,85		1,00	2,04
Descuento tuberia 4"	6,00	0,018			-6,00	-0,65
PASE VIA O BODEGAS	19,00	0,40	0,85		1,00	6,46
	19,00	0,018			-6,00	-2,05


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA


"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE


CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1
CAPITULO:	8	
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE
ITEM:	8.9.4	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC TDP DE 4Φ4" EN BANCO DE DUCTOS — UNIDAD: ML
FRENTE:	EXTERIORES	ACTA No. 9

DIAGRAMA:

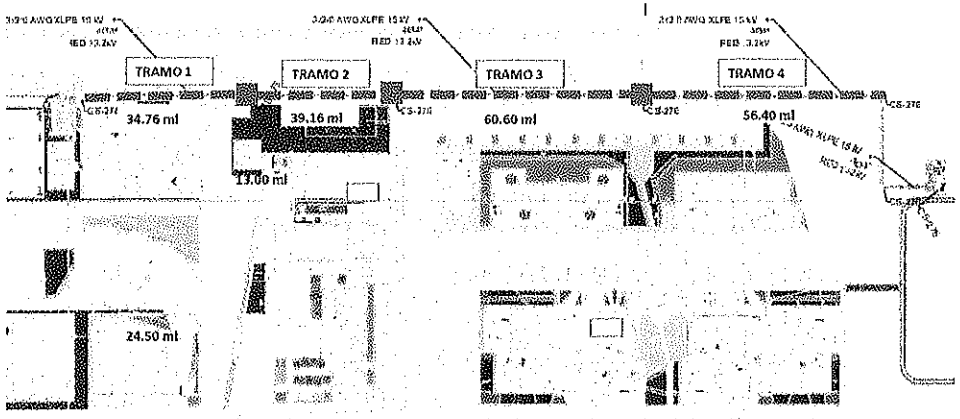



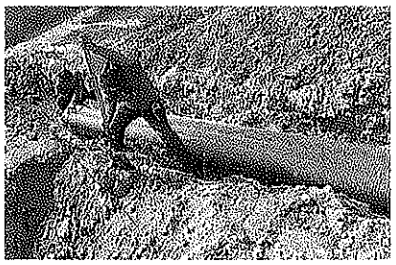

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
DESDE SUBESTACION DEUIL						
TRAMO 1	34,76				1,00	34,76
TRAMO 2	39,16				1,00	39,16
TRAMO 3	60,60				1,00	60,60
TRAMO 4	56,40				1,00	56,40
TOTAL ITEM:						190,92
vienen						
TOTAL ITEM:						190,92

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	8		
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
ITEM:	8.9.5	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC TDP DE 6Ø6" EN BANCO DE DUCTOS	UNIDAD: ML
FRENTE:	EXTERIORES		ACTA No. 9

DIAGRAMA:

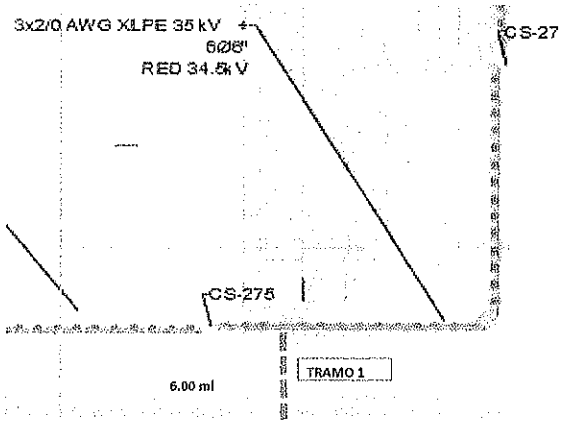



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
Paralelo a cerramiento						-
TRAMO 1	6,00				1,00	6,00
						-
CRUCE DE VIA EN BODEGAS	19,00				1,00	19,00
TOTAL ITEM:						25,00
vienen						
TOTAL ITEM:						25,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PEROOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA


"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	8			
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
ITEM:	8.9.9	SUMINISTRO Y MARCACION CON CINTA CS 273	UNIDAD:	ML
FRENTE:	EXTERIORES		ACTA No.	9

DIAGRAMA:



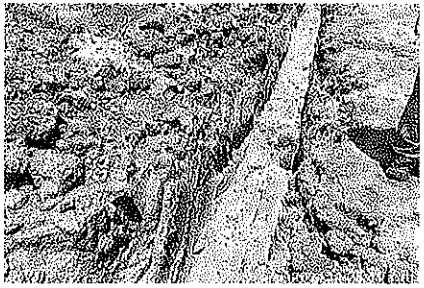

LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANT	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS		
VIA 1						
SUBESTACION DEUIL Tuberia 4"						
TRAMO 1	34,76				1,00	34,76
TRAMO 2	39,16				1,00	39,16
TRAMO 3	60,60				1,00	60,60
TRAMO 4	56,40				1,00	56,40
Paralelo a cerramiento Tuberia 6"						
TRAMO 1	6,00				1,00	6,00
CRUCE DE VIA EN BODEGAS	19,00				1,00	19,00
TOTAL ITEM:						215,92
vienen						
TOTAL ITEM:						215,92

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	8		
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
ITEM:	8.9.10	CONSTRUCCION DE CAJA DE HALADO PARA BANCO DE DUCTOS CON TAPA EN CONCRETO TIPO SENCILLA CS275.	UNIDAD: UND
FRENTE:	EXTERIORES		ACTA No. 9

DIAGRAMA:

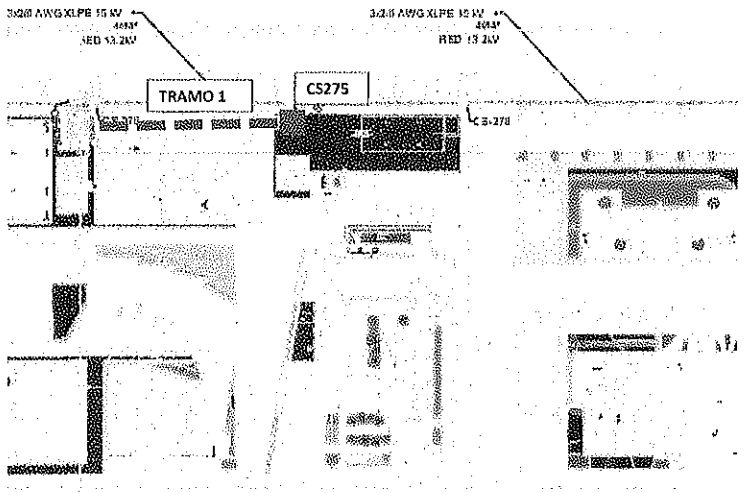

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
VIA 1						
DESDE SUBESTACION DE DEUIL TRAMO 1					1,00	1,00
TOTAL ITEM:						1,00
vienen						
TOTAL ITEM:						1,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA NUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10810-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	8		
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
ITEM:	8.9.11	CONSTRUCCION DE CAJA DE HALADO PARA BANCO DE DUCTOS CON TAPA EN CONCRETO TIPO DOBLE CS276.	UNIDAD: UND
FRENTE:	EXTERIORES		ACTA No. 9

DIAGRAMA:

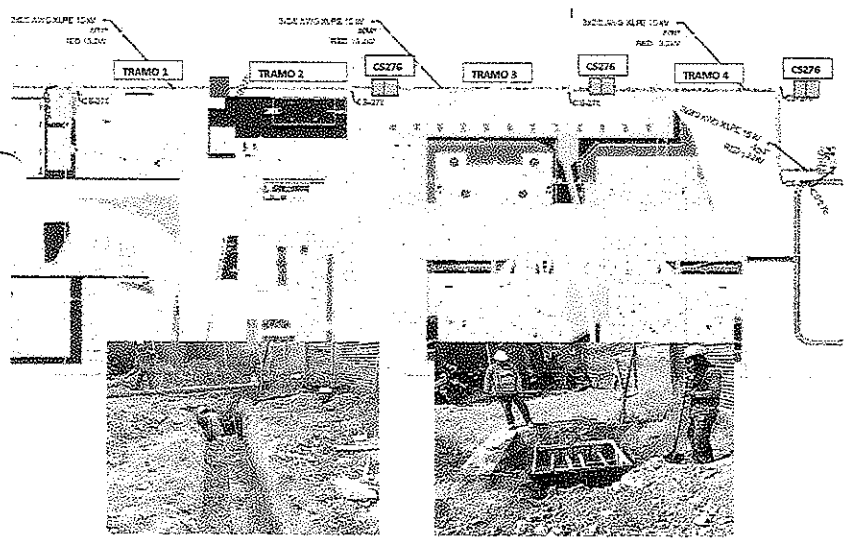

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
VIA 1						
SUBESTACION DEUIL						
TRAMO 2					1,00	1,00
TRAMO 3					1,00	1,00
TRAMO 4					1,00	1,00
						-
Entrada provisional					1,00	1,00
TOTAL ITEM:						4,00
vienen						
TOTAL ITEM:						4,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA


"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	22	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
URBANISMO				
ITEM:	22.7	Suministro e instalacion de Sardinel prefabricado en concreto 3000 psi .20 x .50 x .80 tipo titan o similar	UNIDAD:	ML
FRENTE:	VIA 0		ACTA No.	9

DIAGRAMA:

VÍA 0

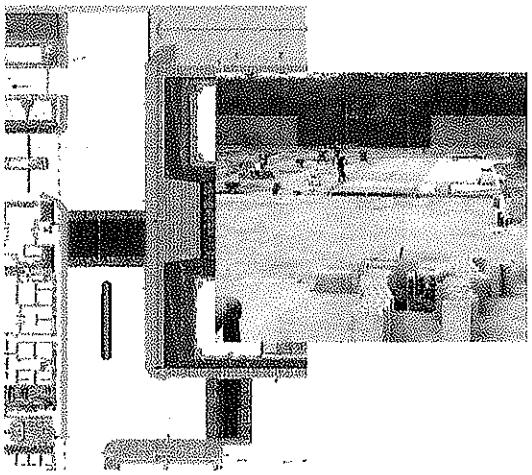

Sardinel

LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANT	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS		
VIA 0						
FRENTE A DEUIL	176,51				1,00	176,51
						-
						-
						-

OBSERVACIONES:

TOTAL ITEM:		176,51
vienen		
TOTAL ITEM:		176,51

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-8-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	22	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
URBANISMO			
ITEM:	22.12	Suministro e instalacion de sub base en recebo compactado	UNIDAD: M3
FRENTE:	EXTERIORES		ACTA No. 9

DIAGRAMA:

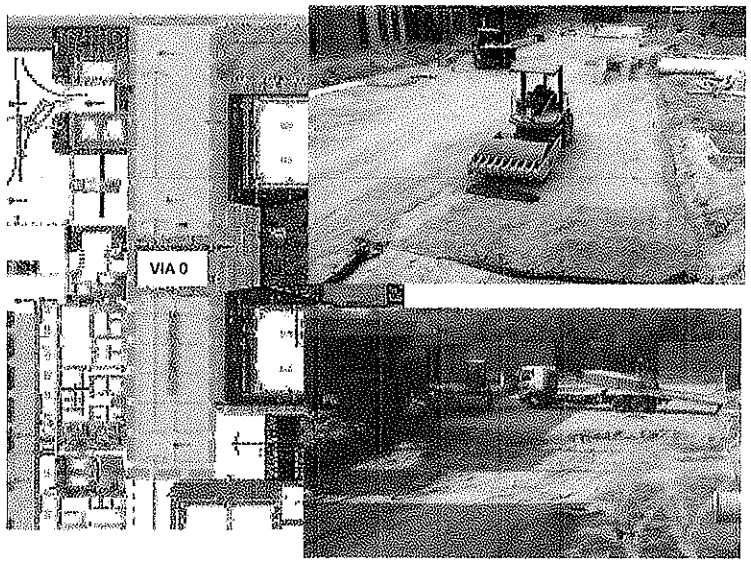

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
VIA 0						
FRENTE A DEUIL	107,52	15,40	0,20			331,16
						-
						-
TOTAL ITEM:						331,16
vienen						
TOTAL ITEM:						331,16

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA


URBAINGENIERIA

"CONSTRUCCION Y DOTACIUON EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	22	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
RELLENOS Y EXCAVACIONES				
ITEM:	22,19	Suministro e instalacion de concreto ciclopeo 60% concreto de 3000 psi 40% piedra	UNIDAD:	M3
FRENTE:	DEUIL		ACTA No.	9

DIAGRAMA:

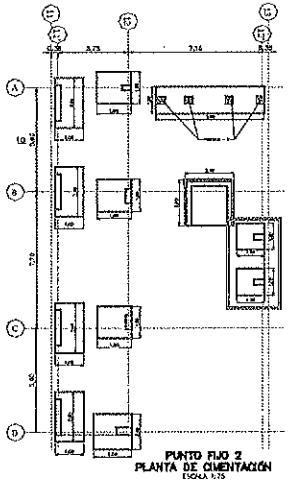

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
PUNTO FIJO 2						
ZAPATAS						
12'C Y 12'B	1,50	1,50	0,70		2,00	3,15

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA


"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE


CONTRATO No: 00-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1
CAPITULO:	NP	
NO PREVISTOS		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE
ITEM:	NP - 001	Concreto limpieza 2000Psi H=0,05 — UNIDAD: M2
FRENTE:		DEUIL — ACTA No. 9


DIAGRAMA:

BLOQUE 1







BLOQUE 2



BLOQUE 3





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
BLOQUE 1						
ZAPATA 1 (A-B)	7,50	1,60				12,00
ZAPATA 1 (C-D)	7,50	1,60				12,00
ZAPATA 2A	1,80	2,00				3,60
ZAPATA 2D	1,80	2,00				3,60
ZAPATA 3 (A-B)	8,30	1,50				12,45
ZAPATA 3 (C-D)	8,30	1,50				12,45
ZAPATA 2B	2,50	2,20				5,50
ZAPATA 2C	2,50	2,20				5,50
VIGA VC-A	7,35	0,40				2,94
VIGA VC-B	6,65	0,40				2,66
VIGA VC-C	6,69	0,40				2,68
VIGA VC-D	7,35	0,40				2,94
VIGA VC-1	5,23	0,40				2,09
VIGA VC-2	12,35	0,40				4,94
VIGA VC-3	4,01	0,40				1,60
BLOQUE 2						
ZAPATA 6 (A-B)	7,30	1,25				9,13
ZAPATA 6 (C-D)	8,00	1,25				10,00
ZAPATA B7-B8-B9-B10-C7-C8-C9-C10	2,75	2,25			8,00	49,50
ZAPATA A7-A8-A9-A10-D7-D8-D9-D11	2,00	2,50			8,00	40,00
ZAPATA 11 (A-B) 11(C-D)	7,30	1,25			2,00	18,25
VIGA VC-A	22,28	0,40				8,91
VIGA VC-B	19,28	0,40				7,71
VIGA VC-C	19,34	0,40				7,74
VIGA VC-D	22,28	0,40				8,91
VIGA VC-6	4,66	0,40				1,86
VIGA VC-7	12,00	0,40				4,80
VIGA VC-8	12,00	0,40				4,80
VIGA VC-9	12,00	0,40				4,80
VIGA VC-10	12,02	0,40				4,81
VIGA VC-11	5,46	0,40				2,18
BLOQUE 3						
ZAPATA 13A-13B-13C-13D-15A-15B-15C-15D	1,60	2,25			8,00	32,40
ZAPATA 14B-14C	2,00	2,20			2,00	8,80
ZAPATA 14A-14D	1,80	1,80			2,00	6,48
VIGA VC-A	8,92	0,40				3,57
VIGA VC-B	8,52	0,40				3,41
VIGA VC-C	8,52	0,40				3,41
VIGA VC-D	8,94	0,40				3,58
VIGA VC-13	11,01	0,40				4,40
VIGA VC-14	12,96	0,40				5,18
VIGA VC-15	11,01	0,40				4,40
TOTAL ITEM:						345,98
Vienen						
TOTAL ITEM:						345,98

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY GUARIACO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA


"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE


CONTRATO No: 05-9-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1
CAPITULO:	NP	
NO PREVISTOS		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE
ITEM:	NP - 001	Concreto limpieza 2000Psi H=0,05 — UNIDAD: M2
FRENTE:	BODEGAS	ACTA No. 9

DIAGRAMA:

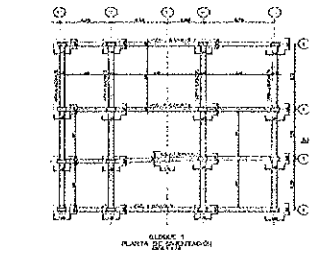

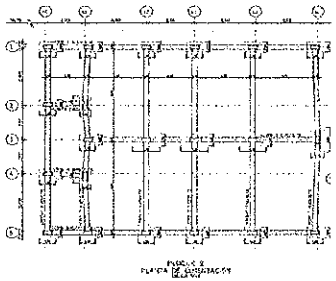



LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
BLOQUE 1						
ZAPATA J1-J2-J3-J4	1,50	1,15			4,00	6,90
ZAPATA I1-I4	1,30	0,90			2,00	2,34
ZAPATA I2-I3	1,50	1,15			2,00	3,45
ZAPATA H'3	1,50	1,15			1,00	1,73
ZAPATA H1-H3'-H4	1,30	0,90			3,00	3,51
ZAPATA H2	1,50	1,15			1,00	1,73
ZAPATA G1-G2-G3-G4	1,50	1,15			4,00	6,90
VIGA VCB1-1	13,16	0,40			1,00	5,26
VIGA VCB1-2	12,76	0,40			1,00	5,10
VIGA VCB1-3	11,82	0,40			1,00	4,73
VIGA VCB1-4	13,16	0,40			1,00	5,26
VIGA VCB1-G	14,30	0,40			1,00	5,72
VIGA VCB1-H	14,05	0,40			1,00	5,62
VIGA VCB1-I	13,78	0,40			1,00	5,51
VIGA VCB1-J	13,53	0,40			1,00	5,41
BLOQUE 2						
ZAPATA A1-A2-A4-A5	1,30	0,90			4,00	4,68
ZAPATA B1-B2-B3-B4-B5	1,30	0,90			5,00	5,85
ZAPATA C1-C5	1,30	0,90			2,00	2,34
ZAPATA C3	2,20	1,10			1,00	2,42
ZAPATA D1-D5	1,30	0,90			2,00	2,34
ZAPATA D3	2,20	1,10			1,00	2,42
ZAPATA E1-E5	1,30	0,90			2,00	2,34
ZAPATA E3	2,20	1,10			1,00	2,42
ZAPATA F1-F5	1,30	0,90			2,00	2,34
ZAPATA F3	2,20	1,10			1,00	2,42
VIGA VCB1-1	15,28	0,40			1,00	6,11
VIGA VCB1-2	1,97	0,40			1,00	0,79
VIGA VCB1-3	10,92	0,40			1,00	4,37
VIGA VCB1-4	1,97	0,40			1,00	0,79
VIGA VCB1-5	15,28	0,40			1,00	6,11
VIGA VCB1-A	14,30	0,40			1,00	5,72
VIGA VCB1-B	12,63	0,40			1,00	5,05
VIGA VCB1-C	15,00	0,40			1,00	6,00
VIGA VCB1-D	15,00	0,40			1,00	6,00
VIGA VCB1-E	15,00	0,40			1,00	6,00
VIGA VCB1-F	13,90	0,40			1,00	5,56
BLOQUE 3						
ZAPATA A1-A5	1,30	0,90			2,00	2,34
ZAPATA A3	1,50	1,15			5,00	8,63
ZAPATA B1-B3-B5	1,50	1,15			3,00	5,18
ZAPATA C1-C3-C5	1,50	1,15			3,00	5,18
ZAPATA D1-D2-D3-D4-D5	1,30	0,90			5,00	5,85
VIGA VCB1-3	7,00	0,40			1,00	2,80
VIGA VCB1-3	7,30	0,40			1,00	2,92
VIGA VCB1-3	7,00	0,40			1,00	2,80
VIGA VCB1-3	15,38	0,40			1,00	6,15
VIGA VCB1-3	12,70	0,40			1,00	5,08
TOTAL ITEM:						199,17
Vienen						345,98
TOTAL ITEM:						544,16

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE


CONTRATO No: 03-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1
CAPITULO:	NP	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE
NO PREVISTOS		
ITEM:	NP - 003	Suministro e instalación de Mampostería en bloque Muros 20 cm.
FRENTE:	BODEGAS	

UNIDAD: M2

ACTA No. 9

DIAGRAMA:

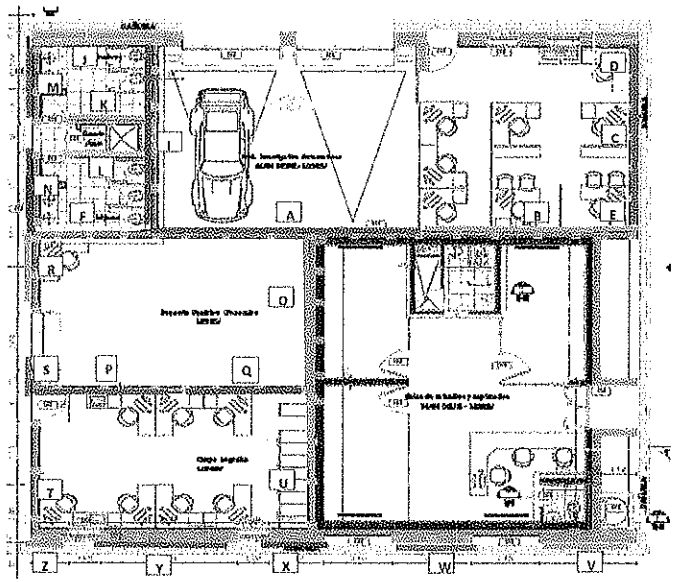

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
BLOQUE 1						
Unidad Investigativa Automotores						
A	6,62		3,45			22,84
B	5,14		3,45			17,73
C	7,10		3,45			24,50
D	0,90		3,45			3,11
E	0,90		3,45			3,11
Baño Mujeres						
F	3,31		3,45			11,42
G	2,71		3,45			9,35
H	2,67		3,45			9,21
Baño Hombres						
I	6,47		3,45			22,32
J	3,31		3,45			11,42
K	2,71		3,45			9,35
L	2,71		3,45			9,35
M	2,75		3,45			9,49
N	2,67		3,45			9,21
Deposito Servicios Generales Menev						
O	4,73		3,45			16,32
P	3,31		3,45			11,42
Q	4,04		3,45			13,94
R	2,59		3,45			8,94
S	0,39		3,45			1,35
Grupo Logistico MENEV						
T	3,62		3,45			12,49
U	4,49		3,45			15,49
Sala de Detenidos y capturados						
V	3,02		3,45			10,42
W	2,47		3,45			8,52
X	1,70		3,45			5,87
Y	4,28		3,45			14,77
Z	1,20		3,45			4,14
						0,00
Descuento Columnetas	0,15		3,45		- 83,00	-42,95
	TOTAL ITEM:					253,13
	vienen					
	TOTAL ITEM:					253,13

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 08-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	NP	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
NO PREVISTOS			
ITEM:	NP - 003	Suministro e instalación de Mampostería en bloque Muros 20 cm.	UNIDAD: M2
FRENTE:	BODEGAS		ACTA No. 9

DIAGRAMA:

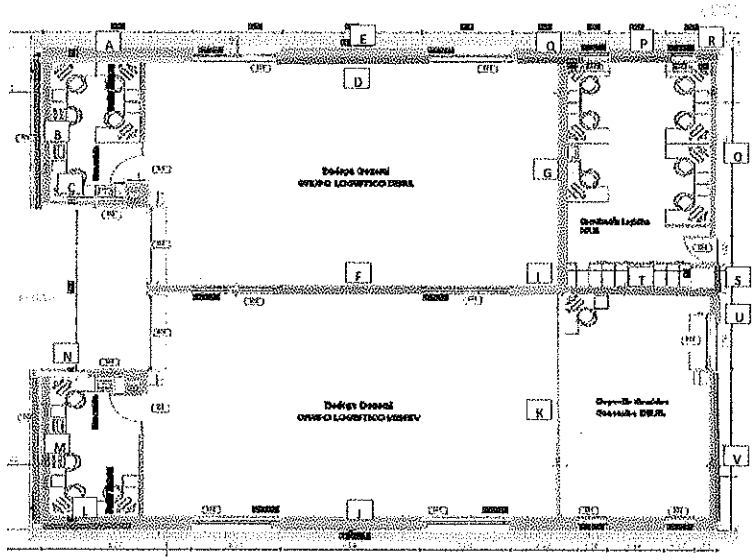

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
BLOQUE 2						
Almacenista						
A	5,00		3,45			17,25
B	5,01		3,45			17,28
C	2,55		3,45			8,80
Bodega General Grupo Logistico						
D	3,19		3,45			11,01
E	4,59		3,45			15,84
F	3,19		3,45			11,01
G	8,17		3,45			28,19
I	1,05		3,45			3,62
Bodega General Grupo Logistico						
J	3,19		3,45			11,01
k	8,18		3,45			28,22
Almacenista						
L	2,55		3,45			8,80
M	5,01		3,45			17,28
N	2,55		3,45			8,80
Coordinacion Logistica DEUIL						
O	6,35		3,45			21,91
P	1,88		3,45			6,49
Q	2,25		3,45			7,76
R	0,75		3,45			2,59
S	0,75		3,45			2,59
T	4,83		3,45			16,66
Deposito Servicio Generales						
U	5,43		3,45			18,73
V	0,57		3,45			1,97
Descuento Columnetas	0,15		3,45		72,00	-37,26

OBSERVACIONES:

TOTAL ITEM:	228,55
vienen	253,13
TOTAL ITEM:	481,68

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	NP	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
NO PREVISTOS			
ITEM:	NP - 003	Suministro e instalación de Mamposteria en bloque Muros 20 cm.	UNIDAD: M2
FRENTE:	BODEGAS		ACTA No. 9

DIAGRAMA:

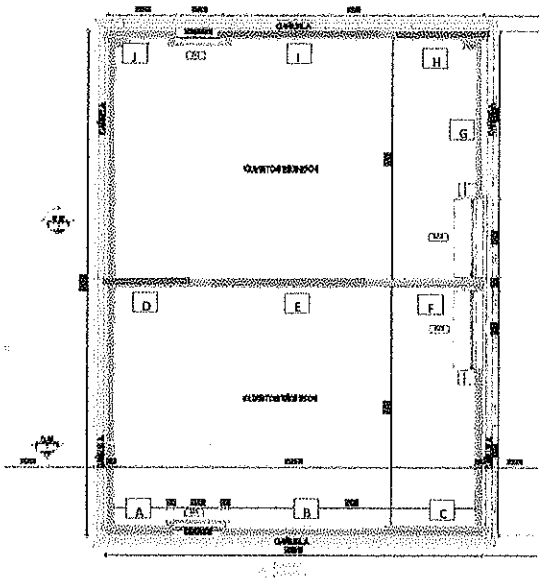

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
BLOQUE3						
Cuarto Tecnico 1						
A	1,49		3,45			5,14
B	3,22		3,45			11,11
C	2,99		3,45			10,32
D	2,99		3,45			10,32
E	3,22		3,45			11,11
F	3,39		3,45			11,70
Cuarto Tecnico 2						
G	3,80		3,45			13,11
H	2,99		3,45			10,32
I	3,22		3,45			11,11
J	1,49		3,45			5,14
Descuento Columnetas	0,15		3,45		- 30,00	-15,53
TOTAL ITEM:						83,85
Vienen						481,68
TOTAL ITEM:						565,53

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE


CONTRATO No: 05-6-10310-23


FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1
CAPITULO:	NP	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE
NO PREVISTOS		
ITEM:	NP - 003	Suministro e instalación de Mamposteria en bloque Muros 20 cm.
FRENTE:	DEUIL	


UNIDAD: M2

ACTA No. 9

DIAGRAMA:

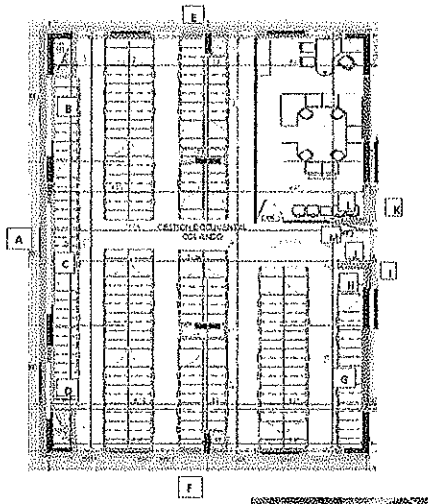





LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
BLOQUE 1 (1er piso)						
GESTION DOCUMENTAL COMANDO						
(A) Fachada	20,15		2,83			57,02
B	3,02		2,83			8,55
C	5,70		2,83			16,13
D	3,03		2,83			8,57
E	12,00		2,83			33,96
Descuento ventanas	1,00		1,00		-4,00	-4,00
F	12,00		2,83			33,96
Descuento ventanas	1,00		1,00		-4,00	-4,00
G	3,50		3,50			12,25
H	1,05		3,50			3,68
I	1,05		3,50			3,68
J	1,05		3,90			4,10
K	1,85		3,50			6,48
L	1,85		3,50			6,48
M	1,05		3,90			4,10
N	1,29		3,45			4,45
O	1,28		3,45			4,42
Descuento Columnatas	0,15		3,50		- 97,00	-35,18


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 08-8-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1
CAPITULO:	NP	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE
NO PREVISTOS		
ITEM:	NP - 003	Suministro e instalación de Mamposteria en bloque Muros 20 cm. — UNIDAD: M2
FRENTE:	DEUIL	ACTA No. 9

DIAGRAMA:

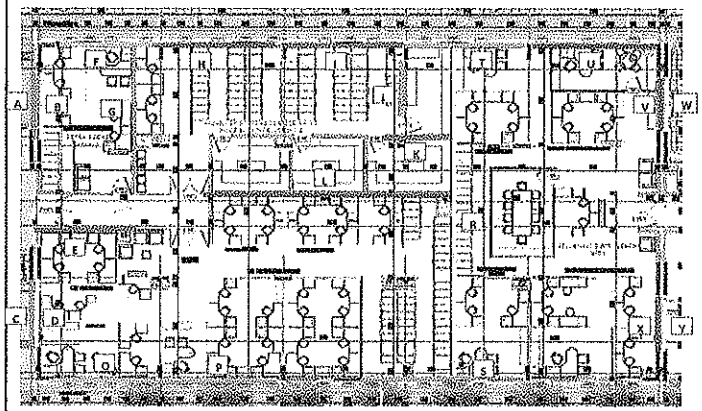

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
BLOQUE 2						
A	3,02		3,50			10,57
B	3,02		3,50			10,57
C	3,84		3,50			13,44
D	3,84		3,5			13,44
E	4,90		3,88			19,01
F	5,20		2,92			15,18
G	8,62		3,50			30,17
H	6,50		2,92			18,98
I	6,50		2,92			18,98
J	3,33		3,50			11,66
K	3,46		3,90			13,49
L	12,75		3,90			49,73
O	5,20		2,92			15,18
P	6,20		2,92			18,10
R	19,40		3,86			74,88
S	6,20		2,94			18,23
T	6,50		2,92			18,98
U	5,88		3,50			20,58
V	3,01		3,50			10,54
W	3,01		3,50			10,54
X	3,02		3,50			10,57
Y	3,02		3,50			10,67
Descuento Columnatas	0,15		3,45		107,00	-55,37
TOTAL ITEM:						378,02
vlanen						730,18
TOTAL ITEM:						1.108,20

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE


CONTRATO No: 00-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1
CAPITULO:	NP	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE
NO PREVISTOS		
ITEM:	NP - 003	Suministro e Instalación de Mamposteria en bloque Muros 20 cm.
FRENTE:	DEUIL	

UNIDAD: M2

ACTA No. 9

DIAGRAMA:

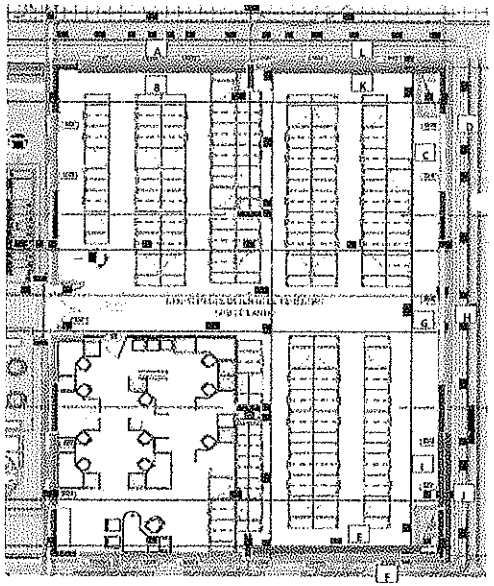

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
BLOQUE3						
(A) Muro interno	6,04		3,50			21,14
Descuento ventanas	1,50		1,50		-1,00	-2,25
	1,00		1,50		-1,00	-1,50
	0,75		1,50		-1,00	-1,13
Descuento Viga dintel	6,04		0,15		-1,00	-0,91
(B) Muro Externo	7,57		3,50			26,50
Descuento ventanas	1,50		1,50		-1,00	-2,25
	1,00		1,50		-1,00	-1,50
	0,75		1,50		-1,00	-1,13
(C) Muro Interno	3,03		3,50			10,61
Descuento ventanas	1,00		1,50		-1,00	-1,50
(D) Muro Externo	5,15		3,50			18,03
Descuento ventanas	1,00		1,50		-1,00	-1,50
(E) Muro Interno	6,02		3,50			21,07
Descuento ventanas	1,50		1,50		-1,00	-2,25
	1,00		1,50		-1,00	-1,50
	0,75		1,50		-1,00	-1,13
(F) Muro Externo	7,02		3,50			24,57
Descuento ventanas	1,00		1,50		-1,00	-1,50
	1,50		1,50		-1,00	-2,25
	0,75		1,50		-1,00	-1,13
(G) Muro Interno	5,70		3,50			19,95
Descuento ventanas	0,75		1,50		-2,00	-2,25
(H) Muro Externo	6,90		3,50			24,15
Descuento ventanas	0,75		1,50		-2,00	-2,25
(I) Muro Interno	3,03		3,50			10,61
Descuento ventanas	1,00		1,50		-1,00	-1,50
	0,75		1,50		-1,00	-1,13
(J) Muro Externo	5,97		3,50			20,90
Descuento ventanas	1,00		1,50		-1,00	-1,50
	0,75		1,50		-1,00	-1,13
(K) Muro Interno	6,00		3,50			21,00
Descuento ventanas	1,50		1,50		-1,00	-2,25
	1,00		1,50		-1,00	-1,50
	0,75		1,50		-1,00	-1,13
Descuento Viga dintel	6,04		0,15		-1,00	-0,91
(L) Muro Externo	7,37		3,50			25,80
Descuento ventanas	1,50		3,50		-1,00	-5,25
	1,00		3,50		-1,00	-3,50
	0,75		3,50		-1,00	-2,63
Descuento Columnetas	0,15		-3,45		66,00	-34,16
TOTAL ITEM:						159,81
vienen						1.109,20
TOTAL ITEM:						1.268,01

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE


CONTRATO No: 06-6-10310-23


FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1
CAPITULO:	NP	
NO PREVISTOS		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE
ITEM:	NP - 005	Suministro e instalación columnete 20 *15
FRENTE:	BODEGAS	

UNIDAD: ML

ACTA No. 9

DIAGRAMA:

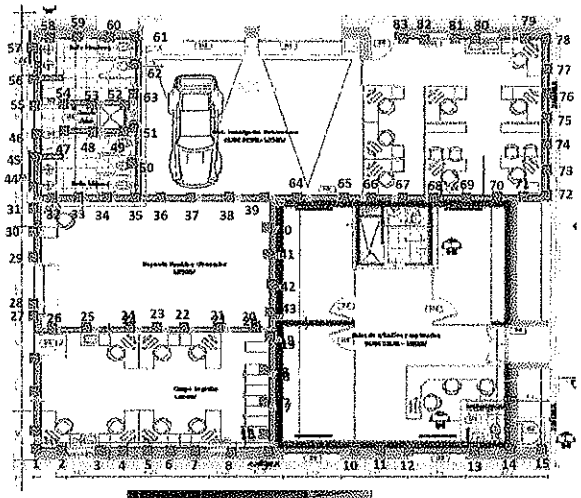

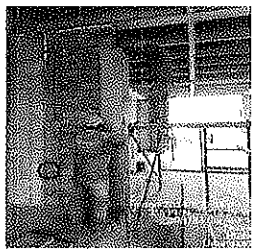

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
BLOQUE 1						
Columnetas 20*15			3,45		83	286,35
BLOQUE 2						
Columnetas 20*15			3,45		72	248,40
BLOQUE 3						
Columnetas 20*15			3,45		30	103,50
TOTAL ITEM:						638,25
vienen						
TOTAL ITEM:						638,25

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA


"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	CONTRATO No: 08-6-10310-23
FECHA: 30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1
CAPITULO: NP	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE
NO PREVISTOS	
ITEM: NP - 005	Suministro e instalación columneta 20 *15 — UNIDAD: ML
FRENTE: BODEGAS	ACTA No. 9

DIAGRAMA:	LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL

BLOQUE 2

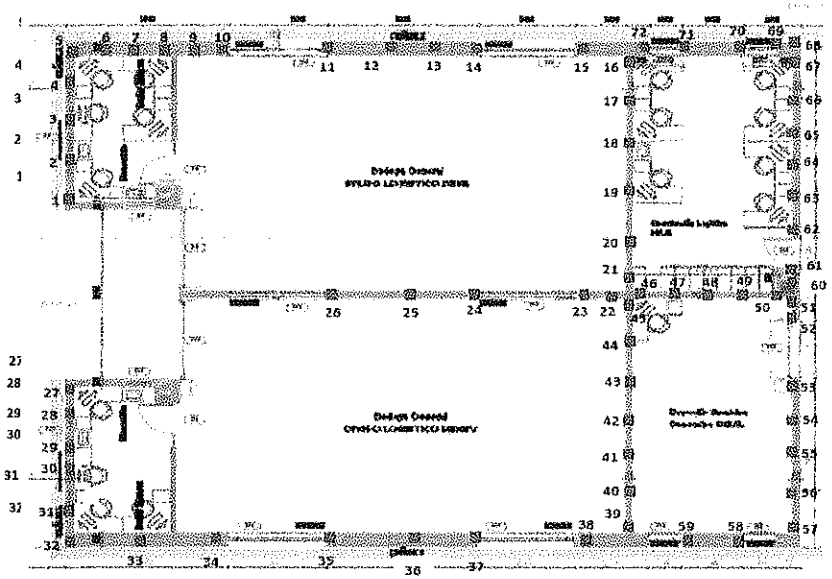

BLOQUE 3

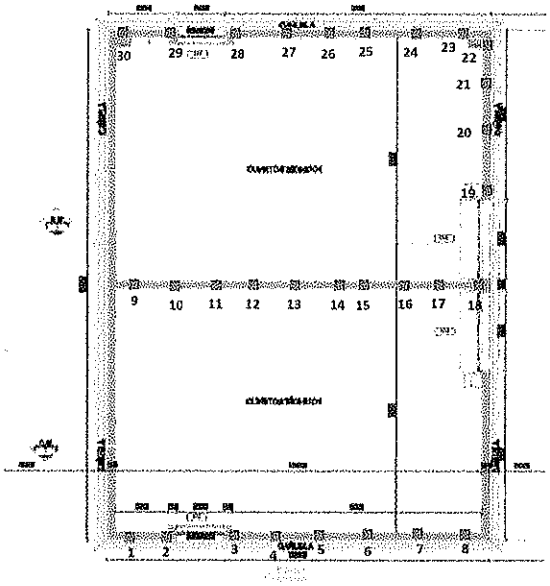

OBSERVACIONES:	TOTAL ITEM:		
	vienen		
	TOTAL ITEM:		

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA


"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 08-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	NP	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
NO PREVISTOS			
ITEM:	NP - 005	Suministro e instalación columneta 20 *15	UNIDAD: ML
FRENTE:	DEUIL		ACTA No. 9

DIAGRAMA:

BLOQUE 1

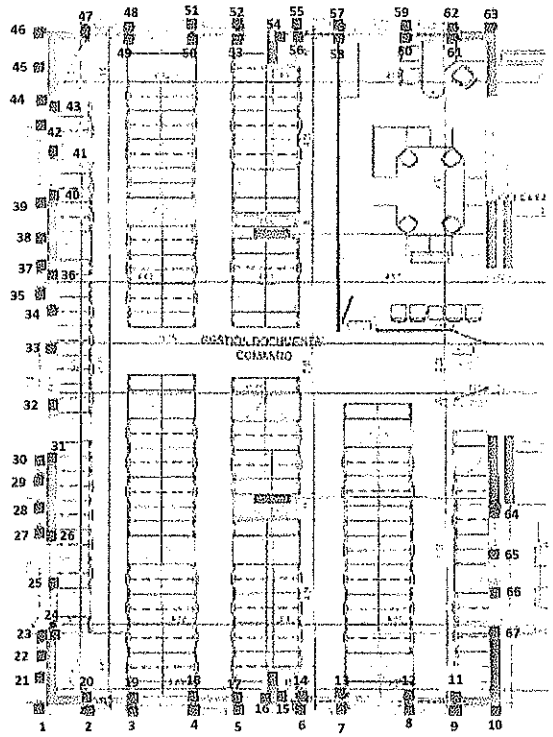


LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
BLOQUE 1 (1ER PISO)						
Columnetas 20*15			3,50		59	206,50
Columnetas 20*15			3,90		2	7,80
Columnetas 20*15			3,45		6	20,70
BLOQUE 2 (1ER PISO)						
Columnetas 20*15			3,50		40	140,00
Columnetas 20*15			3,86		13	50,18
Columnetas 20*15			2,95		40	118,00
Columnetas 20*15			3,90		14	54,60
BLOQUE 3 (1ER PISO)						
Columnetas 20*15			3,50		66	231,00


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE			CONTRATO No: 06-6-10310-23
FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	NP	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
NO PREVISTOS			
ITEM:	NP - 005	Suministro e instalación columneta 20 *15	UNIDAD: ML
FRENTE:	DEUIL		ACTA No. 9

BLOQUE 2

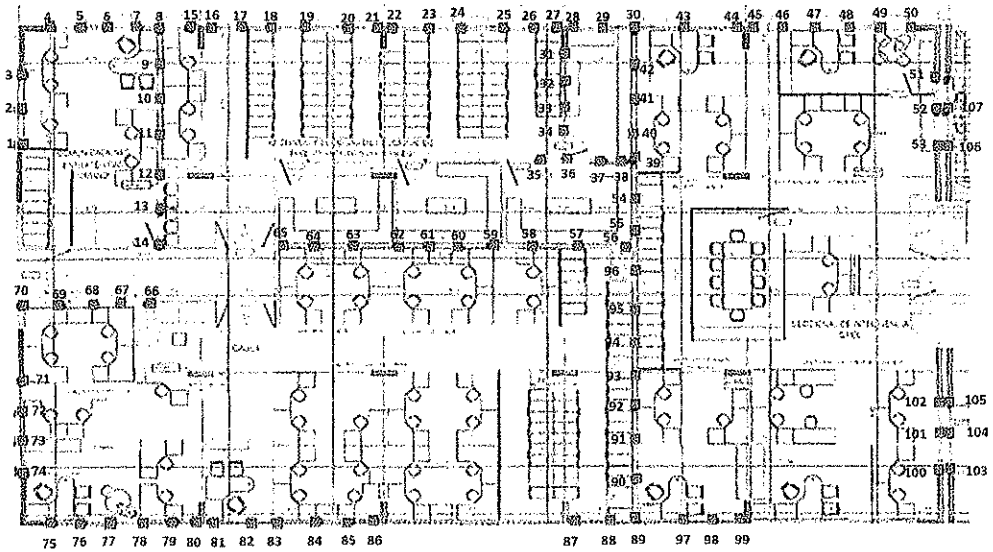

BLOQUE 3

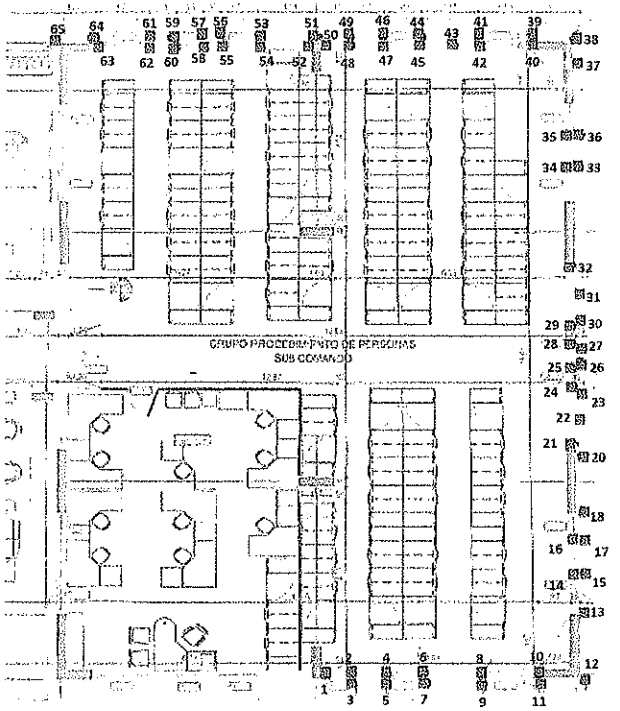

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	NP	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
NO PREVISTOS				
ITEM:	NP - 007	Suministro e instalación de Geotextil Tejido 2400	UNIDAD:	M2
FRENTE:	EXTERIORES		ACTA No.	9

DIAGRAMA:

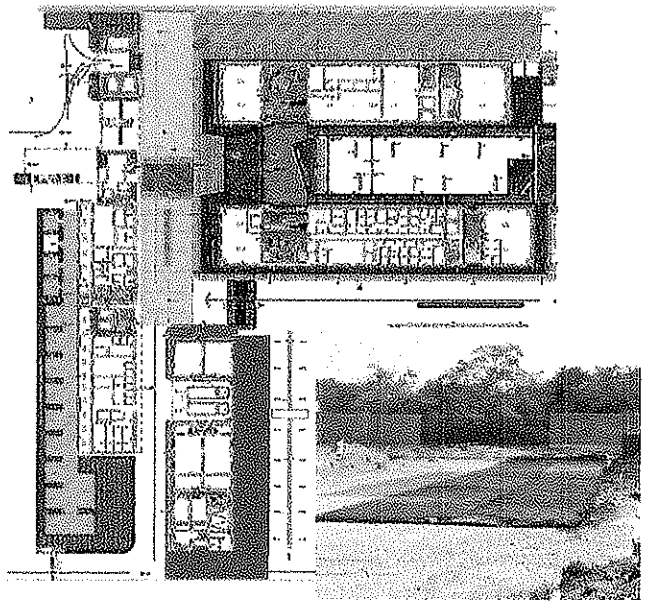

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
VIAS EXTERIORES						
VIA 0	109,72	10,25				1124,63
VIA 1						
	102,22	12,80				1308,42
VIA 0						
FRENTE A DEUIL	107,52	15,40				1655,81
VIA 0	88,26	15,16				1.338,02
POSTERIOR A BODEGAS	28,62	8,04				230,20
TOTAL ITEM:						5.657,08
vienen						
TOTAL ITEM:						5.657,08

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23


FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1
CAPITULO:	NP	
NO PREVISTOS		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE
ITEM:	NP - 008	Anclaje Epoxico 1/2" de 15cm
FRENTE:	BODEGAS	


UNIDAD: UND

ACTA No. 9


DIAGRAMA:

BLOQUE 1

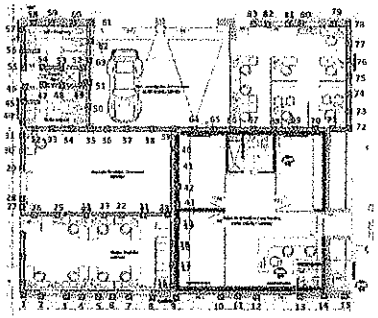

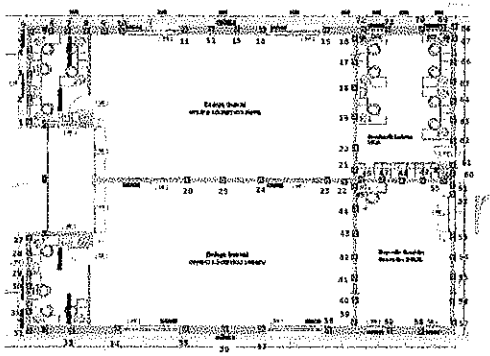

BLOQUE 2

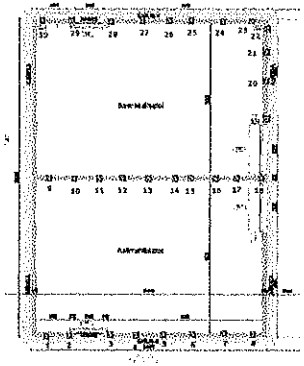

BLOQUE 3

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
BLOQUE 1						
EJE 4 (H' - H)					40,00	40,00
EJE 4 (H' - H - I)					64,00	64,00
EJE 1 (I - J)					64,00	64,00
EJE 1 (I - J),					84,00	84,00
EJE 4 (I - J). INTERNO					80,00	80,00
BLOQUE 2						
EJE (6 - 7) - D. FACHADA					48,00	48,00
EJE (7 - 8) - D. FACHADA					48,00	48,00
EJE (8 - 9) - D. FACHADA					48,00	48,00
EJE (7 - 8) (B - C).					64,00	64,00
EJE 6 ENTRE (C - C').					64,00	64,00
BLOQUE 3						
EJE 9 ENTRE A-D. FACHADA					32,00	32,00
EJE 3 ENTRE A-D.					40,00	40,00
EJE 1 ENTRE A-D.					32,00	32,00
EJE D ENTRE 1-3					16,00	16,00
TOTAL ITEM:						724,00
vienen						
TOTAL ITEM:						724,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	NP	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
NO PREVISTOS			
ITEM:	NP - 008	Anclaje Epoxico 1/2" de 15cm	UNIDAD: UND
FRENTE:	DEUIL		ACTA No. 9

DIAGRAMA:

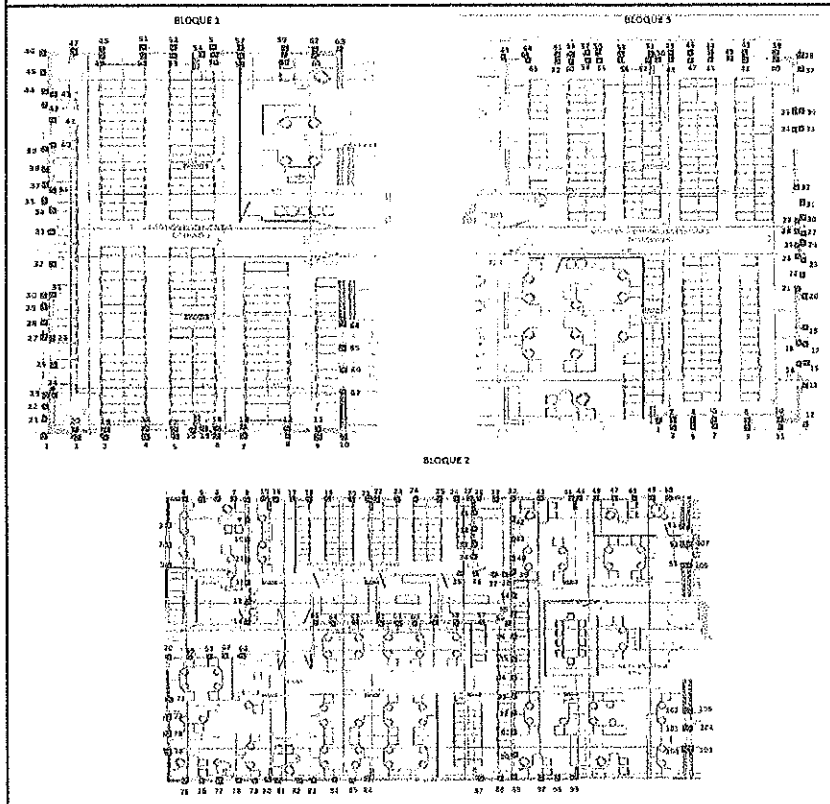

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
BLOQUE 1						
				67	4,00	268,00
BLOQUE 2						
				107	4,00	428,00
BLOQUE 3						
				66	4,00	264,00
TOTAL ITEM:						960,00
vienen						724,00
TOTAL ITEM:						1.684,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA


"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	NP	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
NO PREVISTOS				
ITEM:	NP - 009	Suministro e instalación grafil de 4mm	UNIDAD:	ML
FRENTE:	BODEGAS		ACTA No.	9

DIAGRAMA:

BLOQUE 1

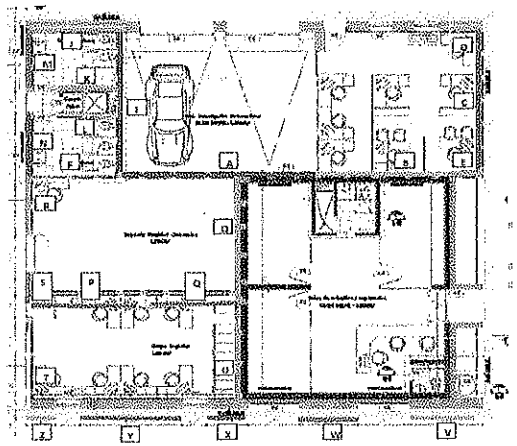

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
BLOQUE 1						
Unidad Investigativa Automotores						
A	6,62				16,00	105,92
B	5,14				16,00	82,24
C	7,10				16,00	113,60
D	0,90				16,00	14,40
E	0,90				16,00	14,40
Baño Mujeres						
F	3,31				16,00	52,96
G	2,71				16,00	43,36
H	2,67				16,00	42,72
Baño Hombres						
I	6,47				16,00	103,52
J	3,31				16,00	52,96
K	2,71				16,00	43,36
L	2,71				16,00	43,36
M	2,75				16,00	44,00
N	2,67				16,00	42,72
Deposito Servicios Generales Menev						
O	4,73				16,00	75,68
P	3,31				16,00	52,96
Q	4,04					4,04
R	2,59				16,00	41,44
S	0,39				16,00	6,24
Grupo Logistico MENEV						
T	3,62				16,00	57,92
U	4,49				16,00	71,84
Sala de Detenidos y capturados						
V	3,02				16,00	48,32
W	2,47				16,00	39,52
X	1,70				16,00	27,20
Y	4,28				16,00	68,48
Z	1,20				16,00	19,20
	TOTAL ITEM:					1.312,36
	vienen					
	TOTAL ITEM:					1.312,36

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-8-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	NP	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
NO PREVISTOS			
ITEM:	NP - 009	Suministro e instalación grafil de 4mm	UNIDAD: ML
FRENTE:	BODEGAS		ACTA No. 9

DIAGRAMA:

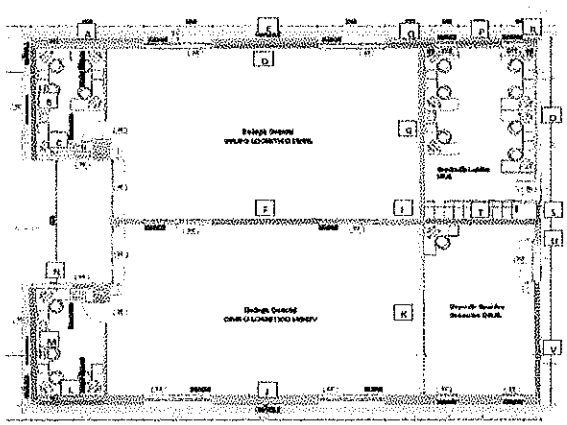

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
BLOQUE 2						
Almacenista						
A	5,00				16,00	80,00
B	5,01				16,00	80,16
C	2,55				16,00	40,80
Bodega General Grupo Logistico						
D	3,19				16,00	51,04
E	4,59				16,00	73,44
F	3,19				16,00	51,04
G	8,17				16,00	130,72
I	1,05				16,00	16,80
Bodega General Grupo Logistico						
J	3,19				16,00	51,04
k	8,18				16,00	130,88
Almacenista						
L	2,55				16,00	40,80
M	5,01				16,00	80,16
N	2,55				16,00	40,80
Coordinacion Logistica DEUIL						
O	6,35				16,00	101,60
P	1,88				16,00	30,08
Q	2,25				16,00	36,00
R	0,75				16,00	12,00
S	0,75				16,00	12,00
T	4,83				16,00	77,28
Deposito Servicio Generales						
U	5,43				16,00	86,88
V	0,57				16,00	9,12
TOTAL ITEM:						1.232,64
vienen						1.312,36
TOTAL ITEM:						2.545,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PEROOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 08-8-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	NP	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
NO PREVISTOS			
ITEM:	NP - 009	Suministro e instalación grafil de 4mm	UNIDAD: ML
FRENTE:	BODEGAS		ACTA No. 9

DIAGRAMA:

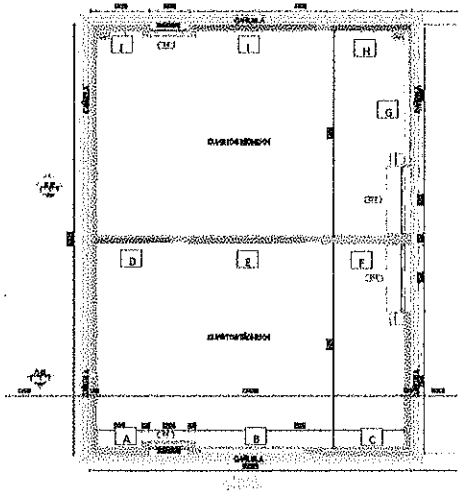

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
BLOQUE3						
Cuarto Tecnico 1						
A	1,49				16,00	23,84
B	3,22				16,00	51,52
C	2,99				16,00	47,84
D	2,99				16,00	47,84
E	3,22				16,00	51,52
F	3,39				16,00	54,24
Cuarto Tecnico 2						
G	3,80				16,00	60,80
H	2,99				16,00	47,84
I	3,22				16,00	51,52
J	1,49				16,00	23,84
TOTAL ITEM:						460,80
Vienen						2.545,00
TOTAL ITEM:						3.005,80

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 08-8-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	NP	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
NO PREVISTOS			
ITEM:	NP - 009	Suministro e instalación grafil de 4mm	UNIDAD: ML
FRENTE:	DEUIL		ACTA No. 9

DIAGRAMA:

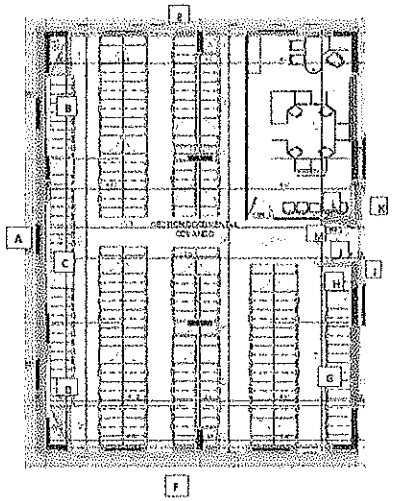

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
BLOQUE 1 (1er piso)						
GESTION DOCUMENTAL COMANDO						
(A) Fachada	20,15				16,00	322,40
B	3,02				16,00	48,32
C	5,70				16,00	91,20
D	3,03				16,00	48,48
E	12,00				16,00	192,00
F	12,00				16,00	192,00
G	3,50				16,00	56,00
H	1,05				16,00	16,80
I	1,05				16,00	16,80
J	1,05				16,00	16,80
K	1,85				16,00	29,60
L	1,85				16,00	29,60
M	1,05				16,00	16,80
N	1,29				16,00	20,64
O	1,28				16,00	20,48
TOTAL ITEM:						1.117,92
Vienen						3.006,80
TOTAL ITEM:						4.123,72

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY GUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-8-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	NP	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
NO PREVISTOS				
ITEM:	NP - 009	Suministro e instalación grafil de 4mm	UNIDAD:	ML
FRENTE:	DEUIL		ACTA No.	9

DIAGRAMA:

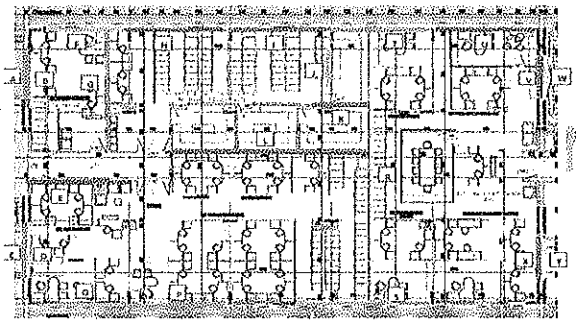

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
BLOQUE 2						
A	3,02				16,00	48,32
B	3,02				16,00	48,32
C	3,84				16,00	61,44
D	3,84				16,00	61,44
E	4,90				16,00	78,40
F	5,20				16,00	83,20
G	8,62				16,00	137,92
H	6,50				16,00	104,00
I	6,50				16,00	104,00
J	3,33				16,00	53,28
K	3,46				16,00	55,36
L	12,75				16,00	204,00
O	5,20				16,00	83,20
P	6,20				16,00	99,20
R	19,40				16,00	310,40
S	6,20				16,00	99,20
T	6,50				16,00	104,00
U	5,88				16,00	94,08
V	3,01				16,00	48,16
W	3,01				16,00	48,16
X	3,02				16,00	48,32
Y	3,02				16,00	48,32

OBSERVACIONES:

TOTAL ITEM:	2.022,72
vienen	4.123,72
TOTAL ITEM:	6.146,44

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-G DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	NP	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
NO PREVISTOS			
ITEM:	NP - 009	Suministro e instalación grafil de 4mm	UNIDAD: ML
FRENTE:	DEUIL		ACTA No. 9

DIAGRAMA:

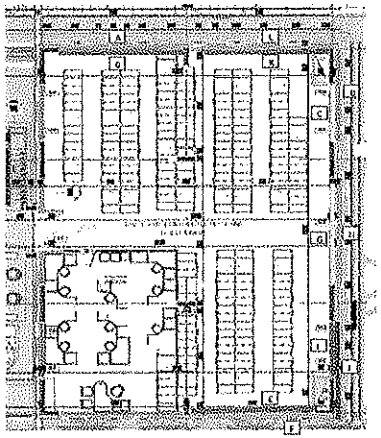

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
BLOQUE3						
(A) Muro Interno	6,04				16,00	96,64
(B) Muro Externo	7,57				16,00	121,12
(C) Muro Interno	3,03				16,00	48,48
(D) Muro Externo	5,15				16,00	82,40
(E) Muro Interno	6,02				16,00	96,32
(F) Muro Externo	7,02				16,00	112,32
(G) Muro Interno	5,70				16,00	91,20
(H) Muro Externo	6,90				16,00	110,40
(I) Muro Interno	3,03				16,00	48,48
(J) Muro Externo	5,97				16,00	95,52
(K) Muro Interno	6,00				16,00	96,00
(L) Muro Externo	7,37				16,00	117,92
TOTAL ITEM:						1.116,80
Vienen						6.146,44
TOTAL ITEM:						7.263,24

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA


"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE


CONTRATO No: 06-6-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	NP		
NO PREVISTOS		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
ITEM:	NP - 011	Suministro e instalación de polietileno para losa de contrapiso	UNIDAD: M2
FRENTE:	EDIFICIOS		ACTA No. 9

DIAGRAMA:







LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
BODEGAS						
BLOQUE 1						
AREA	22,50	17,70				398,25
Descuento Columnas						- 4,52
BLOQUE 2						
AREA	18,52	17,60				325,95
Descuento Columnas						- 3,85
DEUIL						
BLOQUE 1						
AREA	12,25	20,15				246,84
Descuento columnas	0,30	0,70			- 4,00	- 0,84
	0,30	1,00			- 4,00	- 1,20
	0,30	2,00			- 8,00	- 4,80
PUNTO FIJO 1						
AREA 1	7,90	3,82				30,18
AREA 2	13,10	7,58				99,30
Descuento Columnas						- 1,55
BLOQUE 2						
AREA	33,14	19,75				654,52
Descuento columnas	1,00	0,30			- 16,00	- 4,80
Descuento columnas	2,00	0,30			- 8,00	- 4,80
Descuento columnas	0,70	0,30			- 4,00	- 0,84
BLOQUE 3						
	14,72	20,15				296,61
Descuento columnas	1,00	0,30			- 4,00	- 1,20
	2,00	0,30			- 8,00	- 4,80
	0,70	0,30			- 4,00	- 0,84
TOTAL ITEM:						2.017,61
vienen						
TOTAL ITEM:						2.017,61

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 08-6-10310-23


FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1
CAPITULO:	NP	
NO PREVISTOS		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE
ITEM:	NP - 015	Suministro e Instalacion de Baldosa vibroprensada Grano Marmol Terrazo Bicapa espesor 2.2 cm, con mezcla de mortero espesor 3 cm Incluye destroque, brillado y pulido.
FRENTE:	BODEGAS	

UNIDAD: M2


ACTA No. 9

DIAGRAMA:

BLOQUE 1

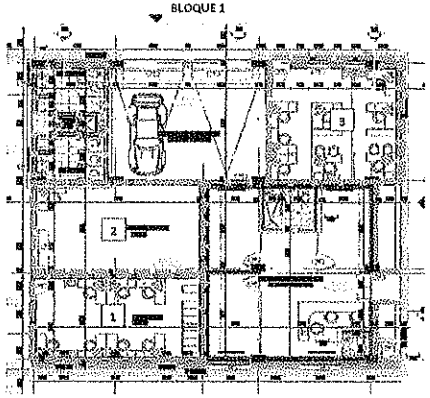

BLOQUE 2

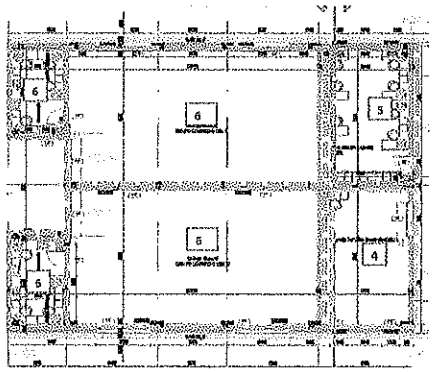

LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	OTROS	CANT	TOTAL
BLOQUE 1						
(1) DEPOSITO DE SERVICIOS GENERALES MENEV	8,43	5,23				44,09
(2)VGRUPO LOGISTICO MENEV	8,43	4,73				39,87
(3) OFICINAS UNIDAD LOGISTICA AUTOMOTORES	6,43	6,64				42,70
BLOQUE 2						0,00
(4) COORDINACION LOGISTICA DEUIL	8,30	4,88				40,50
(5) DEPOSITO DE SERVICIOS GENERALES DEUIL	8,30	4,88				40,50
(6) BODEGA GENERAL GRUPO LOGISTICO MENEV	13,74	8,28				113,77
	3,15	5,16				16,25
(6) BODEGA GENERAL GRUPO LOGISTICO MENEV	13,74	8,28				113,77
	3,15	5,16				16,25
TOTAL ITEM:						467,70
vienen						
TOTAL ITEM:						467,70

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE


CONTRATO No: 06-8-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1	
CAPITULO:	NP	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE	
NO PREVISTOS			
ITEM:	NP - 020	Malla electrosoldada	UNIDAD: KG
FRENTE:		DEUIL	ACTA No. 9

DIAGRAMA:



DEUIL



LOCALIZACION	DIMENSIONES DIAMETRO	KG/M2	LARGO	OTROS	CANT	TOTAL
BLOQUE 1						
DEUIL						
AREA PLACA 2DO PISO			21,15	14,25	301,39	
Cantidad Mallas	6*6	42,20			20,00	844,00
AREA PLACA 3ER PISO			12,00	19,75	237,00	
Cantidad Mallas	6*6	42,20			20,00	844,00
AREA PLACA CUBIERTA			21,15	14,25	301,39	
Cantidad Mallas	6*6	42,20			20,00	844,00
BLOQUE 2						
DEUIL						
AREA PLACA 2DO PISO			21,15	26,26	555,40	
			19,75	6,89	136,08	
Cantidad Mallas	6*6	42,20			60,00	2532,00
AREA PLACA 3ER PISO			33,15	19,75	654,71	
Cantidad Mallas	6*6	42,20			60,00	2532,00
AREA PLACA CUBIERTA			26,11	21,15	552,23	
Cantidad Mallas	6*6	42,20			50,00	2110,00
BLOQUE 3						
DEUIL						
AREA PLACA 2DO PISO			14,32	19,75	282,82	
Cantidad Mallas	6*6	42,20			25,00	1055,00
AREA PLACA CUBIERTA			21,15	14,25	301,39	
Cantidad Mallas	6*6	42,20			25,00	1055,00
TOTAL ITEM:						11816,00
vienen						0,00
TOTAL ITEM:						11816,00

OBSERVACIONES: SE ANEXA CARTILLA

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S


MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, BLOQUE DE BODEGAS, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, VIAS Y URBANISMO DE LA PRIMERA FASE 1-C DEL PROYECTO COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA y DEPARTAMENTO POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATO No: 06-8-10310-23

FECHA:	30 de septiembre de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO URBA FASE 1		
CAPITULO:	NP	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROCCIDENTE		
NO PREVISTOS				
ITEM:	NP - 020	Malla electrosoldada	UNIDAD:	KG
FRENTE:		BODEGAS	ACTA No.	9

DIAGRAMA:





LOCALIZACION	DIMENSIONES DIAMETRO	KG/M2	LARGO	OTROS	CANT	TOTAL
BLOQUE 3						
BODEGAS						
AREA PLACA CUBIERTAS			12,00	17,80	213,60	
Cantidad Mallas	6*6	42,20			19,00	801,80
BLOQUE 2						
BODEGAS						
AREA PLACA CUBIERTAS			22,48	17,29	388,68	
Cantidad Mallas	6*6	42,20			34,00	1434,80
TOTAL ITEM:						2236,60
vienen						11816,00
TOTAL ITEM:						14052,60

OBSERVACIONES: SE ANEXA CARTILLA

REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDER CASTILLO PINILLA
CONSORCIO URBA FASE 1

DIRECTOR DE OBRA
ARMANDO GARCIA CEPEDA
CONSORCIO URBA FASE 1

REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ
CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S
