SMCN – GRUPO CENTRO
Ingeniero
LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 1 del mes de abril al 30 del mes de abril de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN No. 2193 del 27 de junio de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LOS CUROS - MÁLAGA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 124 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	1042 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066	NIT:	900.354.637-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S. con NIT. 900.354.637-5, con porcentaje de participación del 75% e HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.397.334-3, con un porcentaje de participación del 25%.		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	25 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 32939

VALOR INICIAL:	$286.170.023.299 M/CTE
VALOR ADICIONES:	$9.954.675.275 M/CTE
ADICIÓN 1:	$9.954.675.275 M/CTE
VALOR ACTUAL:	$296.124.698.574 M/CTE
ANTICIPO	CUENTA DE AHORROS 219-86590-4 FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$11.407.177.862 M/CTE
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 2.638.793.143,00 M/CTE
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 8.768.384.719,00 M/CTE
PLAZO INICIAL:	102 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	No aplica
PRÓRROGA 1:	No aplica
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de agosto de 2029.

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
466621	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 4.663.443.163	$ 3.590.579.273,0	$ 8.768.384.719 *Anticipo por amortizar
466621	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 256.580.136	$ 256.580.136	
1047021	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 7.300.000.000	$ 2.259.154.446	
1047021	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 2.654.675.275	$ 0	
100122	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 36.901.724.745	$ 36.901.724.745	$ 0
100122	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 598.275.255	$ 598.275.255	$ 0
103923	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 448.706.441	$ 448.706.441	$ 0
103923	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 27.676.293.559	$ 27.676.293.559	$ 0
1408123	2023	20	C-2401-0600-77-0-2401029-02	$ 4.100.000.000	$ 4.100.000.000	$ 0
177724	2024	11	C-2401-0600-77-51102D-2401023-02	$ 448.706.441	$ 448.706.441	$ 0
177724	2024	11	C-2401-0600-77-51102D-2401008-02	$ 27.676.293.559	$ 5.492.280.633	$ 22.184.012.926
TOTAL				$ 112.724.698.574	$ 81.772.300.929	$ 30.952.397.645

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA DE OBRA 34 (MAR-24)	$ 1.457.386.746,00	$ 10.650.134,00	$ 59.491.668,00	$ 1.408.545.212,00
ACTA DE AJUSTE 34P (MAR-24)	$ 351.993.401,00	$ 2.572.259,00	-	$ 354.565.660,00
ACTA DE OBRA 35 (ABR-24)	$ 1.618.143.921,00	$ 23.435.662,00	$ 63.566.893,00	$ 1.578.012.690,00

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 35 de fecha 30/04/2024, para el periodo de abril de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 240.526.352.360	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 68.349.986.620,00	28,42%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 67.760.864.401,00	28,17%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 14.011.436.528,00	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 81.772.300.929,00	

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 11.407.177.862,00
Amortizado	$ 2.638.793.143,00
Saldo	$ 8.768.384.719,00

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 28,42%
Meta física ejecutada %: 28,17%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se realizaron actas de precios no previstos.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron modificaciones.

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. **PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no tramitó reprogramaciones.

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron suspensiones.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron adiciones, prorrogas y/o modificaciones.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/12/2021
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 30/12/2021
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Nacional de seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$13.674.969.857,50	400033673 ANEXO No. 4	16/12/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$11.407.177.862	400033673 ANEXO No. 4	16/12/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$27.349.939.715,00	400033673 ANEXO No. 4	16/12/2021	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	$41.024.909.572,50	400033673 ANEXO No. 4	5 años a partir del Recibo final	
Calidad	$1.088.280.000	400033673 ANEXO No. 4	5 años a partir del Recibo final	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$6.837.484.928,75	400033672 ANEXO No. 3	16/12/2021	31/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No aplica.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA ENVIADA ABRIL DEL 2024				
No. Consecutivo	**fecha del documento**	**Asunto**	**RADICADO CONTRATISTA**	**RADICADO OTROS**
CREACT2021-OC-1002-2024-058	2/4/2024	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO EN EL CIERRE DE MANIFESTACIONES PQRSD VIGENCIA 2023	Fue recibida bajo el radicado No. RC-039-CVC066-03042024	
CREACT2021-OC-1002-2024-059	2/4/2024	RESPUESTA A OFICIOS 026-24-CLI-CVC066-DIR REMISIÓN INFORME MENSUAL ENERO 2024; 061-24-CLI-CVC066-DIR REMISIÓN INFORME MENSUAL FEBRERO 2024	Fue recibida bajo el radicado No. RC-040-CVC066-03042024	
CREACT2021-OC-1002-2024-060	2/4/2024	Respuesta comunicación 355-23-CLI-CVC066-DIR - ENTREGA – Estudios y Diseños sitios siniestrados PR 46+500. Informes de Geología Geotecnia y Pavimentos. PR46	Fue recibida bajo el radicado No. RC-041-CVC066-03042024	
CREACT2021-OC-1002-2024-061	2/4/2024	Solicitud de cumplimiento de las obligaciones establecidas por la resolución DGL No. 000594 del 26 de agosto de 2022 emitida por la CAS y mediante la cual se otorga un permiso de emisiones atmosféricas y se dictan otras disposiciones	Fue recibida bajo el radicado No. RC-042-CVC066-03042024	

CORRESPONDENCIA ENVIADA ABRIL DEL 2024				
No. Consecutivo	**fecha del documento**	**Asunto**	**RADICADO CONTRATISTA**	**RADICADO OTROS**
CREACT2021-OC-1002-2024-062	3/4/2024	ENTREGA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 33 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024		
CREACT2021-OC-1002-2024-052	3/4/2024	PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL (PESV).	fue recibida bajo el radicado No. RC-043-CVC066-03042024	
CREACT2021-OC-1002-2024-063	4/4/2024	SOLICITUD PRÉSTAMO DE SALÓN CULTURAL		FUE RECIBIDA Y RESPONDIDA BAJO RADICADO R-2024-407
CREACT2021-OC-1002-2024-064	5/4/2024	RESPUESTA COMUNICADO 087-24-CLI-CVC066-DIR CON ASUNTO PROGRAMACIÓN SEGUIMIENTO Y MONITOREO NO. 4 DE EPÍFITAS VASCULARES EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 0213 DEL 2022 – CDMB	fue recibida bajo el radicado No. RC-044-CVC066-05042024	
CREACT2021-OC-1002-2024-065	5/4/2024	REITERACIÓN SOLICITUD PROGRAMA DE GESTIÓN PARA EL TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS Y CALIBRACIÓN DE EQUIPO MEDIDOR DE GASES DE ESPACIOS CONFINADOS	fue recibida bajo el radicado No. RC-046-CVC066-05042024	
CREACT2021-OC-1002-2024-066	5/4/2024	ENTREGA ACTA DE COSTOS 34 E INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 34 - MARZO DE 2024		
CREACT2021-OC-1002-2024-067	5/4/2024	Seguimiento al plan de calidad	fue recibida bajo el radicado No. RC-045-CVC066-05042024	
CREACT2021-OC-1002-2024-068	6/4/2024	Respuesta al comunicado 050-24-CLI-CVC066-DIR con asunto: Entrega de Informe Trimestral No. 7 en cumplimiento de la resolución No. 0268 de 2022 EXP210.10.00016.2022	fue recibida bajo el radicado No. RC-047-CVC066-06042024	
CREACT2021-OC-1002-2024-053	5/4/2024	CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE OPERADORES DE MAQUINARIA EN OBRA	fue recibida bajo el radicado No. RC-048-CVC066-08042024	

CORRESPONDENCIA ENVIADA ABRIL DEL 2024				
No. Consecutivo	**fecha del documento**	**Asunto**	**RADICADO CONTRATISTA**	**RADICADO OTROS**
CREACT2021-OC-1002-2024-070	8/4/2024	SOLICITUD VINCULACIÓN CAMIONETA CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
CREACT2021-OC-1002-2024-071	8/4/2024	SOLICITUD VINCULACIÓN PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
CREACT2021-OC-1002-2024-072	9/4/2024	Respuesta comunicación 081-24-CLI-CVC066-DIR / RESPUESTA - CREACT2021-OC-1002-2024-013 / Respuesta comunicación 421-23-CLI-CVC066-DIR, ENTREGA – RESPUESTA – Comunicación CREACT2021-OC-1002-2023-508, cuyo asunto es: Respuesta comunicación 325-23-CLI-CVC066-DIR, ENTREGA – Estudios y Diseños sitios siniestrados.	Fue recibida bajo el radicado No. RC-049-CVC066-10042024	
CREACT2021-OC-1002-2024-073	9/4/2024	Respuesta a comunicado 080-24-CLI-CVC066-DIR / Respuesta - Comunicación CREACT2021-OC1002-2024-014, cuyo asunto es: Respuesta comunicación 398-23-CLI-CVC066-DIR, ENTREGA – RESPUESTA – Comunicación CREACT2021-OC-1002-2023-509, cuyo asunto es: Alcance comunicación CREACT...	Fue recibida bajo el radicado No. RC-050-CVC066-10042024	
CREACT2021-OC-1002-2024-074	9/4/2024	Respuesta a comunicado 111-21-CLI-CVC066-DIR / Respuesta - Comunicación CREACT2021-OC1002-2021-192, cuyo asunto es: Respuesta comunicación 061-21-CLI-CVC066-DIR, Entrega – Respuesta – Comunicación CREACT2021-OC-1002-2021-035, cuyo asunto es: Respuesta comunicación 031-21-CLICVC066-DIR con asunto Respuesta a oficio de interventoría CREACT2021-OC-1002-2021-034 con asunto Observaciones plan de calidad contrato de obra.	Fue recibida bajo el radicado No. RC-051-CVC066-10042024	
CREACT2021-OC-1002-2024-076	9/4/2024	Respuesta a comunicado 297-23-CLI-CVC066-DIR ENTREGA – Volumen II. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico para el sitio critico PR88 (El Canelo)	fue recibida bajo el radicado No. RC-053-CVC066-10042024	
CREACT2021-OC-1002-2024-077	9/4/2024	Respuesta a oficio 031-24-CLI-CVC066-DIR, Aprobación Ficha Predial 690D TU-TCM correspondiente al predio de propiedad del señor Isaías Lozano Lozano y la señora Luding Rodríguez y la Ficha Predial 691D TU-TCM	fue recibida bajo el radicado No. RC-052-CVC066-10042024	

CORRESPONDENCIA ENVIADA ABRIL DEL 2024				
No. Consecutivo	**fecha del documento**	**Asunto**	**RADICADO CONTRATISTA**	**RADICADO OTROS**
		correspondiente al predio de propiedad de la señora Pilar Delgado de Bohórquez.		
CREACT2021-OC-1002-2024-078	11/4/2024	Respuesta comunicación 129-23-CLI-CVC066-DIR, cuyo asunto es “Estudios y Diseños para el sitio siniestrado PR33+000”.		
CREACT2021-OC-1002-2024-079	17/04/2024	REMISIÓN CRONOGRAMA DE REUNIONES INFORMATIVAS Y CAPACITACIONES CON LA VEEDURÍA DEL PROYECTO		
CREACT2021-OC-1002-2024-080	17/4/2024	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA OPC DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS		
CREACT2021-OC-1002-2024-081	17/4/2024	SOLICITUD ATENCIÓN INMEDIATA PUENTE SALABOGA - DESMONTAJE, TRANSPORTE Y MONTAJE PUENTE METÁLICO PROVISIONAL		
CREACT2021-OC-1002-2024-082	18/4/2024	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO CON LA ENTREGA DEL ACTA PARCIAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024		
CREACT2021-OC-1002-2024-075	19/4/2024	CONDICIONES DE SEGURIDAD EN OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CAISSON		
CREACT2021-OC-1002-2024-083	19/4/2024	ENTREGA DE INFORMES Y FORMATOS MEPI-MN1-IN-15-FR-6	No. RC-059-CVC066-22042024	
CREACT2021-OC-1002-2024-084	20/4/2024	Entrega de Fichas Prediales 690D TU-TCM y 691D TU-TCM, aprobadas por esta Interventoría, para su revisión y posterior emisión de Visto Bueno de No Objeción.		
CREACT2021-OC-1002-2024-085	20/4/2024	Respuesta al comunicado Nº 2024S-VBOG-021073 de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS.		
CREACT2021-OC-1002-2024-086	22/4/2024	ENTREGA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 34 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024		

CORRESPONDENCIA ENVIADA ABRIL DEL 2024				
No. Consecutivo	**fecha del documento**	**Asunto**	**RADICADO CONTRATISTA**	**RADICADO OTROS**
CREACT2021-OC-1002-2024-087	22/4/2024	RESPUESTA – Comunicación 013-24-CLI-CVC066-DIR Zonas de desconexión tablero la judía	fue recibida bajo el radicado No. RC-060-CVC066-22042024	
CREACT2021-OC-1002-2024-088	22/4/2024	NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO	fue recibida bajo el radicado No. RC-062-CVC066-26042024	
CREACT2021-OC-1002-2024-089	22/4/2024	TRABAJADORES NO AUTORIZADOS EN ESPACIOS CONFINADOS	fue recibida bajo el radicado No. RC-063-CVC066-26042024	
CREACT2021-OC-1002-2024-090	26/4/2024	Respuesta revisión memorando técnico MT-1196-C108A-2024 - Complemento detalles muro eje A Puente “La Judía”	fue recibida bajo el radicado No. RC-061-CVC066-22042024	
CREACT2021-OC-1002-2024-091	26/4/2024	SOLICITUD DE CAPACITACIONES EN MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PUBLICA		
CREACT2021-OC-1002-2024-092	26/4/2024	RESPUESTA A SOLICITUD DE APOYO VÍA TOPE-TAHONA DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA – SANTANDER DE LA CONCEJAL MÓNICA JOHANA FLORES MORGADO		
CREACT2021-OC-1002-2024-093	26/4/2024	REMISIÓN INFORME TRIMESTRAL ESTADO SOCIAL DEL PROYECTO No11 (enero, febrero y marzo de 2024)		
CREACT2021-OC-1002-2024-094	27/4/2024	ENTREGA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL 34		
CREACT2021-OC-1002-2024-095	29/4/2024	Seguimiento al plan de calidad correspondiente al mes de abril	fue recibida bajo el radicado No. RC-064-CVC066-29042024	
CREACT2021-OC-1002-2024-096	29/4/2024	SOLICITUD APOYO VEREDA LA TOHONA DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA – SANTANDER. SRA MÓNICA JOHANA FLORES MORGADO CONCEJAL SANTA BÁRBARA.	fue recibida bajo el radicado No. RC-065-CVC066-29042024	

CORRESPONDENCIA ENVIADA ABRIL DEL 2024				
No. Consecutivo	**fecha del documento**	**Asunto**	**RADICADO CONTRATISTA**	**RADICADO OTROS**
CREACT2021-OC-1002-2024-097	30/4/2024	PROGRAMA DE OBRA VIGENCIA 2024		
CREACT2021-OC-1002-2024-098	30/4/2024	RESPUESTA A COMUNICADO 2024S-VBOG-021616 CON FECHA 2024-04-15 21:29:12 - SOLICITUD DE INFORMACIÓN PUENTE LOS ROBLES – PR 113+300. CORREDOR LOS CUROS - MÁLAGA.		

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	1002 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021	NIT:	901.481.579-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):	CEMOSA COLOMBIA CON NIT. 900.549.062-9 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 10%, ICOEM COLOMBIA S.A.S. CON NIT. 901.333.961-0, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 40%, HACE INGENIEROS S.A.S. CON NIT. 800.129.789-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 32% Y BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S CON NIT. 900.779.202-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 18%.		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	25 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 32937
VALOR INICIAL:	$19.999.940.500		
VALOR ADICIONES:	No aplica		
ADICIÓN 1:	No aplica		
VALOR ACTUAL:	$19.999.940.500		
ANTICIPO	CUENTA AHORROS 523-81153-7 FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$624.970.250		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$624.970.250		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	102 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	No aplica		
PRÓRROGA 1:	No aplica		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de agosto de 2029		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
421821	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 1.187.440.500	$ 1.187.440.500	$ 0
421821	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 62.500.000	$ 62.500.000	$ 0
98422	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 2.460.114.983	$ 2.460.114.983	$ 0
98422	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 39.885.017	$ 39.885.017	$ 0
912722	2022	20	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 1.000.000.000	$ 1.000.000.000	$ 0
103223	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 1.845.086.237	$ 1.845.086.237	$ 0
103223	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 29.913.763	$ 29.913.763	$ 0
943823	2023	20	C-2401-0600-77-0-2401029-02	$ 540.000.000	$ 540.000.000	$ 0
1396423	2023	20	C-2401-0600-77-0-2401029-02	$ 540.000.000	$ 540.000.000	$ 0
155624	2024	11	C-2401-0600-77-51102D-2401023-02	$ 29.913.763	$ 29.913.763	$ 0
155624	2024	11	C-2401-0600-77-51102D-2401008-02	$ 1.845.086.237	$ 531.962.980	$ 1.313.123.257
TOTAL				**$ 9.579.940.500**	**$ 8.266.817.243**	**$ 1.313.123.257**

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 34 (Mar)	$ 118.163.260	$ 22.451.019	$ 0,00	$ 140.614.279
Acta de costos No. 35 (Mar)	$ 138.590.916	$ 26.332.274	$ 0,00	$ 164.923.190

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 35 de fecha 30/04/2024 para el período de abril 2024 el contrato reporta un avance de 40,25%

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 8.317.945.273,00 40,50%
Total inversión ejecutada: $ 8.266.831.095,00 40,25%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se tramitaron modificaciones

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se tramitaron suspensiones

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

3. No se tramitaron adiciones ni prorrogas.

FECHA	No.	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Nacional de seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$1.037.494.050	400033485 ANEXO No. 4	13/05/2021	31/12/2025

Buen Manejo Anticipo	$ 4.359.218.697	400033485 ANEXO No. 4	13/05/2021	31/12/2021
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.074.988.100	400033485 ANEXO No. 4	13/05/2021	31/12/2021
Calidad del Servicio	$5.999.982.150	400033485 ANEXO No. 4	Acta de entrega a entera satisfacción	5 años a partir del Recibo final

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN No. 1 (redistribución de vigencias)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/07/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: MEMORANDO No SGCP 14474
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 08/08/2022
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**


ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR LA INTERVENTORÍA

AVANCE DE ACTIVIDADES						
Actividad	**Unidad**	**Proyectado**	**Ejecutado**	**%**	**Por ejecutar**	**%**
Excavaciones	m3	2.500.000	206.103	8,2%	2.293.897	91,8%
Concreto	m3	259.775	15.707	6,0%	244.068	94,0%
Acero	kg	11.891.055	960.116	8,1%	10.930.939	91,9%
Subbase	m3	108.000	6.152	5,7%	101.848	94,3%
Base	m3	96.000	4.944	5,2%	91.056	94,9%
Mezcla asfáltica	m3	67.500	3.064	4,5%	64.436	95,5%
Anclajes para estabilización	ml	974.070	48.774	5,0%	925.296	95,0%
Mallas para estabilización	m2	741.713	34.420	4,6%	707.293	95,4%


- Para el presente periodo y teniendo en cuenta las metas físicas definidas dentro delalcance del proyecto, se presenta el siguiente avance en cada una de ellas:

METAS FÍSICAS	**AVANCE ACUMULADO**
Mejoramiento del corredor (pavimentación)	3,64 Km
Mantenimiento de la vía en afirmado	63 Km
Mantenimiento a la señalización del corredor	26,8 Km
Sitio crítico La Judía	83%
Sitio crítico Pangote (se encuentra transitable)	4,7%
Atención a emergencias	(PR111, El Canelo -PR88, Puente Chimpatá-PR94, El Tope-PR95, PR32)
Remoción de derrumbe	48.100 m3

A continuación, se representa gráficamente el avance de la pavimentación del corredor Málaga - Curos

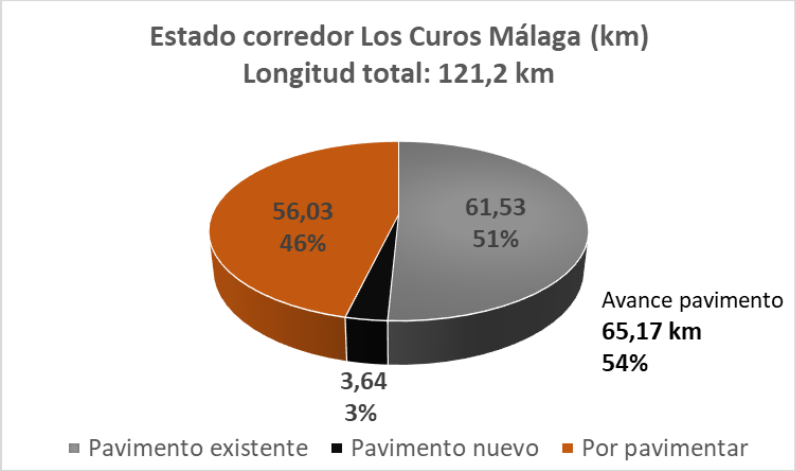

Estado de la pavimentación del corredor Los Curos – Málaga

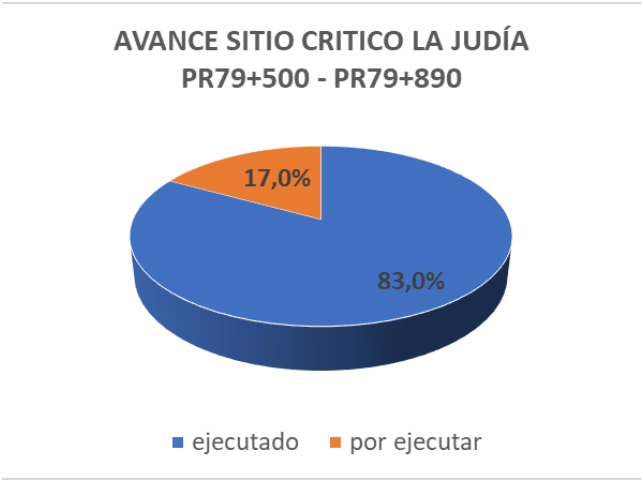

AVANCE SITIO CRÍTICO LA JUDÍA

- La reprogramación del programa de Inversiones No. 7 para el contrato de obra 1042 de 2021 con fecha 25-01-2024, muestra a corte de abril de 2024 un avance de obra programado acumulado de 28,42% y avance ejecutado acumulado de 28,18%. Lo anterior indica que no se está cumpliendo con lo programado, se presenta un atraso del 0,24%.
- La vigencia del contrato para el año 2024 tiene recursos por un valor de $28.125.000.000 pero la capacidad operativa instalada en el proyecto tiene una faltante de recursos por un valor $62.634.110.597.

ESTADO DE ESTUDIOS SECTORES EN EJECUCIÓN Y SITIOS INESTABLES

Con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos técnicos y contractuales para construir las obras para la pavimentación del corredor vial, a continuación, se relacionan los avances en cuanto a los estudios y diseño:

ESTADO ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES EN EJECUCIÓN Y SITIOS INESTABLES			
SECTORES		**LONGITUD km**	**AVANCE %**
1	PR 1+365 al PR 7+000	5,6 km	100%
2	PR 63+050 al PR 73+000	10 km	100%
3	PR 108+600 al PR 109+348	0,748 km	100%
4	PR 109+718 al PR 110+600	0,882 km	100%
5	PR 122+050 al PR 124+000	1,95 km	100%
	Total	**19,18 km**	

SITIOS INESTABLES		
1	PR14+220 al PR 14+500	70%
2*	PR 29+720 al PR 30+090 (SC43)	100%
3*	PR30+492 al PR 30+960	80%
4*	PR32+758 al PR 33+098	70%
5	PR46+580 al PR 47+107	60%
6	PR 53+690 al PR53+743	65%
7*	PR 71+688 al PR 71+740	100%
8*	PR 79+600 al PR 79+800 la judía	100%
9	PR 87+600 al PR 88+250 EL Canelo	5%
10	PR111+080 Talud inferior; PR 111+150 Talud Superior el Volcán	100%
11	PR111+230 al PR111+350	5%

*Sitio crítico relacionado dentro de la acción popular radicado 2015-847.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

Actualmente, se cuenta con un total de 174 predios distribuidos en todo el corredor vial, de los cuales, se encuentran pendientes de firma de los Permisos de Intervención Voluntarios, 13 inmuebles en el sector de Málaga, para un avance total del 92.53% de PIVs.

Continúa el balance positivo en la Gestión y Adquisición Predial, a la fecha de corte del presente informe, se encuentran aprobadas por esta Interventoría y con Visto Bueno de No Objeción por parte del Gestor Técnico Predial de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, treinta (30) Fichas y Planos Prediales con sus insumos constitutivos. Trece (13) Estudios de Títulos correspondientes al Sector de Los Curos, se encuentran aprobados por parte de esta Interventoría Jurídico Predial y con Visto Bueno de No Objeción por parte de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS. Se destaca reiteradamente, que el Contratista notificó mediante los respectivos oficios, a los trece (13) propietarios de los predios de este sector, en cumplimiento a lo requerido por las Fichas Prediales, relacionado con la entrega de la documentación exigida para soportar el lucro cesante y daño emergente, en el que pudiesen verse afectados dichos propietarios.

De igual manera, se cuenta con dos (2) Informes de Diagnóstico Predial aprobados por esta Interventoría, como son el del tramo de Los Curos y el del tramo del Municipio de Santa Bárbara y a la fecha de corte del presente Informe el del tramo del Municipio de Guaca, se encuentra en revisión por parte de esta Interventoría.

Estado de las manifestaciones PQRS: En el periodo de abril de 2024 se recepcionaron cuatro (4) manifestaciones PQRSD, con numero consecutivos; 288,289, 290, 291 que en todos los casos corresponden a peticiones, de la cuales se cerró una (1); la tabla expone dichas PQRSD recepcionadas en el periodo reportado. A la fecha, se cuenta con un acumulado de 291 atenciones ciudadanas recibidas en el proyecto, 98.5% atendidas y cerradas y 2.5% abiertas identificadas con número consecutivo: 287, 288, 289 y 291.
Contratación de Mano de obra de AIP: En el periodo de abril se reportaron 138 personas activas siete (7) más que el periodo inmediatamente anterior, el 42% corresponde a personal de Mano de Obra no Calificada; en todos los casos del área de influencia del Proyecto; el 58% es personal de Mano de Obra Calificada de los cuales más de la mitad 57% es personal del área de influencia del proyecto.

Atención a la comunidad: En el periodo de abril del 2024 se continúa ofreciendo el servicio de una (1) oficina de atención permanente a la comunidad, disponible y abierto en lo que va el proceso constructivo de la obra hasta la fecha; está ubicado en sitio visible y de fácil acceso en el municipio Guaca en la Calle 5 No. 6 – 49 Centro


4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Durante el presente periodo no se realizaron comisiones.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO**

Cordialmente,



Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Director Territorial Santander (E)
