SMCN – GRUPO CENTRO
Ingeniero
LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 1 del mes de junio al 30 del mes de junio de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN No. 2193 del 27 de junio de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LOS CUROS - MÁLAGA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 124 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	1042 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066	NIT:	900.354.637-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S. con NIT. 900.354.637-5, con porcentaje de participación del 75% e HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.397.334-3, con un porcentaje de participación del 25%.		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	25 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 32939

VALOR INICIAL:	$286.170.023.299 M/CTE
VALOR ADICIONES:	$9.954.675.275 M/CTE
ADICIÓN 1:	$9.954.675.275 M/CTE
VALOR ACTUAL:	$296.124.698.574 M/CTE
ANTICIPO	CUENTA DE AHORROS 219-86590-4 FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$11.407.177.862 M/CTE
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 2.740.332.789,00 M/CTE
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 8.666.845.073,00 M/CTE
PLAZO INICIAL:	102 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	No aplica
PRÓRROGA 1:	No aplica
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de agosto de 2029.

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
466621	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 4.663.443.163	$ 3.692.118.919,0	$ 8.666.845.073 *Anticipo por amortizar
466621	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 256.580.136	$ 256.580.136	
1047021	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 7.300.000.000	$ 2.259.154.446	
1047021	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 2.654.675.275	$ 0	
100122	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 36.901.724.745	$ 36.901.724.745	$ 0
100122	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 598.275.255	$ 598.275.255	$ 0
103923	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 448.706.441	$ 448.706.441	$ 0
103923	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 27.676.293.559	$ 27.676.293.559	$ 0
1408123	2023	20	C-2401-0600-77-0-2401029-02	$ 4.100.000.000	$ 4.100.000.000	$ 0
177724	2024	11	C-2401-0600-77-51102D-2401023-02	$ 448.706.441	$ 448.706.441	$ 0
177724	2024	11	C-2401-0600-77-51102D-2401008-02	$ 27.676.293.559	$ 8.439.970.965	$ 19.236.322.594
TOTAL				$ 112.724.698.574	$ 84.821.530.907	$ 27.903.167.667

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA DE AJUSTE 35D (ABR-24)	$ - 920.940,00	$ - 6.730,00	-	$ - 927.670,00
ACTA DE OBRA 36 P (ABR-24)	$ 136.220.820,00	$ 995.460,00	-	$ 137.216.280,00
ACTA DE OBRA 37 (JUN-24)	$ 1.859.829.055,00	$ 13.591.058,00	$ 76.278.145,00	$ 1.797.141.968,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 36 de fecha 31/05/2024, para el periodo de mayo de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 240.526.352.360	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 70.251.354.200,10	29,21%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 70.237.031.232,00	29,20%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 14.584.499.675,00	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 84.821.530.907,00	

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 11.407.177.862,00
Amortizado	$ 2.740.332.789,00
Saldo	$ 8.666.845.073,00

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 29,21%
Meta física ejecutada %: 29,20%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se realizaron actas de precios no previstos.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron modificaciones.

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. **PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no tramitó reprogramaciones.

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron suspensiones.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron adiciones, prorrogas y/o modificaciones.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/12/2021
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 30/12/2021
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Nacional de seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$13.674.969.857,50	400033673 ANEXO No. 4	16/12/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$11.407.177.862	400033673 ANEXO No. 4	16/12/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$27.349.939.715,00	400033673 ANEXO No. 4	16/12/2021	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	$41.024.909.572,50	400033673 ANEXO No. 4	5 años a partir del Recibo final	
Calidad	$1.088.280.000	400033673 ANEXO No. 4	5 años a partir del Recibo final	

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$6.837.484.928,75	400033672 ANEXO No. 3	16/12/2021	31/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No aplica.

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA ENVIADA MAYO DEL 2024			
			INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE DOCUMENTO RADICADO
No. Consecutivo	**fecha del documento**	**Asunto**	**CORREO ENVIÓ**
CREACT2021-OC-1002-2024-144	5/6/2024	ENTREGA ACTA DE COSTOS 36 E INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 36 - MAYO DE 2024.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-145	7/6/2024	Respuesta al comunicado 147-24-CLI-CVC066-DIR con asunto: Informe Semestral No. 4 Resolución No. 268 del 5 de mayo de 2022.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-146	7/6/2024	Respuesta al comunicado 148-24-CLI-CVC066-DIR con asunto: Entrega Informe final Rescate, Traslado y Reubicación de Epífitas Vasculares Resolución 0213 del 18 de marzo de 2022 – CDMB. Exp. AF-0007-2022-SINCA 34095.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-147	7/6/2024	Respuesta al comunicado 217-24-EXTI-CVC066-DIR con asunto: Notificación sobre árboles en riesgo de volcamiento.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-148	7/6/2024	Apremio por Incumplimiento programa de inversión contrato No 1042 de 2021	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>

CORRESPONDENCIA ENVIADA MAYO DEL 2024			
			INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE DOCUMENTO RADICADO
No. Consecutivo	**fecha del documento**	**Asunto**	**CORREO ENVIÓ**
CREACT2021-OC-1002-2024-149	7/6/2024	Respuesta al comunicado 021-24-EXT-CVC066-DIR_Atención a comunicado CREACT2021-OC-1002-2024-001 del 11 de enero de 2023, ajustes a informes de julio a noviembre de 2023 y remisión del informe mensual No 30 de diciembre de 2023 de sostenibilidad.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-150	7/6/2024	Respuesta al comunicado 149-24-CLI-CVC066-DIR con asunto: Entrega Plan de Compensación en cumplimiento de la Resolución No. 0213 del 18 de marzo de 2022 emitida por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-151	7/6/2024	PRESENTACIÓN HOJA DE VIDA PROFESIONAL AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-152	8/6/2024	ENTREGA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 36 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>

CORRESPONDENCIA ENVIADA MAYO DEL 2024			
			INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE DOCUMENTO RADICADO
No. Consecutivo	**fecha del documento**	**Asunto**	**CORREO ENVIÓ**
CREACT2021-OC-1002-2024-153	8/6/2024	ENTREGA ACTA DE AJUSTES DEFINITIVO No 34 Y PROVISIONAL No 35	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-154	6/6/2024	RESPUESTA OFICIOS 127-24-CLI-CVC066-DIR Entrega PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL V4 DOCUMENTO PAGA Y ACTA DE RADICIACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS. Y OFICIO 154-24-CLI-CVC066-DIR ENTREGA PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL (PIS) V4 FIRMADO	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-155	12/6/2024	REMISIÓN PLAN DE INVERSION SOCIAL VERSIÓN 4.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-156	13/6/2024	Respuesta al comunicado 164-24-CLI-CVC066-DIR del 31 de mayo de 2024. – Solicitud de Ampliación Plan de Exploración PR111+300.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-157	13/6/2024	Cambio de Vallas Informativas del Proyecto	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-158	14/6/2024	Condiciones de seguridad Sitio critico La Judía PR79+700	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>

CORRESPONDENCIA ENVIADA MAYO DEL 2024			
			INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE DOCUMENTO RADICADO
No. Consecutivo	**fecha del documento**	**Asunto**	**CORREO ENVIÓ**
CREACT2021-OC-1002-2024-160	20/6/2024	ENTREGA ACTA DE AJUSTES DEFINITIVO No 35 Y PROVISIONAL No. 36	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co> pavila@invias.gov.co, Marlon Oswaldo Gamboa Duarte <mgamboa@invias.gov.co>,ING SEBASTIAN FUENTES <sfuentes@invias.gov.co>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com> , Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>,
CREACT2021-OC-1002-2024-161	20/6/2024	Respuesta a comunicado 132-24-CLI-CVC066-DIR. Entrega informe Gestión Ambiental mensual abril de 2024.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-162	20/6/2024	Respuesta a comunicado 156-24-CLI-CVC066-DIR con asunto: Respuesta a comunicado CREACT2021-OC-1002-2024-128 del 21 de mayo de 2024 - Observaciones a informe mensual ambiental de marzo de 2024	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-163	20/6/2024	Acuso Recibo APUs NO PREVISTOS Paquete No 3 CVC-066	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-164	20/6/2024	Respuesta memorando GT-0533-C180K-2024 / Revisión al oficio con asunto: Aclaración drenes subhorizontales PR30, según observación	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>

CORRESPONDENCIA ENVIADA MAYO DEL 2024			
			INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE DOCUMENTO RADICADO
No. Consecutivo	**fecha del documento**	**Asunto**	**CORREO ENVIÓ**
		CREACT2021-OC-1002-2024-023 del componente hidráulico.	
CREACT2021-OC-1002-2024-165	20/6/2024	Respuesta a comunicado 155-24-CLI-CVC066-DIR con asunto: Respuesta a comunicado CREACT2021-OC-1002-2024-127 del 21 de mayo de 2024 - Observaciones a informe mensual ambiental de febrero de 2024".	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-167	21/6/2024	Respuesta a comunicado INVIAS 2024S-VSAN-040345 del 2024-06-21, cuyo asunto es "Observaciones acta de costos No. 36 correspondiente al mes de mayo de 2024".	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-169	24/6/2024	Respuesta al memorando MT-1209-C182L-2024-v0. Sitio crítico PR 111+300: Necesidad de priorizar la construcción de obras para el manejo de aguas de escorrentía.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-170	25/6/2024	ACTA DE REUNIÓN No 55 DEL 28-05-2024 ESPECIALISTAS	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066

CORRESPONDENCIA ENVIADA MAYO DEL 2024			
			INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE DOCUMENTO RADICADO
No. Consecutivo	**fecha del documento**	**Asunto**	**CORREO ENVIÓ**
		EN GEOTECNIA E HIDRÁULICA.	<correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-171	25/6/2024	Observaciones Informes de Sostenibilidad meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-172	25/6/2024	Respuesta a comunicados: 052-24-CLI-CVC066-DIR (Informe de Sostenibilidad Enero), 092-24-CLI-CVC066-DIR (Informe de Sostenibilidad Febrero), 118-24-CLI-CVC066-DIR (Informe de Sostenibilidad Marzo) y 168-24-CLI-CVC066-DIR (Informe de Sostenibilidad Abril)..	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-173	25/6/2024	Respuesta correo electrónico del 23 de mayo de 2024 – Revisión y aprobación diseños taludes ubicados entre el PR108 al PR110	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-174	25/6/2024	ENTREGA ACTA DE COSTOS 37 - JUNIO DE 2024.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>

CORRESPONDENCIA ENVIADA MAYO DEL 2024			
			INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE DOCUMENTO RADICADO
No. Consecutivo	**fecha del documento**	**Asunto**	**CORREO ENVIÓ**
CREACT2021-OC-1002-2024-175	25/6/2024	Entrega de la Pre-acta Predial Nº37 de junio de 2024, aprobada por esta Interventoría, para su revisión y emisión de Visto Bueno de No Objeción.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-176	24/6/2024	Acta de modificación y reprogramación No 9	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-177	25/6/2024	Solicitud – Aprobación de solicitud de anticipo No. 2	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-178	25/6/2024	ENTREGA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 37 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-179	26/6/2024	Alcance comunicación CREACT2021-OC-1002-2024-176 y CREACT2021-OC-1002-2024-178	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-180	26/6/2024	Aprobación solicitud anticipo No. 2 - Alcance comunicación CREACT2021-OC-1002-2024-177	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-181	27/6/2024	Programa de mantenimiento y registros de vehículos para transporte de personal acorde al PESV	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>

CORRESPONDENCIA ENVIADA MAYO DEL 2024			
			INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE DOCUMENTO RADICADO
No. Consecutivo	**fecha del documento**	**Asunto**	**CORREO ENVIÓ**
CREACT2021-OC-1002-2024-183	28/6/2024	Acta de Reunión No. 56 del 14-05-2024: Recorrido de Obra en el Sector Guaca para Definir el Aprovechamiento Forestal.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-184	28/6/2024	RESPUESTA COMUNICADO No. 2024S-VBOG-041124 DE Fecha: 2024-06- 24 18:58:23. Solicitud de revisión PR 108+893, sector el Volcán. Los CurosMálaga	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-185	28/6/2024	Solicitud de Actualización de Póliza de Seguro de Cumplimiento Estatal No. 400033673, Anexo 7, Conforme a la Solicitud de Anticipo No. 2	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	1002 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021	NIT:	901.481.579-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):	CEMOSA COLOMBIA CON NIT. 900.549.062-9 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 10%, ICOEM COLOMBIA S.A.S. CON NIT. 901.333.961-0, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 40%, HACE INGENIEROS S.A.S. CON NIT. 800.129.789-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 32% Y BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S CON NIT. 900.779.202-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 18%.		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	25 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 32937
VALOR INICIAL:	$19.999.940.500		
VALOR ADICIONES:	No aplica		
ADICIÓN 1:	No aplica		
VALOR ACTUAL:	$19.999.940.500		
ANTICIPO	CUENTA AHORROS 523-81153-7 FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$624.970.250		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$624.970.250		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	102 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	No aplica		
PRÓRROGA 1:	No aplica		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de agosto de 2029		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
421821	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 1.187.440.500	$ 1.187.440.500	$ 0
421821	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 62.500.000	$ 62.500.000	$ 0
98422	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 2.460.114.983	$ 2.460.114.983	$ 0
98422	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 39.885.017	$ 39.885.017	$ 0
912722	2022	20	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 1.000.000.000	$ 1.000.000.000	$ 0
103223	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 1.845.086.237	$ 1.845.086.237	$ 0
103223	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 29.913.763	$ 29.913.763	$ 0
943823	2023	20	C-2401-0600-77-0-2401029-02	$ 540.000.000	$ 540.000.000	$ 0
1396423	2023	20	C-2401-0600-77-0-2401029-02	$ 540.000.000	$ 540.000.000	$ 0
155624	2024	11	C-2401-0600-77-51102D-2401023-02	$ 29.913.763	$ 29.913.763	$ 0
155624	2024	11	C-2401-0600-77-51102D-2401008-02	$ 1.845.086.237	$ 883.344.272	$ 961.741.965
TOTAL				**$ 9.579.940.500**	**$ 8.618.198.535**	**$ 961.741.965**

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 36 (mayo)	$ 139.115.440	$ 26.431.934	$ 0,00	$ 165.547.374
Acta de costos No. 37 (mayo)	$ 156.162.956	$ 29.670.962	$ 0,00	$ 185.833.918

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 37 de fecha 30/06/2024 para el período de junio 2024 el contrato reporta un avance de 41,96%

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 8.604.687.550,00 41,89%
Total inversión ejecutada: $ 8.618.198.535,00 41,96%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se tramitaron modificaciones

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se tramitaron suspensiones

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

3. No se tramitaron adiciones ni prorrogas.

FECHA	No.	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Nacional de seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$1.037.494.050	400033485 ANEXO No. 4	13/05/2021	31/12/2025

Buen Manejo Anticipo	$ 4.359.218.697	400033485 ANEXO No. 4	13/05/2021	31/12/2021
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.074.988.100	400033485 ANEXO No. 4	13/05/2021	31/12/2021
Calidad del Servicio	$5.999.982.150	400033485 ANEXO No. 4	Acta de entrega a entera satisfacción	5 años a partir del Recibo final

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN No. 1 (redistribución de vigencias)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/07/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: MEMORANDO No SGCP 14474
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 08/08/2022
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)


3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR LA INTERVENTORÍA

- Para el presente periodo y teniendo en cuenta las metas físicas definidas dentro del alcance del proyecto, se presenta el siguiente avance en cada una de ellas:


METAS FÍSICAS	AVANCE ACUMULADO
Mejoramiento del corredor (pavimentación)	3,64 Km
Mantenimiento de la vía en afirmado	56 Km
Mantenimiento a la señalización del corredor	60 Km
Sitio crítico La Judía	85%
Sitio crítico Pangote (se encuentra transitable)	4,7%
Atención a emergencias	(PR111, El Canelo - PR88, Puente Chimpatá-PR94, El Tope-PR95, PR32)
Remoción de derrumbe	48.223 m3

A continuación, se representa gráficamente el avance de la pavimentación del corredor Málaga – Curos

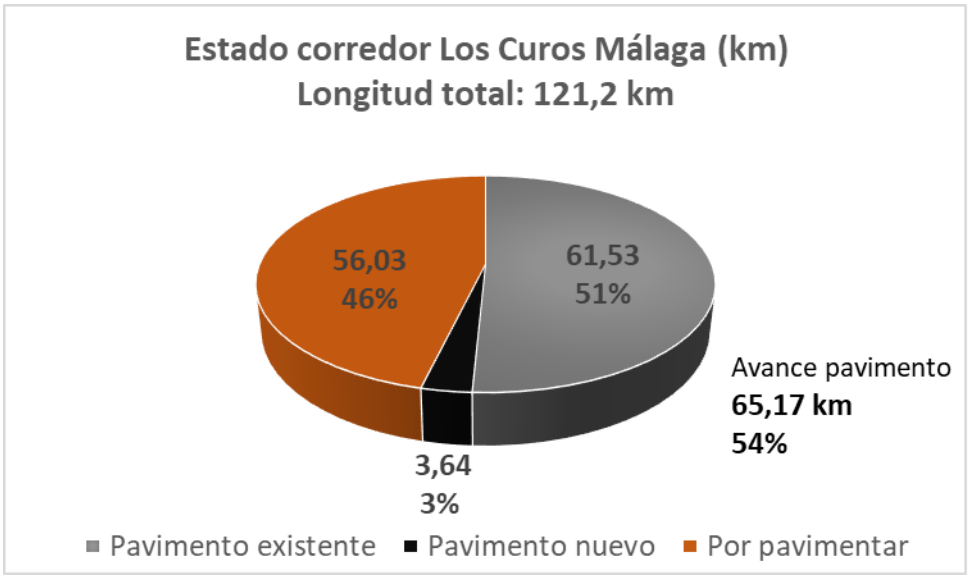

Estado de la pavimentación del corredor Los Curos – Málaga

A continuación, se representa gráficamente el avance de la ejecución del sitio crítico La Judía.

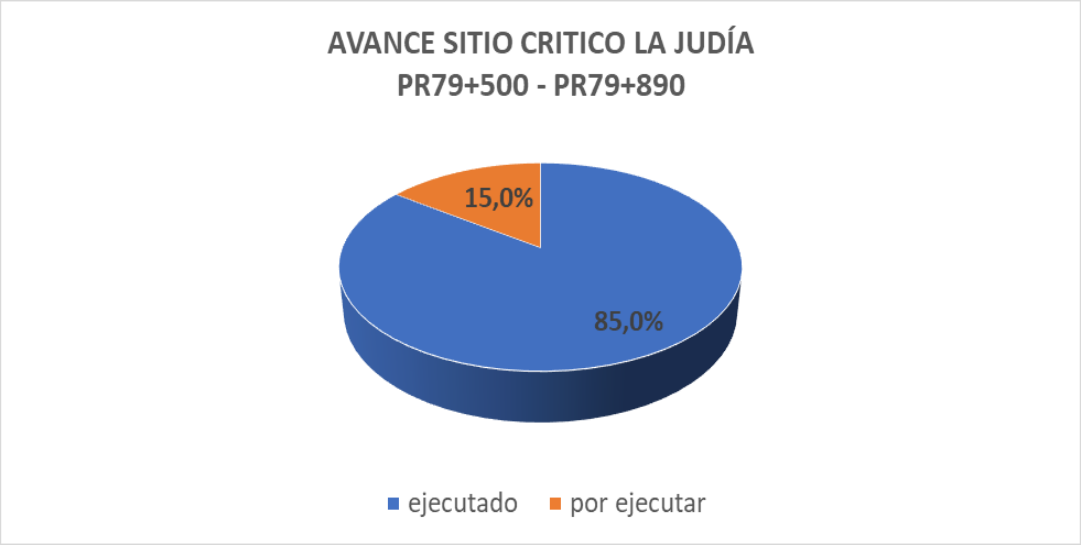

AVANCE SITIO CRÍTICO LA JUDÍA

Adjunto al presente informe se anexa el seguimiento al cronograma presentado para el cumplimiento del fallo de la acción popular, en el que se evidencia que a la fecha se realiza la ejecución del proyecto, tal y como se describió a lo largo del presente documento.

- La reprogramación del programa de Inversiones No. 8 para el contrato de obra 1042 de 2021 con fecha 10-04-2024, muestra a corte de junio de 2024 un avance de obra programado acumulado de 28,83% y avance ejecutado acumulado de 28,79%. Lo anterior indica que no se está cumpliendo con lo programado, se presenta un atraso del 0,04%.
- La vigencia del contrato para el año 2024 tiene recursos por un valor de $28.125.000.000.
- La incidencia de accidentes en las operaciones llevadas a cabo en el corredor Málaga-Los Curos disminuye durante el mes de junio de 2024 en comparación con el mismo período de 2023, con 4 accidentes laborales. Para obtener una visión más completa de la accidentalidad a lo largo del año 2023 y hasta la fecha actual de 2024, se presenta un resumen detallado en el cuadro siguiente:

ESTADO DE ESTUDIOS SECTORES EN EJECUCIÓN Y SITIOS INESTABLES

Con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos técnicos y contractuales para construir las obras para la pavimentación del corredor vial, a continuación, se relacionan los avances en cuanto a los estudios y diseño:

TABLA 1. ESTADO ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES EN EJECUCIÓN

	SECTORES	LONGITUD km	AVANCE %
1	PR 1+365 al PR 7+000	5,6 km	100%
2	PR 63+050 al PR 73+000	10 km	100%
3	PR 108+600 al PR 109+348	0,748 km	100%
4	PR 109+718 al PR 110+600	0,882 km	100%
5	PR 122+050 al PR 124+000	1,95 km	100%
	Total	19,18 km	

TABLA 2. SITIOS INESTABLES

1	PR 14+220 al PR 14+500	80%
2*	PR 29+720 al PR 30+090 (SC 43)	100%
3*	PR 30+492 al PR 30+960	80%
4*	PR 32+758 al PR 33+098	70%
5	PR 46+580 al PR 47+107	60%
6	PR 53+690 al PR 53+743	70%
7*	PR 71+688 al PR 71+740	100%
8*	PR 79+600 al PR 79+800 la judía	100%
9	PR 87+600 al PR 88+250 EL Canelo	5%
10	PR 111+080 Talud inferior; PR 111+150 Talud Superior el Volcán	100%
11	PR 111+230 al PR 111+350	5%

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

Actualmente, se cuenta con un total de 174 predios distribuidos en todo el corredor vial, de los cuales, se encuentran pendientes de firma de los Permisos de Intervención Voluntarios, 13 inmuebles en el sector de Málaga, para un avance total del 92.53% de PIVs.

Continúa el balance positivo en la Gestión y Adquisición Predial, a la fecha de corte del presente informe, se encuentran aprobadas por esta Interventoría y con Visto Bueno de No Objeción por parte del Gestor Técnico Predial de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, treinta (30) Fichas y Planos Prediales con sus insumos constitutivos. Trece (13) Estudios de Títulos correspondientes al Sector de Los Curos, se encuentran aprobados por parte de esta Interventoría Jurídico Predial y con Visto Bueno de No Objeción por parte de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS. En este Informe se destaca, que el Contratista notificó mediante los respectivos oficios, a los propietarios de los predios de un sector del Municipio de Guaca, en cumplimiento a lo requerido por las Fichas Prediales, relacionado con la entrega de la documentación exigida para soportar el lucro cesante y daño emergente, en el que pudiesen verse afectados dichos propietarios.

De igual manera, se informa que se cuenta con tres (3) Informes de Diagnóstico Predial aprobados por esta Interventoría, como son el del tramo de Los Curos, el del tramo del Municipio de Santa Bárbara y el del tramo del Municipio de Guaca; este último se encuentra en revisión y posterior emisión de Visto Bueno de No Objeción por parte de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS.

Estado de las manifestaciones PQRS: Durante el periodo reportado se recepcionaron cinco (5) manifestaciones correspondientes a peticiones con números consecutivos 292, 293, 294 y 295, de la cuales dos (2) fueron cerradas. a la fecha se han recepcionado 296 manifestaciones PQRSD de las cuales el 99% están debidamente atendidas y cerradas.

Contratación de Mano de obra de AIP: Como se observa en la figura 1, en el periodo de mayo se reportaron 134 personas activas cuantro(4) menos que en el periodo inmediatamente anterior, el 42% corresponde a personal de Mano de Obra no Calificada; en todos los casos del área de influencia del Proyecto; el 58% es personal de Mano de Obra Calificada de los cuales más de la mitad 57% es personal del área de influencia del proyecto.

Atención a la comunidad: En el periodo de mayo del 2024 se continúa ofreciendo el servicio de una (1) oficina de atención permanente a la comunidad, disponible y abierto en lo que va el proceso constructivo de la obra hasta la fecha; está ubicado en sitio visible y de fácil acceso en el municipio Guaca en la Calle 4 # 4-32 Centro.


4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Durante el presente periodo no se realizaron comisiones.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO**

Cordialmente,



Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Director Territorial Santander (E)
