SMCN – GRUPO CENTRO
Ingeniero
LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 1 del mes de julio al 31 del mes de julio de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN No. 2193 del 27 de junio de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LOS CUROS - MÁLAGA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 124 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	1042 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066	NIT:	900.354.637-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S. con NIT. 900.354.637-5, con porcentaje de participación del 75% e HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.397.334-3, con un porcentaje de participación del 25%.		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	25 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 32939
VALOR INICIAL:	$286.170.023.299 M/CTE		

VALOR ADICIONES:	$9.954.675.275 M/CTE
ADICIÓN 1:	$9.954.675.275 M/CTE
VALOR ACTUAL:	$296.124.698.574 M/CTE
ANTICIPO	CUENTA DE AHORROS 219-86590-4 FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$16.407.177.862 M/CTE
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 2.846.223.529,00 M/CTE
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 13.560.954.333,00 M/CTE
PLAZO INICIAL:	102 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	No aplica
PRÓRROGA 1:	No aplica
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de agosto de 2029.

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
466621	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 4.663.443.163	$ 3.798.009.659,0	$ 8.560.954.333 *Anticipo por amortizar
466621	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 256.580.136	$ 256.580.136	
1047021	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 7.300.000.000	$ 2.259.154.446	
1047021	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 2.654.675.275	$ 0	
100122	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 36.901.724.745	$ 36.901.724.745	$ 0
100122	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 598.275.255	$ 598.275.255	$ 0
103923	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 448.706.441	$ 448.706.441	$ 0
103923	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 27.676.293.559	$ 27.676.293.559	$ 0
1408123	2023	20	C-2401-0600-77-0-2401029-02	$ 4.100.000.000	$ 4.100.000.000	$ 0
177724	2024	11	C-2401-0600-77-51102D-2401023-02	$ 448.706.441	$ 448.706.441	$ 0
177724	2024	11	C-2401-0600-77-51102D-2401008-02	$ 27.676.293.559	$ 10.592.290.255	$ 17.084.003.304
TOTAL				$ 112.724.698.574	$ 87.079.740.937	$ 25.644.957.637

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA DE AJUSTE 36D (MAY-24)	$ - 142.664,00	$ - 1.043,00	-	$ - 143.707,00
ACTA DE OBRA 37 P (JUN-24)	$ 441.769.270,00	$ 3.228.313,00	-	$ 444.997.583,00
ACTA DE OBRA 37 (JUN-24)	$ 1.791.120.697,00	$ 22.235.457,00	$ 105.890.740.,00	$ 1.707.465.414,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 36 de fecha 31/05/2024, para el periodo de mayo de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 240.526.352.360	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 72.564.423.269,04	30,17%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 71.870.761.822,00	29,88%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 14.584.499.675,00	
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 87.079.740.937,00	

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 16.407.177.862,00
Amortizado	$ 2.846.223.529,00
Saldo	$ 13.560.954.333,00

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 30,17%
Meta física ejecutada %: 29,88%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se realizaron actas de precios no previstos.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron modificaciones.

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. **PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no tramitó reprogramaciones.

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron suspensiones.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron adiciones, prorrogas y/o modificaciones.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/12/2021
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 30/12/2021
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Nacional de seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$13.674.969.857,50	400033673 ANEXO No. 4	16/12/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$11.407.177.862	400033673 ANEXO No. 4	16/12/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$27.349.939.715,00	400033673 ANEXO No. 4	16/12/2021	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	$41.024.909.572,50	400033673 ANEXO No. 4	5 años a partir del Recibo final	
Calidad	$1.088.280.000	400033673 ANEXO No. 4	5 años a partir del Recibo final	

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$6.837.484.928,75	400033672 ANEXO No. 3	16/12/2021	31/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No aplica.

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA ENVIADA JULIO DEL 2024			
			INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE DOCUMENTO RADICADO
No. Consecutivo	**Fecha del documento**	**Asunto**	**CORREO ENVIO**
CREACT2021-OC-1002-2024-187	28/6/2024	Suspensión actividades de construcción disipadores sector Guaca. Entrega ajustes a diseño.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-186	3/7/2024	ACTA DE COMITÉ DE OBRA No 71 DEL 27-06-2024 – COMITÉ PRESENCIAL EN OFICINAS TERRITORIAL INVIAS SANTANDER	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-188	3/7/2023	ACTA DE REUNIÓN No 57 DEL 18-06-2024 – VISITA ESPECIALISTAS	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-189	3/7/2024	Priorización Estudios y Diseños sector PR102+000 al PR106+600, Santa Bárbara y del PR37+000 al PR43+000, San Andrés.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-190	3/7/2024	Solicitud Entrega Inventario Puente Metálico Provisional	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-191	3/7/2024	CREACT2021-OC-1002-2024-191 – SOLICITUD DE COMPLEMENTAR INFORMES DE CALIDAD.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-192	4/7/2024	Mantenimiento de maquinaria y equipo	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066

CORRESPONDENCIA ENVIADA JULIO DEL 2024

			INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE DOCUMENTO RADICADO
No. Consecutivo	**Fecha del documento**	**Asunto**	**CORREO ENVIO**
			<correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-193	4/7/2024	Alcance comunicación CREACT2021-OC-1002-2024-189, PRIORIZACIÓN PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III del PR35+000 a PR41+000	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-194	4/7/2024	Informes de Visita al Proyecto – Especialistas en Geología y Geotecnia y en Hidráulica e Hidrología.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-195	4/7/2024	Respuesta comunicados 164-24-CLI-CVC066-DIR y 177-24-CLI-CVC066-DIR. complementación de la exploración geotécnica en el PR111+300	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-196	4/7/2024	Personal mínimo	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-197	5/7/2024	Respuesta Comunicado 2024S-VSAN-041529 Solicitud apoyo en la atención al derecho de petición de radicado INVIAS No. 2024E-VUVR-052507	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-198	5/7/2024	ALCANCE A COMUNICADO CREACT2021-OC-1002-2024-174 / ENTREGA SOPORTES ACTA DE COSTOS 37 E INFORME MENSUAL	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>

CORRESPONDENCIA ENVIADA JULIO DEL 2024			
			INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE DOCUMENTO RADICADO
No. Consecutivo	**Fecha del documento**	**Asunto**	**CORREO ENVIO**
		DE INTERVENTORÍA No 37 – DE JUNIO DE 2024.	
CREACT2021-OC-1002-2024-199	5/7/2024	PRIORIZACIÓN DEL SECTOR DEL PR 102+000 AL PR 106+600 PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-200	5/7/2024	RESPUESTA OFICIO 123-24-CLI-CVC066-DIR CON REMISIÓN INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL – ABRIL DE 2024 Y OFICIO 163-24-CLI-CVC066-DIR REMISIÓN INFORME GESTIÓN SOCIAL MAYO 2024	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-201	6/7/2024	PASO PEATONAL PUENTE LA JUDIA – PR79+700 – CONCEPTO VCM-CR-042-2024 ESPECIALISTA ESTRUCTURAS .	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-202	8/7/2024	espuesta a los comunicados: 179-24-CLI-CVC066-DIR del 14 de junio de 2024, 170-24-CLICVC066-DIR del 11 de junio de 2024, 160-24-CLI-CVC066-DIR del 29 de mayo de 2024, 157-24-CLI-CVC066- DIR del 28 de mayo de 2024 y 128-24-CLI-CVC066-DIR del 9 de mayo de 2024. Revisión y Aprobación	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>

CORRESPONDENCIA ENVIADA JULIO DEL 2024			
			INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE DOCUMENTO RADICADO
No. Consecutivo	**Fecha del documento**	**Asunto**	**CORREO ENVIO**
		de Estudios de Títulos subsanados conforme a las observaciones generadas por esta Interventoría.	
CREACT2021-OC-1002-2024-203	8/7/2024	Solicitud entrega de los diez (10) Estudios de Títulos aprobados y firmados por el Profesional Jurídico Predial de esta Interventoría.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-204	8/7/2024	Seguimiento al programa de obra	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-205	8/7/2024	Acuso recibo informe estado actual de las láminas del tablero del Puente Metálico Provisional PR111+300.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-206	8/7/2024	Acta de ajustes	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-207	8/7/2024	Entrega de diez (10) Estudios de Títulos correspondientes al sector de Santa Bárbara y de Guaca, revisados y aprobados por esta Interventoría, para su revisión y emisión de Visto Bueno de No Objeción.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>

CORRESPONDENCIA ENVIADA JULIO DEL 2024			
			INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE DOCUMENTO RADICADO
No. Consecutivo	**Fecha del documento**	**Asunto**	**CORREO ENVIO**
CREACT2021-OC-1002-2024-208	9/7/2024	Respuesta a comunicado 171-24-CLI-CVC066-DIR. Entrega informe Gestión Ambiental mensual mayo de 2024.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-210	10/7/2024	Respuesta comunicado 151-24-CLI-CVC066-DIR – Informes Programa de Gerencia de Proyectos	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-211	12/7/2024	Respuesta comunicación 199-24-CLI-CVC066-DIR / RESPUESTA – Comunicación CREACT2021-OC-1002-2024-171, cuyo asunto es: Observaciones a informes de sostenibilidad de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-212	12/7/2024	Respuesta comunicación 205-24-CLI-CVC066-DIR / Entrega informe mensual No 35 de sostenibilidad de mayo de 2024.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-213	13/7/2024	Imagen corporativa vehículos y Cintas reflectivas en equipos y maquinaria	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>

CORRESPONDENCIA ENVIADA JULIO DEL 2024

			INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE DOCUMENTO RADICADO
No. Consecutivo	**Fecha del documento**	**Asunto**	**CORREO ENVIO**
CREACT2021-OC-1002-2024-214	13/7/2024	Dando alcance a los comunicados CREACT2021-OC-1002-2024-188 del 3 de julio de 2024, CREACT2021-OC-1002-2024-170 del 25 de junio de 2024, CREACT2021-OC-1002-2024-115 del 10 de mayo de 2024 y CREACT2021-OC-1002-2024-114 del 10 de mayo de 2024, se solicita la entrega inmediata de las actas de reunión y de comité de obra suscritas por los profesionales del contratista de obra.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-215	13/7/2024	Mantenimiento sitio critico PR29+800 Y PR30+600	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-216	15/7/2024	APREMIO Nº2 POR INCUMPLIMIENTO EN EL COMPROMISO DE ENTREGA DEL PROYECTO OPC DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-217	15/7/2024	Respuesta comunicado 203-24-CLI-CVC066-DIR Hoja de Vida Ingeniero Residente de Obra.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-218	15/7/2024	APROBACIÓN HOJA DE VIDA INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-219	19/7/2024	Entrega de la Pre-acta Predial Nº38 de julio de 2024, aprobada por esta Interventoría, para su revisión y emisión de Visto Bueno de No Objeción.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>

CORRESPONDENCIA ENVIADA JULIO DEL 2024

			INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE DOCUMENTO RADICADO
No. Consecutivo	**Fecha del documento**	**Asunto**	**CORREO ENVIO**
CREACT2021-OC-1002-2024-220	17/7/2024	Suspensión de permisos ambientales. (i) Aprovechamiento forestal Resolución DGL 000444 de 26 de junio de 2023 (ii) Ocupación de Cauce Resolución DGL 000955 del 01 de diciembre de 2022	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-221	18/7/2024	Respuesta comunicado 218-24-CLI-CVC066-DIR y 002-24-CLI-CVC066-RLG, Solicitud suspensión permisos ambientales.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-222	18/7/2024	Sitio critico la Judía PR79+480	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-223	18/7/2024	Respuesta comunicado 201-24-CLI-CVC066-DIR_Concepto técnico estructura de pavimentos - Verificación de zonas intervenidas en el tramo del PR63+000 – PR73+000.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-224	19/7/2024	Cierre parcial y temporal de la vía Curos – Málaga a la altura del PR 79+845 (sector La Judía) de la ruta 55ST02, municipio de Santa Bárbara, Santander.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-225	19/7/2024	Respuesta comunicado 183-24-CLI-CVC066-DIR_memorando técnico MT-1361-C180-2024	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-226	19/7/2024	Entrega de la Pre-acta SOCIAL Nº38 de julio de 2024, aprobada por esta Interventoría, para su revisión y emisión de Visto Bueno de No Objeción.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>

CORRESPONDENCIA ENVIADA JULIO DEL 2024

			INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE DOCUMENTO RADICADO
No. Consecutivo	**Fecha del documento**	**Asunto**	**CORREO ENVIO**
CREACT2021-OC-1002-2024-227	19/07/2024	ENTREGA ACTA DE AJUSTES DEFINITIVO No 35 Y PROVISIONAL No. 36	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-228	19/7/2024	Señalización preventiva e informativa PR 79+490 sector La Judía	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-229	22/7/2024	RESPUESTA OFICIO 198-24-CLI-CVC066-DIR REMISIÓN INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL – JUNIO 2024.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-230	23/7/2024	RESPUESTA – Referente al Comunicado 186-24-CLI-CVC066-DIR y al Memorando Técnico MT-1385-C180A-2024 sobre las obras definitivas de protección en La Judía (NAC), así como al archivo adjunto "Obras Seudolecho La Judía (Def).dwg" enviado por correo electrónico el 21 de junio del 2024.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-209	23/7/2024	REMISIÓN ACTA MODIFICATORIA DE INTERVENTORÍA N° 5 Y REPROGRAMACIÓN DEL PLAN DE CARGAS N° 6: AJUSTE DE SALARIOS Y REDISTRIBUCIÓN DE DEDICACIONES.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-231	25/7/2024	Seguimiento al programa de obra	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-232	25/7/2024	ACTA DE REUNIÓN No 58 DEL 23-07-2024 – SEGUIMIENTO ATENCIÓN DE EMERGENCIA SC LA JUDÍA PR 79+480 – PR 79+500.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>

CORRESPONDENCIA ENVIADA JULIO DEL 2024

			INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE DOCUMENTO RADICADO
No. Consecutivo	**Fecha del documento**	**Asunto**	**CORREO ENVIO**
CREACT2021-OC-1002-2024-233	26/7/2024	REMISIÓN INFORME TRIMESTRAL No12 (abril, mayo y junio de 2024)	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-234	27/7/2024	RESPUESTA OFICIO 226-24-CLI-CVC066-DIR REMISIÓN PROYECTO OBRA CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRAY JOSE DE LAS CASAS NOVAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SANTANDER	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-235	27/7/2024	Respuesta comunicado 222-24-CLI-CVC066-DIR_Entrega oferta técnica y económica para el ajuste de los Estudios y Diseños del PR109+980 – GT-PT-0168-2024-V1.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-236	30/7/2024	Respuesta a comunicado 204-24-CLI-CVC066-DIR: Estudios y Diseños - Entrega informe de patología y reforzamiento estructural del puente Listara.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-237	30/7/2024	PRESENTACIÓN HOJA DE VIDA PROFESIONAL AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-238	31/7/2024	Entrega reprogramación al Plan de Cargas solicitud de traslado de vigencias contrato de Interventoría 1002 de 2021.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-239	31/7/2024	Informe control de dossier - Respuesta a comunicado 142-24-CLICVC066-DIR / Respuesta comunicados CREACT2021-OC-1002-2023-515 / CREACT2021-OC-1002-	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>

CORRESPONDENCIA ENVIADA JULIO DEL 2024			
			INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE DOCUMENTO RADICADO
No. Consecutivo	**Fecha del documento**	**Asunto**	**CORREO ENVIO**
		2023-514 y CREACT2021-OC-1002-2023-592.	
CREACT2021-OC-1002-2024-240	31/7/2024	Respuesta a comunicado 009-24-CLI-CVC066-DIR / Volumen V. Estudio de estabilidad y estabilización de taludes, sitio crítico del PR88, Volumen VII. Estudio de hidrología, hidráulica y socavación, sitio crítico del PR88.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	1002 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021	NIT:	901.481.579-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):	CEMOSA COLOMBIA CON NIT. 900.549.062-9 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 10%, ICOEM COLOMBIA S.A.S. CON NIT. 901.333.961-0, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 40%, HACE INGENIEROS S.A.S. CON NIT. 800.129.789-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 32% Y BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S CON NIT. 900.779.202-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 18%.		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	25 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 32937
VALOR INICIAL:	$19.999.940.500		
VALOR ADICIONES:	No aplica		
ADICIÓN 1:	No aplica		
VALOR ACTUAL:	$19.999.940.500		
ANTICIPO	CUENTA AHORROS 523-81153-7 FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$624.970.250		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$624.970.250		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	102 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	No aplica		
PRÓRROGA 1:	No aplica		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de agosto de 2029		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
421821	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 1.187.440.500	$ 1.187.440.500	$ 0
421821	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 62.500.000	$ 62.500.000	$ 0
98422	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 2.460.114.983	$ 2.460.114.983	$ 0
98422	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 39.885.017	$ 39.885.017	$ 0
912722	2022	20	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 1.000.000.000	$ 1.000.000.000	$ 0
103223	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 1.845.086.237	$ 1.845.086.237	$ 0
103223	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 29.913.763	$ 29.913.763	$ 0
943823	2023	20	C-2401-0600-77-0-2401029-02	$ 540.000.000	$ 540.000.000	$ 0
1396423	2023	20	C-2401-0600-77-0-2401029-02	$ 540.000.000	$ 540.000.000	$ 0
155624	2024	11	C-2401-0600-77-51102D-2401023-02	$ 29.913.763	$ 29.913.763	$ 0
155624	2024	11	C-2401-0600-77-51102D-2401008-02	$ 1.845.086.237	$ 1.065.030.985	$ 780.055.252
TOTAL				**$ 9.579.940.500**	**$ 8.799.885.248**	**$ 780.055.252**

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 36 (mayo)	$ 139.115.440	$ 26.431.934	$ 0,00	$ 165.547.374
Acta de costos No. 37 (mayo)	$ 156.162.956	$ 29.670.962	$ 0,00	$ 185.833.918

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 38 de fecha 31/07/2024 para el período de junio 2024 el contrato reporta un avance de 42,84%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 8.762.678.343,00 42,66%
Total inversión ejecutada: $ 8.810.977.714,00 42,90%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramitaron modificaciones

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramitaron suspensiones

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

3. No se tramitaron adiciones ni prorrogas.

FECHA	No.	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Nacional de seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$1.145.494.050	400033485 ANEXO No. 7	21/12/2023	31/12/2025

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Nacional de seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Buen Manejo Anticipo	$ 4.359.218.697	400033485 ANEXO No. 7	21/12/2023	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.290.988.100	400033485 ANEXO No. 7	21/12/2023	31/12/2028
Calidad del Servicio	$6.161.982.150	400033485 ANEXO No. 7	31/12/2025	31/12/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN No. 1 (redistribución de vigencias)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/07/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: MEMORANDO No SGCP 14474
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 08/08/2022
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)


3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR LA INTERVENTORÍA

- Para el presente periodo y teniendo en cuenta las metas físicas definidas dentro del alcance del proyecto, se presenta el siguiente avance en cada una de ellas:


METAS FÍSICAS	AVANCE ACUMULADO
Mejoramiento del corredor (pavimentación)	3,64 K m
Mantenimiento de la vía en afirmado	56 K m
Mantenimiento a la señalización del corredor	60 K m
Sitio crítico La Judía	85%
Sitio crítico Pangote (se encuentra transitable)	4,7%
Atención a emergencias	(PR 111, El Canelo - PR 88, Puente Chimpatá-PR 94, El Tope-PR 95, PR 32)
Remoción de derrumbe	48.223 m3

A continuación, se representa gráficamente el avance de la pavimentación del corredor Málaga – Curos

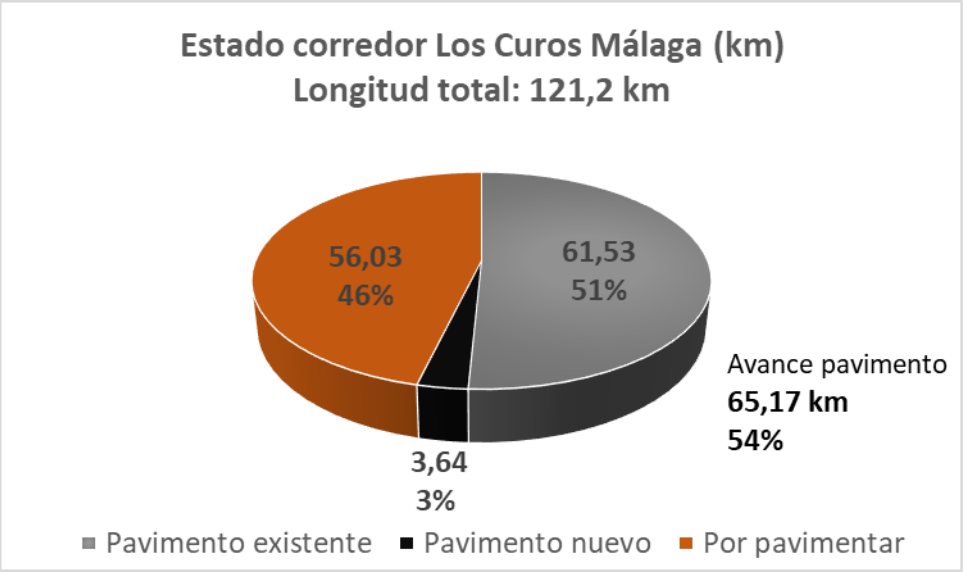

Estado de la pavimentación del corredor Los Curos – Málaga

A continuación, se representa gráficamente el avance de la ejecución del sitio crítico La Judía.

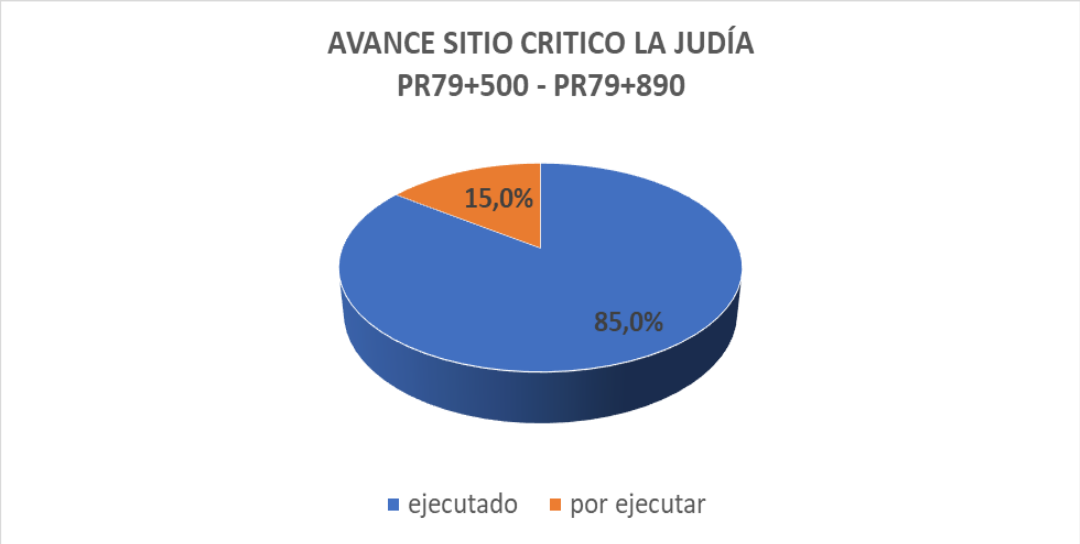

AVANCE SITIO CRÍTICO LA JUDÍA

Adjunto al presente informe se anexa el seguimiento al cronograma presentado para el cumplimiento del fallo de la acción popular, en el que se evidencia que a la fecha se realiza la ejecución del proyecto, tal y como se describió a lo largo del presente documento.

- La reprogramación del programa de Inversiones No. 9 para el contrato de obra 1042 de 2021 con fecha 10-04-2024, muestra a corte de julio de 2024 un avance de obra programado acumulado de 30,17% y avance ejecutado acumulado de 29,78%. Lo anterior indica que no se está cumpliendo con lo programado, se presenta un atraso del 0,39%.

- La vigencia del contrato para el año 2024 tiene recursos por un valor de $28.125.000.000.

- La incidencia de accidentes en las operaciones llevadas a cabo en el corredor Málaga-Los Curos disminuye durante el mes de julio de 2024 en comparación con el mismo período de 2023, con 4 accidentes laborales. Para obtener una visión más completa de la accidentalidad a lo largo del año 2023 y hasta la fecha

ESTADO DE ESTUDIOS SECTORES EN EJECUCIÓN Y SITIOS INESTABLES

Con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos técnicos y contractuales para construir las obras para la pavimentación del corredor vial, a continuación, se relacionan los avances en cuanto a los estudios y diseño:

ESTADO ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES EN EJECUCIÓN			
SECTORES		LONGITUD km	AVANCE %
1	PR 1+365 al PR 7+000	5,6 km	100%
2	PR 63+050 al PR 73+000	10 km	100%
3	PR 108+600 al PR 109+348	0,748 km	100%
4	PR 109+718 al PR 110+600	0,882 km	100%
5	PR 122+050 al PR 124+000	1,95 km	100%
	Total	19,18 km	

SITIOS INESTABLES ATÍPICOS		
1	PR 14+220 al PR 14+500	80%
2	PR 46+580 al PR 47+107	60%
3	PR 53+690 al PR 53+743	80%
4*	PR 87+600 al PR 88+250 EL Canelo	5%
5*	PR 111+080 Talud inferior; PR 111+150 Talud Superior el Volcán	100%
6*	PR 111+230 al PR 111+350	5%

*Tramo pavimentado

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

Actualmente, se cuenta con un total de 174 predios distribuidos en todo el corredor vial, de los cuales, se encuentran pendientes de firma de los Permisos de Intervención Voluntarios, 13 inmuebles en el sector de Málaga, para un avance total del 92.53% de PIVs.

Continúa el balance positivo en la Gestión y Adquisición Predial, a la fecha de corte del presente informe, se encuentran aprobadas por esta Interventoría y con Visto Bueno de No Objeción por parte del Gestor Técnico Predial de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, treinta (30) Fichas y Planos Prediales con sus insumos constitutivos. Trece (13) Estudios de Títulos correspondientes al Sector de Los Curos, se encuentran aprobados por parte de esta Interventoría Jurídico Predial y con Visto Bueno de No Objeción por parte de la Subdirección de Sostenibilidad del

INVIAS. En este Informe se destaca, que el Contratista notificó mediante los respectivos oficios, a los propietarios de los predios de un sector del Municipio de Guaca, en cumplimiento a lo requerido por las Fichas Prediales, relacionado con la entrega de la documentación exigida para soportar el lucro cesante y daño emergente, en el que pudiesen verse afectados dichos propietarios.

De igual manera, se informa que se cuenta con tres (3) Informes de Diagnóstico Predial aprobados por esta Interventoría, como son el del tramo de Los Curos, el del tramo del Municipio de Santa Bárbara y el del tramo del Municipio de Guaca; este último se encuentra en revisión y posterior emisión de Visto Bueno de No Objeción por parte de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS.

Estado de las manifestaciones PQRS: A la fecha, se cuenta con un acumulado de 305 manifestaciones PQRSD, 98% cerradas. en el periodo reportado se recibieron cinco (5) manifestaciones y se cerraron tres (3).

Contratación de Mano de obra de AIP: El proyecto viene cumpliendo con el objetivo de dar prioridad en términos laborales a la población del área de influencia del proyecto en Mano de bra no calificada y mano de obra calificada; en el periodo de julio se reportaron ciento ochenta y nueve (189) personas activas once (11) más que en el periodo inmediatamente anterior, ochenta (80) trabajadores es decir el 42% son de MONC de los cuales 91% pertenecen al área de influencia del proyecto: De otro lado, se reportan 109 trabajadores de MOC que corresponde al 58%;de los cuales el 54% pertenecen al área de influencia del proyecto.

Atención a la comunidad: En el periodo de julio del 2024 se continúa ofreciendo el servicio de una (1) oficina de atención permanente a la comunidad, disponible y abierto en lo que va el proceso constructivo de la obra hasta la fecha; está ubicado en sitio visible y de fácil acceso en el municipio Guaca en la Calle 4 # 4-32 Centro.

Divulgación de Información: Se viene cumpliendo con el objetivo de mantener informada a la comunidad de cierres y emergencias en el corredor vial, en el periodo reportado se divulgó de manera oportuna mediante cuñas radiales la emergencia que se presentó de perdida parcial de banca sobre el PR 79+490 se emitió cuña radial sugiriendo el cambio de ruta para los vehículos de categoría C2 y superiores. El 20 de julio se actualizó la cuña radial la resolución INVIAS 03068 del 19 de julio del 2024,

Contratación de Mano de obra de AIP: El proyecto viene cumpliendo con el objetivo de dar prioridad en términos laborales a la población del área de influencia del proyecto en Mano de obra no calificada y mano de obra calificada; en el periodo de julio se reportaron ciento ochenta y nueve (189) personas activas once (11) más que en el periodo inmediatamente anterior, ochenta (80) trabajadores es decir el

42% son de MONC de los cuales 91% pertenecen al área de influencia del proyecto: De otro lado, se reportan 109 trabajadores de MOC que corresponde


4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Durante el presente periodo no se realizaron comisiones.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO**

Cordialmente,



Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Director Territorial Santander (E)

