SMCN – GRUPO CENTRO
Ingeniero
LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 1 del mes de agosto al 31 del mes de agosto de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN No. 2193 del 27 de junio de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LOS CUROS - MÁLAGA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 124 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	1042 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066	NIT:	900.354.637-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S. con NIT. 900.354.637-5, con porcentaje de participación del 75% e HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.397.334-3, con un porcentaje de participación del 25%.		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	25 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 32939
VALOR INICIAL:	$286.170.023.299 M/CTE		

VALOR ADICIONES:	$9.954.675.275 M/CTE
ADICIÓN 1:	$9.954.675.275 M/CTE
VALOR ACTUAL:	$296.124.698.574 M/CTE
ANTICIPO	CUENTA DE AHORROS 219-86590-4 FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$16.407.177.862 M/CTE
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 2.846.223.529,00 M/CTE
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 13.560.954.333,00 M/CTE
PLAZO INICIAL:	102 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	No aplica
PRÓRROGA 1:	No aplica
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de agosto de 2029.

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
466621	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 4.663.443.163	$ 3.921.430.425,0	$ 8.437.533.567 *Anticipo por amortizar
466621	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 256.580.136	$ 256.580.136	
1047021	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 7.300.000.000	$ 2.259.154.446	
1047021	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 2.654.675.275	$ 0	
100122	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 36.901.724.745	$ 36.901.724.745	$ 0
100122	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 598.275.255	$ 598.275.255	$ 0
103923	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 448.706.441	$ 448.706.441	$ 0
103923	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 27.676.293.559	$ 27.676.293.559	$ 0
1408123	2023	20	C-2401-0600-77-0-2401029-02	$ 4.100.000.000	$ 4.100.000.000	$ 0
177724	2024	11	C-2401-0600-77-51102D-2401023-02	$ 448.706.441	$ 448.706.441	$ 0
177724	2024	11	C-2401-0600-77-51102D-2401008-02	$ 27.676.293.559	$ 12.739.404.369	$ 14.936.889.190
TOTAL				$ 112.724.698.574	$ 89.350.275.817	$ 23.374.422.757

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA DE AJUSTE 37 D (JUN-24)	$ - 9.868.692,00	$ - 72.117,00	-	$ - 9.940.809,00
ACTA DE OBRA 38 D (JUL-24)	$ 364.626.880,00	$ 2.664.581,00	-	$ 367.291.461,00
ACTA DE OBRA 39 (AGO-24)	$ 1.899.304.694,00	$ 13.879.534,00	$ 123.420.766,00	$ 1.789.763.462,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 39 de fecha 31/08/2024, para el periodo de agosto de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 240.526.352.360	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 74.697.516.160,00	31,06%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 73.770.066.516,00	30,67%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 15.580.209.301,00	
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 89.350.275.817,00	

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 16.407.177.862,00
Amortizado	$ 2.969.644.295,00
Saldo	$ 13.437.533.567,00

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 31,06%
Meta física ejecutada %: 30,67%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se realizaron actas de precios no previstos.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron modificaciones.

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. **PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no tramitó reprogramaciones.

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron suspensiones.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

En el presente periodo no se tramitaron adiciones, prorrogas y/o modificaciones.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/12/2021
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 30/12/2021
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento** **NOMBRE: Nacional de seguros** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 14.084.969.857,00	400033673 ANEXO No. 7	19/12/2023	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 11.407.177.862	400033673 ANEXO No. 7	19/12/2023	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 28.169.939.714,00	400033673 ANEXO No. 7	19/12/2023	31/12/2028
Calidad	$ 1.619.280.000	400033673 ANEXO No. 7	31/12/2025	31/12/2030
Estabilidad de la Obra	$ 42.254.909.572,20	400033673 ANEXO No. 7	31/12/2025	31/12/2030

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$7.042.484.929,00	400033672 ANEXO No. 5	19/12/2021	31/12/2025

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No aplica.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA ENVIADA AGOSTO DEL 2024			
No. Consecutivo	**Fecha del Documento**	**Asunto**	**CORREO ENVIADO**
CREACT2021-OC-1002-2024-241	2/8/2024	FORME TRIMESTRAL No. 10 ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO. PERIODO OCTUBRE DICIEMBRE DE 2023	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-242	3/8/2024	Señalización zonas escolares PR0+000 - PR124	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-243	3/8/2024	Informe sitio inestable PR107+000 de la vía Málaga – Curos, afectación viviendas.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-244	3/8/2024	Observaciones APUs. N.P. Paquete No. 3	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-245	5/8/2024	ENTREGA ACTA DE COSTOS 38 E INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 38 - JULIO DE 2024.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-246	6/8/2024	Respuesta a comunicado 239-24-CLI-CVC066-DIR. con asunto Respuesta a comunicado CREACT2021-OC-1002-2024-165 del 20 de junio de 2024 - Observaciones a informe mensual ambiental de febrero de 2024 Versión 2.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-247	6/8/2024	Respuesta a comunicado 217-24-CLI-CVC066-DIR. Entrega informe Gestión Ambiental mensual junio de 2024.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-248	6/8/2024	Respuesta a comunicado 244-24-CLI-CVC066-DIR. con asunto: Respuesta a comunicado CREACT2021-OC-1002-2024-162 del 20 de junio de 2024 - Observaciones	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>

CORRESPONDENCIA ENVIADA AGOSTO DEL 2024			
No. Consecutivo	**Fecha del Documento**	**Asunto**	**CORREO ENVIADO**
		a informe mensual ambiental de marzo de 2024 Versión 2	
CREACT2021-OC-1002-2024-249	6/8/2024	Solicitud cierre resolución 03068 de 19 julio 2024	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-250	8/8/2024	Traslado observaciones oficio INVIAS 2024S-VBOG-046596 solicitud formato inclusión social.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-251	8/8/2024	Concepto HACE01-024-06 Taludes Guaca PR63+350 al PR+69+000 del Especialista en Geotecnia.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-252	8/8/2024	Reiteración comunicado CREACT2021-OC-1002-2024-152 del 13 de junio de 2024 Cambio Vallas Informativas del Proyecto.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-253	8/8/2024	Reiteración comunicado CREACT2021-OC-1002-2024-210 del 8 de julio de 2024, Informes Programa de Gerencia de Proyectos.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-254	09/08/2024	Reporte de equipo y maquinaria y condiciones de operatividad.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-255	12/8/2024	Respuesta comunicación 2024S-VSAN-040345 del 21 de junio de 2024 – Observaciones actas de costos	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-256	13/8/2024	SOLICITUD - REMITIR COPIA DE RESOLUCIÓN NÚMERO 03544 DE 10 AGOSTO DE 2024 A LOS ACTORES SOCIALES CLAVES DEL CORREDOR VIAL LOS CUROS - MÁLAGA	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-258	12/8/2024	MEMORANDO DG-29. Revisión VOLUMEN II. TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO Y SEÑALIZACIÓN PR97 AL PR108.6 – FASE II.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>

CORRESPONDENCIA ENVIADA AGOSTO DEL 2024			
No. Consecutivo	**Fecha del Documento**	**Asunto**	**CORREO ENVIADO**
CREACT2021-OC-1002-2024-259	12/8/2024	Respuesta a comunicado 200-24-CLI-CVC066-DIR Informes de Sostenibilidad de 2024 en su V2	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-260	12/8/2024	Respuesta a comunicados 205-24-CLI-CVC066-DIR y 248-24-CLI-CVC066-DIR Informe de Sostenibilidad mayo de 2024 en su V2.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-261	12/8/2024	COMUNICADO AMVCD-055-2024. Disposición irregular de material proveniente de EXCAVACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE PR32+800	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-262	13/8/2024	Filtros PR63-PR73	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-263	13/8/2024	Respuesta comunicación 255-23-CLI-CVC066-DIR	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-264	14/8/2024	Documentación de ingreso de personal a obra	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-257	15/8/2024	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE 37 DE ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS EN LA VIGENCIA 2022, 2023 Y 2024, PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-265	15/8/2024	Respuesta comunicado 258-24-CLI-CVC066-DIR_de asunto "Autorización compra e instalación resaltos tipo Cojín Escuela la Ceba Pr 106+370"	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-266	15/8/2024	ESTADO DE TRAMITE ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS No 5 Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No 6.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-267	15/8/2024	Solicitud autorización ingreso Profesional Ambiental de Interventoría.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>

CORRESPONDENCIA ENVIADA AGOSTO DEL 2024			
No. Consecutivo	**Fecha del Documento**	**Asunto**	**CORREO ENVIADO**
CREACT2021-OC-1002-2024-268	15/8/2024	ENTREGA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 38 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-269	16/8/2024	Respuesta a los comunicados 210-24-CLI-CVC066-DIR del 10 de julio de 2024, 227-24-CLI-CVC066-DIR del 23 de julio de 2024 y 242-24-CLI-CVC066-DIR. Aprobación de quince (15) Fichas Prediales, componente Técnico.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-270	16/8/2024	Reiteración de atención de observaciones oficio INVIAS 2024S-VBOG-046596 solicitud envío formato inclusión social.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-271	16/08/2024	PRESENTACIÓN HOJA DE VIDA PROFESIONAL VALUATORIA DE INTERVENTORÍA.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-272	17/8/2024	Respuesta comunicación 262-24-CLI-CVC066-DIR	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-273	17/8/2024	Apremio por incumplimiento al programa de obra	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-274	20/8/2024	Entrega de 15 Fichas Prediales, aprobadas por esta Interventoría, para su revisión y posterior emisión de Visto Bueno de No Objeción.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-275	21/8/2024	Respuesta comunicados 2024S-VBOG-042817 del 29 de junio de 2023 y 2024S-VBOG-056167 del 15 de agosto de 2024_Seguimiento al Programa de Obra del Contrato de obra No. 1042 de 2021.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-276	21/8/2024	COMITÉ DE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA 1042/2021 MÁLAGA-CUROS	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-277	22/8/2024	Reiteración de oficio CREACT2021-OC-1002-2024-123_ Actos y condiciones inseguras en Trabajos en alturas	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>

CORRESPONDENCIA ENVIADA AGOSTO DEL 2024			
No. Consecutivo	**Fecha del Documento**	**Asunto**	**CORREO ENVIADO**
CREACT2021-OC-1002-2024-279	22/8/2024	Remisión Hoja de vida – INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORIA	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-280	22/8/2024	Respuesta a comunicado 2024S-VBOG-057563 de Fecha: 2024-08-21, VISTO NO OBJECIÓN 8 INSUMOS PREDIALES - ESTUDIOS DE TITULOS.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-282	23/8/2024	Entrega de los comunicados INVIAS con radicado 2024S-VBOG-057563 del 21 de agosto de 2024, 2024S-VBOG-057382 del 20 de agosto de 2024 y el 2024S-VBOG-051898 del 31 de julio de 2024.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-283	23/8/2024	REMISIÓN DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS COMUNITARIO DEL DR. DANIL ROMAN, PERSONERO DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-284	23/8/2024	ALCANCE OFICIO CREACT2021-OC-1002-2024-283 REMISIÓN DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS COMUNITARIO DEL DR. DANIL ROMAN, PERSONERO DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-285	26/8/2024	Seguimiento al programa de obra	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-286	26/8/2024	Se solicita la entrega de las actas de reunión No 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57 y 58, así como de las actas de comité de obra No 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76 y 77, debidamente firmadas por todos los profesionales participantes del contratista de obra.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-287	26/8/2024	Respuesta a oficios 184-24-CLI-CVC066-DIR y 185-24-CLI-CVC066-DIR. Aprobación de Estudios de Títulos 691D TU-TCM de Pilar Delgado de Bohórquez y 861I TU-TCM de Teresa Adarme de Esteban (Fallecida), subsanados conforme a las observaciones generadas por esta Interventoría.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>

CORRESPONDENCIA ENVIADA AGOSTO DEL 2024			
No. Consecutivo	**Fecha del Documento**	**Asunto**	**CORREO ENVIADO**
CREACT2021-OC-1002-2024-288	26/8/2024	Entrega de los Estudios de Títulos con ficha predial 691D TU-TCM y 861I TU TCM, aprobados por esta Interventoría, para su revisión y posterior emisión de Visto Bueno de No Objeción.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-281	26/8/2024	Solicitud inicio proceso administrativo sancionatorio	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-289	27/8/2024	SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA VEEDORES IDA Y VUELTA SAN ANDRÉS – BUCARAMANGA	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-290	28/8/2024	Se solicita la entrega de las actas de reunión No 2, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 17, 21, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 y 47, así como de las actas de comité de obra No 2, 9, 10, 11, 19, 44, 46, 48, 50 y 51, debidamente firmadas por todos los profesionales participantes del contratista de obra.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-291	28/8/2024	MEMORANDO VCM-CR-048-2024 – PUENTE LISTARÁ	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com>
CREACT2021-OC-1002-2024-292	29/8/2024	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN 20233040025285-20-062023 del Ministerio de Transporte - Cambio Vallas Informativas del Proyecto.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com> jduarte@hehcolombia.com.co
CREACT2021-OC-1002-2024-293	29/8/2024	Remisión Hoja de vida – DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>
CREACT2021-OC-1002-2024-295	29/8/2024	CREACT2021-OC-1002-2024-295 Remisión Hoja de vida – DIRECTOR DE INTERVENTORÍA con corrección a carta de intensión. Alcance a comunicado CREACT2021-OC-1002-2024-293.	Centro de Atencion al Ciudadano <atencionciudadano@invias.gov.co>

CORRESPONDENCIA ENVIADA AGOSTO DEL 2024			
No. Consecutivo	**Fecha del Documento**	**Asunto**	**CORREO ENVIADO**
CREACT2021-OC-1002-2024-296	30/8/2024	Suministro y reposición de elementos de protección personal (EPP)	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com> jduarte@hehcolombia.com.co
CREACT2021-OC-1002-2024-297	30/8/2024	Reiteración de comunicado CREACT2021-OC-1002-2024-053-113 formación y capacitación de personal operador de equipos.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com> jduarte@hehcolombia.com.co
CREACT2021-OC-1002-2024-300	30/8/2024	Respuesta comunicación 282-24-CLI-CVC066-DIR	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com> jduarte@hehcolombia.com.co
CREACT2021-OC-1002-2024-301	31/8/2024	MEMORANDO DG - 30.REVISIÓN DISEÑO SEÑALIZACIÓN QDA. LA JUDÍA - RESPUESTA A COMUNICADO 278-24-CLI-CVC066-DIR.	Wilver Mozo <wmozo@hehcol.com>, Notificaciones HeH <notificaciones@hehcol.com>, Correspondencia CVC066 <correspondenciacvc066@hehcol.com> jduarte@hehcolombia.com.co

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	1002 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021	NIT:	901.481.579-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):	CEMOSA COLOMBIA CON NIT. 900.549.062-9 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 10%, ICOEM COLOMBIA S.A.S. CON NIT. 901.333.961-0, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 40%, HACE INGENIEROS S.A.S. CON NIT. 800.129.789-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 32% Y BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S CON NIT. 900.779.202-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 18%.		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS - MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	25 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 32937
VALOR INICIAL:	$19.999.940.500		
VALOR ADICIONES:	No aplica		
ADICIÓN 1:	No aplica		
VALOR ACTUAL:	$19.999.940.500		
ANTICIPO	CUENTA AHORROS 523-81153-7 FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$624.970.250		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$624.970.250		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	102 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	No aplica		
PRÓRROGA 1:	No aplica		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de agosto de 2029		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
421821	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 1.187.440.500	$ 1.187.440.500	$ 0
421821	2021	54	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 62.500.000	$ 62.500.000	$ 0
98422	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 2.460.114.983	$ 2.460.114.983	$ 0
98422	2022	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 39.885.017	$ 39.885.017	$ 0
912722	2022	20	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 1.000.000.000	$ 1.000.000.000	$ 0
103223	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401008-02	$ 1.845.086.237	$ 1.845.086.237	$ 0
103223	2023	11	C-2401-0600-77-0-2401023-02	$ 29.913.763	$ 29.913.763	$ 0
943823	2023	20	C-2401-0600-77-0-2401029-02	$ 540.000.000	$ 540.000.000	$ 0
1396423	2023	20	C-2401-0600-77-0-2401029-02	$ 540.000.000	$ 540.000.000	$ 0
155624	2024	11	C-2401-0600-77-51102D-2401023-02	$ 29.913.763	$ 29.913.763	$ 0
155624	2024	11	C-2401-0600-77-51102D-2401008-02	$ 1.845.086.237	$ 1.246.855.043	$ 598.231.194
TOTAL				**$ 9.579.940.500**	**$ 8.981.709.306**	**$ 598.231.194**

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 38 (julio)	$ 152.677.910	$ 29.008.803	$ 0,00	$ 181.686.713
Acta de costos No. 39 (agosto)	$ 152.793.326	$ 29.030.732	$ 0,00	$ 181.824.058

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 39 de fecha 31/08/2024 para el período de junio 2024 el contrato reporta un avance de 43,73%

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 8.927.485.321,00 43,46%
Total inversión ejecutada: $ 8.965.069.527,00 43,65%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se tramitaron modificaciones

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

No se tramitaron suspensiones

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

3. No se tramitaron adiciones ni prorrogas.

FECHA	No.	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Nacional de seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$1.145.494.050	400033485 ANEXO No. 7	21/12/2023	31/12/2025

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Nacional de seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Buen Manejo Anticipo	$ 4.359.218.697	400033485 ANEXO No. 7	21/12/2023	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.290.988.100	400033485 ANEXO No. 7	21/12/2023	31/12/2028
Calidad del Servicio	$6.161.982.150	400033485 ANEXO No. 7	31/12/2025	31/12/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN No. 1 (redistribución de vigencias)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/07/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: MEMORANDO No SGCP 14474
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 08/08/2022
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)


3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR LA INTERVENTORÍA

- Para el presente periodo y teniendo en cuenta las metas físicas definidas dentro del alcance del proyecto, se presenta el siguiente avance en cada una de ellas:


METAS FÍSICAS	AVANCE ACUMULADO
Mejoramiento del corredor (pavimentación)	3,64 Km
Mantenimiento de la vía en afirmado	56 Km
Mantenimiento a la señalización del corredor	60 Km
Sitio crítico La Judía	87%
Sitio crítico Pangote (se encuentra transitable)	4,7%
Atención a emergencias	(PR111, El Canelo -PR88, Puente Chimpatá-PR94, El Tope-PR95, PR32)
Remoción de derrumbe	48.223 m3

A continuación, se representa gráficamente el avance de la pavimentación del corredor Málaga – Curos

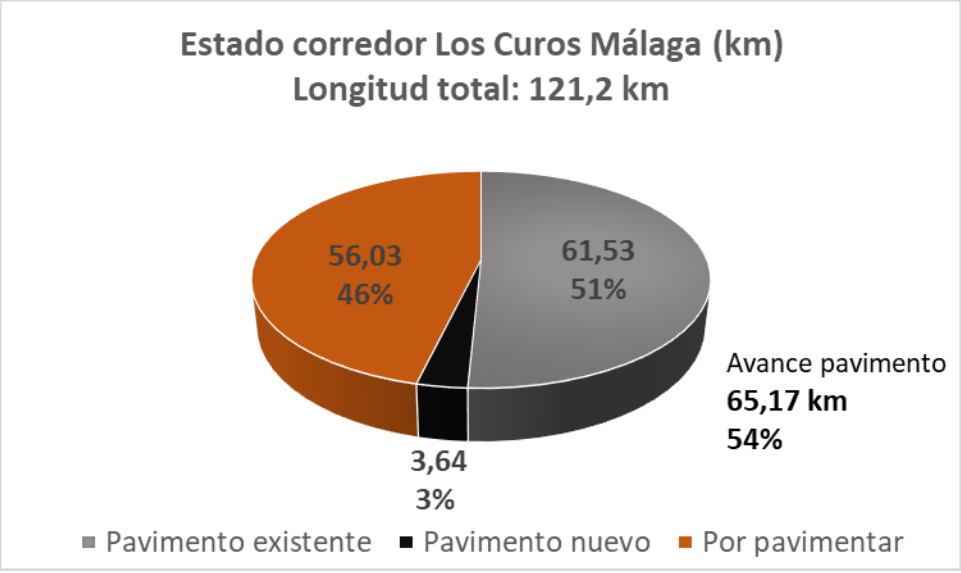

Estado de la pavimentación del corredor Los Curos – Málaga

A continuación, se representa gráficamente el avance de la ejecución del sitio crítico La Judía.

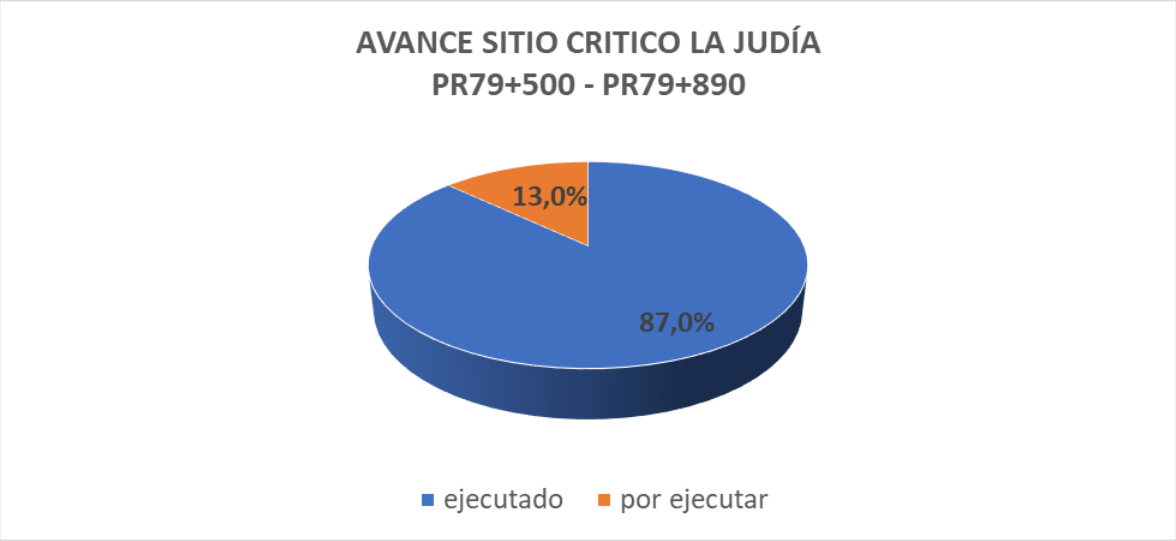

AVANCE SITIO CRÍTICO LA JUDÍA

Adjunto al presente informe se anexa el seguimiento al cronograma presentado para el cumplimiento del fallo de la acción popular, en el que se evidencia que a la fecha se realiza la ejecución del proyecto, tal y como se describió a lo largo del presente documento.

- La reprogramación del programa de Inversiones No. 9 para el contrato de obra 1042 de 2021 con fecha 10-04-2024, muestra a corte de agosto de 2024 un avance de obra programado acumulado de 31,06% y avance ejecutado acumulado de 30,66%. Lo anterior indica que no se está cumpliendo con lo programado, se presenta un atraso del 0,32%.
- La vigencia del contrato para el año 2024 tiene recursos por un valor de $28.125.000.000.
- La incidencia de accidentes en las operaciones del corredor Málaga-Los Curos aumentó en agosto de 2024 en comparación con el mismo período de 2023, registrando 3 accidentes laborales en 2024 frente a 2 en 2023. A continuación, se presenta un resumen detallado que ofrece una visión más completa de la accidentalidad durante todo el año 2023 y hasta la fecha en 2024:

ESTADO DE ESTUDIOS SECTORES EN EJECUCIÓN Y SITIOS INESTABLES

Con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos técnicos y contractuales para construir las obras para la pavimentación del corredor vial, a continuación, se relacionan los avances en cuanto a los estudios y diseño:

ESTADO ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES EN EJECUCIÓN			
SECTORES		LONGITUD km	AVANCE %
1	PR 1+365 al PR 7+000	5,6 km	100%
2	PR 63+050 al PR 73+000	10 km	100%
3	PR 108+600 al PR 109+348	0,748 km	100%
4	PR 109+718 al PR 110+600	0,882 km	100%
5	PR 122+050 al PR 124+000	1,95 km	100%
	Total	19,18 km	

SITIOS INESTABLES ATÍPICOS		
1	PR 14+220 al PR 14+500	80%
2	PR 46+580 al PR 47+107	60%
3	PR 53+690 al PR 53+743	80%
4*	PR 87+600 al PR 88+250 EL Canelo	5%
5*	PR 111+080 Talud inferior; PR 111+150 Talud Superior el Volcán	100%
6*	PR 111+230 al PR 111+350	5%

*Tramo pavimentado

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

El estado de avance de los Permisos de Intervención Voluntarios es superior al 92%, de la totalidad de los predios requeridos para los tramos y los Sitios Críticos. El Avance general de la Gestión y Adquisición Predial se encuentra en un 27%, loque evidencia, la positiva Gestión que se ha realizado durante este periodo y en lo transcurrido del Contrato.

Se reitera y se recomienda que se deben elaborar las fichas sociales de las unidades sociales residentes y productivas, a partir de los Avalúos Comerciales Corporativos, de los cuales, ya fueron generados y radicados a esta Interventoría, cuatro (4) de los mismos, correspondientes al sector de Los Curos y los nueve restantes de este sector, se encuentran en proceso de elaboración por parte de la

Lonja. Actualmente, se continúa avanzando en la identificación de los factores socioeconómicos de todo el corredor vial y se encuentran en proceso de notificación las ofertas de los predios que ya poseen Informes de avalúos comerciales elaborados.

Nuevamente, se informa que el pasivo Predial 001DT3MC, propiedad de la sra. Laura Marcela Delgado, el Contratista manifestó por medio del comunicado 258-23-CLI-CVC066-DIR, que no es viable terminarlo, porque no existe documentación fiable; que se debe realizar nuevamente, ficha predial, Estudio de Títulos y Avalúo. Lo anterior, fue remitido el 26 de junio de 2023, vía email, a la Gestora Valuatoria de la Subdirección de Sostenibilidad, quién, lo remitió a las Gestoras Técnica y Jurídica Predial de la Subdirección, para su revisión. Y de manera oficial, esta Interventoría lo remitió a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, mediante el comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-457, con asunto: Solicitud Finalización Pasivos Prediales, de fecha del 3 de agosto de 2023. El día 2 de octubre 2023, esta interventoría recibió de parte de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, el comunicado 2023S-VBOG-008743, con asunto: Solicitud ejecución pasivo predial de Laura Marcela Delgado, con el cual, sé autorizó la ejecución del mismo por parte del Contratista. A la fecha de corte del presente informe, no se ha ejecutado ninguna actividad correspondiente al presente Pasivo Predial, debido al déficit presupuestal que este proyecto viene presentando desde el mes de agosto de 2023, novedad que fue remitida por esta Interventoría a los Gestores Prediales de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, vía correo electrónico, según su propia solicitud, el pasado 5 de octubre de 2023, por medio del comunicado CREACT2021-OC-1002-2023-527, con asunto: Respuesta comunicación 016-22-CLI-CVC066-RLG Solicitud de Suspensión del Contrato No. 1042 del 2021 del 26 de septiembre de 2023.

➢El Contratista manifiesta que, en la información remitida por el área técnica, se informa la inclusión de zonas requeridas por la instalación de disipadores en el tramo de Guaca, zonas totales que se resumen de la siguiente forma: Total de disipadores 9, distancia lineal de los mismos 326 metros lineales, y área total a adquirir 626.73 m2. Por lo cual, en la Tira Topográfica y Sábana Predial correspondiente a este informe, son incluidas estas áreas. Las cuales se deben realizar el trámite de las servidumbres en dichos predios.

Por lo relevante del documento, este mes, se continúa destacando el comunicado No CREACT2021-OC-1002-2023-469 del 10/08/2023, mediante el cual, esta Interventoría emitió respuesta al comunicado 284-23-CLI-CVC066-DIR del 6 de julio de 2023 elaborado por el Contratista; relacionado con la Aprobación del Informe de Diagnóstico Predial del Municipio de Santa Bárbara. Contando así, a la fecha de cierre del presente Informe, con dos (2) Diagnósticos Prediales aprobados por esta Interventoría, el Diagnóstico Predial del sector de Los Curos y el del sector del

Municipio de Santa Bárbara.

➢Se sigue destacando el Visto Bueno de No Objeción emitido por parte de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, mediante el comunicado SS 42281 de fecha 24 de julio del presente año referente a los siguientes documentos: Diagnostico Predial para las obras requeridas entre el PR 122 al PR 124 e Informe General del sector del corredor vial Los Curos - Málaga.

Se sigue destacando la aprobación del Informe General del sector del corredor vial Los Curos - Málaga, por parte de la Interventoría mediante el comunicado No CREACT2021-OC-1002-2023-438 del 21/07/2023, luego de un largo proceso de atención y subsanación por parte del Contratista, de las observaciones efectuadas por el Profesional Valuatorio de esta Interventoría. Estado de las manifestaciones PQRS: A la fecha, se cuenta con un acumulado de 305 manifestaciones PQRSD, 98% cerradas. en el periodo reportado se recibieron cinco (5) manifestaciones y se cerraron tres (3).

Contratación de Mano de obra de AIP: El proyecto viene cumpliendo con el objetivo de dar prioridad en términos laborales a la población del área de influencia del proyecto en Mano de bra no calificada y mano de obra calificada; en el periodo de julio se reportaron ciento ochenta y nueve (189) personas activas once (11) más que en el periodo inmediatamente anterior, ochenta (80) trabajadores es decir el 42% son de MONC de los cuales 91% pertenecen al área de influencia del proyecto: De otro lado, se reportan 109 trabajadores de MOC que corresponde al 58%;de los cuales el 54% pertenecen al área de influencia del proyecto.

Atención a la comunidad: En el periodo de julio del 2024 se continúa ofreciendo el servicio de una (1) oficina de atención permanente a la comunidad, disponible y abierto en lo que va el proceso constructivo de la obra hasta la fecha; está ubicado en sitio visible y de fácil acceso en el municipio Guaca en la Calle 4 # 4-32 Centro.

Divulgación de Información: Se viene cumpliendo con el objetivo de mantener informada a la comunidad de cierres y emergencias en el corredor vial, en el periodo reportado se divulgó de manera oportuna mediante cuñas radiales la emergencia que se presentó de perdida parcial de banca sobre el PR 79+490 se emitió cuña radial sugiriendo el cambio de ruta para los vehículos de categoría C2 y superiores. El 20 de julio se actualizó la cuña radial la resolución INVIAS 03068 del 19 de julio del 2024.

Contratación de Mano de obra de AIP: El proyecto viene cumpliendo con el objetivo de dar prioridad en términos laborales a la población del área de influencia del proyecto en Mano de obra no calificada y mano de obra calificada; en el periodo de

julio se reportaron ciento ochenta y nueve (189) personas activas once (11) más que en el periodo inmediatamente anterior, ochenta (80) trabajadores es decir el 42% son de MONC de los cuales 91% pertenecen al área de influencia del proyecto: De otro lado, se reportan 109 trabajadores de MOC que corresponde.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el presente periodo no se realizaron comisiones.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

Cordialmente,



Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Director Territorial Santander (E)
